v&m ingenieria SAS

6

Recibe:
26·11·2021
Supervisor

Neiva, 26 de noviembre del 2021

Señor
SECRETARIA DE LA MOVILIDAD – ALCALDIA DE IBAGUE
ING. MIGUEL EDUARDO SAAVEDRA PARRA
SUPERVISOR (E)
Ibagué - Tolima

Referencia: Contrato de Obra No. 1787 de 2021 de Objeto "CONTRATO DE OBRA A MONTO AGOTABLE PARA LA DEMARCACION VIAL E INSTALACION DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE TRANSITO, EN LAS VÍAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUE".

Asunto: Solicitud de Suspensión de Obra

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar, la suspensión al contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1. Que desde el inicio del contrato adicional firmado el 19 de octubre de 2021 y durante los días que se consideran de desarrollo normal de los compromisos pactados, se han presentado periodos lluviosos intermitentes a lo largo del periodo de los días de ejecución corridos, que en total se pueden estimar en más de dieciséis (16) jornadas completas, de lo cual se pueden encontrar evidencias tales como los boletines publicados en la página oficial del IDEAM y los registros que se llevan en la bitácora. Que esta circunstancia de orden climático externo, totalmente ajena a la voluntad y capacidad del contratista y del Municipio, afecta considerablemente las labores de la demarcación vial e instalación de señales de tránsito por lo que el tiempo efectivo dedicado al cumplimiento del contrato se redujo considerablemente, afectando el cronograma de trabajo planteado al inicio del proceso. (anexo informe de precipitación en octubre 2021 - IDEAM)

2. Que el día 21 de octubre se recibió el requerimiento de cumplimiento del contrato de obra No 1787 de 2021 hecho por el Ing. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ donde manifiesta la reparación de defectos y observaciones a la

DIRECCION: CR 4 No. 11 - 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com


cual se le dio respuesta el 28 de octubre, fechas en las que ya se celebraba el contrato adicional.

Por lo anterior V&M INGENIERIA SAS a la fecha, veinticinco (25) de noviembre del presente año ha ejecutado el 32% de la obra correspondiente al Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos CON microesferas de vidrio para marcas viales donde se han intervenido 1168,40 m2 y Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos CON microesferas de vidrio para líneas de carril de 12 cm de ancho donde se han demarcado 12.949 mL que equivalen a setenta y nueve millones trecientos cuarenta y seis mil seis pesos ($79.346.006) existiendo un saldo pendiente de ciento setenta millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos ($170.638.958), así las cosas, conforme al balance teniendo en cuenta que falta por ejecutar más del 60% de la obra en tan solo ocho (8) días de plazo, nuestro equipo de trabajo duplicará esfuerzos para terminar dentro del término pactado y se hace necesario en todo caso solicitar la suspensión por veinte (20) días calendario, dando tiempo a que las condiciones climáticas adversas se superen, y las cuadrillas puedan entrar con tranquilidad a trabajar, precisando que la suspensión temporal de la ejecución no genera ningún tipo de incremento en el valor total del contrato por lo cual el presupuesto oficial continua como se pactó inicialmente.

Cordialmente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Representante Legal

DIRECCION: CR 4 No. 11 - 188
TERUEL - HUILA
Tel: 8741735
E-MAIL: vymingenieriasas@gmail.com

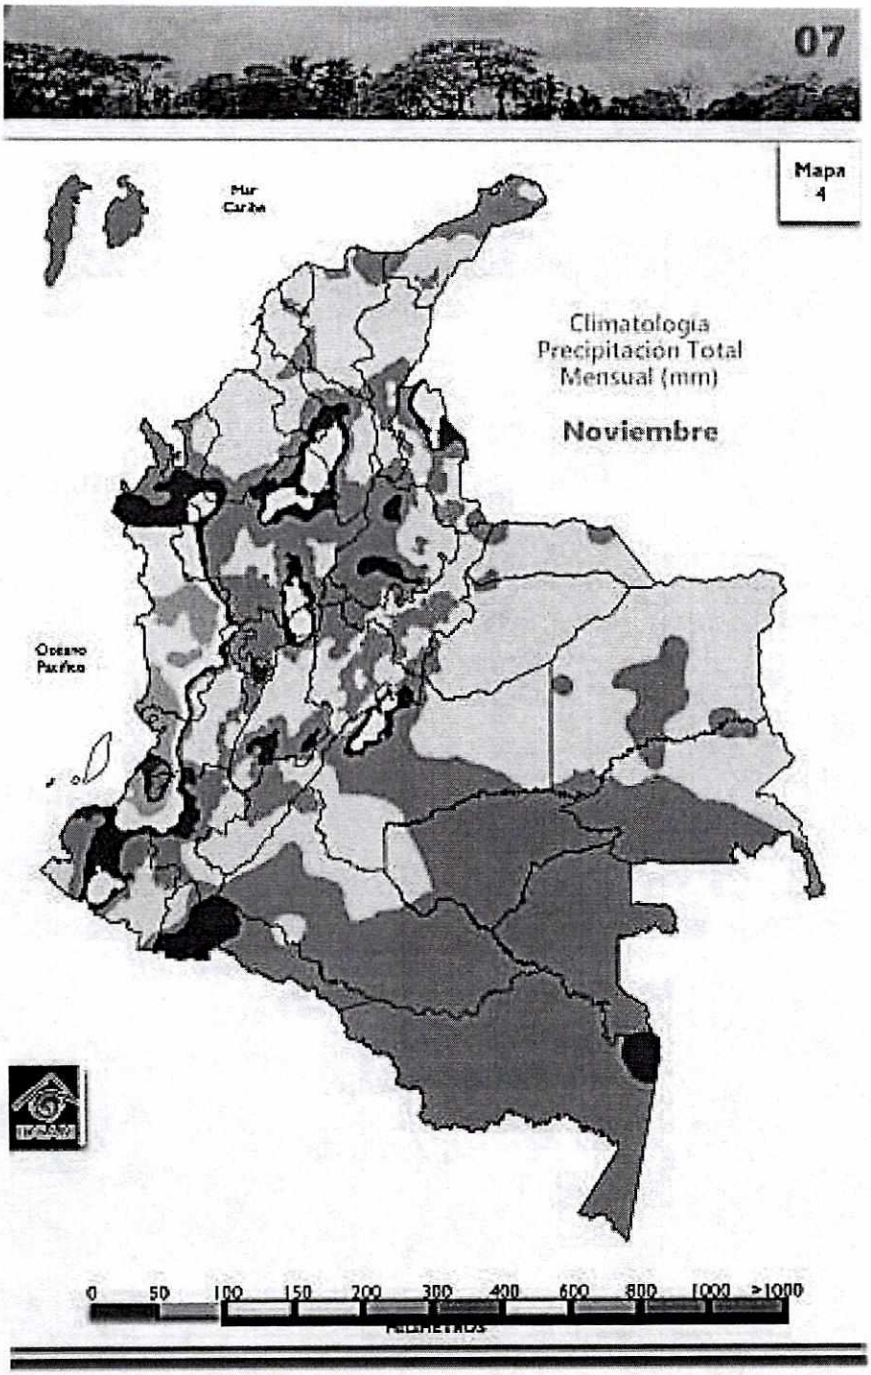

(Reporte del mes de noviembre de precipitación y climatología IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales)

v&m ingeniería SAS

Clima: Climatografía de la principales ciudades

CARTAS CLIMATOLÓGICAS - MEDIAS MENSUALES

AEROPUERTO PERALES (Ibagué)

Tabla de valores

MEDIOS	ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEP	OCTU	NOVIEM	DICIEM
PREC	76.7	95.6	138.5	203.4	240.4	116.9	76.8	88.3	155.0	212.6	164.6	110.4
NoDIAS	12	13	16	20	20	12	10	11	15	20	18	14
TMAX	32.7	34	33.6	34.2	32.5	33.1	34.8	35	35.4	33	31.4	31.4
TMIN	15.3	15.2	14.8	15.6	16.2	15.2	15.2	16.0	14.4	16.0	15.8	15.4
TM-MÁX	28.5	28.6	28.4	27.9	27.8	28.5	29.5	30	29.4	27.5	27.2	27.7
TEMP	23.9	24.0	23.9	23.7	23.6	24.1	24.5	25.0	24.6	23.3	23.1	23.2
TM-MIN	18.7	19.1	19.2	19.2	19.2	19.1	18.8	19.0	19	18.9	18.8	18.7
BRILLO	175.7	138.6	136.5	136.1	157.5	173.6	194.9	193.7	177.9	150.8	141.3	162.1
HUMEDAD	76	76	78	80	81	76	68	65	71	80	82	80
EVAP	128.8	121	125.8	114.5	121.9	129.1	166.5	174.6	147.1	116.9	105.7	108.7

Información suministrada por la Subdirección de Meteorología del IDEAM
