533

JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
1.019.003.817

INFORME PARCIAL 2

RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA



ALCALDIA DE EL ESPINAL
NOVIEMBRE DE 2021

534

INTRODUCCIÓN

Este informe se realiza con el fin de mostrar las etapas y actividades que se han desarrollado durante la realización del contrato, el cual tiene como objeto restauración y adecuación de la casa amiga de los animales (coso municipal) del municipio de El Espinal – Tolima.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Dar a conocer el desarrollo de las actividades y procesos durante el tiempo que se ha realizado la ejecución del contrato que tiene como objeto restauración y adecuación de la casa amiga de los animales (coso municipal) del municipio de El Espinal - Tolima

Objetivos específicos

- Dar a conocer el valor ejecutado de las actividades realizadas durante la ejecución y el desarrollo del proyecto.
- Presentar los documentos que se han expedido para la ejecución del contrato.
- Informar de cada una de las actividades desarrolladas durante el proceso de desarrollo del proyecto con su respectivo registro fotográfico.

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO

2.1 CONDICIONES GENERALES

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	N0. 010- 2021	FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO		
NIT:	1.019.003.817-4		
IDENTIFICACION	1.019.003.817		
DIRECCION:	Manzana k 2, casa 3. B/ Betania campestre El Espinal		
CIUDAD:	El Espinal-Tolima		
TELEFONO	2481842 - 321 2403104		
VALOR	CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 32 CENTAVOS M/C ($160,245,304.32)		
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE CUATRO (4) MESES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO		
ACTA DE INICIO	10 DE AGOSTO DE 2021		
OBJETO	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA		

2.2 REGISTRO DE PERSONAL DE OBRA

N°	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	JOSE LUIS TIQUE CRUZ	93,410,292	INGENIERO RESIDENTE
2	ALBERTO MONTES	1,105,685,744	MAESTRO DE OBRA
3	DARIO PEREZ MONTES	1,105,675,839	MAESTRO DE OBRA
4	JUAN SEBASTIAN BARRETO TAFUR	1,105,692,541	AYUDANTE DE OBRA

2.3 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

aportes en línea

Listado de Empleados Vigentes

	Identificación		Nombre	Salario	Cotizante				Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral	
No.	Tipo	Número		Mensual	Tipo	Subtipo	Extranjero	Cot. Tiempo Ext.	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sucursal	Centro Trabajo
1	CC	1105692541	BARRETO TAFUR JUAN SEBASTIAN	$908,526.00	1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2021-09-01		JOSE GUILLERMO SALAZAR	OBRAS ESPINAL
2	CC	1105685744	MONTES ALBERTO	$908,526.00	1				PROTECCION	NUEVA EPS MOVILIDAD	2021-09-01		JOSE GUILLERMO SALAZAR	OBRAS ESPINAL
3	CC	1105675839	PEREZ MONTES DARIO	$908,526.00	1				PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	2021-09-01		JOSE GUILLERMO SALAZAR	OBRAS ESPINAL
4	CC	93135713	RAMIREZ CARVAJAL CARLOS ARMANDO	$908,526.00	1				COLFONDOS	COMPARTA	2021-09-03		JOSE GUILLERMO SALAZAR	OBRAS ESPINAL
5	CC	93135146	RODRIGUEZ HERRERA CRISTOBAL	$908,526.00	1				PORVENIR	COMPARTA	2021-09-03		JOSE GUILLERMO SALAZAR	OBRAS ESPINAL
6	CC	93410292	TIQUE CRUZ JOSE LUIS	$908,526.00	1				PROTECCION	MEDIMAS EPS	2021-09-01		JOSE GUILLERMO SALAZAR	OBRAS ESPINAL

538

ARL | sura

Medellín, 23 de Septiembre de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador/es de JOSE GUILLERMO SALAZAR DANTONIO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1105682541	BARRETO TAFUR JUAN SEBASTIAN	24/09/2021		0252215[illegible]	DEPENDIENTE
C1105680744	MONTES ALBERTO	24/09/2021		59[illegible]34b	DEPENDIENTE
C1105675939	PEREZ MONTES DARIO	24/09/2021		170[illegible]246	DEPENDIENTE
C80135713	RAMIREZ CARVAJAL CARLOS ARMANDO	03/09/2021		1411[illegible]29	DEPENDIENTE
C80125145	RODRIGUEZ HERRERA CRISTOBAL	03/09/2021		d72[illegible]37	DEPENDIENTE
C82410092	TIQUE CRUZ JOSE LUIS	24/09/2021		1258[illegible]51	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C5184671621266864699

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos


Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/09/2021 17:58:23.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos(**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.241, 186.143.57.28, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.4 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

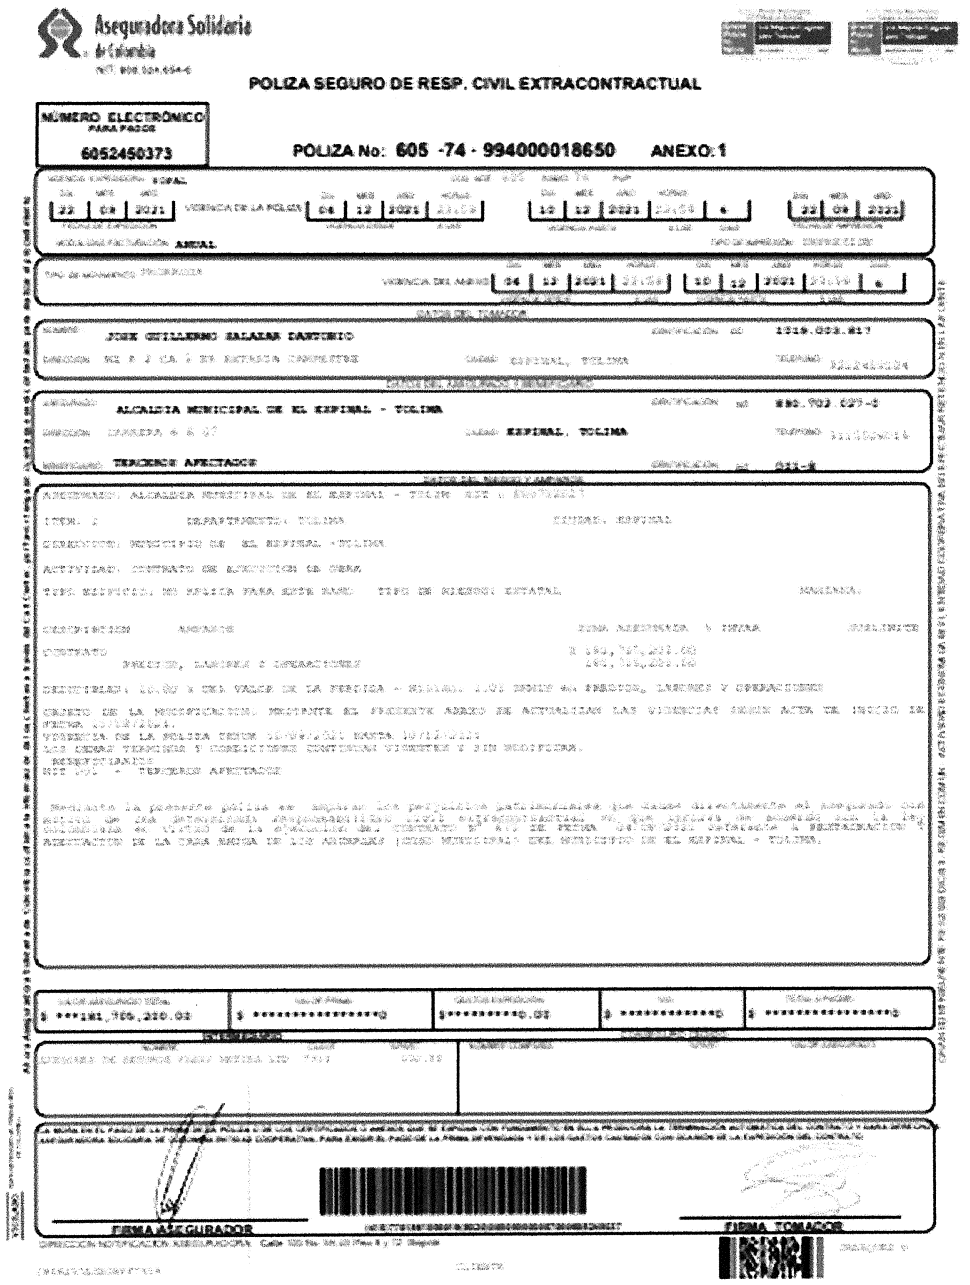

Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS: 6052450373

POLIZA No: 605 -74 - 994000018650 ANEXO: 1

VIGENCIA DE LA POLIZA: 04 12 2021 — 10 12 2021 — 22 08 2022

ANUAL

VIGENCIA DEL AMPARO: 04 12 2021 — 10 12 2021

TOMADOR: JOSE GUILLERMO SALAZAR DANTONIO — IDENTIFICACION CC 1019.003.817

ASEGURADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA — IDENTIFICACION NI 890.703.629-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACION CC 111-0

ASEGURADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA NIT Y DIRECCION

ITEM 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: ESPINAL

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO DE EL ESPINAL -TOLIMA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO MODIFICACION DE POLIZA PARA ESTE RAMO: TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANUAL

CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA CONTRATO.

VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE 04/12/2021 HASTA 10/12/2021

LAS DEMAS CONDICIONES Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

ASEGURADOS

NIT 111 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una responsabilidad extracontractual en que incurra en desarrollo de la ejecución del contrato de obra civil derivada a pavimentación de la carrera 3 entre calles 5 y 6 del municipio de El Espinal - Tolima.

$ ***181,765,210.00 — $ ***********0 — $*********0.00 — $ **********0 — $ **********0

TERCEROS AFECTADOS — 0.00

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADOR: Calle 100 No. 8A-55 Piso 6 y 12 Bogota

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No POLIZA 994000018650 — RAMO 1 — TIPO MOVIMIENTO RENOVACION — RAMO 1

TOMADOR JOSE GUILLERMO SALAZAR DANTONIO — IDENTIFICACION 1019.003.817

ITEM	ASEGURADO	No DOC	DIRECCION RIESGO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA NETA	PRIMA TOTAL
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESP	890703629-2	MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA	ESPINAL	181,765,210.00	0	0

PRIMA TOTA MONEDA	PRIMA TOTAL LOCAL
0	0

540

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP05V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052450365

PÓLIZA No: 605 - 47 - 994000089005 ANEXO: 1

FECHA EXPEDICIÓN: 22 | 04 | 2021 — DESDE: 22 | 04 | 2021

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: JOSE GUILLERMO SALAZAR DANTONIO — IDENTIFICACIÓN No.: 1019.003.817

DIRECCIÓN: KR 8 A CA 3 DE ESTADIO (NORESTE) — CIUDAD: ESPINAL, TOLIMA — TELÉFONO: 3219437194

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.073-0

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.702.073-0

AMPAROS

RAMO DE PRODUCTO: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO: CUMPLIMIENTO	22/04/2021	18/12/2021	$ 6,000,000.00
BUEN USO DEL ANTICIPO, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/04/2021	18/12/2024	$ 6,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/12/2021	18/12/2024	$ 4,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT BENEFICIARIO - ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL - TOLIMA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE OTROSI SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS HASTA ACTA DE INICIO DE OBRA SOLICITADA.
LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
AFECTACION DE LA GARANTIA:

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CONTENIDOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO N° 470 DE FECHA 14/04/2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO O ADECUACION DE LA CASA ACOPIA DE LOS ANIMALES (CASA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TENDRÁ VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	CONTRIBUCIONES	IVA	VALOR A PAGAR
$ ****72,110,389.23	$ ****************2	$*********0.00	$ ************0	$ ****************2

CONDICIONES DE SEGUROS PUBLICOS APROBADAS MEDIANTE RESOLUCION No. 1974 DEL 19

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR


DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-55 Piso 6 y 12 Bogotá — CLIENTE

3. INFORME TECNICO

3.1 UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en el Departamento del Tolima, Municipio de El Espinal.

El Espinal se encuentra a una altitud de 323 m y presenta una temperatura cuyo promedio es de 26 °C. Dista de Ibagué, la capital departamental, 51 km. La población fue fundada en la hacienda llamada Llano Grande del Espinal, propiedad de Antonio Vásquez Forero y Manuel Moya Guzmán, en el año 1754. La cabecera se estableció con el nombre de Upito, a orillas del río Coello, hacia 1776; posteriormente, en 1783, se trasladó la parroquia al lugar donde hoy se encuentra la localidad. La población se ha desarrollado continuamente, pero de forma notable en las dos últimas décadas, convirtiéndose en un importante centro de desarrollo de la actividad agroindustrial, siendo a la vez el eje comercial de la región. Población (2005), 75.375 habitantes. Ubicación Latitud 4° 09' Norte Longitud 74° 53' Oeste.

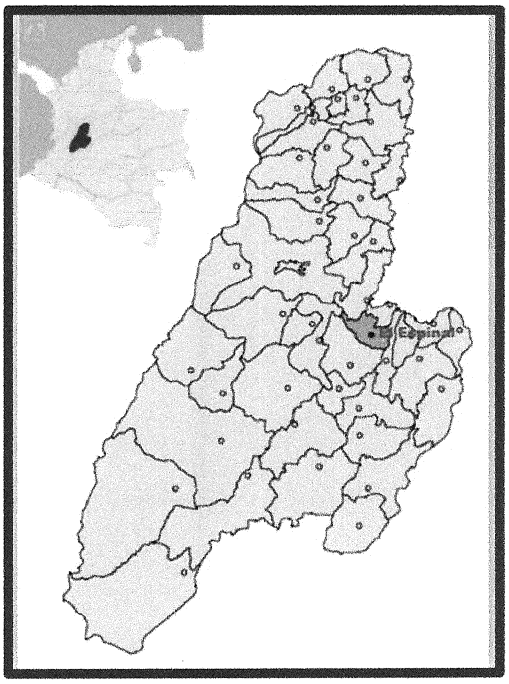

3.2 UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El sitio específico del proyecto se ubica en la zona rural del municipio de El Espinal Tolima situado en la vereda Rincón de San Francisco ceca al corregimiento de Chicoral.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES A REALIZAR

Este contrato tiene como objeto el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la casa amiga de los animales (coso municipal) del municipio de El Espinal – Tolima. La cual contempla las siguientes actividades:

4.1 RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Desmonte de Cubierta (Teja de Zinc)	M2	140,25
1.2	Desmonte de aparato sanitario	UN	1,00
1.3	Desmonte Marcos y puertas	UN	6,00
1.4	Desmonte de ventanas	UN	2,00
1.5	Demolición Placa Maciza Aérea E:0,15M	M2	3,38
1.6	Demolición Muro En Mampostería 0,15M	M2	101,65
1.7	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	43,01
1.8	Demolicion de cimiento enterrado	M3	10,93
1.9	Replanteo Manual de cimientos	M2	152,73
1.10	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	16,90
2	**CIMIENTOS**		
2.1	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	M3	16,40
2.2	Base Agregado Pétreo (Material de Afirmado)	M3	20,58
2.3	Viga de Amarre en Concreto De 3500 PSI	M3	4,65
2.4	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	3,88
2.5	Zapata En Concreto De 3500 PSI	M3	3,84
3	**ESTRUCTURA**		
3.1	Columnas 3500 PSI	M3	3,21
3.2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	3,88
3.3	Placa Base Concreto 0,10 2500 PSI	M2	97,05
3.4	Refuerzo Malla Electrosoldada	KG	296,04
3.5	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2170,61
3.6	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	9,00

4	**MAMPOSTERIA**		
4.1	Muro en Bloque Nº 5 E= 0.12 M	M2	144,62
5	**PAÑETE**		
5.1	Pañete Impermeabilizado Muros 1:3, E=1.5 CM	M2	457,87
6	**CUBIERTA**		
6.1	Suministro e Instalacion Estructura metálica (Tubo Estructural Abierto 4"x2", 15 MM)	M2	140,25
6.2	Suministro e Instalacion Teja Termoacustica Trapezoidal A360	M2	140,25
7	**PISOS BASES**		
7.1	Alistado Impermeabilizado Pisos 1:3, E = 0.04	M2	152,30
8	**APARATOS SANITARIOS**		
8.1	Suministro e instalación de Sanitarios Tanque (Incluye Griferia)	UN	3,00
8.2	Suministro e instalacion de Lavamanos Pedestal (Incluye Griferia)	UN	3,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	1,00
9	**CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA**		
9.1	Suministro e Instalacion Puertas Entamboradas Dimensiones 0.8*2.1 m, (incluye marco y cerradura)	M2	4,20
9.2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	22,07
9.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	23,40
9.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	UND	12,00
9.5	Suministro e Instalacion de columnas en madera 20x20	ML	14,04
9.6	Cerradura entrada Principal	UN	7,00
10	**ACABADOS**		
10.1	Pintura Vinilo 2 Manos	M2	239,4
10.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193,91
10.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193,91
10.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	121,21
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
11.1	Suministro E Instalación De Luminaria Led Cuadrada 30x30 30 W De Incrustar	UN	39,00
11.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	39,00
11.3	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	30,00
11.4	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	1,00
11.5	Tablero Trifásico 18 Circuitos con puerta y chapa, espacio para totalizador	UND	1,00

12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIA**		
12.1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	73,27
12.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	18,00
12.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	56,27
12.4	RED DE VENTILACIÓN 2"	ML	23,32
12.5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	8,00
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA	UND	5,00
12.7	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	3,00
12.8	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	1,00
12.9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3,00
12.10	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8,00
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2"	UND	2,00
12.12	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UND	1,00

SGS

4.2 CRONOGRAMA


ITEMS	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	**PRELIMINARES**																		
1,10	Desmonte de Cubierta (Teja de Zinc)	M2	140,25																
1,20	Desmonte de aparato sanitario	UN	1,00																
1,30	Desmonte Marcos y puertas	UN	6,00																
1,40	Desmonte de ventanas	UN	2,00																
1,50	Demolición Placa Maciza Aérea E:0,15M	M2	3,36																
1,60	Demolición Muro En Mampostería 0,15M	M2	101,65																
1,70	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0,10 M	M2	43,01																
1,80	Demolicion de cimiento enterrado	M3	10,93																
1,90	Replanteo Manual de cimientos	M2	152,73																
1,10	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	19,90																
2	**CIMIENTOS**																		
2,10	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	M3	19,40																
2,20	Base Agregado Pétreo (Material de Afirmado)	M3	20,58																
2,30	Viga de Amarre en Concreto De 3500 PSI	M3	4,65																
2,40	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	3,88																
2,50	Zapata En Concreto De 3500 PSI	M3	3,84																
3	**ESTRUCTURA**																		
3,10	Columnas 3500 PSI	M3	3,21																
3,20	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	3,88																
3,30	Placa Base Concreto 0,10 2500 PSI	M2	97,05																
3,40	Refuerzo Malla Electrosoldada	KG	295,04																
3,50	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2170,61																
3,60	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	9,00																
4	**MAMPOSTERIA**																		
4,10	Muro en Bloque Nº 5 E= 0,12 M	M2	144,62																
5	**PAÑETE**																		
5,10	Pañete Impermeabilizado Muros 1:3, E=1,5 CM	M2	457,87																
6	**CUBIERTA**																		
6,10	Suministro e Instalacion Estructura metálica (Tubo Estructural Abierto 4"x2", 15 MM)	M2	140,25																
6,20	Suministro e Instalacion Teja Termoacustica Trapezoidal A360	M2	140,25																
7	**PISOS BASES**																		
7,10	Alistado Impermeabilizado Pisos 1:3, E = 0.04	M2	152,30																
8	**APARATOS SANITARIOS**																		
8,10	Suministro e Instalación de Sanitarios Tanque (Incluye Grifería)	UN	3,00																
8,20	Suministro e Instalacion de Lavamanos Pedestal (Incluye Grifería)	UN	3,00																
8,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	1,00																
9	**CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA**																		
9,10	Suministro e Instalacion Puertas Entamboradas Dimensiones 0.8*2.1 m, (incluye marco y cerradura)	M2	4,20																
9,20	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	22,07																
9,30	VENTANA LÁMINA CALBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	23,40																
9,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UND	12,00																
9,50	Suministro e Instalacion de columnas en madera 20x20	ML	14,04																
9,60	Cerradura entrada Principal	UN	7,00																
10	**ACABADOS**																		
10,10	Pintura Vinilo 2 Manos	M2	239,40																
10,20	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193,91																
10,30	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193,91																
10,40	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	121,21																
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																		
11,10	Suministro E Instalación De Luminaria Led Cuadrada 30x30 30 W De Incrustar	UN	39,00																
11,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	39,00																
11,30	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	30,00																
11,40	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	1,00																
,))	Tablero Trifásico 18 Circuitos con puerta y chapa, espacio para totalizador	UND	1,00																
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIA**																		
12,10	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	73,27																
12,20	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	18,00																
12,30	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	58,27																
12,40	RED DE VENTILACIÓN 2"	ML	23,32																
12,50	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	8,00																
12,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA	UND	5,00																
12,70	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	3,00																
12,80	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	1,00																
12,90	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UND	3,00																
12,10	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	8,00																
12,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2"	UND	2,00																
12,12	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UND	1,00																


546

4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

2. CIMIENTOS


2.2 BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)

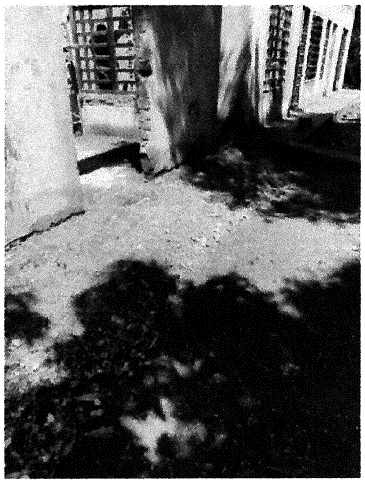
	

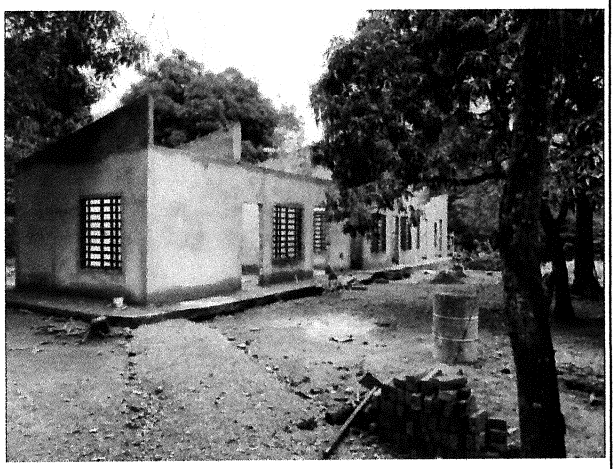
3. ESTRUCTURA

3.1 Columnas 3500 PSI



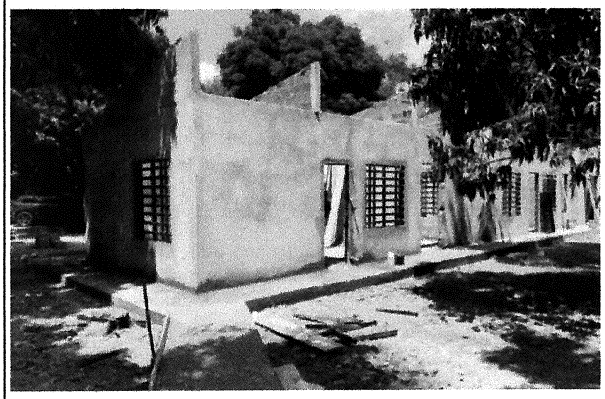

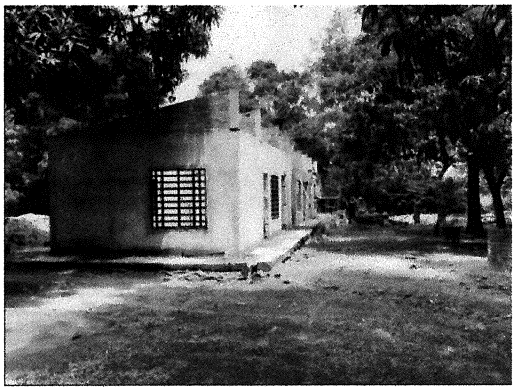3.3 Placa Base Concreto 0,10 2500 PSI

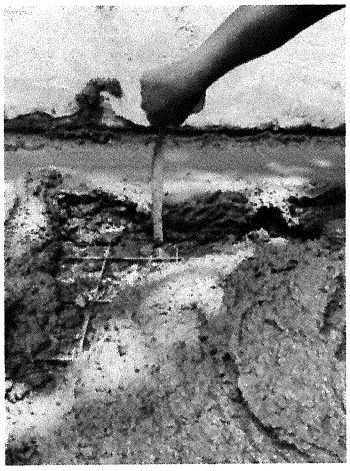




3.4 Refuerzo Malla Electro soldada


3.6 Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.12 m

MAMPOSTERIA

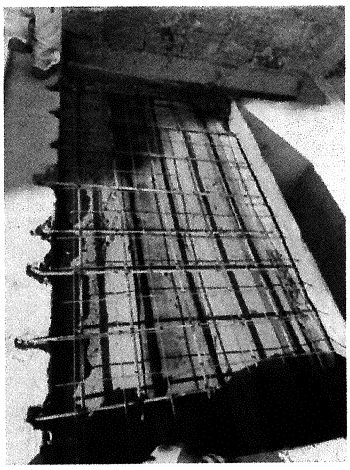4.1 Muro en Bloque Nº 5 E= 0.12 M




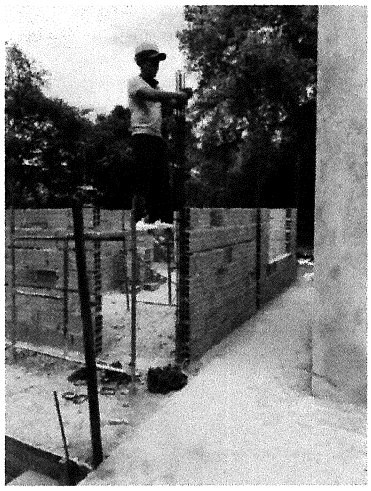

PAÑETE

5.1 Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm




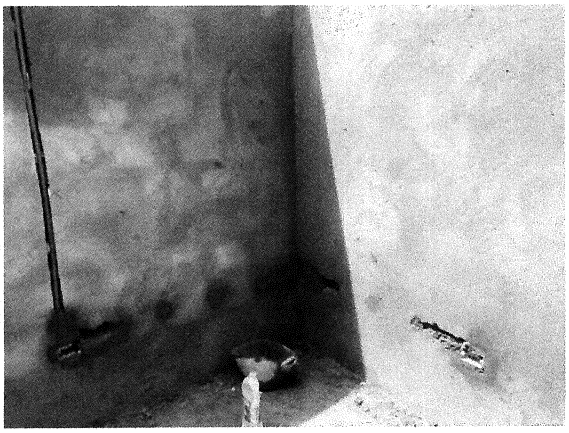

550

CUBIERTA

6.2 Suministro e instalación teja termo acústica trapezoidal a360

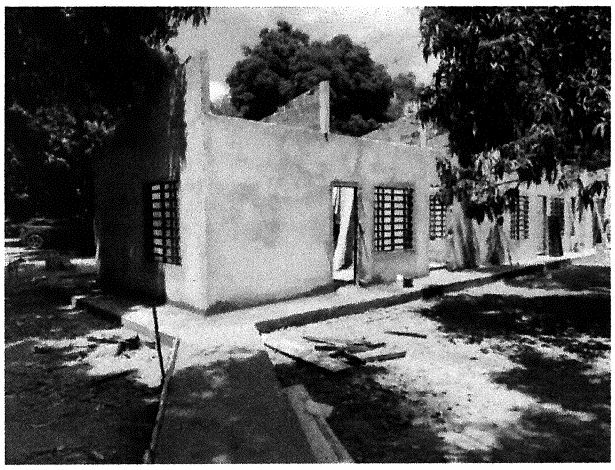PISOS BASES

7.1 Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e = 0.04

APARATOS SANITARIOS


8.1 Suministro e instalación de sanitarios tanque (incluye griferia)

8.2 Suministro e instalación de lavamanos pedestal (incluye grifería)



	

8.3 Suministro e instalación ducha sencilla



	

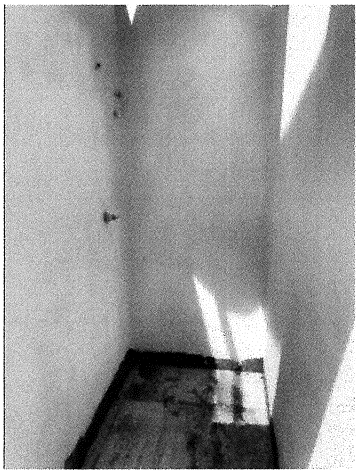CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA

9.2 Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo

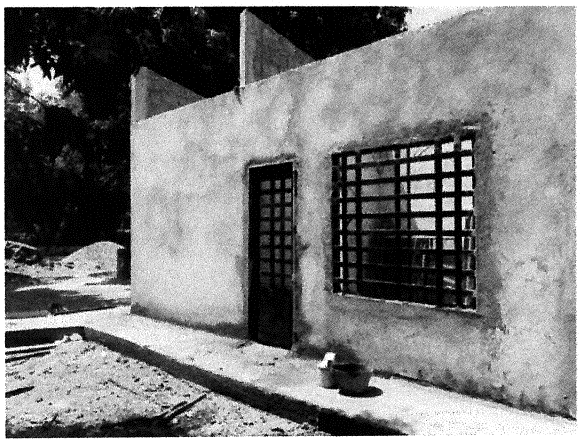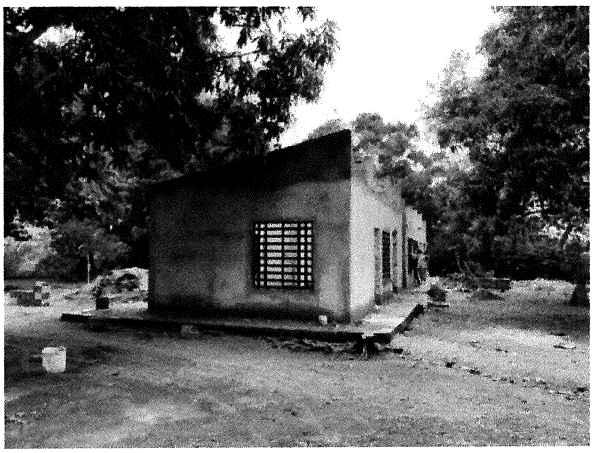
	

9.6 Cerradura entrada principal

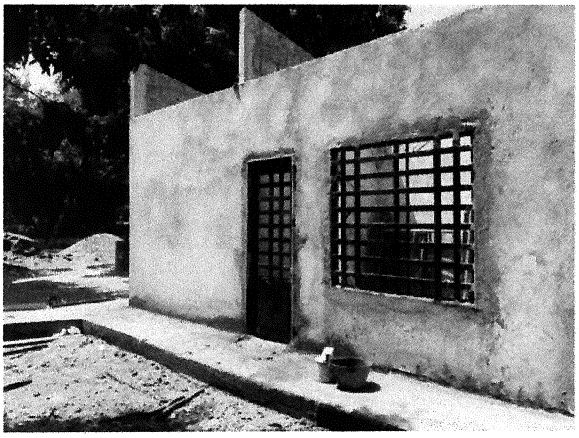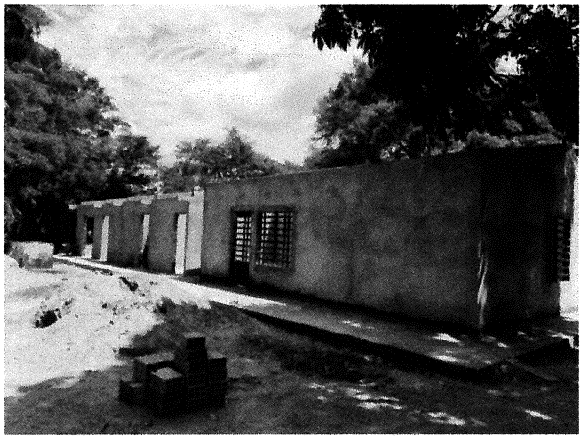ACABADOS

10.2 Anticorrosivo sobre lámina lineal

10.3 Esmalte sobre lámina lineal

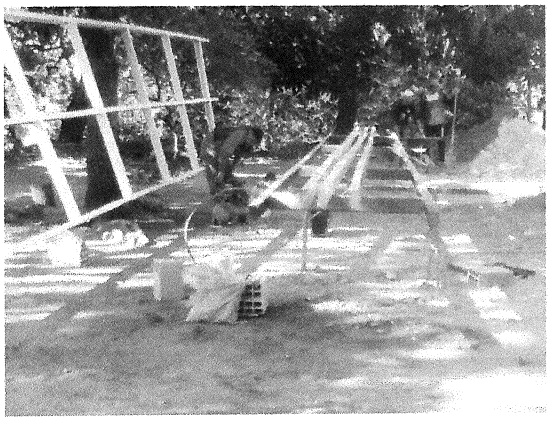
	


10.4 Esmalte sobre lámina llena


INSTALACIONES ELECTRICAS


11.2 Salida lámpara toma pvc completa



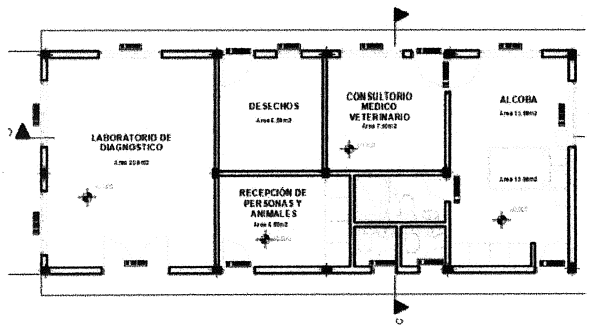

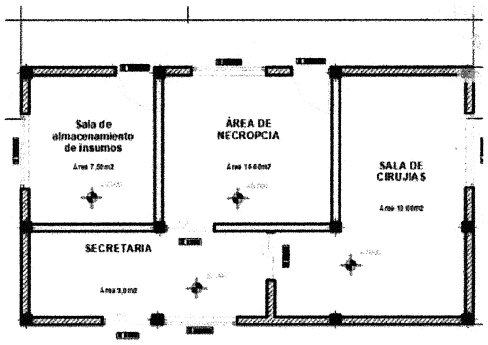
11.3 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

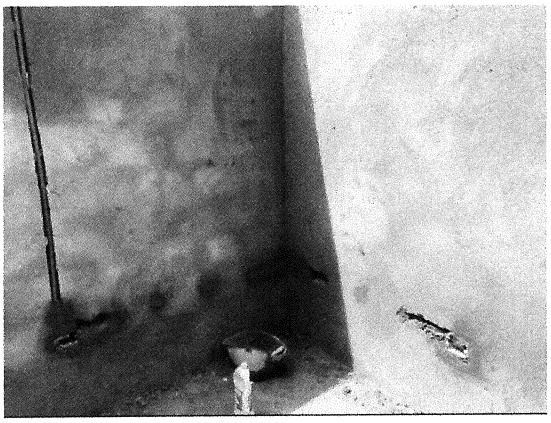


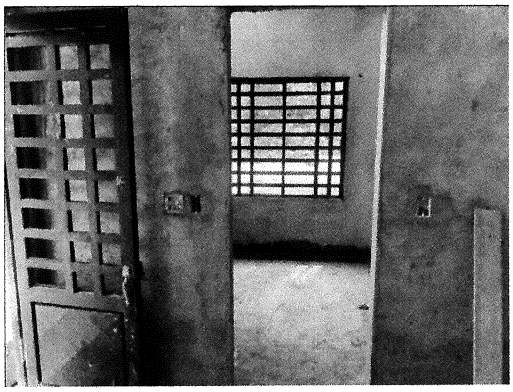


556


11.4 Acometida aérea 10 m. pvc

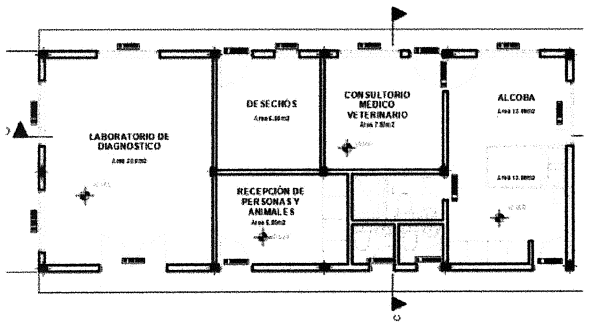

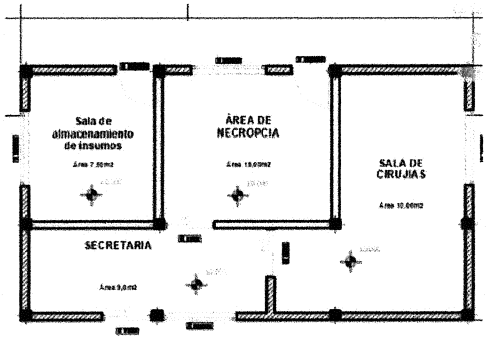

11.5 Tablero trifásico 18 circuitos con puerta y chapa, espacio para totalizador

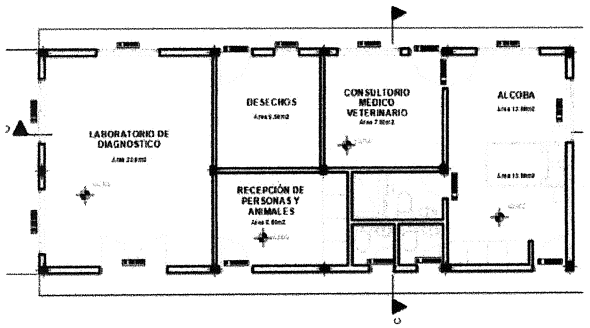


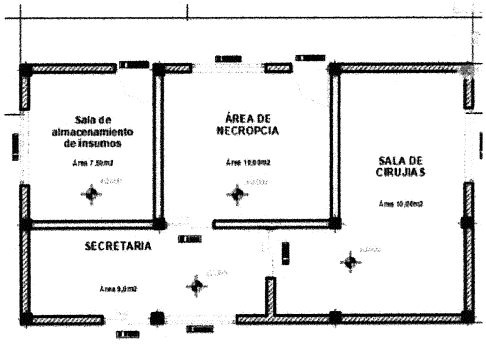

SS7


INSTALACIONES HIDROSANITARIA


12.1 Red suministro pvc 1/2"

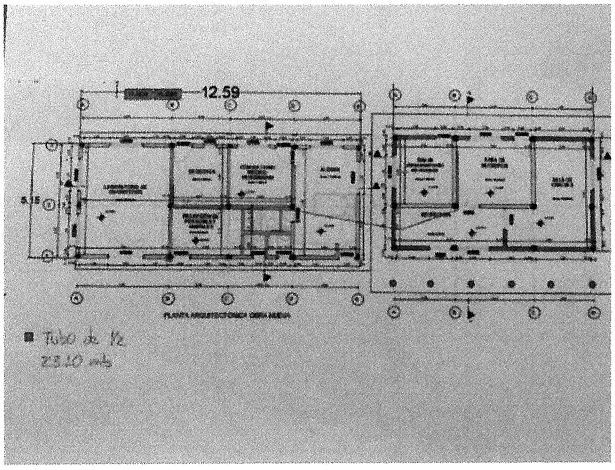





12.2 Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"

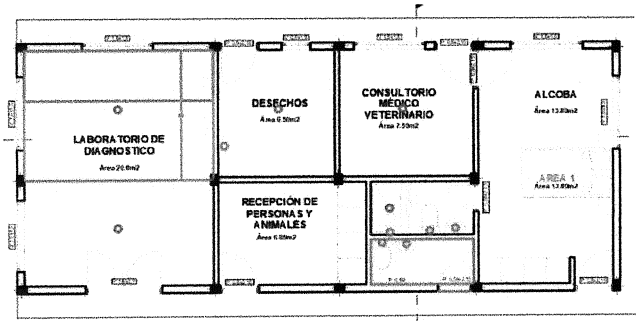

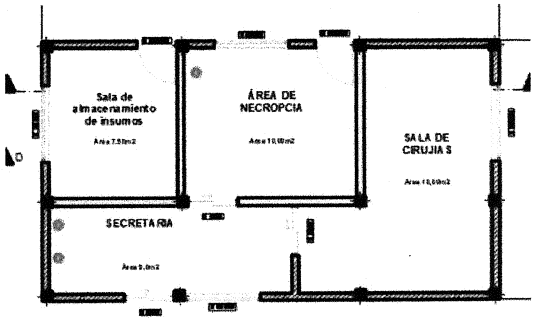



12.3 Red sanitaria pvc-s 4"

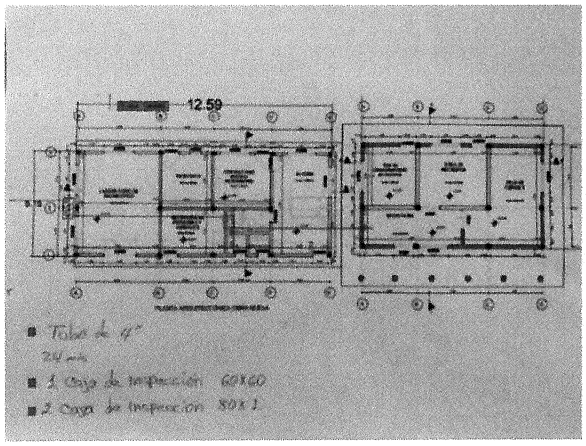

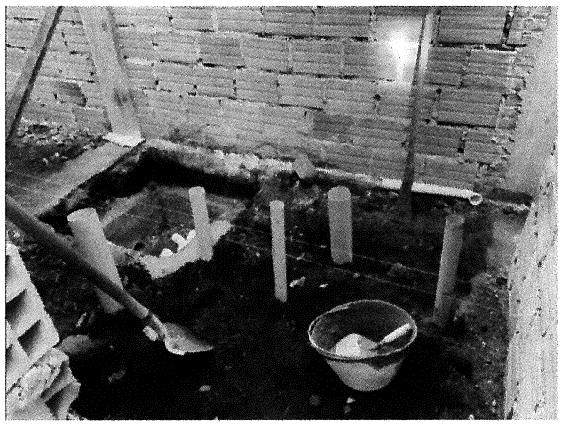


12.6 Suministro e instalación de llave de manguera

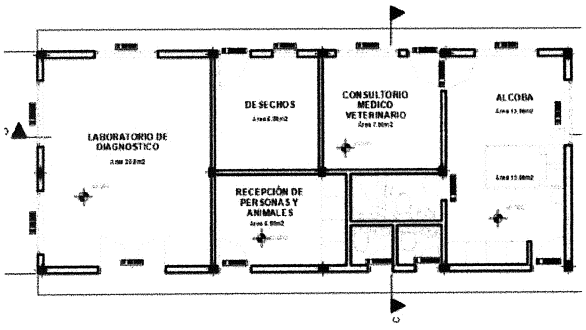


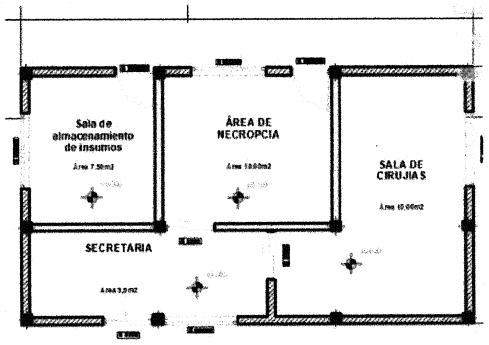

12.8 Salida sanitaria pvc-s/paral 3"

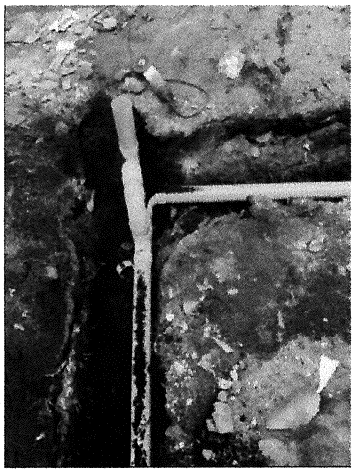
	

12.9 Salida sanitaria pvc-s/paral 4"

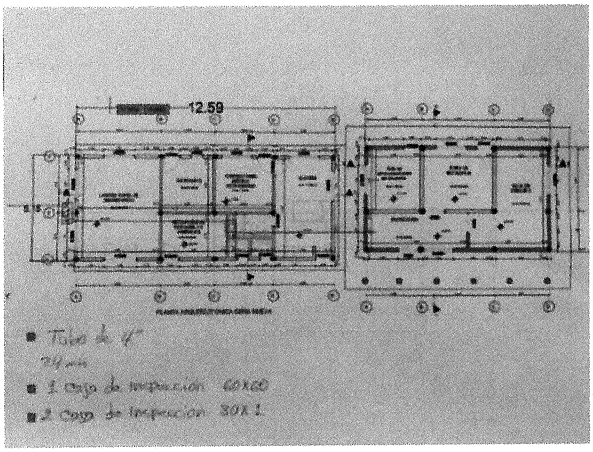
SGO


12.10 Salida sanitaria pvc-s/sifon 3"



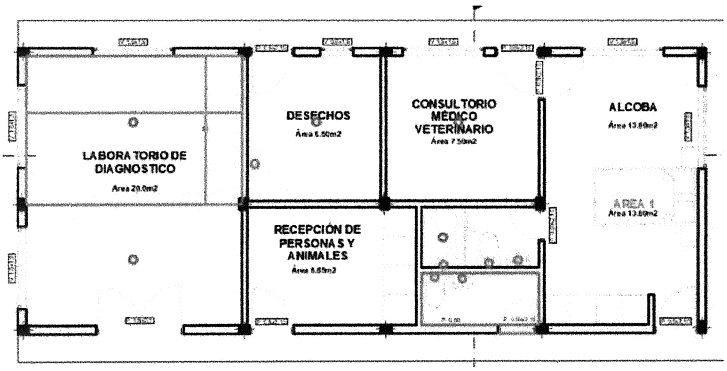



12.11 Suministro e instalacion de registro de 1/2"

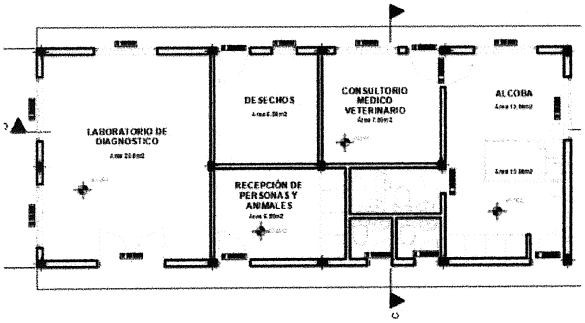

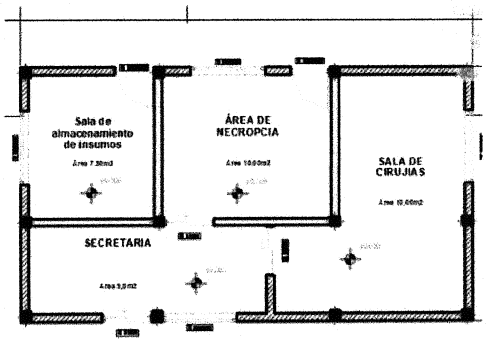

SGI

12.12 Tanque plástico elevado 500 lt (incluye accesorios e instalación)

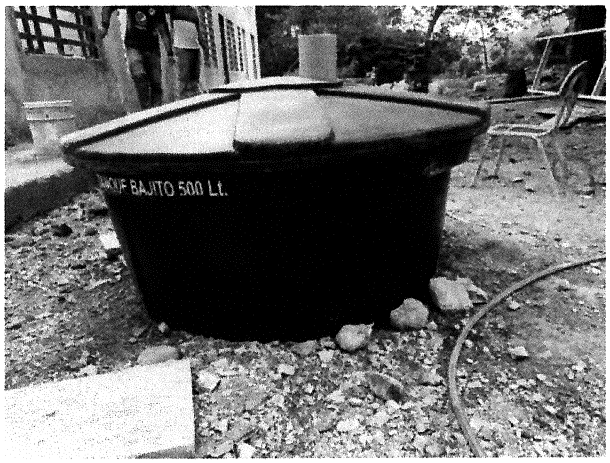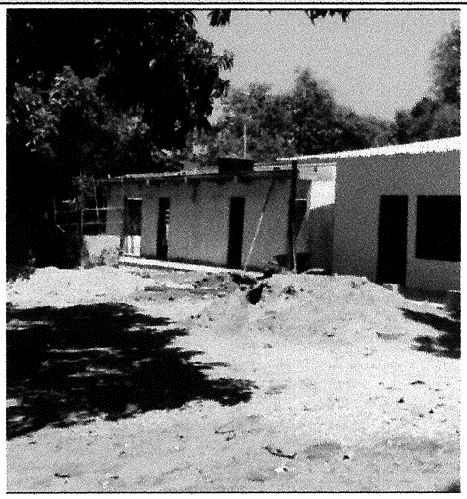JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
C.C. 1.019.003.817
Contratista
