1154

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**132**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 124		DIRECCION	BANCO POPULAR	
COORDENADAS	N	5°18'6.35"N	O	72°24'10.94"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar acometida eléctrica, coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	SI	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
1.18	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Acometida general a gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thhn/thwn	30
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1155

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	132

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	B501HAOF2673	POWEST TITAN
SWITCH	R3Z31E3000205	D-LINK
CAMARA		


¿ Informe y observaciones del Técnico ?

SUMINISTRAR ACOMETIDA DE ENERGIA

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS

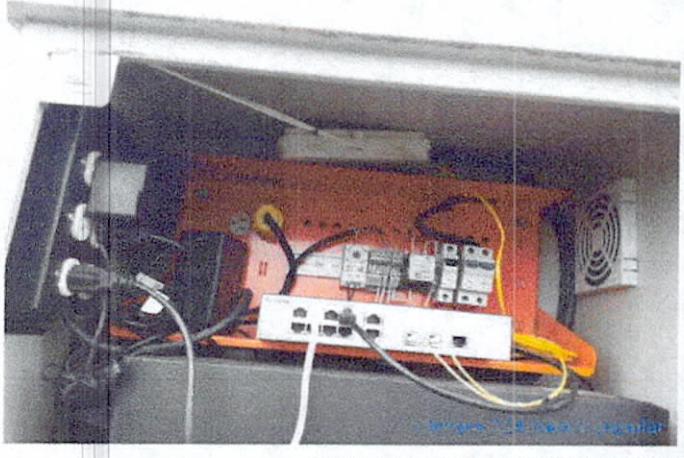



ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

350

1156

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO** 133
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
25	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 43		DIRECCION	Cra 21 Cll 7	
COORDENADAS	N	5°20'8.18"N	O	72°24'0.93"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterias, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	133

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	170920-13000059	POWEST TITAN
SWITCH	R3A0081355	FIRSTMILE
CAMARA		

¿ Informe y observaciones del Técnico ?


CONFIGURAR SOFTWARE CAMARA

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS



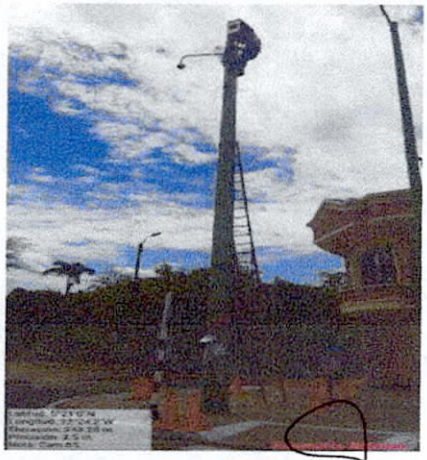

ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

1158

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**134**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE				

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 59		DIRECCION	Cll 9 Cra 24 Entrada Hospital Antiguio	
COORDENADAS	N	5°19'11.93"N	O	72°25'2.58"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterias, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1159

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	134

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	900011504230300	POWEST TITAN
SWITCH	REA0081319	FIRSTMILE
CAMARA	00:OF:7C:10:15:17	ACTI


¿ Informe y observaciones del Técnico ?

CAMBIAR ACRILICO DOMO, CONFIGURAR SOFTWARE CAMARA


DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS

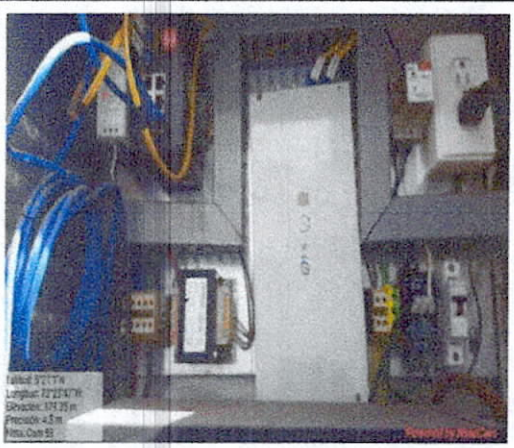



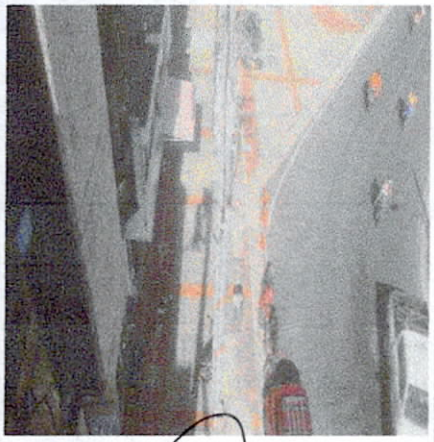

ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

359

1160

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**135**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 83		DIRECCION	TERMINAL SATELITE	
COORDENADAS	N	5°20'59.86"N	O	72°24'2.19"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch.

Realizar mantenimiento correctivo a cámara domo tipo PTZ, baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar acometida eléctrica, coraza americana y la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	SI	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
1.18	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Acometida general a gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thhn/thwn	30
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.1	Suministro e instalación A todo costo de Cámara Domo de red para Exterior tipo PTZ , Zoom optico 36x Resolución 4K, Soporte para resolución 16:9 Full HD (1080p), Lente de zoom óptico 36x incorporada (4,3~129 mm), Vision nocturna por IR, Protocolo	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1

1161

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	135

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	900011504230166	POWEST TITAN
SWITCH	R3A0081295	D-LINK
CAMARA		


¿ Informe y observaciones del Técnico ?

SUMINISTRAR ACOMETIDA DE ENERGIA

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS

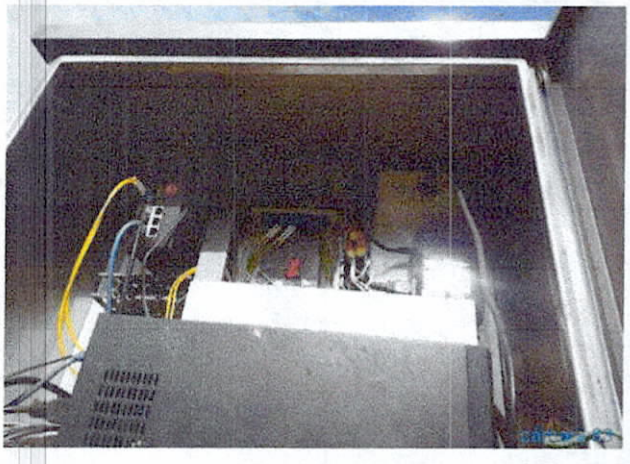



ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

356

1162

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**136**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE				

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 84		DIRECCION	CARRERA 20 CALLE 8	
COORDENADAS	N	5°21'2.94"N	O	72°23'50.23"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO			**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL		
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del Gabinete, UPS, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterias, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1163

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	136

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	900011504230314	POWEST TITAN
SWITCH	R3A00381354	FIRSTMILE

¿ Informe y observaciones del Técnico ?

CAMBIAR ACRILICO DOMO, CONFIGURAR SOFTWARE CAMARA

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS





ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

358

1164

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**137**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 35		DIRECCION	Subida la Virgen	
COORDENADAS	N	5°19'7.09"N	O	72°24'41.90"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a ventilador extractor del gabinete, baterias, ya que perdieron su tiempo de vida útil.
Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
1.24	Suministro e instalación a todo costo de ventilador extractor para gabinete metalico, consumo maximo 5 Watts	1
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1

1165

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	137

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE


EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	NO HAY	NO HAY
SWITCH	R3A00381354	FIRSTMILE
CAMARA		

¿ Informe y observaciones del Técnico ?


CAMBIAR ACRILICO DOMO, CONFIGURAR SOFTWARE CAMARA

DIAGRAMA

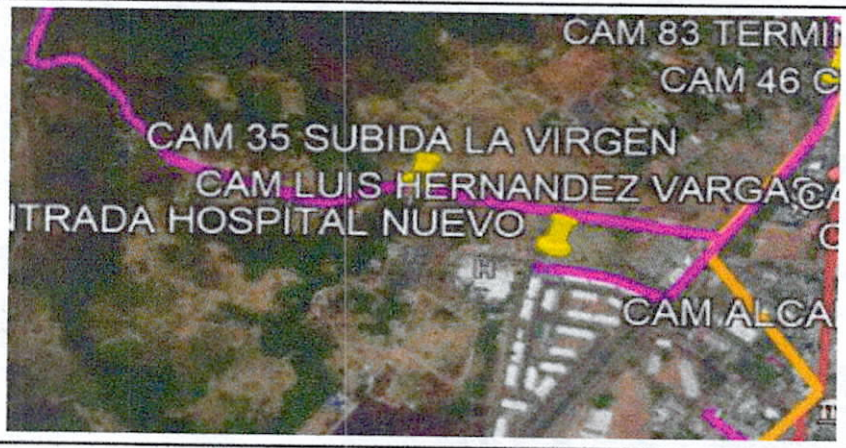

FOTOGRAFIAS



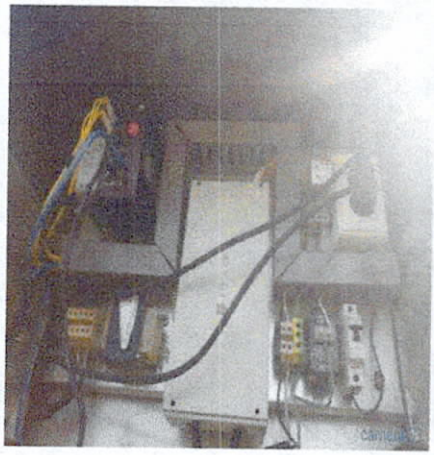



ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

360

1166

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**138**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
28	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 33		DIRECCION	Mirador la Virgen	
COORDENADAS	N	5°20'32.11"N	O	72°24'39.62"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterias, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1

1167

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	138

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS	6116900187	POWEST TITAN
SWITCH	00:1E:6E:01:D7:C9	FIRSTMILE

¿ Informe y observaciones del Técnico ?


CAMBIAR ACRILICO DOMO, CONFIGURAR SOFTWARE CAMARA


DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS



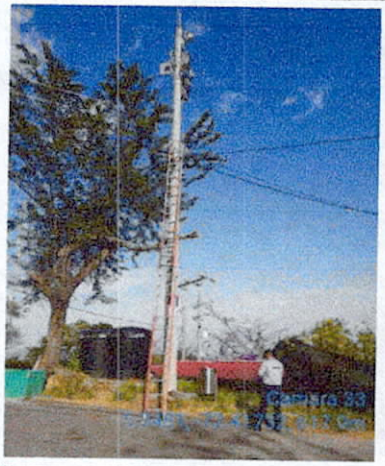

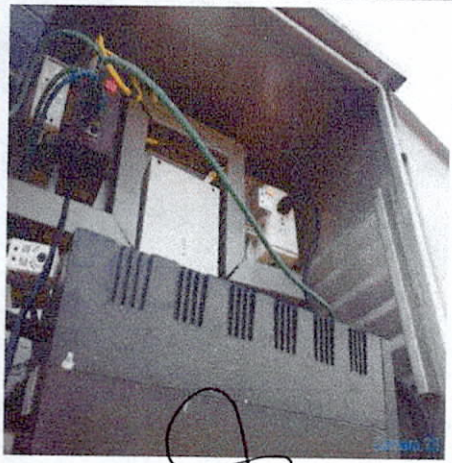

ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

362

1168

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**139**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	RURAL

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 62		DIRECCION	Tranv 23 Cll 38	
COORDENADAS	N	5°20'35.19"N	O	72°22'13.32"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch y cámara.
Realizar mantenimiento correctivo a fuente de cámara domo tipo PTZ, baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil.
Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.6	Suministro e instalación de fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios para camara PTZ	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1169

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	139

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS		POWEST TITAN
SWITCH		FIRSTMILE
camara PTZ	I96--A-XX-15F-00022	ACTI


¿ Informe y observaciones del Técnico ?


Se requiere el cambio del acrilico del domo ya que se ve un poco oscura la imagen al proyectarla

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS

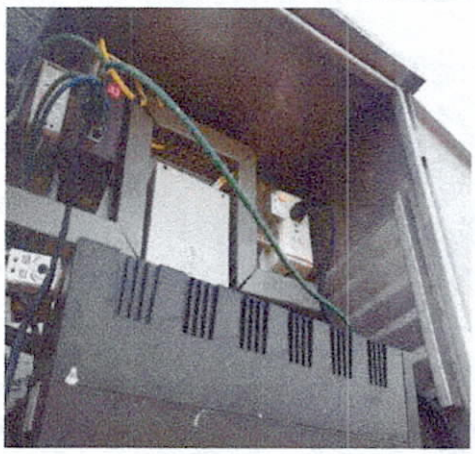

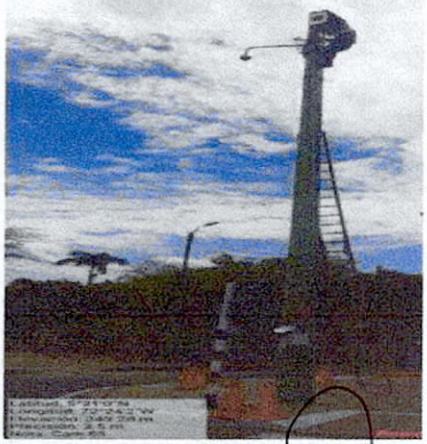

ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

264

1170

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**140**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	RURAL

FECHA DE REALIZACION		
26	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 3		DIRECCION	Cra 23 cll 37 CUSIANA	
COORDENADAS	N	5°19'49.00"N	O	72°22'41.62"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO	**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL				
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a switch, baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Se requiere suministrar e instalar acometida eléctrica, coraza americana, tramo de fibra óptica, empalmes y certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	SI	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	SI
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
1.18	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Acometida general a gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thhn/thwn	30
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
5.12	Suministro e instalación de Swicth de 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports, 2 Gig SFP, 124W PoE AC 110/220V)	1
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
4.35	Servicio técnico Empalme de Fibra óptica o derivacion o sangria de 4 hilos	2
4.7	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Fibra óptica Monomodo tipo Drop 4 Hilos Span 100	100
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1171

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	140

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE


EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
SWITCH		FIRSTMILE
UPS		POWEST TITAN
camara PTZ	I96–A-XX-10E-00023	ACTI

¿ Informe y observaciones del Técnico ?

Cambiar acrilico de la cámara domo PTZ.

DIAGRAMA

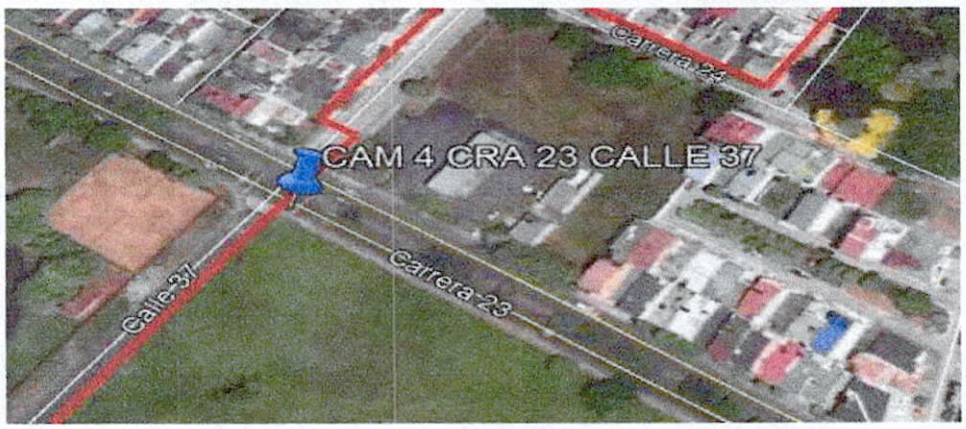

FOTOGRAFIAS





ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

1172

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**141**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE				

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	RURAL

FECHA DE REALIZACION		
27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 106		DIRECCION	EL ESTADIO FORPO	
COORDENADAS	N	5°19'16.57"N	O	72°23'50.41"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos, UPS, switch.

Realizar mantenimiento correctivo a gabinete tipo exterior, camara domo tipo PTZ, baterias, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
1.1	Suministro e instalación de Gabinete tipo exterior, ancho estándar de 19", X 70 cm de alto x 70 cm de profundidad, con soporte para poste, fabricado lamina de acero cold-rolled calibres 18, en pintura electroestática en polvo resistente al golpe, rayado y	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.1	Suministro e instalación A todo costo de Cámara Domo de red para Exterior tipo PTZ , Zoom optico 36x Resolución 4K, Soporte para resolución 16:9 Full HD (1080p), Lente de zoom óptico 36x incorporada (4,3~129 mm), Vision nocturna por IR, Protocolo	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1

1173

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	141

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE


EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS		POWEST TITAN
camara PTZ		ACTI
SWITCH		FIRSTMILE

¿ Informe y observaciones del Técnico ?


Cambiar acrilico de la cámara domo PTZ.

DIAGRAMA

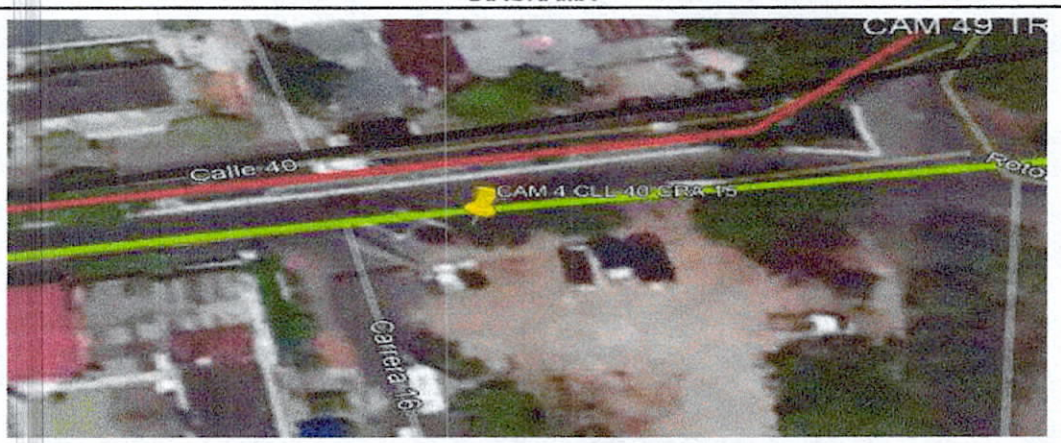

FOTOGRAFIAS



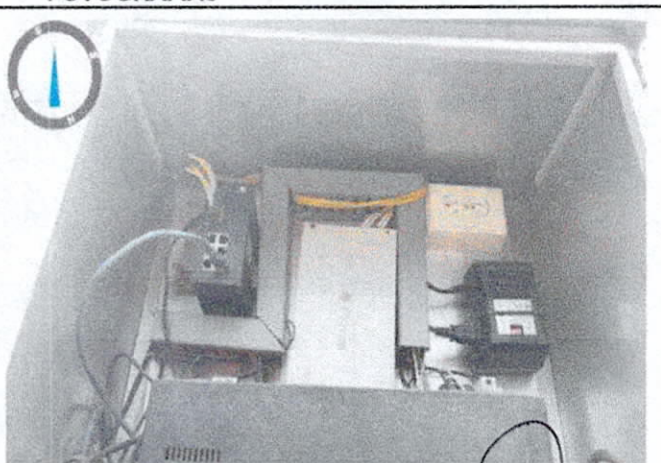

ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

28

1174

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**142**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE				

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	RURAL

FECHA DE REALIZACION		
27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 90		DIRECCION	CRA 13 A 434	
COORDENADAS	N	5°19'32.20"N	O	72°24'11.70"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.

Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar acometida electrica, coraza americana y la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	SI	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
1.18	Suministro e instalación a todo costo por metro lineal Acometida general a gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thhn/thwn	30
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio tecnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1175

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	142

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
UPS		POWEST TITAN
SWITCH		FIRSTMILE
camara PTZ	I96--A-XX-11E-00026	ACTI

¿ Informe y observaciones del Técnico ?


La chapa de la puerta esta en mal estado no asegura la puerta.

Cambiar acrilico de la cámara domo PTZ.

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS

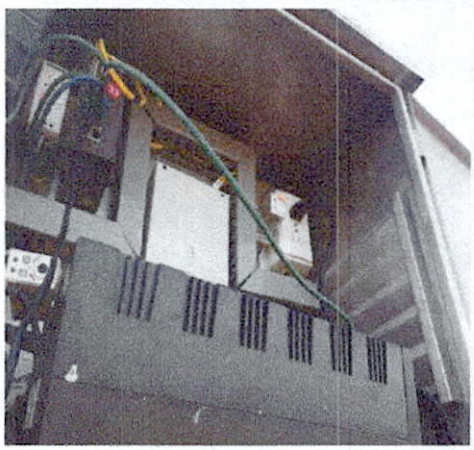



ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

370

1176

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO** 143
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	RURAL

FECHA DE REALIZACION		
27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 20		DIRECCION	Cra 11a entre 45-45a	
COORDENADAS	N	5°19'22.43"N	O	72°24'14.02"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

371

1177

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	143

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
camara PTZ	I96--A-XX-15E-00014	ACTI
UPS		POWEST TITAN
SWITCH		FIRSTMILE

¿ Informe y observaciones del Técnico ?

Cambiar acrilico de la cámara domo PTZ. Coraza metalica dañada.

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS





ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

372

1178

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**144**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE				

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 138		DIRECCION	CALLE 37 CRA 15A	
COORDENADAS	N	5°19'18.74"N	O	72°23'42.79"O	BARRIO: #N/D

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.

Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimiento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	9
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1179

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	144

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
swicth	R3A0081307	IDS-609 Shenzhen First Mile
camara PTZ	I96--A-XX-15E-00029	ACTI
UPS	900011504230307	EA901 II

¿ Informe y observaciones del Técnico ?	se requiere cambio de acrilico de camara domo PTZ

se debe realizar mantenimiento al gabiente y al swicth no se puede accerder por las contraseñas se recomienda hacer reset de fabrica, la imagen de la camara es borrosa

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS







ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

374

1180

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO** 145
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

		FECHA DE REALIZACION		
MUNICIPIO:	YOPAL			
ZONA:	URBANA	27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 56		DIRECCION	Tranv 15 Cll 30	
COORDENADAS	N	5°20'10.87"N	O	72°24'16.18"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch y cámara.

Realizar mantenimiento correctivo a fuente de cámara domo tipo PTZ, baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil.

Así mismo se requiere la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.6	Suministro e instalación de fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios para camara PTZ	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1181

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	145

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
swicth	R3A0081277	IDS-609 Shenzhen First Mile
camara PTZ	I96--A-XX-15E-00022	ACTI
UPS	900011504230305	EA901 II

¿ Informe y observaciones del Técnico ? la camara se encuentra operativa, con el patron de establecido esta un poco opaco la imagen


DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS





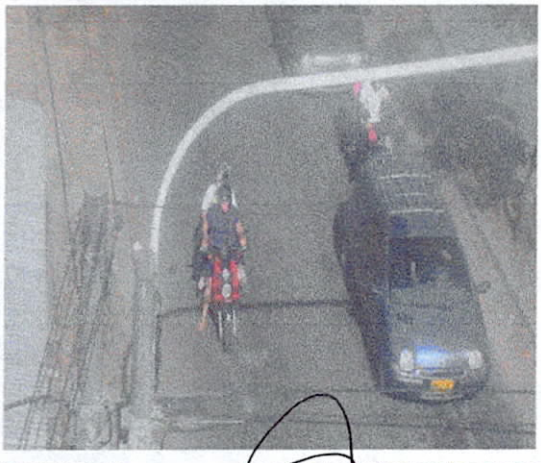

ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

376

1182

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**146**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 44		DIRECCION	Colegio Salvador Camacho Roldan	
COORDENADAS	N	5°20'44.64"N	O	72°24'6.04"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	NO	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.

Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1183

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	146

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
swicth	R3A0081312	IDS-609 Shenzhen First Mile
camara PTZ		ACTI
UPS	900011504230271	EA901 II

¿ Informe y observaciones del Técnico ?	

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS





ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

1134

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**147**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
27	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 85		DIRECCION	CARRERA 19 CALLE 7	
COORDENADAS	N	5°20'8.27"N	O	72°22'57.69"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	NO	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.

Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1185

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	147

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR


EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
swicth	R3A0081268	IDS-609 Shenzhen First Mile
camara PTZ		ACTI
UPS	900011504230263	EA901 II

¿ Informe y observaciones del Técnico ?	

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS

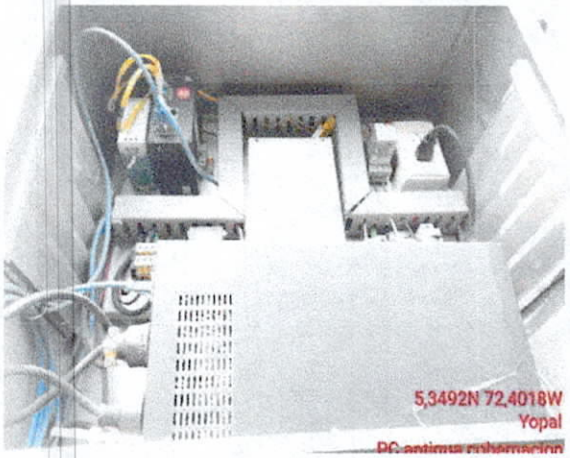



ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma	
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma	
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma	

380

1186

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**148**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE				

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
28	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 102		DIRECCION	CRA 7 CON CALLE 45 PROGRESO	
COORDENADAS	N	5°18'54.46"N	O	72°23'59.85"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	NO	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.

Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere la certificación de tramo de fibra.

Se debe realizar configuración de cámara y switch.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	SI	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1

1197

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232	DEL	28/12/2020	CONSECUTIVO INTERNO	148

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

EQUIPOS A INTERVENIR

EQUIPO	NUMERO DE SERIE	MARCA Y REFERENCIA
swicth		IDS-609 Shenzhen First Mile
camara PTZ		ACTI
UPS		EA901 II

¿ Informe y observaciones del Técnico ?

Se observan los equipos con suciedad el foco de la camara se encuentra un poco opaca.

DIAGRAMA



FOTOGRAFIAS





ELABORÓ CONTRATISTA	JAVIER CAMACHO	Firma
REVISÓ TECNICO DE REDES	JHONAR LEONARDO PEREZ	Firma
APROBÓ POR LA INTERVENTORIA	RONNY RENNE ROJAS REINA	Firma

382

1188

Consorcio CCTV Casanare 2020

CONTRATO No.	2232 DEL 28/12/2020	**CONSECUTIVO INTERNO**	**149**
OBJETO:	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		

FORMATO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MUNICIPIO:	YOPAL
ZONA:	URBANA

FECHA DE REALIZACION		
28	1	2021

LOCALIZACION O SITIO DE INTERVENCION

PUNTO	CAMARA 48		DIRECCION	Colegio Antonio Nariño	
COORDENADAS	N	5°20'17.76"N	O	72°23'21.93"O	BARRIO: 0

Estado de los equipos:	FUERA DE SERVICIO		**Entidad Responsable:**	POLICIA NAL			
¿Tipo de mantenimiento a realizar ?	SI	Preventivo	SI	Correctivo	NO	Garantía	
¿ Aplicar mantenimiento a:?	SI	Equipo	SI	Componentes	SI	Instalación	

PERSONAL QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO

SUPERVISOR	JAVIER CAMACHO	**CARGO:**	REPRESENTANTE LEGAL
TÉCNICO	JHONAR LEONARDO PEREZ	**CARGO:**	TÉCNICO DE REDES

RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

¿ Descripción del problema a resolver ?

Hacer mantenimiento preventivo a equipos del gabinete, UPS, switch, cámara y su fuente.
Realizar mantenimiento correctivo a baterías, ya que perdieron su tiempo de vida útil. Así mismo se requiere suministrar e instalar coraza americana y la certificación de tramo de fibra.
Se debe realizar configuración de cámara.

Tipo de servicio a realizar

Servicio Eléctrico	NO	Configuracion Swicth	NO	Reparación Técnica	SI
Cableado estructurado	NO	Mantenimiento UPS	SI	Empalme de Fibra	NO
Configuración de Camara	SI	Radioenlace	NO	Empalme ODF	NO

¿ Lista de Insumos que se requieren ?

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DEL CONTRATO A APLICAR	CANT
2.23	Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste 70x70, incluye, limpieza, reorganización, marcación, y mantenimento de Patch panel de y switch	1
7.18	Servicio técnico para Mantenimiento Preventivo de Cámara tipo PTZ Domo de red para Exterior	1
2.22	Suministro e instalación de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal	6
6.9	Suministro e instalación de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH Para Ups de 1 kva	3
7.22	Servicio técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios	1
4.39	Servicio técnico Certificación tramo de fibra óptica 4 hilos	1
6.11	Servicio tecnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA	1
