Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**10...**		**PROYECTO CACOM**	**57 días**	**vie 17/09/21**	**sáb 20/11/21**	
2	10...		FIRMA ACTA DE INICIO	56,19 días	vie 17/09/21	sáb 20/11/21	
3	**99%**		**HANGAR ABASTECIMIENTOS**	**15,75 días**	**vie 5/11/21**	**sáb 20/11/21**	
4	**99%**		**PRELIMINARES**	**4 días**	**vie 5/11/21**	**mar 9/11/21**	
10	**10...**		**ESTRUCTURA**	**5 días**	**mar 9/11/21**	**dom 14/11/21**	
14	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**5 días**	**dom 14/11/21**	**vie 19/11/21**	
15	10...		MANTENIMIENTO COLECTORES Y RED DE AGUAS LLUVIA	4 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21	13
16	10...		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	2 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21	15FC-1 día
17	10...		CANAL METALICA CALIBRE 14	2 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21	16FC-2 días
18	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**9,44 días**	**mar 9/11/21**	**jue 18/11/21**	
19	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO	5 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21	
20	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO, ENCHUFABLES,	5 días	mar 9/11/21	dom 14/11/21	19CF-3 días
21	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TRI-PROOF MSF050 50W DL, 5500LM,	5 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21	20FC-5 días
22	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, INCLUYE ETIQUETA	5 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21	21CC-1 día
23	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA REFLECTOR LED 200W, INCLUYE CABLEADO (PE,	5 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21	22CC
24	**10...**		**CIELORRASO**	**5 días**	**lun 15/11/21**	**sáb 20/11/21**	
25	10...		CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	5 días	lun 15/11/21	sáb 20/11/21	

M X J

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
26	**10...**		**PINTURA**	**4 días**	**lun 15/11/21**	**vie 19/11/21**	
27	10...		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	4 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	
28	**10...**		**CARPINTERIA METALICA**	**10 días**	**mié 10/11/21**	**sáb 20/11/21**	
29	10...		MANTENIMIENTO PUERTA EN LÁMINA METÁLICA, INCLUYE RASQUETEADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ALUMINIO LÍQUIDO TRES MANOS, CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, MARCO, CAMBIO DE BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD	10 días	mié 10/11/21	sáb 20/11/21	
30	**10...**		**CUBIERTAS**	**10 días**	**mié 10/11/21**	**sáb 20/11/21**	
31	10...		CAMBIO DE TEJA FIBROCEMENTO	5 días	mié 10/11/21	lun 15/11/21	
32	10...		TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO EXTERIOR O	4 días	sáb 13/11/21	mié 17/11/21	31FC-2 días
33	10...		FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚ	3 días	mié 17/11/21	sáb 20/11/21	32
34	10...		CINTA IMPERMEABLE TAPAGOTERAS SIKA MULTISEAL O SIM	3 días	mié 17/11/21	sáb 20/11/21	33CC
35	**10...**		**HANGAR CLAMSHELL**	**36,25 días**	**lun 11/10/21**	**vie 19/11/21**	
36	**10...**		**ESTRUCTURA**	**34,19 días**	**lun 11/10/21**	**mié 17/11/21**	
37	10...		MANTENIMIENTO SISTEMA ESTRUCTURAL CLAMSHELL	18,94 días	lun 11/10/21	mié 17/11/21	2CC+7 días
38	**10...**		**INSTALACIONES MECANICAS**	**18,5 días**	**jue 21/10/21**	**mié 10/11/21**	
39	10...		MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROMECANICO ELEVACION PUERTAS	5 días	jue 21/10/21	dom 7/11/21	
40	10...		MANTENIMIENTO SISTEMA MECANICO PUERTAS	5 días	vie 5/11/21	mié 10/11/21	39FC-2 días
41	**10...**		**OBRAS GENERALES**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**	

M X J

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
42	10...		LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR SISTEMA PANELES MEMBRANA PCV (CLAMSHELL)	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21				
43	**10...**		**HANGAR 2**	**14,5 días**	**vie 5/11/21**	**sáb 20/11/21**				
44	**10...**		**PRELIMINARES**	**3 días**	**vie 5/11/21**	**lun 8/11/21**				
45	10...		DESMONTE DE CIELORRASO	3 días	vie 5/11/21	lun 8/11/21				
46	10...		DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, TABLEROS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, SALIDA, CAJA, APARATO ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNI	2 días	sáb 6/11/21	lun 8/11/21	45CC+1 día			
47	**10...**		**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 8/11/21**	**jue 11/11/21**				
48	10...		DISEÑO Y ADECUACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	3 días	lun 8/11/21	jue 11/11/21	45			
49	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**7 días**	**jue 11/11/21**	**jue 18/11/21**				
50	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRE	7 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	48			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
51	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA REFLECTOR LED 50W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECT	7 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	50CC			
52	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TRI-PROOF MSF050 50W DL, 5500LM, 6500K, 100- 277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN EMT 3/4", ANCLAJES DE	7 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	51CC			
53	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, INCLUYE ETIQUETA AUTOADHESIVA, TUBERÍA EN EMT 3/4", ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SER	7 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	52CC			
54	**10...**		**CUBIERTAS**	**6,31 días**	**dom 14/11/21**	**sáb 20/11/21**				
55	10...		CINTA IMPERMEABLE TAPAGOTERAS SIKA MULTISEAL O SIMILAR	3 días	mar 16/11/21	jue 18/11/21	56CC+2 días			
56	10...		CAMBIO DE TEJA FIBROCEMENTO	5 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
57	10...		MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON TELA IMPERMEABILIZANTE DE POLIESTER E IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO BRONCOELÁSTICO O SIMILAR	5 días	lun 15/11/21	sáb 20/11/21	55FC-4 días
58	**10...**		**CIELORRASO**	**5 días**	**lun 15/11/21**	**sáb 20/11/21**	
59	10...		CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	5 días	lun 15/11/21	sáb 20/11/21	
60	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**	
61	10...		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	59FC-1 día
62	10...		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	61CC
63	**10...**		**POLVORINES**	**14,44 días**	**vie 5/11/21**	**sáb 20/11/21**	
64	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**8,44 días**	**vie 5/11/21**	**dom 14/11/21**	
65	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA REFLECTOR LED 50W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECT	7 días	vie 5/11/21	vie 12/11/21	2CC
66	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SENSOR DE MOVIEMIENTO 360D SOBREPONER , INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA G	7 días	sáb 6/11/21	sáb 13/11/21	65CC

M X J

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
67	10...		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRAL DE INCENDIO DE 4 LAZOS DE 2 SALIDAS, INCLUYE BATERÍA, MÓDULO EXPANSOR DIRECCIONABLE, CABLEADO, BORNERAS, RIEL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	7 días	sáb 6/11/21	sáb 13/11/21	66CC			
68	10...		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SIRENA CON ESTROBO, 12V/24V, 2 W, 8 CD, INCLUYE CABLEADO, CAJAS TIPO RAWELT, TUBERÍA IMC, UNIONES, CURVAS, TERMINALES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRE	7 días	dom 7/11/21	dom 14/11/21	67CC			
69	**10...**		**PINTURA**	**4 días**	**sáb 6/11/21**	**mié 10/11/21**				
70	10...		PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	4 días	sáb 6/11/21	mié 10/11/21				
71	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**2 días**	**mié 10/11/21**	**vie 12/11/21**				
72	10...		PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DIS	2 días	mié 10/11/21	vie 12/11/21	70			
73	**10...**		**CARPINTERIA METALICA**	**5 días**	**vie 12/11/21**	**mié 17/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
74	10...		MANTENIMIENTO MALLA ESLABONADA DE LUGAR, INCLUYE AJUSTE DE ANCLAJES, TENSIÓN, RASQUETEADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA, SOLDADURA Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS	5 días	vie 12/11/21	mié 17/11/21	68CC+5 días			
75	10...		MANTENIMIENTO PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE LUGAR, INCLUYE AJUSTE DE ANCLAJES, TENSIÓN, RASQUETEADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA, SOLDADURA, BISAGRAS, PASADORES Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS	5 días	vie 12/11/21	mié 17/11/21	74CC			
76	**10...**		**CUBIERTAS**	**7 días**	**sáb 6/11/21**	**sáb 13/11/21**				
77	10...		REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMP	7 días	sáb 6/11/21	sáb 13/11/21	70CC			
78	**10...**		**CERRADURAS**	**2 días**	**jue 18/11/21**	**sáb 20/11/21**				
79	10...		CERRADURA DE SEGURIDAD DE SIETE (7) PUNTOS SIN MANIJA. (CUBRIMIENTO EN PISO TECHO, BISAGRA Y LATERAL. 5 LLAVES CODIFICADAS, COPIADO RESTRINGIDO. ANTIGUANA, ANTIPALANCA, ANTITALADRO).	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	75CC+6 días			
80	**10...**		**ALOJAMIENTOS FLANDES**	**54 días**	**lun 20/09/21**	**sáb 20/11/21**				
81	**10...**		**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 20/09/21**	**sáb 25/09/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
82	10...		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	1 día	lun 20/09/21	mar 21/09/21	2CC			
83	10...		DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, TABLEROS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, SALIDA, CAJA, APARATO ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNI	1 día	lun 20/09/21	mar 21/09/21	82CC			
84	10...		DESMONTE DE ESPEJOS	1 día	mar 21/09/21	mié 22/09/21	82			
85	10...		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	2 días	mar 21/09/21	jue 23/09/21	84CC			
86	10...		DESMONTE DE CIELORRASO	2 días	mar 21/09/21	jue 23/09/21	85CC			
87	10...		REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	2 días	jue 23/09/21	sáb 25/09/21	86			
88	**10...**		**MAMPOSTERIA**	**16 días**	**mar 19/10/21**	**vie 5/11/21**				
89	10...		MESÓN EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO	15 días	mar 19/10/21	vie 5/11/21	84CC			
90	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**19,25 días**	**lun 4/10/21**	**mié 27/10/21**				
91	10...		CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	2 días	mar 19/10/21	jue 21/10/21	87			
92	10...		DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	2 días	vie 22/10/21	lun 25/10/21	91			
93	10...		DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	2 días	lun 4/10/21	mié 6/10/21	92CC			
94	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	3 días	lun 4/10/21	jue 7/10/21	93			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
95	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	3 días	lun 4/10/21	jue 7/10/21	94CC			
96	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	4 días	mié 6/10/21	lun 11/10/21	95			
97	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	4 días	vie 8/10/21	mié 13/10/21	96CC			
98	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	4 días	sáb 9/10/21	jue 14/10/21	97CC			
99	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6"	4 días	vie 8/10/21	mié 13/10/21	98CC			
100	10...		PUNTO SANITARIO Ø 2"	2 días	lun 11/10/21	mié 13/10/21	99			
101	10...		PUNTO SANITARIO Ø 3"	2 días	mar 12/10/21	jue 14/10/21	100CC			
102	10...		PUNTO SANITARIO Ø 4"	2 días	jue 14/10/21	sáb 16/10/21	101CC			
103	10...		SIFÓN Ø 3X2"	1 día	jue 14/10/21	jue 14/10/21	102			
104	10...		TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 3"	1 día	vie 15/10/21	sáb 16/10/21	103CC			
105	10...		CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	3 días	sáb 16/10/21	mié 20/10/21	104			
106	10...		TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	105CC+2 días			
107	**10...**		**INSALACION HIDRAULICA**	**3,75 días**	**vie 22/10/21**	**mié 27/10/21**				
108	10...		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	3 días	vie 22/10/21	mar 26/10/21	106			
109	10...		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	1 día	mar 26/10/21	mié 27/10/21	108			
110	10...		PRUEBA HIDRÁULICA	1 día	mar 26/10/21	mié 27/10/21	109CC			
111	10...		REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	1 día	mar 26/10/21	mié 27/10/21	110			
112	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**14,81 días**	**vie 22/10/21**	**dom 7/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
113	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAM	3 días	vie 22/10/21	dom 7/11/21	111			
114	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	3 días	vie 22/10/21	dom 7/11/21	113CC			
115	10...		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE INTERRUPTOR, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓG	3 días	vie 22/10/21	dom 7/11/21	114CC			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
116	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO, ENCHUFABLES, SEIS (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN	3 días	vie 22/10/21	dom 7/11/21	115CC			
117	**10...**		**PAÑETES**	**3 días**	**dom 7/11/21**	**mié 10/11/21**				
118	10...		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	3 días	dom 7/11/21	mié 10/11/21	116			
119	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**6 días**	**mié 10/11/21**	**mié 17/11/21**				
120	10...		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	2 días	mié 10/11/21	vie 12/11/21	118			
121	10...		ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA MARENGO, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO	4 días	vie 12/11/21	mié 17/11/21	120			
122	10...		ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.	4 días	vie 12/11/21	mié 17/11/21	121CC			
123	**10...**		**CIELORRASO**	**4 días**	**lun 15/11/21**	**vie 19/11/21**				
124	10...		CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	4 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	122FC-2 días			
125	**10...**		**PINTURA**	**4 días**	**lun 15/11/21**	**vie 19/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
126	10...		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	4 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21				
127	**10...**		**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**29,81 días**	**mar 19/10/21**	**sáb 20/11/21**				
128	10...		DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.	18 días	lun 25/10/21	sáb 20/11/21				
129	10...		DISPENSADOR DE PAPEL	18 días	mar 19/10/21	sáb 20/11/21	128CC			
130	10...		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE SOCODA	18 días	mar 19/10/21	sáb 20/11/21	129CC			
131	10...		PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 SOCODA.	18 días	lun 25/10/21	sáb 20/11/21	130CC			
132	**10...**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**4 días**	**mar 16/11/21**	**sáb 20/11/21**				
133	10...		ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	2 días	mar 16/11/21	jue 18/11/21				
134	10...		SANITARIO MANANTIAL BLANCO	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	133			
135	10...		LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	134CC			
136	10...		LLAVE TERMINAL PARA LAVAMANOS	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	135CC			
137	10...		VALVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	136CC			
138	10...		REGADERA CON BRAZO Y REGISTRO	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	137CC			
139	10...		BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	138CC			
140	**10...**		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**3 días**	**mié 17/11/21**	**sáb 20/11/21**				
141	10...		ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	3 días	mié 17/11/21	sáb 20/11/21	139FC-7 días			
142	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
143	10...		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21				
144	10...		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	143CC			
145	**10...**		**GIMNASIO**	**36,75 días**	**lun 11/10/21**	**sáb 20/11/21**				
146	**10...**		**PRELIMINARES**	**7,75 días**	**lun 11/10/21**	**mié 20/10/21**				
159	**10...**		**CIMENTACIÓN**	**7 días**	**lun 25/10/21**	**lun 1/11/21**				
160	10...		RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	2 días	lun 25/10/21	mié 27/10/21	158			
161	10...		VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	5 días	mar 26/10/21	lun 1/11/21	160			
162	**10...**		**ESTRUCTURA**	**7,06 días**	**lun 1/11/21**	**lun 8/11/21**				
163	10...		ACERO FIGURADO PARA REFUERZO HORIZONTAL DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE FY' 60,000 PSI, INCLUYE ANCLAJE EPOXICO A COLUMNAS	2 días	lun 1/11/21	mié 3/11/21	161			
164	10...		COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	2 días	mar 2/11/21	vie 5/11/21	163FC-1 día			
165	10...		MALLA ELECTRO SOLDADA	1 día	vie 5/11/21	sáb 6/11/21	164			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
166	10...		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	2 días	sáb 6/11/21	lun 8/11/21	165			
167	**10...**		**MAMPOSTERIA**	**9 días**	**lun 8/11/21**	**mié 17/11/21**				
168	10...		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	4 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	166			
169	10...		DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20	2 días	mié 10/11/21	vie 12/11/21	168FC-2 días			
170	10...		POYOS DUCHAS INCLUYE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE	1 día	vie 12/11/21	sáb 13/11/21	169			
171	10...		BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	1 día	sáb 13/11/21	dom 14/11/21	170			
172	10...		MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS.	3 días	dom 14/11/21	mié 17/11/21	171			
173	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**11 días**	**vie 5/11/21**	**mar 16/11/21**				
174	**10...**		**INSTALACIÓN SANITARIA**	**11 días**	**vie 5/11/21**	**mar 16/11/21**				
191	**10...**		**INSTALACION HIDRAULICA**	**5 días**	**vie 5/11/21**	**mié 10/11/21**				
197	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**9,75 días**	**mar 2/11/21**	**vie 12/11/21**				
204	**10...**		**PAÑETES**	**2 días**	**vie 5/11/21**	**dom 7/11/21**				
205	10...		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INC	2 días	vie 5/11/21	dom 7/11/21				
206	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**6 días**	**vie 5/11/21**	**jue 11/11/21**				
207	10...		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE	2 días	vie 5/11/21	dom 7/11/21				
208	10...		ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA MARENGO, INCLUYE W	3 días	dom 7/11/21	mié 10/11/21	207			
209	10...		ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN	3 días	dom 7/11/21	mié 10/11/21	208CC			
210	10...		PISO PORCELANATO 60 x 60 CMS REF. CONCRETO GRAFIT	3 días	dom 7/11/21	mié 10/11/21	209CC			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
211	10...		GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO 60 x 60 CMS REF. CO	3 días	lun 8/11/21	jue 11/11/21	210CC+1 día			
212	10...		PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,338X 0,338 MTS REF: M	3 días	dom 7/11/21	mié 10/11/21	211CC-1 día			
213	10...		BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCH	2 días	mar 9/11/21	jue 11/11/21	212CC+2 días			
214	**10...**		**CIELORRASO**	**5 días**	**mié 10/11/21**	**lun 15/11/21**				
215	10...		CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUE	5 días	mié 10/11/21	lun 15/11/21	213FC-1 día			
216	**10...**		**PINTURA**	**3 días**	**dom 14/11/21**	**mié 17/11/21**				
217	10...		ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FIL	2 días	dom 14/11/21	mar 16/11/21	215FC-1 día			
218	10...		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACION	1 día	mar 16/11/21	mié 17/11/21	217			
219	**10...**		**CARPINTERIA EN MADERA**	**12 días**	**dom 7/11/21**	**vie 19/11/21**				
220	10...		PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO C	12 días	dom 7/11/21	vie 19/11/21	218CC-9 días			
221	10...		SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN MELAMINIC	12 días	dom 7/11/21	vie 19/11/21	220CC			
222	**10...**		**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**10 días**	**dom 7/11/21**	**mié 17/11/21**				
223	10...		PP EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ESCUDO EN	10 días	dom 7/11/21	mié 17/11/21	221CC			
224	**10...**		**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				
225	10...		DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H=	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	223CC-10 días			
226	10...		DISPENSADOR DE PAPEL	7 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	225CC			
227	10...		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE SO	4 días	jue 11/11/21	lun 15/11/21	226CC			
228	10...		PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 SOCODA.	5 días	jue 11/11/21	mar 16/11/21	227CC			
229	10...		SECADOR DE MANOS ELECTRICO ACERO INOXIDABLE SOC	3 días	jue 11/11/21	dom 14/11/21	228CC			
230	10...		FALDON DE ACERO INOXIDABLE BAJO LAVAMANOS CORR	8 días	jue 11/11/21	vie 19/11/21	229CC			
231	**10...**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**2 días**	**jue 18/11/21**	**sáb 20/11/21**				
232	10...		ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
233	10...		VALVULA PARA ORINAL TRADICIONAL	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	232CC			
234	10...		BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISI	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	233CC			
235	10...		SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE D	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	234CC			
236	10...		DUCHA MONOCONTROL SIN SALIDA A BAÑERA ARIZONA	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	235CC			
237	10...		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	236CC			
238	10...		LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALT	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	237CC			
239	10...		GRIFERIA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO EMPOT	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	238CC			
240	**10...**		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				
242	**10...**		**CERRADURAS**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				
245	**10...**		**OBRAS GENERALES**	**7 días**	**sáb 13/11/21**	**sáb 20/11/21**				
247	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				
250	**10...**		**ANTIGUO COLEGIO**	**49,81 días**	**lun 20/09/21**	**mar 16/11/21**				
251	**10...**		**PRELIMINARES**	**6 días**	**lun 20/09/21**	**lun 27/09/21**				
255	**10...**		**MAMPOSTERIA**	**3 días**	**lun 27/09/21**	**jue 30/09/21**				
256	10...		BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	2 días	lun 27/09/21	mié 29/09/21	254			
257	10...		SIPS. MESÓN EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 60CM PIED	1 día	mié 29/09/21	jue 30/09/21	256			
258	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**12,5 días**	**jue 7/10/21**	**vie 22/10/21**				
259	**10...**		**INSTALACIÓN SANITARIA**	**9,5 días**	**jue 7/10/21**	**mar 19/10/21**				
260	10...		DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	3 días	lun 11/10/21	jue 14/10/21	257			
261	10...		DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	2 días	jue 7/10/21	sáb 9/10/21	260CC+1 día			
262	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø	3 días	sáb 9/10/21	mié 13/10/21	261			
263	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6	3 días	lun 11/10/21	jue 14/10/21	262CC			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
264	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	3 días	lun 11/10/21	jue 14/10/21	263			
265	10...		PUNTO SANITARIO Ø 3"	1 día	lun 18/10/21	mar 19/10/21	264CC+2 días			
266	10...		SIFÓN Ø 3X2"	1 día	lun 18/10/21	mar 19/10/21	265CC			
267	10...		TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 3"	1 día	lun 18/10/21	mar 19/10/21	266CC			
268	**10...**		**INSALACION HIDRAULICA**	**4,31 días**	**dom 17/10/21**	**vie 22/10/21**				
269	10...		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	2 días	dom 17/10/21	mar 19/10/21	267			
270	10...		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	1 día	mar 19/10/21	mié 20/10/21	269CC+1 día			
271	10...		PRUEBA HIDRÁULICA	1 día	jue 21/10/21	vie 22/10/21	270CC			
272	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**4,44 días**	**sáb 23/10/21**	**jue 28/10/21**				
273	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOM	4 días	dom 24/10/21	jue 28/10/21	271			
274	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INT	4 días	dom 24/10/21	jue 28/10/21	273CC			
275	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUM	4 días	sáb 23/10/21	jue 28/10/21	274CC			
276	**10...**		**PAÑETES**	**2 días**	**jue 21/10/21**	**sáb 23/10/21**				
277	10...		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INC	2 días	jue 21/10/21	sáb 23/10/21	275			
278	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**17,81 días**	**jue 21/10/21**	**mar 9/11/21**				
279	10...		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE	2 días	jue 21/10/21	vie 5/11/21	277			
280	10...		ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA MARENGO, INCLUYE W	4 días	vie 5/11/21	mar 9/11/21	279			
281	10...		CENEFA VERTICAL DE 0,554 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFE	2 días	dom 7/11/21	mar 9/11/21	280CC+2 días			
282	10...		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED AU	4 días	vie 5/11/21	mar 9/11/21	280CC			
283	**10...**		**CIELORRASO**	**2 días**	**mar 9/11/21**	**jue 11/11/21**				
284	10...		REPOSICIÓN LÁMINAS DE CIELORASO FIBROCEMENTO DE	2 días	mar 9/11/21	jue 11/11/21	282			
285	**10...**		**PINTURA**	**2 días**	**jue 11/11/21**	**dom 14/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
286	10...		ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FIL	2 días	jue 11/11/21	dom 14/11/21	284			
287	10...		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACION	1 día	vie 12/11/21	dom 14/11/21	286CC+1 día			
288	**10...**		**CARPINTERIA EN MADERA**	**23,81 días**	**jue 21/10/21**	**mar 16/11/21**				
289	10...		SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 M	12 días	jue 21/10/21	mar 16/11/21	287FC-10 días			
290	**10...**		**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**12,81 días**	**sáb 23/10/21**	**sáb 6/11/21**				
291	10...		LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0,57 X 0,51 MEZCLADOR PRA	8 días	sáb 23/10/21	sáb 6/11/21	289FC-15 días			
292	**10...**		**CUBIERTAS**	**4 días**	**vie 5/11/21**	**mar 9/11/21**				
293	10...		CAMBIO DE TEJA FIBROCEMENTO	4 días	vie 5/11/21	mar 9/11/21	291FC-4 días			
294	10...		CINTA IMPERMEABLE TAPAGOTERAS SIKA MULTISEAL O S	2 días	dom 7/11/21	mar 9/11/21	293CC+2 días			
295	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**vie 5/11/21**	**sáb 6/11/21**				
298	**10...**		**BARRACA 6**	**25,56 días**	**dom 24/10/21**	**sáb 20/11/21**				
299	**10...**		**PRELIMINARES**	**13,06 días**	**dom 24/10/21**	**dom 7/11/21**				
300	10...		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21				
301	10...		DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21	300			
302	10...		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE D	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21	300			
303	10...		DESMONTE DE CLOSED	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21	302CC			
304	10...		DESMONTE DE ESPEJOS	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21	303CC			
305	10...		DESMONTE DE CIELORRASO	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21	304			
306	10...		REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PARED	2 días	dom 24/10/21	mar 26/10/21	305CC			
307	10...		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY W	2 días	dom 24/10/21	mar 26/10/21	306			
308	10...		DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCE	1 día	dom 24/10/21	lun 25/10/21	307FC-1 día			
309	10...		DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDR	1 día	mié 27/10/21	vie 5/11/21	308			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
310	10...		DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO	2 días	vie 5/11/21	dom 7/11/21				
311	**10...**		**CIMENTACIÓN**	**2 días**	**dom 7/11/21**	**mar 9/11/21**				
312	10...		VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEA	2 días	dom 7/11/21	mar 9/11/21	310			
313	**10...**		**ESTRUCTURA**	**4 días**	**mar 9/11/21**	**sáb 13/11/21**				
314	10...		ACERO FIGURADO PARA REFUERZO HORIZONTAL DE MAM	2 días	mar 9/11/21	jue 11/11/21	312			
315	10...		ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY' 60,000 PSI	2 días	mar 9/11/21	jue 11/11/21	314CC			
316	10...		COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. IN	2 días	jue 11/11/21	sáb 13/11/21	315			
317	**10...**		**MAMPOSTERIA**	**6 días**	**sáb 13/11/21**	**vie 19/11/21**				
318	10...		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	4 días	sáb 13/11/21	mié 17/11/21	316			
319	10...		SIPS. MESÓN EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 60CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS) Y SALPICADERO DE 0.10CMS	2 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21	318			
320	10...		POYOS DUCHAS INCLUYE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE	2 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21	319CC			
321	10...		BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	2 días	mar 16/11/21	jue 18/11/21				
322	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				
323	**10...**		**INSTALACIÓN SANITARIA**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				
324	10...		CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	1 día	vie 5/11/21	sáb 6/11/21				
325	10...		DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	2 días	sáb 6/11/21	lun 8/11/21	324			
326	10...		DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	2 días	sáb 6/11/21	lun 8/11/21	325CC			
327	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	2 días	lun 8/11/21	mié 10/11/21	326			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
328	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	2 días	lun 8/11/21	mié 10/11/21	327CC			
329	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	2 días	mié 10/11/21	vie 12/11/21	328			
330	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	2 días	vie 12/11/21	dom 14/11/21	329			
331	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	2 días	dom 14/11/21	mar 16/11/21	330			
332	10...		PUNTO SANITARIO Ø 2"	1 día	lun 15/11/21	mar 16/11/21	331CC+1 día			
333	10...		PUNTO SANITARIO Ø 3"	1 día	lun 15/11/21	mar 16/11/21	332CC			
334	10...		PUNTO SANITARIO Ø 4"	1 día	lun 15/11/21	mar 16/11/21	333CC			
335	10...		SIFÓN Ø 3X2"	1 día	lun 15/11/21	mar 16/11/21	334CC			
336	10...		CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	3 días	mar 16/11/21	vie 19/11/21	335			
337	10...		TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	1 día	jue 18/11/21	vie 19/11/21	336CC+2 días			
338	**10...**		**INSALACION HIDRAULICA**	**3 días**	**vie 5/11/21**	**lun 8/11/21**				
339	10...		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	3 días	vie 5/11/21	lun 8/11/21				
340	10...		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	1 día	dom 7/11/21	lun 8/11/21	339CC+2 días			
341	10...		PRUEBA HIDRÁULICA	1 día	dom 7/11/21	lun 8/11/21	340CC			
342	10...		REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	1 día	dom 7/11/21	lun 8/11/21	341CC			
343	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**4 días**	**lun 8/11/21**	**vie 12/11/21**				
349	**10...**		**PAÑETES**	**6 días**	**vie 5/11/21**	**jue 11/11/21**				
350	10...		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	6 días	vie 5/11/21	jue 11/11/21				
351	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**6 días**	**dom 7/11/21**	**sáb 13/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
352	10...		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	2 días	dom 7/11/21	mar 9/11/21	350FC-4 días			
353	10...		ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA MARENGO, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO	4 días	mar 9/11/21	sáb 13/11/21	352			
354	10...		ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.	4 días	mar 9/11/21	sáb 13/11/21	353CC			
355	10...		PISO PORCELANATO 60 x 60 CMS REF. CONCRETO GRAFITO RÚSTICO HOLZTEK O SIMILAR	4 días	mar 9/11/21	sáb 13/11/21	354CC			
356	10...		GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO 60 x 60 CMS REF. CONCRETO GRAFITO RÚSTICO HOLZTEK O SIMILAR	2 días	jue 11/11/21	sáb 13/11/21	355CC+2 días			
357	10...		BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL	2 días	jue 11/11/21	sáb 13/11/21	356CC			
358	**10...**		**CIELORRASO**	**2 días**	**sáb 13/11/21**	**lun 15/11/21**				
360	**10...**		**PINTURA**	**2 días**	**lun 15/11/21**	**mié 17/11/21**				
363	**10...**		**CARPINTERIA EN MADERA**	**13 días**	**vie 5/11/21**	**jue 18/11/21**				
364	10...		PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR CENIZA, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL	13 días	vie 5/11/21	jue 18/11/21	362CC-14 días			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
365	10...		SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN MELAMINICO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	13 días	vie 5/11/21	jue 18/11/21	364CC			
366	10...		SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS Y/O COCINA, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	13 días	vie 5/11/21	jue 18/11/21	365CC			
367	**10...**		**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**7 días**	**jue 11/11/21**	**jue 18/11/21**				
368	10...		V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SILVER SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y/O SEGÚN DISEÑO, VIDRIO EN FACHADA DE COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN Y TRASPARENTE DE 5 MM EN INTERIORES, (INCLUYE MARCO Y ANGEO GRIS FIBRA DE VIDRIO COLMALLAS)	7 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	366FC-7 días			
369	**10...**		**CUBIERTAS**	**5 días**	**dom 14/11/21**	**vie 19/11/21**				
370	10...		CAMBIO DE TEJA FIBROCEMENTO	4 días	dom 14/11/21	jue 18/11/21	368FC-4 días			
371	10...		REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMP	3 días	mar 16/11/21	vie 19/11/21	370FC-2 días			
372	**10...**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**2 días**	**jue 18/11/21**	**sáb 20/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
373	10...		LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21				
374	10...		SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	373CC			
375	10...		KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	374CC+1 día			
376	10...		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	375CC			
377	10...		GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL TISZA BAJA O SIMILAR	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	376CC			
378	10...		LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	377CC			
379	**10...**		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**2 días**	**mié 17/11/21**	**vie 19/11/21**				
380	10...		ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	2 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21				
381	10...		SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2 días	mié 17/11/21	vie 19/11/21	380CC			
382	**10...**		**CERRADURAS**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				
383	10...		CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	381FC-1 día			
384	10...		TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	383CC			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
385	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**	
388	**10...**		**EFHAA**	**37 días**	**lun 4/10/21**	**dom 14/11/21**	
389	**10...**		**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 4/10/21**	**sáb 9/10/21**	
396	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**6 días**	**sáb 9/10/21**	**sáb 16/10/21**	
403	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**3 días**	**sáb 16/10/21**	**mié 20/10/21**	
407	**10...**		**PAÑETES**	**14,81 días**	**mié 20/10/21**	**sáb 6/11/21**	
409	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**5 días**	**sáb 6/11/21**	**jue 11/11/21**	
410	10...		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE	2 días	sáb 6/11/21	lun 8/11/21	408
411	10...		ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA MARENGO, INCLUYE W	3 días	lun 8/11/21	jue 11/11/21	410
412	10...		ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN	3 días	lun 8/11/21	jue 11/11/21	411CC
413	**10...**		**CIELORRASO**	**2 días**	**jue 11/11/21**	**sáb 13/11/21**	
415	**10...**		**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**18,56 días**	**lun 25/10/21**	**sáb 13/11/21**	
416	10...		DISPENSADOR DE PAPEL	15 días	lun 25/10/21	sáb 13/11/21	414FC-15 días
417	10...		DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE SO	5 días	vie 5/11/21	jue 11/11/21	416CC
418	10...		SECADOR DE MANOS ELECTRICO ACERO INOXIDABLE SOC	6 días	jue 4/11/21	jue 11/11/21	417CC
419	10...		FALDON DE ACERO INOXIDABLE BAJO LAVAMANOS CORR	4 días	sáb 6/11/21	jue 11/11/21	418CC
420	**10...**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**2 días**	**mar 9/11/21**	**jue 11/11/21**	
421	10...		BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISI	1 día	mar 9/11/21	mié 10/11/21	419FC-2 días
422	10...		SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE D	1 día	mié 10/11/21	jue 11/11/21	421
423	10...		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	1 día	mié 10/11/21	jue 11/11/21	422CC
424	10...		LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALT	1 día	mié 10/11/21	jue 11/11/21	423CC
425	10...		GRIFERIA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO EMPOT	1 día	mié 10/11/21	jue 11/11/21	424CC

M X J

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
426	**10...**		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**7 días**	**vie 5/11/21**	**vie 12/11/21**				
428	**10...**		**CERRADURAS**	**1 día**	**vie 12/11/21**	**sáb 13/11/21**				
430	**10...**		**OBRAS GENERALES**	**5 días**	**lun 8/11/21**	**sáb 13/11/21**				
432	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**sáb 13/11/21**	**dom 14/11/21**				
435	**10...**		**CASAS FISCALES**	**54 días**	**lun 20/09/21**	**sáb 20/11/21**				
436	**10...**		**PRELIMINARES**	**6 días**	**lun 20/09/21**	**lun 27/09/21**				
448	**10...**		**MAMPOSTERIA**	**5 días**	**sáb 25/09/21**	**vie 1/10/21**				
452	**10...**		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**17 días**	**vie 1/10/21**	**vie 22/10/21**				
453	**10...**		**INSTALACIÓN SANITARIA**	**13 días**	**vie 1/10/21**	**lun 18/10/21**				
454	10...		CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	1 día	vie 1/10/21	sáb 2/10/21	451			
455	10...		DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	3 días	sáb 2/10/21	mié 6/10/21	454			
456	10...		DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	3 días	sáb 2/10/21	mié 6/10/21	455CC			
457	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø	2 días	mié 6/10/21	vie 8/10/21	456			
458	10...		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6	2 días	mié 6/10/21	vie 8/10/21	457CC			
459	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	2 días	vie 8/10/21	mar 12/10/21	458			
460	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	2 días	vie 8/10/21	mar 12/10/21	459CC			
461	10...		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	2 días	vie 8/10/21	mar 12/10/21	460CC			
462	10...		PUNTO SANITARIO Ø 2"	1 día	lun 11/10/21	mar 12/10/21	461CC+1 día			
463	10...		PUNTO SANITARIO Ø 3"	1 día	lun 11/10/21	mar 12/10/21	462CC			
464	10...		PUNTO SANITARIO Ø 4"	1 día	lun 11/10/21	mar 12/10/21	463CC			
465	10...		SIFÓN Ø 3X2"	1 día	lun 11/10/21	mar 12/10/21	464CC			
466	10...		CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	3 días	mar 12/10/21	vie 15/10/21	465			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
467	10...		CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	2 días	vie 15/10/21	lun 18/10/21	466			
468	**10...**		**INSALACION HIDRAULICA**	**4 días**	**lun 18/10/21**	**vie 22/10/21**				
469	10...		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	2 días	lun 18/10/21	mié 20/10/21	467			
470	10...		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	469			
471	10...		PRUEBA HIDRÁULICA	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	470CC			
472	10...		REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	471CC			
473	10...		CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" .	1 día	jue 21/10/21	vie 22/10/21	472			
474	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**14,81 días**	**vie 22/10/21**	**dom 7/11/21**				
478	**10...**		**CIELORRASO**	**6 días**	**mar 26/10/21**	**lun 1/11/21**				
479	10...		CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUE	3 días	dom 7/11/21	mié 10/11/21	477			
480	**10...**		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**7 días**	**mié 10/11/21**	**jue 18/11/21**				
481	10...		ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE	1 día	mié 10/11/21	jue 11/11/21	479			
482	10...		ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA MARENGO, INCLUYE W	6 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	481			
483	10...		ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN	6 días	jue 11/11/21	jue 18/11/21	482CC			
484	10...		PISO PORCELANATO 60 x 60 CMS REF. CONCRETO GRAFIT	4 días	jue 11/11/21	mar 16/11/21	483CC			
485	10...		CENEFA VERTICAL DE 0,554 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFE	2 días	dom 14/11/21	mar 16/11/21	484CC+2 días			
486	10...		PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 0,45X 0,45 MTS REF: PIEI	4 días	jue 11/11/21	mar 16/11/21	484CC			
487	10...		GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO 60 x 60 CMS REF. CO	2 días	dom 14/11/21	mar 16/11/21	486CC+2 días			
488	10...		GUARDAESCOBA EN CERAMICA REF: PIEDRA CID DESERST	2 días	dom 14/11/21	mar 16/11/21	487CC			
489	10...		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED AU	5 días	jue 11/11/21	mié 17/11/21	486CC			
490	10...		BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCH	2 días	dom 14/11/21	mar 16/11/21	489CC+2 días			
491	**10...**		**CARPINTERIA EN MADERA**	**13,44 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
492	10...		PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO C	13 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	490FC-10 días			
493	10...		SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS EN MELAMINICO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.	10 días	mar 9/11/21	vie 19/11/21	492CC			
494	10...		SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS Y/O COCINA, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	10 días	mar 9/11/21	vie 19/11/21	493CC			
495	**10...**		**CARPINTERIA METALICA**	**26,81 días**	**lun 18/10/21**	**mar 16/11/21**				
496	10...		PUERTA DE BATIENTE DE 1,00X1,80H MATLICA SEGÚN DISEÑO CON BISAGRA TIPO PESADO INCLIUYE CHAPA YALE DE DOBLE PASADOR PORTACANDADOS Y PASADOR SIMILAR A CERRAMIENTO	15 días	lun 18/10/21	mar 16/11/21	494FC-15 días			
497	**10...**		**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**5 días**	**mié 10/11/21**	**mar 16/11/21**				
498	10...		V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SILVER SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y/O SEGÚN DISEÑO, VIDRIO EN FACHADA DE COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN Y TRASPARENTE DE 5 MM EN INTERIORES, (INCLUYE MARCO Y ANGEO GRIS FIBRA DE VIDRIO COLMALLAS)	5 días	mié 10/11/21	mar 16/11/21	496FC-5 días			
499	**10...**		**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**20,56 días**	**jue 28/10/21**	**jue 18/11/21**				
500	10...		LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0,57 X 0,51 MEZCLADOR PRACTICO	5 días	jue 28/10/21	jue 18/11/21	498FC-15 días			

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
501	**10...**		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**2 días**	**jue 18/11/21**	**sáb 20/11/21**				
502	10...		LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21				
503	10...		SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	502CC			
504	10...		KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	503CC			
505	10...		DUCHA MONOCONTROL SIN SALIDA A BAÑERA ARIZONA	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	504CC			
506	10...		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	505CC			
507	10...		GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL TISZA BAJA O SIMILAR	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	506CC			
508	**10...**		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**5 días**	**lun 15/11/21**	**sáb 20/11/21**				
511	**10...**		**CERRADURAS**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				
512	10...		CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21				
513	10...		TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	512CC			
514	**10...**		**ASEO GENERAL**	**1 día**	**vie 19/11/21**	**sáb 20/11/21**				
515	10...		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21				
516	10...		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	1 día	vie 19/11/21	sáb 20/11/21	515CC			
517	**10...**		**RED ELECTRICA**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				
518	**10...**		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
519	10...		Mantenimiento de sistema de iluminación LED en el CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES, compuesto por dos lámparas, dos paneles solares y batería, incluye limpieza, revisión y cambio de baterías (incluye suministro), ajuste de conexiones, li	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	2CC+15 días			
520	10...		Mantenimiento sistema de paneles solares compuesto por 12 baterías, incluye cambio de baterías, ajuste de conexiones, limpieza de contactos y cambio de elementos menores en mal estado.	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	519CC			
521	**10...**		**VOZ Y DATOS**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				
522	**10...**		**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**	**14 días**	**vie 5/11/21**	**vie 19/11/21**				
523	10...		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTOS DE VOZ/DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	2CC+25 días			


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



Id	% compl	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M	X	J
524	10...		PUNTOS DE DATOS SENCILLOS PARA LA CONEXIÓN DE ACCESS POINTS DEBEN SER CATEGORÍA 6A, CONTAR CON TOMAS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA, INCLUIR CANALETA METÁLICA, TROQUELES, FACEPLATE, PATCH PANEL, PATCH CORDS DE 1,5 METROS PARA SU CONEXIÓN EN EL CENTRO DE CABL	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	523CC			
525	10...		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PUNTOS ELÉCTRICOS NORMAL/REGULADO PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS DE DATOS INSTALADOS. INCLUYE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE NO. 12, TOMAS ELÉCTRICAS NORMAL Y REGULADA, AUTODESFORRE PLÁSTICO, MALLA A TIERRA PARA TODO EL	14 días	vie 5/11/21	vie 19/11/21	524CC			
526	10...		ADMINISTRACION	0 días	vie 17/09/21	vie 17/09/21				
527	10...		IMPREVISTOS	0 días	vie 17/09/21	vie 17/09/21				
528	10...		UTILIDAD	0 días	vie 17/09/21	vie 17/09/21				
529	10...		IVA SOBRE UTILIDAD	0 días	vie 17/09/21	vie 17/09/21				


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



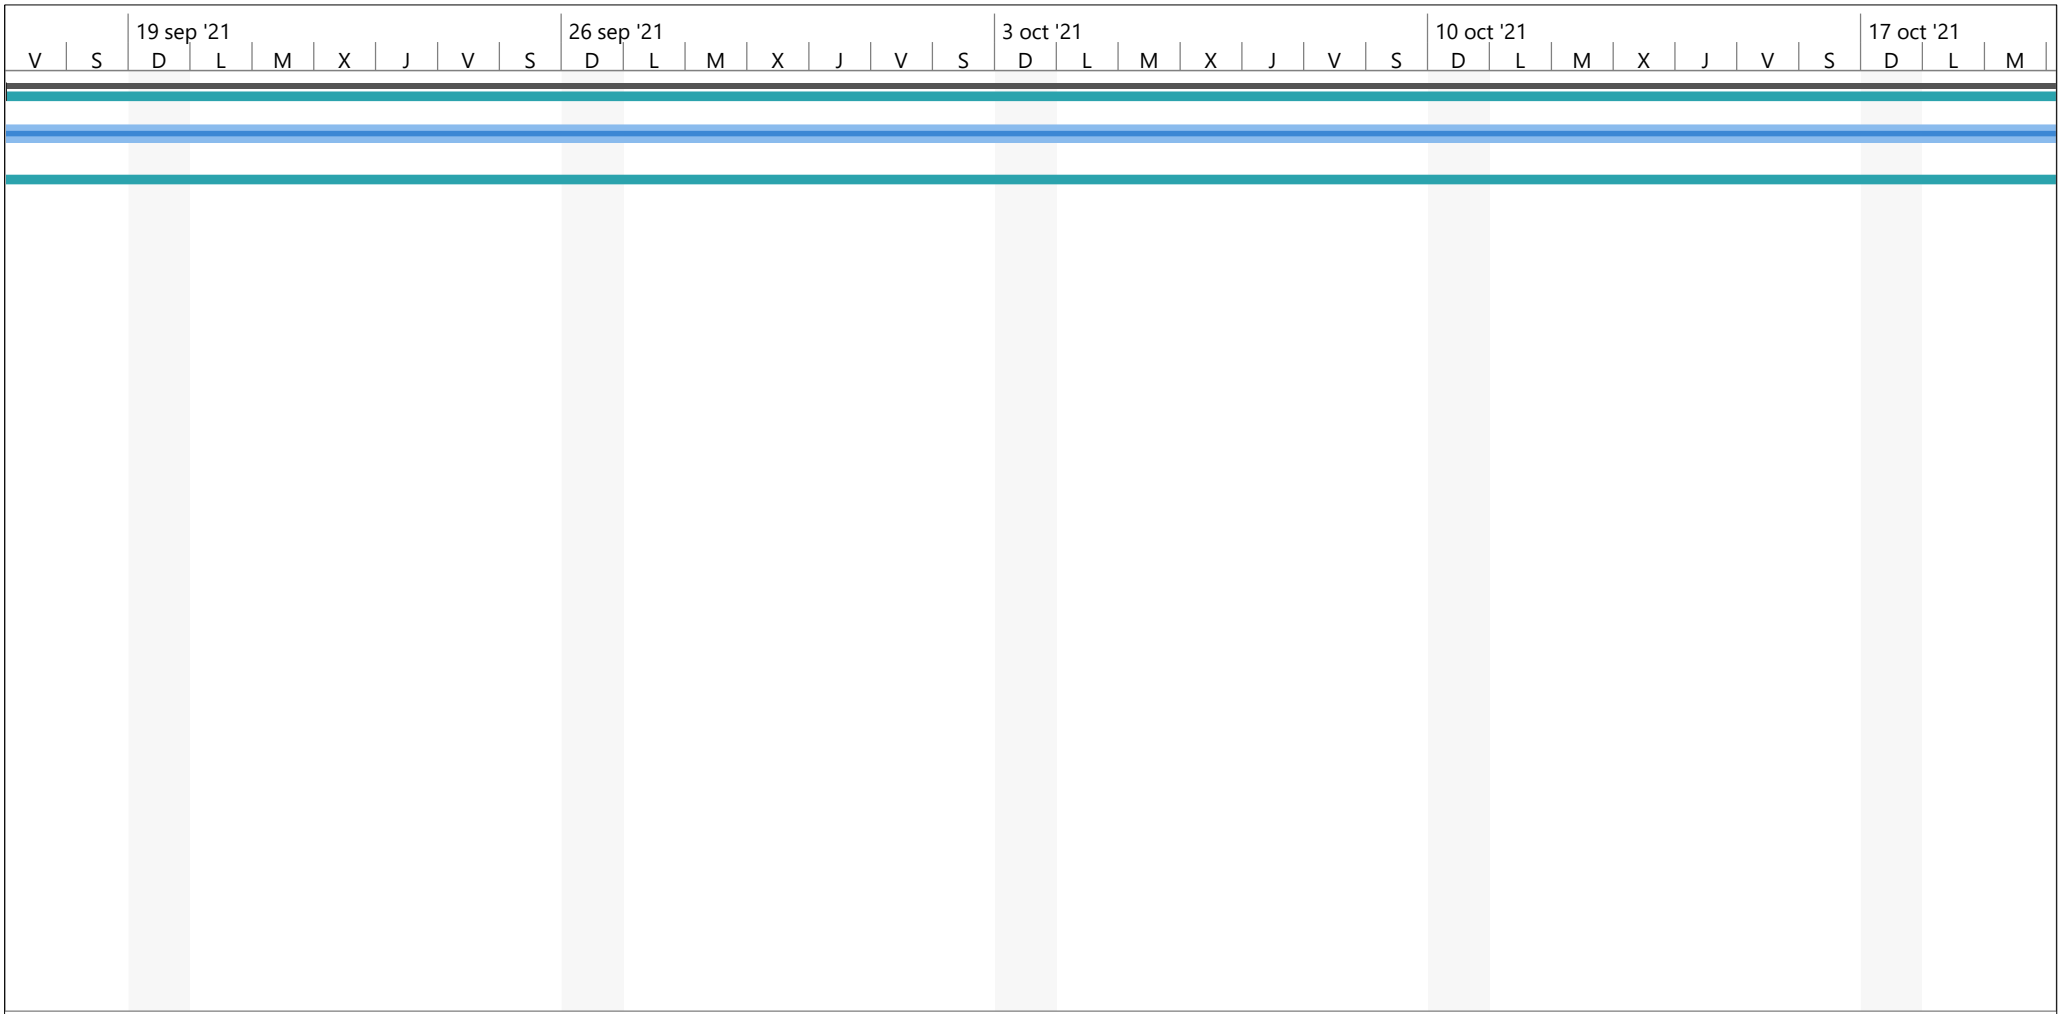


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

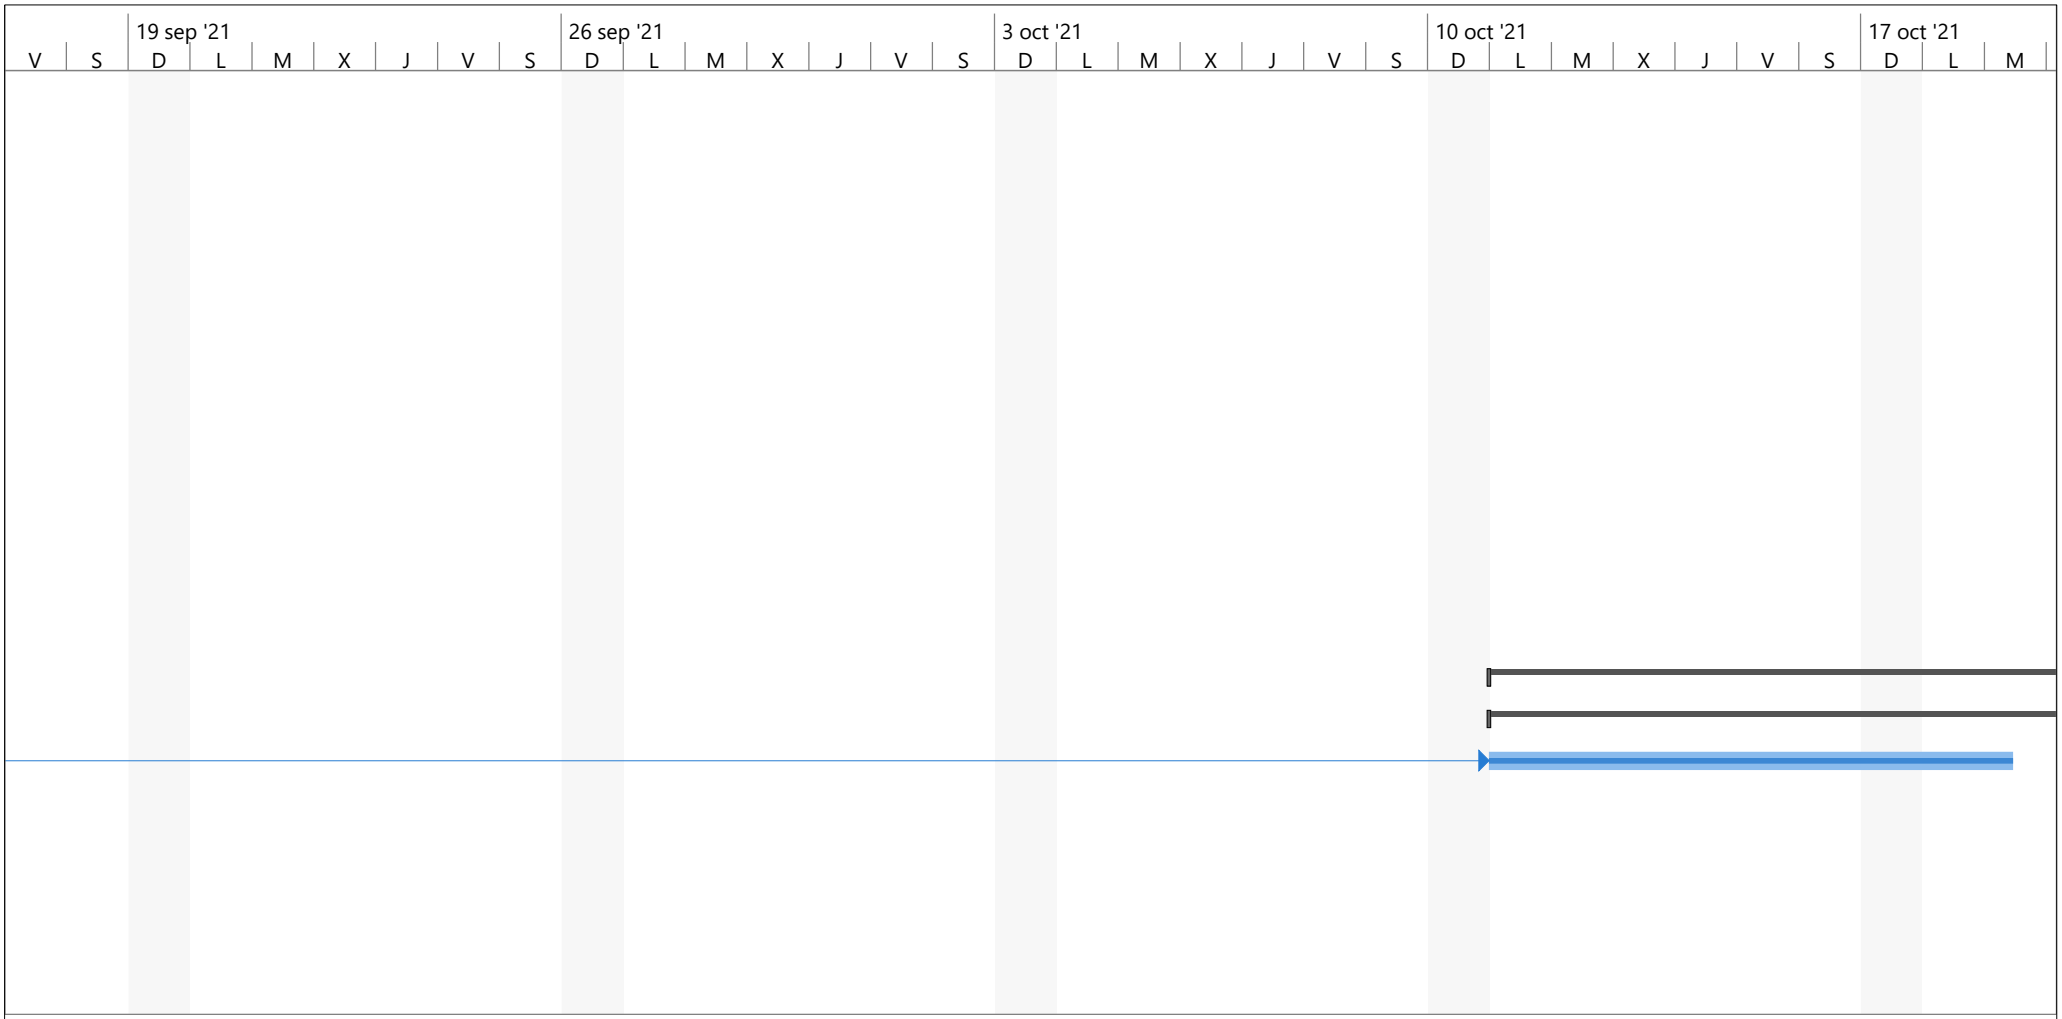


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

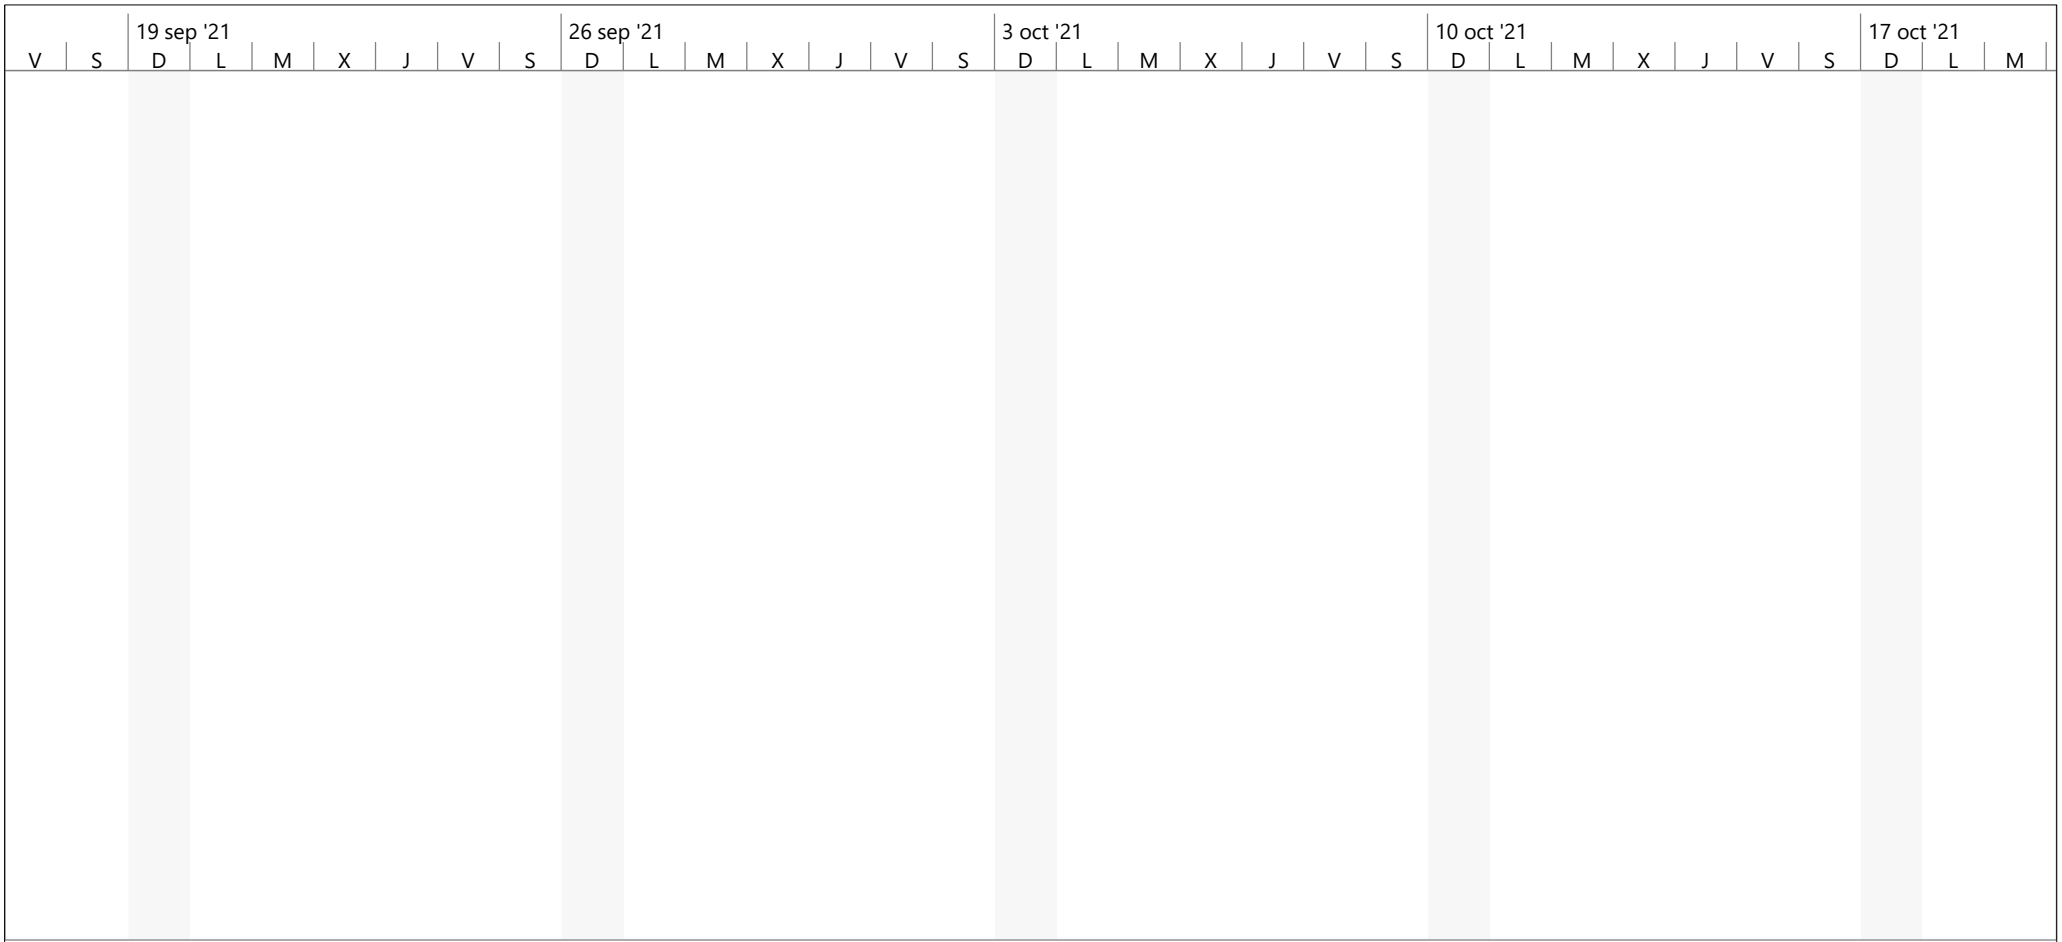


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



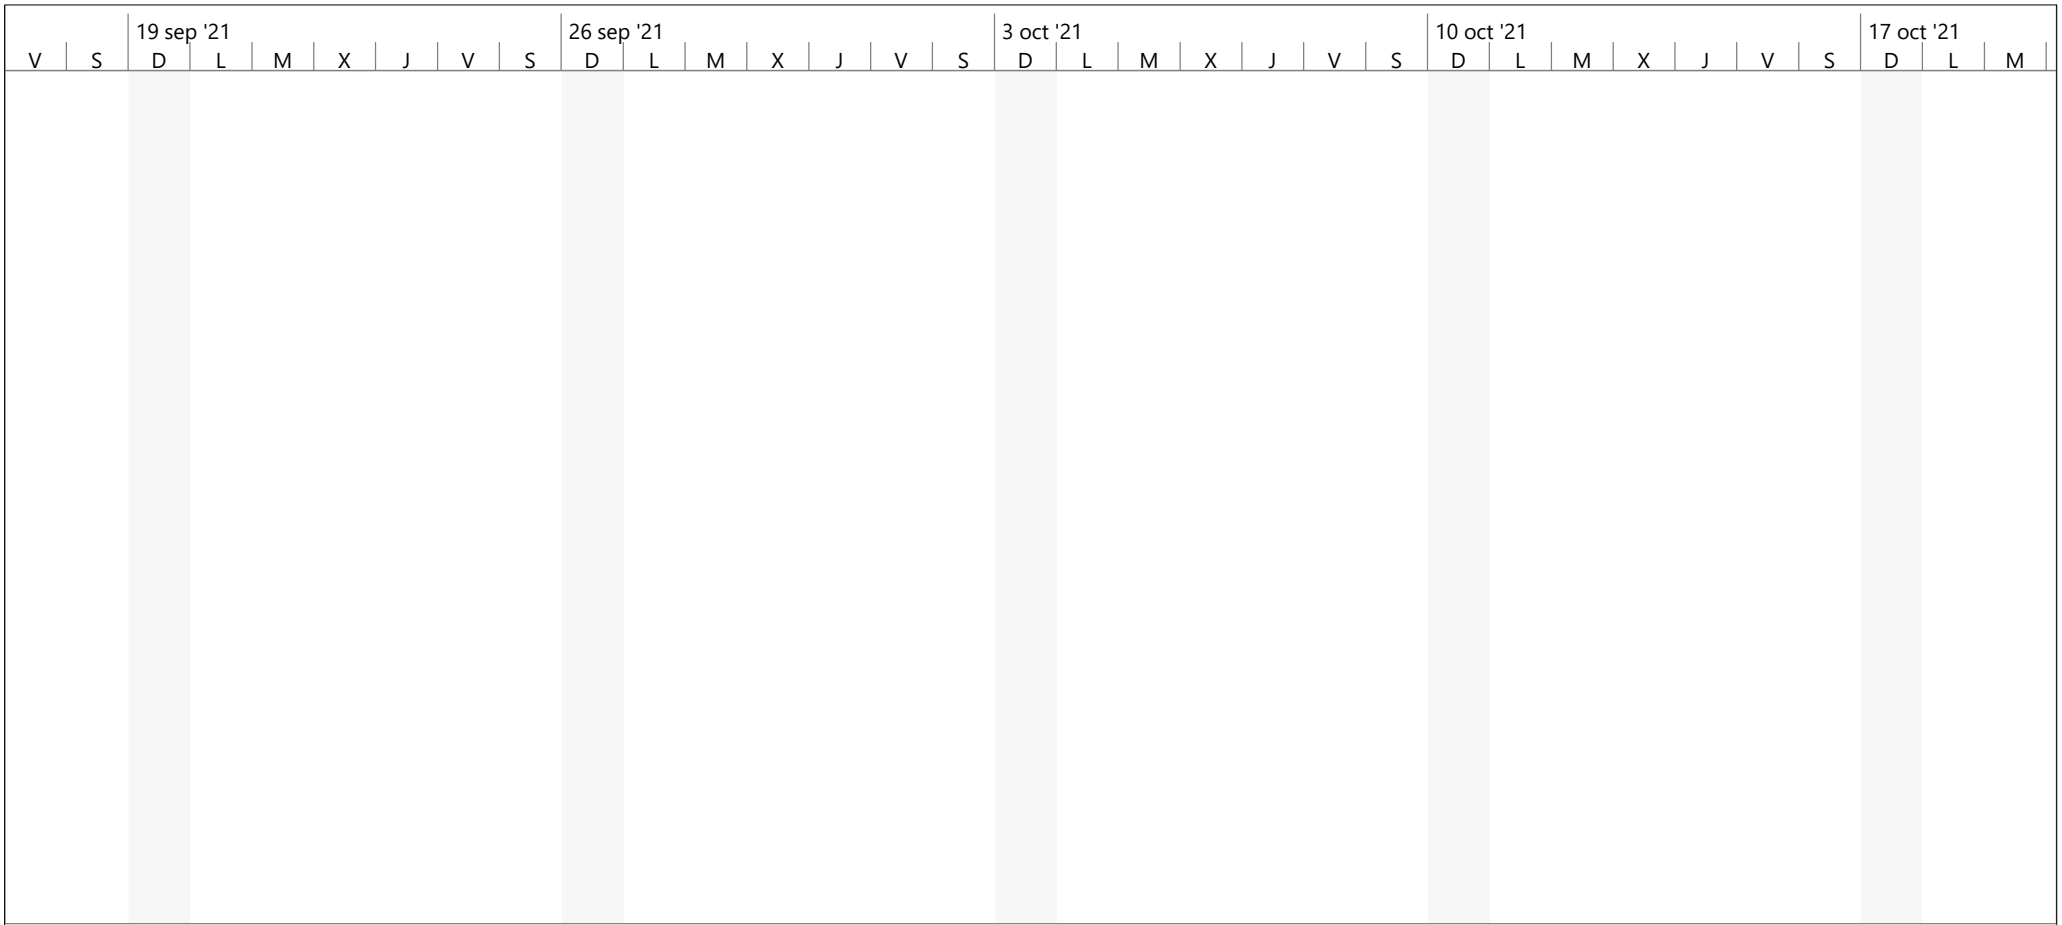

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



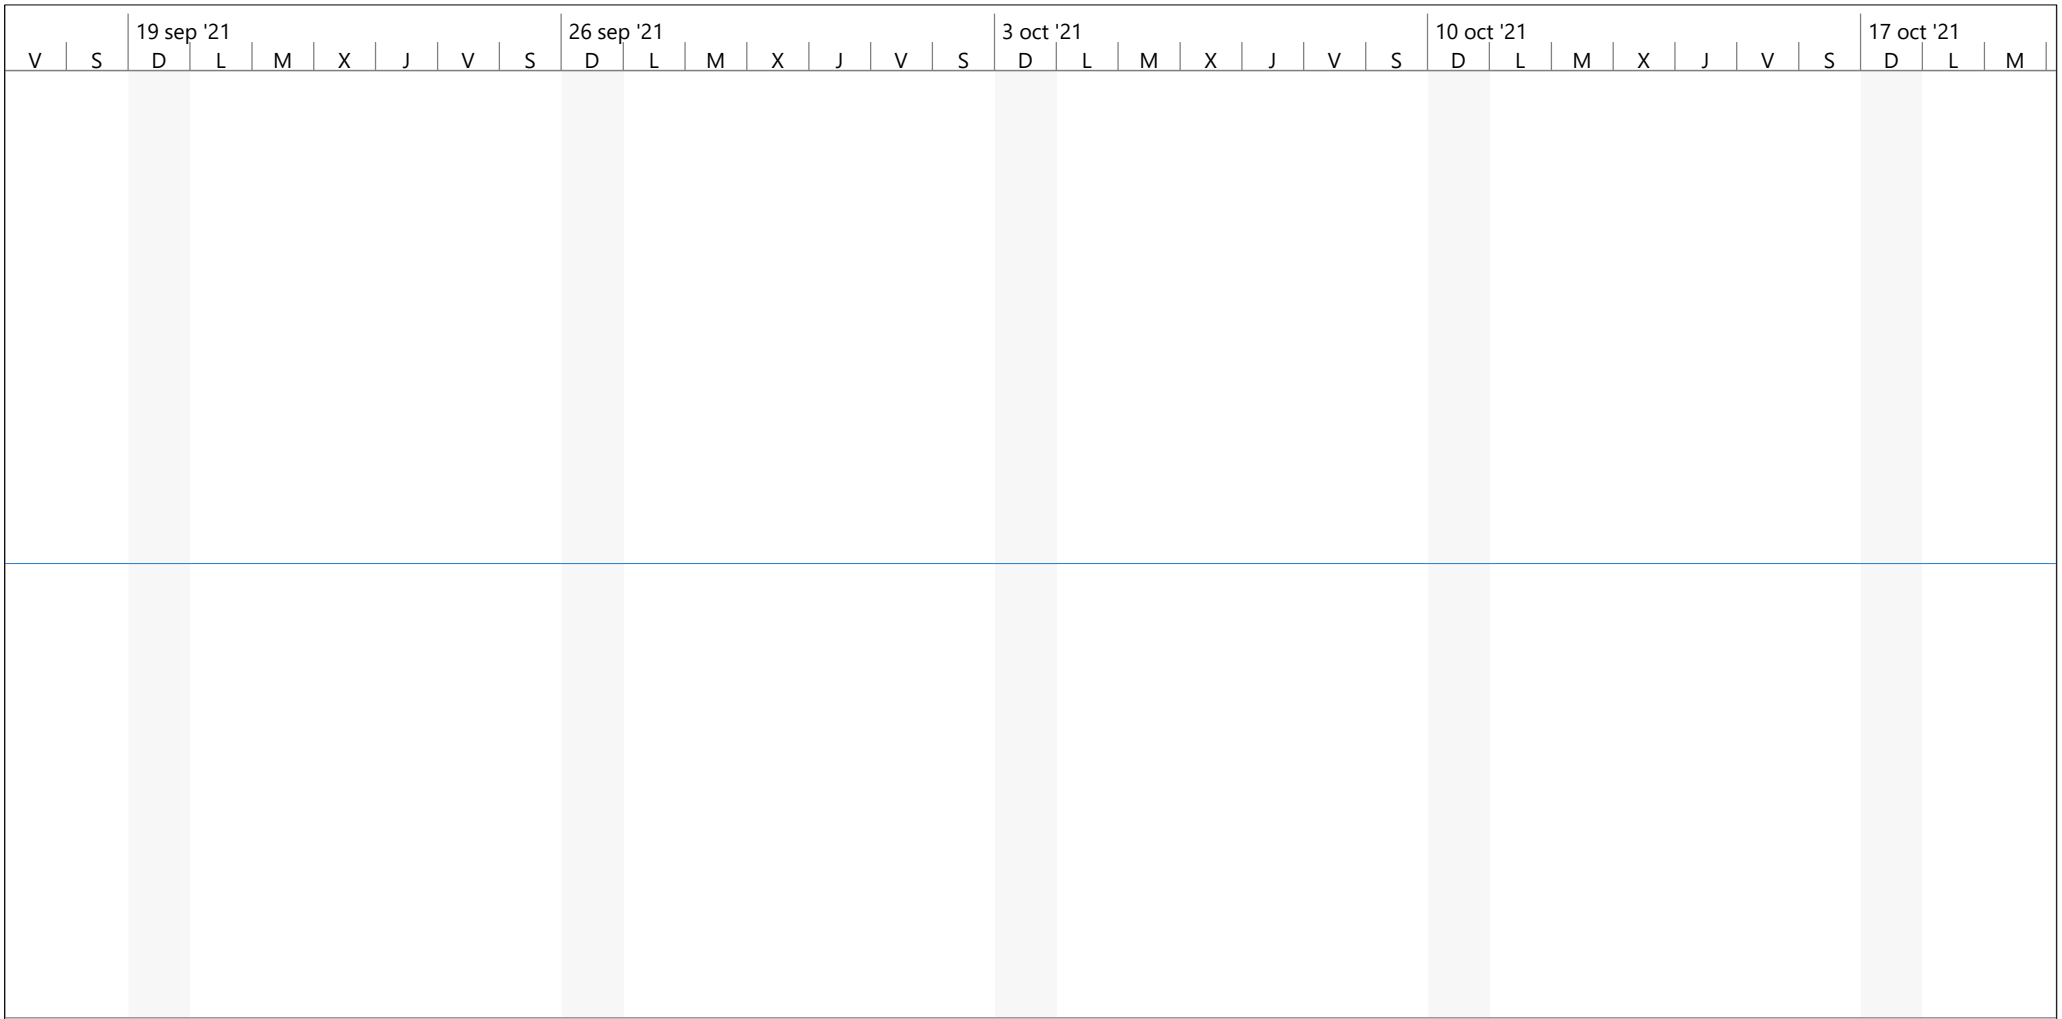


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



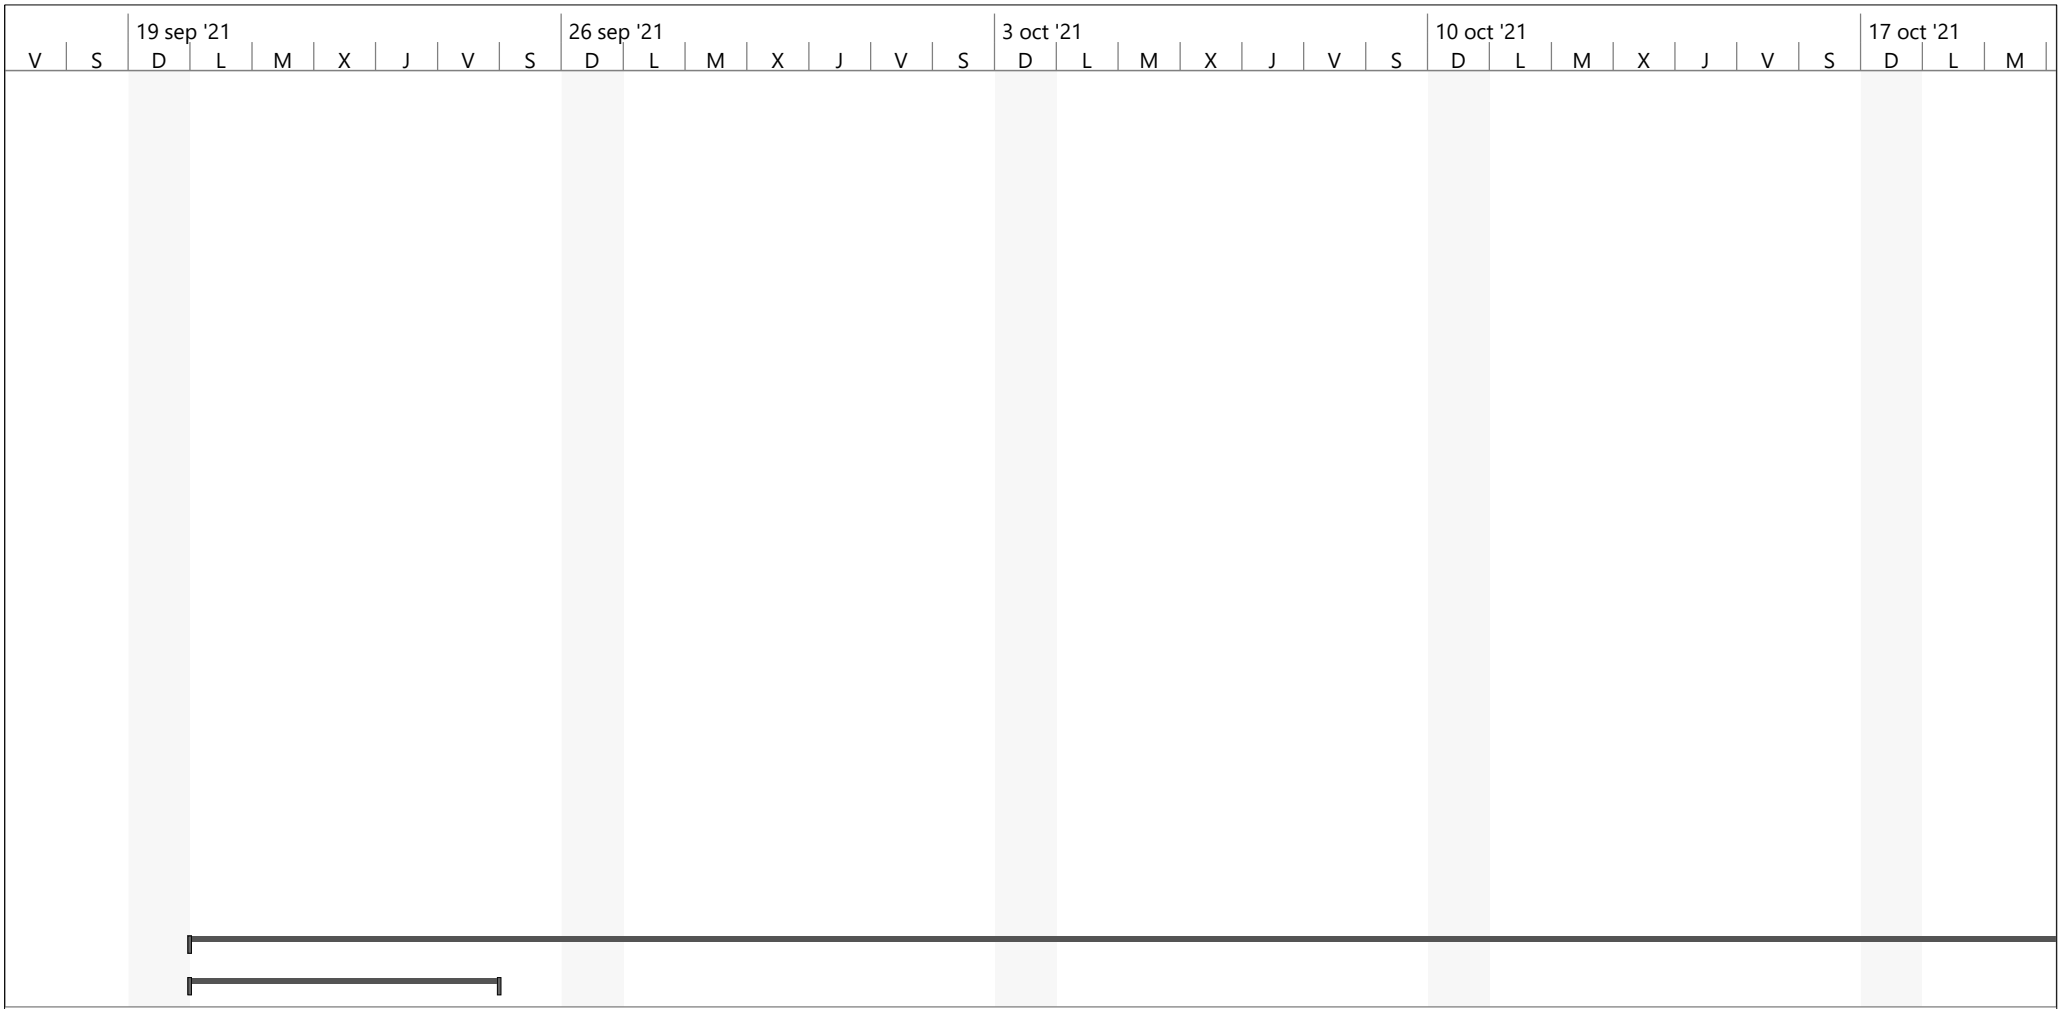


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

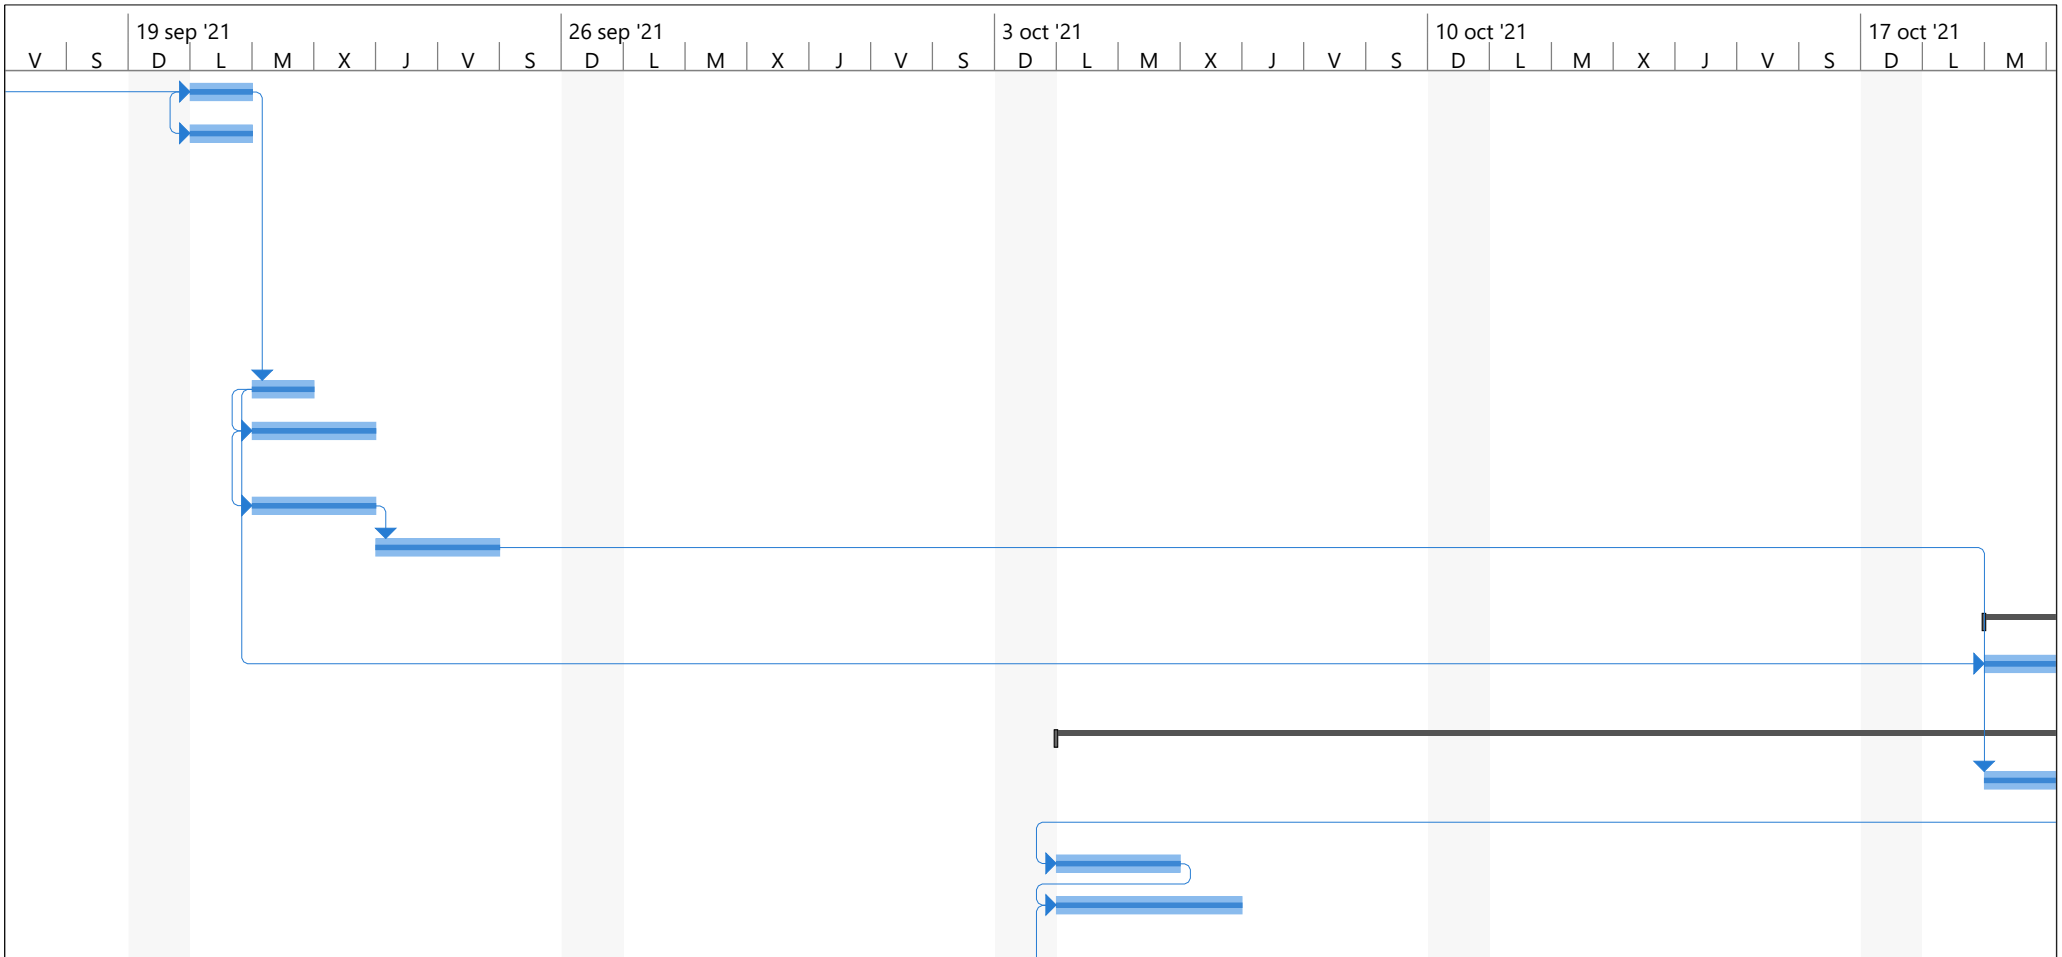


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

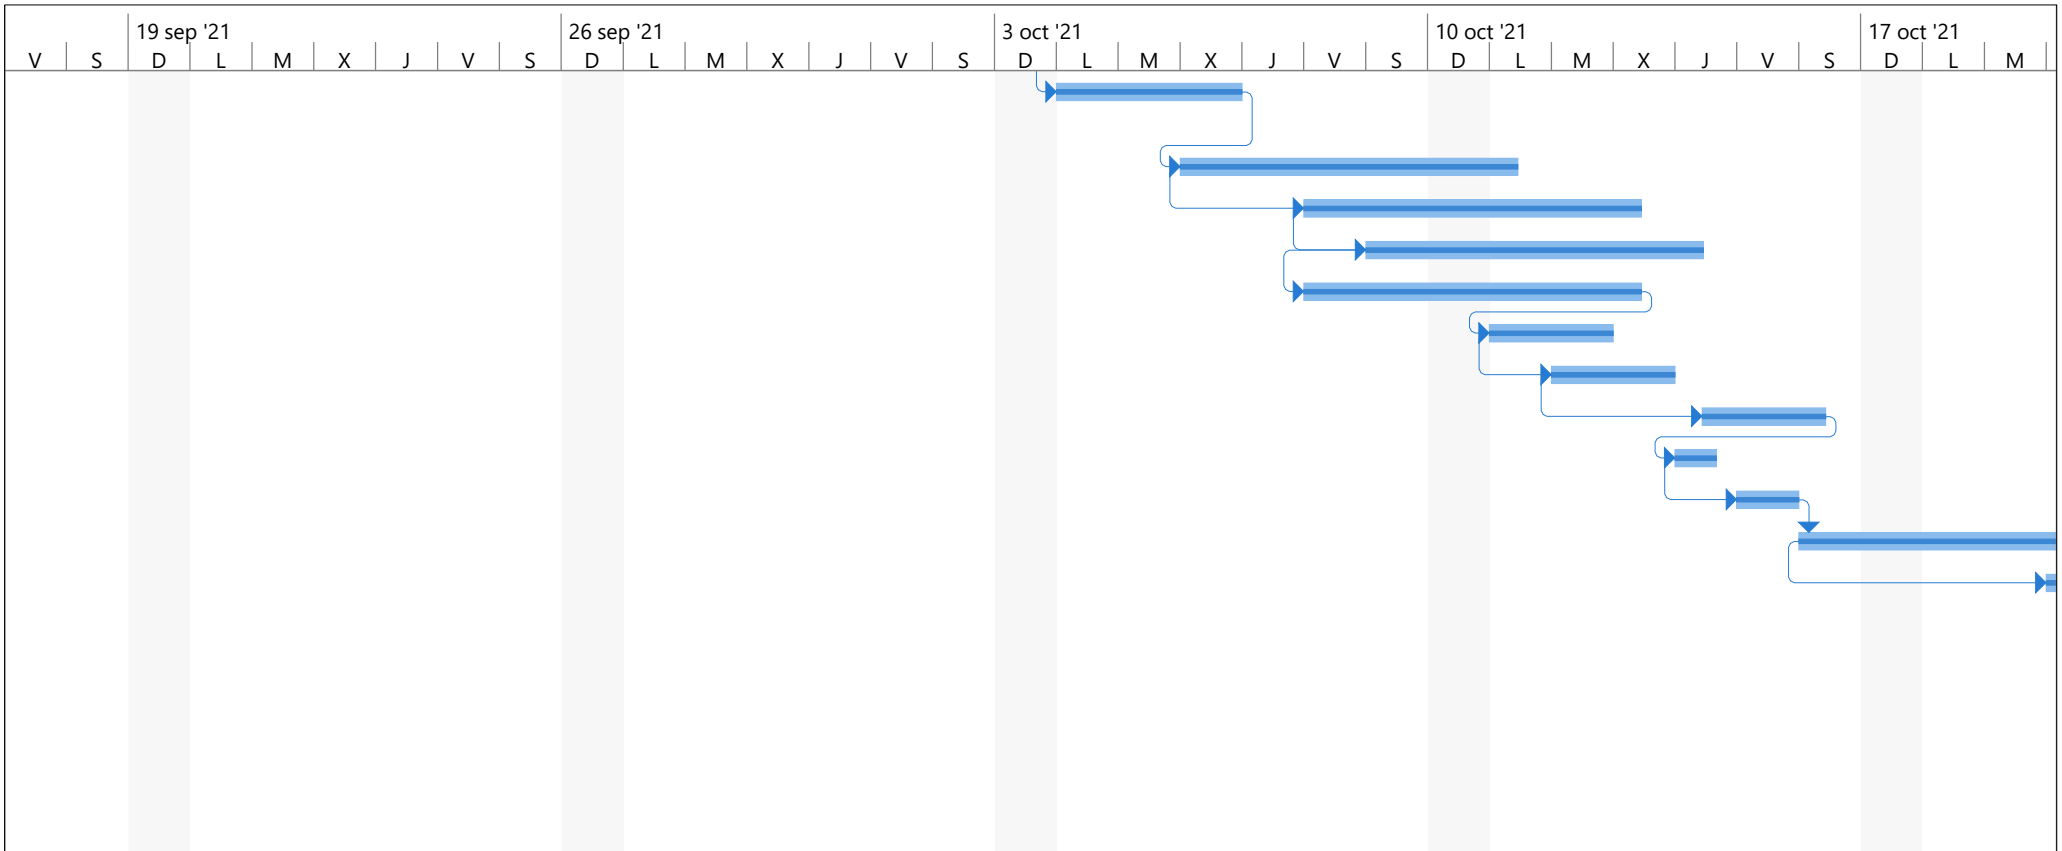

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

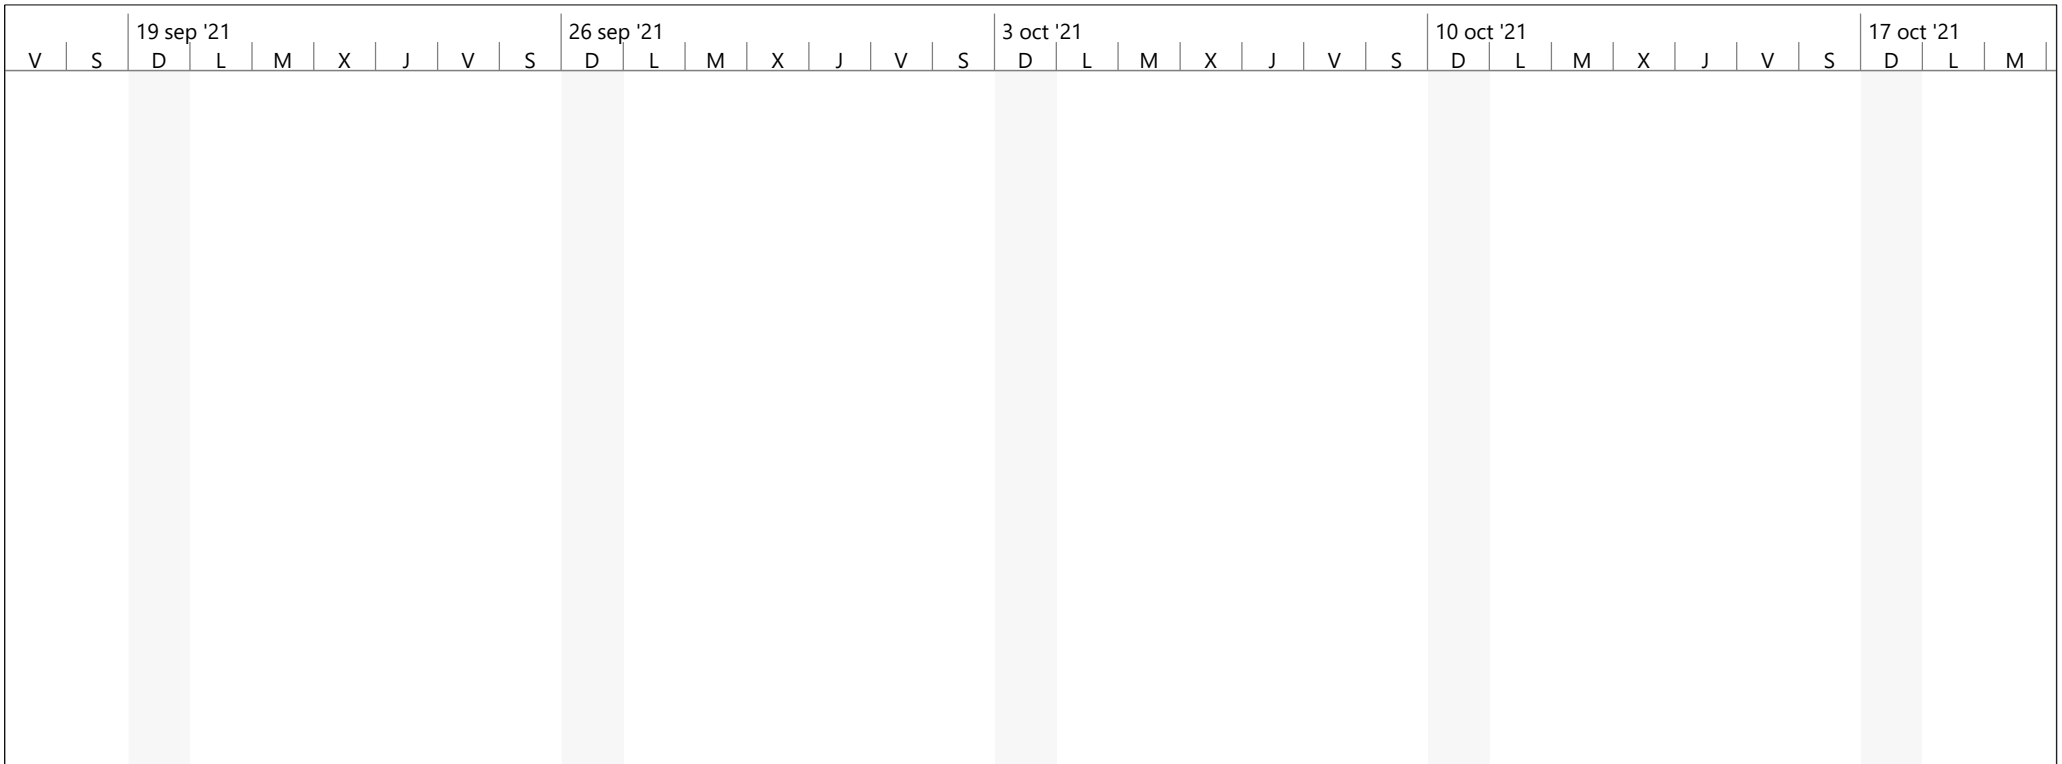


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21





Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

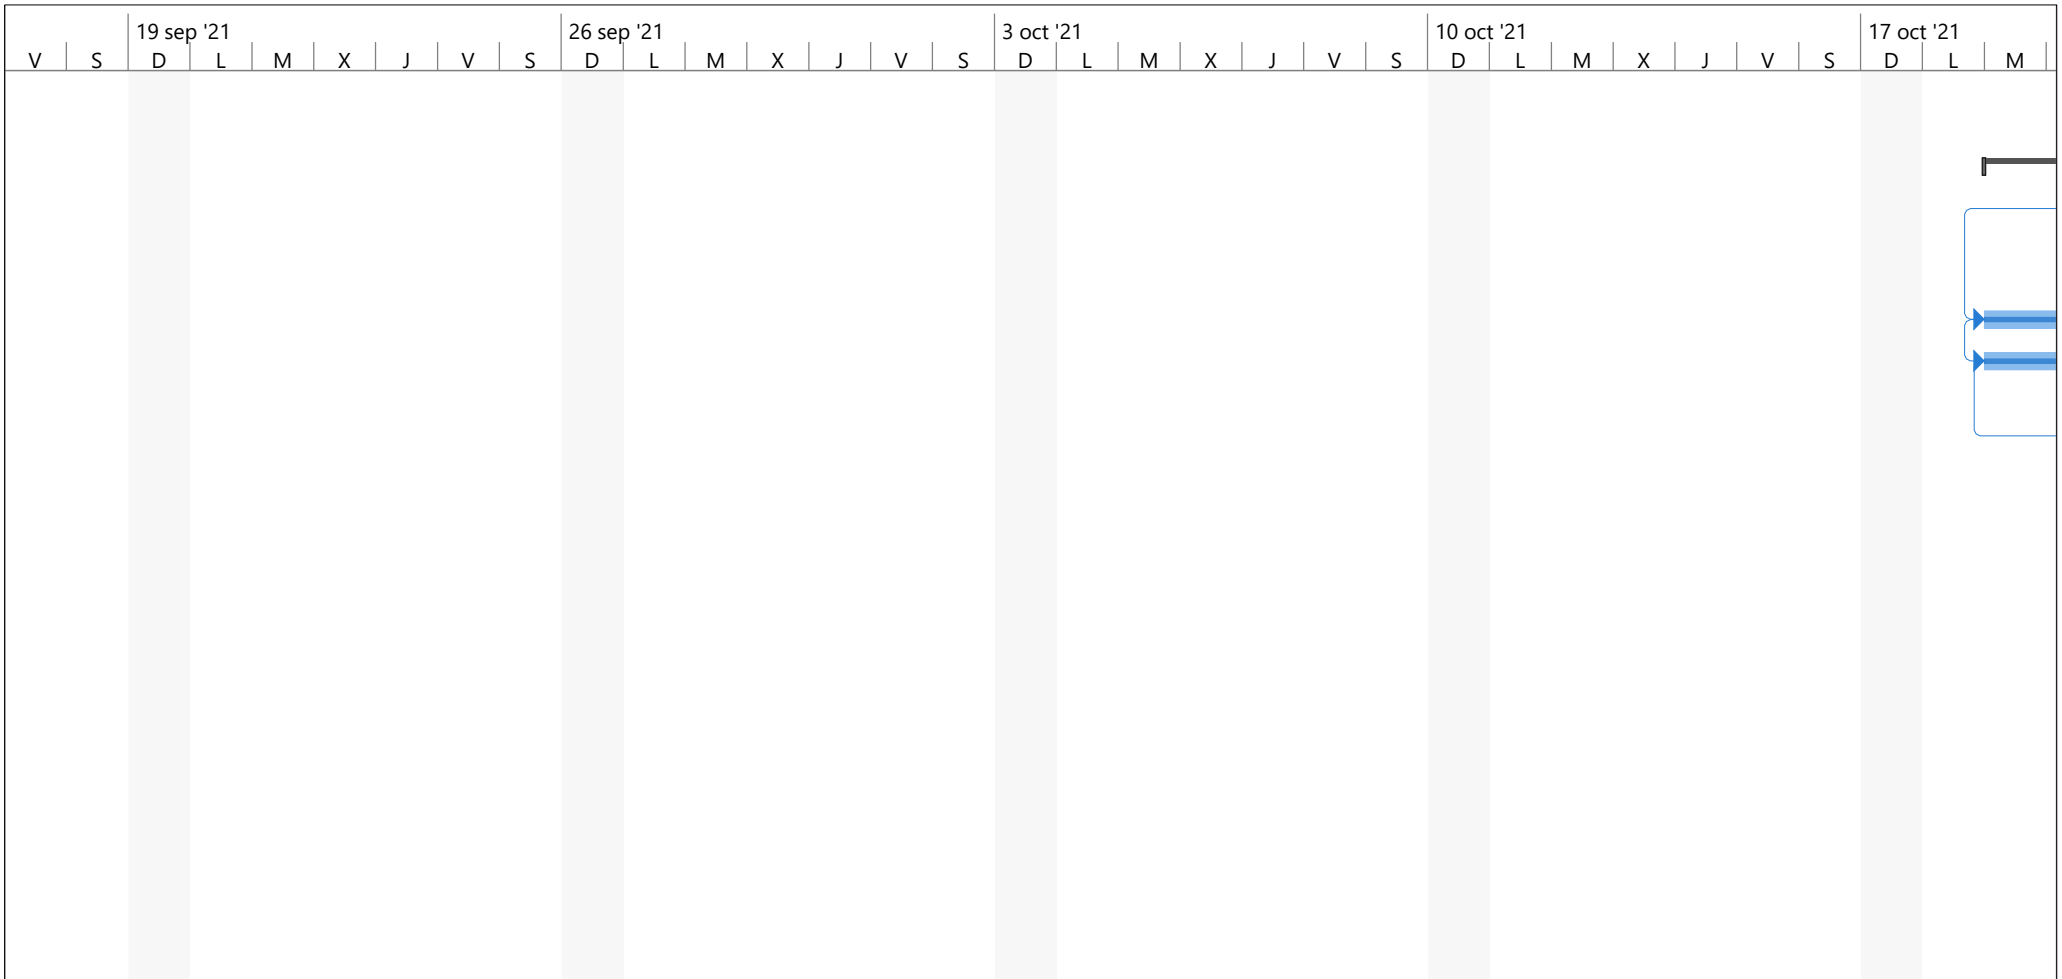


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

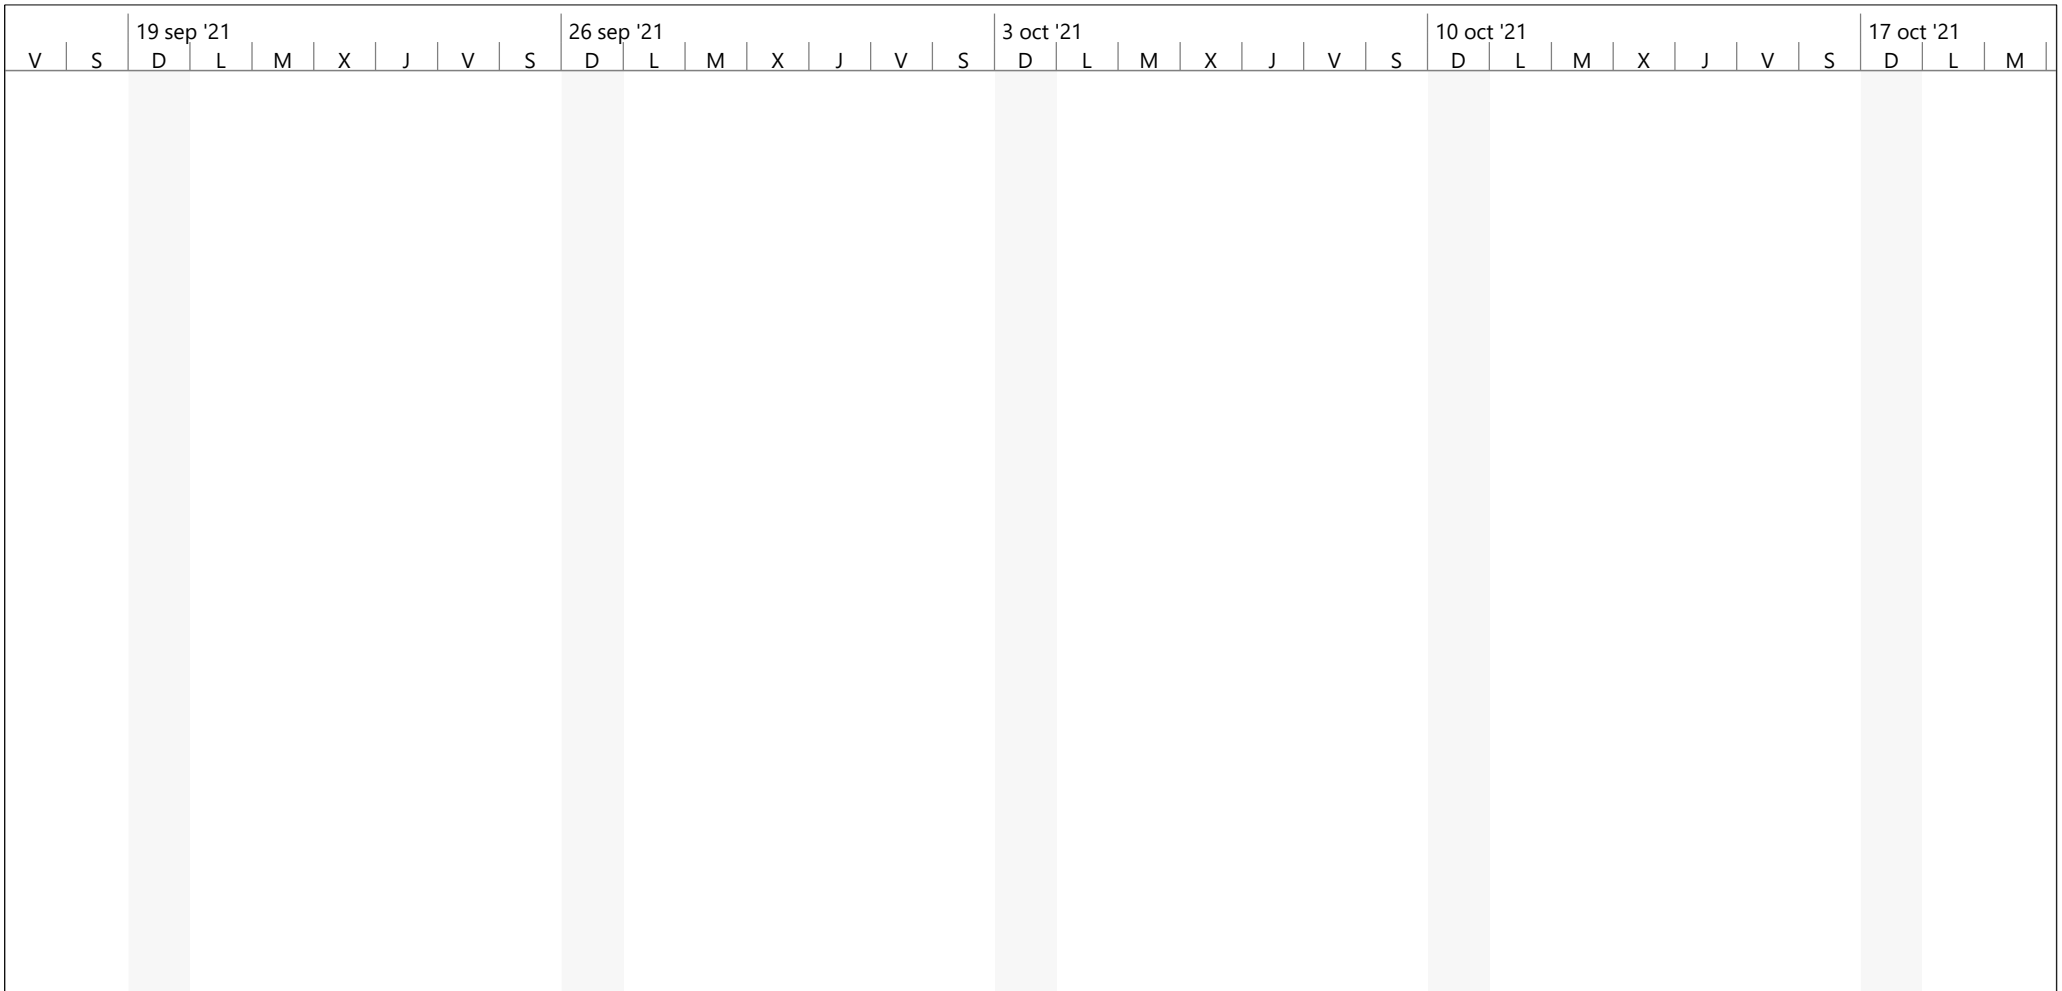


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

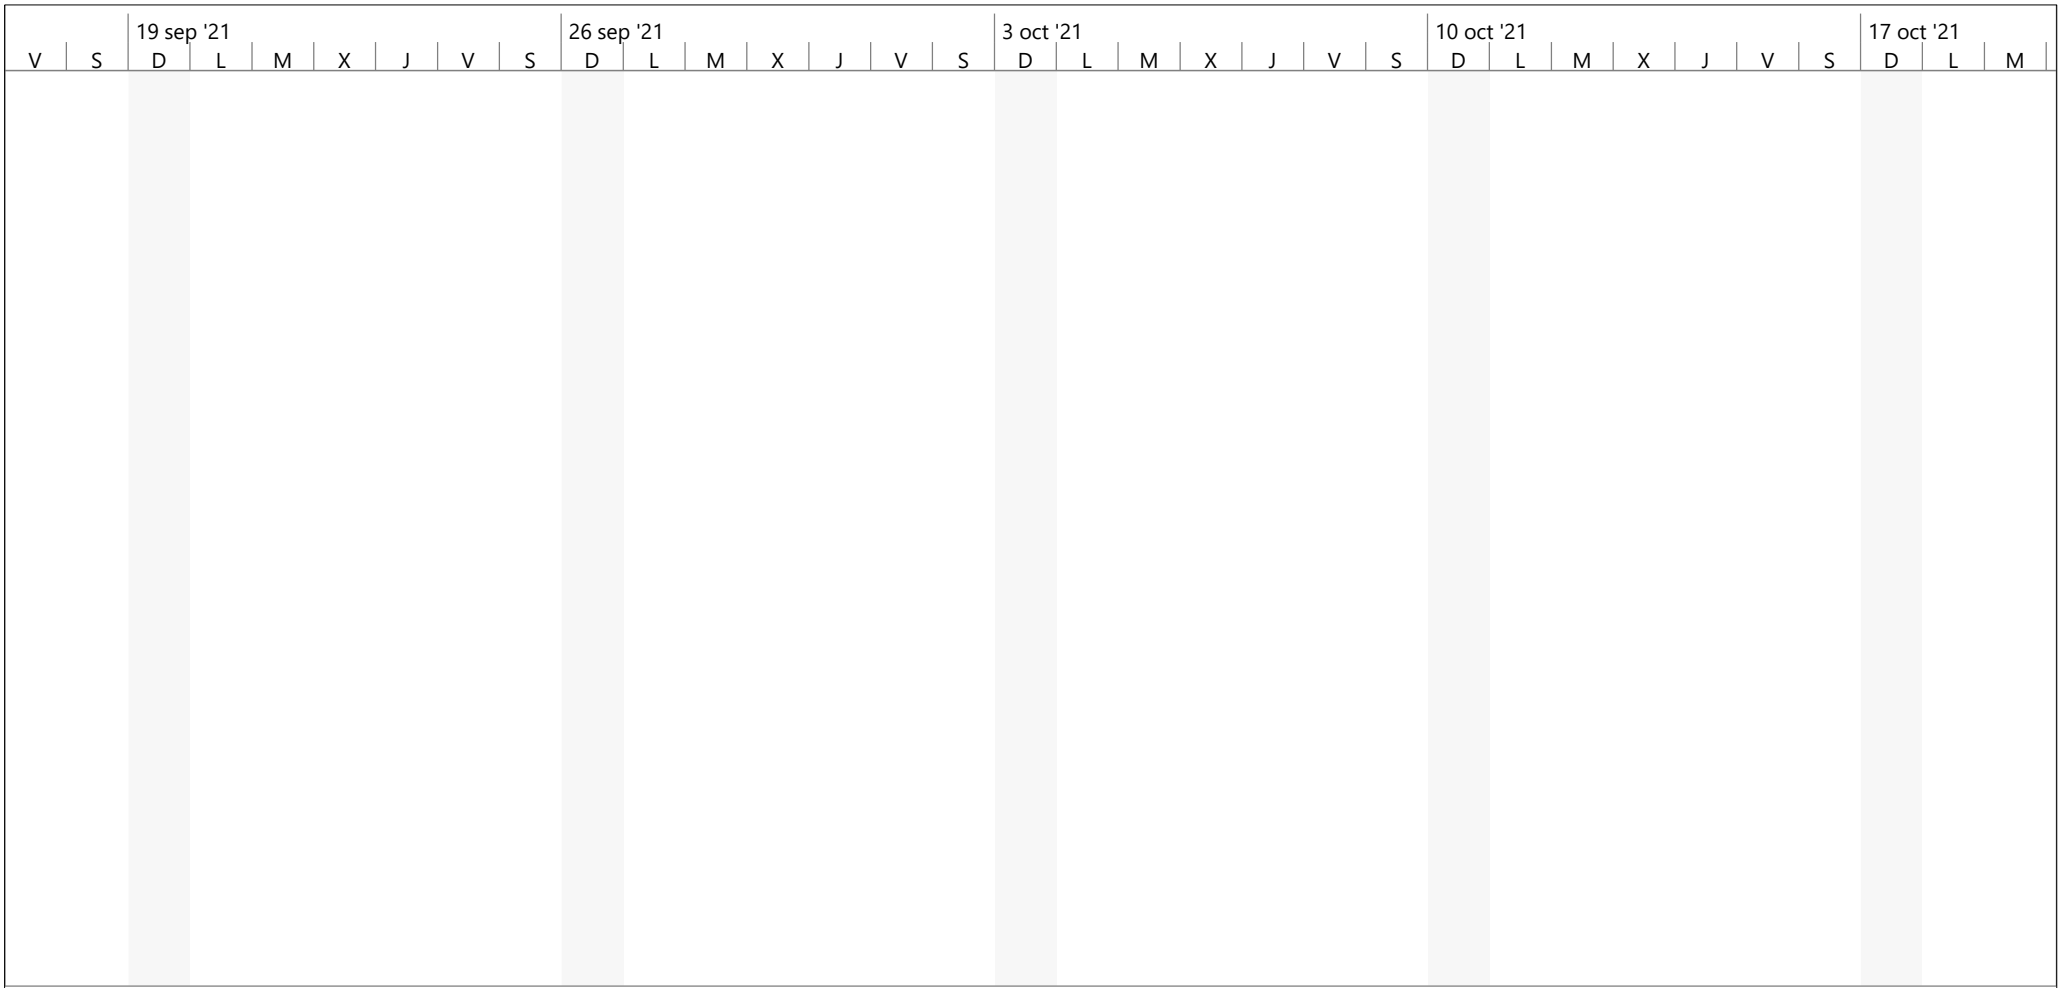


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



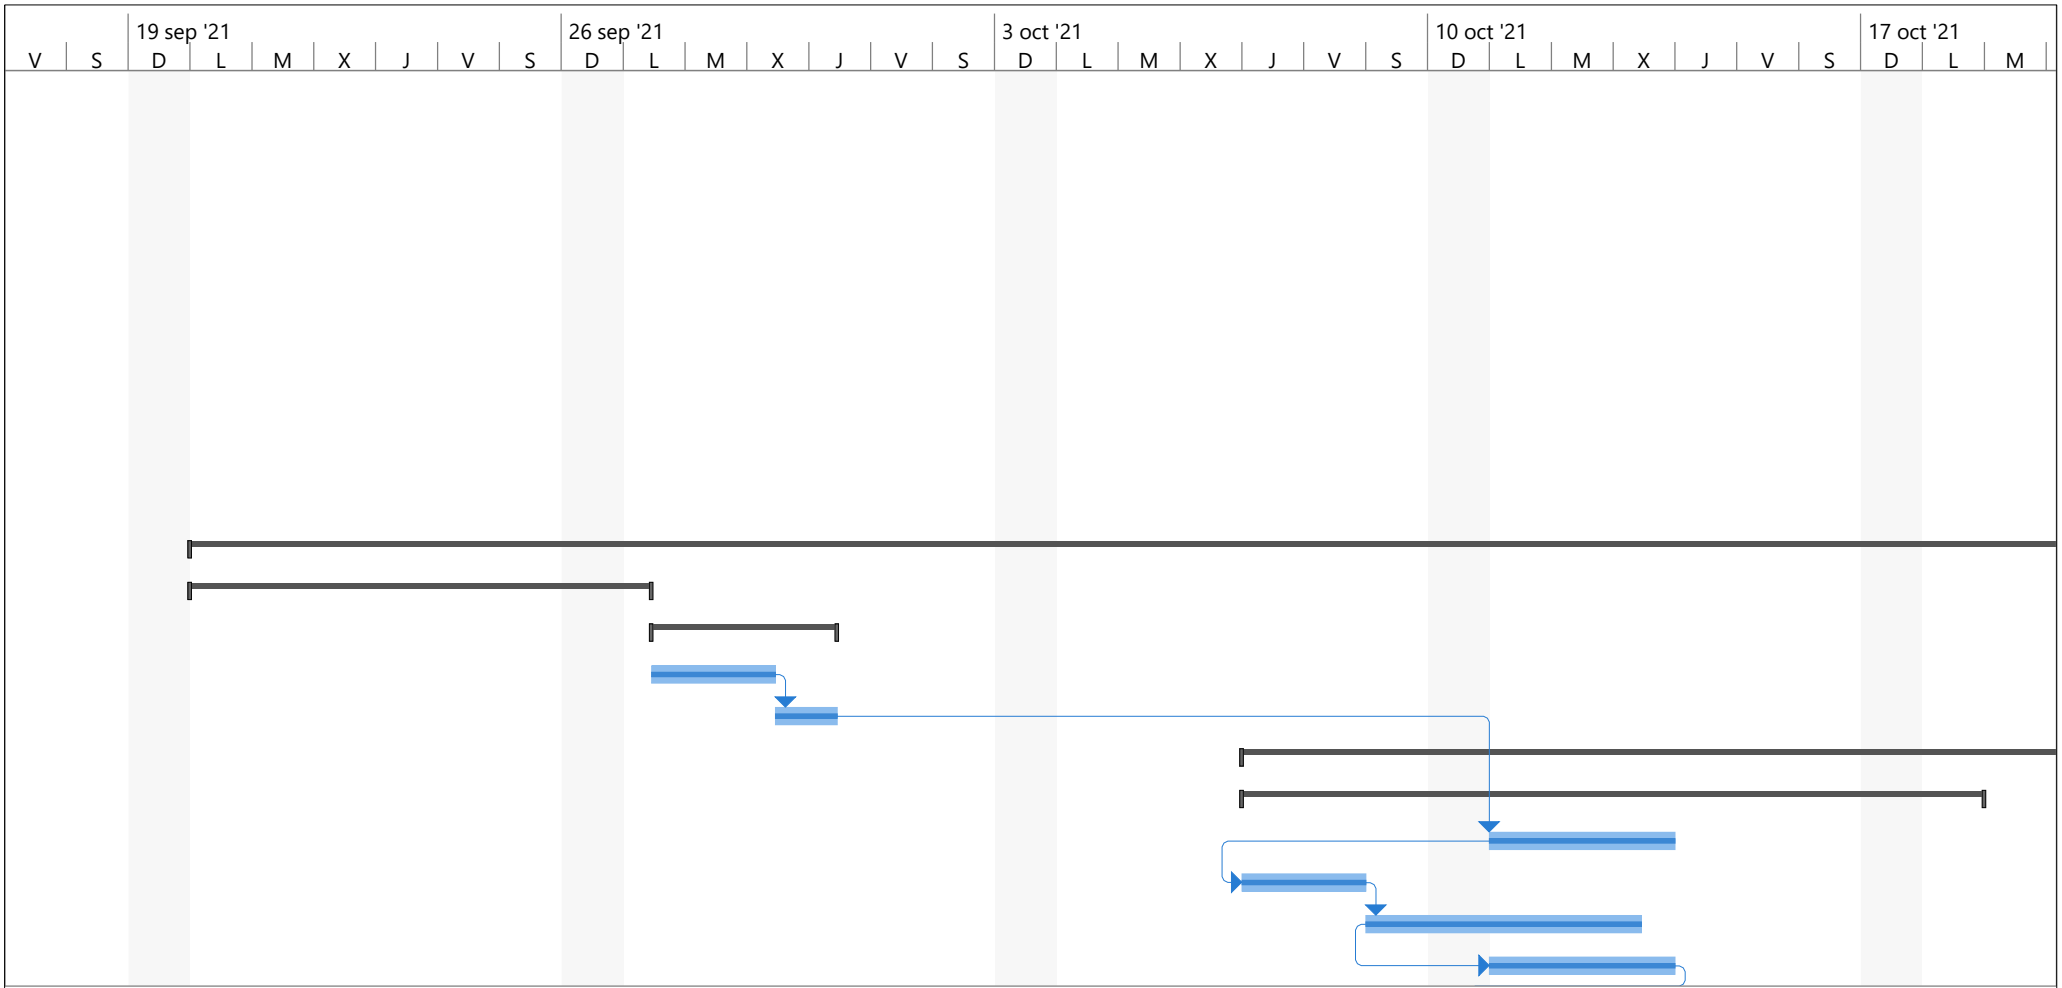


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

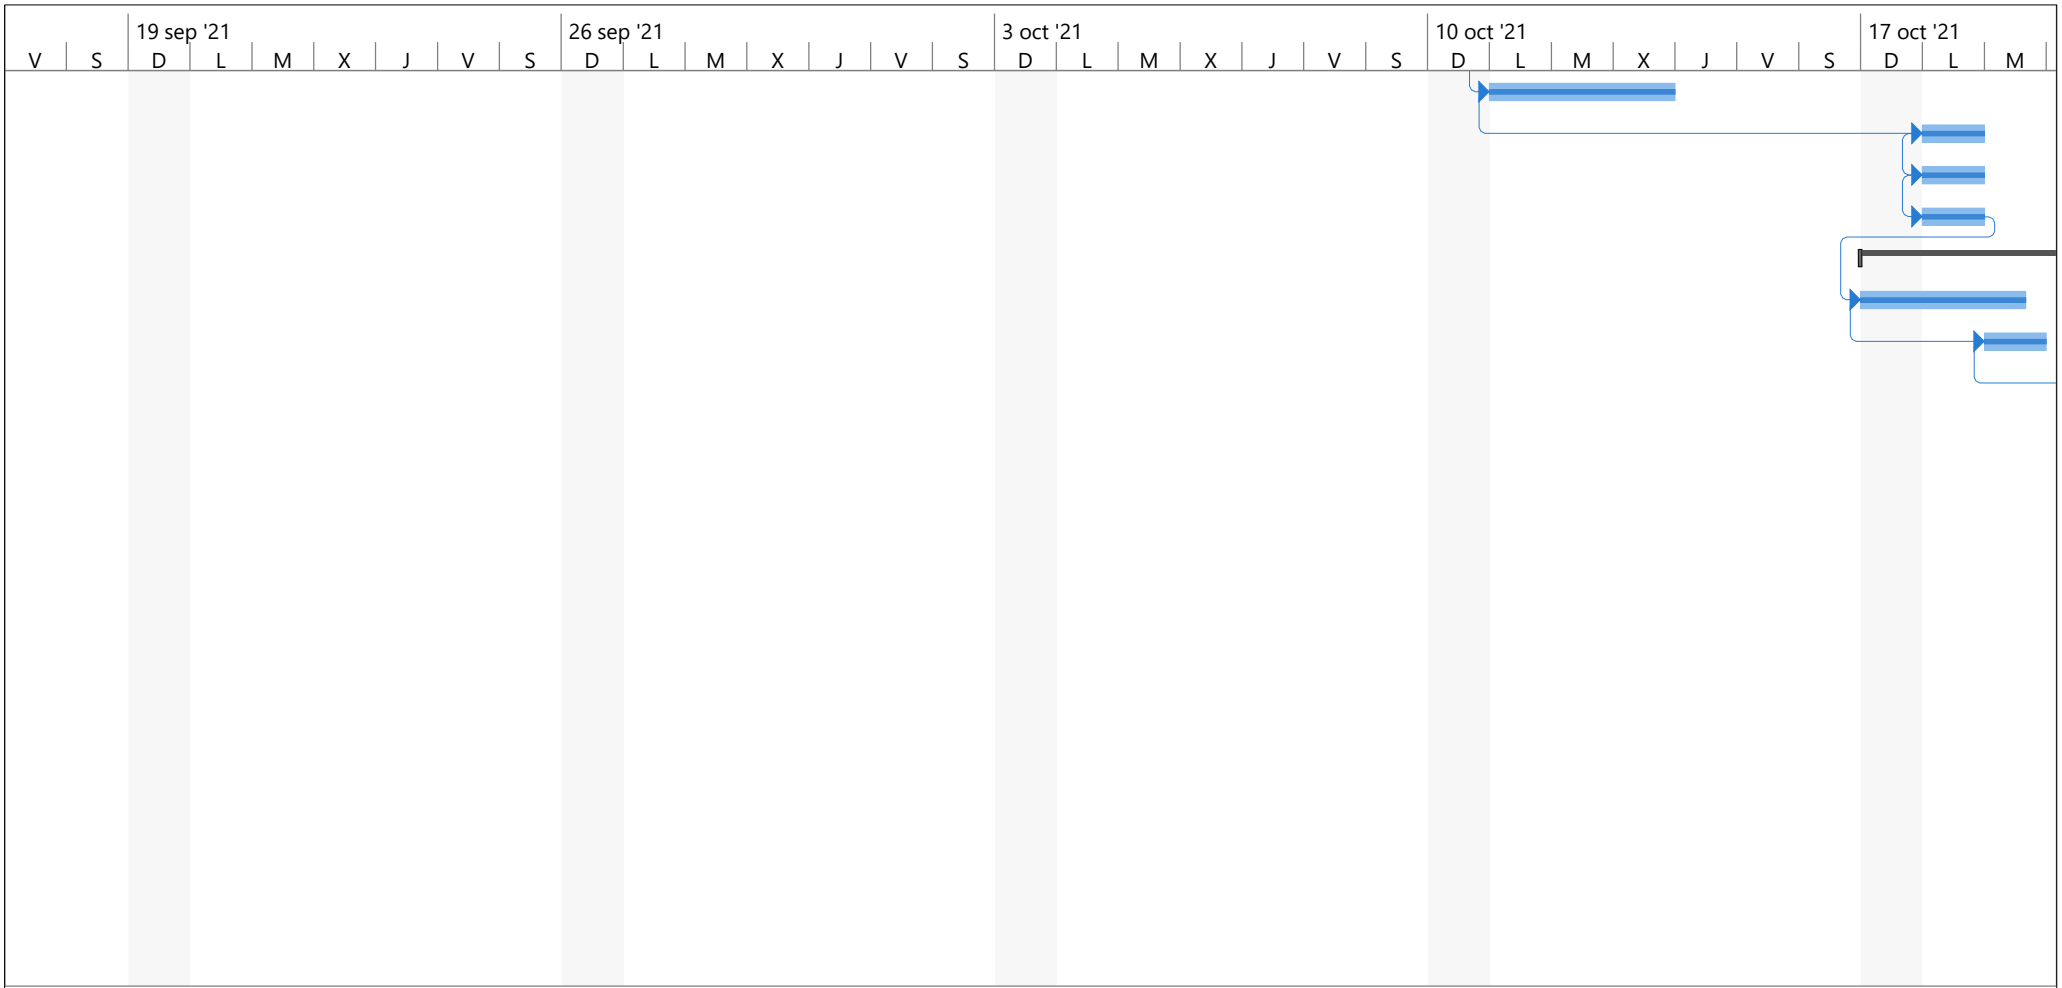


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

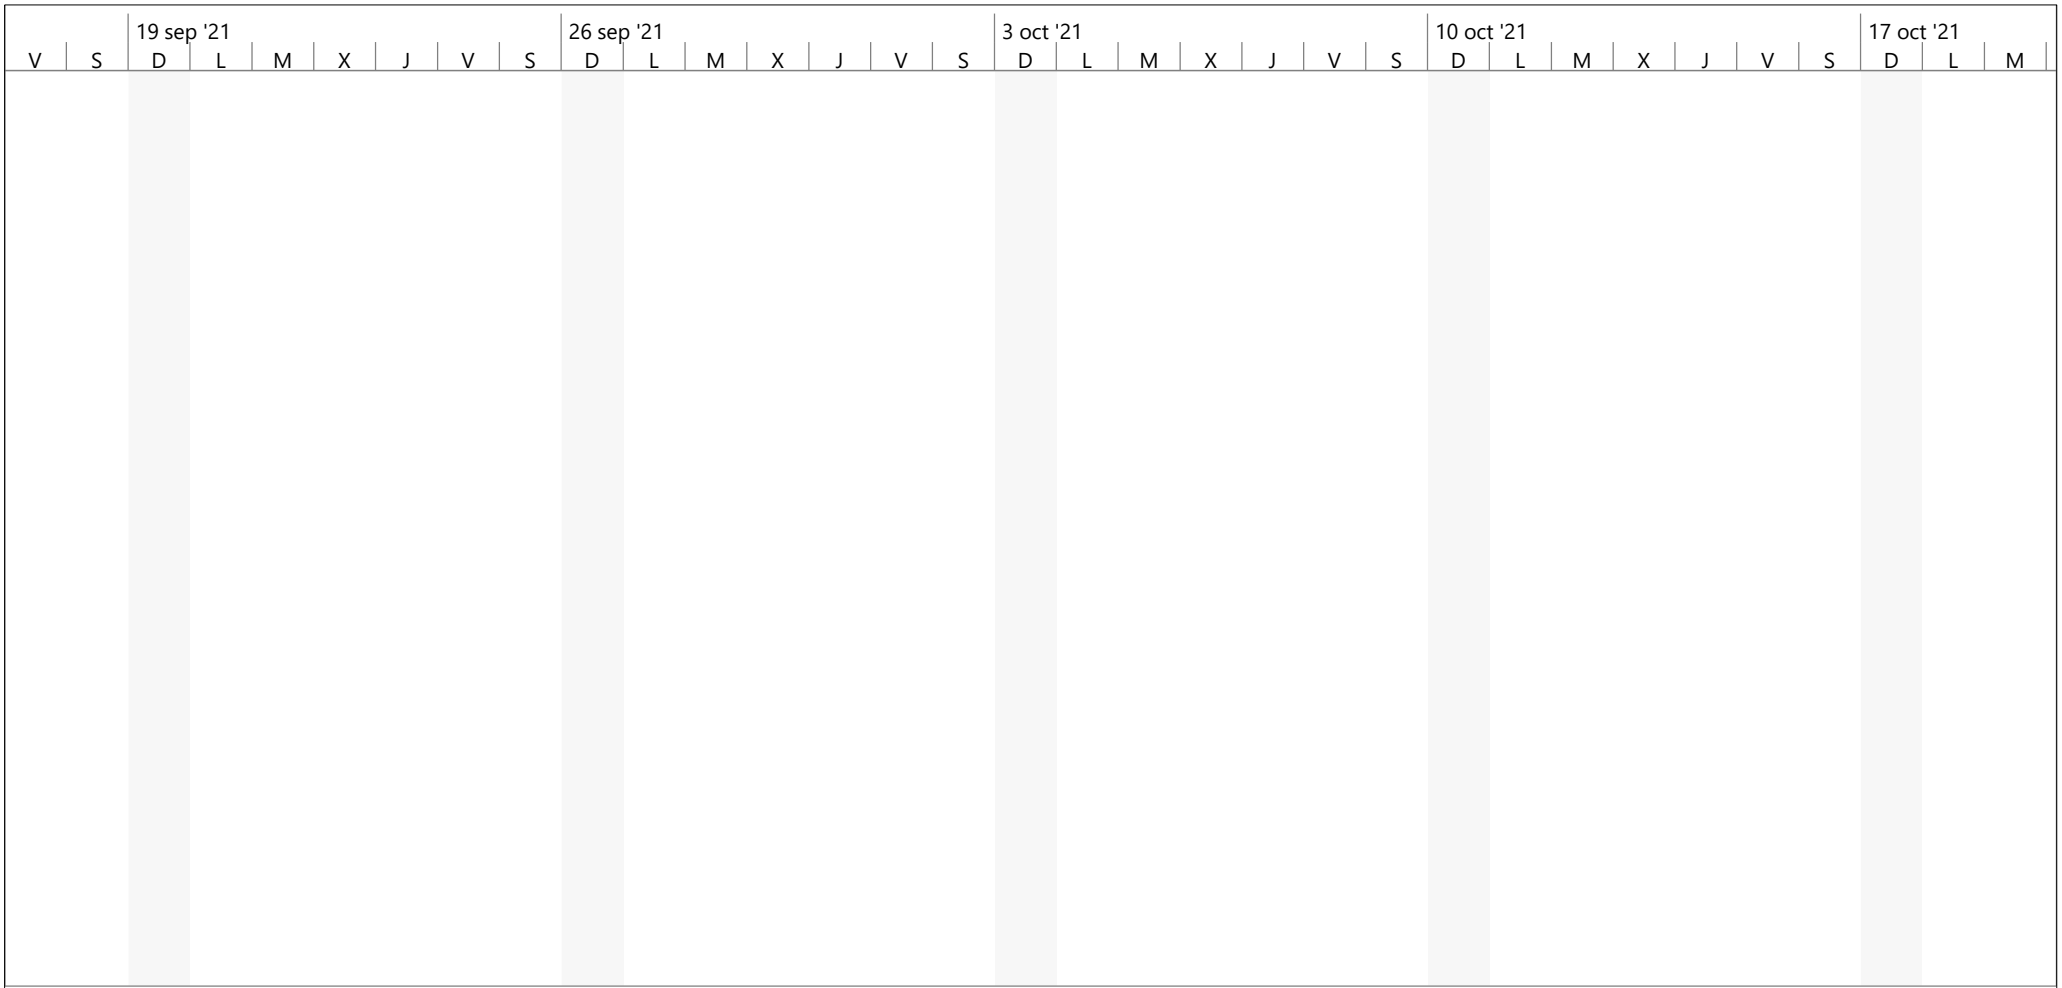


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

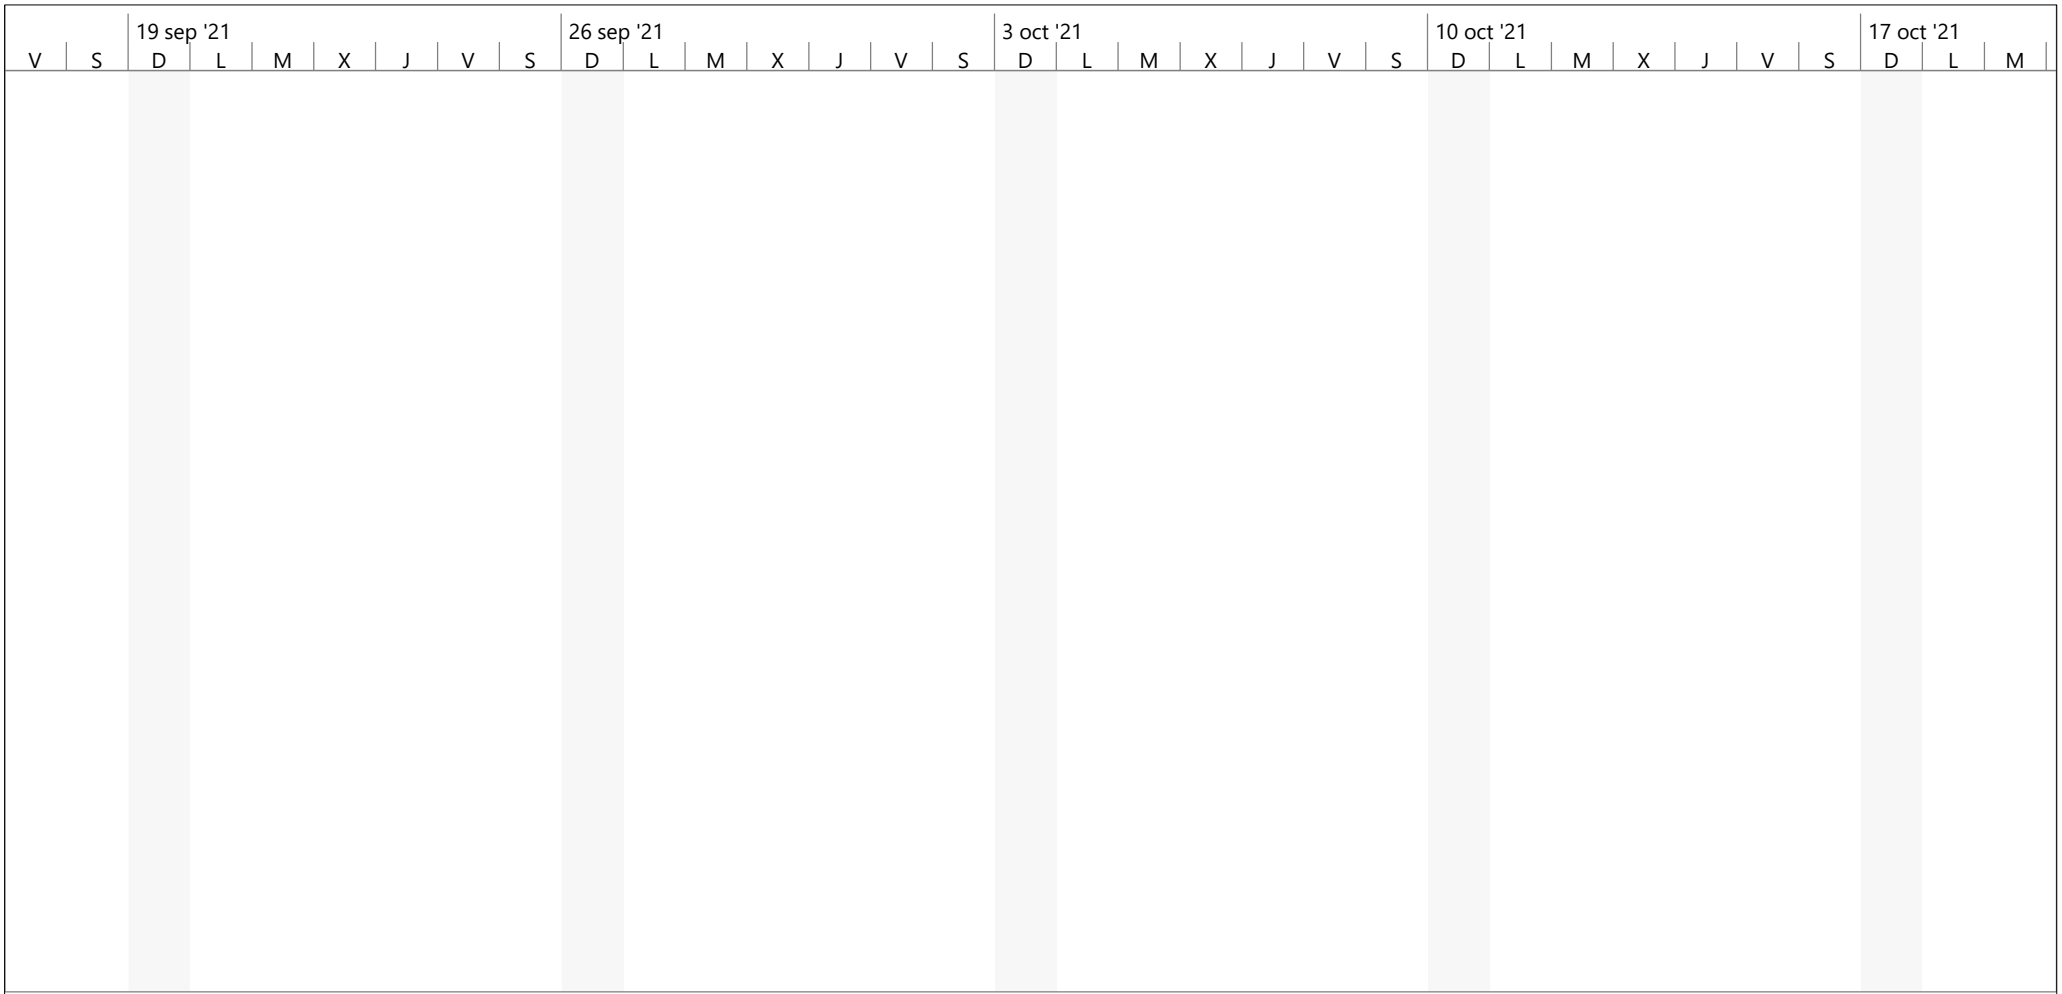

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

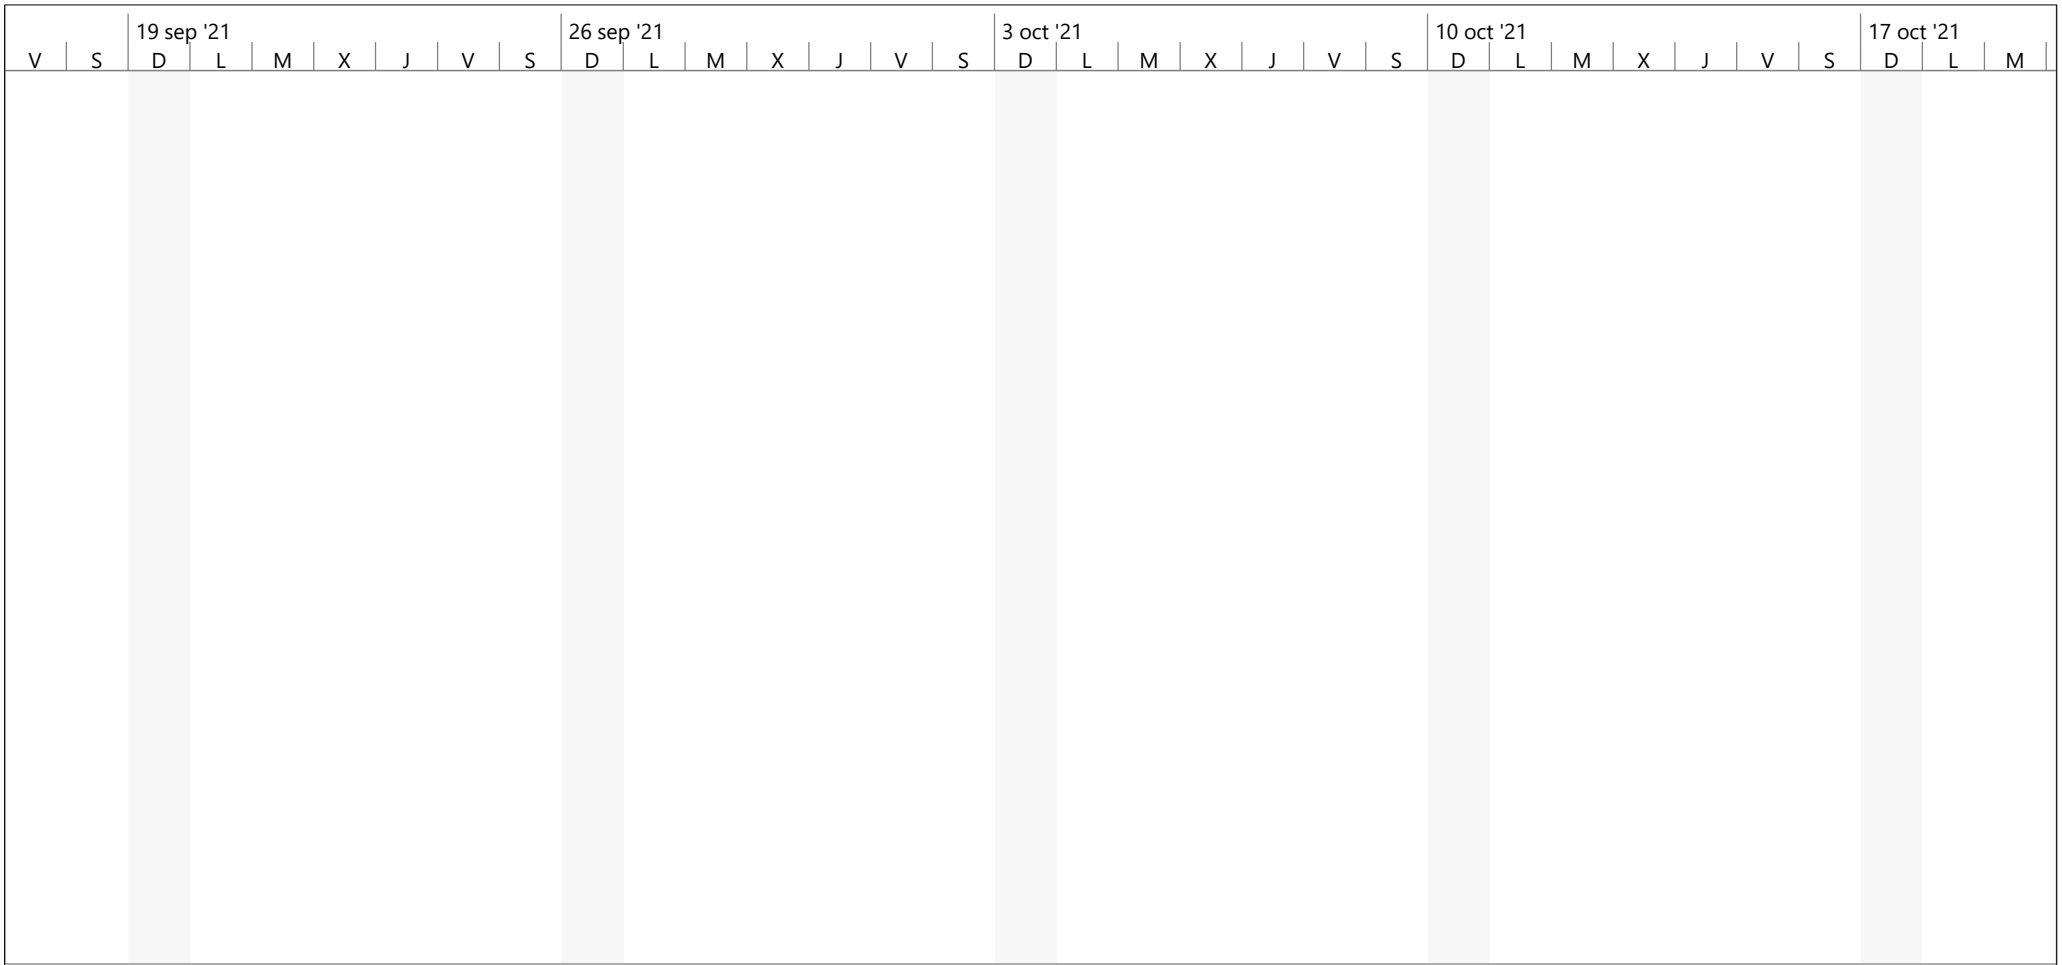


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

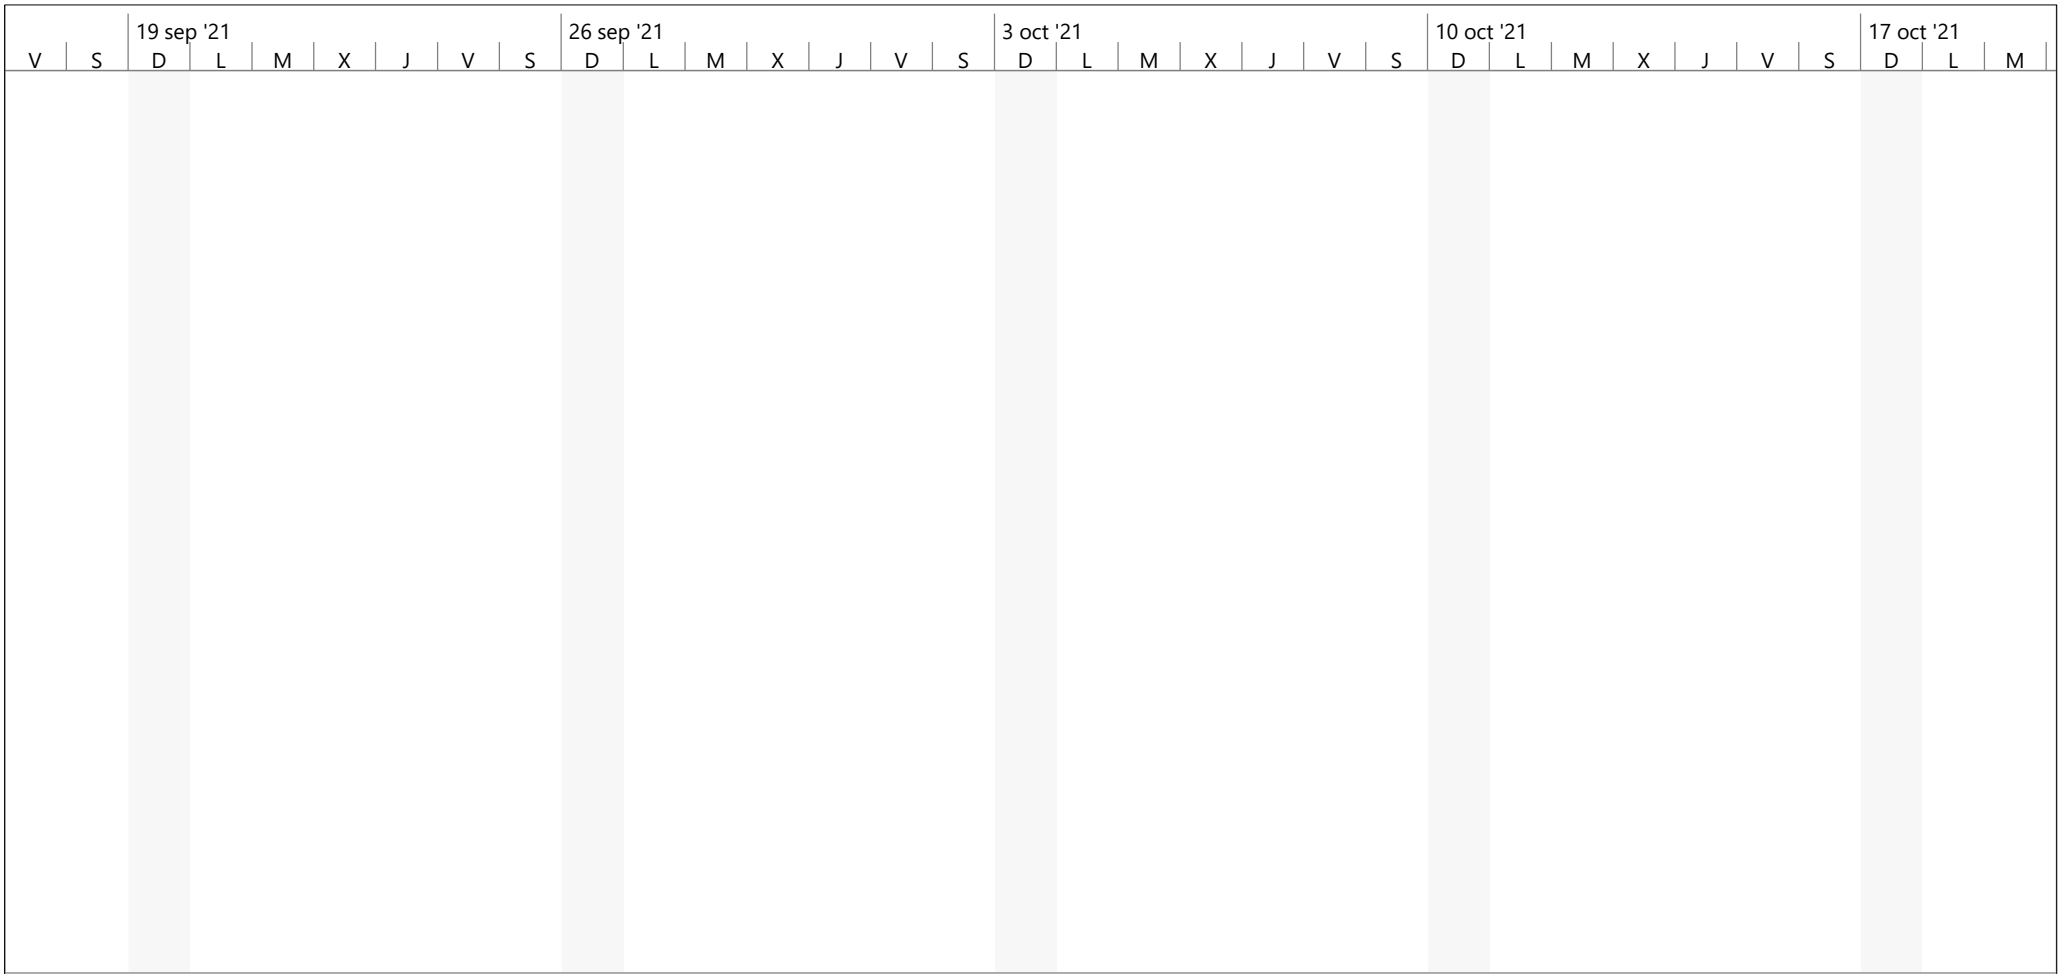


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



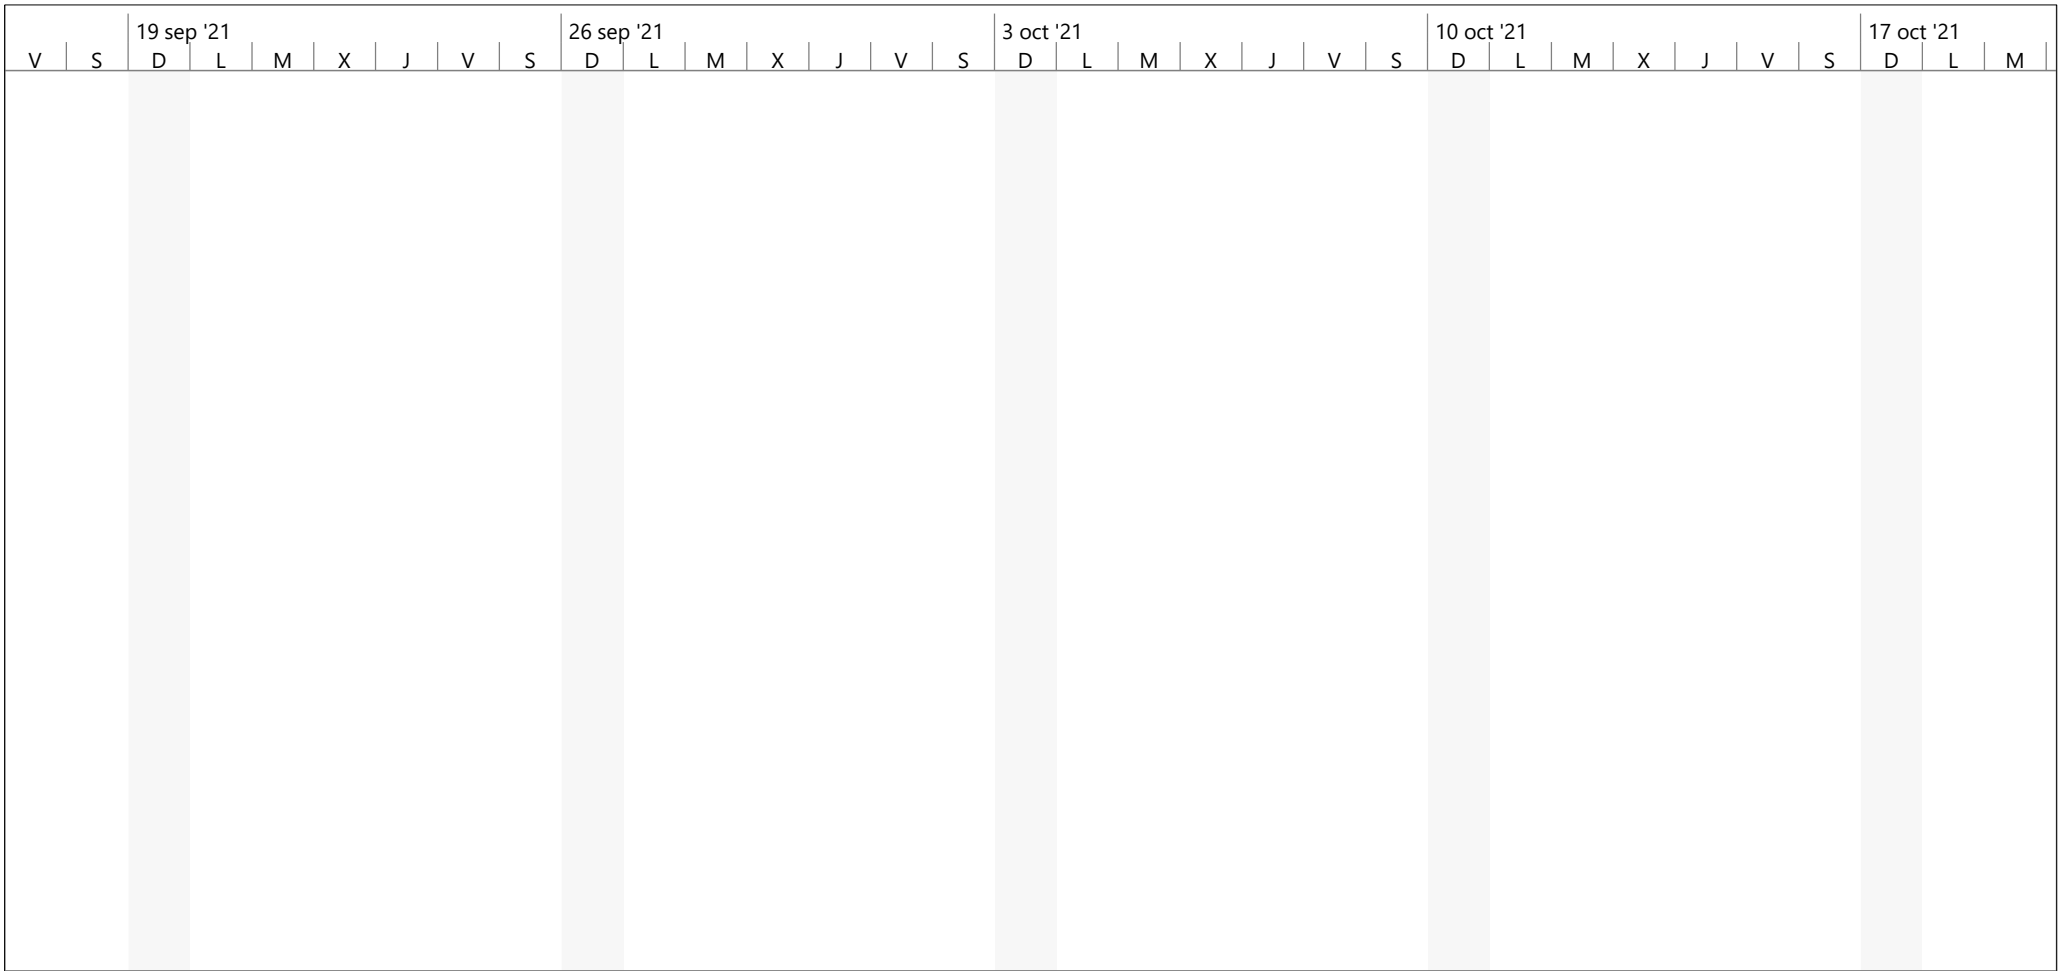


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



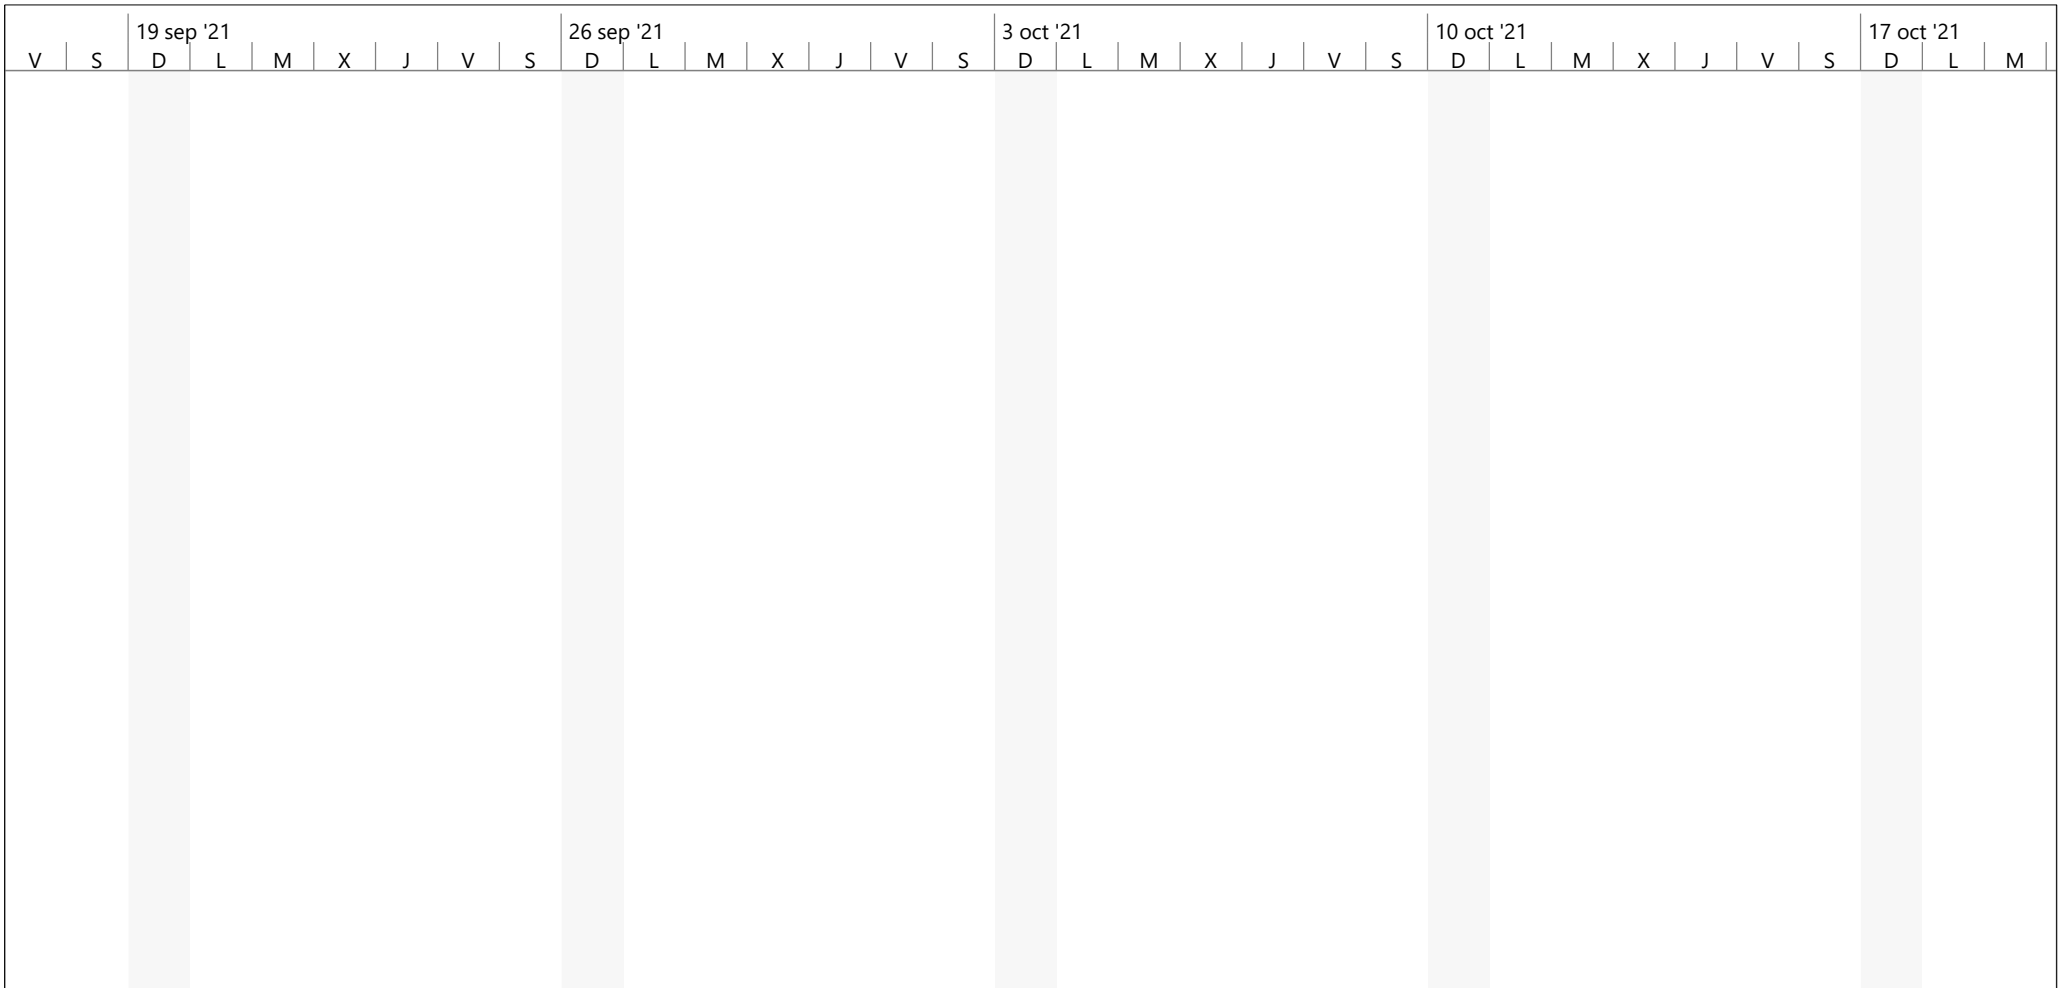


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

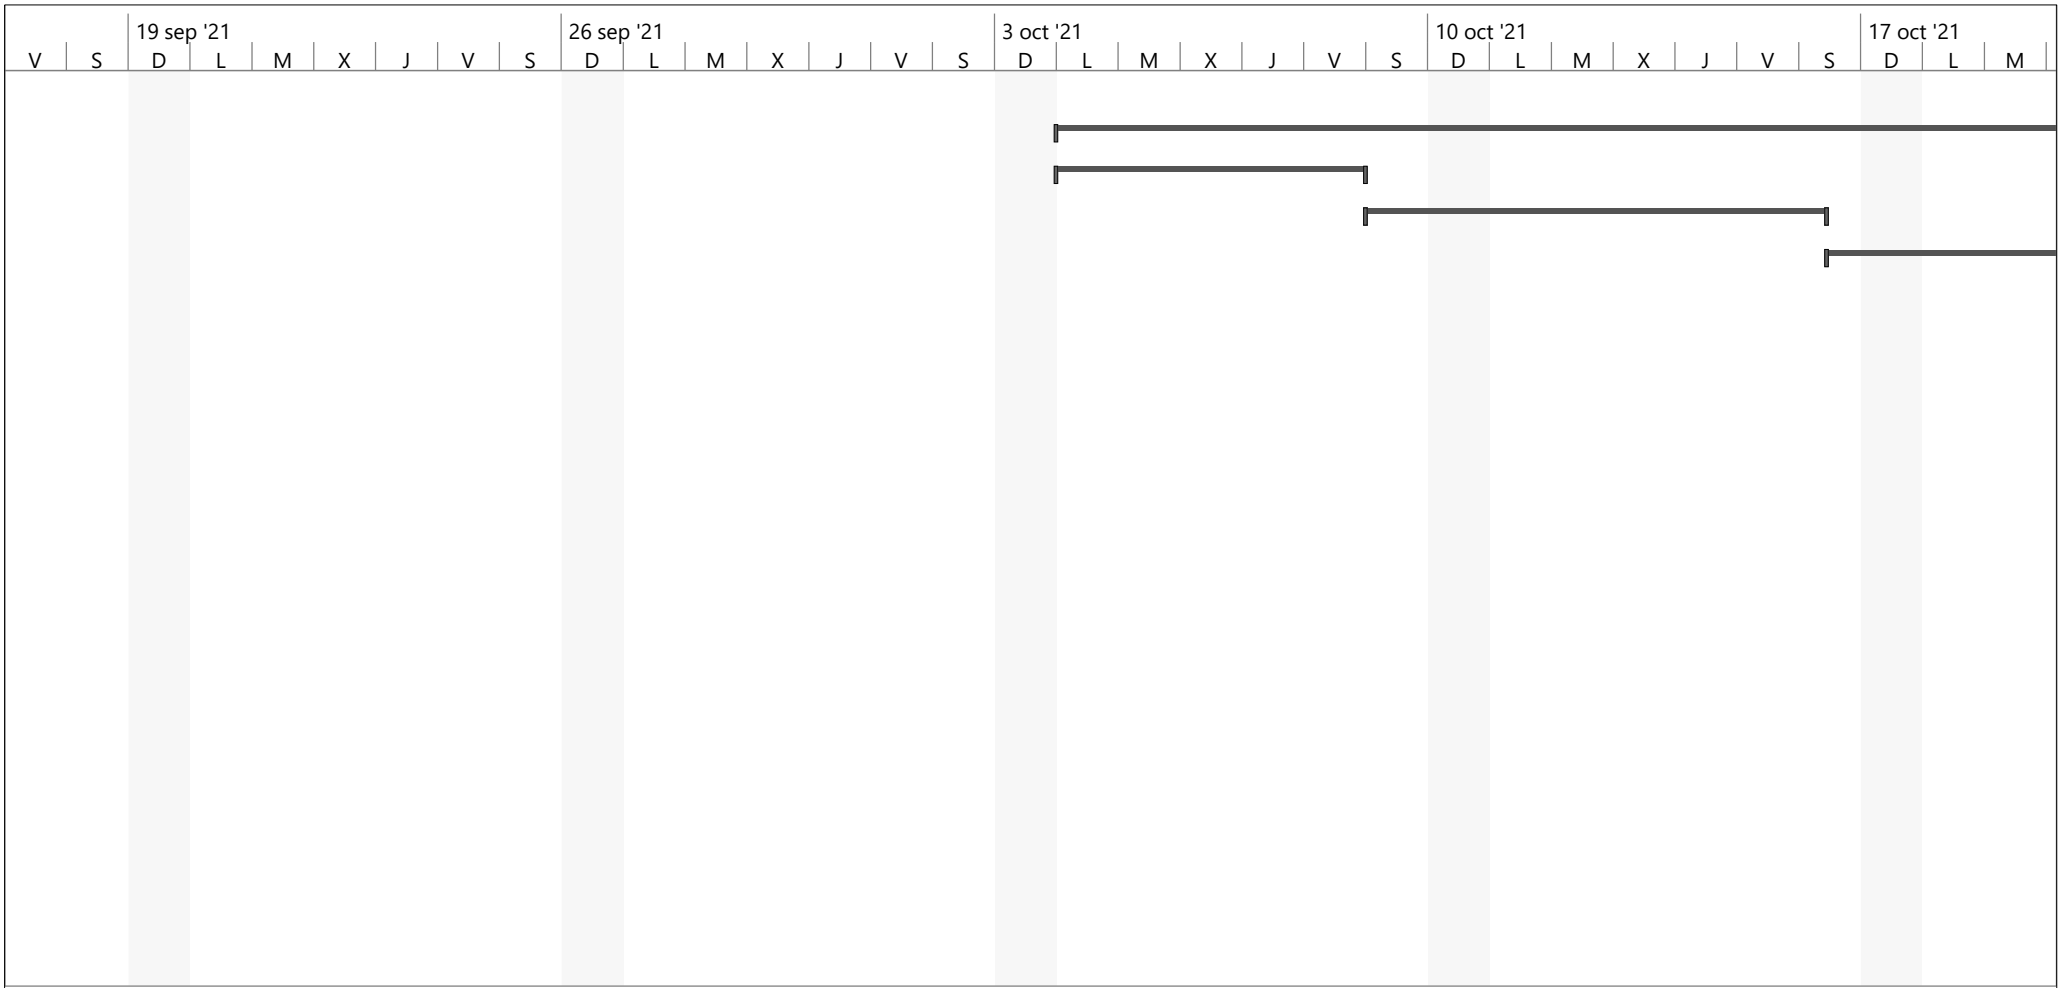


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

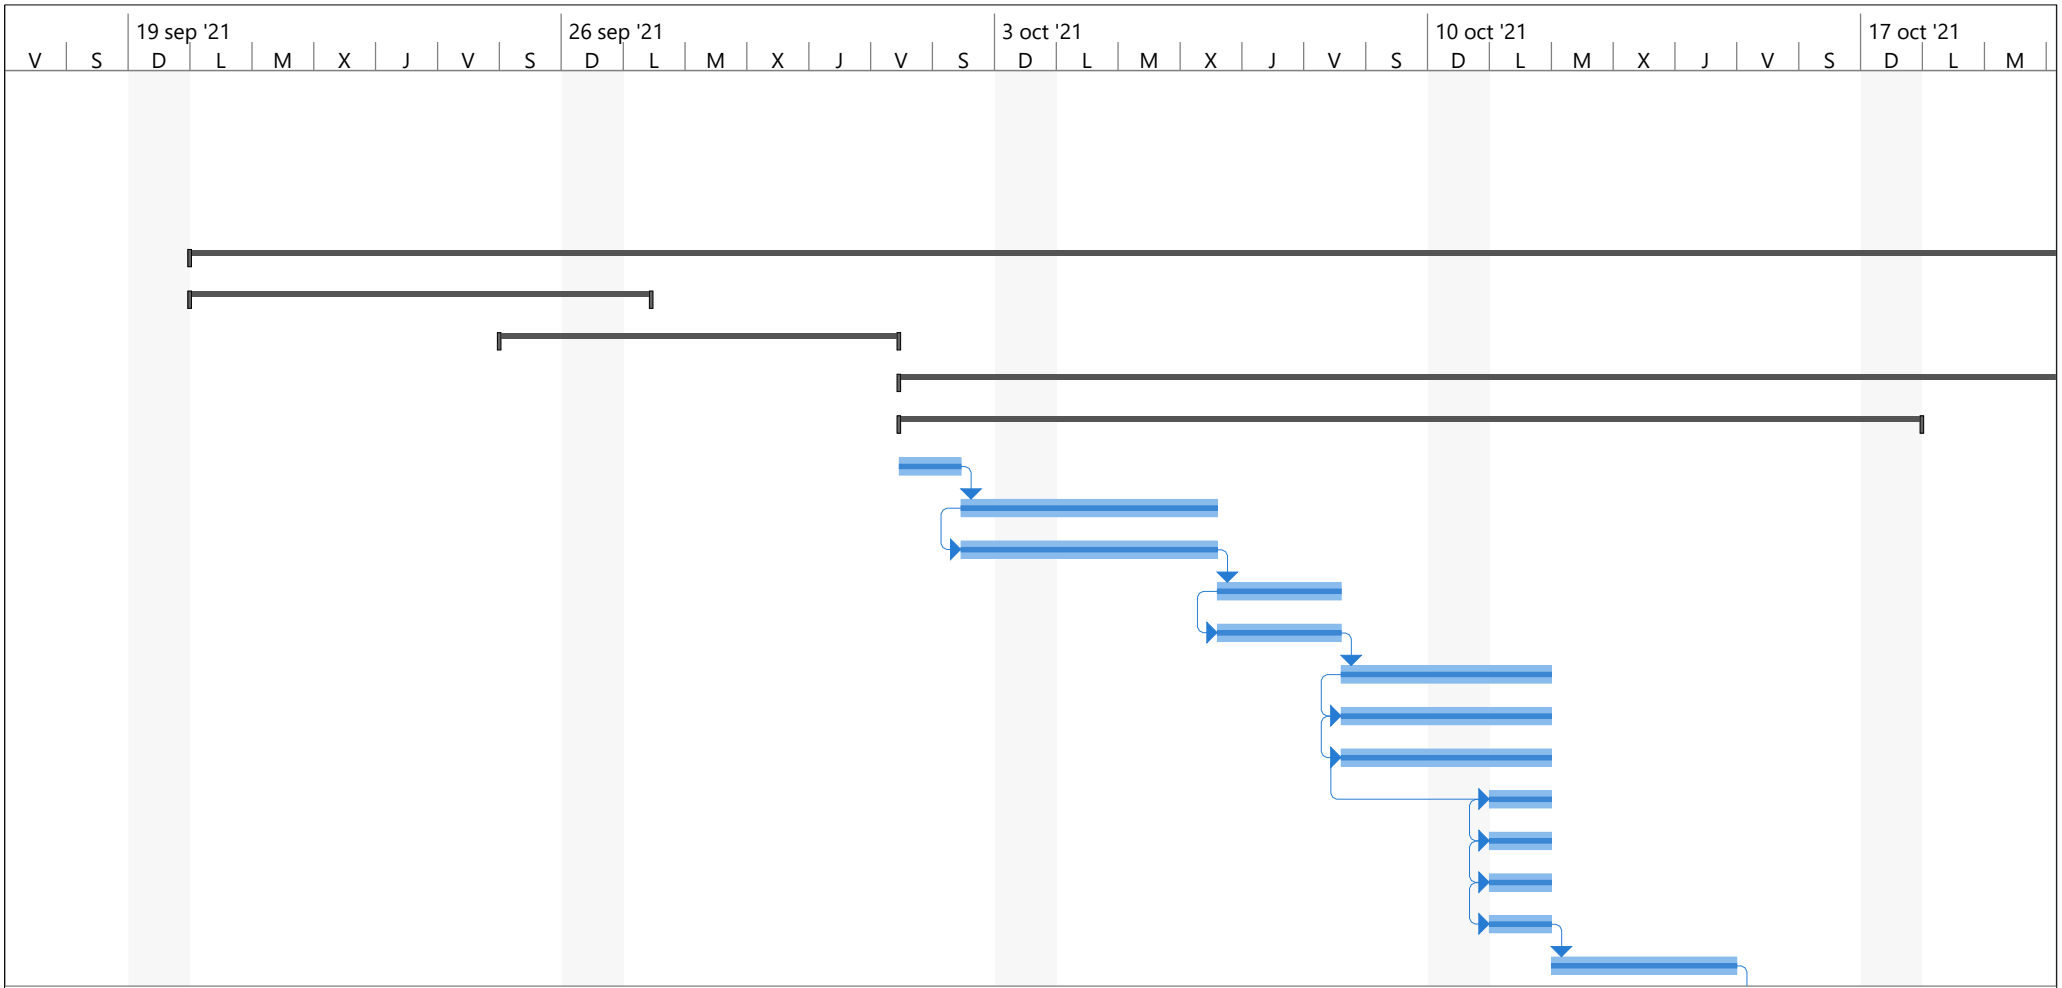


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

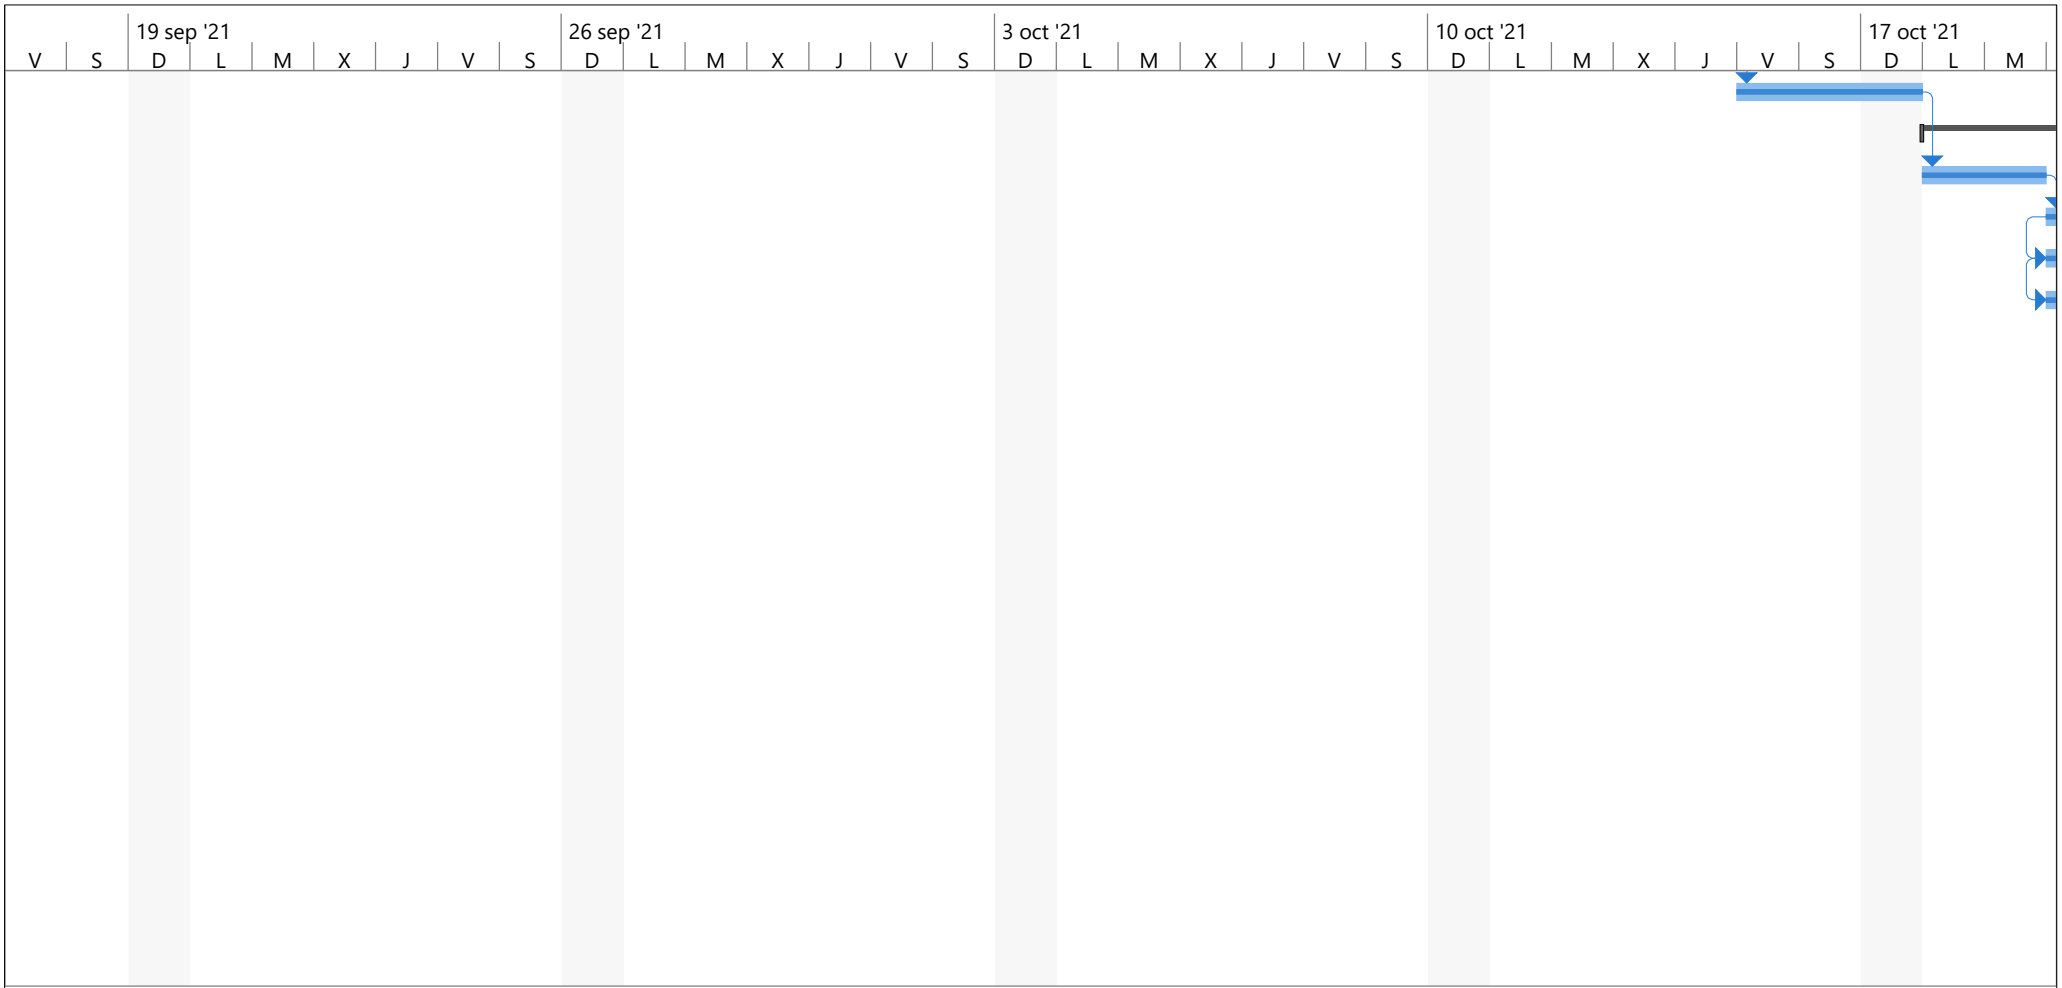


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

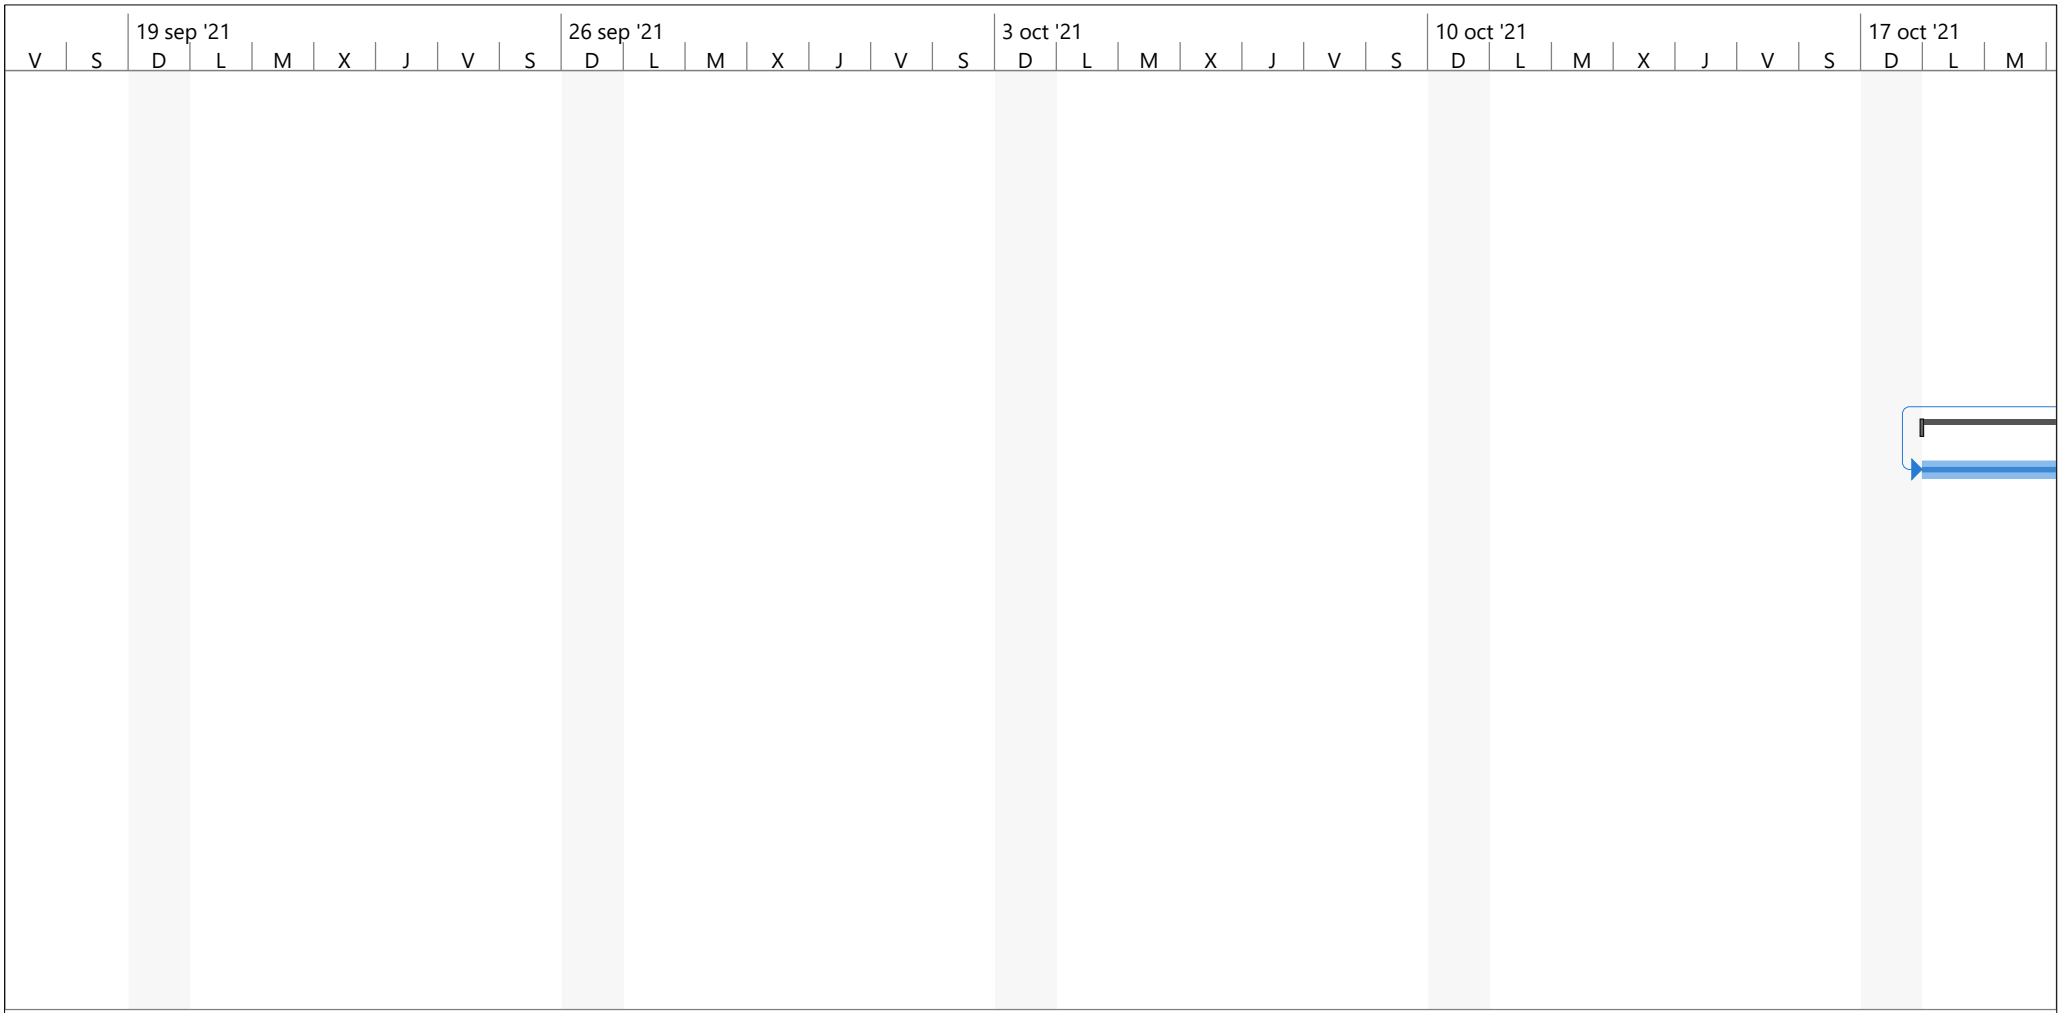


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

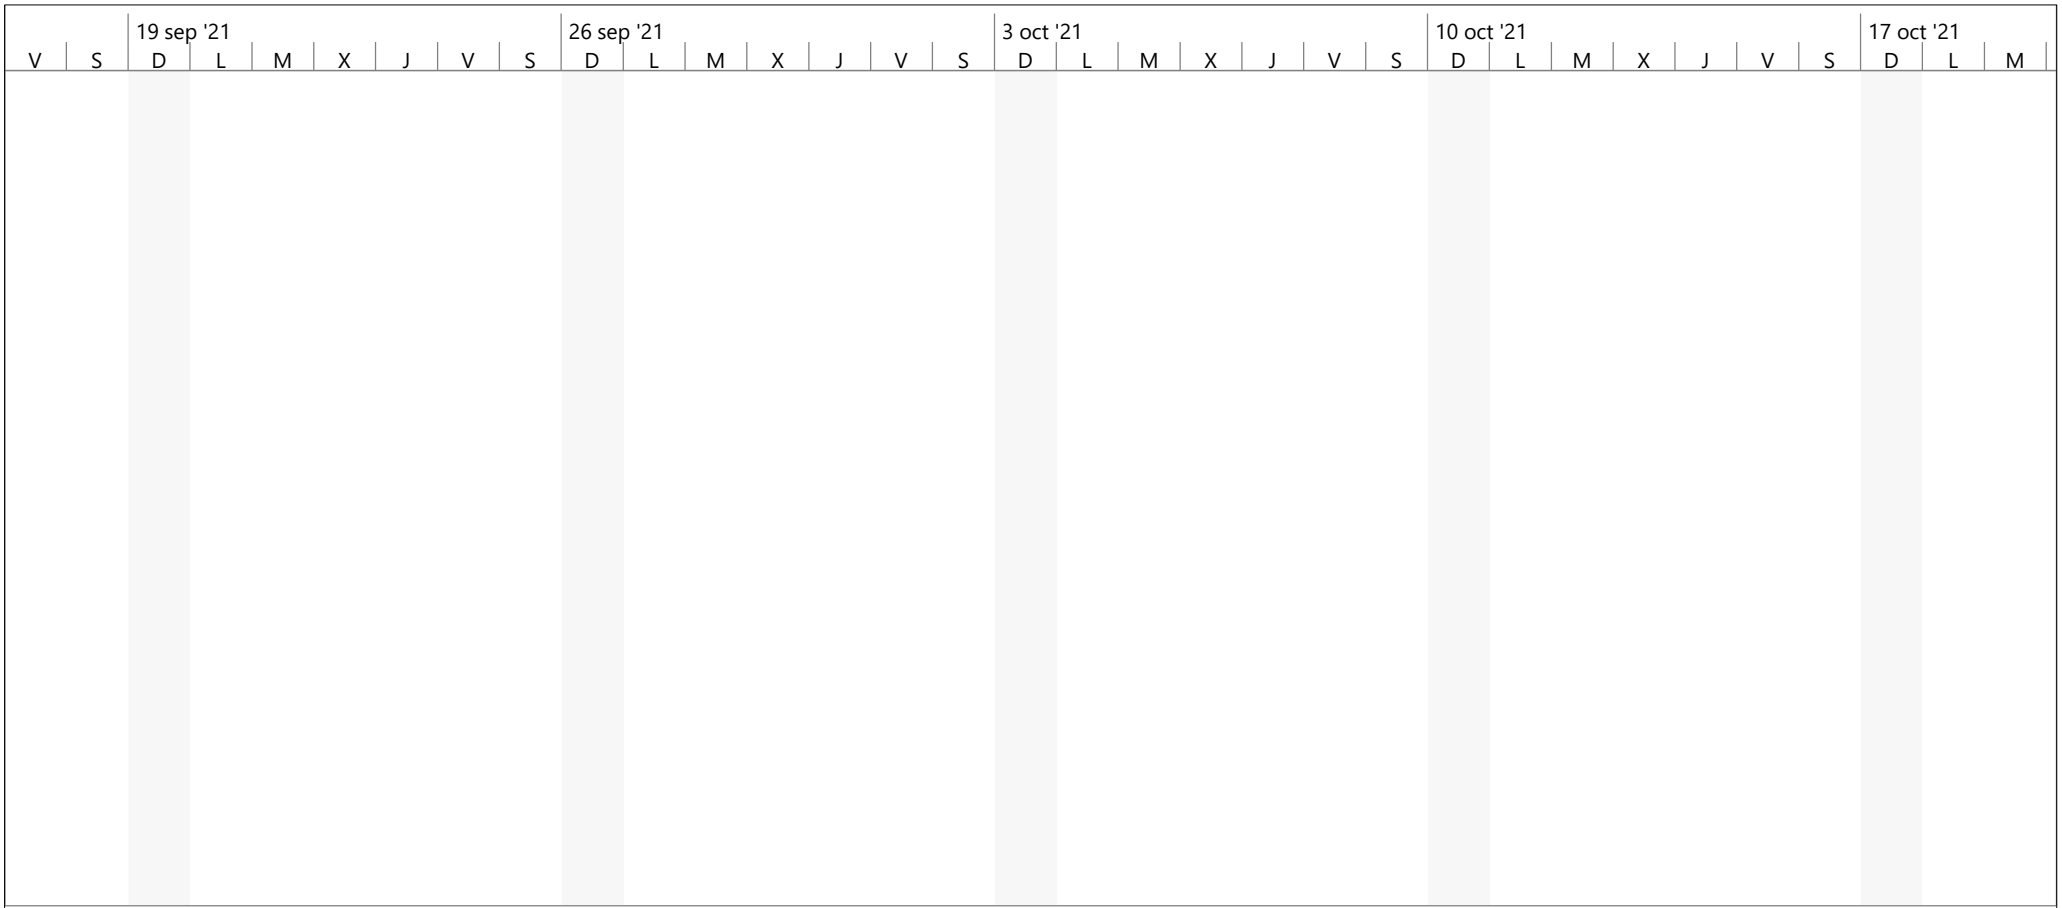


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



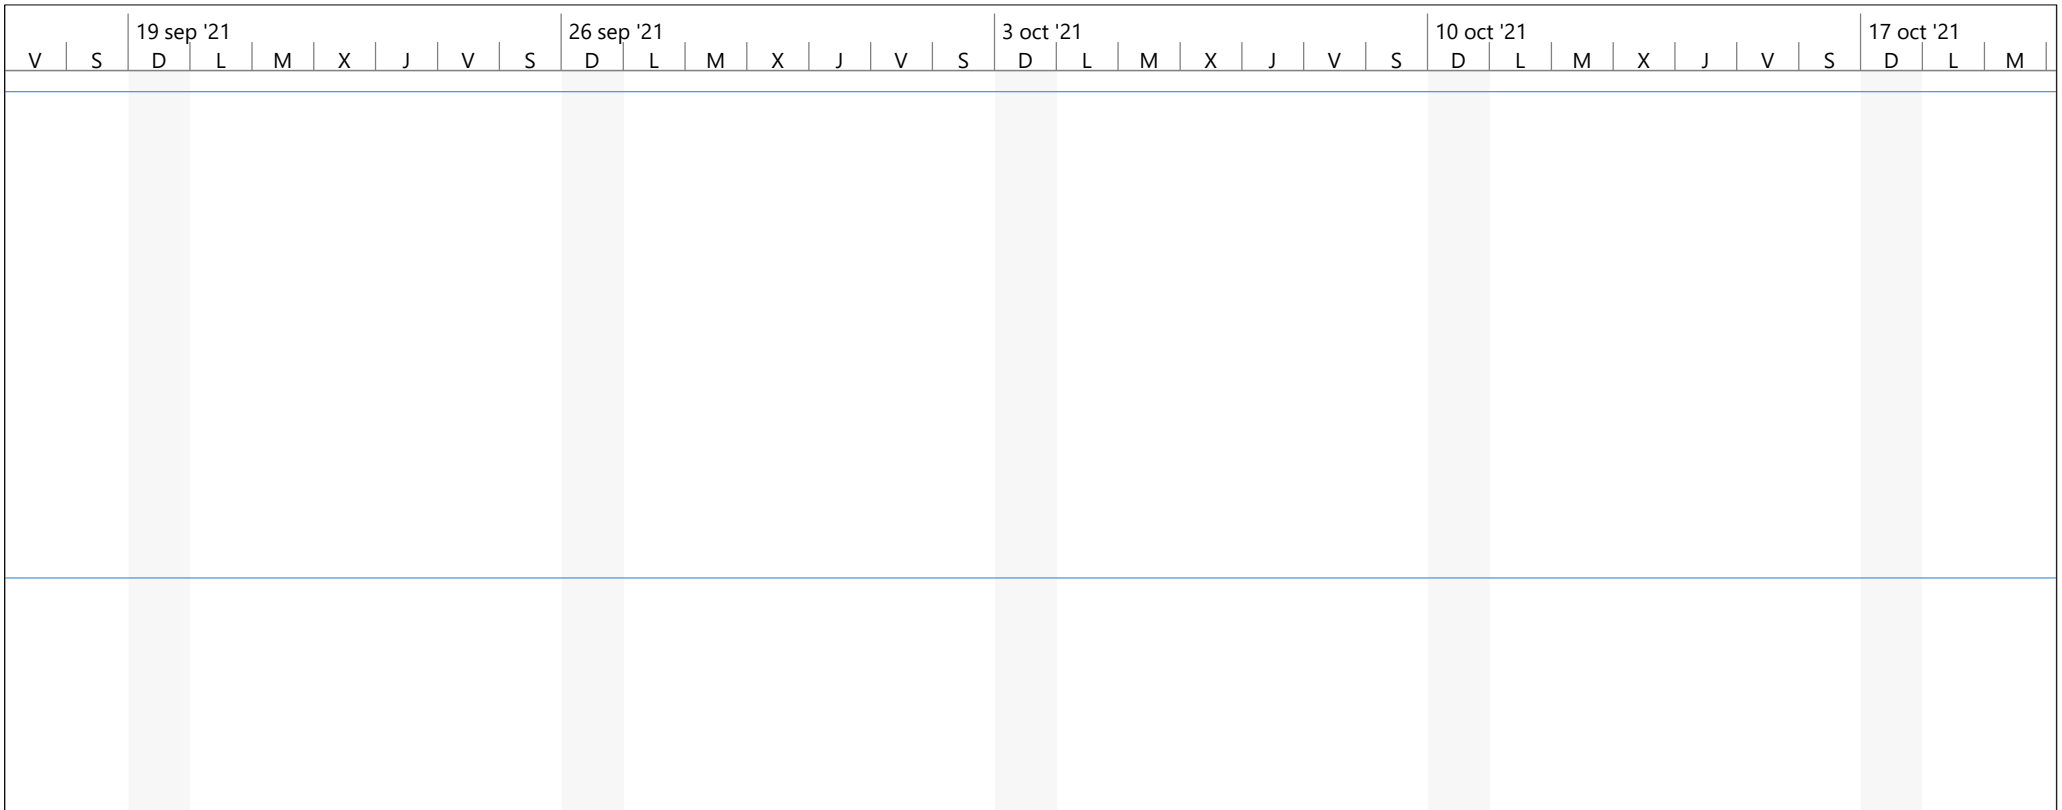


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

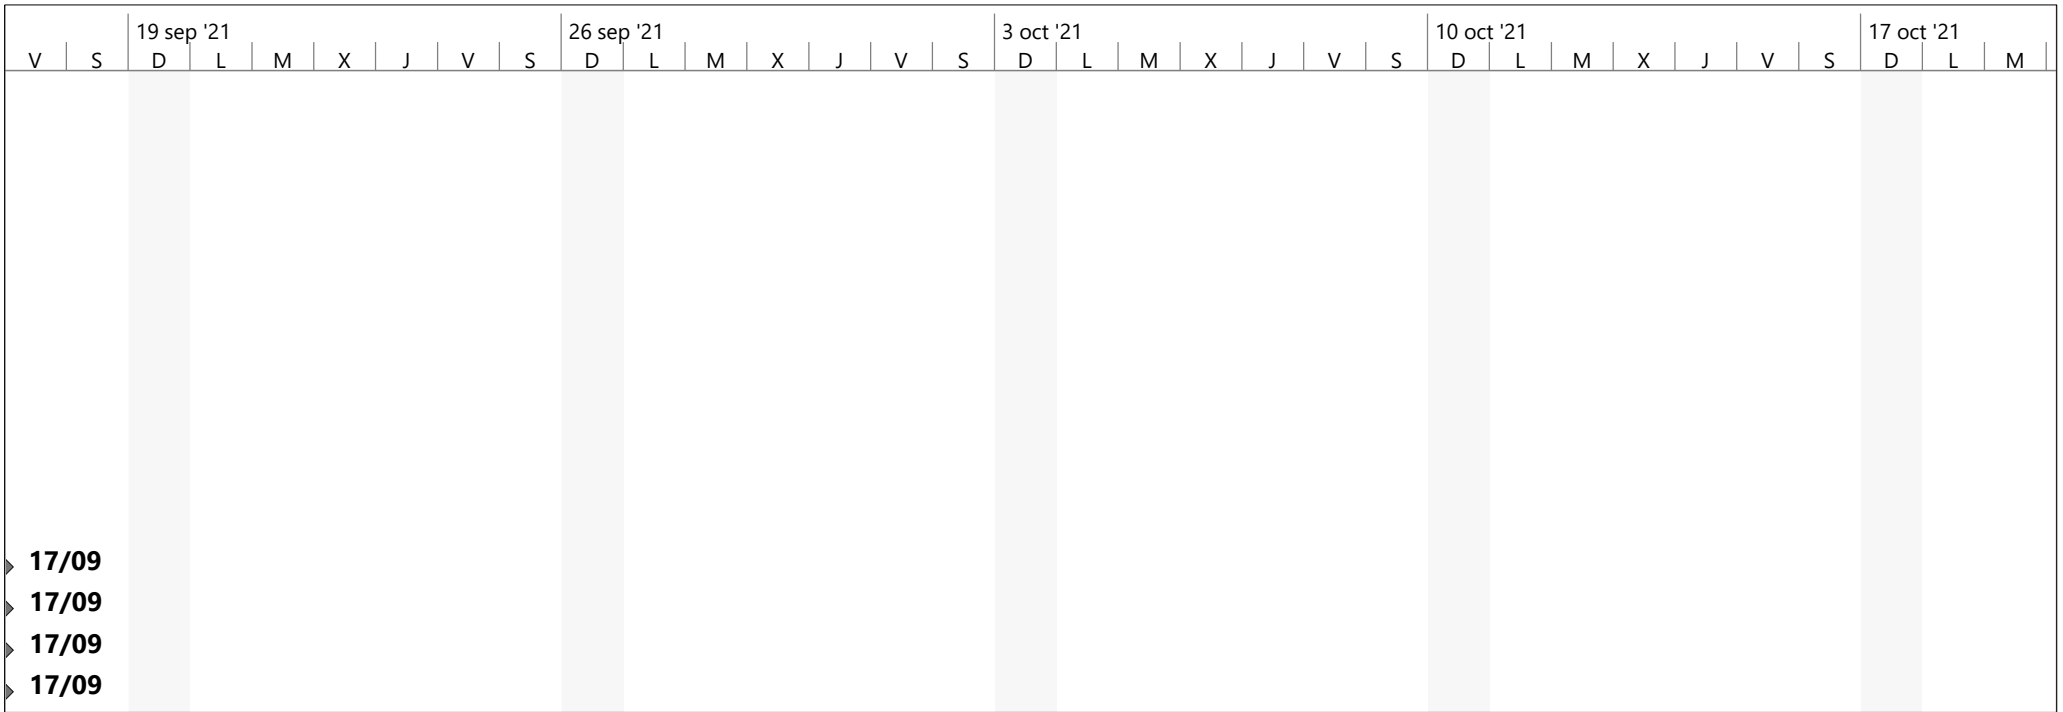


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21



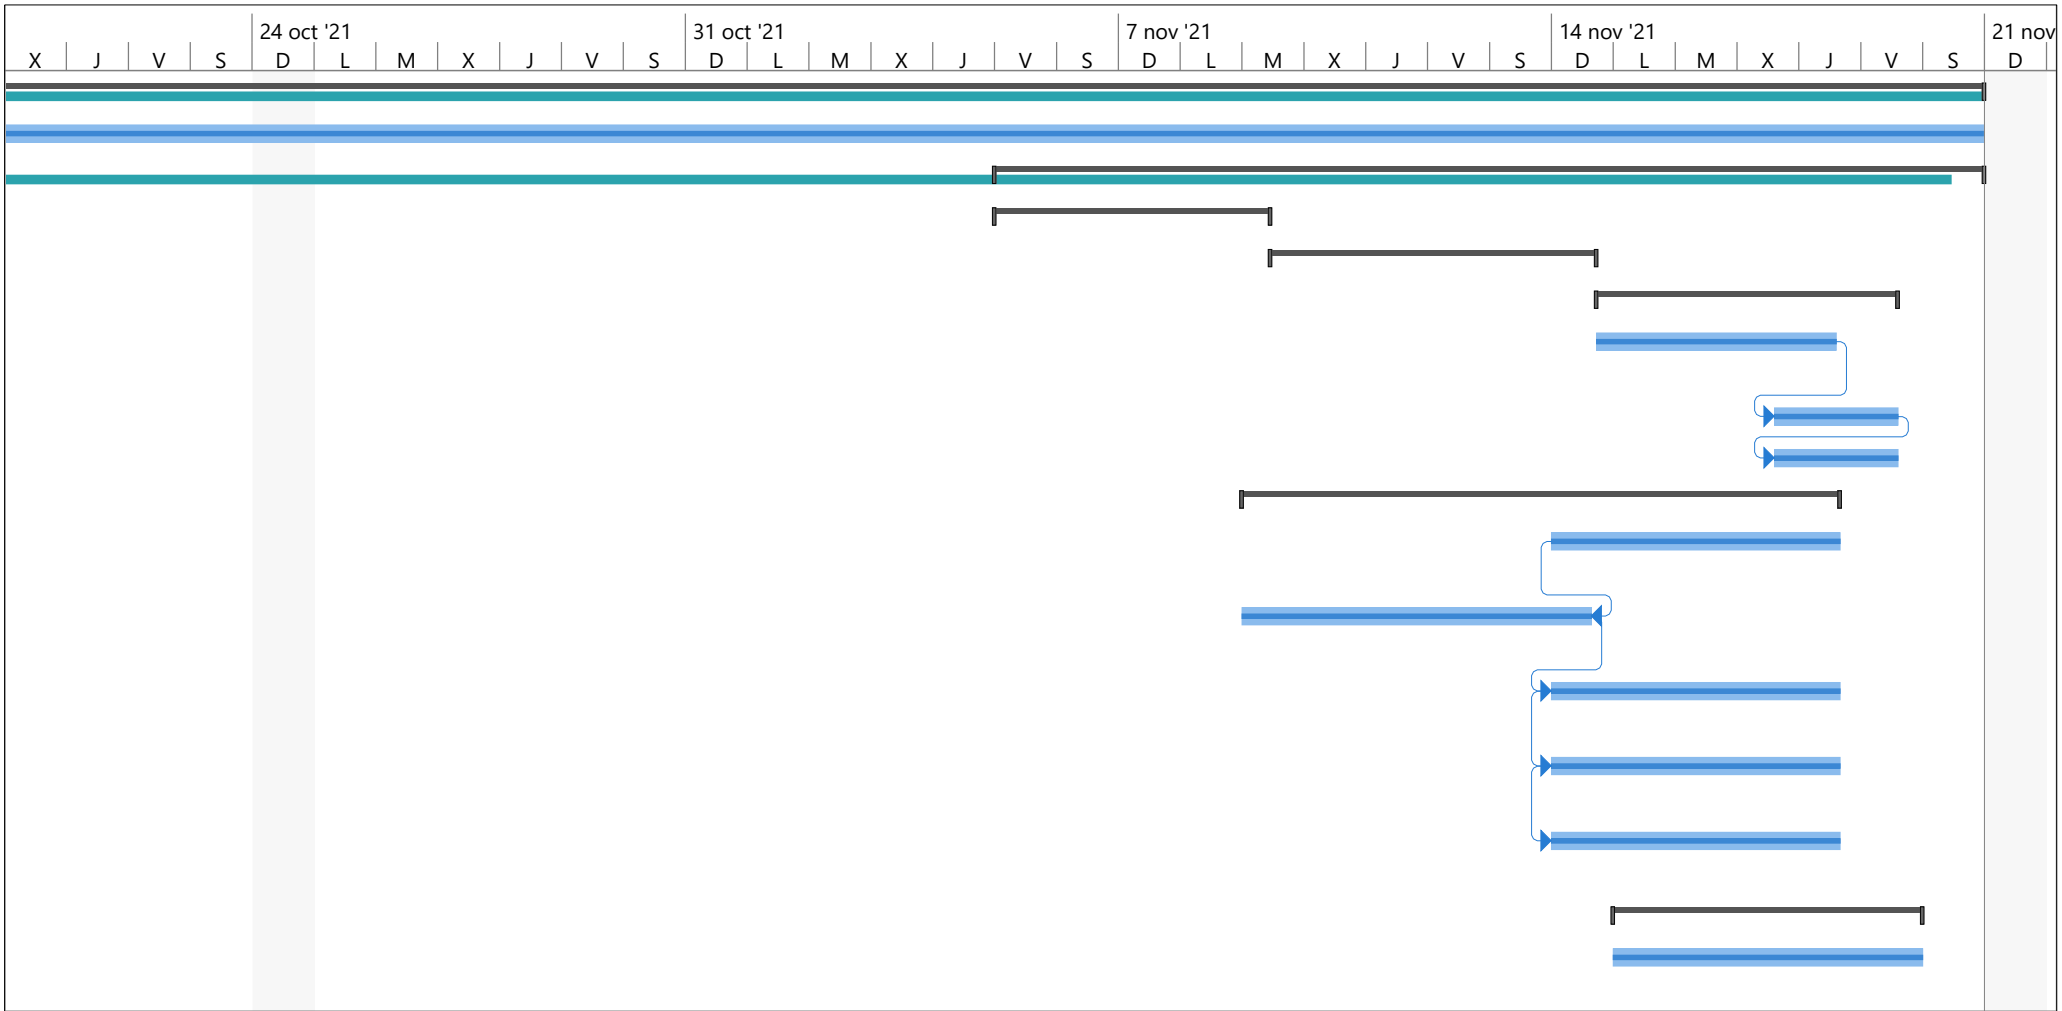


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

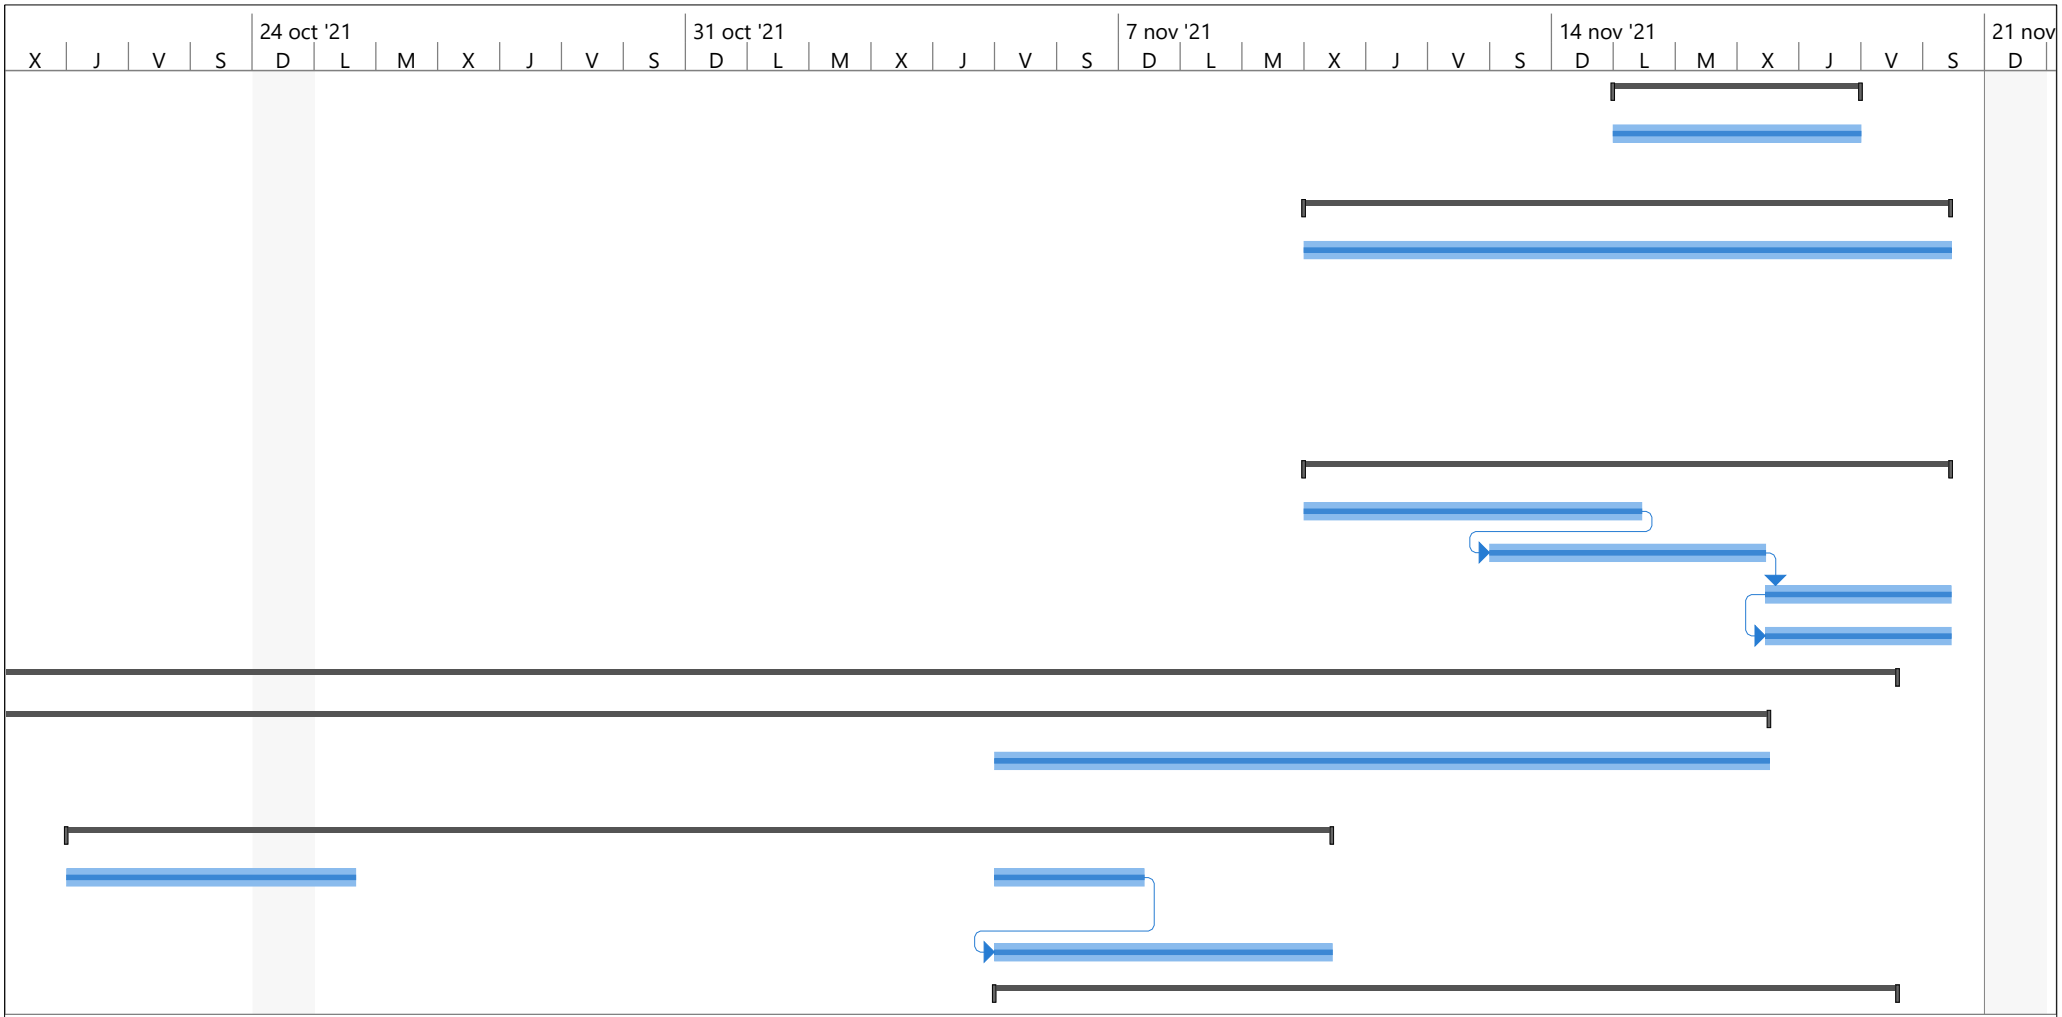


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

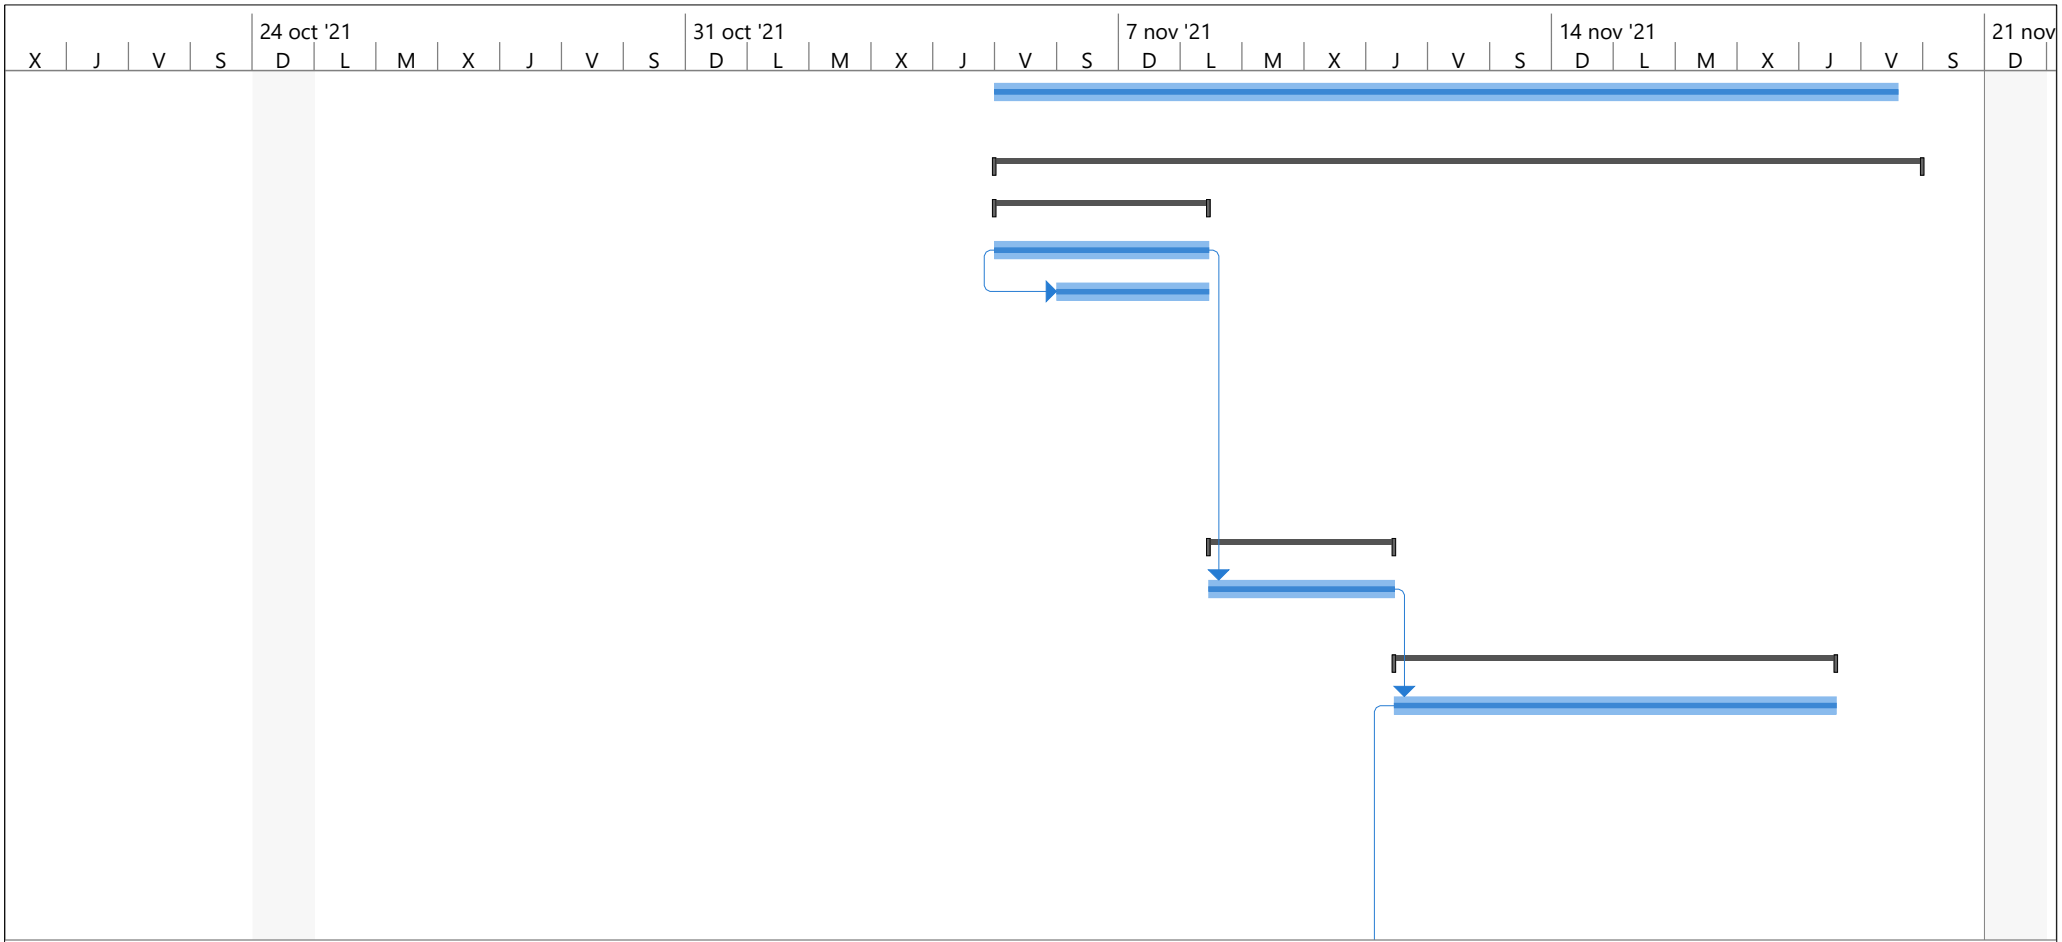


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

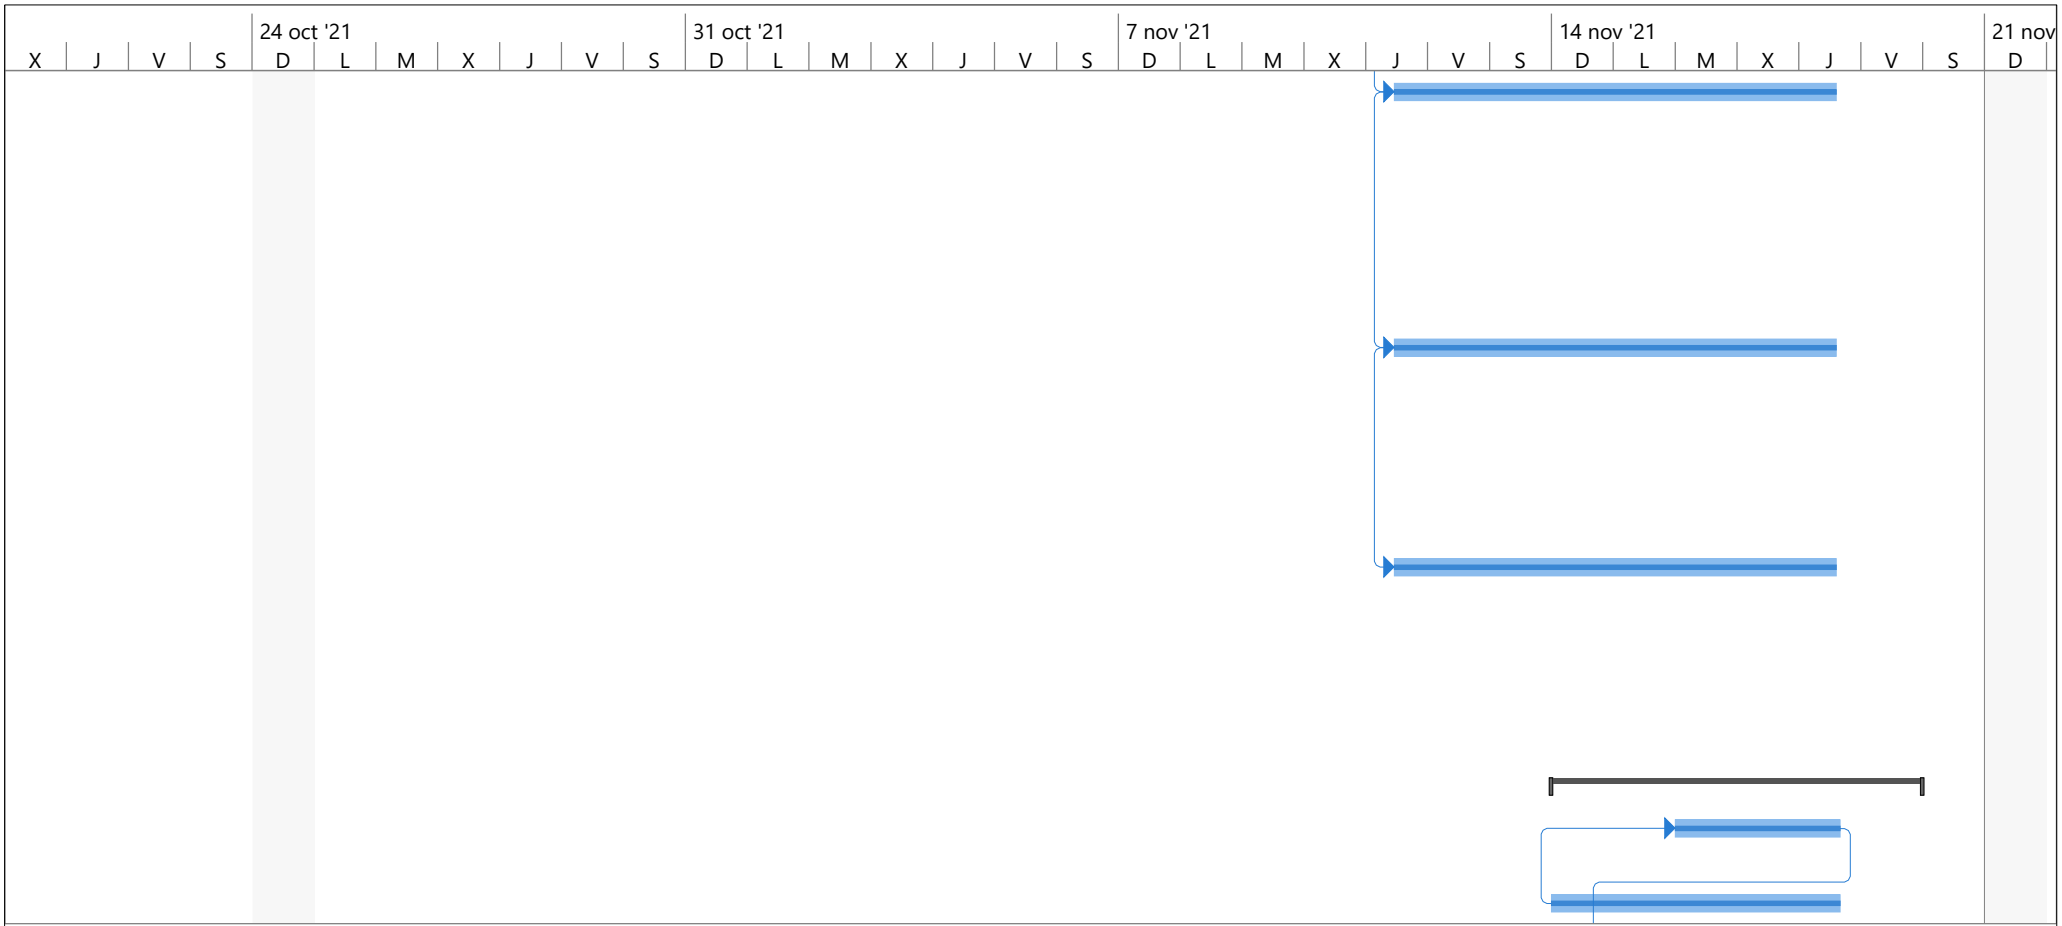


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

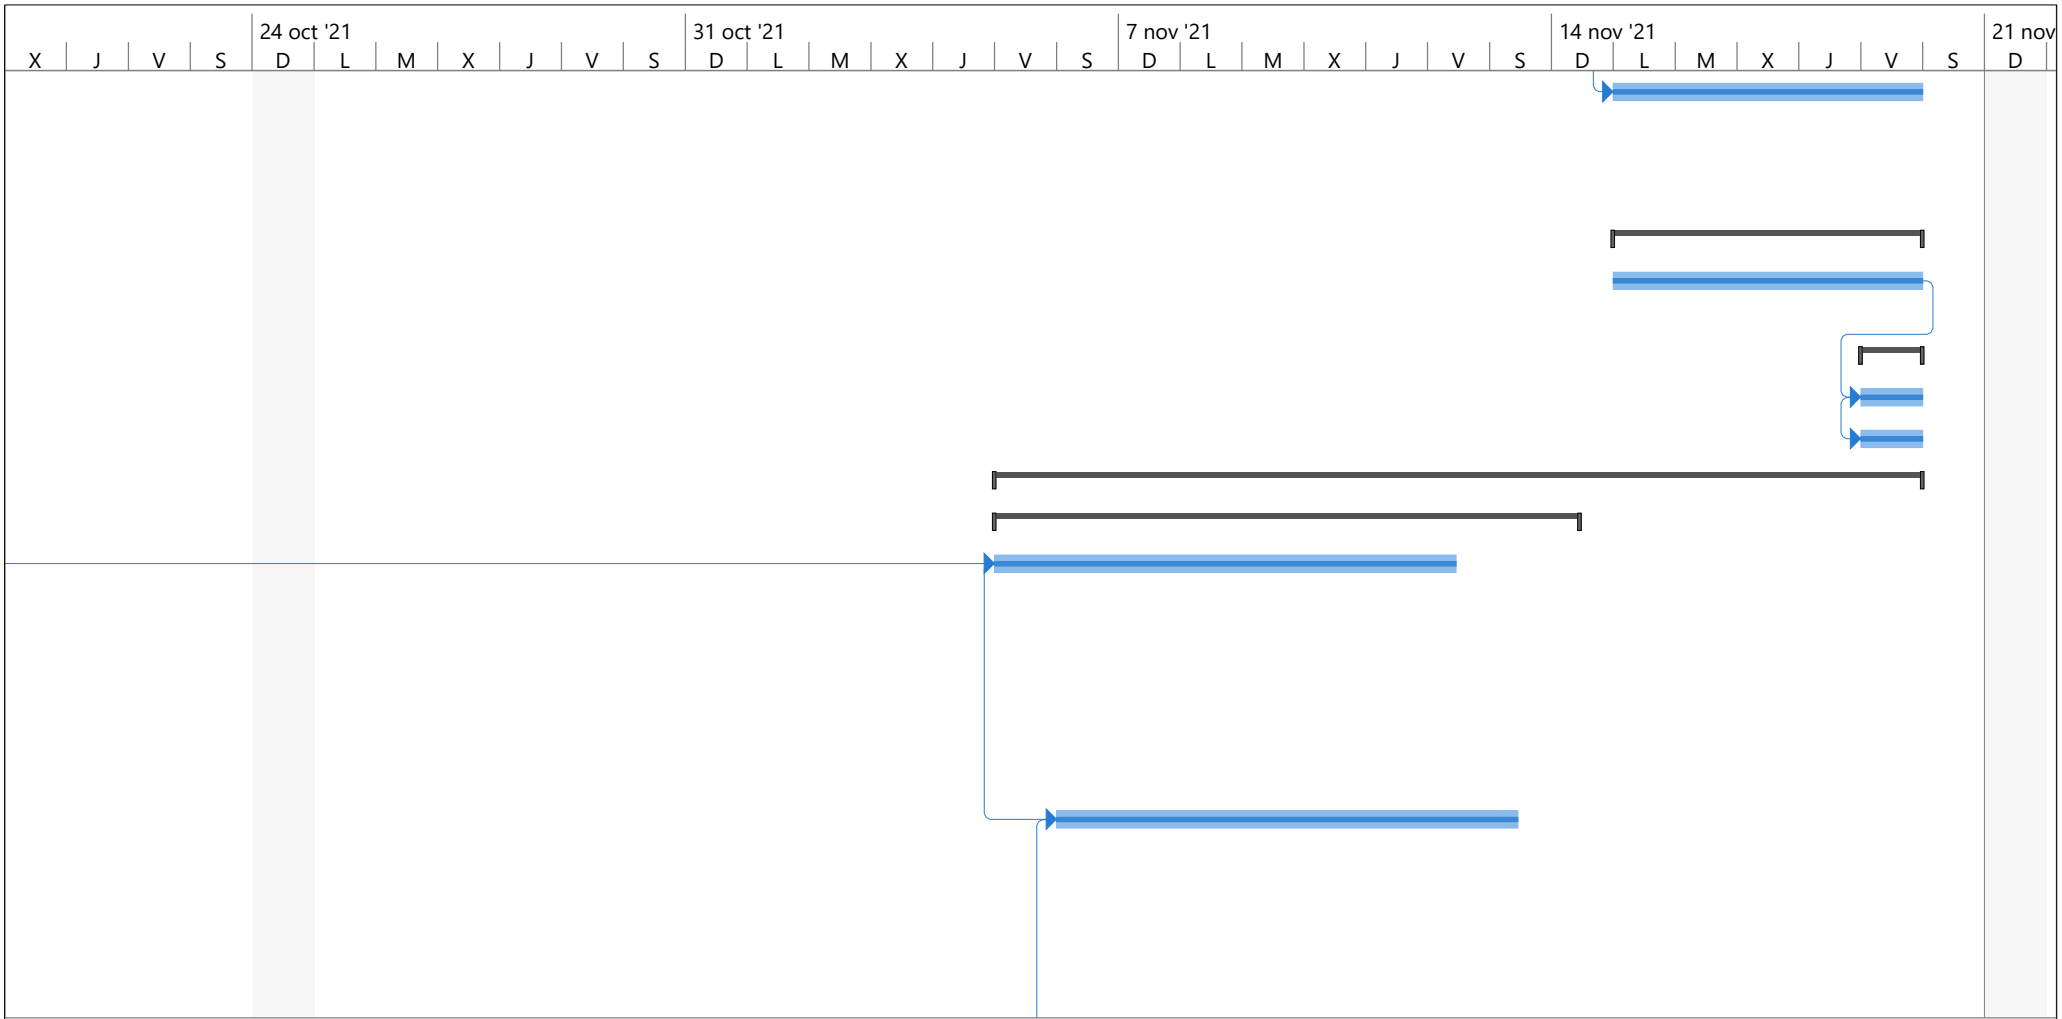


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

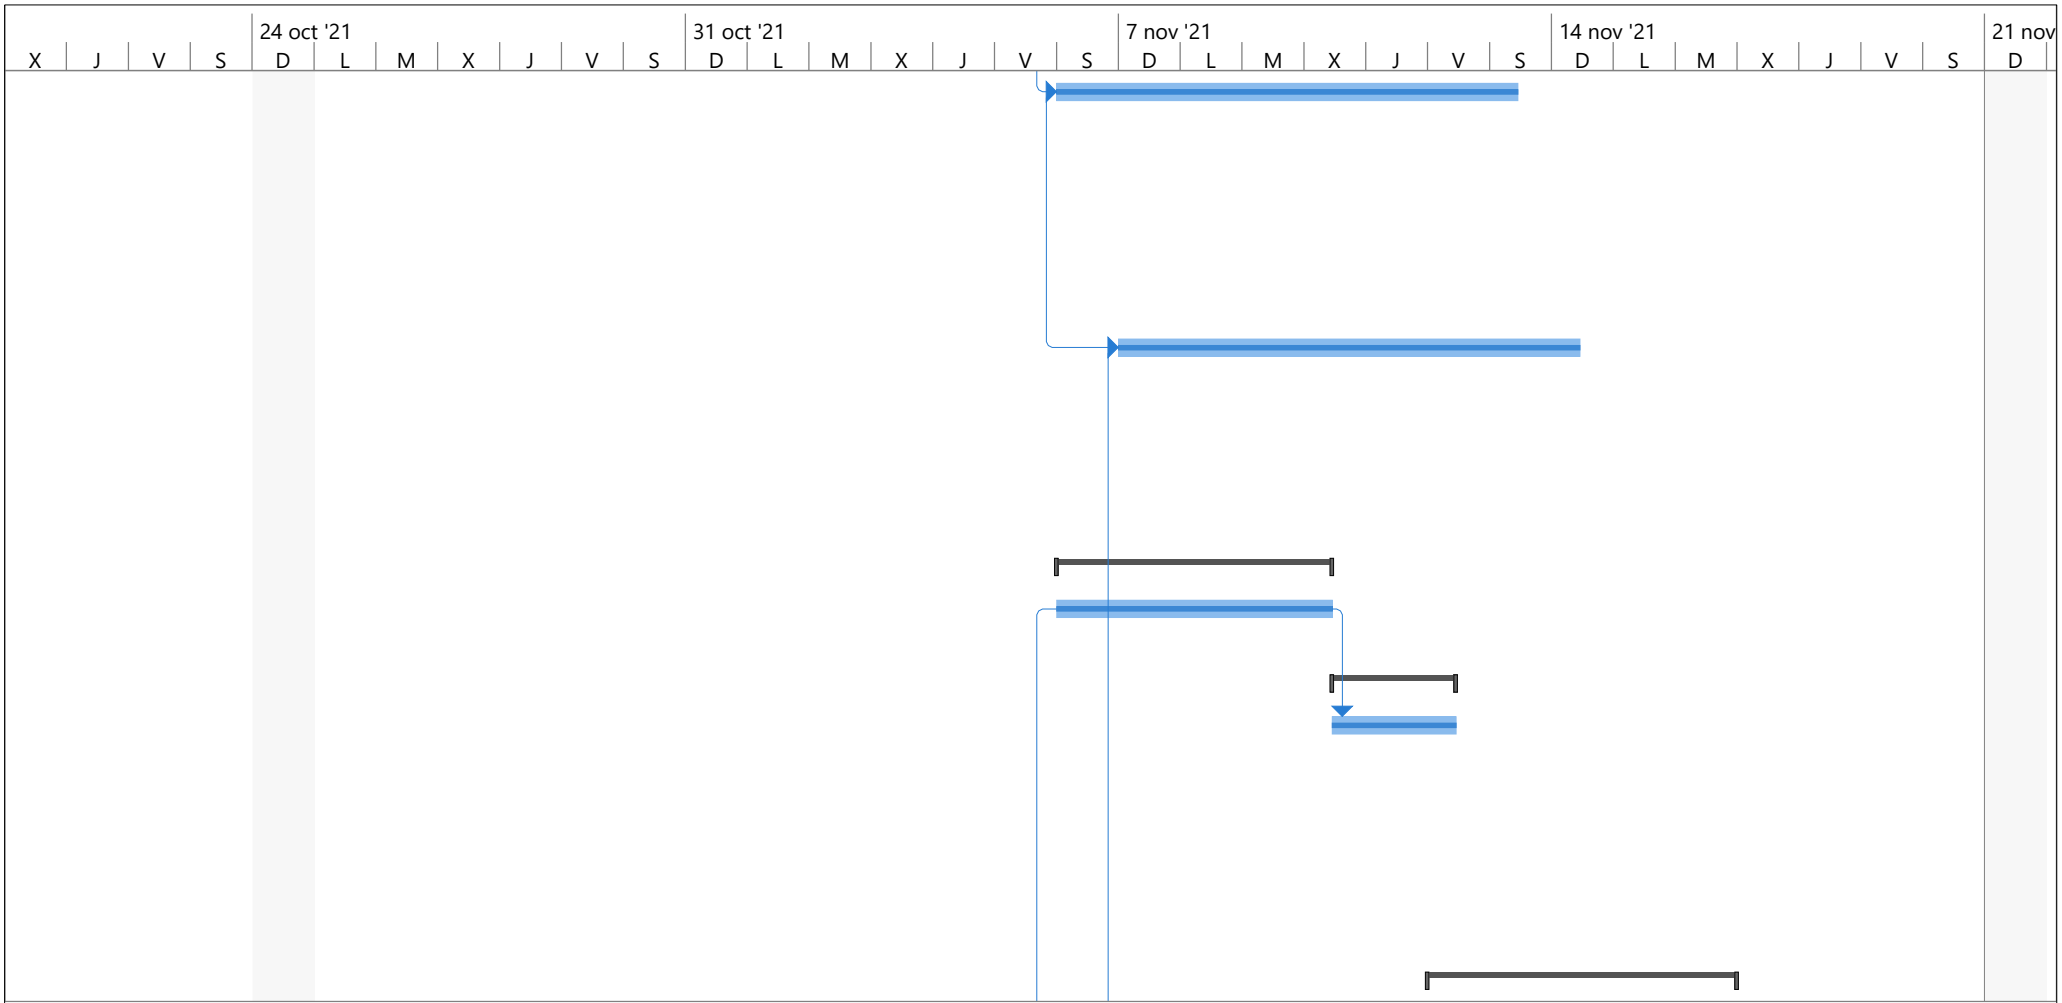


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

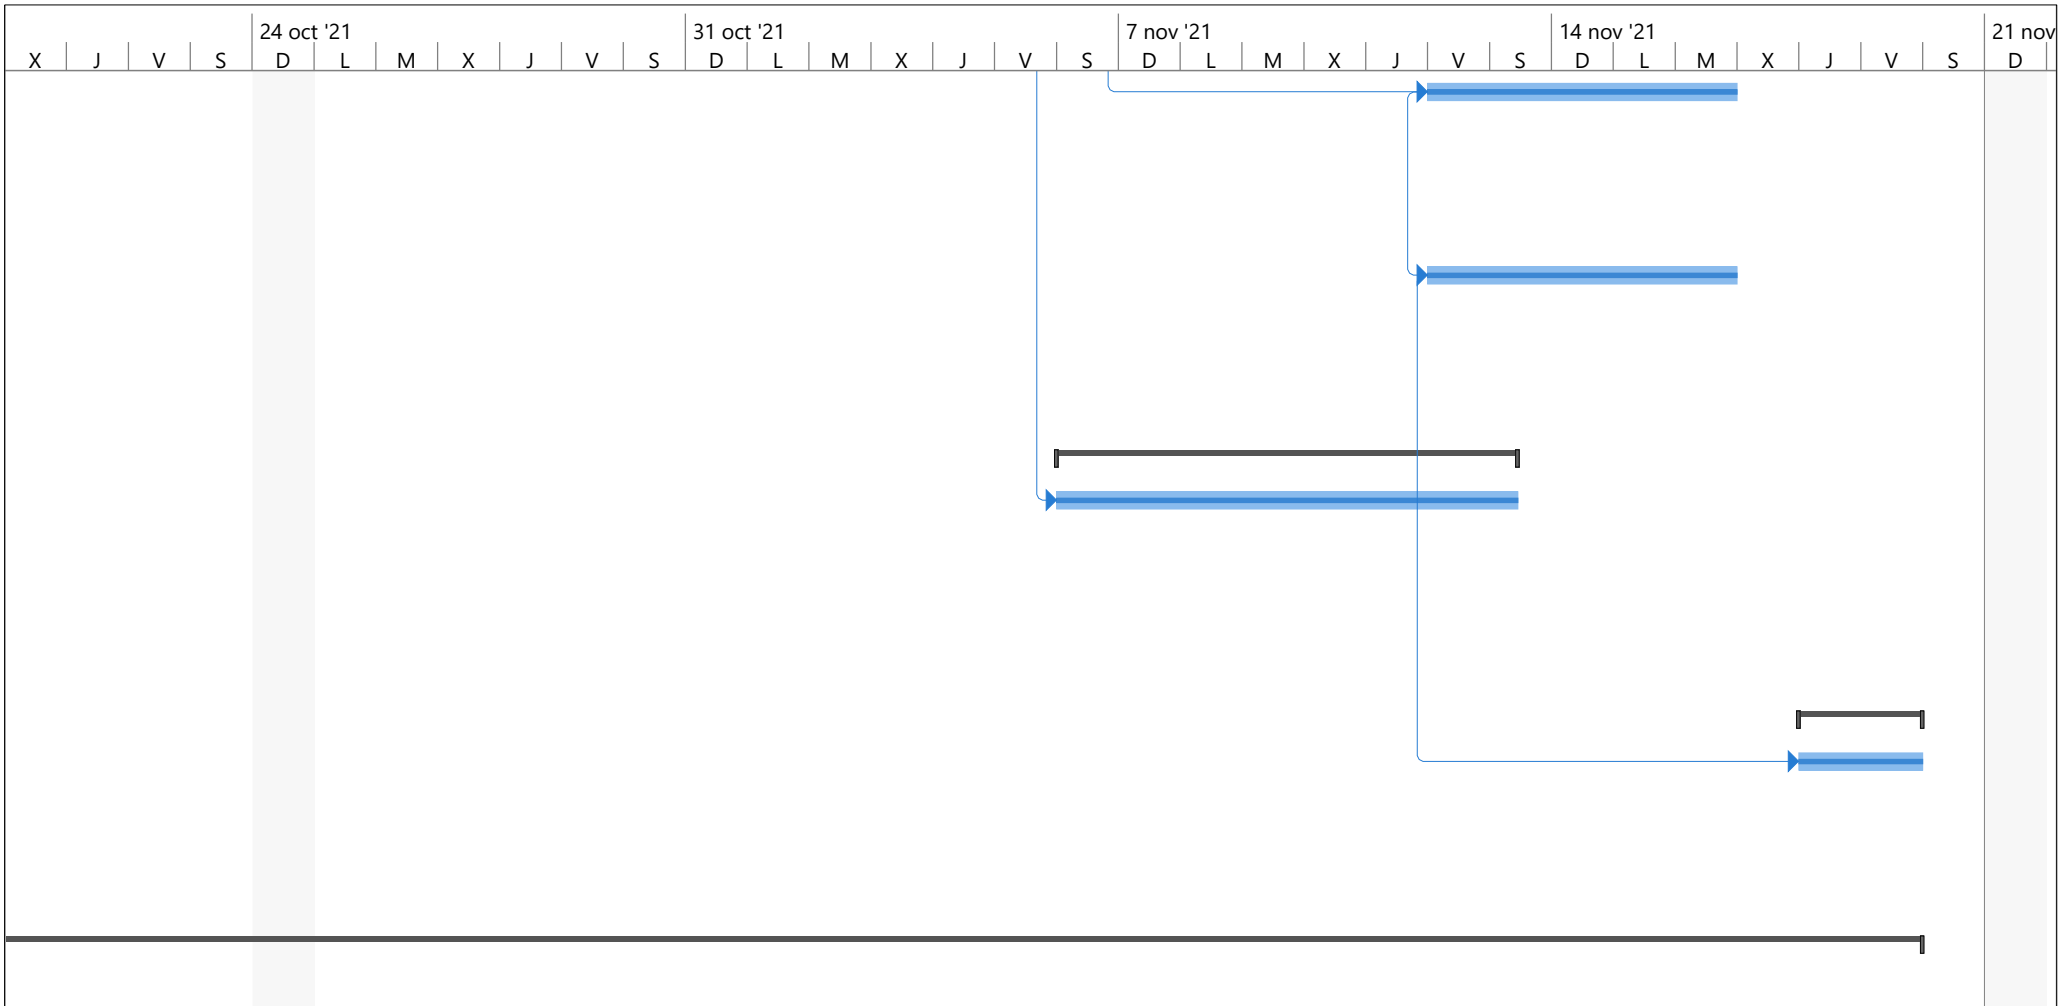


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

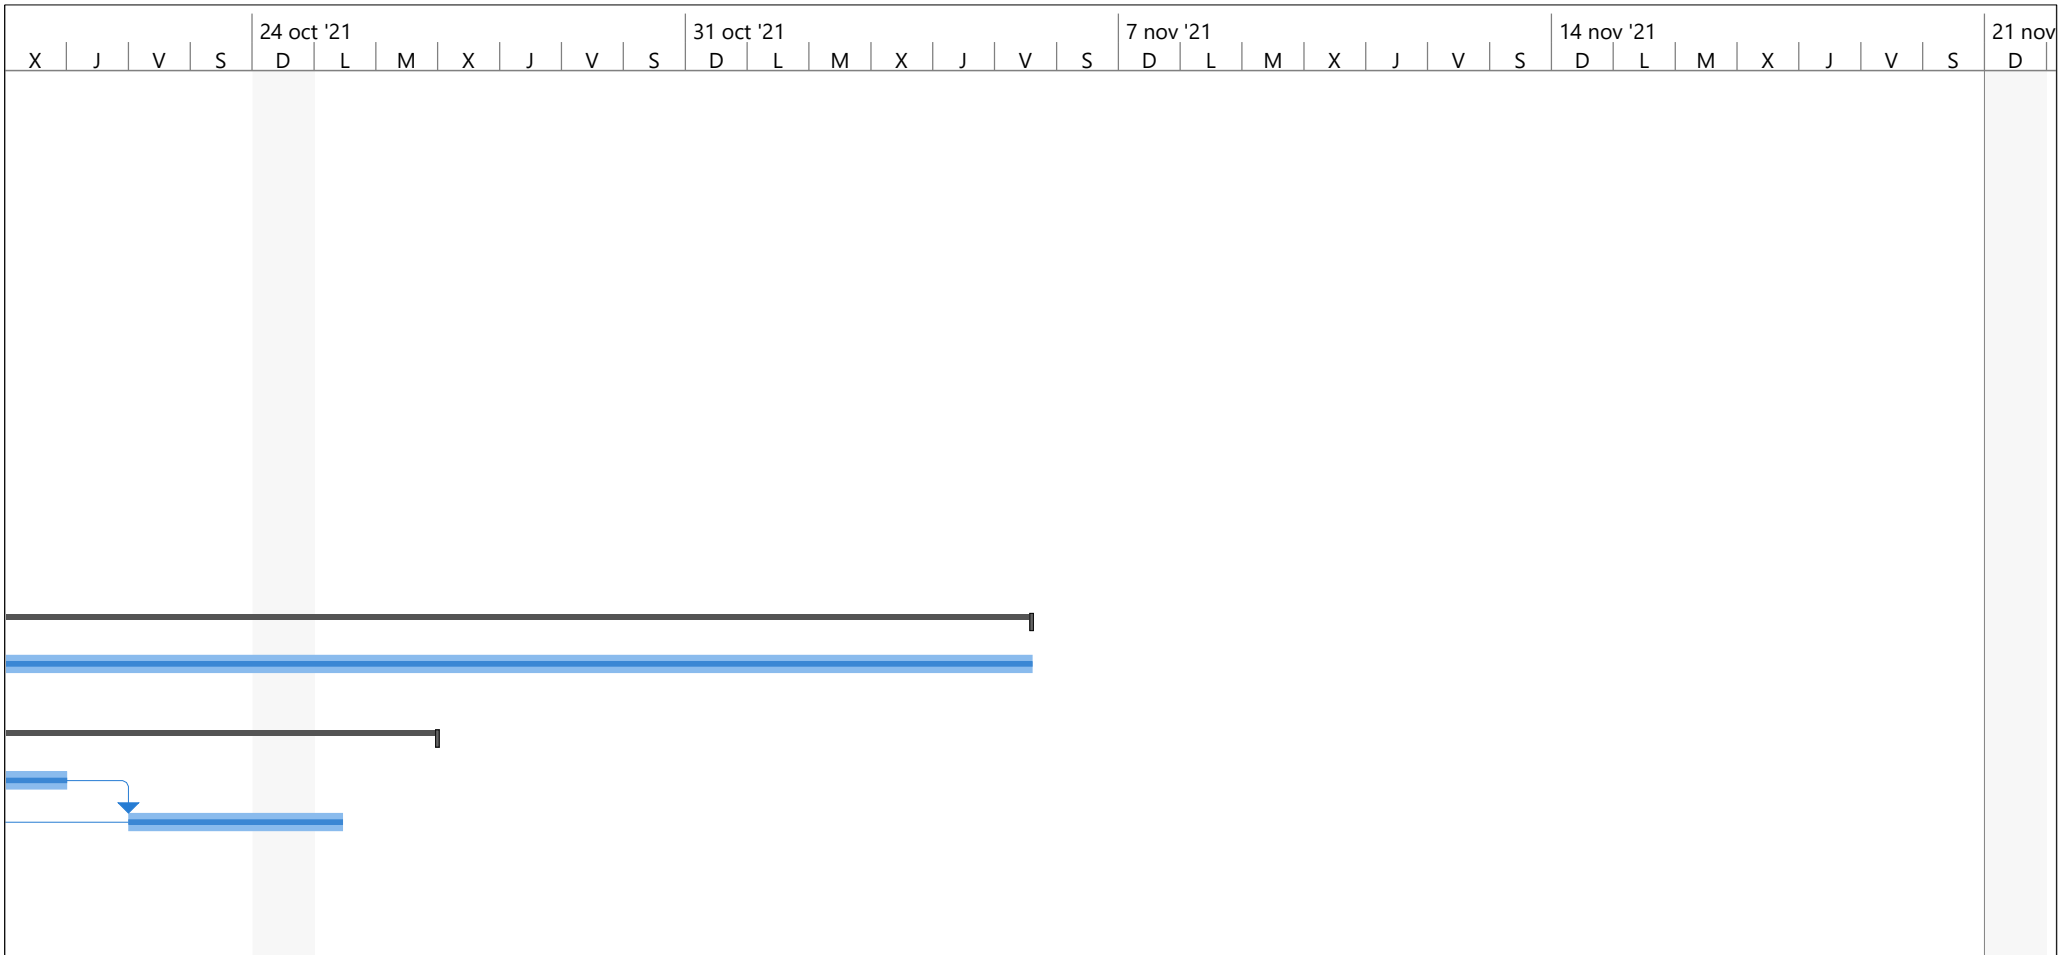


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

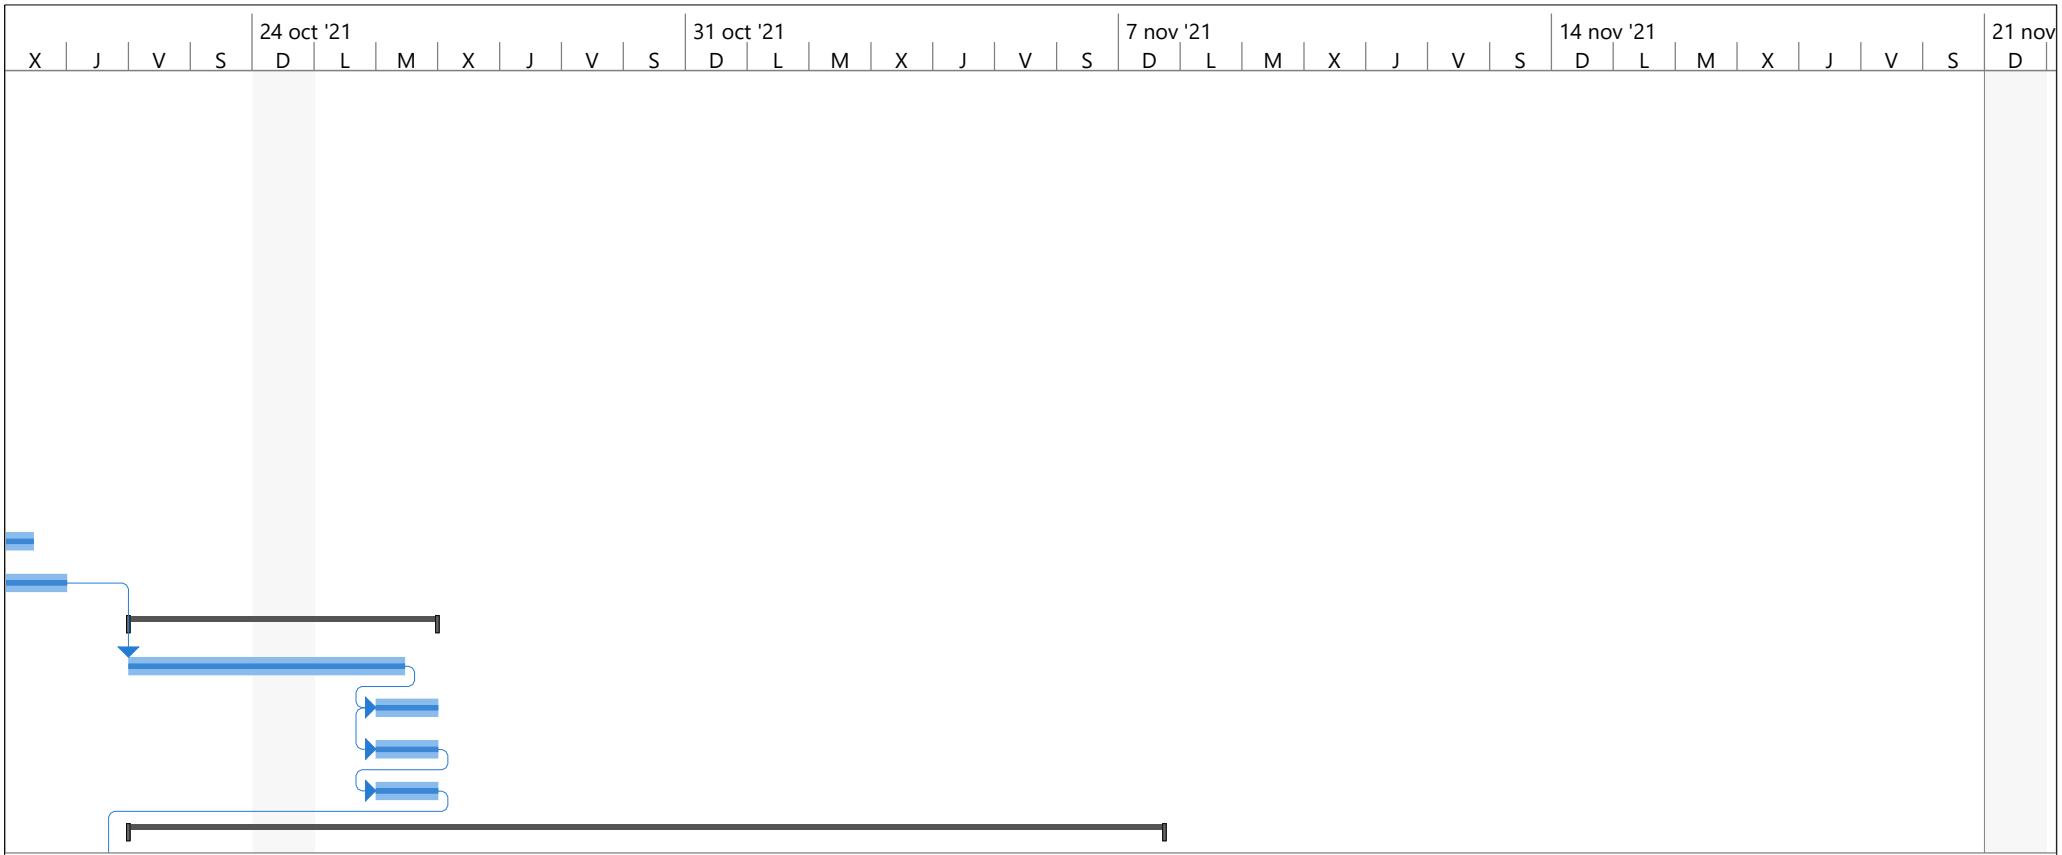


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

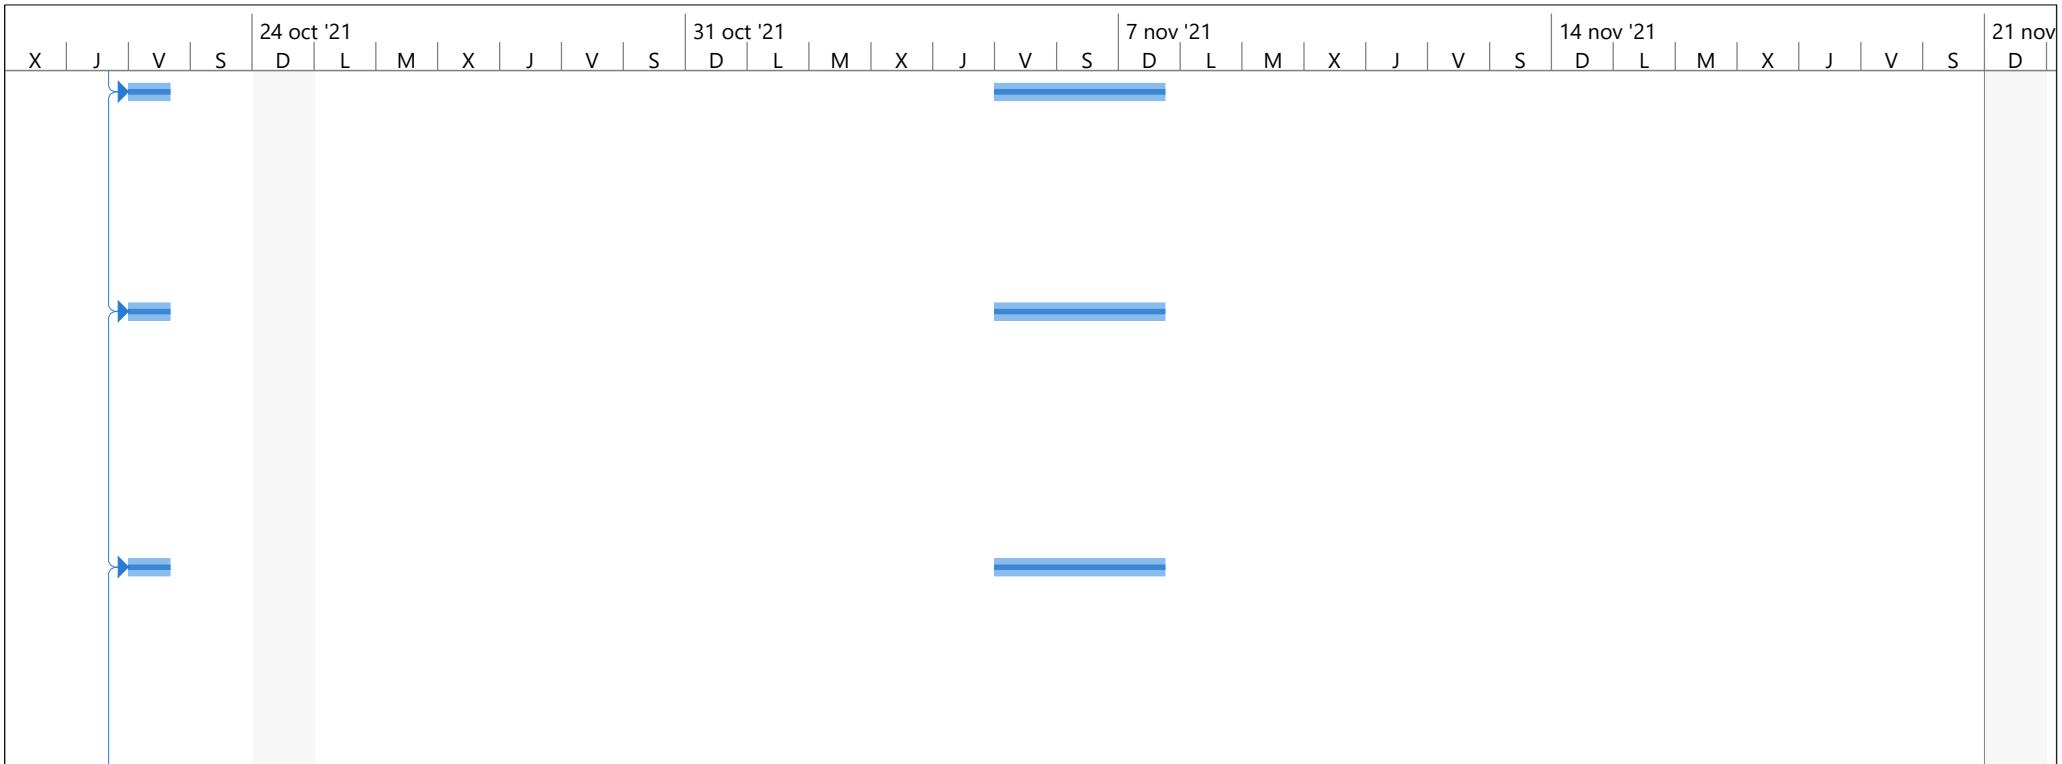


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

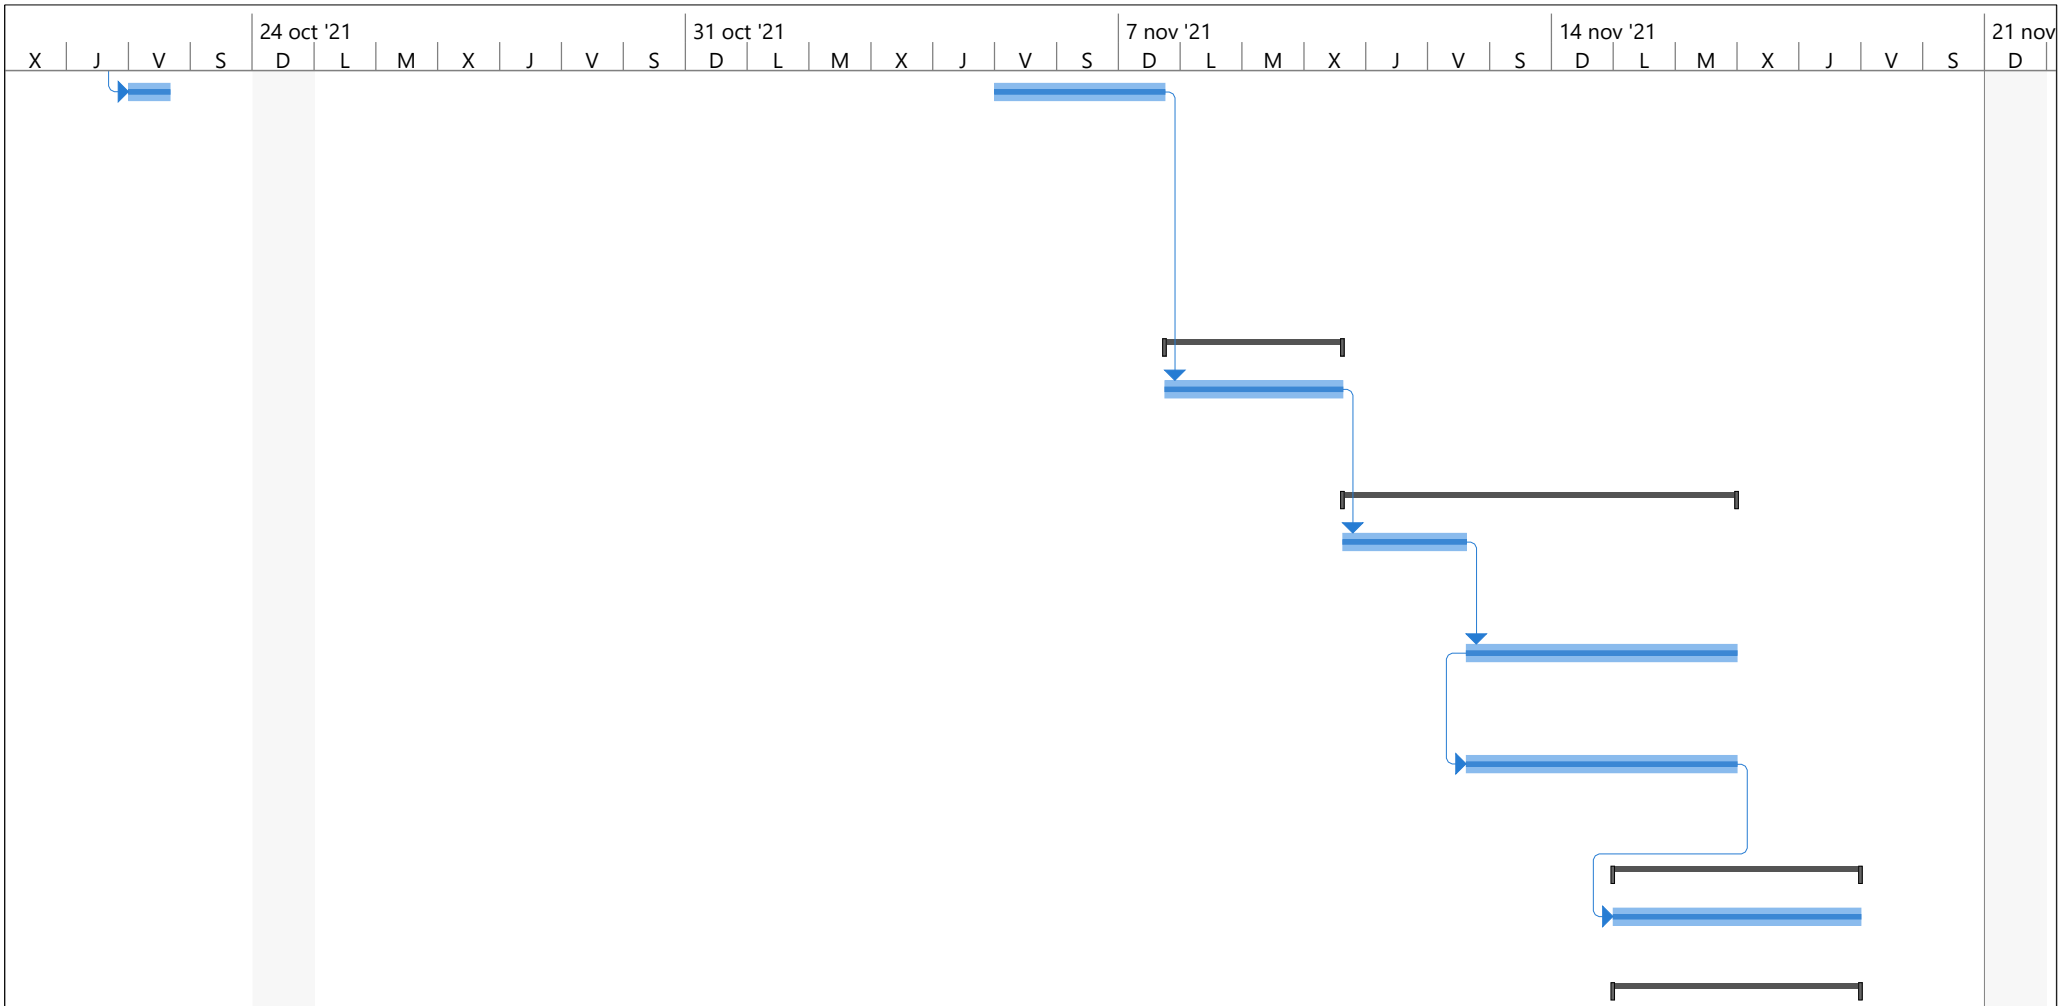


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

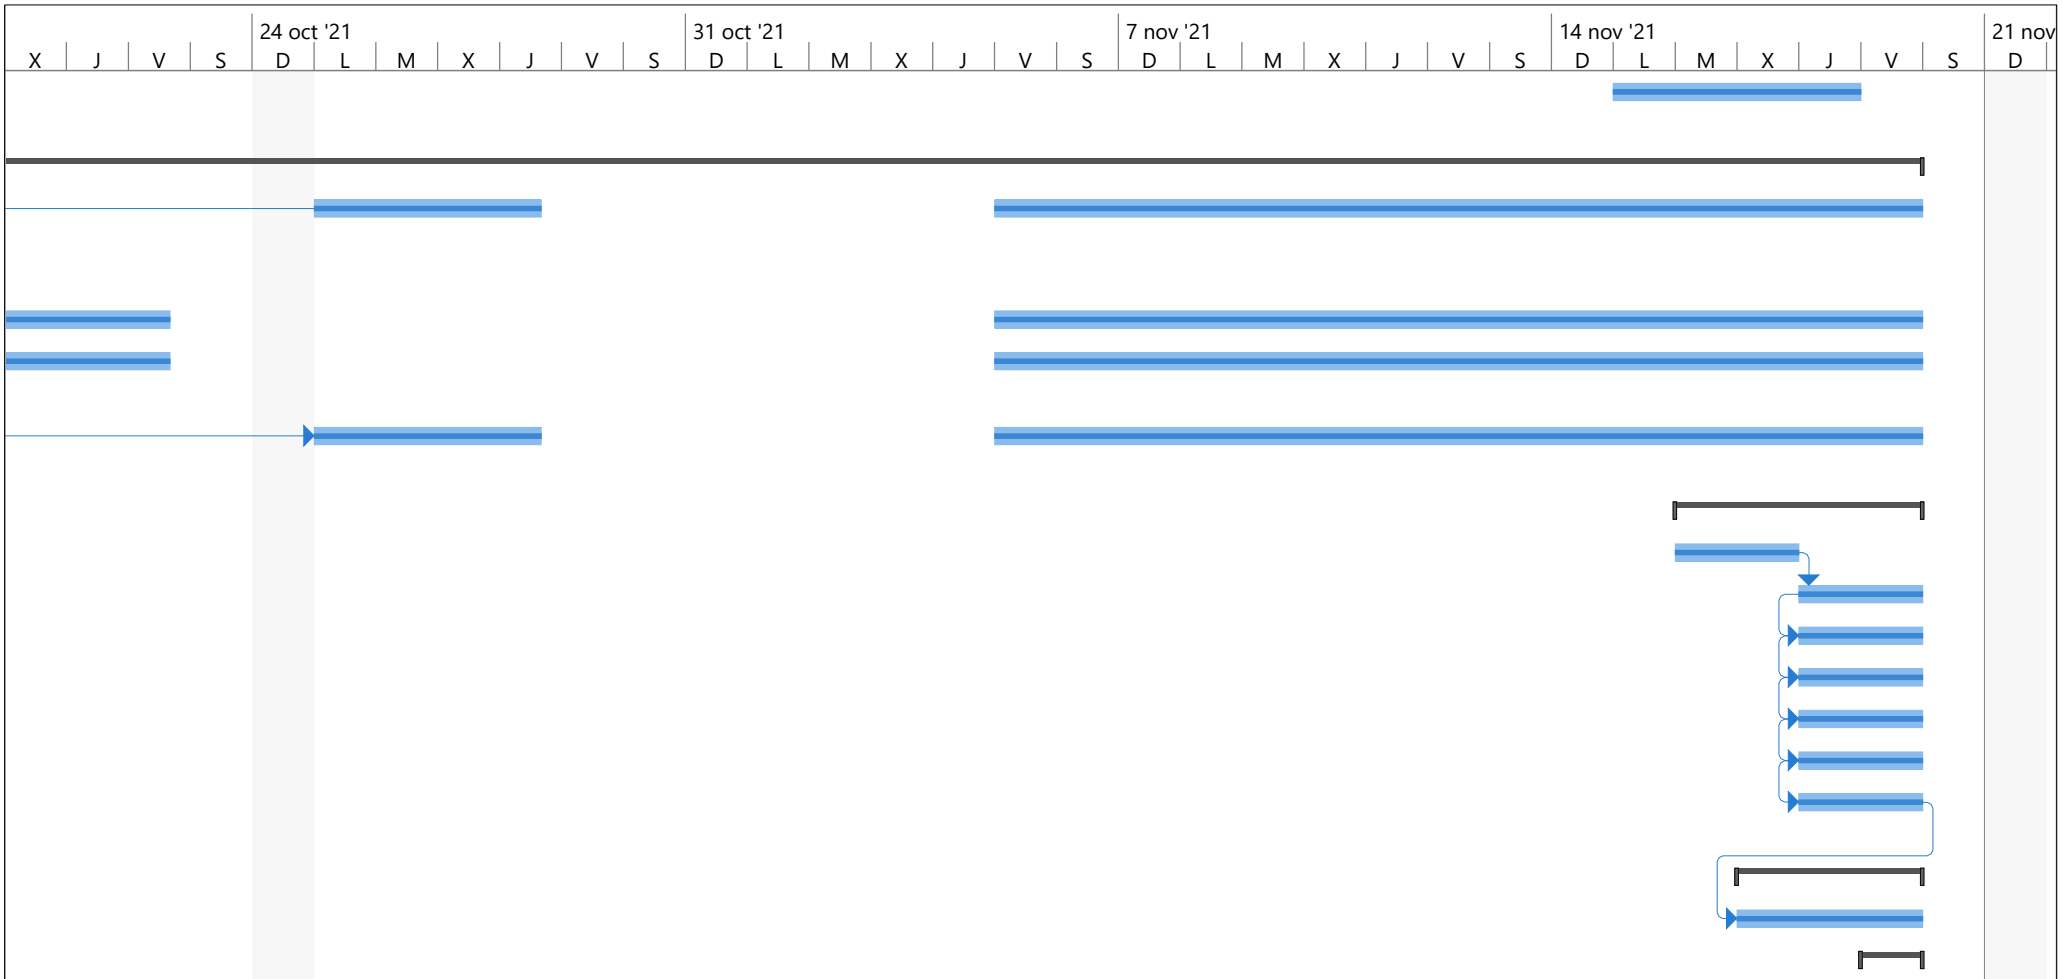


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

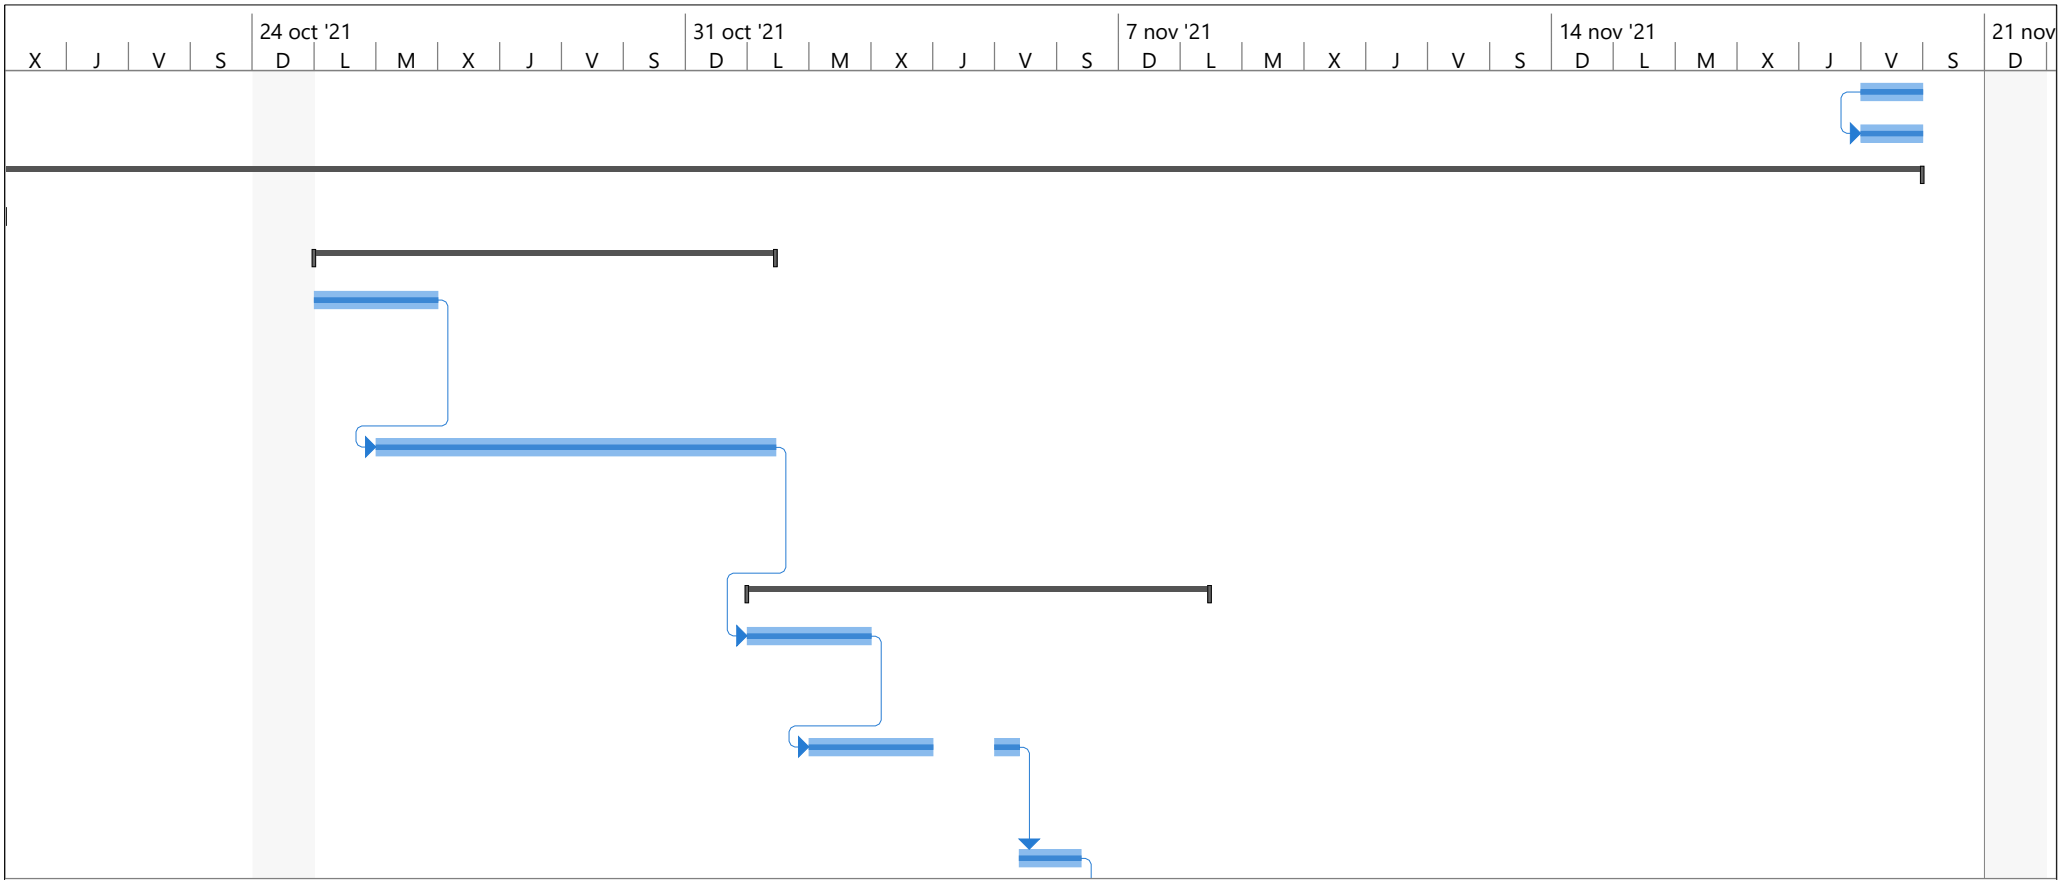


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

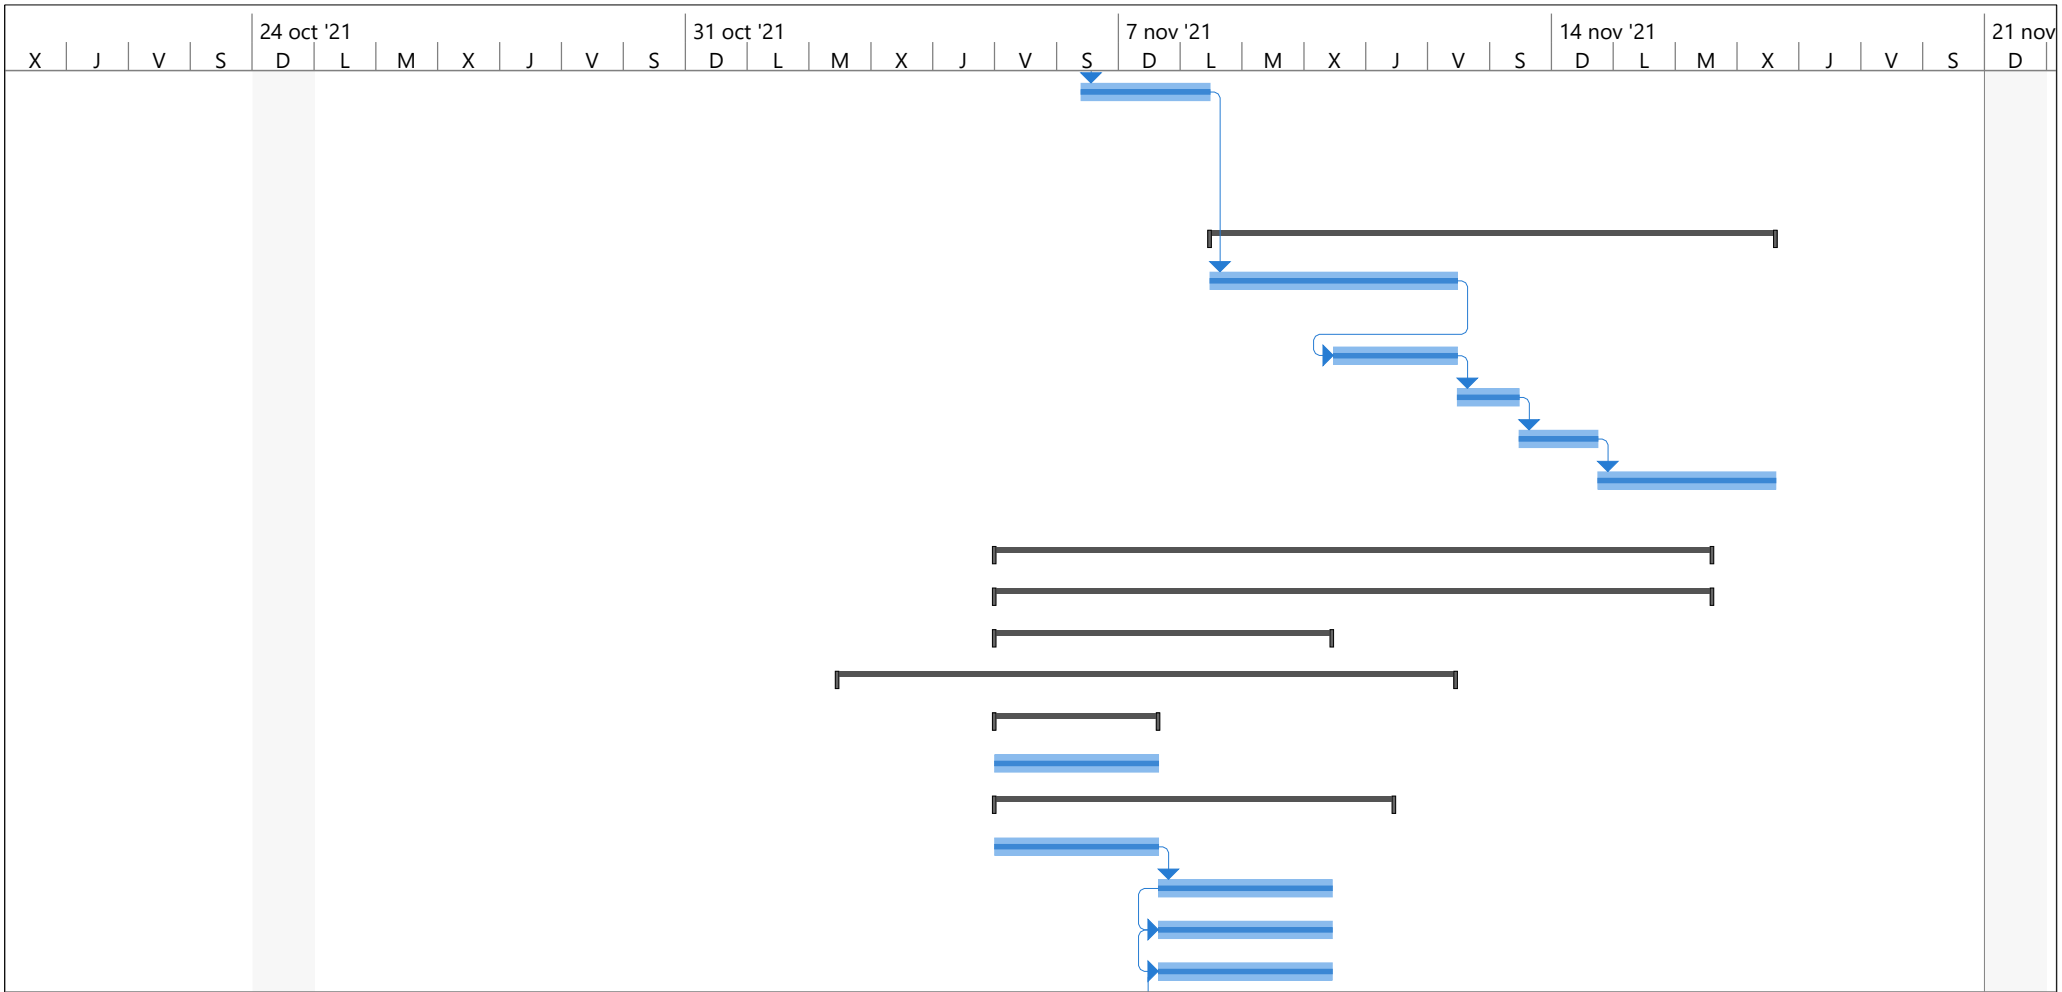


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

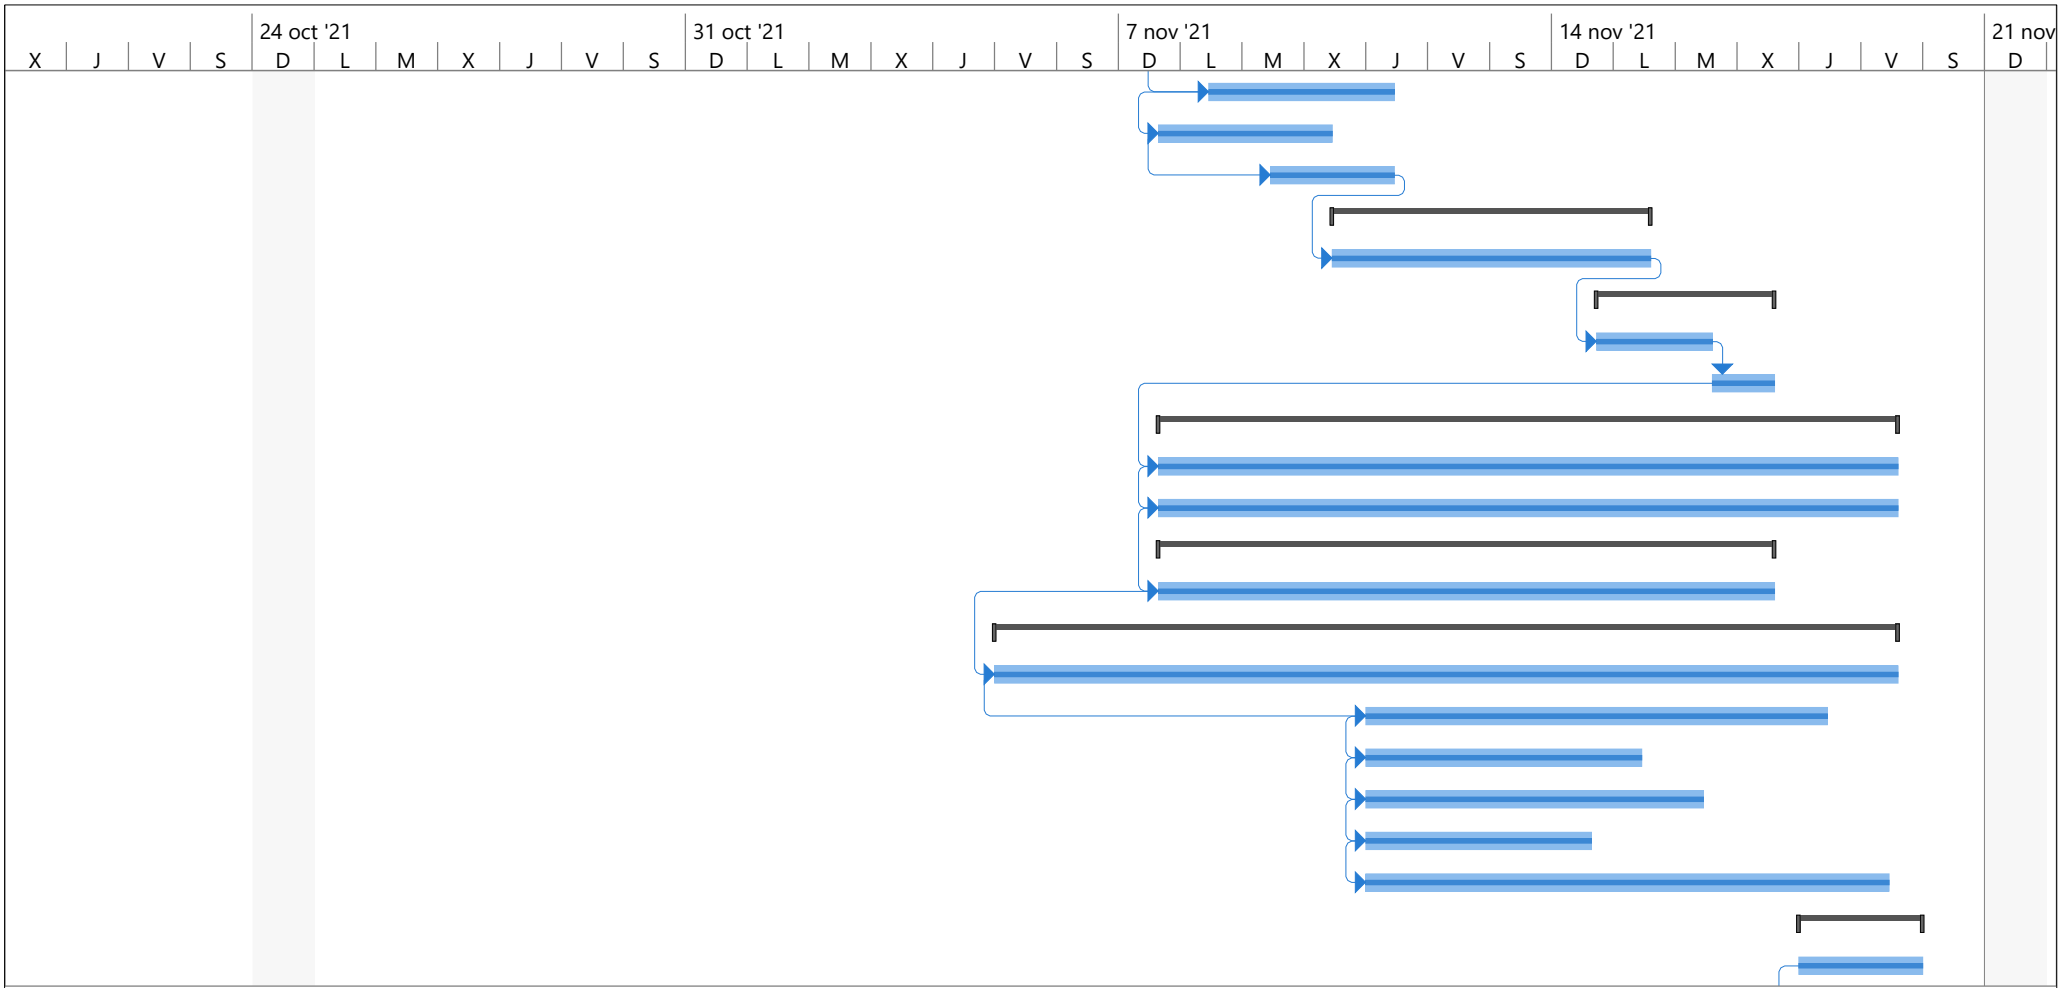


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

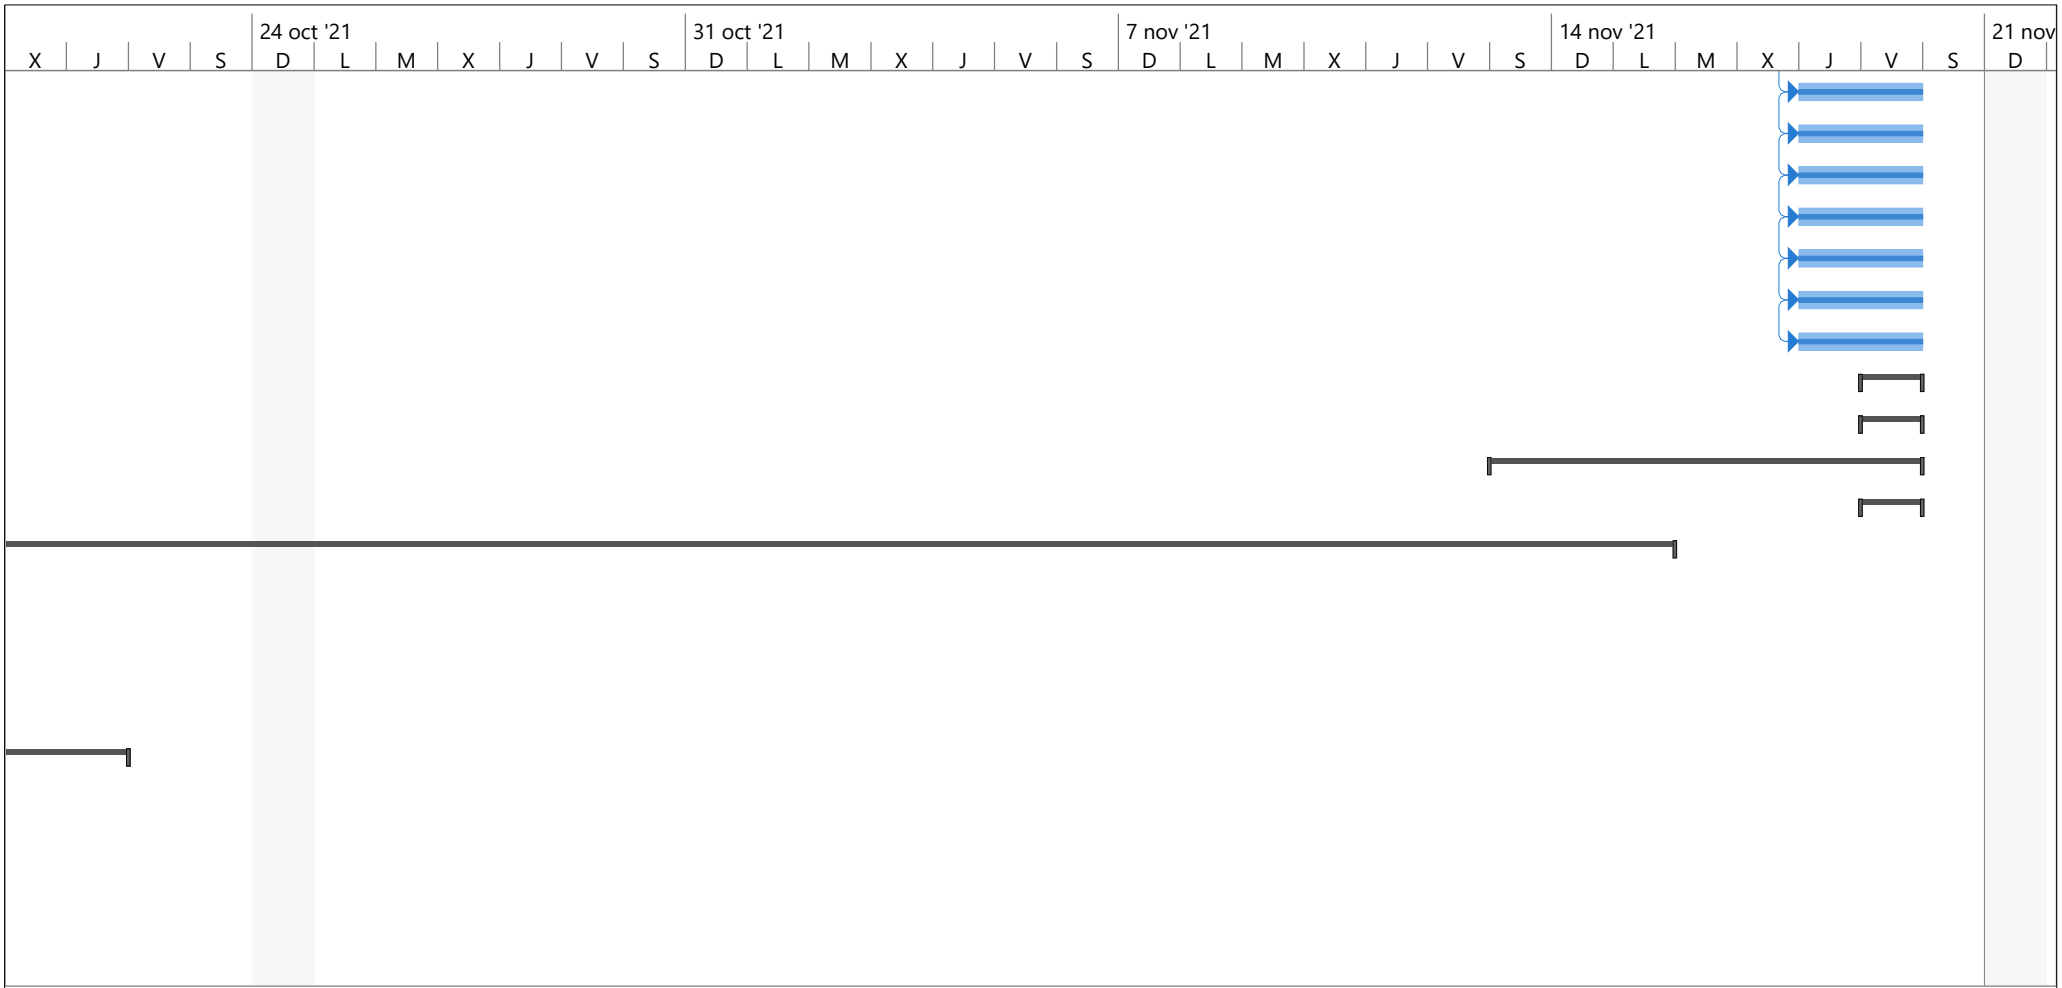


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

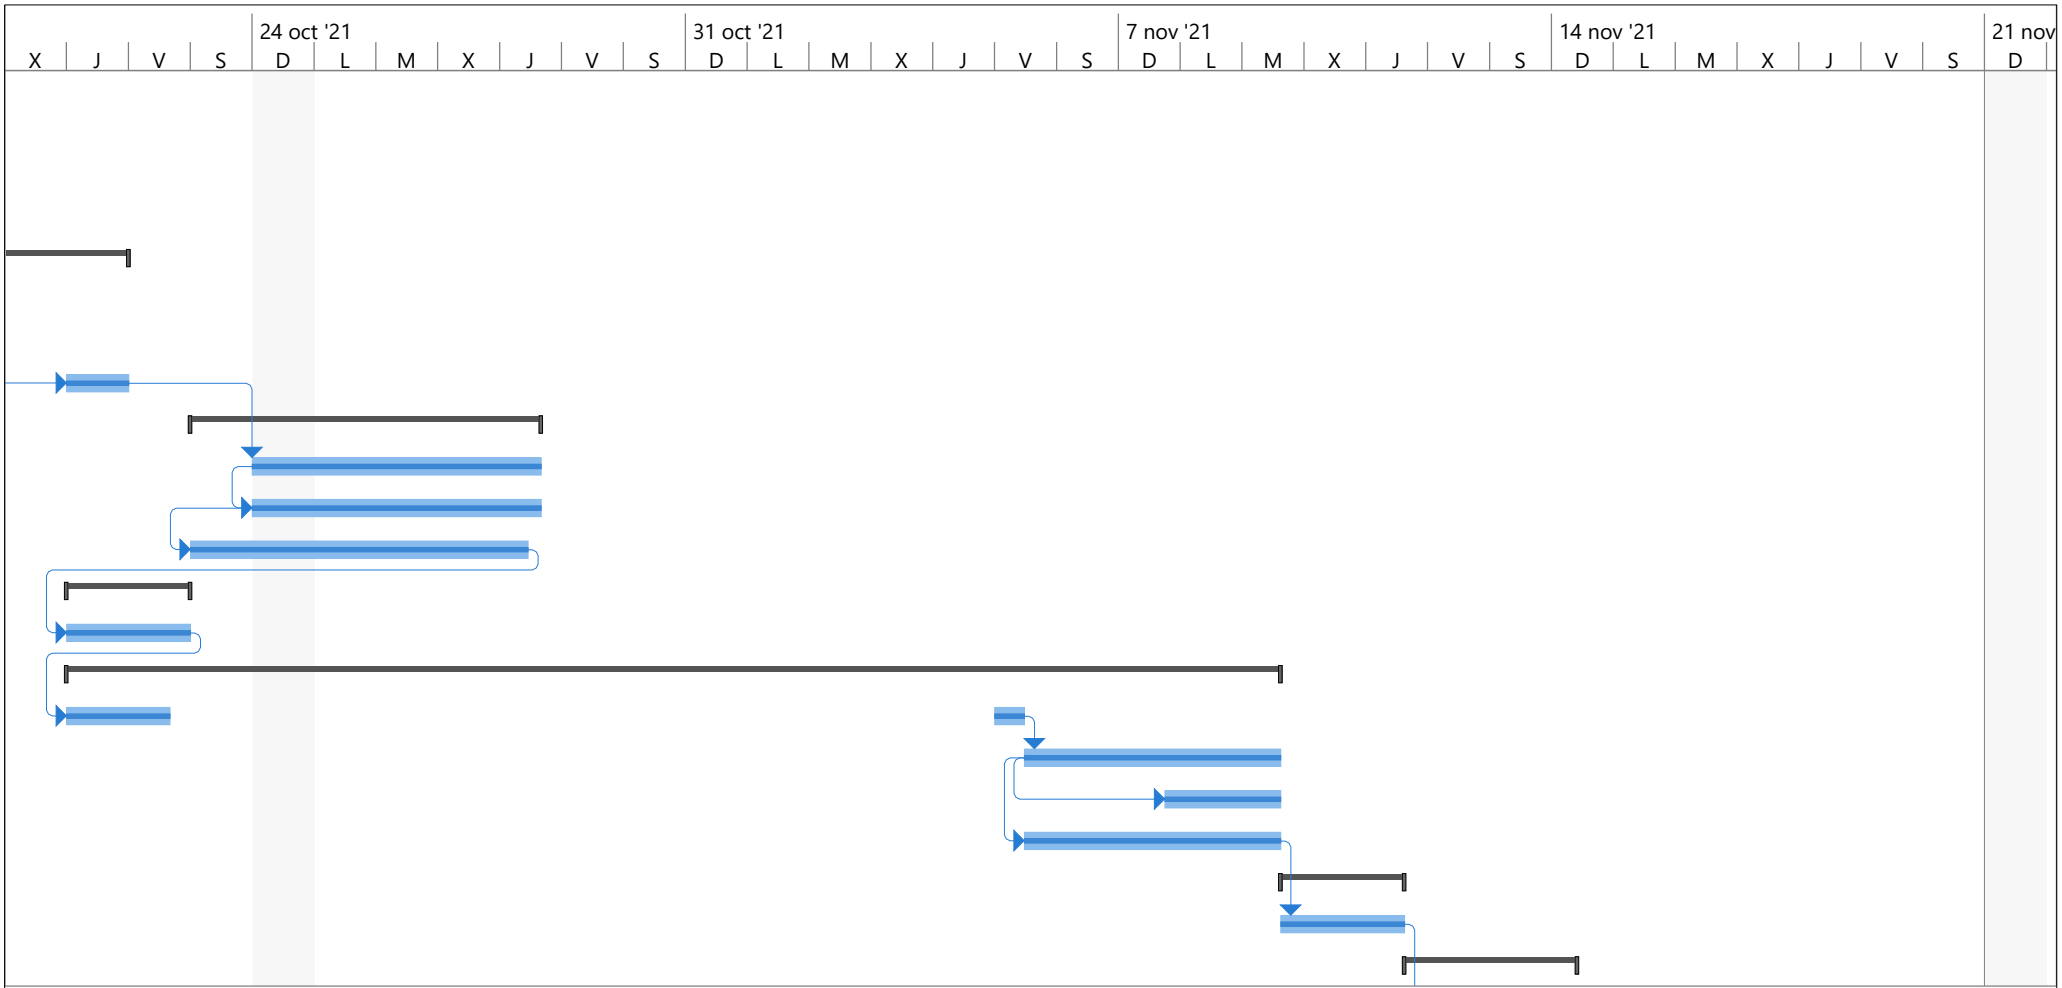


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

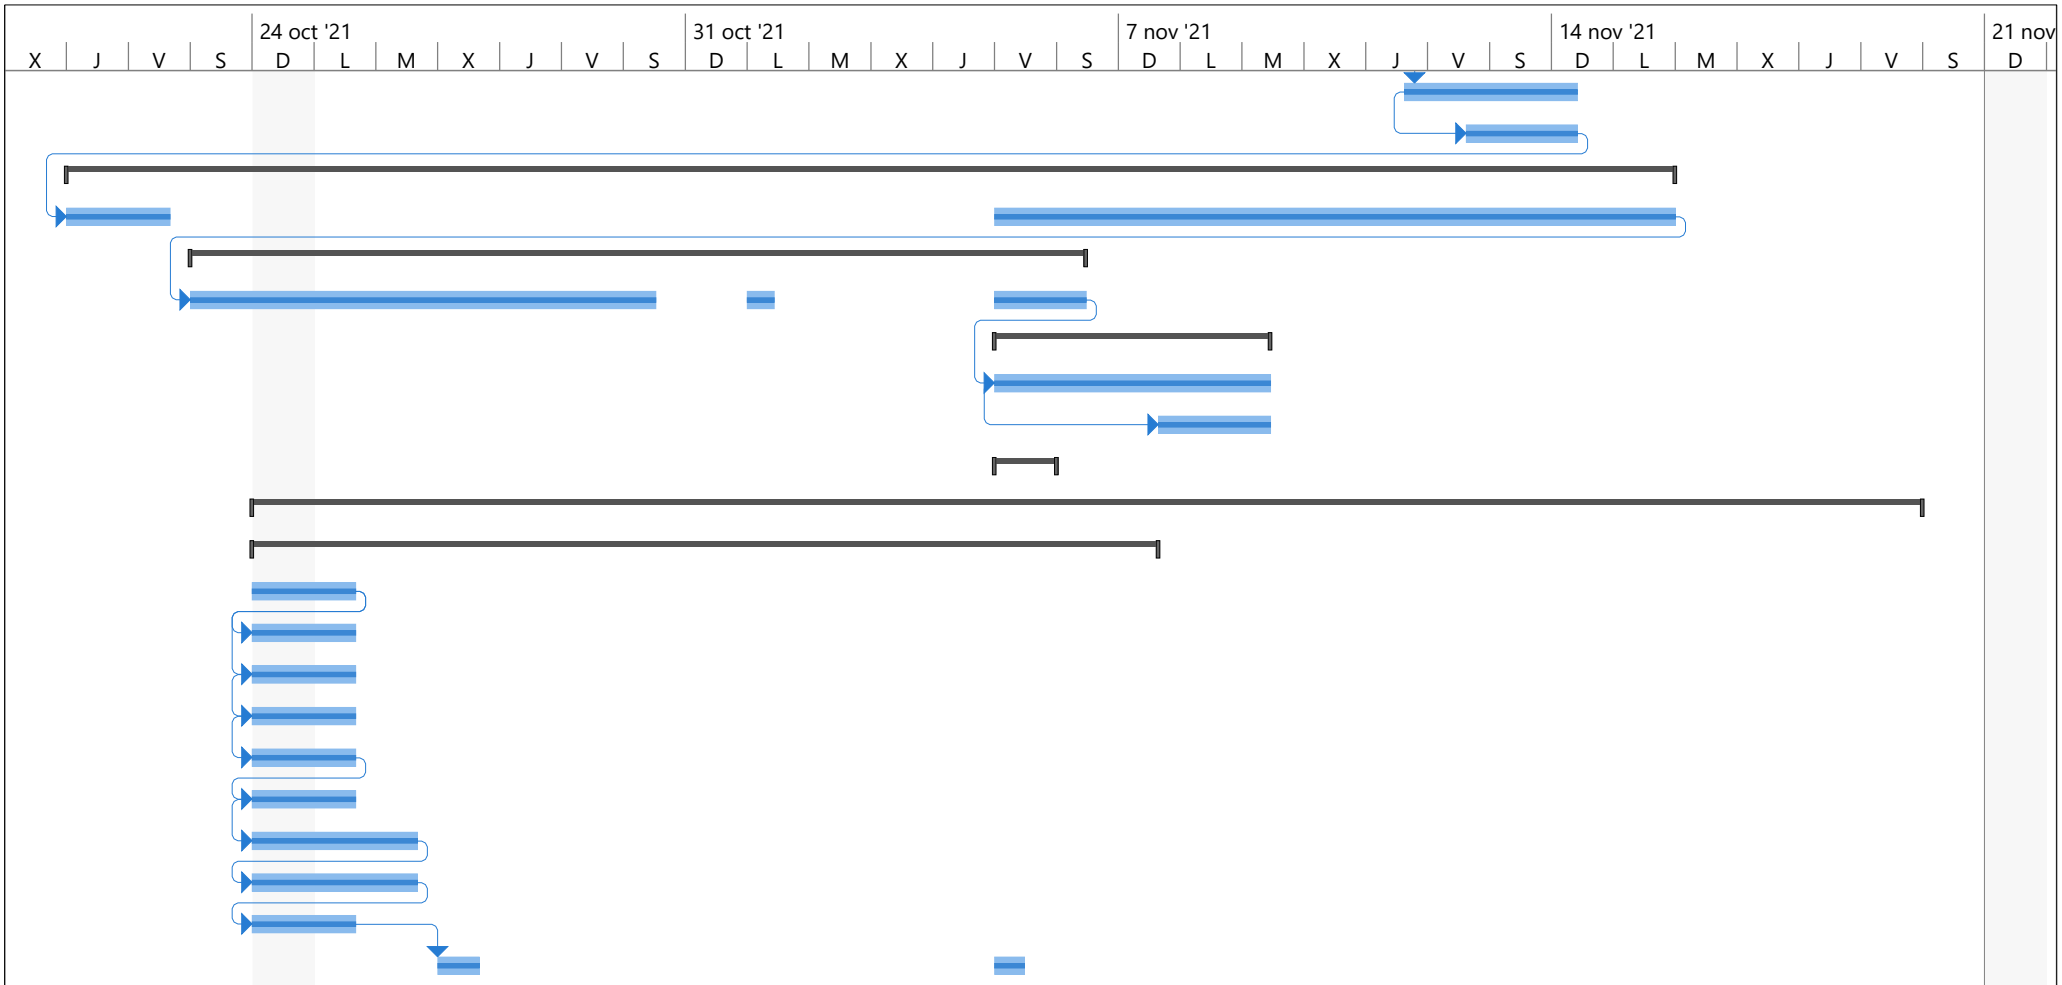


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

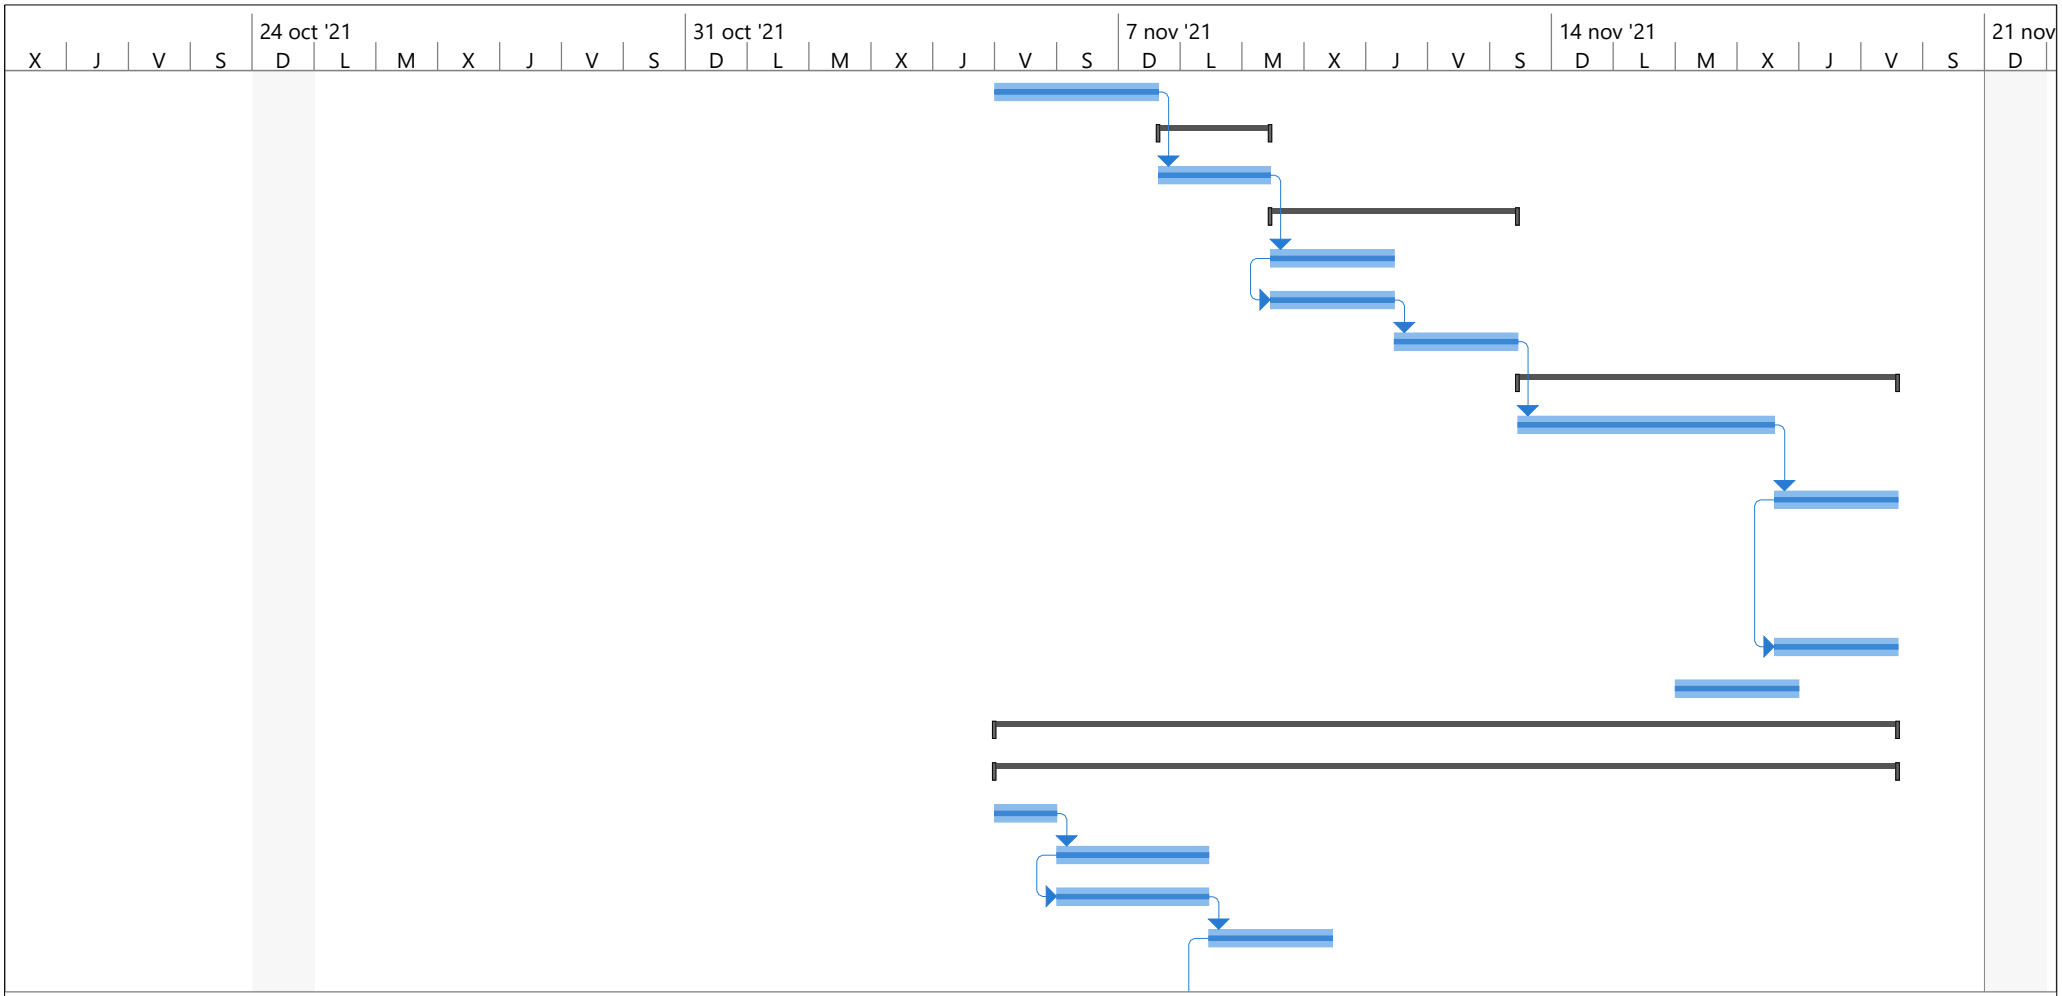


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

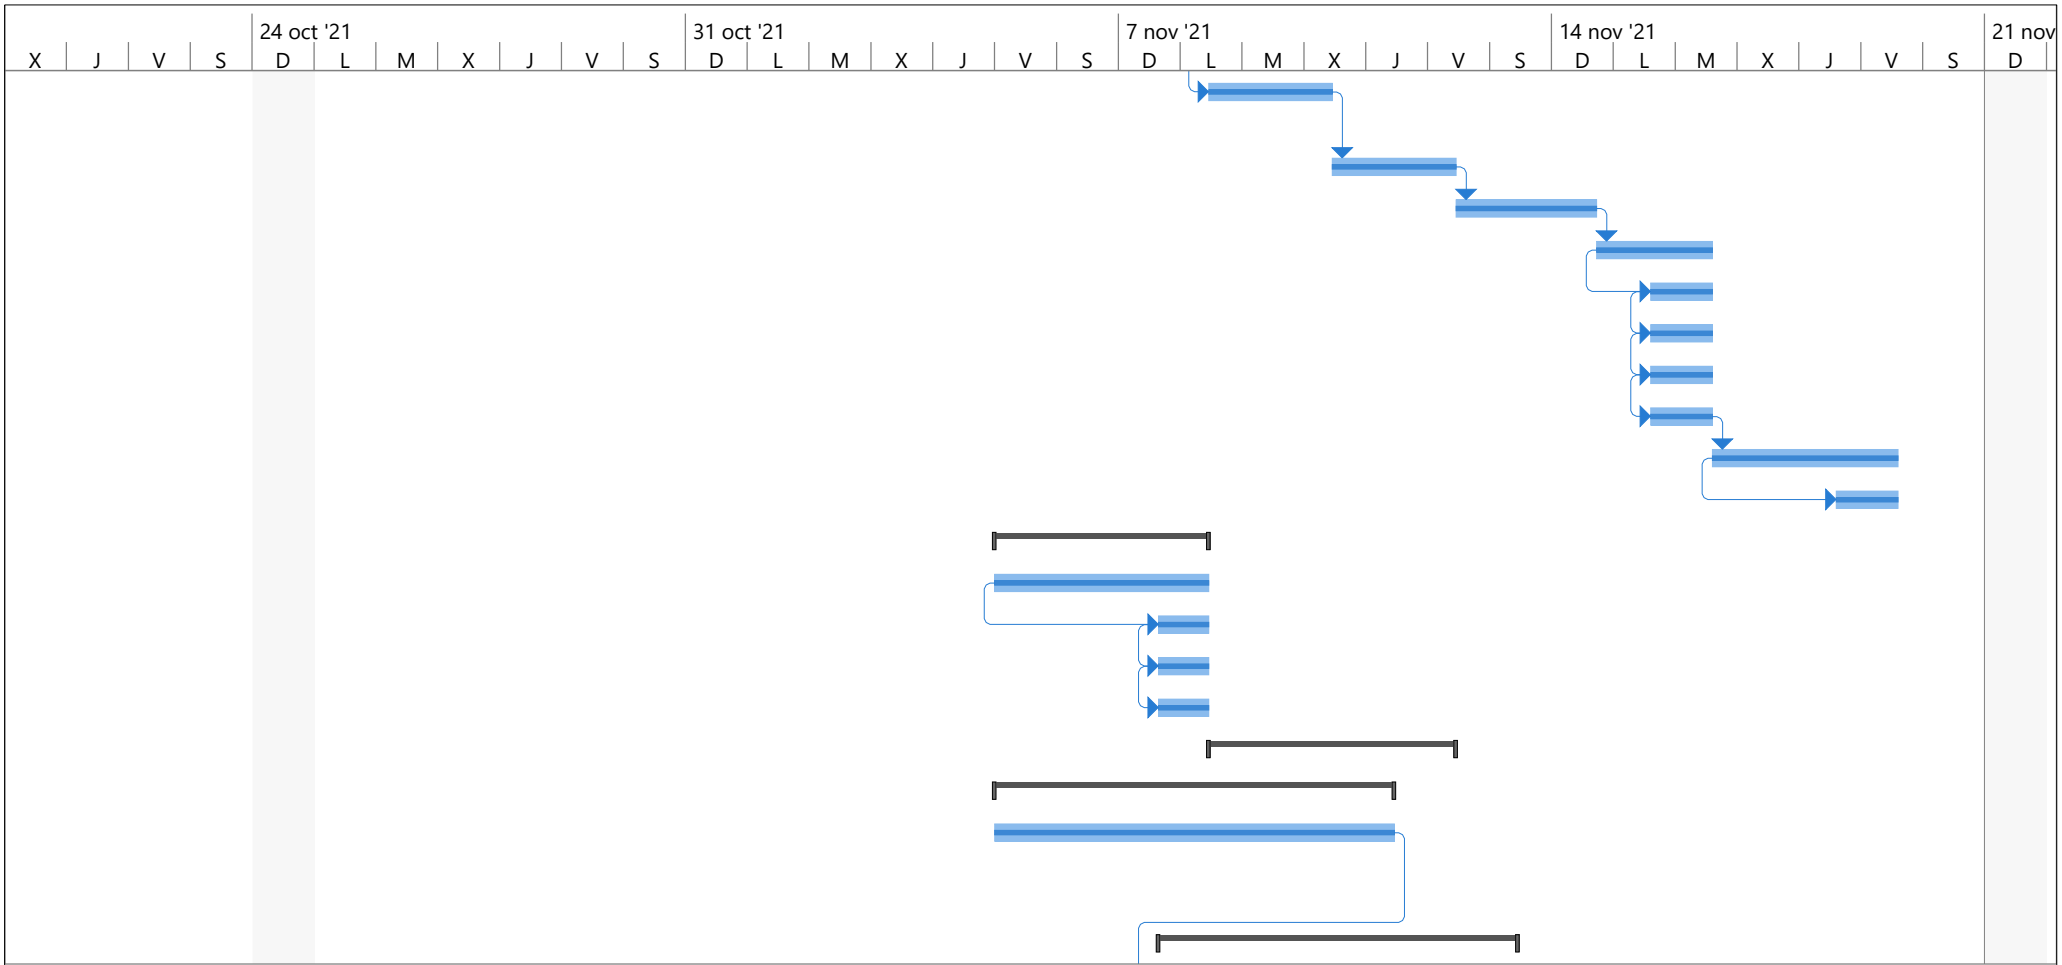


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

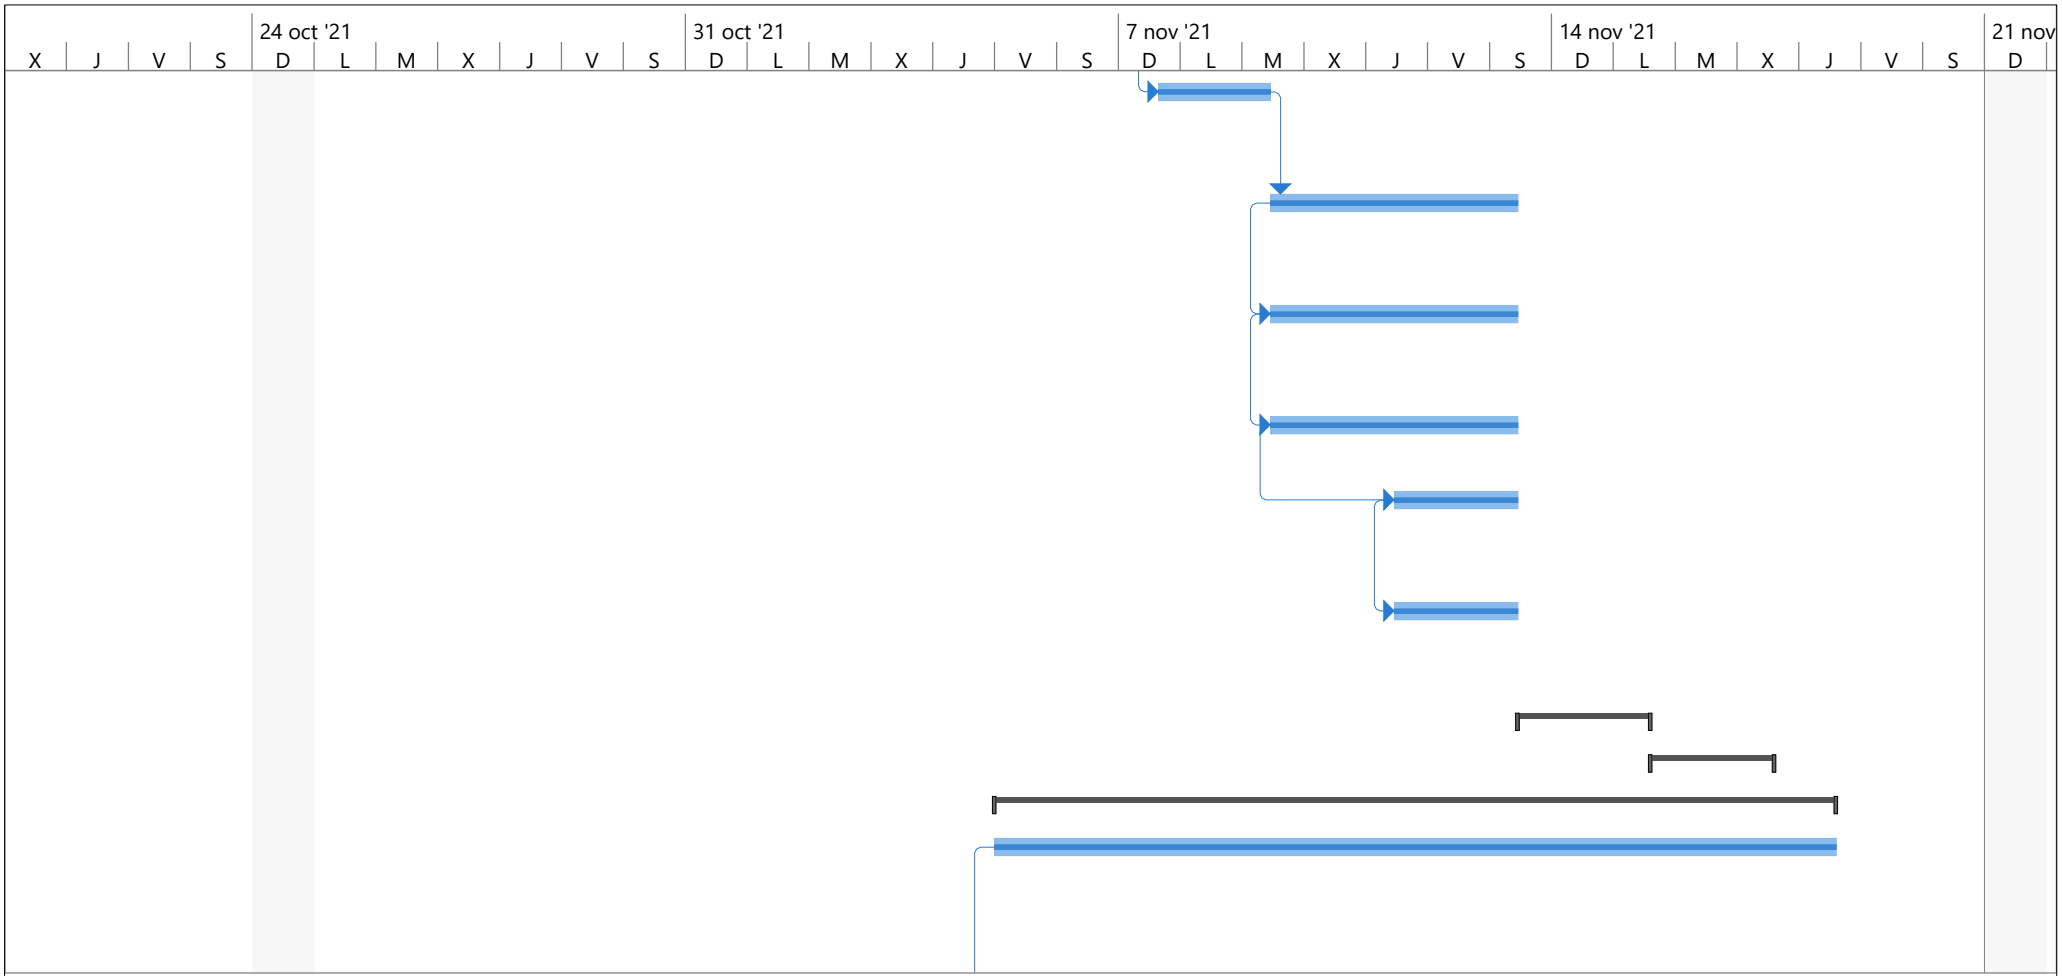

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

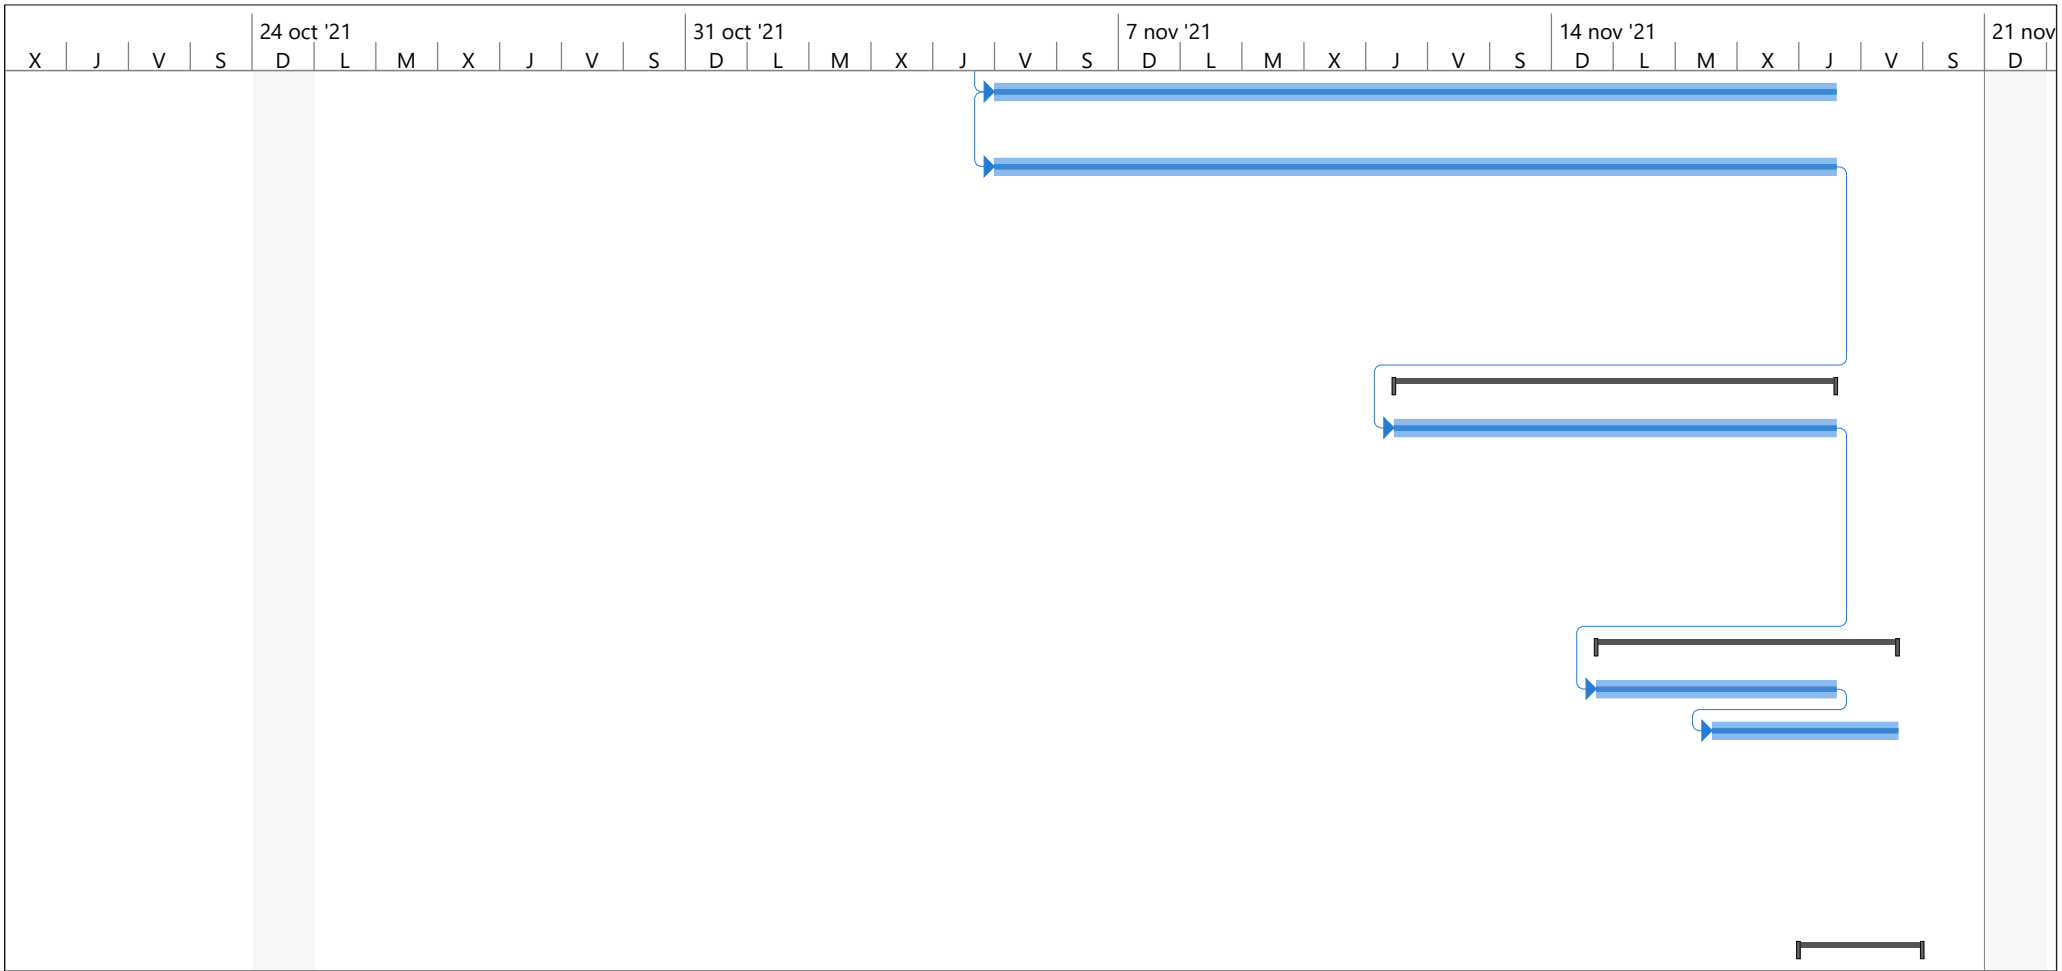


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

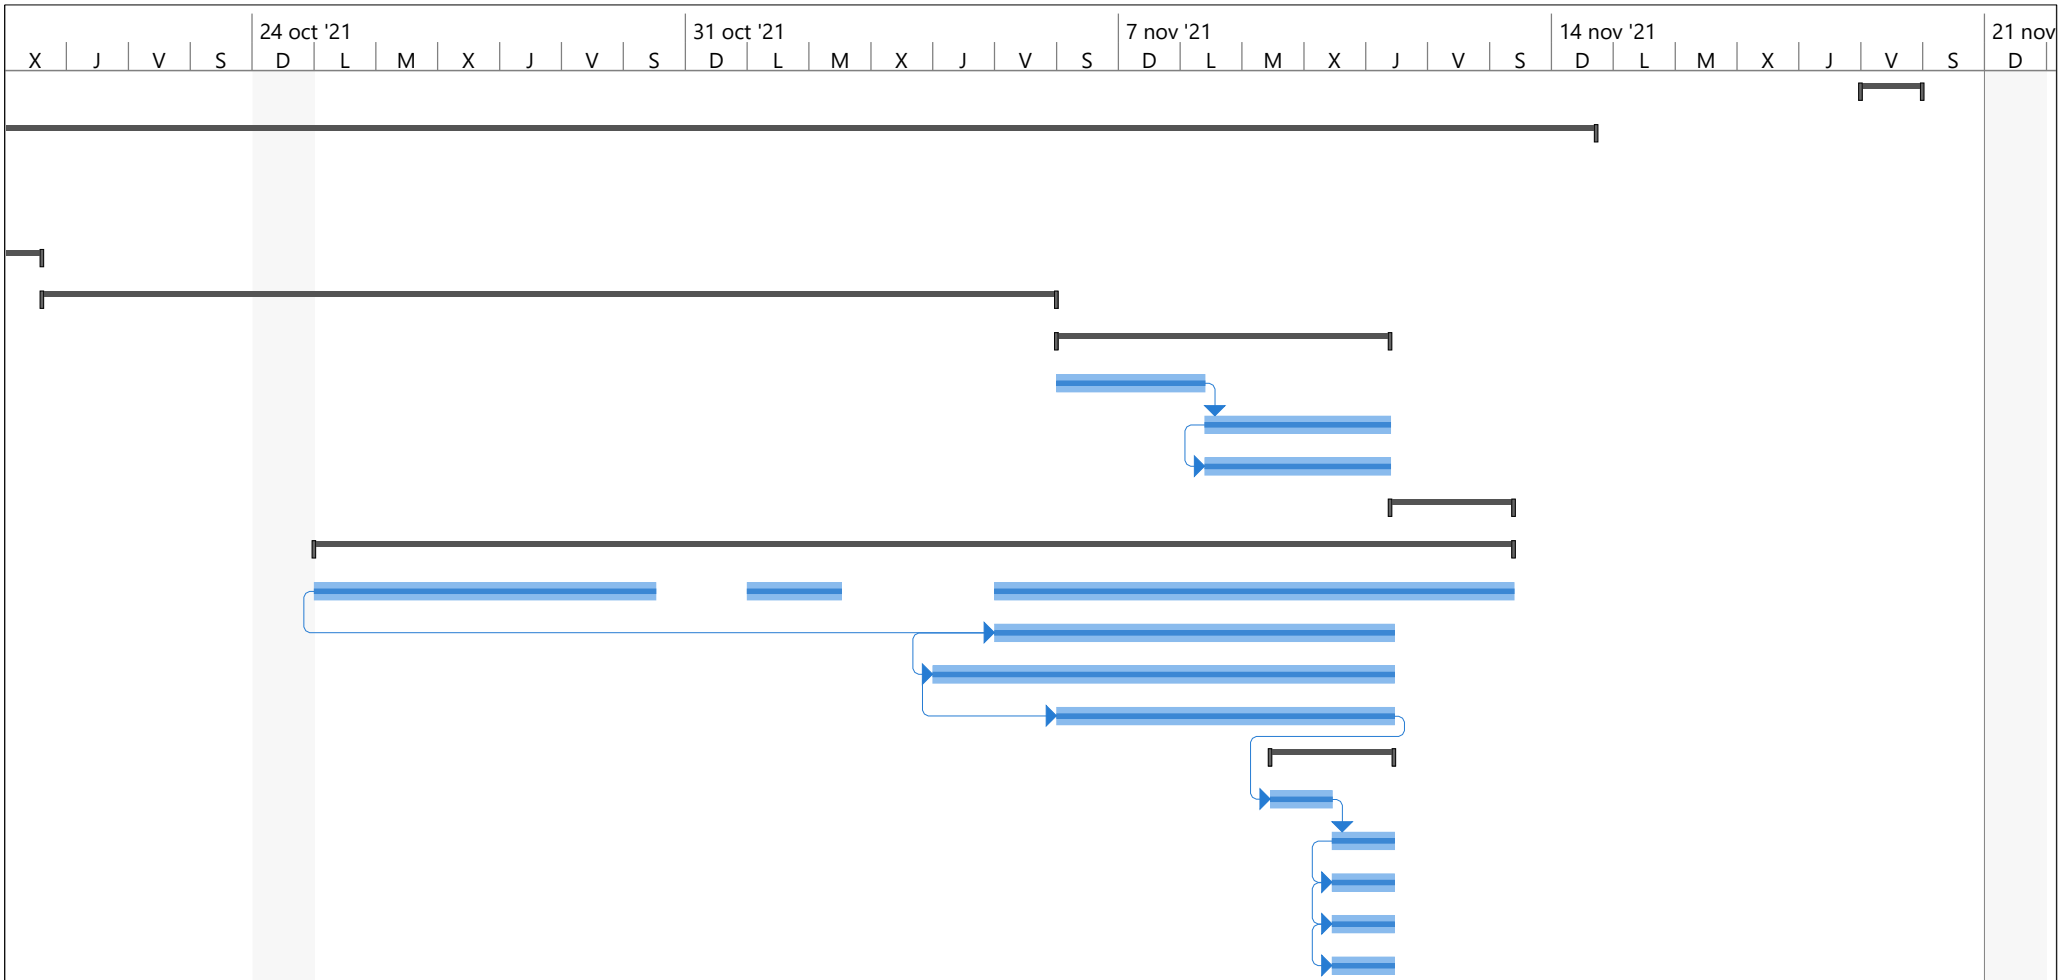


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

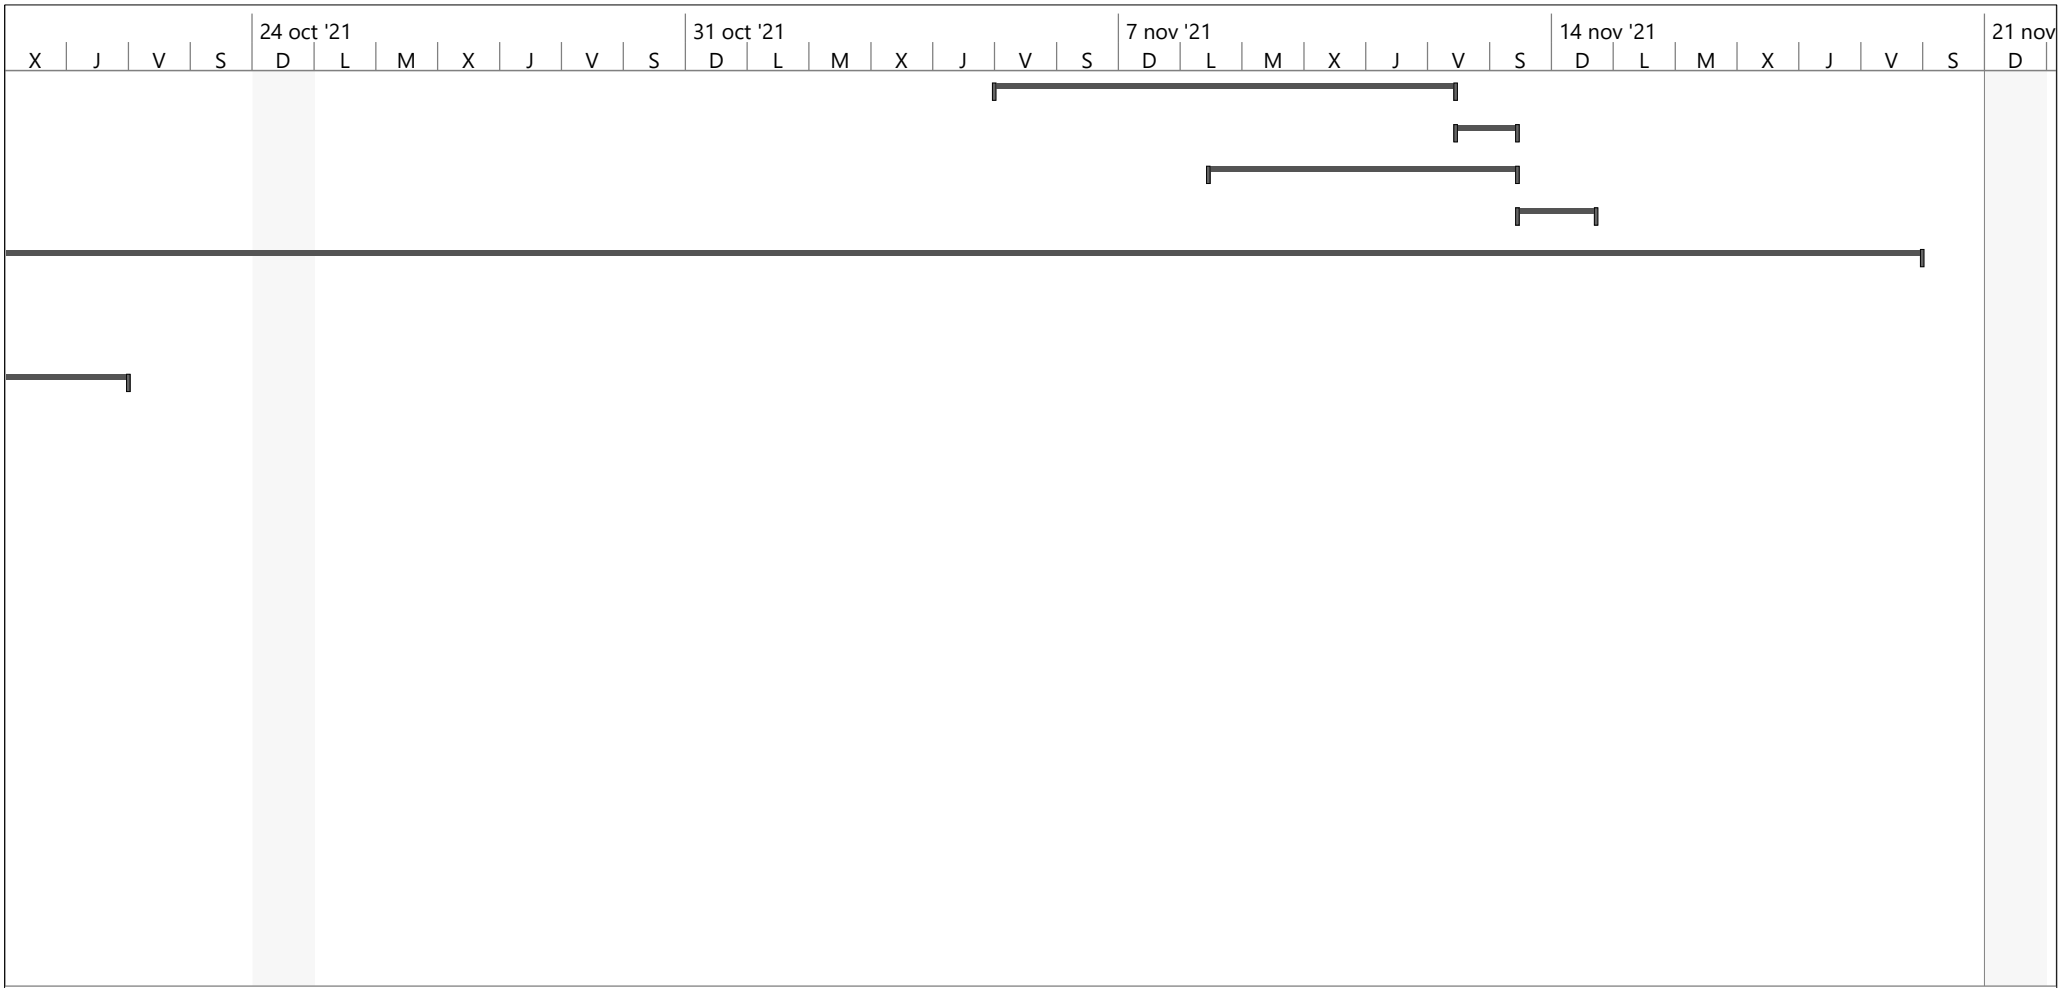

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

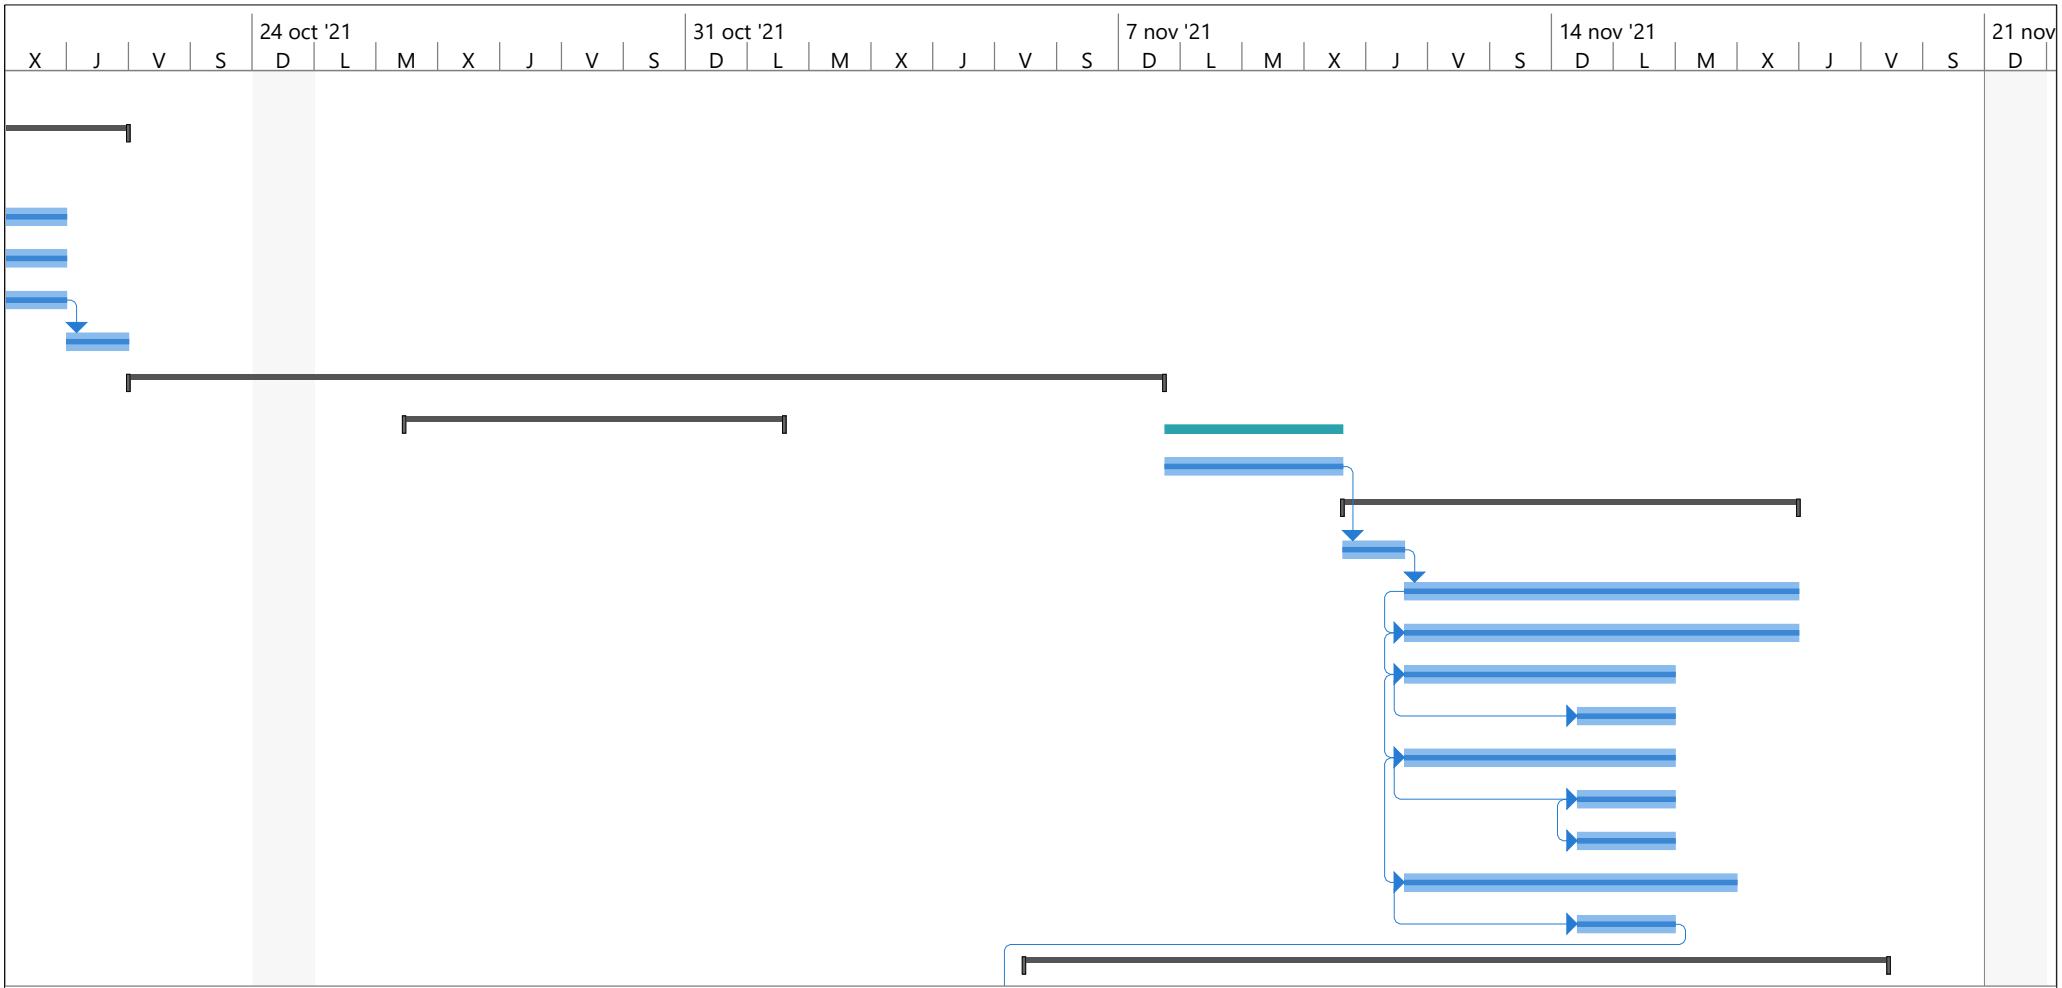


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

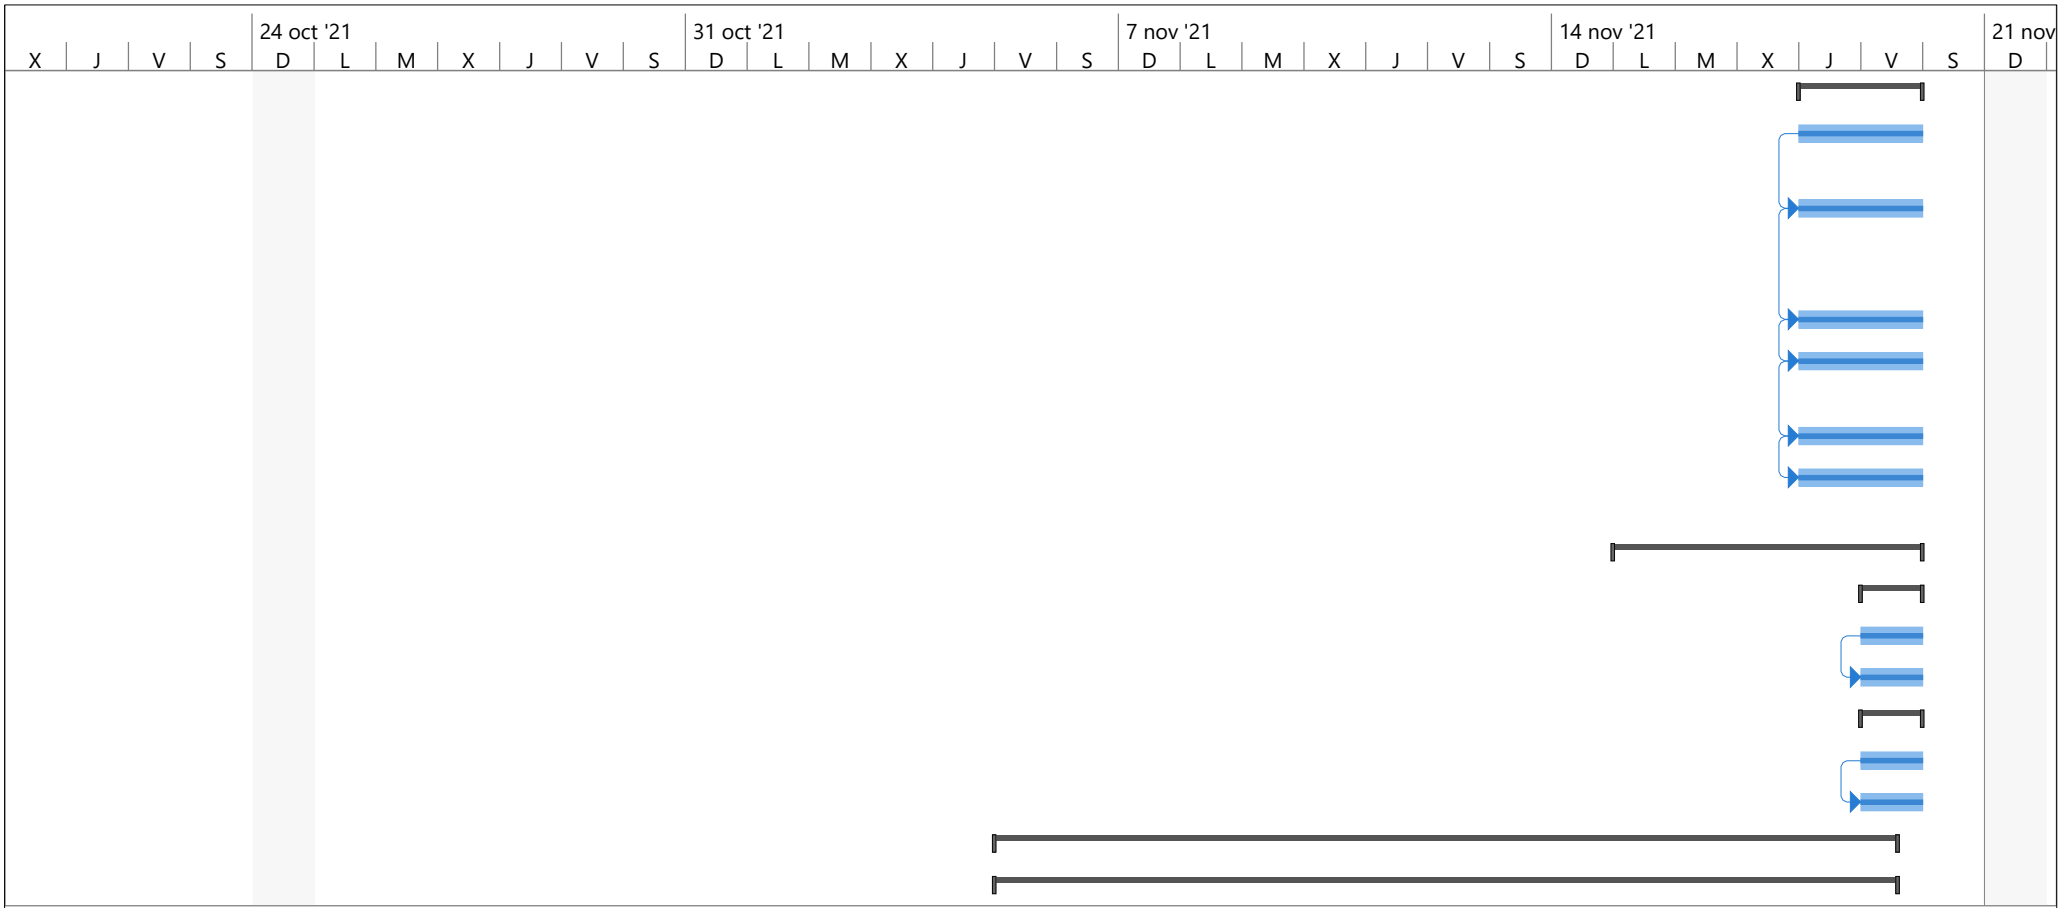


Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

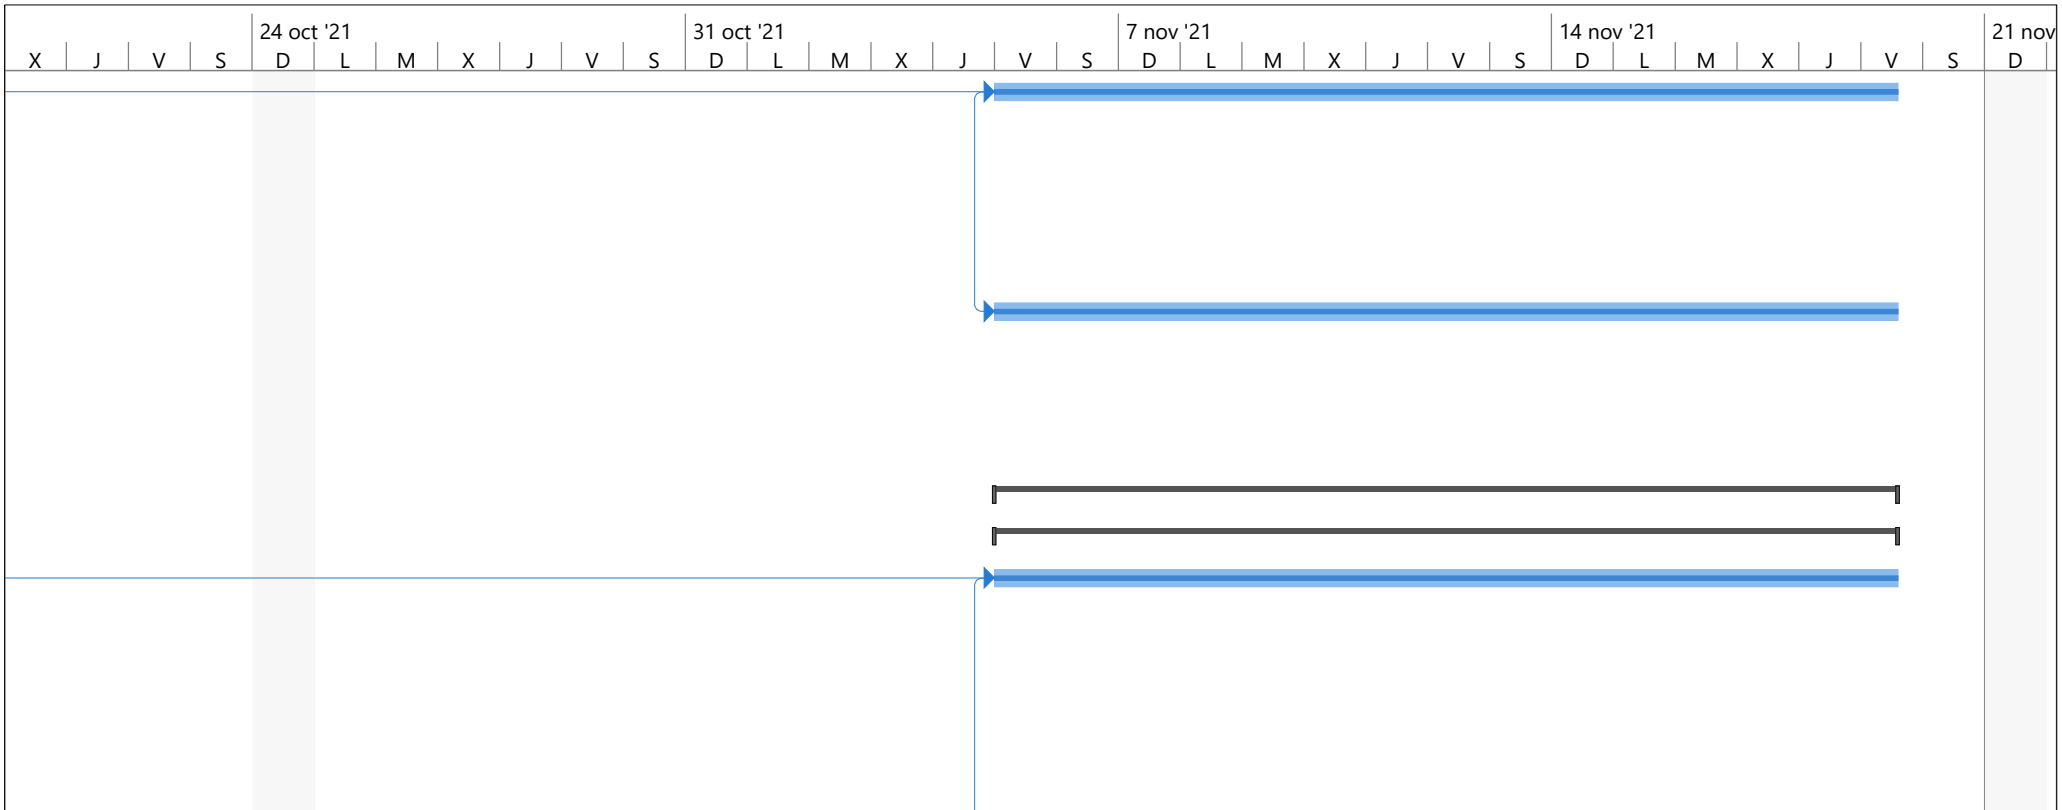

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

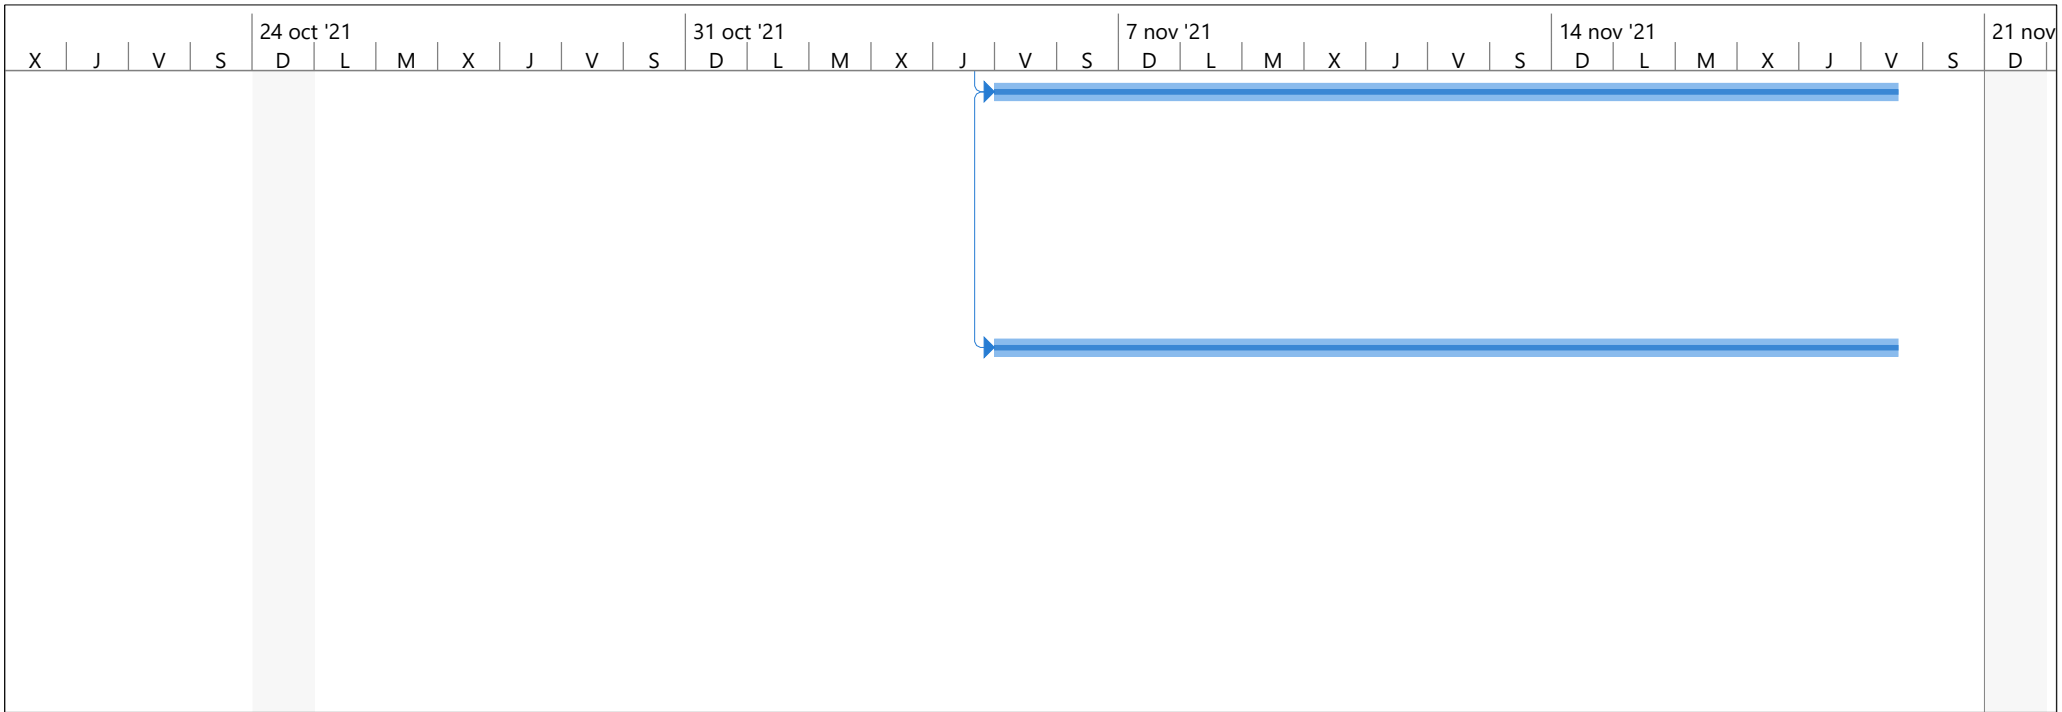

Proyecto: CACOM COMPLETO
Fecha: dom 28/11/21

