INFORME MENSUAL No 6 DEL INTERVENTORÍA
DEL 29 de noviembre de 2020 AL 20 de enero de 2021



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE" – LOTE 2

ENERO DE 2020

ELABORÓ	APROBÓ
CESAR A. MORA BARNEY DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**CESAR A. MORA BARNEY** REPRESENTANTE LEGAL 2C INGENIEROS S.A.

INFORME MENSUAL No 6 DEL INTERVENTORÍA
DEL 29 de noviembre de 2020 AL 20 de enero de 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE" – LOTE 2

2C INGENIEROS S.A.
INTERVENTORÍA
CESAR ASHLEY MORA BARNEY
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SUPERVISIÓN
WILSON JAVIER ROJAS MORENO
Director Administrativo y Financiero
Dirección General SENA

EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ
Profesional Líder del grupo de construcciones
Supervisor del contrato de interventoría

JOSÉ ANDRÉS BUSTOS
Profesional de apoyo a la supervisión

ENERO DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6

2 OBJETIVO 7

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

3.1 LOCALIZACIÓN 8

3.1.1 Departamento de Arauca 9

3.1.2 Departamento de Casanare 9

3.1.3 Departamento de Norte de Santander 11

3.1.4 Departamento de Santander 12

4 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 13

5 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

6 ALCANCE DEL PROYECTO 16

6.1 ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA 16

6.2 ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

7 CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA 17

7.1 ÁREA TÉCNICA 17

7.1.1 Actividades Ejecutadas 17

7.1.2 Aspectos relevantes sobre los centros educativos 18

7.1.3 Cantidades de obra y valor revisado 18

7.1.4 Control de Programación y Avance de Obra 55

7.1.5 Comité Técnico 56

7.1.6 Inconvenientes y determinaciones 56

7.1.7 Bitácora de Obra 60

7.1.8 Advertencia Anticipada 60

7.2 ÁREA ADMINISTRATIVA 65

7.2.1 Descripción de las Actividades 65

7.2.2 Estado del Contrato de obra 66

7.2.3 Informe del Personal 67

7.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 74

7.2.5 Correspondencia 74

7.3 ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 75

7.3.1 Control Avance y Ejecución Financiera del Contrato de Obra 75

7.3.2 Control Avance y Ejecución Financiera del Contrato de Interventoría 77

7.4 ÁREA JURÍDICA 78

7.4.1 Garantías 79

7.4.2 Suscripción de Actas de Inicio 81

7.4.3 Suscripción de otrosí prorroga a los contratos 81

7.5 ÁREA AMBIENTAL 82

7.5.1 Manejo y Disposición Final de Escombros 82
7.5.2 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales 83
7.5.3 Protección Flora 83

7.6 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 84
7.6.1 Recursos del Sistema 84
7.6.2 Documentación 84
7.6.3 Comunicación 85
7.6.4 Medicina Preventiva y del Trabajo 85
7.6.5 Seguridad Industrial 85
7.6.6 Trabajos de alto riesgo 86
7.6.7 Actas de inducción 87
7.6.8 Capacitación y/o Charlas 87

7.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 87
7.7.1 Implementación de medidas preventivas para el personal administrativo 88
7.7.2 Implementación de medidas preventivas para el personal en obra 88
7.7.3 Responsable del protocolo de bioseguridad 88
7.7.4 Seguimiento a caso positivo por Covid-19 88

8 RECOMENDACIONES 89

9 CONCLUSIONES 90

10 ANEXOS 91

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Ficha Técnica Contrato de Obra 13
Tabla 2 Ficha Técnica Contrato de Interventoría 15
Tabla 3. Consolidado intervenciones en centros educativos 18
Tabla 4. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Boyacá Parcial No. 4 21
Tabla 5. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Casanare Parcial No. 4 31
Tabla 6. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Norte de Santander Parcial No. 4 35
Tabla 7. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Santander Parcial No. 4 38
Tabla 8. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Arauca Parcial No. 4 45
Tabla 9. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Parcial No. 4 48
Tabla 10 Estado actual del contrato de obra 66
Tabla 11. Personal Profesional 67
Tabla 12. Personal de mano de obra no calificada 68
Tabla 13. Personal de mano de obra no calificada 69
Tabla 14. Personal de mano de obra no calificada 70
Tabla 15. Personal de mano de obra no calificada 70
Tabla 16. Personal de mano de obra no calificada 72
Tabla 17. Personal de interventoría 73
Tabla 18. Avance financiero contrato de obra 76

Tabla 19. Inversión financiero contrato de interventoría 78
Tabla 20. Pólizas contrato de obra.....79
Tabla 21. Pólizas contrato de interventoría 80

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación del Departamento de Arauca 9
Figura 2. Ubicación del Municipio de Yopal - Casanare 10
Figura 3. Ubicación del SENA, Regional Casanare.....11
Figura 4 Ubicación del Departamento de Norte de Santander 11
Figura 5 Ubicación del Departamento de Norte de Santander 12

LISTADO DE GRAFICAS

Gráfico 1 Avance del contrato de obra.....54
Gráfico 2 Programado Versus Ejecutado.....55
Gráfico 3 Ejecución del contrato de obra.....77

1 INTRODUCCIÓN

La firma 2C INGENIEROS S.A., en calidad de interventor del contrato de obra pública No. CO.1.PCCNTR.1552507 del 27 de mayo de 2020, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.", presenta **INFORME MENSUAL No 6 DE INTERVENTORÍA** correspondiente al periodo del **29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021**, del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato de interventoría anteriormente indicado.

2 OBJETIVO


Presentar a la supervisión ingeniero **EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ** Profesional Líder del grupo de construcciones, del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, el **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 6 DE INTERVENTORÍA** correspondiente al periodo del **29 de noviembre de 2020 AL 20 de enero de 2021**, del Contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020 ejecutado por 2C INGENIEROS S.A.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación los cuales poseen 225 inmuebles (175 inmuebles propios y 50 inmuebles recibidos sin contraprestación), los cuales prestan un servicio permanente a la comunidad ofreciendo formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, esta antigüedad sumado al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, para lo cual no se dispone del recurso humano necesario, siendo requerido contratar el MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

Por lo anterior, estos centros educativos presentes en el país, fueron agrupados por Lotes de acuerdo con su ubicación. Este contrato estará focalizado en el lote 2, el cual abarca los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander, Santander.

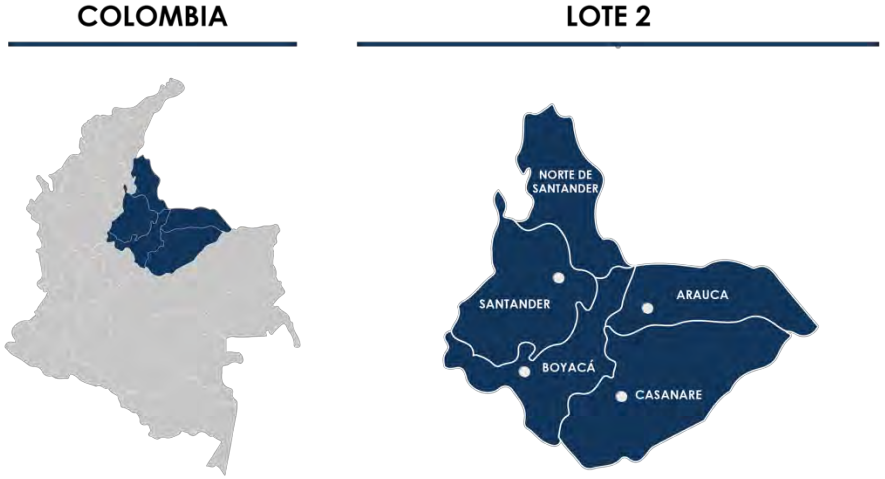

3.1.1 Departamento de Arauca

Departamento de Arauca cuenta con 6 centros educativos localizado en los municipios de Arauca, municipio de Arauquita, municipio de Saravena y Tame.

1. Municipio de Arauca como son:

   - Agencia pública de Empleo en la Calle 24 Nº. 19-17
   - Escuela de Gastronomía en la Calle 1era Nº 1-130
   - Centro de gestión desarrollo Agroindustrial Arauca sede principal en la carrera 20 Nª 28-163 Br libertadores.

2. Municipio de Arauquita Vereda campo alegre
3. Municipio de Saravena Centro de gestión y desarrollo agroindustrial sede Saravena ubicado en la carrera 16ª Nº 28-11 barrio 6 de octubre.
4. Municipio Tame, Centro de gestión y desarrollo agroindustrial sede Tame, ubicado en la Calle 15 Nº 37ª-155.

Figura 1 Ubicación del Departamento de Arauca




Fuente: https://upload.wikimedia.org

3.1.2 Departamento de Casanare

El departamento de Casanare, cuenta con 2 centros educativos localizados en la ciudad de Yopal. Este municipio que se encuentra ubicado cerca del río Cravo Sur, en el piedemonte de la cordillera Oriental, por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km², Medio 106Km² y Frio 25Km², y está limitado por el Norte: Municipio de Nunchía y municipio de Paya (departamento de Boyacá), por el Sur: Municipio de Orocué y Maní, por el Oriente: Municipio de San Luis

de Palenque, y por el Occidente: Municipio de Aguazul y municipio de Labranzagrande (Departamento de Boyacá). (Ver Figura 2)


Figura 2. Ubicación del Municipio de Yopal - Casanare

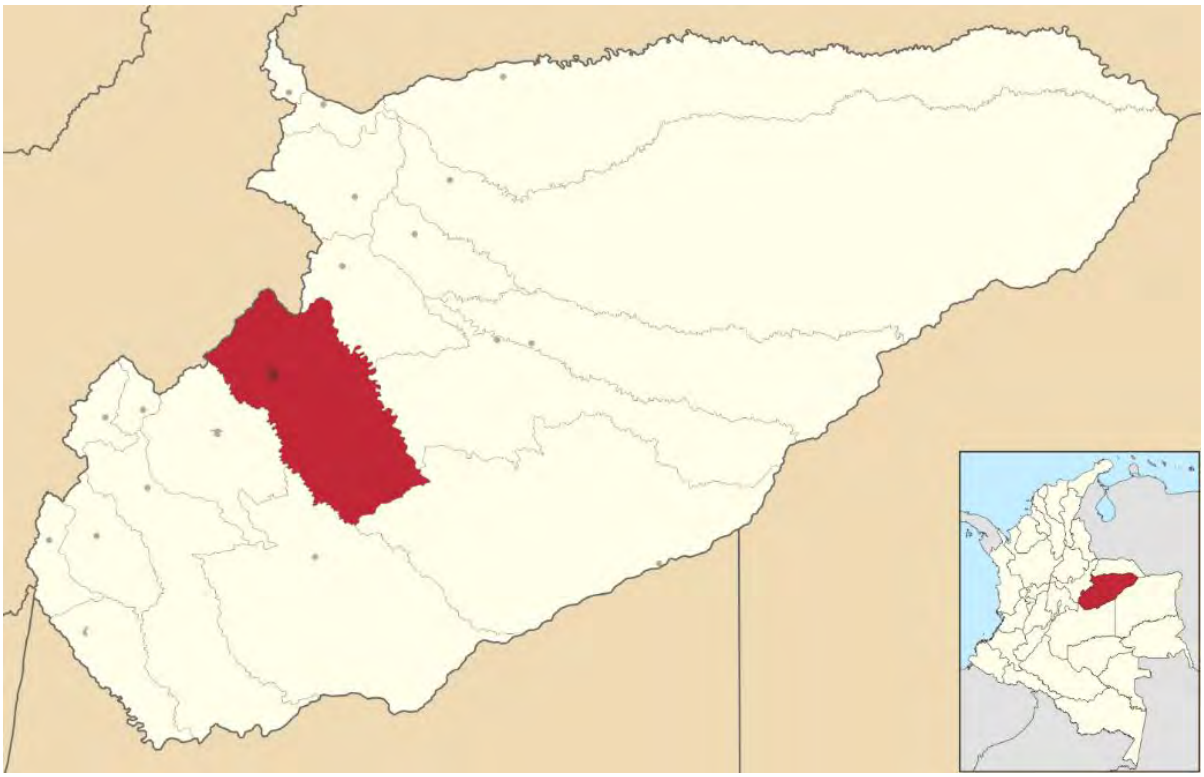

Fuente: https://upload.wikimedia.org

Este proyecto contempla mantenimiento, reparaciones y mejoras locativas en el C.1. Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare y el C.2. Despacho Regional Casanare, según el presupuesto asignado para dichos centros, conforme a las necesidades priorizadas. El C.1. Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare y el C.2. Despacho Regional Casanare, se encuentran ubicados en la Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil del municipio de Yopal departamento de Casanare, (Ver Figura 3).

Figura 3. Ubicación del SENA, Regional Casanare

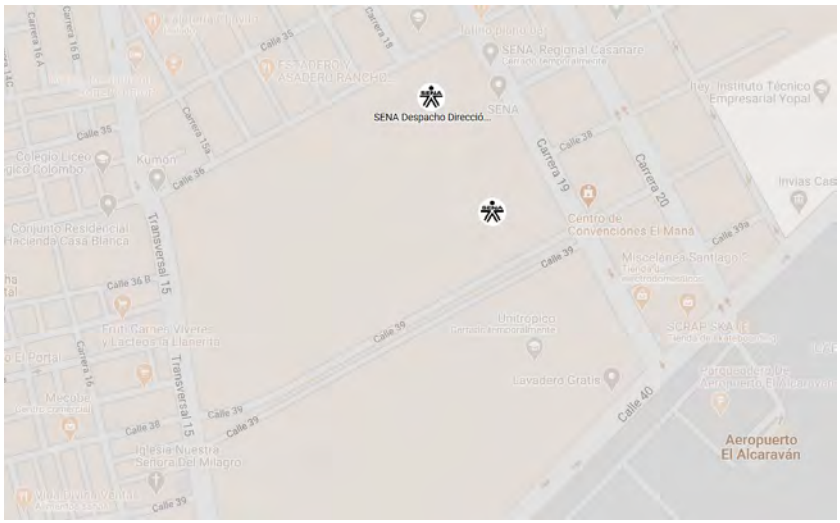

Fuente: ttps://www.google.com/maps

3.1.3 Departamento de Norte de Santander

El departamento de Norte de Santander, cuenta con 8 centros educativos localizados en la ciudad de Cúcuta y los municipios de Pamplona, Los Patios y Ocaña.

Figura 4 Ubicación del Departamento de Norte de Santander




Fuente: Google Maps

3.1.4 Departamento de Santander

El departamento de Santander, cuenta con 2 centros educativos localizados en la ciudad de Santander y los municipios de Piedecuesta, San Gii, Barbosa, Vélez, Socorro, Cimitarra, Barrancabermeja y Málaga.

Figura 5 Ubicación del Departamento de Norte de Santander

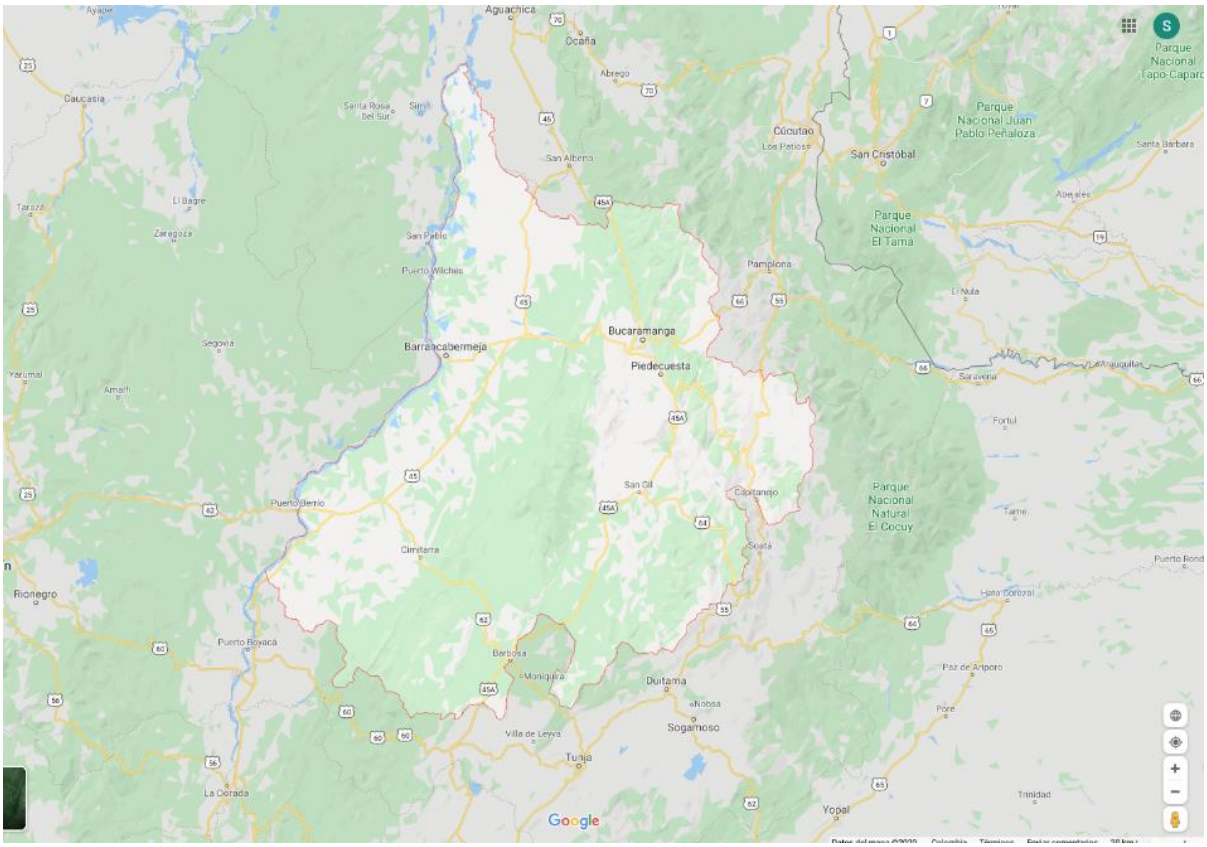

Fuente: Google maps

4 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

El contratista CONSORCIO JG 2020, es el encargado de ejecutar el contrato de obra CIVIL No. CO.1.PCCNTR.1552507 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.)".

El 30 de enero de 2020, el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena publicó en el SECOP II_(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.5527713&isFromPublicArea=True&isModal=False) (i) el aviso de convocatoria pública, (ii) el estudio de mercado, (iii) los estudios previos, (iv) el anexo al proyecto de pliego de condiciones y los anexos del proceso de contratación de licitación pública No. LP-DG-0001-2020.

Mediante Resolución No. 1-0254 de 2020 se dio apertura al proceso de contratación No. LP-DG-0001-2020, publicándose el contenido de la misma en la plataforma SECOP II, el 04 de marzo de 2020, donde el CONSORCIO JG 2020 se presentó y cumplió con todo lo exigido en el pliego de condiciones y fue elegido mediante RESOLUCIÓN No. 1-0498 de fecha 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se ordena la Adjudicación de la licitación pública No. LP-DG-0001-2020.

Tabla 1 Ficha Técnica Contrato de Obra

CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATO NO.:	CO.1 PCCNTR.1552507
FECHA DEL CONTRATO:	27 DE MAYO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA DE LA OBRA:	CONSORCIO JG 2020 NIT. 901.382.308 - 1
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA:	JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR C.C. 71.185.747 de Puerto Berrío
INTERVENTOR:	2C INGENIEROS S.A. NIT. 830.023.761 - 7
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTOR:	CESAR ASHLEY MORA BARNEY C.C. 19.356.176 de Bogotá
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 3.681.491.238,00) INCLUIDO AU, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, GASTOS, IVA SOBRE UTILIDAD Y DEMÁS

CONDICIONES DEL CONTRATO	
	DEROGACIONES EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL (01) DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta cuando se agote el valor total del mismo lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA PRORROGA No. 1	TREINTA (30) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL OTROSÍ PRORROGA No. 2	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2021
ADICIÓN No. 1 SEGÚN OTROSÍ PRORROGA No. 2	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE **($38.702.000,00)** con cargo al CDP No. 15320, con el ánimo de generar los reembolsos correspondientes a los montos causados por implementación de los protocolos de bioseguridad.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.720.193.238,00)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LOTE 2 - Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Santander.

Fuente: Interventoría 2C Ingenieros S.A.

5 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El contratista Interventor 2C INGENIEROS S.A., es el encargado de ejecutar el contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"

Que el 26 de febrero de 2020, el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena publicó en la plataforma SECOP II: (i) el aviso de convocatoria pública, (ii) el estudio de mercado, (iii) los estudios previos, (iv) el anexo al proyecto de pliego de condiciones y los anexos del proceso de contratación de concurso de méritos No. CM-DG-0001-2020.

Mediante Resolución No. 1-0330 de 11 de marzo de 2020 se dio apertura al proceso de selección por Concurso de méritos No. CM-DG-0001-2020, publicándose el contenido de la misma en la plataforma SECOP II, donde 2C INGENIEROS S.A. se presentó y cumplió con todo lo exigido en el pliego de condiciones y fue elegido mediante RESOLUCIÓN No. 1-0633 de fecha 16 de junio de 2020, por medio de la cual se ordena la Adjudicación del concurso de méritos No. CM-DG-0001-2020.

Tabla 2 Ficha Técnica Contrato de Interventoría

CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATO NO.:	CO1.PCCNTR.1635455
FECHA DEL CONTRATO:	19 DE JUNIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"
CONTRATISTA INTERVENTOR:	2C INGENIEROS S.A. NIT. 830.023.761 - 7
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTOR:	CESAR ASHLEY MORA BARNEY C.C. 19.356.176 de Bogotá
SUPERVISOR DESIGNADO:	EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ
CARGO:	LIDER GRUPO CONSTRUCCIONES SENA
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE ($ 460.956.020,00) INCLUIDO IVA.
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA PRORROGA No. 1	DIECISÉIS (16) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA PRORROGA No. 2	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2021
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LOTE 2 - Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Santander.

Fuente: Interventoría 2C Ingenieros S.A.

6 ALCANCE DEL PROYECTO

6.1 ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El presente proyecto contempla, mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, en diferentes centros ubicados en las regionales de:

- Arauca
- Boyacá
- Casanare
- Norte de Santander
- Santander

6.2 ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La INTERVENTORÍA, realizará la supervisión, la vigilancia, control, seguimiento y acompañamiento a las actividades a desarrollar en cumplimiento al contrato, que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.)".

La INTERVENTORÍA dentro de sus funciones deberá supervisar y controlar la gestión técnica, administrativa, jurídica, contable y ambiental, desarrollada por el contratista constructor para el cumplimiento de las obligaciones contratadas detalladas en el contrato respectivo, así mismo, deberá efectuar el control de la calidad y cantidad de los materiales empleados, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas, logrando que se desarrolle el contrato de obra dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.

7 CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se relacionan todas las actuaciones ejecutadas por la interventoría, emanadas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, en la parte técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental. Al igual que el avance y las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo 29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021.

7.1 ÁREA TÉCNICA

En cumplimiento de las funciones descritas en el anexo del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, estudios previos y pliego de condiciones definitivos, la interventoría realizo las siguientes actividades, en desempeño de sus obligaciones:

7.1.1 Actividades Ejecutadas

Durante el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021, se han venido desarrollando actividades constructivas en varios centros ubicado en las cinco regionales que comprenden el lote 2 objeto del contrato de obra civil No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, según lo indicado en el presente informe.

La interventoría 2C Ingenieros S.A. ha realizado control y seguimiento a la ejecución de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, las cuales son relacionadas en el presente informe, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato conforme a lo contratado.

El contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a las especificaciones contratadas para cada una de las actividades.

2C Ingenieros S.A. ha realizado las gestiones ante los diferentes centros de formación para la autorización de ingreso del personal de obra a realizar las diferentes actividades de mantenimiento.

La interventoría ha elaborado informes semanales de las actividades ejecutadas por el contratista, los cuales han sido radicados vía email a la supervisión designada, por parte de la entidad contratante.

2C INGENIEROS S.A. ha venido elaborando los informes mensuales correspondientes a la ejecución del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, conforme a lo estipulado en el mismo. Por tanto, el 27 de agosto de 2020 mediante

comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-021 radico vía email el **informe No. 1** Correspondiente al periodo del 27 al 31 de julio de 2020, el 15 de septiembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-031 radico vía email el **informe No. 2** Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2020, el 24 de septiembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-038 radico vía email el **informe No. 3** Correspondiente al periodo del 01 al 20 de septiembre de 2020 junto con el acta de avance parcial No. 1; el 04 de noviembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-0077 radico vía email el **informe No. 4** Correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 24 de octubre de 2020 junto con el acta de avance parcial No. 2; el 09 de diciembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-100 radico vía email el **informe No. 5** Correspondiente al periodo del 25 de octubre al 28 de noviembre de 2020 junto con el acta de avance parcial No. 3. Dando así cumplimiento al contrato de interventoría.

7.1.2 Aspectos relevantes sobre los centros educativos

El CONSORCIO JG 2020 se encuentra desarrollando actividades de obra en las siguientes regionales:

Tabla 3. Consolidado intervenciones en centros educativos

LOTE 2 – 42 Centros de Formación					
REGIONAL	**POR VISITAR**	**VISITADAS**	**SEDES QUE NO SERÁN INTERVENIDAS**	**EJECUCIÓN**	**TERMINADAS**
Arauca	0	6	0	6	0
Boyacá	0	11	2	0	11
Casanare	0	2	0	2	0
Norte de Santander	0	8	0	5	0
Santander	0	15	0	10	0
TOTAL	**0**	**42**	**2**	**23**	**11**

Fuente: 2C Ingenieros S.A.

De los 11 centros educativos visitados en Boyacá, el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de Tunja y Escuela de Gastronomía y Turismo de Villa de Leyva no serán intervenidos, de acuerdo con lo evidenciado en la visita inicial realizada – se incluyen con terminados.

7.1.3 Cantidades de obra y valor revisado


Esta interventoría durante el periodo de ejecución del proyecto en el periodo del presente informe realizó control, verificación y seguimiento a la construcción de las obras objeto del contrato ejecutadas por el Consorcio JG 2020.

A continuación, se relacionan las actividades que fueron revisadas y medidas por la Interventoría a la fecha de corte del presente informe:

7.1.3.1 Regional Boyacá

Durante el periodo del presente informe del **29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021**, el CONSORCIO JG 2020 ejecutó actividades de mantenimiento en diferentes centros de la regional Boyacá, las cuales son relacionadas a continuación:

B.5 DIRECCIÓN REGIONAL – SOGAMOSO: Se ejecutó actividad de Instalación de cubierta.

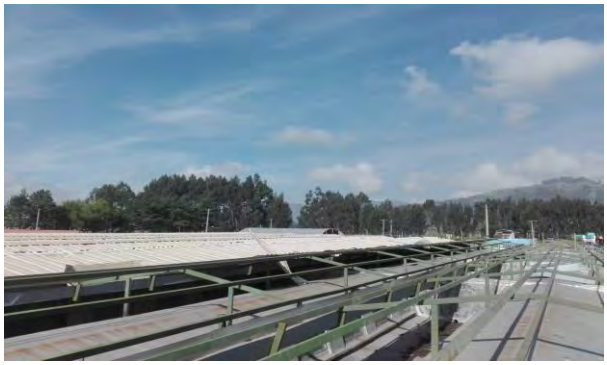B1. CENTRO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL – DUITAMA: Se ejecutó actividad de Impermeabilización.




B.2.1 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL – TUNJA: Se ejecutó actividad de Instalación muro superboard.

Durante el periodo de la Semana del Semana del 25 al 31 de diciembre de 2020
Se realizó la entrega de los centros educativos de la regional, quedando pendientes algunas actividades menores y actividades de limpieza, orden y aseo. A continuación, se realiza listado de las sedes intervenidas y finalizadas:

1. B1. CENTRO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - CEDEAGRO DUITAMA
2. B.2.1 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - CEGAFE TUNJA
3. B.2 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO - TUNJA
4. B.2 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO - TUNJA
5. B.2 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - CEGAFE MONIQUIRA
6. B.2 CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO - VILLA DE LEYVA
7. B.3 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - SOGAMOSO
8. B.3 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - CHIQUINQUIRÁ
9. B.3 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - CIMM DUITAMA
10. B.4 CENTRO MINERO DE MORCÁ - SOGAMOSO
11. B.5 DIRECCIÓN REGIONAL - SOGAMOSO

Cabe indicar que los 11 centros educativos visitados en Boyacá, el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de Tunja y Escuela de Gastronomía y Turismo de Villa de Leyva no fueron intervenidos, de acuerdo con lo evidenciado en la visita inicial realizada, por consiguiente, se incluyen como terminados, toda vez que hacen parte de los centros relacionados para la ejecución del contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 de 2020.

En la tabla a continuación se indican las cantidades revisadas y aprobadas para los centros intervenidos durante el periodo del presente informe para la regional Boyacá.

Tabla 4. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Boyacá Parcial No. 4

CONDICIONES CONTRACTUALES					SEDE PRINCIPAL TUNJA CEGAFE		SEDE MONIQUIRA CEGAFE		GASTRONOMIA		CENTRO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA		CENTRO INDUSTRIAL CIMM DUITAMA BOYACA.		CENTRO INDUSTRIAL CIMM CHIQUINQUIRA BOYACA.		CENTRO MINERO BOYACA. SOGAMOSO		DESPACHO REGIONAL BOYACA.		CONSOLIDADO TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	**IMPERMEABILIZACIONES**																					
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICOManto Protector 10m2	1,00	M2	$ 24.772,00		$ 0,00	89,28	$ 2.211.644,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	89,28	$ 2.211.644,16
5	**LAVADO DE TANQUES**																					
5.2.1	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	1,00	M3	$ 6.427,00		$ 0,00		$ 0,00	97,20	$ 624.704,40		$ 0,00		$ 0,00	19,87	$ 127.704,49		$ 0,00		$ 0,00	117,07	$ 752.408,89
5.3.2	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE ELEVADO	1,00	M3	$ 7.067,00	4,00	$ 28.268,00	2,00	$ 14.134,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6	$ 42.402,00
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza demoliciones, pinturas,estructuras, etc.)**																					
8.5	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSIN CERAMICO - GRES - GRANITO- MEDIA CAÑA GRANITO- (Incluye retiro de escombros)	1,00	ML	$ 1.851,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	29,74	$ 55.048,74		$ 0,00	29,74	$ 55.048,74
8.15	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.665,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	127,50	$ 1.232.287,50	127,5	$ 1.232.287,50
8.31	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA CERAMICA .20 X.20 HASTA .45 X.45	1,00	M2	$ 36.011,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,12	$ 184.376,32		$ 0,00	66,46	$ 2.393.291,06		$ 0,00	71,58	$ 2.577.667,38
8.34	AFINADO PULIDO ENDURECIDO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=0,04 M.	1,00	M2	$ 23.076,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	51,31	$ 1.184.029,56		$ 0,00	51,31	$ 1.184.029,56
8.35	ENCHAPE CERAMICA 50X50	1,00	M2	$ 99.787,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,07	$ 1.803.151,09		$ 0,00	18,07	$ 1.803.151,09
8.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN DUROPISO- GRAVILLA LAVADA- BALDOSIN DE GRANITO H = 0.08 M- CERAMICA- GRES- MORTERO H = 0,10 m	1,00	ML	$ 16.569,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	45,10	$ 747.261,90		$ 0,00	45,1	$ 747.261,90
8.49	ENCHAPE PARED 25 x 25 DE PRIMERA CALIDAD	1,00	M2	$ 65.794,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	89,56	$ 5.892.510,64		$ 0,00	89,56	$ 5.892.510,64
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**																					

CONDICIONES CONTRACTUALES					SEDE PRINCIPAL TUNJA CEGAFE		SEDE MONIQUIRA CEGAFE		GASTRONOMIA		CENTRO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA		CENTRO INDUSTRIAL CIMM DUITAMA BOYACA.		CENTRO INDUSTRIAL CIMM CHIQUINQUIRA BOYACA.		CENTRO MINERO BOYACA. SOGAMOSO		DESPACHO REGIONAL BOYACA.		CONSOLIDADO TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
9.15	REPARACION DE CANAL DE A.LLUVIAS METALICO	1,00	ML	$ 25.177,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	102,00	$ 2.568.054,00	102	$ 2.568.054,00
9.30	CAMBIO DE SENSOR PARA ORINAL DE COLGAR	1,00	UN	$ 140.463,00	10,00	$ 1.404.630,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10	$ 1.404.630,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	1,00	UN	$ 27.454,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 137.270,00	5	$ 137.270,00
10	**NO PREVISTOS**							$ 0,00		$ 0,00												
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)		M2	$ 63.214,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00			643,70	$ 40.690.922,61	643,7	$ 40.690.922,61
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC		M2	$ 59.978,21		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20,85	$ 1.250.545,68		$ 0,00		$ 0,00	20,85	$ 1.250.545,68
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO		M2	$ 9.830,18		$ 0,00	89,28	$ 877.638,47		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	89,28	$ 877.638,47
NP-20	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CUBIERTA LABORATORIOS REGIONAL BOYACÁ SOGAMOSO (INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURA REFUERZOS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)"		UND	$ 6.113,93		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	500,00	$ 3.056.965,00	500	$ 3.056.965,00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN MALLA GALVANIZADA CAL 10, ANGULO 1 1/2" X 3 /16" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE)		m²	$ 73.436,73		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,20	$ 1.116.238,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,2	$ 1.116.238,30
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH		Und	$ 208.511,19	2,00	$ 417.022,38		$ 0,00	4,00	$ 834.044,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6	$ 1.251.067,14
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLES de 15-20-30 AMP		Und	$ 22.209,13		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	216,00	$ 4.797.172,08	216	$ 4.797.172,08
COSTO DIRECTO						**$1.849.920,38**		**$ 3.103.416,63**		**$ 1.458.749,16**		**$ 1.116.238,30**		**$ 184.376,32**		**$1.378.250,17**		**$ 12.075.292,99**		**$ 52.482.671,19**		**$ 73.648.915,14**
AU (23%)						**$ 425.481,69**		**$ 713.785,82**		**$ 335.512,31**		**$ 256.734,81**		**$ 42.406,55**		**$ 316.997,54**		**$ 2.777.317,39**		**$ 12.071.014,37**		**$ 16.939.250,48**
U (5%)						**$ 92.496,02**		**$ 155.170,83**		**$ 72.937,46**		**$ 55.811,92**		**$ 9.218,82**		**$ 68.912,51**		**$ 603.764,65**		**$ 2.624.133,56**		**$ 3.682.445,76**
IVA (19%) / U						**$ 17.574,24**		**$ 29.482,46**		**$ 13.858,12**		**$ 10.604,26**		**$ 1.751,58**		**$ 13.093,38**		**$ 114.715,28**		**$ 498.585,38**		**$ 699.664,69**
COSTO TOTAL						**$ 2.385.472,33**		**$ 4.001.855,74**		**$ 1.881.057,04**		**$ 1.439.389,29**		**$ 237.753,26**		**$1.777.253,59**		**$ 15.571.090,31**		**$ 67.676.404,50**		**$ 94.970.276,07**

Teniendo en cuenta lo indicado en la tabla anterior, el valor ejecutado en la regional de Boyacá corresponde a la suma de **$94.970.276,07**

7.1.3.2 Regional Casanare - Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial y Despacho Regional Casanare

Durante el periodo del presente informe del **29 de noviembre de 2020 AL 20 de enero de 2021**, el CONSORCIO JG 2020 ejecutó para la regional Casanare, actividades tales como: mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de unidades sanitarias, suministro e instalación de registros, suministro e instalación luminaria led alumbrado público, y pinturas en infraestructura metálica, por consiguiente a continuación se relacionan las actividades aprobadas para el presente corte:

Ítem No. 1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO #4
Esta actividad se ejecutó en las áreas donde las tejas se encontraban partidas, las cuales generaban filtraciones.




Ítem No. 2.9 TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.
Se realizó la instalación de un tablero en el área de cuarto eléctrico.



Ítem No. 8.3 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES-PISOS CERÁMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)

Esta actividad se ejecutó en las unidades sanitarias del bloque nuevos ambientes o bloque denominado Norte, con el fin de realizar el cambio e instalación de dos registros.

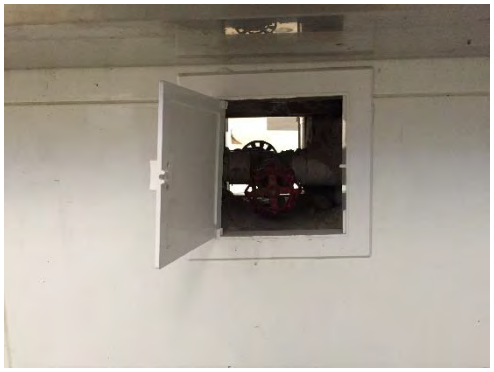




Ítem No. 8.6 DESMONTE DE CIELORRASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL-LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)

Esta actividad se ejecutó en el área de baños de la agencia pública de empleo y en el ambiente de atención al ciudadano, con el fin de realizar el cambio, toda vez que el existente estaba en mal estado por causa de las filtraciones.





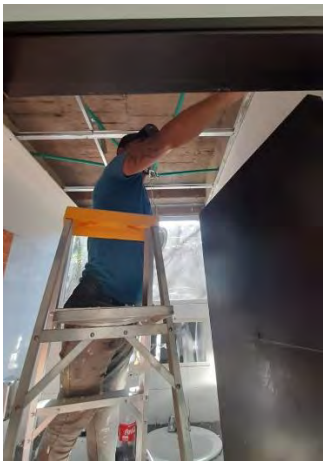


Ítem No. 8.13 DESMONTE TEJA DE BARRO (Incluye retiro de escombros)
Esta actividad se ejecutó en diferentes cubiertas del centro, en áreas tales como: cubierta de baños unidad 3, y cubierta oficina atención al ciudadano.







Ítem No. 8.37 TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3
Esta actividad se ejecutó en las áreas externas a los ambientes administrativos y a las aulas de clase, donde se requerían.

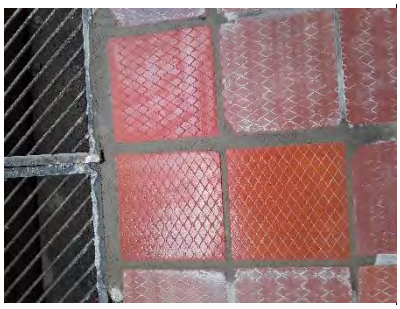
Ítem No. 8.53 CIELO RASO PLANO DRYWALL


Esta actividad se ejecutó en el área de baños de la agencia pública de empleo, toda vez que el existente estaba en mal estado por causa de las filtraciones.



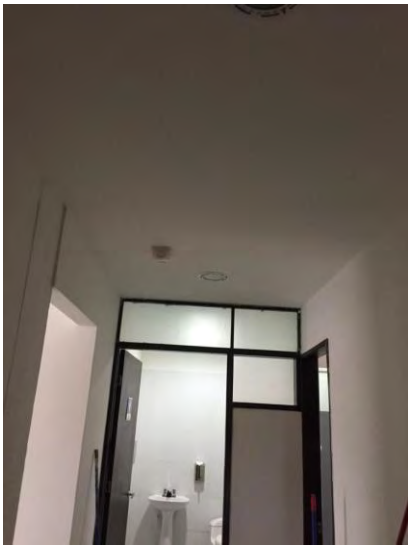

Ítem 9.9: INSTALACIÓN DE TUBERÍA BAJANTE ALL PVCS DE D=3", CON ROTURA DE PISO (INCLUYE RESANE Y ACABADO DE PISO EN GRANITO PULIDO)

Esta actividad se ejecutó en la parte externa del ambiente de sennova, donde se realizará el cambio de canal de aguas lluvias.

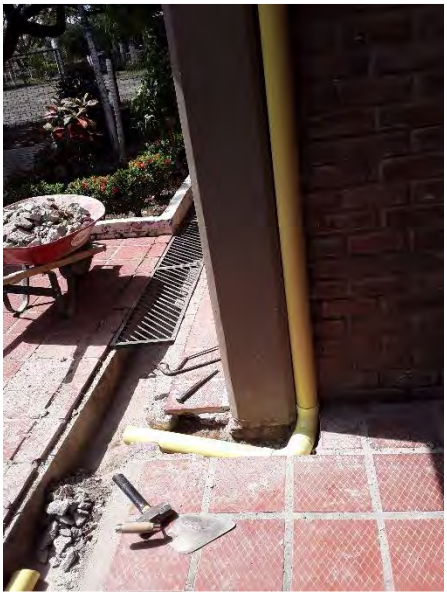



Ítem 9.23: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA Ø=1/2"
Esta actividad se ejecutó en las unidades sanitarias del bloque nuevos ambientes o bloque denominado Norte.




Ítem NP-10: LAVADO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO (sobre asbesto cemento, No incluye base en asbesto cemento)
Esta actividad se ejecutó en diferentes cubiertas del centro, en áreas tales como: Gastronomía, Cubierta de enfermería, Agroindustria, sindesena, Auditorio, Biotecnología, Electrónica, Recursos Humanos, cubierta de baños unidad 3, y cubierta oficina atención al ciudadano






Ítem NP-13: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 60W 100/277V 5.000K/ 8.400 lm FOTOCELDA (No incluye cableado) (INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1 DOBLEZ DE 1-1/2" X 1.20 m CON COLLARÍN DE 1-1/2" X 1/4" 180 mm)
Esta actividad a la fecha se ha ejecutado en el área perimetral del centro SENA YOPAL.



Ítem NP-17: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA SANITARIO CORONA O SIMILAR
Esta actividad se ejecutó en las diferentes unidades sanitarias del C1. Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare y del C2. Despacho Regional Casanare



Ítem NP-22: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)


Esta actividad se realizó en el ambiente de hidrocarburos, en puertas y lamina bajo placa.





Ítem NP-23: ESMALTE SOBRE BARANDA METÁLICA EN TUBO Y MALLA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)

Esta actividad se realizó en el ambiente de hidrocarburos, en las barandas de dicha área.

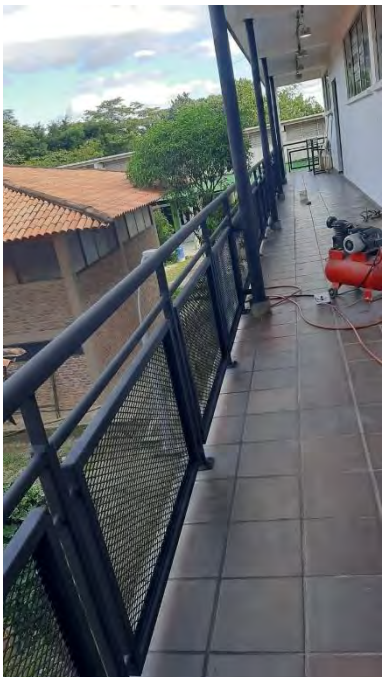




Ítem NP-24: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE TUBERÍA O LAMINA LINEAL (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)

Esta actividad se realizó en el ambiente de hidrocarburos, en tubería y escaleras.



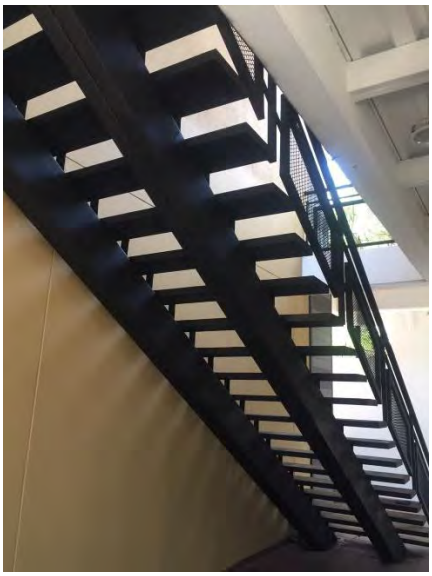

Ítem NP-25: MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA (EMBOBINADO MOTOR BARMESA 5,0 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUES SOPORTES 1 1/2", PRETOSTATO 30-50 PSI, MONITOR DE VOLTAJE, CONTACTOR WEG 25 AMP)

Esta actividad se ejecutó en el cuarto de bombas ubicado contiguo al bloque denominado Zona Norte o Ambiente nuevo.









Ítem NP-27: LAVADO DE CUBIERTAS EN TEJA ASBESTO CEMENTO

Esta actividad se ejecutó en diferentes cubiertas del centro, en áreas tales como: Gastronomía, Auditorio, Biotecnología, Computación, cocina, baños unidad 3, y oficina atención al ciudadano

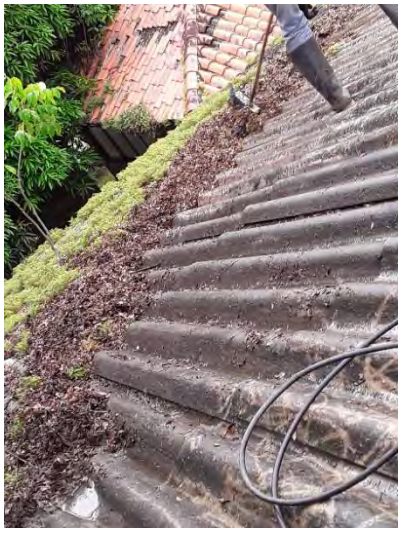

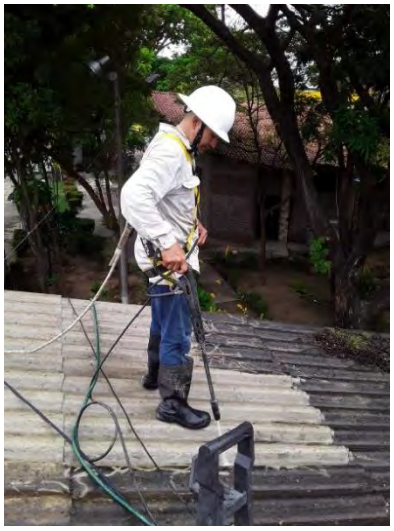

Ítem NP-35: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14

Este ítem fue necesario para la instalación de las luminarias de alumbrado público en el área perimetral del centro SENA YOPAL.

En la tabla a continuación se indican las cantidades revisadas y aprobadas para los centros intervenidos durante el periodo del presente informe para la regional Casanare.

Tabla 5. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Casanare Parcial No. 4

CONDICIONES CONTRACTUALES					Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**					
1.9	INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	1,00	M2	$ 37.908,00	9,78	$ 370.740,24
2	**SISTEMA ELÉCTRICO**					
2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	1,00	UN	$ 1.354.867,00	1,00	$ 1.354.867,00
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**					
8.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 8.530,00	0,36	$ 3.070,80

CONDICIONES CONTRACTUALES					Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL-LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 8.462,00	48,19	$ 407.783,78
8.13	DESMONTE TEJA DE BARRO (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.302,00	148,97	$ 1.385.718,94
8.37	TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3	1,00	M2	$ 57.445,00	3,00	$ 172.335,00
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	1,00	M2	$ 50.081,00	28,58	$ 1.431.314,98
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**					
9.9	INSTALACION DE TUBERÍA BAJANTE ALL PVCS DE D=3", CON ROTURA DE PISO (INCLUYE RESANE Y ACABADO DE PISO EN GRANITO PULIDO)	1,00	ML	$ 48.742,00	12,80	$ 623.897,60
9.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA d=1/2"	1	UN	$ 46.063,00	2,00	$ 92.126,00
10	**NO PREVISTOS**					
NP-10	LAVADO E INSTALACION DE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO (sobre asbesto cemento, No incluye base en asbesto cemento)		M2	$ 29.056,34	520,49	$ 15.123.534,41
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 60W 100/277V 5.000K/ 8.400 lm FOTOCELDA (No incluye cableado) (INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1 DOBLEZ DE 1-1/2" X 1.20 m CON COLLARIN DE 1-1/2" X 1/4" 180 mm)		UND	$ 506.054,35	55,00	$ 27.832.989,25
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA SANITARIO CORONA O SIMILAR		UND	$ 94.022,24	14,00	$ 1.316.311,36
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		m²	$ 39.301,99	95,75	$ 3.763.236,29
NP-23	ESMALTE SOBRE BARANDA METÁLICA EN TUBO Y MALLA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		m²	$ 34.212,79	53,85	$ 1.842.358,74
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE TUBERÍA O LAMINA LINEAL (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		ml	$ 23.849,99	53,14	$ 1.267.388,47
NP-25	MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA (EMBOBINADO MOTOR BARMESA 5,0 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUES SOPORTES 1 1/2", PRETOSTATO 30-50 PSI, MONITOR DE VOLTAJE, CONTACTOR WEG 25 AMP)		Und	$ 1.672.898,95	1,00	$ 1.672.898,95
NP-27	LAVADO DE CUBIERTAS EN TEJA ASBESTO CEMENTO		m²	$ 12.773,89	505,20	$ 6.453.369,23
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14		ml	$ 6.724,83	260,30	$ 1.750.473,25
COSTO DIRECTO						**$ 66.864.414,29**
AU (23%)						**$ 15.378.815,29**
U (5%)						**$ 3.343.220,71**
IVA (19%) / U						**$ 635.211,94**
COSTO TOTAL						**$ 86.221.662,23**

Teniendo en cuenta lo indicado en la tabla anterior, el valor ejecutado en la regional de Casanare corresponde a la suma de **$ 86.221.662,23**

7.1.3.3 Regional Norte de Santander

Durante el periodo del presente informe del **29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021**, el CONSORCIO JG 2020 ejecuto actividades de mantenimiento en diferentes centros de la regional Norte de Santander, las cuales son relacionadas a continuación:

NS.2.3 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - COMUNEROS CÚCUTA: Se ejecutaron actividades de pintura y instalación de cielo raso.





NS.3 DIRECCIÓN REGIONAL/CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS/ CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO – CÚCUTA: Se ejecutaron actividades de mantenimiento, sifones, instalación cintas antideslizantes, Desmonte de cubierta, instalación mortero de nivelación.






NS.2.2 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - CALZADO CÚCUTA: Se ejecutaron actividades de Polarizado, pintura cielo raso, mantenimiento filtraciones y canales.

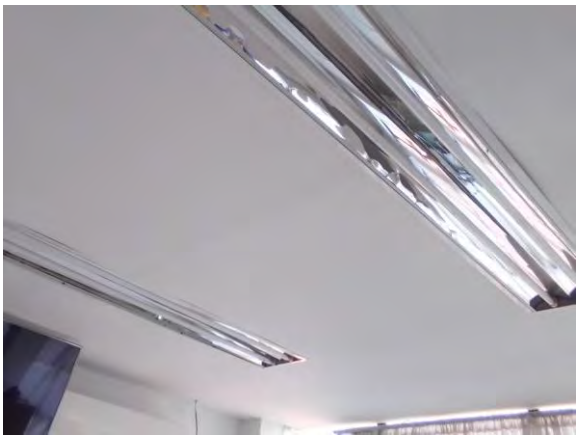

NS.2.4 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - LOS PATIOS: Se ejecutaron actividades de Pintura, cielo raso





En la tabla a continuación se indican las cantidades revisadas y aprobadas para los centros intervenidos durante el periodo del presente informe para la regional Norte de Santander.

Tabla 6. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Norte de Santander Parcial No. 4

CANTIDADES CONTRATADAS					DIRECCIÓN REGIONAL calle 2 n#1n-142 industria y biblioteca		CUCUTA- SEDE PESCADERO - CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS AVENIDA CANAL BOGOTÁ No. 1N - 30 BARRIO PESCADERO		COMUNEROS		CALZADO		LOS PATIOS- CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS AV - 10 CL 29 No.29 -06		CAJAS REALES pamplona		AGROINDUSTRIAL pamplona CL 2N # 1N-142		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL NORTE DE SANTANDER	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL NORTE DE SANTANDER
1	**IMPERMEABILIZACIONES**																			
1.6	CORRECCIÓN/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACIÓN. GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	1,00	UN	$ 22.539,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5	$ 112.695,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5	$ 112.695,00
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	1,00	ML	$ 3.304,00	200	$ 660.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	200	$ 660.800,00
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	1,00	UND	$ 66.094,00		$ 0,00	7	$ 462.658,00	3	$ 198.282,00		$ 0,00	5	$ 330.470,00		$ 0,00		$ 0,00	15	$ 991.410,00
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza demoliciones, pinturas,estructuras, etc.)**					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
8.4	DEMOLICIÓN ENCHAPE FACHADA CRISTANAC - FACHADAS Y MUROS INTERNOS	1,00	M2	$ 5.899,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 12.977,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 12.977,80
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL-LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 8.462,00		$ 0,00	12	$ 101.544,00	61	$ 515.132,71		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	73	$ 616.676,71
8.12	DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE- TOLETE; E = 12 cm (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.640,00	43	$ 419.301,44		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	43	$ 419.301,44
8.15	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.665,00	772	$ 7.461.380,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	772	$ 7.461.380,00
8.18	RETIRO DE PINTURA EPOXICA	1,00	M2	$ 2.742,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	38	$ 105.018,60	38	$ 105.018,60
8.21	REPOSICION MUROS EN DRY WALL - SUPERBOARD	1	M2	$ 96.841,00		$ 0,00		$ 0,00	20	$ 1.901.957,24		$ 0,00	3	$ 292.459,82		$ 0,00		$ 0,00	23	$ 2.194.417,06
8.28	RESANES GENERALES PAÑETES SOBRE MUROS Y BAJO PLACA.-	1,00	M2	$ 9.140,00	96	$ 877.476,56		$ 0,00	49	$ 447.860,00	15	$ 137.282,80		$ 0,00	33	$ 297.940,24		$ 0,00	193	$ 1.760.559,60
8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA Y/NO REFLECTIVAS PARA GRADAS	1,00	ML	$ 14.922,00	50	$ 746.100,00	46	$ 686.412,00		$ 0,00		$ 0,00	25	$ 377.526,60		$ 0,00		$ 0,00	121	$ 1.810.038,60
8.52	TABLETAS DE FACHADA INTERNA DE GRES/M2	1,00	M2	$ 46.955,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 103.301,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 103.301,00
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	1,00	M2	$ 50.081,00		$ 0,00	12	$ 600.972,00	61	$ 3.048.730,96	3	$ 150.243,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	76	$ 3.799.945,96
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	1,00	M2	$ 11.032,00		$ 0,00		$ 0,00	5	$ 50.195,60	115	$ 1.268.569,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	120	$ 1.318.765,28
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	1,00	M2	$ 10.827,00	582	$ 6.300.263,78	64	$ 697.432,03	677	$ 7.330.257,95	284	$ 3.076.731,33		$ 0,00	36	$ 388.256,22		$ 0,00	1.643	$ 17.792.941,30
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	1,00	M2	$ 19.083,00	13	$ 249.033,15		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	13	$ 249.033,15

CANTIDADES CONTRATADAS					DIRECCIÓN REGIONAL calle 2 n#1n-142 industria y biblioteca		CUCUTA- SEDE PESCADERO - CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS AVENIDA CANAL BOGOTÁ No. 1N - 30 BARRIO PESCADERO		COMUNEROS		CALZADO		LOS PATIOS- CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS AV - 10 CL 29 No.29 -06		CAJAS REALES pamplona		AGROINDUSTRIAL pamplona CL 2N # 1N-142		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL NORTE DE SANTANDER	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL NORTE DE SANTANDER
8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO	1,00	M2	$ 13.411,00		$ 0,00	10	$ 140.010,84		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	249	$ 3.339.473,11	259	$ 3.479.483,95
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	1,00	M2	$ 17.290,00		$ 0,00		$ 0,00	20	$ 345.972,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20	$ 345.972,90
8.78	CAMBIO PELICULA POLARIZADO VIDRIO LISO	1,00	M2	$ 28.979,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	203	$ 5.882.302,32		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	203	$ 5.882.302,32
8.81	LIMPIEZA VIDRIOS	1,00	M2	$ 3.818,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	203	$ 774.996,73		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	203	$ 774.996,73
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	1,00	ML	$ 8.389,00	100	$ 838.900,00	83	$ 693.770,30		$ 0,00	52	$ 436.228,00		$ 0,00		$ 0,00	24	$ 203.013,80	259	$ 2.171.912,10
9.9	INSTALACION DE TUBERÍA BAJANTE ALL PVCS DE D=3", CON ROTURA DE PISO (INCLUYE RESANE Y ACABADO DE PISO EN GRANITO PULIDO)	1,00	ML	$ 48.742,00	67	$ 3.265.714,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	67	$ 3.265.714,00
9.16	SOPORTES METÁLICOS PARA BAJANTE PVCS D=4"	1,00	UN	$ 21.562,00	27	$ 582.174,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	27	$ 582.174,00
9.17	DESTAPE DE SIFONES EN CUBIERTAS DE 4"	1,00	UN	$ 16.950,00	10	$ 169.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10	$ 169.500,00
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CAJA DE INSPECCION 0,5X0,5M.	1,00	UN	$ 46.118,00	8	$ 368.944,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8	$ 368.944,00
10	**NO PREVISTOS**					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
NP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC		M2	$ 59.978,21	200	$ 11.995.642,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	200	$ 11.995.642,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH ACERO GALVANIZADO PREPINTADO SUPERIOR 0,35; ACERO INFERIRO 0,35 PORLIURETANO INYECTADO EN ESPESOR 30 MM L		M2	$ 161.933,41	772	$ 125.012.592,52		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	772	$ 125.012.592,52
NP-7	PODA DE ÁRBOLES > A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)		UND	$ 127.613,57	4	$ 510.454,28		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 510.454,28
NP-8	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)		M2	$ 46.844,14	481	$ 22.533.905,11	83	$ 3.875.415,70		$ 0,00	15	$ 700.788,33		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	579	$ 27.110.109,14
COSTO DIRECTO						**$ 181.992.180,84**		**$ 7.258.214,87**		**$ 13.838.389,36**		**$ 12.656.115,99**		**$ 1.000.456,42**		**$ 686.196,46**		**$ 3.647.505,51**		**$221.079.059,44**
AU (23%)						**$ 41.858.201,59**		**$ 1.669.389,42**		**$ 3.182.829,55**		**$ 2.910.906,68**		**$ 230.104,98**		**$ 157.825,19**		**$ 838.926,27**		**$ 50.848.183,67**
U (5%)						**$ 9.099.609,04**		**$ 362.910,74**		**$ 691.919,47**		**$ 632.805,80**		**$ 50.022,82**		**$ 34.309,82**		**$ 182.375,28**		**$ 11.053.952,97**
IVA (19%) / U						**$ 1.728.925,72**		**$ 68.953,04**		**$ 131.464,70**		**$ 120.233,10**		**$ 9.504,34**		**$ 6.518,87**		**$ 34.651,30**		**$ 2.100.251,06**
COSTO TOTAL						**$ 234.678.917,19**		**$ 9.359.468,07**		**$ 17.844.603,08**		**$ 16.320.061,57**		**$ 1.290.088,55**		**$ 884.850,34**		**$ 4.703.458,36**		**$285.081.447,15**

Teniendo en cuenta lo indicado en la tabla anterior, el valor ejecutado en la regional de Norte de Santander corresponde a la suma de **$285.081.447,15**


7.1.3.4 Regional Santander

Durante el periodo del presente informe del **29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021**, el CONSORCIO JG 2020 ejecuto actividades de mantenimiento en diferentes centros de la regional Santander, las cuales son relacionadas a continuación:

S.9. DIRECCIÓN REGIONAL/CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS-SANTANDER: Se ejecutaron actividades de demolición de enchapes y pañetes, Instalación de enchape y afinado de piso, enchape cenefa, demolición de morteros, mantenimiento de cerramiento pintura, instalación cielo raso PVC.



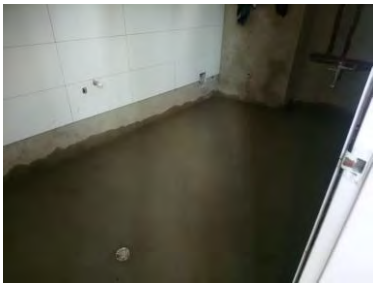

S.8 CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO – BARRANCABERMEJA: Se ejecutaron actividades de Instalación cielo raso.




En la tabla a continuación se indican las cantidades revisadas y aprobadas para los centros intervenidos durante el periodo del presente informe para la regional Santander.

Tabla 7. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Santander Parcial No. 4

CANTIDADES CONTRATADAS					CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER - PIEDECUESTA - GUATIGUARA		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER- FLORIDABLANCA (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-GIRON SANTANDER (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CIMI) SANTANDER- GIRON KM 7 PALENQUE GIRON		CENTRO INDUSTRIAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO - BARRANCABERMEJA CARRERA 28 No. 56 10 y CARRERA 28 No. 55A 8 /49		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA GRANJA KR 11 # 13-13 O PREDIO VENTAQUEMADA VEREDA CALICHAL		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA PRINCIPAL		Centro Agroturistico - SOCORRO		DESPACHO REGIONAL SANTENDER		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL SANTANDER	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT TOTAL SANTANDER	VR. TOTAL SANTANDER
2																										
2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	1,00	UN	$ 506.442,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15	$ 7.596.630,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 7.596.630,00
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	1,00	UN	$ 1.132.218,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 2.264.436,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 2.264.436,00
2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	1,00	ML	$ 3.304,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	414,05	$ 1.368.021,20	414,05	$ 1.368.021,20
2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	1,00	UN	$ 1.354.867,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 1.354.867,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.354.867,00
2.21	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA UNA VEZ AL AÑO. SE DEBE OBTENER UNA LECTURA DE 3 OHMIOS O MENOR.	1,00	UN	$ 861.091,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 861.091,00		$ 0,00	1,00	$ 861.091,00
4																										
4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS inc. Puesta a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, Suministro de Rodamientos, estator, rotor, ajuste de barreras, revisión de sellos mecanicors, impulsor turbina, ajuste y limpieza de barreras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las Motobombas .	1,00	UN	$ 727.774,00		$ 0,00		$ 0,00	3	$ 2.183.322,00		$ 0,00	6,00	$ 4.366.644,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 6.549.966,00
5						$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				
5.1.2	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE SUPERFICIAL	1,00	M3	$ 8.402,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 58.814,00		$ 0,00	7,00	$ 58.814,00
7						$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y	1,00	UN	$ 84.021,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 420.105,00	5,00	$ 420.105,00

CANTIDADES CONTRATADAS					CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER - PIEDECUESTA-GUATIGUARA		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-FLORIDABLANCA (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-GIRON SANTANDER (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CIMI) SANTANDER- GIRON KM 7 PALENQUE GIRON		CENTRO INDUSTRIAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO - BARRANCABERMEJA CARRERA 28 No. 56 10 y CARRERA 28 No. 55A 8 /49		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA GRANJA KR 11 # 13-13 O PREDIO VENTAQUEMADA VEREDA CALICHAL		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA PRINCIPAL		Centro Agroturístico - SOCORRO		DESPACHO REGIONAL SANTENDER		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL SANTANDER	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT TOTAL SANTANDER	VR. TOTAL SANTANDER
	MANEJADORA, MINISPLIT.MENSUALMENTE. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción																							
8						$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1,00	ML	$ 16.590,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	65,60	$ 1.088.304,00	65,60	$ 1.088.304,00
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso - Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 8.530,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 104	$ 887.546,50		$ 0,00	243,47	$ 2.076.816,16	36,04	$ 307.421,20	383,56	$ 3.271.783,86
8.4	DEMOLICION ENCHAPE FACHADA CRISTANAC - FACHADAS Y MUROS INTERNOS	1,00	M2	$ 5.899,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8,20	$ 48.371,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	135,84	$ 801.320,16	144,04	$ 849.691,96
8.5	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSIN CERAMICO - GRES - GRANITO- MEDIA CAÑA GRANITO- (Incluye retiro de escombros)	1,00	ML	$ 1.851,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	359,98	$ 666.322,98		$ 0,00	359,98	$ 666.322,98
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL-LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 8.462,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	467,17	$ 3.953.192,54		$ 0,00	$ 81	$ 687.537,50	44,45	$ 376.135,90	430,87	$ 3.646.021,94	1.023,74	$ 8.662.887,88
8.8	DEMOLICION PAÑETES (Incluye retiro de escombros)/M2	1,00	M2	$ 6.710,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 20	$ 134.200,00	47,46	$ 318.456,60	135,84	$ 911.486,40	203,30	$ 1.364.143,00
8.11	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	M2	$ 13.103,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 104	$ 1.363.367,15	$ 60	$ 788.276,48	0,00	$ 0,00		$ 0,00	164,21	$ 2.151.643,63
8.12	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE- TOLETE; E = 12 cm (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.640,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,10	$ 10.604,00		$ 0,00	1,10	$ 10.604,00
8.15	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.665,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 112	$ 1.078.614,00		$ 0,00		$ 0,00	111,60	$ 1.078.614,00
8.17	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	1,00	M3	$ 41.067,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 15	$ 616.005,00		$ 0,00		$ 0,00	42,00	$ 1.724.814,00	57,00	$ 2.340.819,00
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 3.585,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	36,04	$ 129.203,40	36,04	$ 129.203,40
8.26	FILOS Y DILATACIONES	1,00	ML	$ 7.231,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	244,80	$ 1.770.148,80	244,80	$ 1.770.148,80
8.27	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	1,00	M2	$ 20.015,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	48,56	$ 971.928,40	361,24	$ 7.230.150,03	409,80	$ 8.202.078,43
8.28	RESANES GENERALES PAÑETES SOBRE MUROS Y BAJO PLACA.-	1,00	M2	$ 9.140,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	41,71	$ 381.229,40	41,71	$ 381.229,40

CANTIDADES CONTRATADAS					CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER - PIEDECUESTA-GUATIGUARA		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-FLORIDABLANCA (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-GIRON SANTANDER (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CIMI) SANTANDER- GIRON KM 7 PALENQUE GIRON		CENTRO INDUSTRIAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO - BARRANCABERMEJA CARRERA 28 No. 56 10 y CARRERA 28 No. 55A 8 /49		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA GRANJA KR 11 # 13-13 O PREDIO VENTAQUEMADA VEREDA CALICHAL		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA PRINCIPAL		Centro Agroturístico - SOCORRO		DESPACHO REGIONAL SANTENDER		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL SANTANDER	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT TOTAL SANTANDER	VR. TOTAL SANTANDER
8.29	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	1,00	M2	$ 21.438,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	47,32	$ 1.014.446,16	47,32	$ 1.014.446,16
8.31	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA CERAMICA .20 X.20 HASTA .45 X.45	1,00	M2	$ 36.011,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8,20	$ 295.290,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8,20	$ 295.290,20
8.34	AFINADO PULIDO ENDURECIDO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=0.04 M.	1,00	M2	$ 23.076,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	208,34	$ 4.807.699,99	36,19	$ 835.120,44	244,53	$ 5.642.820,43
8.35	ENCHAPE CERAMICA 50X50	1,00	M2	$ 99.787,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	208,34	$ 20.789.823,15	86,35	$ 8.616.607,45	294,69	$ 29.406.430,60
8.37	TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3	1,00	M2	$ 57.445,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	65,02	$ 3.735.073,90		$ 0,00	65,02	$ 3.735.073,90
8.49	ENCHAPE PARED 25 x 25 DE PRIMERA CALIDAD	1,00	M2	$ 65.794,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	279,55	$ 18.392.712,70	279,55	$ 18.392.712,70
8.50	WIN DE ALUMINIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	1,00	ML	$ 9.799,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	55,50	$ 543.844,50	55,50	$ 543.844,50
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	1,00	M2	$ 7.228,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,65	$ 19.154,20	2,65	$ 19.154,20
8.60	INMUNIZANTE-PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUADUA (REMOCION PINTURA EXISTENTE, BASE INMUNIZANTE - BARNIZ SEMITRANSPARENTE- MATERIAL VEGETAL CONTAMINANTE)	1,00	M2	$ 17.153,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	287,17	$ 4.925.827,01	287,17	$ 4.925.827,01
8.61	INSTALACION CIELO RASO EN SUPERBOARD	1,00	M2	$ 62.718,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 19	$ 1.162.164,54		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,53	$ 1.162.164,54
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	1,00	M2	$ 10.827,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	328,02	$ 3.551.472,54		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1715,27	$ 18.571.228,29	2.043,29	$ 22.122.700,83
8.64	ESTUCO ACRILICO sobre muros/M2	1,00	M2	$ 8.798,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	47,46	$ 417.553,08		$ 0,00	47,46	$ 417.553,08
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	1,00	M2	$ 19.083,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	34,85	$ 665.042,55	34,85	$ 665.042,55
8.69	ESMALTE INMUNIZANTES S/MADERA LLENA puertas y cielo raso	1,00	M2	$ 12.016,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	287,35	$ 3.452.797,60	287,35	$ 3.452.797,60
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	1,00	M2	$ 17.290,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 126	$ 2.182.689,60	47,46	$ 820.583,40	82,08	$ 1.419.163,20	255,78	$ 4.422.436,20
9						$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
9.15	REPARACION DE CANAL DE A.LLUVIAS METALICO	1,00	ML	$ 25.177,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 25	$ 624.389,60		$ 0,00		$ 0,00	24,80	$ 624.389,60
9.35	REUBICACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS CON ROTURA Y RESANE DE ENCHAPE	1,00	UN	$ 74.115,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 1.334.070,00	18,00	$ 1.334.070,00
10	**NO PREVISTOS**					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)		M2	$ 63.214,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 112	$ 7.054.694,68		$ 0,00		$ 0,00	111,60	$ 7.054.694,68

CANTIDADES CONTRATADAS					CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER - PIEDECUESTA-GUATIGUARA		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-FLORIDABLANCA (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-GIRON SANTANDER (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CIMI) SANTANDER- GIRON KM 7 PALENQUE GIRON		CENTRO INDUSTRIAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO - BARRANCABERMEJA CARRERA 28 No. 56 10 y CARRERA 28 No. 55A 8 /49		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA GRANJA KR 11 # 13-13 O PREDIO VENTAQUEMADA VEREDA CALICHAL		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA PRINCIPAL		Centro Agroturístico - SOCORRO		DESPACHO REGIONAL SANTENDER		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL SANTANDER	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT TOTAL SANTANDER	VR. TOTAL SANTANDER
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PLACA E:5cm		M2	$ 38.803,52		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	65,02	$ 2.523.004,87	7,18	$ 278.609,27	72,20	$ 2.801.614,14
NP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC		M2	$ 59.978,21		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12,40	$ 743.729,80	467,17	$ 28.020.020,37		$ 0,00		$ 0,00	39,58	$ 2.373.937,55	430,87	$ 25.842.811,34	950,02	$ 56.980.499,06
NP-8	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)		M2	$ 46.844,14		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,40	$ 65.581,80	1,40	$ 65.581,80
NP-11	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, TIPO SPLIT - CASSETTE Y PISO TECHO. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2		UND	$ 135.450,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 406.350,00	3,00	$ 406.350,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR 30 X 120 CMS 40 W 100/240V 65000 K 4000 LM (No incluye cableado). EN CIELO RASO PVC O DRY WALL.		UND	$ 172.647,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	22,00	$ 3.798.253,80	63,00	$ 10.876.817,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	85,00	$ 14.675.071,50
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA DE INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 18W 8" 100/240V BLANCO 6500K/7000K (incluye Cableado)		UND	$ 42.144,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 379.299,42		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 379.299,42
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE No. 12 LIBRE DE HALOGENO		ML	$ 3.724,83		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	100,00	$ 372.483,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	100,00	$ 372.483,00
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIO CORONA O SIMILAR		UND	$ 94.022,24		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 1.410.333,60	15,00	$ 1.410.333,60
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA PUHS ANTI VANDALISMO		UND	$ 746.937,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.493.874,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 2.987.749,20	6,00	$ 4.481.623,80
NP-19	DEMOLICION DE MORTERO DE PLACA (Incluye retiro de manto asfaltico existente, trasiego de escombros hasta punto de acopio y retiro de escombros)		M2	$ 12.882,97		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,18	$ 92.499,72	7,18	$ 92.499,72
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		m²	$ 39.301,99		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	120,00	$ 4.716.238,80	120,00	$ 4.716.238,80
NP-23	ESMALTE SOBRE BARANDA METÁLICA EN TUBO Y MALLA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		m²	$ 34.212,79		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	308,24	$ 10.545.750,39	308,24	$ 10.545.750,39
NP-26	FLANCHE METÁLICO CAL 26 H=0,35		ml	$ 13.730,75	66	$ 906.229,50		$ 0,00		$ 0,00	60,00	$ 823.845,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	126,00	$ 1.730.074,50
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO		Und	$ 432.579,84		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 6.488.697,60	15,00	$ 6.488.697,60

CANTIDADES CONTRATADAS					CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER - PIEDECUESTA-GUATIGUARA		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-FLORIDABLANCA (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y MANUFACTURA SANTANDER-GIRON SANTANDER (CIDM)		CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CIMI) SANTANDER- GIRON KM 7 PALENQUE GIRON		CENTRO INDUSTRIAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO - BARRANCABERMEJA CARRERA 28 No. 56 10 y CARRERA 28 No. 55A 8 /49		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA GRANJA KR 11 # 13-13 O PREDIO VENTAQUEMADA VEREDA CALICHAL		CENTRO AGROEMPRESARIALY TURISTICO DE LOS ANDES (CATA) MALAGA PRINCIPAL		Centro Agroturístico - SOCORRO		DESPACHO REGIONAL SANTENDER		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL SANTANDER	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT TOTAL SANTANDER	VR. TOTAL SANTANDER
	PUSH PARA SANITARIO (INCLUYE ROTURA DE PARED, RETIRO DEL EXISTENTE Y RESANE DE PARED)																							
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH		Und	$ 208.511,19		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 3.753.201,42	18,00	$ 3.753.201,42
NP-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA BALTICO SIN FLUXÓMETRO BLANCA (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)		Und	$ 572.529,84		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 8.587.947,60	15,00	$ 8.587.947,60
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CASCADE DE SOBREPONER BLANCO SIN GRIFERÍA (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)		Und	$ 264.711,19		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 4.764.801,42	18,00	$ 4.764.801,42
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO EN T PARA LUMINARIAS LED RECTANGULAR DE 30X 120 CMS		Und	$ 43.798,60	3,00	$ 131.395,80	7,00	$ 306.590,20		$ 0,00	22,00	$ 963.569,20	113,00	$ 4.949.241,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	145,00	$ 6.350.797,00
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO BLANCO		m²	$ 576.223,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	35,52	$ 20.468.564,81	35,52	$ 20.468.564,81
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN PARA BAÑOS EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL CON FRENTES DE 7 CM Y HUECOS PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER DIMENSIONES (1,5 MTS X 0,6 MTS)		Und	$ 696.279,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 5.570.237,20	8,00	$ 5.570.237,20
NP-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA BAÑOS EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL CON FRENTES DE 7 CM Y HUECO PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER DIMENSIONES (0,7 MTS X 0,6 MTS)		Und	$ 328.139,82		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 656.279,64	2,00	$ 656.279,64
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA DE 15 X 45 CM PARA BAÑOS		ml	$ 35.892,71		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,50	$ 556.337,01	15,50	$ 556.337,01
COSTO DIRECTO						**$ 1.037.625,30**		**$ 306.590,20**		**$ 2.183.322,00**		**$ 8.166.934,40**		**$ 56.469.171,37**		**$ 15.245.016,19**		**$ 12.550.401,86**		**$ 40.807.844,99**		**$ 176.760.230,45**		**$ 313.527.136,75**
AU (23%)						**$ 238.653,82**		**$ 70.515,75**		**$ 502.164,06**		**$ 1.878.394,91**		**$ 12.987.909,41**		**$ 3.506.353,72**		**$ 2.886.592,43**		**$ 9.385.804,35**		**$ 40.654.853,00**		**$ 72.111.241,45**
U (5%)						**$ 51.881,27**		**$ 15.329,51**		**$ 109.166,10**		**$ 408.346,72**		**$ 2.823.458,57**		**$ 762.250,81**		**$ 627.520,09**		**$ 2.040.392,25**		**$ 8.838.011,52**		**$ 15.676.356,84**
IVA (19%) / U						**$ 9.857,44**		**$ 2.912,61**		**$ 20.741,56**		**$ 77.585,88**		**$ 536.457,13**		**$ 144.827,65**		**$ 119.228,82**		**$ 387.674,53**		**$ 1.679.222,19**		**$ 2.978.507,80**
COSTO TOTAL						**$ 1.338.017,82**		**$ 395.348,06**		**$ 2.815.393,72**		**$ 10.531.261,91**		**$ 72.816.996,48**		**$ 19.658.448,38**		**$ 16.183.743,19**		**$ 52.621.716,11**		**$ 227.932.317,17**		**$404.293.242,84**

Teniendo en cuenta lo indicado en la tabla anterior, el valor ejecutado en la regional de Santander corresponde a la suma de **$404.293.242,84**


7.1.3.5 Regional Arauca

Durante el periodo del presente informe del **29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021**, el CONSORCIO JG 2020 realizo las siguientes actividades en la regional de Arauca:


A.1. CENTRO DE FORMACIÓN - CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA: Se ejecutaron actividades de Retiro de escombros, inventario de tableros para mantenimiento.




A.1.1 CENTRO DE FORMACIÓN - ESCUELA DE GASTRONOMÍA -SUBSEDE DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA: Se ejecutaron actividades de mantenimiento de tableros.

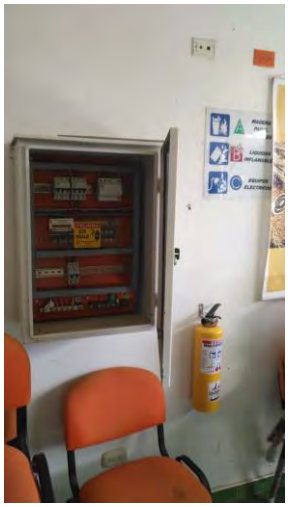
A.1.6 CENTRO DE FORMACIÓN CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - SUBSEDE TAME: Se ejecutaron actividades de mantenimiento de baterías sanitarias, Pintura de puertas, mantenimiento cielo raso.

CENTROS EDUCATIVOS ARAUCA: Se ejecutaron actividades de mantenimiento de aires acondicionados pendientes. Definición de alcance componente eléctrico.

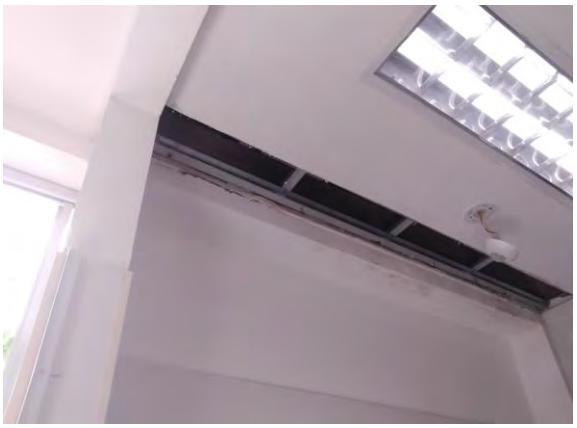


A.1.3 CENTRO DE FORMACIÓN - CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA: Se ejecutaron actividades de Pintura bajo placa, pintura en muros interiores ambiente competencia.



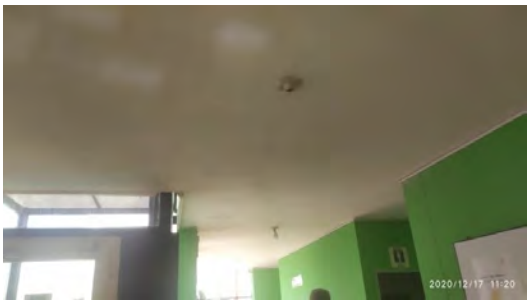

En la tabla a continuación se indican las cantidades revisadas y aprobadas para los centros intervenidos durante el periodo del presente informe para la Arauca.

Tabla 8. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Regional Arauca Parcial No. 4

CANTIDADES CONTRATADAS					TAME- CENTRO DE GESTION Y DESARRPLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA SUB SEDE TAME		ARAUCA- CENTRO DE GESTION Y DESARROLLOAGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		EG- ESCUELA DE GASTRONIMIA - SUBSEDE DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		APE/ SBDC - AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SBDC		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL ARAUCA	
					CALLE 15 No. 37a- 55		CARRERA 20 No. 29 - 67/71 Y CARRERA 20 No. 2977785		CALLE 1 No. 1 - 130 VIA AL AEROPUERTO		cra 24			
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL ARAUCA
1	IMPERMEABILIZACIONES													
1.1	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)	1,00	M2	$ 11.301,00	5,10	$ 57.635,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5	$ 57.635,10
1.9	INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	1,00	M2	$ 37.908,00		$ 0,00		$ 0,00	11	$ 409.406,40		$ 0,00	11	$ 409.406,40
2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	1,00	UN	$ 506.442,00		$ 0,00	12,00	$ 6.077.304,00	4,00	$ 2.025.768,00		$ 0,00	16	$ 8.103.072,00
4														
4.1	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN	1,00	UN	$ 450.749,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 450.749,00		$ 0,00	1	$ 450.749,00
4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS inc. Puesta a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, Suministro de Rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revision de sellos mecanicons, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las Motobombas .	1,00	UN	$ 727.774,00		$ 0,00	2,00	$ 1.455.548,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 1.455.548,00
6														
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT.MENSUALMENTE. VER: Anexo al Pliego	1,00	UN	$ 84.021,00		$ 0,00	4	$ 336.084,00		$ 0,00		$ 0,00	4	$ 336.084,00

CANTIDADES CONTRATADAS					TAME- CENTRO DE GESTION Y DESARRPLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA SUB SEDE TAME		ARAUCA- CENTRO DE GESTION Y DESARROLLOAGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		EG- ESCUELA DE GASTRONIMIA - SUBSEDE DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		APE/ SBDC - AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SBDC		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL ARAUCA	
					CALLE 15 No. 37a- 55		CARRERA 20 No. 29 - 67/71 Y CARRERA 20 No. 2977785		CALLE 1 No. 1 - 130 VIA AL AEROPUERTO		cra 24			
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL ARAUCA
	electronico para ampliar descripción													
8														
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1,00	ML	$ 16.590,00		$ 0,00	25,65	$ 425.533,50		$ 0,00		$ 0,00	26	$ 425.533,50
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL-LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 8.462,00	0,60	$ 5.077,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 5.077,20
8.8	DEMOLICION PAÑETES (Incluye retiro de escombros)/M2	1,00	M2	$ 6.710,00	5,36	$ 35.965,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5	$ 35.965,60
8.11	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	M2	$ 13.103,00	6,30	$ 82.548,90		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6	$ 82.548,90
8.15	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	1,00	M2	$ 9.665,00		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 77.320,00		$ 0,00	8	$ 77.320,00
8.27	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	1,00	M2	$ 20.015,00	5,36	$ 107.280,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5	$ 107.280,40
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	1,00	M2	$ 50.081,00	0,60	$ 30.048,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 30.048,60
8.57	PAÑETE IMPERMEABILIZADO CIELO RASO 1:3 CON MALLA GALLINERO	1,00	M2	$ 21.808,00		$ 0,00	36,50	$ 795.992,00		$ 0,00		$ 0,00	37	$ 795.992,00
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	1,00	M2	$ 10.827,00	109,57	$ 1.186.314,39	287,34	$ 3.111.030,18		$ 0,00		$ 0,00	397	$ 4.297.344,57
8.64	ESTUCO ACRILICO sobre muros/M2	1,00	M2	$ 8.798,00	26,40	$ 232.267,20	76,67	$ 674.542,66		$ 0,00		$ 0,00	103	$ 906.809,86
8.80	LIMPIEZA DE FACHADAS (ANTEPECHOS TERRAZA) MOHO Y MANCHAS DE HUMEDAD VERDES	1,00	M2	$ 10.407,00	85,90	$ 893.961,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	86	$ 893.961,30
10	NO PREVISTOS													

CANTIDADES CONTRATADAS					TAME- CENTRO DE GESTION Y DESARRPLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA SUB SEDE TAME		ARAUCA- CENTRO DE GESTION Y DESARROLLOAGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		EG- ESCUELA DE GASTRONIMIA - SUBSEDE DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		APE/ SBDC - AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y SBDC		TOTAL VALOR PACTA PARCIAL ARAUCA	
					CALLE 15 No. 37a- 55		CARRERA 20 No. 29 - 67/71 Y CARRERA 20 No. 2977785		CALLE 1 No. 1 - 130 VIA AL AEROPUERTO		cra 24			
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL ARAUCA
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PLACA E:5cm		M2	$ 38.803,52		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	30,90	$ 1.199.028,77	31	$ 1.199.028,77
NP-19	DEMOLICION DE MORTERO DE PLACA (Incluye retiro de manto asfaltico existente, trasiego de escombros hasta punto de acopio y retiro de escombros)		M2	$ 12.882,97		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	30,90	$ 398.083,77	31	$ 398.083,77
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		m²	$ 39.301,99	10,20	$ 400.880,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10	$ 400.880,30
NP-23	ESMALTE SOBRE BARANDA METÁLICA EN TUBO Y MALLA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		m²	$ 34.212,79	106,84	$ 3.655.294,48		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	107	$ 3.655.294,48
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE TUBERÍA O LAMINA LINEAL (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)		ml	$ 23.849,99	271,20	$ 6.468.117,29		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	271	$ 6.468.117,29
NP-32	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PONER A PUNTO EL EQUIPO DE BOMBEO SEDE GASTRONOMÍA ARAUCA (INCLUYE SWICH DE ENCENDIDO, FLOTADOR ELÉCTRICO, TUBERÍA GALVANIZADA Y ACCESORIOS, BASE SOPORTE HIDROFLOW E INSUMOS HIDRÁULICOS)		Und	$ 857.835,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 857.835,00		$ 0,00	1	$ 857.835,00
COSTO DIRECTO						**$ 13.155.390,76**		**$ 12.876.034,34**		**$ 3.821.078,40**		**$ 1.597.112,54**		**$ 31.449.616,04**
AU (23%)						**$ 3.025.739,87**		**$ 2.961.487,90**		**$ 878.848,03**		**$ 367.335,88**		**$ 7.233.411,69**
U (5%)						**$ 657.769,54**		**$ 643.801,72**		**$ 191.053,92**		**$ 79.855,63**		**$ 1.572.480,80**
IVA (19%) / U						**$ 124.976,21**		**$ 122.322,33**		**$ 36.300,24**		**$ 15.172,57**		**$ 298.771,35**
COSTO TOTAL						**$ 16.963.876,38**		**$ 16.603.646,28**		**$ 4.927.280,60**		**$ 2.059.476,62**		**$ 40.554.279,88**

Teniendo en cuenta lo indicado en la tabla anterior, el valor ejecutado en la regional de Arauca corresponde a la suma de **$ 40.554.279,88**

A continuación de indican las cantidades validadas por esta interventoría a corte del presente informe.

Tabla 9. Cantidades Ejecutadas y valor revisado Parcial No. 4

CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**PRECIO UNITARIO**	**CAT. TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**					**.**
1.1	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)	M2	872	$ 11.301,00	5,10	$ 57.635,10
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	M2	3.834	$ 24.772,00	89,28	$ 2.211.644,16
1.6	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	UN	2.290	$ 22.539,00	5,00	$ 112.695,00
1.9	INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	3.109	$ 37.908,00	20,58	$ 780.146,64
	SUBTOTAL IMPERMEABILIZACIONES					**$ 3.162.120,90**
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**					**.**
2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	UN	106	$ 506.442,00	31,00	$ 15.699.702,00
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	UN	23	$ 1.132.218,00	2,00	$ 2.264.436,00
2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	ML	1.310	$ 3.304,00	614,05	$ 2.028.821,20
2.9	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	UN	9	$ 1.354.867,00	2,00	$ 2.709.734,00
2.21	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA UNA VEZ AL AÑO. SE DEBE OBTENER UNA LECTURA DE 3 OHMIOS O MENOR.	UN	13	$ 861.091,00	1,00	$ 861.091,00
	SUBTOTAL SISTEMAS ELÉCTRICOS					**$ 23.563.784,20**
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**					**.**
3.4	PODA DE ÁRBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M2	406	$ 66.094,00	15,00	$ 991.410,00
	SUBTOTAL DE SERVICIO DE JARDINERÍA					**$ 991.410,00**
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**					**.**
4.1	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN	UN	20	$ 450.749,00	1,00	$ 450.749,00
4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS inc. Puesta a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, Suministro de Rodamientos, estator, rotor,	UN	36	$ 727.774,00	11,00	$ 8.005.514,00

CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**PRECIO UNITARIO**	**CAT. TOTAL**	**VALOR TOTAL**
	ajuste de borneras, revision de sellos mecanicons, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las Motobombas .					
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE BOMBEO					**$ 8.456.263,00**
5	**LAVADO DE TANQUES**					**.**
5.1.2	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE SUPERFICIAL	M3		$ 8.402,00	7,00	$ 58.814,00
5.2.1	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	M3	684	$ 6.427,00	117,07	$ 752.408,89
5.3.2	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE ELEVADO	M3	260	$ 7.067,00	6,00	$ 42.402,00
	SUBTOTAL DE LAVADO DE TANQUES					**$ 853.624,89**
7	**SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN**					**.**
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER: Anexo al Pliego electronico para ampliar descripción	UN	2.131	$ 84.021,00	9,00	$ 756.189,00
	SUBTOTAL DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN					**$ 756.189,00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**					**.**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	104	$ 16.590,00	91,25	$ 1.513.837,50
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín-gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)	M2	1.076	$ 8.530,00	383,92	$ 3.274.854,66
8.4	DEMOLICION ENCHAPE FACHADA CRISTANAC - FACHADAS Y MUROS INTERNOS	M2	273	$ 5.899,00	146,24	$ 862.669,76
8.5	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSIN CERAMICO - GRES - GRANITO-MEDIA CAÑA GRANITO-(Incluye retiro de escombros)	ML		$ 1.851,00	389,72	$ 721.371,72
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	M2	3.132	$ 8.462,00	1.145,41	$ 9.692.425,57
8.8	DEMOLICION PAÑETES (Incluye retiro de escombros)/M2	M2	248	$ 6.710,00	208,66	$ 1.400.108,60
8.11	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	2.384	$ 13.103,00	170,51	$ 2.234.192,53
8.12	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE- TOLETE; E = 12 cm (Incluye retiro de escombros)	M2	46	$ 9.640,00	44,60	$ 429.905,44
8.13	DESMONTE TEJA DE BARRO (Incluye retiro de escombros)	M2	497	$ 9.302,00	148,97	$ 1.385.718,94
8.15	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA	M2	4.796	$ 9.665,00	1.019,10	$ 9.849.601,50

CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CAT. TOTAL	VALOR TOTAL
	MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)					
8.17	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	277	$ 41.067,00	57,00	$ 2.340.819,00
8.18	RETIRO DE PINTURA EPOXICA	M2	1.546	$ 2.742,00	38,30	$ 105.018,60
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	M2		$ 3.585,00	36,04	$ 129.203,40
8.21	REPOSICION MUROS EN DRY WALL - SUPERBOARD	M2	293	$ 96.841,00	22,66	$ 2.194.417,06
8.26	FILOS Y DILATACIONES	ML	68	$ 7.231,00	244,80	$ 1.770.148,80
8.27	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	165	$ 20.015,00	415,16	$ 8.309.358,83
8.28	RESANES GENERALES PAÑETES SOBRE MUROS Y BAJO PLACA.-	M2	1.050	$ 9.140,00	234,33	$ 2.141.789,00
8.29	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	5	$ 21.438,00	47,32	$ 1.014.446,16
8.31	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA CERAMICA .20 X.20 HASTA .45 X.45	M2	709	$ 36.011,00	79,78	$ 2.872.957,58
8.34	AFINADO PULIDO ENDURECIDO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=0.04 M.	M2	547	$ 23.076,00	295,84	$ 6.826.849,99
8.35	ENCHAPE CERAMICA 50X50	M2	300	$ 99.787,00	312,76	$ 31.209.581,69
8.37	TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:3	M2	44	$ 57.445,00	68,02	$ 3.907.408,90
8.40	SUMINISTRO E INSTALACION BANDA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA Y/NO REFLECTIVAS PARA GRADAS	ML	677	$ 14.922,00	121,30	$ 1.810.038,60
8.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN DUROPISO-GRAVILLA LAVADA-BALDOSIN DE GRANITO H = 0.08 M- CERAMICA- GRES-MORTERO H = 0.10 m	ML	307	$ 16.569,00	45,10	$ 747.261,90
8.49	ENCHAPE PARED 25 x 25 DE PRIMERA CALIDAD	M2	31	$ 65.794,00	369,11	$ 24.285.223,34
8.50	WIN DE ALUMINIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	18	$ 9.799,00	55,50	$ 543.844,50
8.52	TABLETAS DE FACHADA INTERNA DE GRES/M2	M2		$ 46.955,00	2,20	$ 103.301,00
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	1.993	$ 50.081,00	105,06	$ 5.261.309,54
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	M2	379	$ 11.032,00	119,54	$ 1.318.765,28
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	M2		$ 7.228,00	2,65	$ 19.154,20
8.57	PAÑETE IMPERMEABILIZADO CIELO RASO 1:3 CON MALLA GALLINERO	M2	178	$ 21.808,00	36,50	$ 795.992,00
8.60	INMUNIZANTE-PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUADUA (REMOCION PINTURA EXISTENTE, BASE INMUNIZANTE - BARNIZ SEMITRANSPARENTE- MATERIAL VEGETAL CONTAMINANTE)	M2	70	$ 17.153,00	287,17	$ 4.925.827,01
8.61	INSTALACION CIELO RASO EN SUPERBOARD	M2	245	$ 62.718,00	18,53	$ 1.162.164,54
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	M2	36.636	$ 10.827,00	4.083,59	$ 44.212.986,70

CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**PRECIO UNITARIO**	**CAT. TOTAL**	**VALOR TOTAL**
8.64	ESTUCO ACRILICO sobre muros/M2	M2	56	$ 8.798,00	150,53	$ 1.324.362,94
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	M2	7.346	$ 19.083,00	47,90	$ 914.075,70
8.69	ESMALTE INMUNIZANTES S/MADERA LLENA puertas y cielo raso	M2		$ 12.016,00	287,35	$ 3.452.797,60
8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO	M2	1.850	$ 13.411,00	259,45	$ 3.479.483,95
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	M2	3.662	$ 17.290,00	275,79	$ 4.768.409,10
8.78	CAMBIO PELICULA POLARIZADO VIDRIO LISO	M2	195	$ 28.979,00	202,99	$ 5.882.302,32
8.80	LIMPIEZA DE FACHADAS (ANTEPECHOS TERRAZA) MOHO Y MANCHAS DE HUMEDAD VERDES	M2	212	$ 10.407,00	85,90	$ 893.961,30
8.81	LIMPIEZA VIDRIOS	M2	26	$ 3.818,00	202,99	$ 774.996,73
	SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO GENERALES					**$ 200.862.943,48**
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**					.
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	ML	1.630	$ 8.389,00	258,90	$ 2.171.912,10
9.9	INSTALACION DE TUBERÍA BAJANTE ALL PVCS DE D=3", CON ROTURA DE PISO (INCLUYE RESANE Y ACABADO DE PISO EN GRANITO PULIDO)	ML	76	$ 48.742,00	79,80	$ 3.889.611,60
9.15	REPARACION DE CANAL DE A.LLUVIAS METALICO	ML	608	$ 25.177,00	126,80	$ 3.192.443,60
9.16	SOPORTES METÁLICOS PARA BAJANTE PVCS D=4"	UN	54	$ 21.562,00	27,00	$ 582.174,00
9.17	DESTAPE DE SIFONES EN CUBIERTAS DE 4¨	UN	246	$ 16.950,00	10,00	$ 169.500,00
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CAJA DE INSPECCION 0,5X0,5M.	UN	16	$ 46.118,00	8,00	$ 368.944,00
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA d=1/2"	UN	3	$ 46.063,00	2,00	$ 92.126,00
9.30	CAMBIO DE SENSOR PARA ORINAL DE COLGAR	UN	19	$ 140.463,00	10,00	$ 1.404.630,00
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	UN	56	$ 27.454,00	5,00	$ 137.270,00
9.35	REUBICACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS CON ROTURA Y RESANE DE ENCHAPE	UN	1	$ 74.115,00	18,00	$ 1.334.070,00
	SUBTOTAL DE UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES					**$ 13.342.681,30**
10	**ÍTEMS NO PREVISTOS**					.
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)	m²		$ 63.214,11	755,30	$ 47.745.617,28
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIVELACION PARA PLACA E:5cm	m²		$ 38.803,52	103,10	$ 4.000.642,91
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC	m²		$ 59.978,21	1.170,87	$ 70.226.686,74
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO	m²		$ 9.830,18	89,28	$ 877.638,47

CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CAT. TOTAL	VALOR TOTAL
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH ACERO GALVANIZADO PREPINTADO SUPERIOR 0,35; ACERO INFERIRO 0,35 PORLIURETANO INYECTADO EN ESPESOR 30 MM L	m²		$ 161.933,41	772,00	$ 125.012.592,52
NP-7	PODA DE ÁRBOLES > A 5.00 m. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	und		$ 127.613,57	4,00	$ 510.454,28
NP-8	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)	m²		$ 46.844,14	580,13	$ 27.175.690,94
NP-10	LAVADO E INSTALACION DE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO (sobre asbesto cemento, No incluye base en asbesto cemento)	m²		$ 29.056,34	520,49	$ 15.123.534,41
NP-11	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, TIPO SPLIT - CASSETTE Y PISO TECHO . MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	und		$ 135.450,00	3,00	$ 406.350,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR 30 X 120 CMS 40 W 100/240V 65000 K 4000 LM (No incluye cableado), EN CIELO RASO PVC O DRY WALL.	und		$ 172.647,90	85,00	$ 14.675.071,50
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 60W 100/277V 5.000K/ 8.400 lm FOTOCELDA (No incluye cableado) (INCLUYE BRAZO PARA LUMINARIA HORIZONTAL 1 DOBLEZ DE 1-1/2" X 1.20 m CON COLLARIN DE 1-1/2" X 1/4" 180 mm)	und		$ 506.054,35	55,00	$ 27.832.989,25
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA DE INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 18W 8" 100/240V BLANCO 6500K/7000K (incluye Cableado)	und		$ 42.144,38	9,00	$ 379.299,42
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE No. 12 LIBRE DE HALOGENO	ml		$ 3.724,83	100,00	$ 372.483,00
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIO CORONA O SIMILAR	und		$ 94.022,24	29,00	$ 2.726.644,96
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA PUHS ANTI VANDALISMO	und		$ 746.937,30	6,00	$ 4.481.623,80
NP-19	DEMOLICION DE MORTERO DE PLACA (Incluye retiro de manto asfaltico existente, trasiego de escombros hasta punto de acopio y retiro de escombros)	m²		$ 12.882,97	38,08	$ 490.583,50
NP-20	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CUBIERTA LABORATORIOS REGIONAL BOYACÁ SOGAMOSO (INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURA REFUERZOS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)"	und		$ 6.113,93	500,00	$ 3.056.965,00
NP-22	ESMALTE SOBRE BARANDA METÁLICA EN TUBO Y MALLA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)	m²		$ 39.301,99	225,95	$ 8.880.355,38


CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	PRECIO UNITARIO	CAT. TOTAL	VALOR TOTAL
NP-23	ESMALTE SOBRE BARANDA METÁLICA EN TUBO Y MALLA (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)	m²		$ 34.212,79	468,93	$ 16.043.403,61
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SOBRE TUBERÍA O LAMINA LINEAL (INCLUYE ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA)	ml		$ 23.849,99	324,34	$ 7.735.505,76
NP-25	MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA (EMBOBINADO MOTOR BARMESA 5,0 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUES SOPORTES 1 1/2", PRETOSTATO 30-50 PSI, MONITOR DE VOLTAJE, CONTACTOR WEG 25 AMP)	Und		$ 1.672.898,95	1,00	$ 1.672.898,95
NP-26	FLANCHE METÁLICO CAL 26 H=0,35	ml		$ 13.730,75	126,00	$ 1.730.074,50
NP-27	LAVADO DE CUBIERTAS EN TEJA ASBESTO CEMENTO	m²		$ 12.773,89	505,20	$ 6.453.369,23
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH PARA SANITARIO (INCLUYE ROTURA DE PARED, RETIRO DEL EXISTENTE Y RESANE DE PARED)	Und		$ 432.579,84	15,00	$ 6.488.697,60
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN MALLA GALVANIZADA CAL 10, ANGULO 1 1/2" X 3 /16" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE)	m²		$ 73.436,73	15,20	$ 1.116.238,30
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LLAVE LAVAMANOS TIPO PUSH	Und		$ 208.511,19	24,00	$ 5.004.268,56
NP-32	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PONER A PUNTO EL EQUIPO DE BOMBEO SEDE GASTRONOMÍA ARAUCA (INCLUYE SWICH DE ENCENDIDO, FLOTADOR ELÉCTRICO, TUBERÍA GALVANIZADA Y ACCESORIOS, BASE SOPORTE HIDROFLOW E INSUMOS HIDRÁULICOS)	Und		$ 857.835,00	1,00	$ 857.835,00
NP-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA BALTICO SIN FLUXÓMETRO BLANCA (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)	Und		$ 572.529,84	15,00	$ 8.587.947,60
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CASCADE DE SOBREPONER BLANCO SIN GRIFERÍA (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)	Und		$ 264.711,19	18,00	$ 4.764.801,42
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ml		$ 6.724,83	260,30	$ 1.750.473,25
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO EN T PARA LUMINARIAS LED RECTANGULAR DE 30X 120 CMS	Und		$ 43.798,60	145,00	$ 6.350.797,00
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ENCHUFABLES de 15-20-30 AMP	Und		$ 22.209,13	216,00	$ 4.797.172,08
NP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO BLANCO	m²		$ 576.223,08	35,52	$ 20.468.564,81
NP-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN PARA BAÑOS EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL CON FRENTES DE 7 CM Y HUECOS PARA	Und		$ 696.279,65	8,00	$ 5.570.237,20

CANTIDADES CONTRATADAS					ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**PRECIO UNITARIO**	**CAT. TOTAL**	**VALOR TOTAL**
	LAVAMANOS DE SOBREPONER DIMENSIONES (1,5 MTS X 0,6 MTS)					
NP-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA BAÑOS EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL CON FRENTES DE 7 CM Y HUECO PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER DIMENSIONES (0,7 MTS X 0,6 MTS)	Und		$ 328.139,82	2,00	$ 656.279,64
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA DE 15 X 45 CM PARA BAÑOS	ml		$ 35.892,71	15,50	$ 556.337,01
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS					**$ 454.580.124,88**
			COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES			**$ 706.569.141,65**
			ADMINISTRACIÓN 23,00%			**$ 162.510.902,58**
			UTILIDAD 5,00%			**$ 35.328.457,08**
			IVA (%) SOBRE UTILIDAD 19,00%			**$ 6.712.406,85**
			TOTAL PRESUPUESTO OBRAS			**$ 911.120.908,16**

Según lo reportado anteriormente se determina que el avance del presente corte corresponde al **24,49%** equivalente a una inversión de **$911.120.908,16**, valor aprobado para el corte No. 4

En el grafico a continuación se muestra el estado de ejecución del contrato de obra a la fecha de corte del presente informe.

Gráfico 1 Avance del contrato de obra

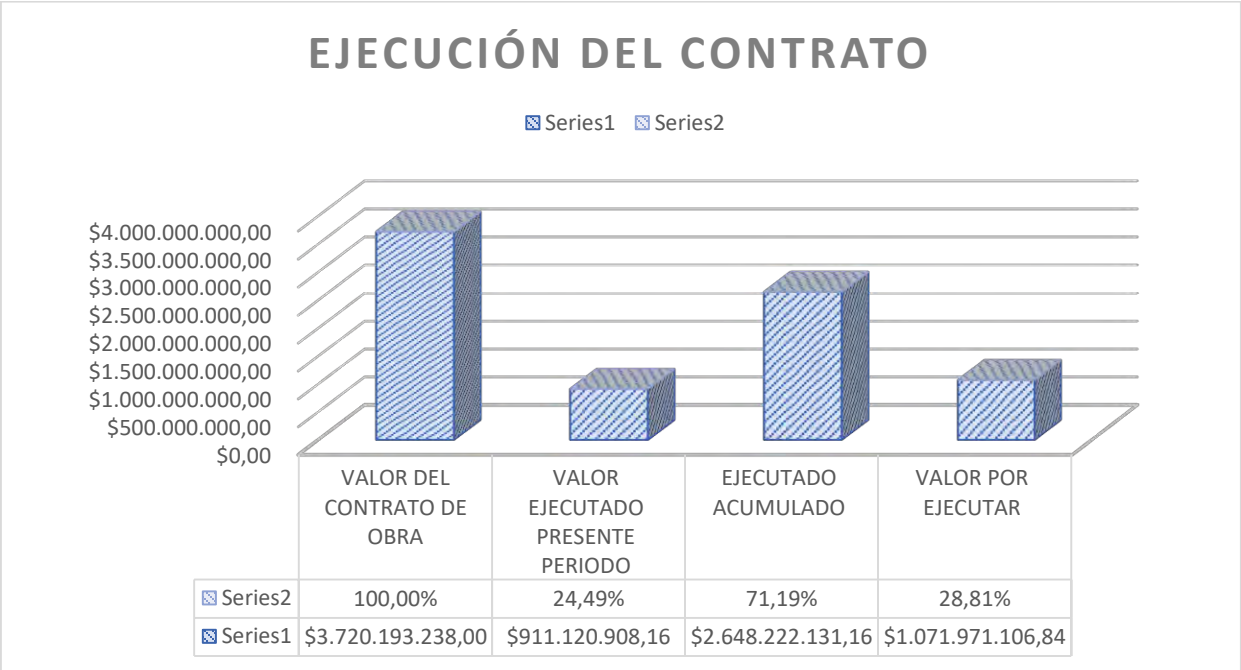

	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
Series2	100,00%	24,49%	71,19%	28,81%
Series1	$3.720.193.238,00	$911.120.908,16	$2.648.222.131,16	$1.071.971.106,84

Fuente: 2C Ingenieros S.A.


7.1.4 Control de Programación y Avance de Obra

De acuerdo con la programación No. 04 de obra del contrato presentada por el CONSORCIO JG 2020 el 01 de diciembre de 2020, se tiene un programado acumulado del **92,47 %** contra un porcentaje ejecutado de obra acumulado del **71,19%**, mostrando un atraso del **-21,28 %** según obra programada a la fecha.

Actualmente, el contrato de obra cuenta con dos prórrogas en tiempo; la primera con treinta (30) días, y la segunda con un (01) mes y Quince (15) días, por tanto la nueva fecha de finalización del contrato es el 15 de febrero de 2021, así las cosas, a la fecha de corte de presente informe ha transcurrido el **77,50 %** del tiempo contractual de ejecución del contrato definido a la fecha, quedando el **22,50 %** del plazo del contrato de obra.

En el grafico a continuación se muestra lo programado versus lo ejecutado a la fecha de corte del presente informe.

Gráfico 2 Programado Versus Ejecutado

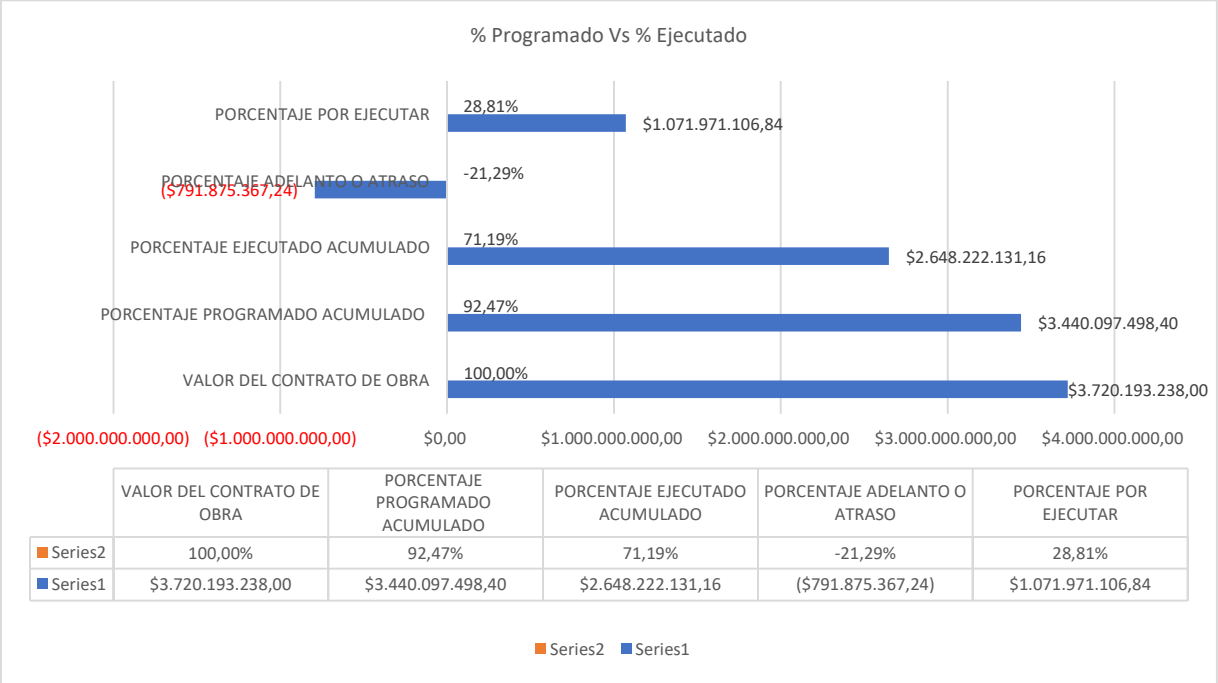

	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE ADELANTO O ATRASO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
Series2	100,00%	92,47%	71,19%	-21,29%	28,81%
Series1	$3.720.193.238,00	$3.440.097.498,40	$2.648.222.131,16	($791.875.367,24)	$1.071.971.106,84

Fuente: 2C Ingenieros S.A.

Es importante mencionar que, si bien se dio inicio al contrato de obra el día 27 de julio de 2020, se contó con programación de obra a partir del día 20 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que fue necesario realizar las visitas a todos los centros educativos. Lo anterior, con el fin de verificar los presupuestos y planes de

mantenimiento en las 42 sedes objeto de este contrato, para así, priorizar las intervenciones y establecer una ruta de trabajo.

7.1.5 Comité Técnico

Durante el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021, se desarrollaron los siguientes comités técnicos.

- 11 de diciembre de 2020, comité seguimiento técnico contrato obra: En este comité se realiza seguimiento por parte de la interventoría, la supervisión al avance del contrato de obra y dificultades presentadas en el periodo. Se solicita al contratista Informe con foto respecto a los tableros priorizados en la regional de Arauca, Realizar los mantenimientos pendientes de los aires acondicionados y Incremento de cuadrillas en la regional Arauca y Casanare.

(Ver Anexo 1. Actas de comité).

7.1.6 Inconvenientes y determinaciones

Es importante mencionar que, si bien se dio inicio al contrato de obra el día 27 de julio de 2020, se cuenta con programación de obra a partir del día 20 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que fue necesario realizar las visitas a todos los centros educativos. Lo anterior, con el fin de verificar los presupuestos y planes de mantenimiento en las 42 sedes objeto de este contrato, para así, priorizar las intervenciones y establecer una ruta de trabajo.

PANDEMIA COVID-19

El día 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declara emergencia sanitaria mediante Decreto 417 de 2020 teniendo en cuenta que el día 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional.

Posteriormente, a través de Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 el Presidente de la República de Colombia impartió las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, por lo anterior, se deben implementar protocolos de bioseguridad en cada uno de los centros y/o frentes de trabajo para evitar la propagación de este virus.

Es así que las implementaciones de estos protocolos han afectado el normal desarrollo de las actividades de obra programadas, toda vez que se requiere permiso de las administraciones locales y aprobación de protocolos y en muchos de los casos las

entidades no se encuentran funcionando o no cuentan con el personal suficiente. Algunos municipios no permiten el acceso a personal, no ofrecen servicio de hospedaje, transporte o alimentación, cuentan con restricciones como pico y cedula, toques de queda y solicitan cuarentena al personal proveniente de otros municipios.

Adicionalmente, en cada centro de formación se requiere presentar la documentación e implementación de los protocolos de bioseguridad para el ingreso al personal contractual, técnico y de mano de obra no calificada. Si bien, la información es la misma, la forma en la que debe presentarse (físico, en plataformas digitales, previo al ingreso, luego del ingreso, entre otros) y los requerimientos para el ingreso en cada centro de formación difieren lo que genera retrasos.

MÚLTIPLES ACTORES Y FRENTES DE TRABAJO

Es importante mencionar que el proyecto cuenta con 42 frentes de trabajo distribuidos en 5 departamentos, en este caso Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Boyacá. Cada departamento cuenta con un director regional y cada sede con un director de sede, los cuales, en muchos casos cuentan con subsedes y administradores de las mismas. Lo anteriormente mencionado, sumado a la necesidad de interactuar con el delegado de infraestructura de las regionales, personal de mantenimiento y los profesionales en seguridad y salud de cada centro ha generado dificultades en la ejecución del contrato ya que requiere un proceso de articulación y comunicación fuerte y eficiente.

VARIAS SITUACIONES POR REGIONAL

Casanare, Norte de Santander, Arauca:

Se presentan atrasos en el trámite ante CORPORINOQUIA en las regionales Casanare y Arauca, para obtener los permisos necesarios para la poda de árboles, por lo cual no ha sido posible la ejecución de estas actividades.

ATRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA

Se evidencia un atraso mucho más bajo en las actividades programadas teniendo en cuenta que el contrato de obra fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020, sin embargo, el tiempo es insuficiente para la finalización del contrato por lo cual, se solicitará por parte de la interventoría ampliación hasta el 15 de febrero de 2021.

Se solicitó al contratista Programación ajustada al plazo final para la ejecución del proyecto, Flujo de fondos actualizado y Plan de contingencia actualizado con las fechas reales del ingreso de las nuevas cuadrillas y la implementación de las acciones

para normalizar el avance de obra y así dar cumplimiento con el objeto del contrato en el nuevo plazo pactado.

La interventoría solicito a la entidad, ampliación al plazo del contrato de obra, toda vez que el tiempo restante es insuficiente para el desarrollo de las obras programadas, en atención al comunicado radicado por el CONSORCIO JG 2020 el 28 de septiembre de 2020, mediante el cual solicita prórroga para el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507, esta interventoría, después de realizar la evaluación de la solicitud presentada por el contratista precisa que a la fecha el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507 ha presentado atrasos en la ejecución de actividades, los cuales obedecen a diferentes factores tales como:

- No se contaban con presupuestos definidos para cada una de las sedes priorizadas, que ascienden a 43 distribuidas en los 5 departamentos que comprende el contrato para el lote 2, como los son Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Boyacá. Lo que requirió realizar visitas a todos los centros de formación, con el fin de verificar los presupuestos y planes de mantenimiento en las 43 sedes objeto de este contrato, para así, priorizar las intervenciones y establecer una ruta de trabajo.

- Que, si bien es cierto, se firmó acta de inicio del contrato de obra el día 27 de julio de 2020, se pudo definir una programación de obra a partir del día 20 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que fue necesario realizar las visitas a todos los centros educativos.

- Que en ejercicio de las visitas realizadas a cada uno de las sedes se identificaron ítems no previstos que son requeridos para los adecuados mantenimientos, lo que implica que el contratista de obra debe realizar APU's de actividades no previstas, sumado a esto, se deben presentar cotizaciones por parte del contratista de obra y de interventoría para su aprobación, lo que ha requerido mayores tiempos, toda vez muchos comerciantes se abstienen de cotizar, manifestando que es una práctica requerida por las entidades que les implica tiempo sin garantizarles una venta.

- Que se requieren permisos para la poda de árboles en el departamento de Casanare y Arauca, ante la entidad competente CORPORINOQUIA, para lo cual se debe realizar un inventario forestal por parte del SENA para dicho permiso, el cual a la fecha no ha sido tramitado, desconociéndose así los tiempos que se requerirán para dicho trámite.

- Cada departamento cuenta con un director regional y cada sede con un director de sede, los cuales, en muchos casos cuentan con subsedes y administradores de las mismas. Lo anteriormente mencionado, sumado a la necesidad de interactuar con el delegado de infraestructura de las regionales, personal de mantenimiento y los profesionales en seguridad y salud de cada centro ha generado dificultades en la ejecución del contrato ya que requiere un proceso de articulación y comunicación fuerte y eficiente.

- Las implementaciones de los protocolos de bioseguridad a nivel municipal para prevenir el contagio por COVID-19 han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas, toda vez que se requiere aprobación del protocolo de obra por parte de las administraciones locales, las cuales, en muchos de los casos, no se encuentran funcionando o no cuentan con el personal suficiente. Algunos municipios cuentan con restricciones para

el acceso de personal, no ofrecen servicio de hospedaje, transporte o alimentación, cuentan con restricciones como pico y cedula, toques de queda y solicitan cuarentena al personal proveniente de otros municipios. Así mismo, los bajos rendimientos en la ejecución de las obras también obedecen a la implementación y puesta en marcha del protocolo de bioseguridad de obra aprobado por la entidad contratante el 5 de agosto de 2020, ya que las jordanas de trabajo deben reducirse por el tiempo que se dispone para el diligenciamiento de planillas de diagnóstico, toma de temperatura y el lavado de manos, al inicio, durante y finalización de la jornada laboral. Lo anteriormente mencionado, sumado al temor de la mano de obra local para regresar al trabajo, el distanciamiento social y la baja oferta de materiales y suministro requeridos para la continuidad y oportuna ejecución de las obras se traduce en mayores tiempos requeridos para la ejecución del contrato.

- Adicionalmente, en cada centro de formación se requiere presentar la documentación e implementación de los protocolos de bioseguridad para el ingreso al personal contractual, técnico y de mano de obra no calificada. Si bien, la información es la misma, la forma en la que debe presentarse (físico, en plataformas digitales, previo al ingreso, luego del ingreso, entre otros) y los requerimientos para el ingreso en cada centro de formación difieren lo que genera atrasos.

El pasado 16 de octubre de 2020, esta interventoría solicitó a través de comunicado RL-SENA LOTE 2-2020-064 ampliación en plazo del contrato de obra por término de 30 días calendario, a partir de la fecha de terminación inicial (01 de diciembre de 2020), plazo que fue otorgado por la entidad a través de modificatorio N. 1; sin embargo, este tiempo no era suficiente para la finalización del objeto contractual. A pesar de lo anterior, la solicitud no podría ser presentada por un plazo mayor, pues antes debía surtir efecto los trámites administrativos para el traslado de las vigencias al año 2021.

> Por lo anterior, 2C INGENIEROS S.A. considera prudencial y viable un plazo adicional por un término de un (1) mes y Quince (15) días para culminación de las actividades en el marco del CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507, toda vez que, el tiempo restante para su terminación es insuficiente. Sin embargo, es importante mencionar que este tiempo podría llegar a ampliarse en caso que durante el último mes del año 2020 e inicio del año 2021 se presente incremento de casos de contagio por COVID-19 en las regionales donde se ejecutan los trabajos o se extremen las medidas por parte de los mandatarios locales, lo cual podría afectar la correcta ejecución del contrato.

Dadas las consideraciones expuestas por esta interventoría, 2C INGENIEROS S.A. avala un plazo adicional para el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 1.27%, a partir de la fecha de terminación actual. Así mismo solicita ampliar el contrato de interventoría por el mismo plazo, es decir de 1.27%, con lo cual, es posible garantizar, que la interventoría continúe ejerciendo control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra.

Por consiguiente, esta interventoría manifiesta que los hechos expuestos anteriormente han venido perjudicando el normal desarrollo del contrato de obra, viéndose así afectado el plazo de ejecución.

7.1.7 Bitácora de Obra

Para la ejecución del proyecto se lleva una bitácora de obra en donde se relacionan las actividades diarias ejecutadas, personal, clima, equipo y observaciones técnicas que se presenten durante el desarrollo de las actividades del contrato de obra CO.1 PCCNTR.1552507. (Ver Anexo 2. Copia Bitácora de Obra)

7.1.8 Advertencia Anticipada

2C INGENIEROS S.A., ha dado cumplimiento con los estudios previos, pliego de condiciones y con cada una de las cláusulas pactadas en el anexo del contrato No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, en consecuencia, a continuación, se indican las acciones y recomendaciones en lo que concierne a la cláusula 4 – obligaciones del contratista: numeral. ***4.1.5 "Advertencia anticipada"*** la cual indica "*El Interventor deberá advertir al supervisor del SENA, lo antes posible sobre hechos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las obras. El Interventor deberá presentar una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el precio del Contrato y la fecha de terminación. El Interventor deberá proporcionar dicha estimación en un plazo no mayor a diez días calendario, posteriores a la Advertencia Anticipada. El Interventor preparará las posibles alternativas de solución a través de las cuales se puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento. El Contratista de obra no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente*".

- Que a la fecha el contrato de obra presenta atrasos en la ejecución de actividades de obra, los cuales obedecen a diferentes factores tales como:

  - ✓ No se contaban con presupuestos definidos para cada una de las sedes priorizadas, que ascienden a 42 distribuidas en los 5 departamentos que comprende el contrato para el lote 2, como los son Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Boyacá. Lo que requirió realizar visitas a todos los centros de formación, con el fin de verificar los presupuestos y planes de mantenimiento en las 42 sedes objeto de este contrato, para así, priorizar las intervenciones y establecer una ruta de trabajo.

  - ✓ Que en ejercicio de las visitas realizadas a cada uno de las sedes se identificaron ítems no previstos que son requeridos para los adecuados mantenimientos, lo que implica que el contratista de obra debe realizar APU´s de ítems no previstos, sumado a esto, se deben presentar cotizaciones por parte del contratista de obra y de interventoría para su aprobación, lo que ha requerido mayores tiempos, toda vez muchos comerciantes se

abstienen de cotizar, manifestando que es una práctica requerida por las entidades que les implica tiempo sin garantizarles una venta.

- ✓ Que se requieren permisos para la poda de árboles en el departamento de Arauca y Casanare, ante la entidad competente CORPORINOQUIA, para lo cual cada uno de los centros de estas regionales remitió inventario forestal ante la corporación con el fin de dar trámite al permiso. Respecto a la Regional Casanare, observamos con preocupación que a la fecha no ha sido autorizada esta actividad, lo cual afecta directamente la garantía de otros trabajos realizados como lo son la instalación de luminarias de alumbrado público y mantenimiento de cubiertas. Lo anterior, fue ampliamente detallado en el comunicado del RL-SENA LOTE 2-2020-094 27 de noviembre de 2020.

- ✓ Cada departamento cuenta con un director regional y cada sede con un director de sede, los cuales, en muchos casos cuentan con subsedes y administradores de las mismas. Lo anteriormente mencionado, sumado a la necesidad de interactuar con el delegado de infraestructura de las regionales, personal de mantenimiento y los profesionales en seguridad y salud de cada centro ha generado dificultades en la ejecución del contrato ya que requiere un proceso de articulación y comunicación fuerte y eficiente.

- ✓ Las implementaciones de los protocolos de bioseguridad han afectado el normal desarrollo de las actividades de obra programadas, toda vez que se requiere permiso de las administraciones locales y aprobación de protocolos y en muchos de los casos las entidades no se encuentran funcionando o no cuentan con el personal suficiente. Algunos municipios no permitían el acceso a personal, no ofrecen servicio de hospedaje, transporte o alimentación, cuentan con restricciones como pico y cedula, toques de queda y solicitan cuarentena al personal proveniente de otros municipios.

  Adicionalmente, en cada centro de formación se requiere presentar la documentación e implementación de los protocolos de bioseguridad para el ingreso al personal contractual, técnico y de mano de obra no calificada. Si bien, la información es la misma, la forma en la que debe presentarse (físico, en plataformas digitales, previo al ingreso, luego del ingreso, entre otros) y los requerimientos para el ingreso en cada centro de formación difieren lo que genera retrasos.

- ✓ Que, si bien es cierto, se firmó acta de inicio del contrato de obra el día 27 de julio de 2020, se pudo definir una programación de obra a partir del día 20 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que fue necesario realizar las visitas a todos los centros educativos.

- ✓ Que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA a las comunicaciones mediante las cuales se radicaron la aprobación de los análisis de precios unitarios de actividades no previstas. De acuerdo con lo anterior, esta interventoría advierte de manera anticipada a la entidad que de no dar respuesta y aprobación a los análisis de precios no previstos entregados a la fecha para el contrato de obra No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 2020, se generaría procesos jurídicos para las partes, toda vez que las actividades no previstas se han venido ejecutando por el contratista CONSORCIO JG 2020, con el fin de evitar mayores atrasos al contrato de obra, puesto que muchas de estas actividades son antecesoras de otras.

- ADVERTENCIA ANTICIPADA – GARANTÍA DE LAS OBRAS MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y ALUMBRADO PERIMETRAL POR ATRASO DE PERMISO PARA PODA DE ÁRBOLES

EMPRESARIAL DE CASANARE – SENA CASANARE en el marco del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552507 de 2020, se está desarrollando el mantenimiento a cubiertas en varios de los ambientes, mantenimiento al alumbrado perimetral, entre otras actividades y actualmente se encuentra en trámite permiso ante CORPORINOQUIA para la poda de 235 árboles en el centro educativo.

Respecto a la poda de árboles, el 29 de septiembre de 2020 fue radicado por el SENA, ante CORPORINOQUIA, la solicitud de la poda de árboles, de acuerdo con el INVENTARIO FORESTAL presentado por el ingeniero Fredy Pérez profesional del SENA. El día 13 de noviembre de 2020, fue realizada visita por parte del profesional de CORPORINOQUIA para verificar el inventario realizado y proceder con el trámite del permiso. Sin embargo, observamos con preocupación que a la fecha no ha sido autorizada esta actividad, lo cual afecta directamente la garantía de otros trabajos realizados como lo son la instalación de luminarias de alumbrado público y mantenimiento de cubiertas.

Como se evidenció en la visita realizada y como se manifiesta en el INVENTARIO FORESTAL los árboles priorizados para la poda fueron aquellos que ***"presentaban conflicto con la redes eléctricas e Infraestructura, es decir estaban haciendo daño en redes de conducción eléctrica, andenes, estructuras de ambientes de formación y área administrativa y cerramientos."*** Por lo anterior, esta interventoría advierte anticipadamente que, si bien se dará entrega de los trabajos de mantenimiento de cubiertas y alumbrado perimetral, no será posible garantizar los trabajos realizados si no se realiza la poda a la totalidad de los arboles priorizados en el porcentaje de poda propuesto, pues como se puede observar en las fotografías anexas a este comunicado los árboles priorizados generan graves afectaciones en el centro educativo.

En cuanto a las afectaciones a la infraestructura, los árboles contiguos a las edificaciones generan gran cantidad de material vegetal, lo que afecta que el fluido se desplace adecuadamente por las cubiertas cuando se presentan lluvias, ocasionando filtraciones por el represamiento de este material, al igual que el buen funcionamiento de canales y sifones, así mismo, la caída de los frutos, las extensas ramas y el peso de las mismas puede ocasionar daños a las tejas.

Así mismo, en lo relacionado con el sistema eléctrico, los árboles actualmente generan gran tensión en las líneas de conducción, por lo que se podría presentar intermitencia en el suministro eléctrico y como consecuencia daños en las luminarias. Adicionalmente, las ramas de los árboles afectan los transformadores y son un puente para que roedores u otro tipo de animales los cuales pueden causar daños en los equipos eléctricos.

Por último, se ha evidenciado que los árboles han generado daños en el cerramiento perimetral, no permiten que las luminarias iluminen adecuadamente los espacios en las horas de la noche y por su gran envergadura facilitan el acceso a ladrones o personal no autorizado al centro.

Por consiguiente, esta interventoría manifiesta que los hechos expuestos anteriormente han venido perjudicando el normal desarrollo del contrato de obra, viéndose así afectado el plazo de ejecución.

- ADVERTENCIA ANTICIPADA – NO CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONSORCIO JG 2020

  - Que 2C INGENIEROS S.A. en cumplimiento de sus obligaciones descritas en el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, solicitó al CONSORCIO JG 2020 el 18 de diciembre de 2020 vía email mediante comunicado No. 1 de carácter preventivo No. RL-SENA LOTE 2-2020-105, paz y salvos del personal que se ha desvinculado del proyecto a la fecha, y, además, se indicó que tal información debe ser remitida a esta interventoría a medida que el personal se retira del Consorcio, lo anterior por ser una función de control y vigilancia que nos asiste en cumplimiento de las obligaciones a cargo de la interventoría a la luz de lo dispuesto en el contrato No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020. Sin que el contratista CONSORCIO JG 2020 a la fecha haya dado respuesta a dicha solicitud.

  - Que el día 28 de diciembre de 2020 mediante correo electrónico se recibió comunicado del señor **LUIS JAVIER GUANAY MECHE**, quien manifiesta que el CONSORCIO JG 2020, a la fecha no les ha realizado los pagos correspondientes a las prestaciones sociales de ley, según el tiempo laborado con dicho Consorcio. Igualmente indica que en las mismas condiciones se encuentran los exempleados Carlos Alarcón, Clemente Bernal, José Cepeda. Se anexa comunicado y PQRS No.: 7-2020-252308 NIS: 2020-01-326569 enviada por el SENA regional Casanare referente a dicha solicitud del señor Guanay. Sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte del contratista Consorcio JG 2020.

  - Que el 31 de diciembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-111 enviado vía email con asunto "*comunicación No. 01 de carácter preventivo -solicitud documentos de cumplimiento de las prestaciones sociales del personal*", esta interventoría solicitó paz y salvos del personal contratado a través del CONSORCIO JG 2020 y subcontratistas, retirado del proyecto a la fecha. Sin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte del contratista Consorcio JG 2020. (se Anexa Comunicado).

- Que el día 12 de enero de 2021 mediante correo electrónico esta interventoría recibió oficio por parte del señor **FERMÍN BELLO JIMÉNEZ** (maestro de obra), quien manifiesta que el CONSORCIO JG 2020, a la fecha no le ha realizado los pagos correspondientes al salario pactado entre las partes, adeudándole 30 días de trabajo a la fecha, por lo cual suspenden labores a partir de la fecha del comunicado hasta tanto el consorcio realice el pago del salario adeudado a la fecha. (se Anexa Comunicado).

- Que el 13 de enero de 2021, mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-119 enviado vía email con asunto "*comunicación No. 01 de carácter preventivo - incumplimiento en el pago de salarios laborales*", esta interventoría solicitó al CONSORCIO JG 2020 se dé cumplimiento con el pago de salarios al personal de obra en un plazo no mayor a un día hábil a partir del recibido de esta comunicación, en cumplimiento de los requisitos legales y normatividad vigente en materia de pagos de salarios y prestaciones del personal vinculado a la ejecución del contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 de 2020, con el fin de normalizar las labores en el frente de trabajo de la regional Casanare, toda vez que el personal suspendió labores a partir de la fecha en dicho centro. Por tanto, se solicita soporte del cumplimiento de dicha obligación. (se Anexa Comunicado).

- Esta interventoría el día 13 de enero de 2021, mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-120 enviado vía email con asunto "*comunicación No. 02 de carácter Correctivo* - solicitud documentos de cumplimiento de las prestaciones sociales del personal", solicito paz y salvos del personal retirado a la fecha de la ejecución del contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 de 2020, al igual que los subcontratistas, lo anterior, para que se demuestre y acredite de manera clara y oportuna el cumplimiento de los requisitos legales y normatividad vigente en materia de pagos de salarios y prestaciones del personal vinculado a lo largo de la ejecución del plazo que ha transcurrido del contrato de obra civil anteriormente mencionado. Teniendo en cuenta que al a fecha el CONSORCIO JG 2020 ha hecho caso omiso a las solicitudes de la interventoría 2C INGENIEROS S.A.

- Que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del contratista CONSORCIO JG 2020 a las comunicaciones radicadas por esta interventoría referente al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad vigente en materia de pagos de salarios y prestaciones del personal vinculado a lo largo de la ejecución del plazo que ha transcurrido del contrato de obra civil No. CO1.PCCNTR.1552507 de 2020.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría advierte de manera anticipada a la entidad contratante que de no recibir respuesta satisfactoria por parte del contratista CONSORCIO JG 2020 del cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra civil No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 2020 y de la normatividad legal vigente, procederá a solicitarle a la entidad contratante SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, hacer efectiva la *CLÁUSULA 19 - GARANTÍAS:* PÓLIZA DE cumplimiento **literal d**. "*Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Del personal que haya de utilizar para el cumplimiento del objeto de este contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más*", que lo hace incurso en las multas mencionadas en la *CLÁUSULA 7 - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES, CLÁUSULA PENAL, MULTAS.*

7.2 ÁREA ADMINISTRATIVA

Esta interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de obra No. CO.1 PCCNTR.1552507 durante su ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento al objeto contractual.

7.2.1 Descripción de las Actividades

En cumplimiento de las funciones descritas en el anexo del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, estudios previos y pliego de condiciones definitivos, la interventoría realizo las siguientes actividades, en desempeño de sus obligaciones:

2C INGENIEROS S.A. ha realizado control y seguimiento al estado del contrato de obra pública, con el fin de dar cumplimiento oportuno al objeto contractual.

Por lo anterior, se ha verificado que el contratista disponga del personal mínimo requerido para la ejecución de las actividades, y que cuente con las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo, y así mismo este afiliado a la ARL y al sistema de seguridad social integral y que le sean pagadas las prestaciones sociales de ley.

Así mismo se han emitido diferentes comunicaciones, de carácter preventivo al contratista y se han dado respuesta oportunamente a las solicitudes recibidas, igualmente se han realizado comités entre las partes.

Igualmente, 2C INGENIEROS S.A. ha venido elaborando los informes mensuales correspondientes a la ejecución del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, conforme a lo estipulado en el mismo. Por tanto, el 27 de agosto de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-021 radico vía email el **informe No. 1** Correspondiente al periodo del 27 al 31 de julio de 2020, el 15 de septiembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-031 radico vía email el **informe No. 2** Correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2020, el 24 de septiembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-038 radico vía email el **informe No. 3** Correspondiente al periodo del 01 al 20 de septiembre de 2020 junto con el acta de avance parcial No. 1; el 04 de noviembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-0077 radico vía email el **informe No. 4** Correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 24 de octubre de 2020 junto con el acta de avance parcial No. 2; el 09 de diciembre de 2020 mediante comunicado No. RL-SENA LOTE 2-2020-100 radico vía email el **informe No. 5** Correspondiente al periodo del 25 de octubre al 28 de noviembre de 2020 junto con el acta de avance parcial No. 3. Dando así cumplimiento al contrato de interventoría

7.2.2 Estado del Contrato de obra

El contratista CONSORCIO JG 2020 ha venido ejecutando las actividades objeto del contrato No. CO.1 PCCNTR.1552507 conforme a la programación presentada una vez realizadas las visitas a los centros de formación, por consiguiente, a la fecha de corte de presente informe se presenta un programado acumulado del **92,47 %**, contra un porcentaje ejecutado de obra acumulado del **71,19%**, presentando un atraso del **-21,28 %**.

En la tabla a continuación se evidencia el estado actual del contrato de obra.

Tabla 10 Estado actual del contrato de obra

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATO NO.:	CO.1 PCCNTR.1552507
FECHA DEL CONTRATO:	27 DE MAYO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
CONTRATISTA DE LA OBRA:	CONSORCIO JG 2020 NIT. 901.382.308 - 1
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA:	JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR C.C. 71.185.747 de Puerto Berrío
INTERVENTOR:	2C INGENIEROS S.A. NIT. 830.023.761 - 7
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTOR:	CESAR ASHLEY MORA BARNEY C.C. 19.356.176 de Bogotá
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 3.681.491.238,00) INCLUIDO AU, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, GASTOS, IVA SOBRE UTILIDAD Y DEMÁS DEROGACIONES EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL (01) DE DICIEMBRE DE 2020 o hasta cuando se agote el valor total del mismo lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE LA PRORROGA No. 1	TREINTA (30) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL OTROSÍ PRORROGA No. 2	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2021
ADICIÓN No. 1 SEGÚN OTROSÍ PRORROGA No. 2	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE **($38.702.000,00)** con cargo al CDP No. 15320, con el ánimo de generar los reembolsos correspondientes a los montos causados por implementación de los protocolos de bioseguridad.

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($3.720.193.238,00)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LOTE 2 - Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Santander.

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.2.3 Informe del Personal

7.2.3.1 Personal Contratista de Obra

Durante la ejecución de obra el contratista ha contado con el personal profesional mínimo requerido contractualmente, al igual que el personal de obra de apoyo y mano no calificada de acuerdo a la ejecución de las actividades realizadas. (Ver Anexo 3. Control de Personal del Contratista de obra).

A continuación, se relaciona el personal profesional que laboró durante el periodo de ejecución del presente informe.

Tabla 11. Personal Profesional

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CEDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL PROFESIONAL
PERSONAL CONTRACTUAL		
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	DIRECTOR DE OBRA	71.185.747 De Puerto Berrio (Ant)
EDGAR JEREZ TAMI	COORDINADOR REGIONAL 1	91205625 De Bucaramanga Santander
ISLEY RINCÓN SUAREZ	COORDINADOR REGIONAL 2	60.334.309 De Cúcuta Santander
MARTHA BEATRIZ MENDOZA CARRASCAL	COORDINADOR REGIONAL 3	60.261.351 De Teorama Norte De Santander
CESAR AUGUSTO CRISTANCHO SÁNCHEZ FRANCO	ENCARGADO ÁREA ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.098.692.691 De Bucaramanga Santander
GERSON JHAIR CUADROS LUNA	ENCARGADO ÁREA AMBIENTAL	1.102.356.716 De Bucaramanga Santander
WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES	ENCARGADO ÁREA HIDROSANITARIA	91.075.487 San Gil
DIEGO AUGUSTO SÁNCHEZ BÁEZ	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	91.266.126 De Bucaramanga Santander
MAIRA ALEJANDRA CALA SOLER	INSPECTOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.098.632.716 De Bucaramanga Santander
PERSONAL ADICIONAL		
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO	APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA (Adicional)	1.099.204.149 De Barbosa Santander

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

En la siguiente tabla se relaciona el personal de mano de obra no calificado que laboró durante el periodo de ejecución del presente informe.

7.2.3.1.1 Personal Regional Boyacá

Tabla 12. Personal de mano de obra no calificada

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL BOYACÁ						
1	Ariolfo Antonio Tovar	1'099.204.149	Ing. Apoyo a la dirección	CONSORCIO JG 2020	1-ago.-2020	
2	Maira Alejandra Cala	1´098.632.716	Inspector SST	CONSORCIO JG 2020	25-ago.-2020	
3	Luis Domingo Becerra	1'098.717.075	Residente de obra	CONSORCIO JG 2020	21-ago.-2020	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA						
4	Carlos Salcedo	9.399.103	Maestro de obra	CONSORCIO JG 2020	28-ago.-2020	
5	William Pineda Salcedo	74.080.444	Oficial de obra	CONSORCIO JG 2020	28-ago.-2020	
6	Juan Pineda Salcedo	74.185.695	Oficial de obra	CONSORCIO JG 2020	28-ago.-2020	
7	Giovanny Ponguta	1.057.580.018	Oficial de obra	CONSORCIO JG 2020	28-ago.-2020	
8	YEISON HERNANDEZ RODRIGUEZ	74.245.088	OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIETNO	CONSORCIO JG 2020	20-ago.-2020	
9	JOSE MANUEL FERNANDEZ	931.862.215.011.978	AYUDANTE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIETNO	CONSORCIO JG 2020	3-sep.-2020	
10	EDUIN ENRIQUE HOYOS CAMACHO	78.702.967	OFICIAL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIETNO	CONSORCIO JG 2020	20-ago.-2020	
11	JHONNY EDUARDO PEREZ NIÑO	1.127.924.958	OFICIAL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIETNO	CONSORCIO JG 2020	8-sep.-2020	
12	HEINER YESID REDONDO	1.049.636.195	AYUDANTE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIETNO	CONSORCIO JG 2020	8-sep.-2020	
13	WILSON HERNEY VARGAS PEREZ	74.337.737	AYUDANTE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CERRAMIETNO	CONSORCIO JG 2020	23-oct.-2020	
14	JESUS MOSCOSO	4.178.718	OFICIAL ELECTRICO	SERVINTEG SAS	21-oct.-2020	

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.2.3.1.2 Personal Regional Casanare

Tabla 13. Personal de mano de obra no calificada

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL CASANARE						
PROFESIONAL						
1	JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	71.185.747	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	9-jun.-2020	
2	EDGAR JEREZ TAMI	91.205.625	COORDINADOR REGIONAL	CONSORCIO JG 2020	23-jul.-2020	
3	MAIRA ALEJANDRA CALA	1.098.632.716	INSPECTOR SST	CONSORCIO JG 2020	23-jul.-2020	
TÉCNICO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA						
4	FERMÍN JIMÉNEZ BELLO	74.859.773	MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	3-sep.-2020	12-ene.-2021
5	CARLOS ARTURO ALARCON CORREDOR	1.118.550.222	AYUDANTE OBRA	CONSORCIO JG 2020	3-sep.-2020	30-nov.-2020
6	RUDY ALEXANDER CARVAJAL PULIDO	74.347.867	TÉCNICO ELECTRICISTA (Subcontratista	CONSORCIO JG 2020	10-sep.-2020	
7	JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ	86.047.413	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	10-sep.-2020	12-ene.-2021
8	JHON FREDY HIDALGO SANABRIA	1.116.547.998	AYUDANTE DE OBRA - PINTURA	CONSORCIO JG 2020	2-oct.-2020	
9	RODRIGO ANDRES VEGA SANABRIA	1.006.442.094	MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	14-nov.-2020	
10	CARLOS ENRIQUE GARZON RINCON	1.095.844.497	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020
11	EIDER ANTONIO LÓPEZ JAIMES	1.102.725.265	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020
12	SERGIO ANDRES ROJAS SANTIAGO	1.098.704.140	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020
13	GERMAN EDUARDO MORENO	91.512.213	CONDUCTOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020
14	JOSÉ LEONARDO PÉREZ CORREDOR	1.116.551.667	TECNICO ELECTRICISTA	TARKUS DISEÑI Y CONSTRUCCIONES	7-ene.-2021	
15	DAIRO DE LA ROSA BADILLO	1.095.803.688	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021	
16	SERGIO ANDRES ROJAS SANTIAGO	1.098.704.140	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021	
17	YOVANIS DE LA ROSA BADILLO	1.052.573.001	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021	
18	PATROCINIO CORREDOR JOYA	91.518.170	CONDUCTOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021	

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.2.3.1.3 Personal Regional Santander

Tabla 14. Personal de mano de obra no calificada

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Ariolfo Antonio Tovar	1.099.204.149	Apoyo a la dirección	CONSORCIO JG 2020	2-sep.-2020	
2	Diego Augusto Sánchez Báez	91.266.126	Profesional SST	CONSORCIO JG 2020	2-sep.-2020	
3	Maira Alejandra Cala	1.098.632.716	Inspector SST	CONSORCIO JG 2020	2-sep.-2020	
4	Gerson Jhair Cuadros Luna	1.102.356.716	Encargado Área Ambiental	CONSORCIO JG 2020	2-sep.-2020	
2	Omar Andrés Osorio Avellaneda	1,098,704,659	Arquitecto Apoyo	CONSORCIO JG 2020	17-sep.-2020	
3	Huber Alfonso caicedo	1.094.574.920	Oficial de Construcción	CONSORCIO JG 2020	2-sep.-2020	
5	Johnatan Pulgarín	1.098.753.378	Ayudante Técnico	CONSORCIO JG 2020	8-sep.-2020	
6	John Harol Posso	1.024.502.083	Instalador de Cielo raso	SERVICONSTRUYAMOS SAS.	2-sep.-2020	
3	BRYAN DUCON	1.057.611.224	Instalador de Cielo raso	SERVICONSTRUYAMOS SAS.	2-sep.-2020	
5	Jefferson Fabian Ferreira Ospina	1.098.741.169	Ayudante de pintura	INNOBRAR SAS	11-sep.-2020	
8	JUAN GUILLERMO ACOSTA	1´095.796.441	MAESTRO DE PINTURA	CONSORCIO JG 2020	6-sep.-2020	
9	MIGUEL OSWALDO VELASCO TIQUE	1.098.719.486	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	15-sep.-2020	

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.2.3.1.4 Personal Regional Norte de Santander

Tabla 15. Personal de mano de obra no calificada

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
1	MARTHA BEATRIZ MENDOZACARRASCAL	60.261.351	ING COORDINADOR	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020	
2		13.497.740		INDEPENDIENTE		

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
	GIOVANI ALFREDO GALAN		ING SUBCONTRATISTA		1-oct.-2020	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA						
3	EYVAR ERNESTO GALVIS BONILLA	1.127.919.665	AYUDANTE	CONSORCIO JG 2020	1-oct.-2020	
4	FREDY ALEXANDER MORENO	1.090.435.531	OFICIAL	CONSORCIO JG 2020	1-oct.-2020	
5	FREDY GUSTAVO MORENO CASANOVA	13.480.148	OFICIAL	CONSORCIO JG 2020	1-oct.-2020	
6	JESUS MANUEL GALVIS	1.090.541.154	AYUDANTE	CONSORCIO JG 2020	1-oct.-2020	
7	JIMMY QUINTERO DURAN	1.090.377.657	AYUDANTE	CONSORCIO JG 2020	1-oct.-2020	27-oct.-2020
8	JOSE LUIS MORENO RAMIREZ	1.090.455.460	MAESTRO	CONSORCIO JG 2020	1-oct.-2020	
9	SERGIO ANDRES SANCHEZ	1.093.783.620	AYUDANTE	CONSORCIO JG 2020	5-oct.-2020	
10	DEIBY ALEXANDER PINTO	1.098.721.674	AYUDANTE	CONSORCIO JG 2020	6-oct.-2020	
11	FAUSTO CUTIVA ROMERO	79.947.401	OFICIAL	CONSORCIO JG 2020	6-oct.-2020	
12	MAURICIO JAVIER VANEGAS	1.098.667.577	AYUDANTE	CONSORCIO JG 2020	6-oct.-2020	
13	DANY ARNULFO RAMOS FIGUEROA	10.904.391.181	TECNICO	INDEPENDIENTE	3-oct.-2020	
14	JOHANFFY VERGARA HERNANDEZ	13.276.880	TECNICO	INDEPENDIENTE	3-oct.-2020	
15	EDNA ROCIO RIVEROS	60.364.630	TECNICO DE MANTENIMIENTO	ATENCION INMEDIATA CONSTRUCCIONES SAS	10-nov.-2020	
16	YEINER RIVEROS REALES	1.093.758.122	TECNICO DE MANTENIMIENTO	ATENCION INMEDIATA CONSTRUCCIONES SAS	10-nov.-2020	
17	CESAR ARNOLDO TORRES	88.310.042	TECNICO	CONSORCIO JG 2020	22-oct.-2020	
18	JHON SEBASTIAN SANABRIA REY	1.098.755.486	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	6-sep.-2020	
19	JOSE ADRIAM PIÑAREZ	1.100.891.205	OFICAL DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	15-sep.-2020	
20	CARLOS DE LA OSSA MATAGIRA	1.104.131.489	OFICAL DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	22-sep.-2020	
21	WALTER STVEN PEÑA	1.090.482.097				

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
			TECNICO DE MANTENIMIENTO	INVERSIONES MARIN MATAMOROS SAS	13-nov.-2020	
22	ALEXANDER MORA URIBE	1.066.352.592	PODADOR	FORESTALES Y ASESORÍAS ECOLÓGICAS - FORESAECO S.A.S	17-nov.-2020	
23	ISAIAS VARGAS PEÑARANDA	77.158.539	PODADOR	FORESTALES Y ASESORÍAS ECOLÓGICAS - FORESAECO S.A.S	17-nov.-2020	
24	JESUS ARLEY PUERTA	1.091.807.049	PODADOR	FORESTALES YASESORÍAS ECOLÓGICAS - FORESAECO S.A.S	17-nov.-2020	
25	JHON EDISON ORTEGA	1.091.806.662	PODADOR	FORESTALES Y ASESORÍAS ECOLÓGICAS - FORESAECO S.A.S	17-nov.-2020	
26	NELSON CARDENAS MORA	1.066.352.095	PODADOR	FORESTALES Y ASESORÍAS ECOLÓGICAS - FORESAECO S.A.S	17-nov.-2020	
27	HUGO FERNANDO PIEDRAHITA	72.302.180	TECNICO DE MANTENIMIENTO	CONSORCIO JG 2020	21-nov.-2020	

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.2.3.1.5 Personal Regional Arauca

Tabla 16. Personal de mano de obra no calificada

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL ARAUCA						
PROFESIONAL						
1	JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	71.185.747	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	9-jun.-2020	
2	EDGAR JEREZ TAMI	91.205.625	COORDINADOR REGIONAL	CONSORCIO JG 2020	23-jul.-2020	
3	MAIRA ALEJANDRA CALA		INSPECTOR SST	CONSORCIO JG 2020		
TECNICO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA						
1	JESUS IVAN GIRALDO SARMIENTO	17545035	MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	22-oct.-2020	
2	PEDRO JOSE LAYA MORENO	17589020	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	22-oct.-2020	

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
REGIONAL ARAUCA						
3	DIEGO ARMANDO BLANCO	1116808609	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	22-oct.-2020	
4	MANUEL ANTONIO CARDENAS	9656335	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	22-oct.-2020	Retiro
5	LUIS HERNAN CASTILLO QUINTERO	1116791183	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	9-nov.-2020	
6	MIGUEL LIBARDO FONTALVO	1116862621	OFICIAL DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	22-oct.-2020	

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.2.3.2 ***Personal de Interventoría***

La interventoría 2C INGENIEROS S.A., ha contado con el personal mínimo ofertado para la ejecución del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 DE 2020, así mismo la interventoría a dispuesto de personal adicional para apoyar las actividades objeto del contrato anteriormente indicado, el cual es relacionado en la tabla a continuación:

Tabla 17. Personal de interventoría

No.	NOMBRE EMPLEADO	CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
PERSONAL CONTRACTUAL				
1	CESAR MORA BARNEY	19.356.176 DE BOGOTÁ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
2	JAMESSON JESÚS SOSA RODRÍGUEZ -	79.958.684 DE BOGOTÁ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	23-dic-2020
3	MITCHEL BRIAN ESPINOSA	1.069.737.799 DE FUSAGASUGÁ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA BOYACÁ	
4	FLAVIO MORA FERNÁNDEZ	1.020.752.622 DE BOGOTÁ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARAUCA Y CASANARE	
5	GIOVANNI EDUEN ACOSTA CADENA	91.293.589 DE BUCARAMANGA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER	
6	JULIETH MARTÍNEZ ANGULO	1.069.052.723 LA PALMA CUNDINAMARCA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD	
7	JUANITA SANTOS PRIETO	1.015.476.366 DE BOGOTÁ	SECRETARIA	
8	SANDRA CAROLINA MORA	46.457.765 DE DUITAMA	TECNÓLOGO 1	
9	KATERING FORERO HERNÁNDEZ	1.054.558.189 DE LA DORADA	TECNÓLOGO 2	
PERSONAL ADICIONAL				
1	MARÍA SOFÍA TRUJILLO	1.054.558.189 DE BOGOTÁ	PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)	

No.	NOMBRE EMPLEADO	CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
2	DINA LUZ DÍAZ LÓPEZ	1.118.536.629 DE YOPAL	PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)	
3	OSCAR IVÁN CÁRDENAS BARÓN	1.057.599.452 DE SOGAMOSO	PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)	
4	FRED EVERARDO SUÁREZ OVALLES	88.210.995 DE CÚCUTA	TECNÓLOGO DE APOYO (Adicional)	

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

(Ver Anexo 4. Control Personal de Interventoría).

7.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

7.2.4.1 Aportes del Contrato de obra

El contratista CONSORCIO JG 2020 a la fecha del corte del presente informe remitido las planillas de pago de seguridad social integral, pensiones, ARL y parafiscales correspondientes al mes de noviembre de 2020 del Personal profesional mínimo requerido y del personal de mano de obra no calificada para proyecto objeto del contrato de obra No. CO.1 PCCNTR.1552507 . Así las cosas, esta interventoría realizó verificación de las planillas allegadas por el contratista de obra, a través del formato de control de sistema de seguridad social. (Ver Anexo 5. Control sistema de seguridad social integral contrato de obra).

7.2.4.2 Aportes del Contrato de Interventoría

2C INGENIEROS S.A. a la fecha del corte del presente informe cuenta con el pago de seguridad social integral, pensiones, ARL y parafiscales correspondientes al mes de noviembre de 2020 del Personal profesional mínimo requerido para proyecto objeto del contrato de interventoría. (Ver Anexo 6. Control sistema de seguridad social integral contrato de Interventoría).

7.2.5 Correspondencia

7.2.5.1 Correspondencia Enviada

En el registro de control de correspondencia enviada, se relaciona todas las comunicaciones enviadas al contratista y demás entidades directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo del proyecto, las comunicaciones enviadas son de carácter informativo, preventivo, correctivo y para solicitud de información necesaria

para desarrollar nuestra labor como interventores (Ver Anexo 7. Control de Correspondencia Enviada).

7.2.5.2 Correspondencia Recibida

2C INGENIEROS S.A., en el formato de control de correspondencia recibida, ha relacionado los oficios recibidos de las diferentes entidades involucradas en el proyecto, tales como contratista de obra y entidad contratante (Ver Anexo 8. Control de Correspondencia Recibida).

7.3 ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE

En cumplimiento de las funciones descritas en el anexo del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, estudios previos y pliego de condiciones definitivos, la interventoría realizo las siguientes actividades, en desempeño de sus obligaciones:

7.3.1 Control Avance y Ejecución Financiera del Contrato de Obra

El contrato de obra pública No. CO.1 PCCNTR.1552507 suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y el CONSORCIO JG 2020, tiene un valor de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 3.681.491.238,00) INCLUIDO AU, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, GASTOS, IVA SOBRE UTILIDAD Y DEMÁS DEROGACIONES EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La forma de pago descrita en la **CLÁUSULA 3- FORMA DE PAGO:** "*El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:* ***1. PAGOS PARCIALES:*** *El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan…* ***2. UN ÚLTIMO PAGO:*** *Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la*

interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma…"

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que, a corte del 20 de enero de 2021 según programación aprobada, el contratista de obra cuenta un avance de ejecución del **71,19%**.

En la tabla a continuación se relaciona el estado financiero del contrato de obra a la fecha de corte del presente informe:


Tabla 18. Avance financiero contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR POR EJECUTAR
VALOR DEL CONTRATO ACTUAL	$3.720.193.238,00			
VALOR EJECUTADO CORTE No. 1		$ 137.101.223,07	$ 137.101.223,07	
VALOR EJECUTADO CORTE No. 2		$ 605.441.944,23	$605.441.944,23	
VALOR EJECUTADO CORTE No. 3		$ 994.558.055,70	$ 994.558.055,70	
VALOR EJECUTADO EN EL CORTE No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRESENTE INFORME		$911.120.908,16		
VALOR POR EJECUTAR Y/O COBRAR				$ 1.071.971.106,84
TOTALES	**$ 3.720.193.238,00**	**$ 2.648.22.131,16**	**$ 1.737.101.223,00**	**$ 1.071.971.106,84**

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

Según lo reportado anteriormente se evidencia que avance acumulado a la fecha del presente informe corresponde al **71,19%**, y que el avance ejecutado en el periodo del presente informe para el cobro parcial No. 4 corresponde al **24,49%** equivalente al valor de **$911.120.908,16**, valor aprobado para el corte No. 4

Gráfico 3 Ejecución del contrato de obra

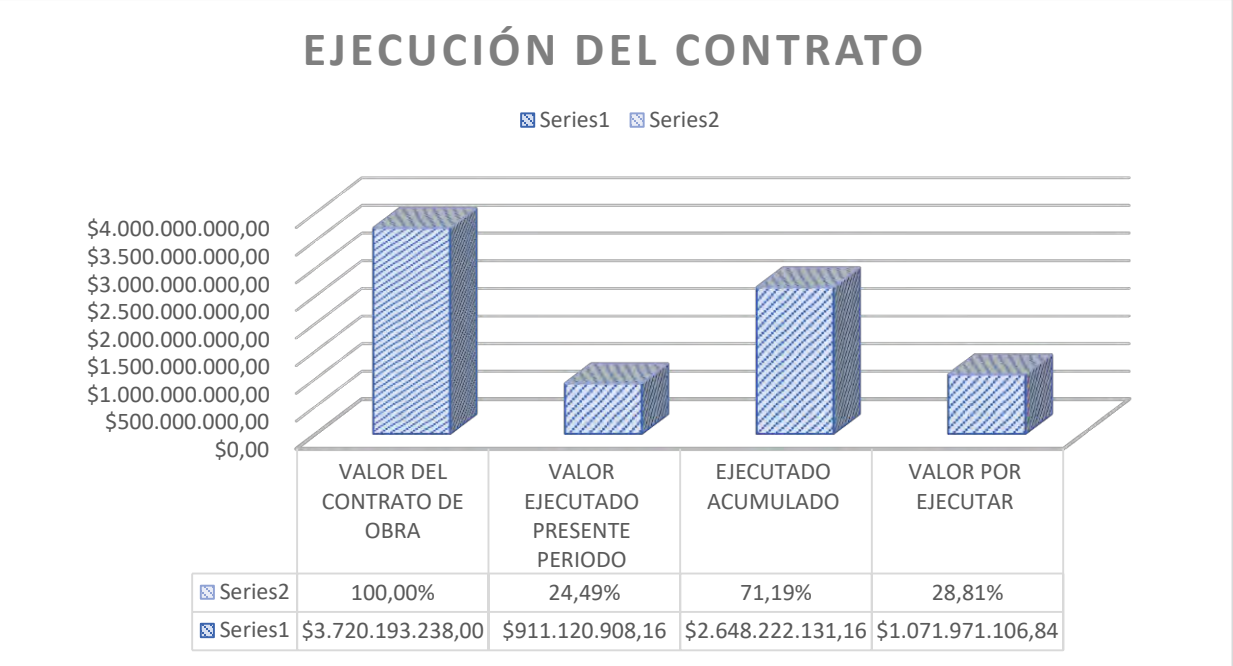

	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
Series2	100,00%	24,49%	71,19%	28,81%
Series1	$3.720.193.238,00	$911.120.908,16	$2.648.222.131,16	$1.071.971.106,84

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

7.3.2 Control Avance y Ejecución Financiera del Contrato de Interventoría

El contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020 suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y 2C INGENIEROS S.A., tiene un valor de CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE. ($ 460.956.020,00) INCLUIDO IVA.

La forma de pago descrita en la **CLÁUSULA 3- FORMA DE PAGO:** *"El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de INTERVENTORÍA de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:* ***1. PAGOS PARCIALES:*** *Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.* ***2. UN ÚLTIMO PAGO:*** *Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra…"*

A la fecha del presente informe corresponde al corte de 20 de enero de 2021, 2C INGENIEROS S.A., presenta la siguiente inversión financiera del contrato de interventoría:

Tabla 19. Inversión financiero contrato de interventoría

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	VALOR POR COBRAR	%
VALOR DEL CONTRATO ACTUAL	$ 460.956.020,00						
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME		$ 330.367.179,30					71,67%
VALOR POR EJECUTAR			$ 130.588.840,70				28,33%
VALOR FACTURADO EN EL ACTA PARCIAL No. 1				$ 17.147.563,94	$ 17.147.563,94		3,72%
VALOR FACTURADO EN EL ACTA PARCIAL No. 2				$ 75.827.265,29	$ 75.827.265,29		16,45%
VALOR A FACTURAR EL ACTA PARCIAL No. 3				$ 124.504.220,77	$ 124.504.220,77		27,01%
VALOR A FACTURAR EL ACTA PARCIAL No. 4				**$ 112.888.129,30**			24,49%
VALOR POR COBRAR						$ 130.588.840,70	28,33%
TOTALES	**$460.956.020,00**	**$330.367.179,30**	**$130.588.840,70**	**$330.367.179,30**	**$217.479.050,00**	**$130.588.840,70**	**100,00%**

Fuente: 2c Ingenieros S.A.

Es preciso indicar que la interventoría a corte del presente informe ha contado con el personal e insumos ofertados, por tanto, la inversión financiera correspondiente a la ejecución asciende a un valor de $ 381.934.988,00 equivalente al 82.86 % de ejecución del contrato de Interventoría.

No obstante, teniendo en cuenta la forma de pago del contrato de interventoría el valor a cobrar en el corte No. 4, correspondiente a la ejecución de avance del periodo del presente informe asciende a la suma de **$ 112.888.129,30** equivalente al **24,49 %** de avance.

7.4 ÁREA JURÍDICA

En cumplimiento de las funciones descritas en el anexo del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, esta interventoría ha verificado los documentos de tipo legal, en la medida del avance del contrato de obra.

7.4.1 Garantías

7.4.1.1 Contrato de Obra

En cumplimiento a lo indicado en el anexo del contrato de obra No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020 en la cláusula 19 – GARANTÍAS, el contratista CONSORCIO JG 2020 constituyó garantía única con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., quien expidió la póliza No. 96-44-101153414 "Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal", y póliza No. 96-40-101054903 "Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil extracontractual derivada de cumplimiento", pólizas aprobadas por la entidad contratante.

Las pólizas han sido actualizadas teniendo en cuenta cada uno de los actos administrativos suscritos a la fecha de corte del presente informe, el último acto administrativo generado fue la Modificación No. 2 al contrato de obra – "Por medio de la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2021", el contratista presentó actualización de los amparos de las garantías del contrato de obra, dando cumplimiento a lo indicado en la cláusula 19 – garantías; las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 20. Pólizas contrato de obra

RIESGO AMPARADO	No. DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	96-44-101153414	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$744.038.647,60	27/07/2020	15/08/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101153414	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$186.009.661,90	27/07/2020	15/02/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101153414	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$744.038.647,60	31/01/2021	31/01/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	96-44-101153414	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$744.038.647,60	31/01/2021	01/08/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101153414	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$744.038.647,60	31/01/2021	01/08/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – Predios laborales y operacionales	96-40-101054903	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 351.121.200.00	27/07/2020	15/02/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – Contratista y subcontratistas	96-40-101054903	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 351.121.200,00	10/08/2020	12/0/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL –	96-40-101054903	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 70.224.240,00	10/08/2020	15/02/2021

RIESGO AMPARADO	No. DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Vehículos propios y no propios					

Fuente: 2C INGENIEROS S.A.

7.4.1.2 Contrato de Interventoría

En cumplimiento a lo indicado en el contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020 en la CLAUSULA 19 - GARANTÍAS, la firma 2C INGENIEROS S.A. constituyó garantía única con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., quien expidió póliza No. 14-44-101118845 "Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal", y póliza No. 14-40-101032975 "Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil extracontractual derivada de cumplimiento", pólizas aprobadas por la entidad contratante.

Las pólizas han sido actualizadas teniendo en cuenta cada uno de los actos administrativos suscritos a la fecha de corte del presente informe, el último acto administrativo generado fue la Modificación No. 2 al contrato de obra – "Por medio de la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2021", 2C INGENIEROS S.A., presentó actualización de los amparos de las garantías del contrato de obra, dando cumplimiento a lo indicado en la cláusula 19 – garantías; las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 21. Pólizas contrato de interventoría

RIESGO AMPARADO	No. DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101118845	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$92.191.204,00	27/07/2020	15/08/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101118845	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$92.191.204,00	27/07/2020	15/02/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101118845	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$23.047.801,00	27/07/2020	15/02/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – Predios laborales y operacionales	14-40-101032975	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 351.121.200.00	27/07/2020	15/02/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – Daño emergente y lucro cesante	14-40-101032975	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 351.121.200,00	27/07/2020	15/02/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – Perjuicios Extramatrimoniales	14-40-101032975	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 351.121.200,00	27/07/2020	15/02/2021

Fuente: 2C INGENIEROS S.A.

7.4.2 Suscripción de Actas de Inicio

2C INGENIEROS S.A. representado legalmente por CESAR ASHLEY MORA BARNEY en calidad de contratista interventor, suscribe con WILSON JAVIER ROJAS MORENO, Director Administrativo y Financiero actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA y LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS profesional del grupo de construcciones, en calidad de delegado por el ordenador del gasto como Supervisor del contrato, acta de inicio el 27 de julio de 2020 del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, a partir de la cual corren los tiempos del contrato, cuyo plazo corresponde hasta el 15 de diciembre de 2020 o hasta cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

Así mismo, se suscribe acta de inicio del contrato de obra No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 2020, el 27 de julio de 2020 entre las partes WILSON JAVIER ROJAS MORENO en calidad de Director Administrativo y Financiero actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR, Representante legal del CONSORCIO JG 2020 en calidad de contratista de obra y CESAR ASHLEY MORA BARNEY en calidad de representante legal de la firma de Interventoría 2C INGENIEROS S.A., fecha a partir de la cual corren los tiempos del contrato, hasta el (01) de diciembre de 2020 o hasta cuando se agote el valor total del mismo lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

7.4.3 Suscripción de otrosí prorroga a los contratos

7.4.3.1 Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552507

El 30 de noviembre de 2020 el supervisor del contrato realizo justificación otro sí prorroga No. 1 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552507 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje - SENA Y CONSORCIO JG 2020, por el término de treinta (30) días hasta el 31 de diciembre de 2020.

El 24 de diciembre de 2020 el supervisor del contrato realizo justificación otro sí prorroga No. 2 al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552507 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje - SENA Y CONSORCIO JG 2020 por el término de un mes y quince días hasta el 15 de febrero de 2021.

7.4.3.1 Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.1635455

El 11 de diciembre de 2020, el supervisor del contrato realizo justificación otro sí prorroga No. 1 al contrato No. CO1.PCCNTR.1635455 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje - SENA Y 2C INGENIEROS S.A., por el término de quince días hasta el 31 de diciembre de 2020.

El 24 de diciembre de 2020 el supervisor del contrato realizo justificación otro sí prorroga No. 2 al contrato No. CO1.PCCNTR.1635455 suscrito entre el servicio nacional de aprendizaje - SENA Y 2C INGENIEROS S.A., por el término de un mes y quince días hasta el 15 de febrero de 2021.

7.5 ÁREA AMBIENTAL

Esta interventoría durante el periodo del presente informe realizó el seguimiento y control del cumplimiento de los aspectos ambientales generados por el contrato de mantenimiento No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 2020 ejecutado por el CONSORCIO JG 2020.

Lo anterior teniendo en cuenta que el contratista de obra cuenta con un plan de manejo ambiental denominado "*Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable" – Lote No. 2 Regional Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Santander*", el cual tiene como objetico formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante la elaboración de los mantenimientos, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA.

En cumplimiento de lo anterior esta interventoría verificó el cumplimiento de:

7.5.1 Manejo y Disposición Final de Escombros

Dentro de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el del 29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021, el CONSORCIO JG 2020 ha generado residuos de construcción y demolición producto de actividades de:

- Demolición de enchape
- Desmonte de cielo raso
- Demolición de pañetes
- Demolición de piso en concreto

- Escarificación de pañete y pintura

Durante este el periodo de este informe no se realizó disposición del material de construcción y demolición, los residuos generados en cada una de las regionales se encuentran correctamente almacenados en cada uno de los centros educativos intervenidos, una vez se finalicen las intervenciones en los ítems anteriormente descritos el CONSORCIO JG 2020 procederá a realizar la disposición adecuada.

7.5.2 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

Para el manejo de residuos sólidos convencionales se han dispuesto bolsas de basura en obra con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, en cuanto a los residuos generados producto de la implementación del protocolo de bioseguridad, esta interventoría ha verificado que se realiza en doble bolsa negra tal y como lo establece la Resolución 666 de 2020 teniendo en cuenta que no se registran personas contagiadas por COVID-19 en obra. Los residuos ordinarios son entregados al servicio de recolección municipal, donde se ejecutan los trabajos por parte del CONSORCIO JG 2020.

En cuanto a la disposición de los residuos peligrosos, se encuentran correctamente almacenados en cada uno de los centros educativos intervenidos, una vez se finalicen las intervenciones en los ítems anteriormente descritos el CONSORCIO JG 2020 procederá a realizar la disposición adecuada.
Servicios Públicos

El CONSORCIO JG 2020 no requiere realizar conexión a servicios públicos. En cuanto al uso de herramientas menores que requieren energía eléctrica o el suministro de agua, el contratista de obra solicitará autorización en cada uno centros a intervenir para hacer uso de estos servicios.

7.5.3 Protección Flora

El proyecto tiene contemplada la actividad de podas de árboles, lo que genera afectación a la flora existente en los diferentes centros de formación, par tanto, esta interventoría verificará y realizará acompañamiento para obtener los permisos para la poda de árboles en los centros educativos que lo requieran de acuerdo con lo establecido por la corporación autónoma regional u otras entidades, de acuerdo con la localización del centro.

Actualmente, se adelanta por parte del SENA regional Casanare, permiso de podas ante Corporinoquia. Así mismo, se debe solicitar premiso ante la Empresa de Energía de Casanare – Enerca para programar los cortes necesarios, ya que los árboles actualmente generan afectaciones en el alumbrado perimetral del centro educativo.

7.6 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Esta interventoría durante el periodo del presente informe realizó el seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos de la normatividad de salud y seguridad en el trabajo, respecto a las actividades ejecutadas por el contrato de mantenimiento No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 2020. Para lo cual, se verificó el cumplimiento de:

7.6.1 Recursos del Sistema

De acuerdo con el seguimiento mensual realizado por parte de esta interventoría al CONSORCIO JG 2020, se puede evidenciar que el contratista de obra:

- Cuenta con un manual del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.
- Cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo.
- Cuenta con un responsable para la planificación y ejecución de las actividades del sistema de gestión.
- Todo el personal del CONSORCIO JG 2020 participa activamente en la ejecución de actividades de seguridad y salud en el trabajo.

7.6.1.1 Políticas

La CONSORCIO JG 2020 cuenta con Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, así como política de No Alcohol, no drogas y tabaquismo, y política de ambiente armonioso.

7.6.2 Documentación

Esta interventoría verificó que la CONSORCIO JG 2020 mantiene disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: la política y los objetivos, las responsabilidades, la identificación continua de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, el plan de emergencias, plan de capacitación, los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo y los registros. La documentación relacionada con el SG-SST se establece, controla y conserva adecuadamente.

7.6.3 Comunicación

Esta interventoría evidenció que la CONSORCIO JG 2020, cuenta con mecanismos de comunicación con las partes interesadas tales como: correo electrónico, reuniones administrativas, capacitaciones, boletines.

7.6.4 Medicina Preventiva y del Trabajo

7.6.4.1 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021, no se presentaron accidentes de trabajo.

7.6.4.2 Exámenes de ingreso

Previo al inicio de actividades se solicita exámenes de ingreso al personal contratado con el fin de conocer las condiciones de salud en las cuales ingresan los trabajadores.

7.6.5 Seguridad Industrial

El CONSORCIO JG 2020 realiza la entrega de dotación y elementos de protección personal a todo el personal en obra. 2C INGENIEROS S.A. a través de inspección visual diaria en obra y registros firmados verifica que todo el personal cuenta con dotación y elementos de protección personal. (Ver anexo No. 10 Actas de entrega de EPP)

Así las cosas, a continuación, se muestra un registro fotográfico de la evidencia de entrega de elementos de protección personal:









7.6.6 Trabajos de alto riesgo

El CONSORCIO JG 2020, durante la ejecución de actividades a corte del presente informe, se han verificado los certificados de trabajo en alturas de todo el personal que labora a alturas superiores a 1.5 metros, así mismo se ha realizado seguimiento al desarrollo de charlas y análisis de trabajo seguro del personal expuesto a este riesgo. (Ver anexo No. 11 Soportes trabajo en alturas)





7.6.7 Actas de inducción

El CONSORCIO JG 2020, durante la ejecución de actividades a corte del presente informe, realizo la correspondiente inducción al personal que ingreso a laborar en las actividades objeto del contrato de obra No. CO.1 PCCNTR.1552507 de 2020, en cada uno de los centros que se encuentran ejecutando actividades de obra. (Ver anexo No. 12 Capacitaciones e Actas de Inducción)

7.6.8 Capacitación y/o Charlas

El CONSORCIO JG 2020 cuenta con un plan de capacitaciones que incluye charlas periódicas al personal en temas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Para el periodo comprendido entre el 29 de noviembre de 2020 al 20 de enero de 2021, se han desarrollado diferentes charla y/o capacitaciones para el personal en obra (Ver anexo No. 12 Capacitaciones e Actas de Inducción).

7.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo del presente informe, esta interventoría realizó seguimiento al Protocolo de bioseguridad aprobado para la ejecución del contrato de obra. Para lo cual, se realizó seguimiento a los siguientes aspectos:

7.7.1 Implementación de medidas preventivas para el personal administrativo

El CONSORCIO JG 2020 ha implementado para la ejecución de los trabajos el protocolo de bioseguridad relacionados con la prevención de contagio por COVID-19. (Ver anexo No. 12 Capacitaciones e Actas de Inducción).

Por consiguiente, el contratista ha realizado en cada uno de los frentes de trabajo las capacitaciones de la implementación del protocolo de bioseguridad, relacionadas con las medidas preventivas establecidas, como es el adecuado uso de los elementos de protección personal y el lavado de manos. Igualmente, han implementado vía WhatsApp la divulgación de información sobre los cuidados que se deben tener frente a la pandemia por COVID-19.

7.7.2 Implementación de medidas preventivas para el personal en obra

Para la ejecución de las actividades en obra, todo el personal, previo a iniciar su contrato con el CONSORCIO JG 2020 debe participar de charla para socialización del protocolo de bioseguridad, en donde son socializadas las medidas y se compromete a cumplirlas (Ver anexo No. 12 Capacitaciones e Actas de Inducción) Así mismo, el CONSORCIO JG 2020 a la entrada de cada sede realiza la toma diaria de temperatura y consulta de sintomatología (Ver Anexo 13. Formato de verificación Síntomas COVID-19 y toma temperatura).

7.7.3 Responsable del protocolo de bioseguridad

El responsable del protocolo de bioseguridad en cada uno de los centros donde se están ejecutando actividades por parte del CONSORCIO JG 2020, está a cargo del ingeniero residente de la regional y/o del profesional de seguridad y salud en el trabajo dispuesto, quien es el encargado de implementar y realizar el seguimiento de las medidas preventivas en obra, estos profesionales realizan las tomas de temperatura, diagnósticos de salud y entrega de elementos de protección personal diariamente.

7.7.4 Seguimiento a caso positivo por Covid-19

Actualmente no se han reportado casos positivos por COVID-19 en obra.

8 RECOMENDACIONES

La interventoría recomendó mediante oficio solicita realizar adición en tiempo al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552507 de 2020 teniendo en cuenta que el plazo para el desarrollo de las actividades de obra no es suficiente y que el proyecto se ve directamente afectado por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, las restricciones municipales en materia de ingreso de personal, tiempos para el suministro de insumos, al igual que los hechos expuestos en el numeral de inconvenientes y de advertencia anticipada.

Por otra parte, se recomienda a la entidad aclarar mediante comunicado interno cadena de mando y roles de cada uno de los actores que participa en el proyecto, así como, exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, se recomienda identificar plenamente a quién debe ser remitida la información con el fin de evitar retrasos y demoras en la ejecución del proyecto. Lo anterior, debido a que cada departamento cuenta con un director regional y cada sede con un director de sede, los cuales, en muchos casos cuentan con subsedes y administradores de las mismas. Sumado a esto, es necesario interactuar con el delegado de infraestructura de las regionales, personal de mantenimiento y los profesionales en seguridad y salud de cada centro, por lo que en muchas ocasiones se presenta perdida de la información y retrasos en el inicio de las obras al no tener identificados los actores que participan de acuerdo con la particularidad de cada centro.

9 CONCLUSIONES

La firma 2C INGENIEROS S.A. a la fecha ha dado cumplimiento a cada una de las actividades descritas en el contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.1635455 de 2020, realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental al contrato de obra objeto No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020. Así mismo, ha dado cumplimiento con las condiciones propuestas (personal e insumos) para la ejecución del contrato anteriormente mencionado.

El CONSORCIO JG 2020 a la fecha de corte del presente informe presenta un avance acumulado de ejecución del contrato de obra No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020 correspondiente al **71,19%**, contra un programado acumulado del **92,47 %** . De acuerdo con la reprogramación No. 3 aprobada, por consiguiente, el contrato presenta un atraso del **-21,28 %**.

Que el avance de ejecución contrato de obra No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020 para el presente corte corresponde al **24,49%** equivalente a la suma de **$911.120.908,16**, valor aprobado para el corte No. 4

El contratista de obra cumple con los requerimientos en materia de seguridad, salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad, así como los requisitos relacionados con la protección del medio ambiente y la gestión de residuos.

El contratista de obra cumple con lo relacionado con afiliaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales y con el sistema de seguridad industrial implementado en obra, a lo cual, se hace seguimiento diario por parte de la Interventoría.

10 ANEXOS

Anexo 1. Actas de comité
Anexo 2. Bitácora de obra
Anexo 3. Control de personal de obra
Anexo 4. Control personal interventoría
Anexo 5. Control de aportes de seguridad social Obra
Anexo 6. Control de aportes de seguridad social Interventoría
Anexo 7. Control correspondencia enviada
Anexo 8. Control correspondencia recibida.
Anexo 9. Acta entrega de elementos de protección personal
Anexo 10. Soportes trabajo en alturas
Anexo 11. Actas de capacitación e inducción.
Anexo 12. Actas de verificación síntomas COVID-19 y toma temperatura

Anexo 1. Actas de comité

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

ACTA No. 18		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2020	**HORA INICIO:** 4:00 p.m.	**HORA FIN:** 6:00 p.m.
LUGAR:	VIRTUAL	

TEMA (S):
SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza la presentación de todos los asistentes.

El CONSORCIO JG 2020 inicia con la descripción de actividades en la regional Arauca, aquí manifiesta que ya se solicitó el ingreso del profesional eléctrico para la revisión de este componente y para establecer los tableros que requieren cambio.

El contratista de obra solicita un comité en campo con la ingeniera Lorena Pérez, interventoría y obra para definir los pendientes en esta regional. El contratista menciona que respecto a las solicitudes de incremento de cuadrillas se requiere que en esta regional se tenga totalmente definido todos los componentes.

La interventoría manifiesta que la regional Arauca requiere apoyo para definir los tableros que deben ser priorizados, por lo cual, solicita al contratista de obra, hacer un recorrido en conjunto con la interventoría y se haga la propuesta al director de la regional con el fin de facilitar la priorización de actividades. La interventoría solicita que la siguiente semana se realice visita para definir los pendientes. Frente a los problemas reportados en la regional por el mantenimiento de bombas, se solicita al contratista de obra que se realice propuesta frente a la solución definitiva en los fallos del equipo, ya que en el centro no existe personal capacitado para establecer que mantenimiento se requiere, todo en pro de evitar que el mantenimiento ya realizado se pierda y garantizar la calidad del servicio prestado.

En cuanto al mantenimiento de aires acondicionados, el contratista manifiesta que el día 17 de diciembre de 2020 el personal realizará los mantenimientos pendientes, sin embargo, el contratista solicita que todos los ambientes se encuentren abiertos, ya que esta es la segunda vez que se visita la regional y en la primera visita varios de los ambientes se encontraban cerrados, razón por la cual quedaron mantenimientos pendientes. Con el fin de evitar que suceda esto nuevamente, se requiere que todos los espacios se encuentren

abiertos. La interventoría solicita que se incluyan los aires de los RAC y requiere confirmar la fecha y el personal para solicitar el ingreso.

Por otra parte, la interventoría manifiesta que se han presentado problemas de comunicación entre el personal del Consorcio y el personal de centro educativo, por lo cual, solicita tomar las acciones necesarias para evitar que estas situaciones continúen ocurriendo y hacer énfasis con el personal en obra de la importancia del respeto con el personal de los centros educativos.

El supervisor manifiesta que ya hace bastante se viene insistiendo en la intervención de la Regional Arauca, ya que a pesar que el CONSORCIO JG 2020 tenga un avance importante en el total de la obra, se deben atender las regionales de manera simultanea. También hace énfasis que no se puede esperar hasta que las cuadrillas finalicen trabajos en otras regionales y se desplacen, si no que deben hacerse trabajos en simultáneo.

El contratista manifiesta que durante el transcurso del mes se ampliarán el numero de las cuadrillas. El supervisor insiste que no deben realizarse los mantenimientos cuando otro personal se desocupe, sino que deben atenderse al mismo tiempo. El supervisor manifiesta que solo hay 4 personas contratadas a la fecha en la regional Arauca y se solicita incrementar de manera inmediata.

En cuanto al tema de facturación , el supervisor manifiesta que el contrato de obra va a tener un flujo importante de dinero, por lo cual, requiere que se implementen plan de contingencia ya que el recurso financiero no será un inconveniente. El supervisor manifiesta que si en dos semanas a partir de la fecha no se observan cambios, serán implementadas otras acciones para solicitar el cumplimiento.

En cuanto a la Regional Casanare, el contratista de obra manifiesta que se debe realizar la revisión del presupuesto.

En cuanto a Norte de Santander, el contratista manifiesta que durante el martes o miércoles (16 y 17 de diciembre) estará llegando el suministro de la teja tipo sandwich, para esa instalación entrarán 7 personas. En esta regional, también se requiere definir el presupuesto final. Adicionalmente, se menciona que el centro educativo de Pamplona se está dando inicio a los trabajos de relación de cubiertas.

El supervisor realiza aclaración y solicita que no se vayan a exceder los valores asignados para cada regiona,l ya que este contrato no tendrá adiciones y los trabajos realizados fuera de los presupuestos asignados no podrán ser reconocidos.

En cuanto al Regional Santander, el supervisor solicita se realice una presentación frente a los presupuestos de Vélez, Socorro y San Gil para conocer como serán invertidos los recursos pendientes por priorizar de acuerdo con las visitas realizadas.

El contratista de obra realiza resumen de las actividades que se están desarrollando en la regional Santander en cada uno de los centros intervenidos.

Respecto a la fecha de entrega de Boyacá , la interventoría solicita se confirme si es posible realizar la entrega la tercera semana de diciembre. El contratista de obra menciona que en cuanto a las actividades gruesas, es posible realizar la entrega dentro de las fechas establecidas, sin embargo, menciona que las actividades relacionadas con los sensores de los lavamanos aun se encuentran pendientes, lo anterior debido a que se requiere un

repuesto especifico para finalizar esta actividad. Por lo cual, estará pendiente esta entrega por algunos días más.

La interventoría solicita la entrega parcial de las actividades con el fin de evitar que se realicen reclamos por posibles daños en las actividades ejecutadas. La interventoría recomienda priorizar el mantenimiento de las baterías sanitarias, equipos para el suministro de agua en los centros intervenidos y en los nuevos centros a intervenir. Adicionalmente, solicita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y trabajar en la consolidación del acta parcial para ser radicada la ultima semana de diciembre.

El supervisor da cierre a la reunión insistiendo en el cierre de las actividades y entrega de centros. Y reitera la necesidad de no bajar el ritmo de trabajo en diciembre y enero y de incrementar el personal.

El contratista de obra menciona que es su compromiso incrementar el número de personal.

Fin de la reunión.

Link de la reunión:
https://www.dropbox.com/s/53tjcnyzfhz071f/1.%20Comite%2011Dic20.mov?dl=0

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Informe con foto respecto a los tableros priorizados.	CONSORCIO JG 2020	30 de diciembre de 2020
2. Realizar los mantenimientos pendientes de los aires acondicionados.	CONSORCIO JG 2020	17 de diciembre de diciembre de 2020.
3. Incremento de cuadrillas en la regional Arauca y Casanare	CONSORCIO JG 2020	30 de diciembre de 2020

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. 18 DEL DÍA 11DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	JOSÉ ANDRÉS BUSTOS HERRERA				SUPERVISIÓN SENA	jabustosh@sena.edu.co	3043926462	
2	MARÍA SOFÍA TRUJILLO	1.020.752.622			PROFESIONAL DE APOYO INTERVENTORÍA	Senalote2@2cingenieros.com.co	3138086081	Maria Sofia Trujillo
3	ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO	1.099.204.149 de Barbosa Santander			CONSORCIO JG 2020	consorciojg2020@gmail.com	3133726275	

Anexo 2. Bitácora de obra

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

30/10/2020 CLIMA NUBLADO PERSONAL OBRA RESIDENTE DE OBRA
EQUIPOS EQUIPO DE SOLDADURA MAESTRO GENERAL.
COMPRESORES OFICIALES 6.
HERRAMIENTA MENOR AYUDANTES 4
PERSONAL DE INTERVENTORIA OSCAR IVAN CÁRDENAS BARÓN
7AM INICIO DE ACTIVIDADES SE CONTINUA CON INSTALACION DE ENCHAPE EN SEDE CEGAFE TUNJA; SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO EN SEDE CEDAGRO DULTAMA BOYACA; CONTINUACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO EN SEDE CEGAFE MONIQUIRA; CONTINUACION DE ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA EN SEDE REGIONAL.
5PM. FINAL DE ACTIVIDADES
Luis Ramos
CONSORCIO JG 2020 2C INGENIEROS S.A.

31/10/2020 CLIMA NUBLADO PERSONAL DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
EQUIPOS - EQUIPO SOLDADURA MAESTRO GENERAL
- COMPRESORES OFICIALES
- HERRAMIENTA MENOR AYUDANTES
PERSONA DE INTERVENTORIA OSCAR IVAN CARDENAS BARON
7 AM INICIO DE ACTIVIDADES, SE CONTINUA LA INSTALACION DE ENCHAPE EN LA SEDE CEGAFE TUNJA; SE CONTINUA CON MANTENIMIENTO EN SEDE CEDAGRO DULTAMA BOYACA; CONTINUACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y CUBIERTA MONIQUIRA; CONTINUACION DE ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA DE SEDE REGIONAL
12 PM Final de actividades
Luis Ramos
CONSORCIO JG 2020 2C INGENIEROS S.A

1/11/2020 CLIMA SOLEADO PERSONAL DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
EQUIPOS. DE SOLDADURA MAESTRO GENERAL
- COMPRESORES OFICIALES
- HERRAMIENTA MENOR AYUDANTES
PERSONA DE INTERVENTORIA OSCAR IVAN CARDENAS BARON
7 AM INICIO DE ACTIVIDADES, SE INICIA ACTIVIDAD DE PINTURA DE MUROS EN CEGAFE TUNJA; SE CONTINUA ACTIVIDAD DE ENCERRAMIENTO

En sede cedagro quitarsi se continua actividad de actividades en sede monquira; se continua actividad de demonte de cubierta, en sede regional Boyaca.

5 Pm — Final de actividades.
Luis Campo
CONSORCIO IG 2020
2C INGENIERIA S.A

3/11/2020 — Clima lluvioso, personal de obra; Residente de obra
Equipos - Equipo soldadura — Maestro General
- Compresores — Oficiales
- Herramienta menor — Ayudantes
Personal de interventoria Oscar Ivan Cardenas

7 Am — Clima lluvioso, Hr inicio de actividades, se evidencia afectacion de ciclo nodo en sede nal, se realiza reunion en regional Boyaca por afectacion de lluvias, se presenta en la reunion; interventoria, contratista, supervision de contrato; se continua actividad de pinturas de muros en sede cedagro tunja; se inicia actividad de reparacion de canales y mantenimiento de estructura de cubierta. en sede regional Sogamoso, se continua actividad de mantenimiento de encerramiento en sede cedagro quitarsi.

5 Pm — Final de actividad diaria.
Luis Campo
CONSORCIO IG 2020
2C INGENIERIA S.A

4/11/2020 — Clima lluvioso, personal de obra, residente de obra
Equipos: - Equipo soldadura — maestro General
- Compresores — oficiales
- Herramienta menor — Ayudantes
Personal de interventoria Oscar Ivan Cardenas Daniel

7 Am — Inicio de actividades; continuacion de pintura de muros en sede cedagro tunja, se continua labores de mantenimiento de encerramiento en sede cedagro quitarsi; se continua labores de reparacion de canales y mantenimiento de estructura de la cubierta en sede Regional Boyaca.

5 Pm — Final de actividades

Consorcio JG 2020

2C INGENIEROS S.A

5/11/2020 Clima nublado, personal de obra: Residente de obra
EQUIPO - EQUIPO soldadura, Maestro General
- Compresores Oficiales
- Herramienta menor Ayudantes

Persona de interventoria: OSCAR IVAN CARDENAS BARON

7 am Visita tecnica a las SEDES de Bolaños, regional pojanda, centro minero, clima quitama, agropecuario quitama. por parte de la interventoria, supervision de contrato y contratista. Inicio de actividades, continuacion de labores de ~~pintura~~ en tunja, se continua labores de reparacion de muros en sede agro quitama, se continua labores de reparacion de estructura y cambio de estructura en regional bolaños.

5 pm Final de actividades.

Consorcio JG 2020

2C INGENIEROS S.A

6/11/2020 Clima nublado personal de obra: residente de obra
EQUIPO equipo soldadura Maestro General
Planta electrica Oficiales
Herramienta menor Ayudantes

Personal de interventoria: OSCAR IVAN CARDENAS BARON

7 am Se realiza una visita tecnica por la interventoria contratista, y supervision de contrato A las sedes de sede monquira, sede chiquinquira, sede regional tunja se continuan labores de pintura en regional tunja, se continua labores de mantenimiento de enchapamiento en sede agropecuaria quitama, se continua labores de mantenimiento de canales de aguas lluvias, y mantenimiento de estructura metalica de la cubierta, en la sede regional Bolaños.

5 pm Final de actividades

Consorcio JG 2020

2C INGENIEROS S.A

7/11/2020	Clima soleado, personal de obra;	Residente de obra
	Equipos Equipo de soldadura	Maestro General
	Planta eléctrica	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
	Persona de interventoria; Oscar Ivan Cardenas Baron	
7 A.M	se continuan labores en la sede CEGAFE TUNJA, en	
	Pintura de muros, se continuan labores de mantenimiento	
	de encerramiento de malla en la sede Agrosequro Duitama,	
	se continua actividades de mantenimiento de canales y	
	mantenimiento de estructura metalica en regional Boyaca.	
5 P.M	Final de actividades.	
	Jairo Zuluaga	
	CONSORCIO JG 2020	2C INGENIEROS S.A
9/11/2020	Clima nublado, personal de obra;	Residente de obra
	Equipos: Equipo soldadura	Maestro General
	Planta electrica	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
	Persona de interventoria; Oscar Ivan Cardenas Baron	
7 A.M	Inicio de actividades; continuacion de pinturas de muros en	
	sede CEGAFE TUNJA, se continua labores d mantenimiento de	
	malla en sede Agrosequro Duitama., se continua actividades	
	mantenimiento d canales y de mantenimiento d estructura metalica	
	en la sede Regional Boyaca.	
5 P.M	Final d actividades	
	Jairo Zuluaga	
	CONSORCIO JG 2020	2C INGENIEROS S.A
11/11/2020	Clima nublado personal de obra;	Residente de obra
	Equipos Equipo soldadura	Maestro General
	Compresores	Oficiales
	Planta electrica	Ayudantes
	Persona de interventoria; Oscar Ivan Cardenas Baron	
7 AM	Inicio de actividades; Ingresa tesa master mil	
	en la sede Regional Boyaca y se da inicio a la instalacion	
	de la cubierta; se inicia actividad de impermeabilizacion	
	muro existente en la sede Regional Boyaca, se continua	

	Actividad de pintura de muros en sede CEGAFE TUNJA, se continua con el mantenimiento de malla en sede AGROPECUARIA QUITAMA.
5 PM	Final de actividades. Luis Domingo CONSORCIO JG 2020 — 2C INGENIEROS S.A
11/11/2020	clima nublado; Personal de obra; Residente de obra EQUIPOS: Equipo soldador. Maestro General Herramienta menor Oficiales Planta electrica Ayudantes Persona de interventoria; Oscar Ivan Cardenas Baron
7. A.M	Inicio de actividades, se continua labores de pintura de muros en sede CEGAFE TUNJA, se continua labores de mantenimiento de malla en sede AGROPECUARIA QUITAMA, se continua labores de cubiertas en sede regional BOYACA y impermeabilizaciones de bizcocho.
5. P.M	Final de actividades Luis Domingo CONSORCIO JG 2020 — 2C INGENIEROS S.A
12/11/2020	clima nublado, Personal de obra; Residente de obra EQUIPOS: Equipo soldador. Maestro General Herramienta menor Oficiales Planta electrica Ayudantes
7 A.M	Inicio de actividades, se continua labores de pintura de muros en la sede CEGAFE TUNJA, se continua actividades de mantenimiento de malla en sede AGROPECUARIO QUITAMA, se continua con labores de cubierta + impermeabilizaciones en la sede regional BOYACA.
5. P.M	Final de actividades Luis Domingo CONSORCIO JG 2020 — 2C INGENIEROS S.A
13/11/2020	Clima nublado, personal de obra; Residente de obra EQUIPOS: Equipo de soldador. Maestro General Herramienta menor Oficiales Planta electrica Ayudantes

7 AM	Se continuan actividades de pintura de muros en cabecera tunel, se continuan labores de mantenimiento a mallas en sedimentadores, se continuan labores de instalacion de cubierta reparacion de canales y estructura, y impermeabilizacion de box culvert existentes en margen izquierda segmento 1 se actividades
5 PM	Fin actividades Luis Dominguez CONSORCIO JG 2020 ZC INGENIEROS S.A
14-11-2020	clima soleado, personal de obra: residente de obra EQUIPOS: Equipo soldadura maestro General Planta electrica General Herramienta menor Ayudante
7 AM	Se continuan labores de pintura de muros en cabecera tunel reparacion de muros de concreto en la zona cabecera aitara se continuan labores de instalacion de cubierta a tuna master 1000 reparacion de canales, mantenimiento de estructura, y impermeabilizacion de box culvert existentes en margen izquierda segmento
5 PM	Fin actividades diarias Luis Dominguez CONSORCIO JG 2020 ZC INGENIEROS SA
16-11-2020	se continuan labores clima nublado, personal de obra EQUIPOS: Equipo soldadura Residente de obra Herramienta menor maestro General Eq compactadores General Planta electrica Ayudante
7 AM	Se continuan actividades de instalacion de TG1a master 1000, reparacion de canales, mantenimiento a estructura en margen izquierda segmento 1, se inicia actividad de pintura a muros en aitara abancay, y se continuan labores de mantenimiento de encauzamiento, se continua labores de instalacion de tuna reparacion de canales, mantenimiento a estructura.
5. PM	Final de actividades. Luis Dominguez Consorcio JG 2020 ZC INGENIEROS S.A

17-11-2020	Clima nublado, Personal de obra;	Residente de obra
	Equipos; Herramienta menor	Maestro General
	6 Equipos de soldadura	Oficial
	Pulidora	Ayudante.
7 AM	Se continuan labores de pintura de muros en sus diferentes ejes, se continua labores de instalacion de tuberia contra incendio, se continua labores de instalacion de tuberia nueva mil, instalacion de muro estructural, reparacion de canales y mantenimiento de estructura.	
5 PM	Fin de actividades diarias	
	Luis Dominguez	
	Consorcio JG 2020	ZC Ingenieros S.A
18-11-2020	Clima nublado, Personal de obra;	Residente de obra
	Equipos Soldadora	Maestro General
	Pulidora	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
7 AM	Inicio de actividades, continuacion de pintura de muros en diferentes ejes, continuacion de mantenimiento de estructura de cubierta, instalacion de tuberia y reparacion de canales se continuan labores de instalacion de muro estructural en Regional Segovia.	
5 PM	Final de actividades diarias.	
	Luis Dominguez	
	Consorcio JG 2020	ZC Ingenieros S.A
19-11-2020	Clima nublado, Personal de obra;	Residente de obra
	Equipos Pulidora	Maestro General
	Soldador	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
7 AM	Inicio de actividades, continuacion de labores de mantenimiento de estructura, reparacion de canales, instalacion de tuberia nueva mil, instalacion de muro estructural en Regional Segovia, se continua pintura de muros en distintos ejes.	
5 PM	Finalizacion de actividades diarias	
	Luis Dominguez	
	Consorcio JG 2020	ZC Ingenieros S.A

20-11-2020	Ciima soldado, personal de obra	Residente de obra
	EQUIPOS EQ soldadura	Maestro General
	taladro	Oficiales
	pulidora	Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, continuación de labor de mantenimiento de estructura metalica, reparacion de canales, instalacion de teja master mil, instalacion de malla electrosoldada en cubierta, soldadura de platina de muros en obra exterior	
5 pm	Final de actividades ciima Luis Amaya Consorcio JG 2020	ZC INGENIEROS S.A
21-11-2020	Ciima soldado, personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPOS EQ soldadura	Maestro General
	Taladro, pulidora	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
7 Am	Inicio de actividades, continuacion de pintura de muros en sede obra exterior, continuacion de labores en cubierta soldadura de instalacion de malla electrosoldada, mantenimiento de estructura metalica de cubierta, instalacion de teja master mill.	
5 pm	Final actividades: Luis amaya Consorcio JG 2020	ZC INGENIEROS SA
23-11-2020	Inicio de actividades, Ciima soldado, personal de obra;	
	EQUIPOS EQ soldadura	Residente de obra
	Planta electrica	Maestro General
	Herramienta menor	Oficiales
	Pulidora taladro	Ayudantes
7 Am	Inicio de actividades, continuación de mantenimiento de estructura metalica, reparación de canales, instalacion de teja master mil, se inicia actividad de pintura de muros en el centro minero, desmonte y instalación de cielo raso PVC en el centro minero	
Pm	Final de actividades Luis Amaya Consorcio JG 2020	ZC INGENIEROS S.A

24-11-2020	Clima Soleado, Personal de obra;	Residente de obra
	Equipos: Eq. Soldadura	maestro General
	Herramienta menor	Oficiales
	Pulidora, taladro	Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, continuación de mantenimiento de estructura metalica Reparacion de canales, instalacion de foto master mill, desmonte de foto en Regional Sogamoso, continuación de labores de pintura de muros instalacion de cielo razo PVC en centro minero Sogamoso.	
5 pm	Final de actividades	
	Luis	
	Consorcio TG 2020	ZC INGENIEROS S.A
25-11-2020	Clima Soleado, Personal de obra;	maestro General
	Equipos: Soldadura	Oficiales
	taladro, pulidora	Ayudantes
	Herramienta menor	Residente de Obra
7 am	Inicio de actividades, continuacion de mantenimiento de estructura Reparacion de canales, instalacion de foto master mill, continuación de desinstalacion de foto en el centro Regional Sogamoso. continuación de pintura de muros y instalacion de cielo razo PVC en el centro minero sogamoso.	
5 pm	Final actividades	
	Luis	
	Consorcio TG 2020	ZC INGENIEROS S.A
26-11-2020	Clima Soleado; personal de obra;	Residente de obra
	Equipos Eq. Soldadura	maestro General
	taladros, pulidoras	Oficiales
	Herramienta menor.	Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, se inicia poda de arboles en sede obra Duitama, continuacion de labores de mantenimiento, Reparacion de estructura y canales, instalacion de foto master mill en Regional Sogamoso, se inicia labor de pintura de muros en el centro Regional Sogamoso, se continua labores de instalacion de cielo razo PVC en el centro minero	
	Luis	
	Consorcio TG 2020	ZC INGENIEROS S.A

23-11-2020	Cima Soldado, Personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPO: Soldadora	Maestro General
	taladro, pulidora	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, continuacion poda de arboles en sede obra Quitaro, Continuacion de labores de pintura de muros y cubierta en Regional Sogamoso. se continua labores de instalación de pvc en el centro minero.	
5 pm	Final de actividades	
	Luis Quiroga	
	Consorcio JG 2020	ZC INGENIERIA S.A
24-11-2020	Cima Soldado, Personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPO: taladros	Maestro General
	pulidoras	Oficiales
	Herramienta menor	Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, continuacion de labores; poda de arboles en AGROPECUARIO Quitaro, continuacion de labores de mantenimiento de estructura metalica, reparacion de canales de aguas lluvias, instalacion de toja master mill, pintura de muros en Regional Sogamoso.	
5 pm	Final actividades	
	Luis Quiroga	
	Consorcio JG 2020	ZC INGENIERIA SA
30-11-2020	Cima Soldado, Personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPO: EQ. soldadura	Maestro General
	taladro, pulidora	Oficiales
	Herramienta menor.	Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, se inicia labor de instalacion de cielo raso PVC en la sede chiquinquira, se continua labores de pintura de muros, mantenimiento de estructura metalica reparacion de canales, instalacion de toja master mill, se continuan labor de poda de arboles en sede AGRO Quitaro.	
5 pm	Final de actividades	
	Luis Quiroga	
	Consorcio JG 2020	ZC INGENIERIA S.A

12-2020	Clima soleado, personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPOS: Soldadura	maestro general
	taladro, pulidora	Oficiales
	Herramienta menor.	ayudantes
7 am	inicio de actividades: se inicia actividad de lavado de tanques en la sede cima suitama, se continua labores de poda de arboles en la sede agropecuaria suitama, se continua labores de pintura de muros, mantenimiento de estructura instalación de tesa master mill en la sede regional boyaca	
5 pm	Final de actividades	
	Luis Ocampo	
	Consorcio JG 2020	consorcio, 2C INGOMERO SA
12-2020	Clima soleado personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPOS Soldadura	maestro general
	pulidora	Oficiales
	Planta electrica	ayudantes
7 am	inicio de actividades se continua labor de lavado de tanques en la sede cegara, se continua actividades de poda de arboles en la sede agropecuaria suitama, se continua labores de pintura de muros, mantenimiento de estructura metalica, reparacion de canales, instalación de tesa master mil.	
5 pm	Final de actividades	
	Luis Ocampo Bacuna	
	CONSORCIO JG 2020	2C INGOMERO S.A
12-2020	Clima soleado, personal de obra;	Residente de obra
	EQUIPOS; Soldadura	maestro general
	Planta electrica	Oficiales
	Herramienta menor	ayudantes
am	inicio de actividades, se continua labor de lavado de tanques en la sede monguira, se continua labor de poda de arboles en la sede agropecuaria suitama, se continua actividad de cubiertas en la sede Regional Boyaca.	
5 pm	Final de actividades	
	Luis Ocampo	
	consorcio JG 2020	2C INGOMERO SA

4-12-2020	Clima Soleado, personal de obra; Residente de obra Equipos de Soldadura Maestro General Bomba Electrica Oficiales Herramienta menor Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, se continua lavado de tanques en la sede Regional Boyaca, se continua con la poda de arboles en la sede Regional Boyaca. Se realiza actividad de impermeabilizacion con manto asfaltico en las sedes Cegaro tunja, y Clima Sotaqua. se continua labores de la cubierta en Regional Sogamoso.
5 pm	Final de actividades Luis Dominguez Consorcio JG 2020 ZC Ingenieros S.A
5-12-2020	Clima Soleado, Personal de obra; Residente de obra Equipos Soldadura Maestro General Bomba inyectora Oficiales Herramienta menor. Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, se continua labor de lavado de tanques en el centro minero, se continua labor de impermeabilizacion con manto asfaltico en las sedes Cegaro tunja y Clima Sotaqua se continua labor de poda de arboles en Agropecuario Sotaqua. se continua labores de cubierta en la sede Regional Sogamoso
5 pm	Final de actividades. Luis Dominguez Consorcio JG 2020 ZC Ingeniero S.A
6-12-2020	Clima soleado personal de obra; Residente Equipos Pulidora Oficiales Herramienta menor Ayudantes
7 am	Inicio de actividades, se continua labores de impermeabilizacion con manto asfaltico en la sede Cegaro tunja, se continua labores de cubierta en la sede Regional Sogamoso
3 pm	Final de actividades Luis Dominguez Consorcio JG 2020 ZC Ingenieros S.A

2-2020	cima solcado personal de actividad; Residente de obra
	Equipos Soldadura Maestro General
	Pulidora taladro Oficiales
	Herramienta menor Ayudantes
AM	Inicio de actividades, se continua labor de lavado de tanques en la sede de Gastronomia tunza, se inicio labor de encharpes, morteros, demoliciones en la sede minero, se continua labor de cubierta en la sede Regional Sogamoso.
PM	Final de actividades
	Cima cumple
	Consorcio JG 2020 2C INGENIEROS SA
12-2020	cima solcado, Personal de obra; residente de obra
	EQUIPOS Soldadura Maestro General
	Planta electrica Oficiales
	Herramienta menor Ayudantes
AM	Inicio de actividades, se continua labores de lavado de tanques en la sede cima chicamocha, se continua labores de encharpe morteros y demoliciones en la sede minero, se continua labor de Poda de arboles, se continua labor de cubierta en la sede Regional Sogamoso.
PM	Final de actividades
	Cima cumple
	Consorcio JG 2020 2C INGENIEROS S.A

Fecha : Diciembre 4 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Continúa la demolición de enchape de pared y piso en el cuarto piso del edificio de la Regional Santander SENA.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 5 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Zafarreado de las superficies donde se demolió el enchape en el piso cuarto del edificio para dejarlo como alistado para la instalación del nuevo enchape.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 7 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Zafarreado de las superficies donde se demolió el enchape de pared en el cuarto del edificio para dejarlo como alistado para la instalación del nuevo enchape.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 9 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 profesional SST, 4 técnicos, 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de pared en el piso tercero del edificio, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de divisiones, en el sexto piso, pintura de reja de cerramiento y mantenimiento de aires acondicionados.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 10 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 profesional SST, 4 técnicos, 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso en el piso tercero del edificio, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de divisiones, en el quinto piso, pintura de reja de cerramiento y mantenimiento de aires acondicionados.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 11 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Zafarreado de las superficies donde se demolió el enchape de pared en el piso tercero del edificio, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de divisiones, en el cuarto piso y pintura de reja de cerramiento.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Diciembre 12 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Mortero de nivelación en la superficie donde se demolió el enchape en el piso cuarto del edificio, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de divisiones en el tercer piso y pintura de reja de cerramiento.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 14 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Mortero de nivelación en la superficie donde se demolió el enchape en el piso quinto del edificio y pintura de reja de cerramiento.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Diciembre 15 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Mortero de nivelación en la superficie donde se demolió el enchape en el piso tercero del edificio y pintura de reja de cerramiento, instalación de enchape de pared los baños del quinto piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 16 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Pintura de reja de cerramiento e instalación de enchape de pared los baños del quinto y cuarto piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 17 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Pintura de reja de cerramiento, desmonte de cieloraso e instalación de enchape de pared los baños del cuarto y tercer piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 18 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Revisión de goteras y escarificado de pintura en el sexto piso, desmonte de cieloraso e instalación de enchape de pared los baños del cuarto y tercer piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 19 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Revisión de goteras y escarificado de pintura en el sexto piso, desmonte de cieloraso e instalación de enchape de pared los baños del sexto piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 20 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Escarificado de pintura en el sexto piso, desmonte de cieloraso antiguo, instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de pared los baños del sexto y tercer piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 21 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Escarificado de pintura en el sexto piso, desmonte de cieloraso antiguo, instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de pared los baños del sexto piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 22 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Pintura en el Hall del sexto piso, instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de piso en los baños del cuarto piso, adecuación de instalaciones hidráulicas para baños en el cuarto piso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

contratista

Fecha : Diciembre 23 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Pintura en el Hall del sexto piso, instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de piso en los baños y adecuación de instalaciones hidráulicas para baños en el cuarto piso.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 24 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de piso en los baños y adecuación de instalaciones hidráulicas para baños en el tercer piso.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 27 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de piso en los baños y adecuación de instalaciones hidráulicas para baños en el tercer piso.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Diciembre 28 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de piso en los baños y adecuación de instalaciones hidráulicas para baños en el quinto piso.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Diciembre 29 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales y 3 ayudantes.
Actividades : Instalación de cieloraso en pvc e instalación de enchape de piso en los baños y adecuación de instalaciones hidráulicas para baños en el quinto piso, demolición de enchape de pared del segundo piso.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Diciembre 30 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Diciembre 31 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 4 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.

Giovanni L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, instalación de cieloraso en pvc, demolición de mortero de placa, pañete impermeabilizado, impermeabilización de cubierta y aplicación de aluminio bituminoso.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 5 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, instalación de cieloraso en pvc, demolición de mortero de placa, pañete impermeabilizado, impermeabilización de cubierta y aplicación de aluminio bituminoso.

Giovanni Acosta.
Interventoria.

Contratista

Fecha : Enero 6 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 7 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa.

Giovanni L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 8 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa.

Giovanni L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 9 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa.

Giovanni L:
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 12 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura.

Giovanni L:
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 13 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura.

Giovanni J. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 14 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura.

Giovanni J. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 15 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura.

Giovanni J. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 16 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos,

Giovanni J. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 18 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 19 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 20 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones

Giovanni Acosta
Interventoría.

y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 21 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 22 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 23 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.

Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 25 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 5 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 26 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 4 oficiales, 2 técnicos y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchapes de pisos y pared en los baños, demolición de pañetes, escarificación de pañetes, reubicación de puntos hidráulicos, resanes generales, afinado de mortero impermeabilizado, instalación de enchapes de piso y pared, instalación de cenefa, filos, dilataciones y pintura, inmunización de madera de pérgolas, aplicación de esmalte inmunizante e instalación de mesones en los baños y demarcación de tubería EMT.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 3 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : instalación de cieloraso en pvc en la oficina de instructores, desmonte de cieloraso existente en el pasillo del auditorio, montaje de la estructura e instalación del nuevo cieloraso en pvc.

Giovanni C.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Diciembre 4 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : instalación de cieloraso en pvc en el pasillo del auditorio, pintura de muros interiores en la oficina de dirección.

Giovanni C.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 5 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Pintura de muros interiores, en las oficinas de subdirección y financiera.

Giovanni C.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 7 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni C.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 9 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de luces y paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 10 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 11 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Diciembre 12 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 14 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Solano

Fecha : Diciembre 15 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Ariolfo Toro

Fecha : Diciembre 16 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Ariolfo Toro

Fecha : Diciembre 17 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Ariolfo Toro

Fecha : Diciembre 18 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 19 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría

Fecha : Diciembre 21 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Diciembre 22 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni A. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 23 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni Acosta.
Giovanny f: L:
Interventoría.

Fecha : Diciembre 24 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta.
Interventoría

Fecha : Diciembre 26 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Diciembre 28 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Diciembre 29 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones de paneles led, pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Enero 12 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalación eléctrica para paneles led, pintura de muros interiores en la edificación y desmonte de motobombas para efectuarles mantenimiento.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 13 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Enero 14 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny f: L:
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 15 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 16 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Anotho Toro

Fecha : Enero 18 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 19 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco, instalación de balas de incrustar y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Enero 20 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, montaje de motobombas, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 21 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 22 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 23 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 3 ayudantes.
Actividades : Desmonte de cieloraso existente, instalación de cieloraso en pvc, instalaciones eléctricas para paneles led, instalación paneles led con su respectivo marco y pintura de muros interiores en la edificación.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha: Diciembre 18 de 2020.
Clima: Día Soleado.
Herramientas: Herramienta menor.
Personal: 1 Oficial y 2 Ayudantes.
Actividad: Instalación de paneles led con su respectivos marcos y corrección de banda antideslizante en zona exterior expuesta al sol y el agua.

Giovanni A. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

Jaime Galan.
Contratista.

FECHA: NOVIEMBRE 24 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 1 AYUDANTE.
ACTIVIDAD: APLICACIÓN ALUMINIO BITUMINOSO A/C MANTO ASFÁLTICO.

Arq. Omar Cala

Gloval Ltda: L: Hoyo Cala
Giovanni Acosta C. Ingeniero
Interventoría.

FECHA: DICIEMBRE 2 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE CIELORASO EN EL PASILLO DEL ÁREA DE BIENESTAR.

Gloval Ltda: L:
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

FECHA: DICIEMBRE 3 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN CIELORASO EN EL PASILLO E INTERIOR DEL ÁREA DE BIENESTAR.

Jaime Galan.

Gloval Ltda: L:
Giovanni Acosta C
Interventoría.

FECHA: DICIEMBRE 4 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN CIELORASO EN EL INTERIOR DEL ÁREA DE BIENESTAR.

CC. 74.185.749.

Gloval Ltda: L:
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

FECHA: DICIEMBRE 5 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES
ACTIVIDAD: INSTALACION CIELORASO PVC EN EL INTERIOR

DEL AREA DE BIENESTAR.

Giovanni A. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

71.185747

FECHA: DICIEMBRE 7 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE ORINALES E INSTALACIÓN DE CIELORASO PVC EN EL INTERIOR DEL AREA DE BIENESTAR.

Giovanni A. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

Contratista.

FECHA: DICIEMBRE 23 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: REVISIÓN CABLEADO ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE PANELES LED EN EL ÁREA DE BIENESTAR.

Giovanni A. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

Contratista.

FECHA: DICIEMBRE 24 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOE.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN CABLEADO Y APERTURA DE CIELORASO PARA LUMPARAS LED.

Giovanni A. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

71.185747.

FECHA: DICIEMBRE 26 DE 2020.
CLIMA: DIA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: APERTURA CIELO RASO PARA MARCOS.

Giovanni A. C.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Primavera

FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2020.
CLIMA: DIA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: APERTURA CIELORASO PVC, PARA COLOCACIÓN DE MARCOS Y PANELES LED.

Giovanni J. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

Jaime Galan.

FECHA: DICIEMBRE 29 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 2 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE MARCOS Y PANELES LED EN EL ÁREA DE BIENESTAR.

Giovanni J. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

Contratista.

FECHA: DICIEMBRE 30 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 3 AYUDANTES.
ACTIVIDADES: DETALLAJE CIELORASO EN PVC DEL ÁREA DE BIENESTAR E INSTALACIÓN DE ORINALES.

Giovanni J. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

Contratista.


FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2020.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 3 AYUDANTES.
ACTIVIDADES: DETALLE CIELORASO PVC E INSTALACIÓN ORINALES.

Giovanni J. C.
Giovanni Acosta C.
Interventoría.

FECHA: ENERO 4 DE 2021.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.


PERSONAL: 3 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: COLOCACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LA CUBIERTA DEL ÁREA DE BIENESTAR.

Giovanni A. C:
Giovanni Acosta C.
Interventoría.


Jaime Galan.


FECHA: ENERO 5 DE 2021.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 3 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: COLOCACIÓN FLANCHES METALICOS EN LA CUBIERTA DE BIENESTAR.

Giovanni A. C:
Giovanni Acosta C.
Interventoría.


Jaime Galan.


FECHA: ENERO 6 DE 2.021.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 3 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: COLOCACION FLANCHE METÁLICO DE LA CUBIERTA DE BIENESTAR, COLOCACIÓN DE TAPA EN SUPERBOARD EN ORILLA EXTERIOR DE LA CUBIERTA.

Giovanni A. C:
Giovanni Acosta C.
Interventoría.


Contratista.

FECHA: ENERO 7 DE 2.021.
CLIMA: DÍA SOLEADO.
HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL: 3 AYUDANTES.
ACTIVIDAD: TERMINACION CIELORASO PYC, INSTALACIÓN COMPLETA DE MARCOS Y LUCES.

Giovanni A. C:
Giovanni Acosta C.
Interventoría.


Jaime Galan

Primavera

BITÁCORA DE ACTIVIDADES.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO.1.PCCNTR.1552507.

"MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".

SEDE: CENTRO AGROTURÍSTICO.

CENTRO: CALLE 16 No. 14-28 SOCORRO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO.1.PCCNTR.1635455.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL".

CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020.

INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.

SUPERVISIÓN:

WILSOM JAVIER ROJAS MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL SENA

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS
PROFESIONAL GRUPO CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha : Diciembre 14 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Inducción por parte del personal del SENA con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, al igual, que a los cuidados que se deben tener en cuenta para evitar la contaminación y propagación del Covid.

Giovanni F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría

Fecha : Diciembre 15 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Demolición del piso en el primer piso de la edificación.

Giovanni F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Diciembre 16 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Demolición de piso y guardaescobas del primer piso de la edificación.

Giovanni F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría

Fecha : Diciembre 17 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Demolición de piso y guardaescobas del primer piso y cubierta de la edificación.

Giovanni F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Diciembre 18 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Demolición de piso y pañete sobre muros de la cubierta de la edificación.

Giovanni Acosta.
Giovanni L.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 19 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Mortero de nivelación de piso y pañete sobre muros de la cubierta de la edificación.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Diciembre 21 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Mortero de nivelación de piso y pañete sobre muros de la cubierta de la edificación.

Giovanni L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Diciembre 22 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Pañete sobre muros de la cubierta de la edificación y desmonte de cieloraso existente.

Giovanni L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Diciembre 23 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Pañete sobre muros de la cubierta de la edificación, desmonte de cieloraso existente e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta
Interventoría

Contratista.

Fecha : Diciembre 24 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Pañete sobre muros de la cubierta de la edificación, desmonte de cieloraso existente e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Contratista

Fecha : Diciembre 28 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescoba, instalación de tableta de gres, estuco acrílico, mortero de nivelación e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta.
Interventoría

Jaime Galan.

Fecha : Diciembre 29 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescoba, estuco acrílico, instalación de tableta de gres, mortero de nivelación e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Contratista

Fecha : Diciembre 30 de 2.020.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de pañetes, instalación de tableta de gres, mortero de nivelación e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

Fecha : Enero 4 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de pañetes, instalación de tableta de gres, mortero de nivelación e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta.
Interventoría

Contratista.

Fecha : Enero 5 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de pañetes, instalación de tableta de gres, mortero de nivelación e instalación de cieloraso en pvc.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.


Fecha : Enero 6 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

contratista.


Fecha : Enero 7 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.




Fecha : Enero 8 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.




Fecha : Enero 9 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.




Fecha : Enero 12 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.



Fecha : Enero 13 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.



Fecha : Enero 14 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanni C.
Giovanni Acosta.
Interventoría

Jaime Galan.

Fecha : Enero 15 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanni C.
Giovanni Acosta.
Interventoría

Contratista.

Fecha : Enero 16 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanni C.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 18 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanni C.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 19 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso e instalación de tableta de gres.

Giovanni C.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 20 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescobas, prueba de estanqueidad de tanques superficiales y medición de resistencia de la puesta a tierra.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 21 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescobas, prueba de estanqueidad de tanques superficiales y medición de resistencia de la puesta a tierra.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 22 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Pañete impermeabilizado, afinado de piso, instalación de tableta de gres y enchape cerámico, estuco acrílico.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Fecha : Enero 23 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescobas, pañete impermeabilizado, afinado de piso, instalación de tableta de gres y enchape cerámico, estuco acrílico, pintura acrílica.

Giovanny F. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 25 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescobas, pañete impermeabilizado, afinado de piso, instalación de tableta de gres y enchape cerámico, estuco acrílico, pintura acrílica.

Giovanni J. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Solan.

Fecha : Enero 26 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 1 oficial y 3 ayudantes.
Actividades : Demolición de enchape de piso, demolición de guardaescobas, pañete impermeabilizado, afinado de piso, instalación de tableta de gres y enchape cerámico, estuco acrílico, pintura acrílica.

Giovanni J. L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista

BITÁCORA DE ACTIVIDADES.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO.1.PCCNTR.1552507.

"MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".

SEDE: CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES.

CENTRO: KR 11 # 13-13 MÁLAGA.
CENTRO: PREDIO VENTAQUEMADA- VEREDA CALICHAL - MÁLAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO.1.PCCNTR.1635455.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL".

CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020.

INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.

SUPERVISIÓN:

WILSOM JAVIER ROJAS MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL SENA

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS
PROFESIONAL GRUPO CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha : Enero 13 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes y desmonte de cubierta.
KR 11 # 13-13
Actividades : Demolición de enchapes de piso, demolición de piso en concreto y
La Granja verificación circuitos eléctricos.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 14 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes y desmonte de cubierta.
KR 11 # 13-13
Actividades : Demolición de enchapes de piso, demolición de piso en concreto y
La Granja verificación circuitos eléctricos.

Giovanni Acosta
Interventoría

Jaime Galan

Fecha : Enero 15 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes y desmonte de cubierta.
KR 11 # 13-13
Actividades : Demolición de enchapes de piso, demolición de piso en concreto y
La Granja verificación circuitos eléctricos.

Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 16 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes y desmonte de cubierta.
KR 11 # 13-13
Actividades : Demolición de enchapes de piso, demolición de piso en concreto y
La Granja verificación circuitos eléctricos.

Giovanni Acosta.
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 18 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes, demolición de pañetes, reparación de canal
KR 11 # 13-13 de aguas lluvias e instalación de cubierta en teja master mil.
Actividades : Demolición de enchapes de piso, demolición de piso en concreto y
La Granja organización circuitos eléctricos.

Giovanni A.L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan

Fecha : Enero 19 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes, demolición de pañetes, reparación de canal
KR 11 # 13-13 de aguas lluvias e instalación de cubierta en teja master mil.
Actividades : Demolición de enchapes de piso, demolición de piso en concreto y
La Granja organización circuitos eléctricos.

Giovanni A.L.
Giovanni Acosta
Interventoría

Contratista.

Fecha : Enero 20 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales, 2 eléctricos y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes, instalación de cubierta en teja master mil,
KR 11 # 13-13 pintura acrílica para fachadas.
Actividades : Organización circuitos eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de
La Granja cargas.

Giovanni A.L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Jaime Galan.

Fecha : Enero 21 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales, 2 eléctricos y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes, instalación de cubierta en teja master mil,
KR 11 # 13-13 pintura acrílica para fachadas.
Actividades : Organización circuitos eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de
La Granja cargas.

Giovanni A.L.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 22 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales, 2 eléctricos y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes, instalación de cubierta en teja master mil,
KR 11 # 13-13 pintura acrílica para fachadas.
Actividades : Organización circuitos eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de
La Granja cargas, identificación y marcación de circuitos.

Giovanni A.C.
Giovanni Acosta
Interventoría.

Contratista.

Fecha : Enero 23 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales, 2 eléctricos y 4 ayudantes.
Actividades : Demolición de andenes, instalación de cubierta en teja master mil,
KR 11 # 13-13 pintura acrílica para fachadas.
Actividades : Organización circuitos eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de
La Granja cargas, identificación y marcación de circuitos.

Giovanni A.C.
Giovanni Acosta
Interventoría

Jaime Galan

Fecha : Enero 25 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales, 2 eléctricos y 4 ayudantes.
Actividades : Instalación de cubierta en teja master mil, pintura acrílica para
KR 11 # 13-13 fachadas, desmonte de cieloraso.
Actividades : Organización circuitos eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de
La Granja cargas, identificación, marcación de circuitos y cambio de tablero.

Giovanni A.C.
Giovanni Acosta.
Interventoría.

Fecha : Enero 26 de 2.021.
Clima : Día soleado.
Herramientas : Herramienta menor.
Personal : 1 Maestro, 2 oficiales, 2 eléctricos y 4 ayudantes.
Actividades : Instalación de cubierta en teja master mil, pintura acrílica para
KR 11 # 13-13 fachadas, desmonte de cieloraso.
Actividades : Cuadro de cargas, identificación, marcación de circuitos y cambio de
La Granja tablero, instalación de cieloraso en superboard.

Giovanni A.C.
Giovanni Acosta
Interventoría.

1- Diciembre 2020 Martes.
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes
Herramienta Menor.
Actividades:
Pescadero:- Poda de arboles
- Desmonte lavamanos area salud
Comuneros:- Impermeabilizacion de cubierta
- Resane de Muros
Patios: - Resane de Muros.
- Pintura Cielo Raso
Industria: - Limpieza Bajantes, Destape Sifones de cubierta
- Limpiza Cajas de inspeccion.

2. Diciembre 2020 Miercoles
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
1 Tecnico
5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramiento Menor.
Actividades: Pescadero: - Poda de arboles
- Mantenimiento Planta
Comuneros: - Impermeabilizacion de cubierta
- Resane de Muros.
Los Patios: - Resane y Pintura Muros.

líder

Industria: - Limpieza de Bajantes
- Destape de sifones de Cubierta
- Limpiza de cajas de inspección.

3 de Diciembre 2020 Jueves.
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes
Herramienta Menor.
Actividades: Pescadero: - Podo de arboles
Comuneros: - Impermeabilización Cubierta
- Instalación Cielo Raso
Industria: - Limpieza de bajantes
- Destape de sifones de Cubierta.

4 Diciembre 2020 Viernes.
Clima: Soleado.
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes
Herramienta Menor.
Actividades: - Pescadero: Podo de Arboles
- Comuneros: - Impermeabilización de Cubierta

5 Diciembre 2020 Sábado

Clima: Soleado

Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes.

Herramienta Menor.

Actividades: Pescadero: Pintura Vinilo Recepción
Comuneros: - Impermeabilización Cubierta
- Pintura Muros.
Patios: - Pintura Cielo Raso
Industria: - Instalación Bajantes aguas lluvias.

7 Diciembre 2020 Lunes.

Clima: Soleado

Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales.
8 Ayudantes

Herramienta Menor.

Actividades: Comuneros: - Resane Muros
- Pintura Muros.
Industria: - Instalación Bajantes. aguas lluvias.
- Instalación mortero de nivelación en Cubierta.

líder

9 Diciembre 2020 Miercoles.
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Comuneros: - Resane de Muros.
- Pintura Cielo Raso
Industria: - Demolición de Muros en cubierta
- Trasiego de escombros.
- Instalación Banda Antideslizante.

10 Diciembre 2020 Jueves.
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Comuneros: - Resane y Pintura Muros y Cielo Raso
Industria: - Instalación mortero de nivelación
- Trasiego de Escombros.

líder

11 Diciembre 2020 Viernes.
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales.
8 Ayudantes
Herramienta Menor.
Actividades:
Comuneros: - Resane y Pintura muros y cielo Raso
Industria: - Instalación mortero de nivelación
- Trasiego de Escombros.

12 Diciembre 2020 Sabado
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Comuneros: - Resane Muros.
- Pintura Cielo Raso
- Pintura Muros.
Industria: - Mortero de nivelación cubierta.

14 Diciembre 2020 Lunes.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales.
5 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Agro industria: - Visita verificación de actividades.
Cajas Reales: - Visita verificación de actividades
Comuneros: Resane Muros.
· Pintura muros.
Industria: Instalación mortero nivelación.

15 Diciembre 2020 Martes.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades
Comuneros: - Resane y Pintura Muros
Industria: - Pulida Piso Granito
- Instalación Mortero
- Limpieza de cubierta.
- Trasiego de Escombros.

líder

16 Diciembre 2020 Miercoles
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales.
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Agroindustria: - Retiro pintura epoxica de Piso
Calzado: - Encintar y pintar cielo Raso
Comuneros: - Resane y pintura Muros
Industria: - Pulida Granito
- Desmonte de teja de Cubierta.

17 Diciembre 2020 Jueves
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
5 Oficiales.
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Agroindustria: Aplicacion de pintura epoxica piso
Calzado: Cambio pelicula polarizada y
limpieza de ventanas.
Comuneros: Resane y Pintura de Muros.
Industria: - Desmonte de Cubierta
- Instalacion Mortero Nivelacion.

líder

18 Diciembre 2020 Viernes.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
3+5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Agroindustria: -Aplicación de pintura epoxica para Piso
Comuneros: - Pintura Muros y Cielo Raso
Industria: - Descargue Teja tipo sandwich.
- Traslado de escombros de cubierta.

19 Diciembre 2020 Sabado
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
3+5 Oficiales
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Agroindustria: Limpieza de canales.
- Sellamiento perimetral de Ventanas.
Comuneros: - Pintura Muros y Cielo Raso
Industria: - Instalación de cubierta tipo Sandwich.

21 Diciembre 2020 Lunes.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
8 Oficiales.
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Cajas Reales: Resane y Pintura Muros.
Comuneros: Resane y Pintura Muros.
Industria: - Inst. Mortero de Nivelación
- Inst. Teja tipo Sandwich.
- Resane y pintura Muros sala TIC

22 Diciembre 2020 Martes.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
8 Oficiales.
8 Ayudantes.
Herramienta Menor.
Actividades:
Cajas Reales: - Resane y Pintura Muros atención Para el empleo.
Comuneros: - Resane y pintura Muros.
Industria: - Resane y pintura sala TIC
- Desmonte de Cubierta.
- Instalación Teja tipo sandwich.

líder


23 Diciembre 2020 Miercoles.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
8 Oficiales.
8 Ayudantes
Herramienta Menor.
Actividades.
Cajas Reales: Resane y Pintura Muros.
Comuneros: Resane y Pintura Muros.
Industria: - Resane y Pintura Sala TEC
- Desmonte de Teja cubierta
- Instalación Teja tipo sandwich.
- Impermeabilización de Placa

24 Diciembre 2020 Jueves.
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero
1 Maestro
3 Oficiales.
Herramienta Menor.
Actividades:
Industria: Instalacion de teja tipo sandwich.


26 Diciembre 2020 Sabado
Clima Soleado
Personal: 1 Ingeniero · 3 Oficiales.
Actividades:
Industria: Instalacion de teja tipo sandwich.

líder


28 Diciembre 2020 Lunes.
Clima: soleado
Personal: 1 Ingeniero
3 Oficiales
Actividades:
Industria: - Desmonte de cubierta
- Instalación de Teja tipo sandwich.



29 Diciembre 2020 Martes.
Clima soleado
Personal: 1 Ingeniero
3 Oficiales
Actividades:
Industria: - Desmonte de cubierta.
- Instalación de Teja tipo sandwich.



30 Diciembre 2020 Miercoles.
Clima soleado
Personal 1 Ingeniero
3 Oficiales.
Actividades:
Industria: - Desmonte de cubierta.
- Instalación de teja tipo sandwich.



líder

1 Diciembre 2020

Personal en obra: Arauca.
2 Oficiales de obra
1 Ayudante de Obra.
Tame.
2 Ayudante de Obra
2 Oficiales de Obra

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades:
Arauca: Pañete bajo placa, 2 pisos.

Tame: Pintura Rejas y Ventanas

2 Diciembre 2020

Personal Obra Arauca: 2 Oficiales
1 Ayudante
Tame: 2 Oficiales
2 Ayudante
1 Arquitecto

Clima lluvia a medio dia
de resto soleado

Escaneado con CamScanner

Ejecucion de Actividades

Arauca: Pandido Mortero de nivelacion para manto asfaltico placa de los paneles.

Tame: Estuco sobre Muros baños.

EDGAR DERET Supervisor

4 - Diciembre - 2020

Personal en Obra

Arauca: 2 Oficiales
1 Ayudante
1 Arquitecto

Tame 2 Oficiales
2 Ayudantes

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades

Arauca:

NO SE LABORO PORQUE EL SENA

Escaneado con CamScanner

HEMOS PROGRESADO LA FUMIGACION DEL CENTRO. SE HIDRATO LOS PISOS QUE SE HABIA FUNDIDO EL DIA ANTERIOR.

Tame: Pintoras marcos de Ventanas

JEREZT

Interventora.
2C. Ingenieros

5 - Diciembre 2020

Personal de Obra:

Arauca: 2 Oficiales
1 Ayudant
1 Arquitecto

Tame 1 Oficial
1 Ayudante

Clima Soleado

Ejecucion de Actividades

Arauca: Se liza el estuco Ambiente de Competencias

Tame: No se labozo

Interventoria 2C Ingenieros

Escaneado con CamScanner

7 Diciembre 2020

Personal en Obra:

Arauca 2 Oficiales de Obra
1 Ayudante de Obra
1 Arquitecto Coordinador

Tame: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra

Clima:

Ejecucion de Actividades:

Arauca: Continuan con instalacion de malla y mortero bajo placa.

Tame: Pintura sobre muro exterior en baño

Interventoria Ing

9 Diciembre 2020

Personal en Obra.

Arauca: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante

Tame: 1 Oficial de Obra

Escaneado con CamScanner

1 Ayudante de Obra

Clima

Ejecucion de Actividades

Arauca: Estuco tercer piso bajo placa

Tame: Inicio de lija y Estuco ambiente Bienestar del aprendiz.

Intervventoria
2o Ingeniero

10 Diciembre 2020

Personal en Obra.

Arauca: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra

Tame: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
1 Arquitecto coordinador

Clima.

Ejecucion de Actividades.

Arauca: Continuan aplicando Estuco bajo Placa

Tame: Continua impermeabilizando en Bienestar

Escaneado con CamScanner

11 Diciembre 2020

Personal en Obra:

Arauca: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra

Tame: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades

Arauca: Estuco bajo placa.
2 piso

Tame: Pintura Ambiente de
Bienestar del Aprendiz

Interventoria
2C Ingeniero.

12 Diciembre 2020

Personal en Obra:

Arauca 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra

Clima: Soleado

Escaneado con CamScanner

Ejecucion de Actividades
Arauca: Ligado de Estuco bajo placa 3 piso

14

Sandra
Interventoria
2C ingeniero

14 Diciembre 2020

Personal en Obra
Arauca: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
1 Tecnico Electrico

Arauca:
Pintura Muros interiores Ambiente Competencia y limpieza de tableros de circuitos electricos.

Sandra
Interventoria
2C ingeniero

15 Diciembre 2020

Personal en Obra
Arauca: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante 1 Tecnico
1 Arquitecto Coordinador
Tame: 1 Oficial

Clima: Soleado

Escaneado con CamScanner

Ejecucion de Actividades
Arauca: - Lijado bajo placa estuc
- Pintura Ambiente de comedor
- limpieza tableros de circuitos
Tame: Desmonte Dray wall baño

Interventoria
2C ingenieros

16 Diciembre 2020

Personal en obra
Arauca: 1 Oficial de Obra
1 Auxiliar de Obra
Tame: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades

Arauca: Lijado de Estuco y preparacion para pintura bajo placa

Tame: Instalacion dry wall en el baño

Interventoria
2C ingenieros

Escaneado con CamScanner

17 Diciembre 2020

Personal de Obra: 1 Oficial
1 Ayudante
2 Tecnicos de Aire
1 Arquitecto

Clima: Soleado

Ejecución de Actividades

Se realizaron trabajos en el Centro principal de Arauca. Nuevamente ingresan personal de mantenimiento de Aires acondicionados Tumbien se continuan con lijado y preparación de superficie para pinturas

Interventoria
2C ingenieros

18 Diciembre 2020

Personal en Obra: 1 Oficial de Obra
1 ayudante de Obra
2 Tecnicos de Aires
1 Arquitecto Coordinador

Clima: Soleado

Escaneado con CamScanner

Ejecucion de Actividades.

Se continua con mantenimiento a Aires, nuevamente se presentan inconvenientes con los ambientes cerrados.

Se inician labores de pintura baso placa.

Interventoria
2C ingenieros

19. Diciembre 2020

Personal en Obra. 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
1 Arquitecto Coordinador

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades

Se continua con pintura baje placa.

Interventoria
2C Ingenieros

Escaneado con CamScanner

21 de Diciembre 2020

Personal en Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
1 Arquitecto Coordinador

Clima: Soleado

Ejecucion ole Actividades.

Se continua con la actividad de Pinturas. en el sena principal de Arauca.

Pes. Interventoria
2C ingenieros

22 de Diciembre 2020

Personal en Obra: 1 Oficial de Obra
1 Ayudante de Obra
1 Arquitecto Coordnador

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades.

Se finalizan labores de pintura y se impermeabiliza en el cuarto de comunicaciones un muro

Interventoria
2C

Escaneado con CamScanner

23 Diciembre 2020

Personal en Obra: 1 Oficial de Ob.
1 Ayudante

Clima: Soleado.

Ejecucion de Actividades

Limpieza de Areas intervenidas y Organización para continuar labores en Enero, se suspenden Actividades, por fiestas de fin de año.

Interventor
(Ingeniero)

Escaneado con CamScanner

19 Enero 2021

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades.
Retoma de Actividades ingresa personal a la sede Agencia publica de Empleo e inician la demolicion de mortero y escarificacion.

JOSE JERET.

Interventoria
Ingenieros

20 Enero 2021

Personal en Obra:
Arauca: 2 Oficiales de Obra
1 Ayudante
1 Arquitecto Supervisor

Clima: Soleado

Ejecucion de Actividades

Escaneado con CamScanner

Recorrido a los 3 Centros de Arauca y organizar presupuestos para socializarlos a la Supervisora.

EDGAR JEREZ T.

Interventoria
2C Ingeniero

22 Enero 2021

Personal en Obra. Arauca: 2 Oficiales
1 Ayudante
Tame: 2 Oficiale
1 Ayudante
1 Arquitecto coordinador

Ejecucion de Actividades
Arauca: Terminacion de la fundida de mortero de nivelacion.
Agencia publica de empleo

Tame: Contruccion de Cajas de circuito electrico

EDGAR JEREZ T.

Interventoria
2C Ingenieros

23 Enero 2021

Personal en Obra Arauca: 3 Oficiales
1 Ayudante
Tame 2 Oficiales
1 Ayudante

Escaneado con CamScanner

Sede la 20 Limpieza de Canal y fundida de mortero sobre placa de tuberias

Tame: Continuan realizando pintura en aceite bloque Administrativo

EDGAR JEREZ T.

Supervisor
Interventoria
Ingenieros

26 Enero 2021

Arauca 3 Oficiales
2 Ayudantes
Saravena 1 Oficial de Obra
1 Ayudante
Tame. 2 oficiales de Obra
1 Ayudante
1 Arquitecto Coordinador

Clima Soleado
Ejecucion de Actividades
Arauca:-Agencia Publica de empleo
Demolicion Enchapte. baño.
- Sede la 20 Instalación tubo de desagüe de cubierta
- Escuela de Gastronomia Limpieza caja de inspección y labado de muros

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

SENA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507

CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”.

CONTRATISTA: CONSORCIO JG 2020

INTERVENTORÍA: 2C INGENIEROS S.A.

29 de NOVIEMBRE de 2020 domingo

30 de NOVIEMBRE de 2020 lunes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de bodega de insumos de almacén, con el fin de corregir las filtraciones en este sector, realizando desmonte, suministro y monte de teja de fibrocemento, igualmente se realiza esta actividad en el aula 105.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

01 de diciembre de 2020 martes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de aula 107, con el fin de corregir las filtraciones en este sector, realizando desmonte, suministro y monte de teja de fibrocemento.

Se realiza actividad de mantenimiento de los fluxómetros de sanitarios del bloque norte o ambientes nuevos.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

02 de diciembre de 2020 miércoles

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza lavado de tanques plásticos en el área de agencia de empleo.
Se realiza actividad de adecuación de las áreas donde se requiere la instalación de tableta de gres.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

03 de diciembre de 2020 jueves

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de informática, con el fin de corregir las filtraciones en este sector, realizando desmonte y monte de teja de barro.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

04 de diciembre de 2020 viernes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de informática, con el fin de corregir las filtraciones en este sector, realizando desmonte y monte de teja de barro.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

05 de diciembre de 2020 sábado

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de informática, con el fin de corregir las filtraciones en este sector, realizando desmonte y monte de teja de barro.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

06 de diciembre de 2020 domingo

07 de diciembre de 2020 lunes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19**.**

Se realiza corrección de filtraciones en el ambiente de electricidad y en el área de la cubierta de oficina de almacén.

Igualmente realiza actividad de mantenimiento de cubierta del área de atención al ciudadano, desmonte y lavado de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

08 de diciembre de 2020 martes festivo

09 de diciembre de 2020 miércoles

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza actividad de mantenimiento de cubierta del área de atención al ciudadano, desmonte y lavado de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento y instalación de teja de barro.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

10 de diciembre de 2020 jueves

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de unidad de baños 3, ejecutando desmonte de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

11 de diciembre de 2020 viernes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de unidad de baños 3, ejecutando desmonte de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

12 de diciembre de 2020 sábado

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de unidad de baños 3, ejecutando desmonte de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

13 de diciembre de 2020 domingo

14 de diciembre de 2020 lunes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de unidad de baños 3, ejecutando desmonte de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento y instalación de teja de barro.

Se realiza instalación de tableta de gres.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

15 de diciembre de 2020 martes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza instalación de tableta de gres.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

16 de diciembre de 2020 miércoles

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción

1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realizó la instalación de tapas sanitarias en las diferentes unidades de baños donde se requerían.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

17 de diciembre de 2020 jueves

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de los fluxómetros de lavamanos y sanitarios del bloque norte o ambientes nuevos.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

18 de diciembre de 2020 viernes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza actividad de mantenimiento de los fluxómetros de lavamanos del bloque norte o ambientes nuevos.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

19 de diciembre de 2020 sábado

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se continua con el mantenimiento de los fluxómetros de lavamanos del bloque norte o ambientes nuevos.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

20 de diciembre de 2020 domingo

21 de diciembre de 2020 lunes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1
Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza el cambio de dos registros de bola en las unidades sanitarias del bloque norte y realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento.

Igualmente se da inicio con las impermeabilizaciones en la placa del bloque norte.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

22 de diciembre de 2020 martes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
3 técnicos de impermeabilizaciones
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento.

Se realizan actividades de impermeabilizaciones en la placa del bloque norte.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

23 de diciembre de 2020 miércoles

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
3 técnicos de impermeabilizaciones
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento. Y Se realiza instalación de bajantes de aguas lluvias en el área de senova.

Se realizan actividades de impermeabilizaciones en la placa del bloque norte.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

24 de diciembre de 2020 jueves

no se ejecutan actividades.

25 de diciembre de 2020 viernes festivo

26 de diciembre de 2020 sábado

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza instalación de bajantes de aguas lluvias en el área de senova.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

27 de diciembre de 2020 domingo

28 de diciembre de 2020 lunes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento y organización de caballetes, con el fin de corregir filtraciones en este sector.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

29 de diciembre de 2020 martes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento y organización de caballetes, con el fin de corregir filtraciones en este sector.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

30 de diciembre de 2020 miércoles

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento y organización de caballetes y instalación de teja de barro, con el fin de corregir filtraciones en este sector.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

31 de diciembre de 2020 jueves

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19**.**

Se realiza mantenimiento en la cubierta del área de comedor de gastronomía, retiro de teja de barro y lavado de teja de fibrocemento y organización de caballetes e instalación de teja de barro, con el fin de corregir filtraciones en este sector.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

01 de Enero de 2021 Viernes Festivo

02 de Enero de 2021 Sábado

No se ejecutaron actividades.

03 de Enero de 2021 domingo

04 de Enero de 2021 lunes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área de comedor de agroindustrial, ejecutando instalación de teja de barro.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

05 de Enero de 2021 martes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza mantenimiento de cubierta en el área cubierta pasillo baños unidad.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

06 de Enero de 2021 miércoles

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se continua con el desmonte y lavado de teja de barro en el área cubierta pasillo baños unidad

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

07 de Enero de 2021 jueves

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se continua con el desmonte y lavado de teja de barro en el área cubierta pasillo baños unidad 3.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

08 de Enero de 2021 Viernes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza lavado de tanque del área administrativa.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

09 de Enero de 2021 Sábado

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realiza lavado de tanque del área del bloque norte o ambientes nuevos.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

10 de Enero de 2021 Domingo

11 de Enero de 2021 lunes festivo

12 de Enero de 2021 Martes

Personal en obra:
1 Oficiales de construcción
1 Ayudantes de obra
2 técnicos electricistas

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se realizó instalación de luminarias de alumbrado público en la parte interna del centro.

Así mismo se dio inicio con el lavado de tanque subterráneo del área de cocina del SENA.

Igualmente, se realizó recorrido entre contratista, interventoría y SENA, con el fin de definir los puntos de instalación de lámpara eléctricas.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

13 de Enero de 2021 Miércoles

Personal en obra:
1 Ayudantes de obra
1 técnico electricista

Realizaron instalación de tablero eléctrico en el área de caseta eléctrica. Igualmente dieron inicio con el desmonte de cielo raso en el área de empleo.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

14 de Enero de 2021 jueves

El consorcio JG no ejecuto actividades por falta de personal.

15 de Enero de 2021 viernes

El consorcio JG no ejecuto actividades por falta de personal.

16 de Enero de 2021 sábado

El consorcio JG no ejecuto actividades por falta de personal.

17 de Enero de 2021 domingo

18 de Enero de 2021 Lunes

Personal en obra:
2 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se ejecutaron actividades en horas de la tarde de desmonte de cielo raso en el área de agencia pública de empleo.

Se realizó visita entre contratista e interventoría con el fin de verificar actividades pendientes a la fecha.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

19 de Enero de 2021 martes

Personal en obra:
2 Ayudantes de obra
Arquitecto coordinador regional 1

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se ejecutaron actividades de instalación de cielo raso en el área de agencia pública de empleo.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

20 de Enero de 2021 miércoles

Personal en obra:
2 Ayudantes de obra
1 Técnico electricista
3 técnicos de impermeabilizaciones
Coordinador de HSEQ

Clima: día soleado

Ejecución de actividades:
Antes de dar inicio con las actividades de mantenimiento el contratista realiza la toma de temperatura y diligencian el formato de verificación síntomas COVID -19.

Se ejecutaron actividades de instalación en el área de agencia pública de empleo, tales como instalación de cielo raso, escarificación de pañetes, resanes y pintura. Igualmente se dio inicio con la instalación de lámparas en el ambiente de aulas del bloque norte.

Igualmente ingreso la cuadrilla de impermeabilizaciones a ejecutar actividades en las placas del ambiente de las aulas del bloque norte.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO JG 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO JG 2020

Anexo 3. Control de personal de obra

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

	CONTROL DE PERSONAL OBRA	PI - IN - F06
		VERSIÓN 00 PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTORÍA	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	DESDE	29 Nov 2020	HASTA	20 Ene 2021

PERSONAL	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	TOTAL DÍAS LABORADOS	% DISPONIBILIDAD
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
PERSONAL CALIFICADO																																																			
JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - DIRECTOR DE OBRA		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	16,4	40,00%
EDGAR JEREZ TAMI - COORDINADOR REGIONAL 1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
ISLEY RINCON SUAREZ - COORDINADOR REGIONAL 2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
MARTHA BEATRIZ MENDOZA CARRASCAL - COORDINADOR REGIONAL 3		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
CESAR AUGUSTO CRISTANCHO SÁNCHEZ FRANCO - ENCARGADO ÁREA ELÉCTRICA Y MECÁNICA		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
GERSON JHAIR CUADROS LUNA - ENCARGADO ÁREA AMBIENTAL		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES - ENCARGADO ÁREA HIDROSANITARIA		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
DIEGO AUGUSTO SÁNCHEZ BAEZ - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
MAIRA ALEJANDRA CALA SOLER - INSPECTOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
LUIS DOMINGO BECERRA - PROFESIONAL DE APOYO		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
ARIOLFO ANTONIO TOVAR PARDO - APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA (Adicional)		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
TOTAL DE PERSONAS LABORANDO		11 PERSONAS																																															

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	21-ene.-2021
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA		

Anexo 4. Control personal interventoría

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

	CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA	PI - IN - F06
		VERSIÓN 00

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	2C INGENIERO S.A.
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO **DESDE** 29 NOV 2020 **HASTA** 20 ENE 2021

PERSONAL	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	DIAS TRABAJADOS	DEDICACIÓN
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
PERSONAL CALIFICADO																																																								
CESAR MORA BARNEY - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																										0,7		0,7		0,7	0,7	0,7	0,7		0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	14,7	70,00%
JAMESSON JESÚS SOSA RODRIGUEZ - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7		0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7																												14,0	70,00%
MITCHEL BRIAN ESPINOSA - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA BOYACÁ		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
FLAVIO MORA FERNÁNDEZ - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARAUCA Y CASANARE		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
GIOVANNI EDUEN ACOSTA CADENA - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
JULIETH MARTÍNEZ ANGULO - PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	16,4	40,00%
JUANITA SANTOS - SECRETARIA		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
SANDRA CAROLINA MORA - TECNÓLOGO 1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
KATERING FORERO HERNÁNDEZ - TECNÓLOGO 2		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	41,0	100,00%
MARÍA SOFÍA TRUJILLO - PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	41,0	
DINA LUZ DIAZ LÓPEZ - PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	41,0	
OSCAR IVÁN CÁRDENAS BARÓN - PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	41,0	
FRED EVERARDO SUÁREZ OVALLES - TECNÓLOGO DE APOYO (Adicional)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	41,0	
TOTAL DE PERSONAS LABORANDO		13 PERSONAS																																																						

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	21-ene.-2021
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA		

Anexo 5. Control de aportes de seguridad social Obra

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

	CONTROL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	PI - IN - F 21
		VERSIÓN 02
		17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	29-nov.-2020	**HASTA**	20-ene.-2021


No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA			PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO	OBSERVACIÓN
							SALUD	PENSIÓN	ARL			
REGIONAL CASANARE												
PROFESIONAL												
1	JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	71.185.747	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	9-jun.-2020		SANITAS 9 6 2020	COLPENSIONES 9 6 2020	SURA 9 6 2020	DICIEMBRE DE 2020	5	
2	EDGAR JEREZ TAMI	91.205.625	COORDINADOR REGIONAL	CONSORCIO JG 2020	23-jul.-2020		COOMEVA EPS 23 7 2020	PROTECCION 23 7 2020	SURA 23 7 2020	DICIEMBRE DE 2020	5	
3	MAIRA ALEJANDRA CALA	1.098.632.716	INSPECTOR SST	CONSORCIO JG 2020	23-jul.-2020		COOMEVA EPS 23 7 2020	PORVENIR 23 7 2020	SURA 23 7 2020	DICIEMBRE DE 2020	5	
TECNICO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA												
4	FERMIN JIMENEZ BELLO	74.859.773	MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	3-sep.-2020	12-ene.-2021	3-sep.-2020 NUEVA EPS	3-sep.-2020 COLFONDOS	3-sep.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
5	CARLOS ARTURO ALARCON CORREDOR	1.118.550.222	AYUDANTE OBRA	CONSORCIO JG 2020	3-sep.-2020	30-nov.-2020	3-sep.-2020 NUEVA EPS	3-sep.-2020 PORVENIR	3-sep.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
6	RUDY ALEXANDER CARVAJAL PULIDO	74.347.867	TECNICO ELECTRICISTA (Coordinador de Pintura)	CONSORCIO JG 2020	10-sep.-2020		10-sep.-2020 NUEVA EPS	10-sep.-2020 COLPENSIONES	10-sep.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
7	JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ	86.047.413	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	10-sep.-2020	12-ene.-2021	10-sep.-2020 MEDIMAS EPS	10-sep.-2020 PORVENIR	10-sep.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
8	JHON FREDY HIDALGO SANABRIA	1.116.547.998	AYUDANTE DE OBRA - PINTURA	CONSORCIO JG 2020	2-oct.-2020		30-sep.-2020 EPS SANITAS	30-sep.-2020 PORVENIR	30-sep.-2020 POSITIVA	DICIEMBRE DE 2020	5	
9	RODRIGO ANDRES VEGA SANABRIA	1.006.442.094	MAESTRO DE OBRA	CONSORCIO JG 2020	14-nov.-2020		10-nov.-2020 NUEVA EPS	10-nov.-2020 PORVENIR	10-nov.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
10	CARLOS ENRIQUE GARZON RINCON	1.095.844.497	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020	11-nov.-2020 NUEVA EPS	11-nov.-2020 PORVENIR	11-nov.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
11	EIDER ANTONIO LÓPEZ JAIMES	1.102.725.265	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020	7-oct.-2020 COOSALUD	7-oct.-2020 PORVENIR	7-oct.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	

2C INGENIEROS S.A.	**CONTROL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	PI - IN - F 21 VERSIÓN 02 17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	29-nov.-2020	**HASTA**	20-ene.-2021

No.	**NOMBRE**	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**CONTRATANTE**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA**			**PERIODO COTIZADO**	**CLASE DE RIESGO**	**OBSERVACIÓN**
							SALUD	**PENSIÓN**	**ARL**			
12	SERGIO ANDRES ROJAS SANTIAGO	1.098.704.140	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020	18-jun.-2020	18-jun.-2020	18-jun.-2020	DICIEMBRE DE 2020	5	
							SANITAS	PROTECCION	SURA			
13	GERMAN EDUARDO MORENO	91.512.213	CONDUCTOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	19-dic.-2020	23-dic.-2020	1-sep.-2020	1-sep.-2020	1-sep.-2020	DICIEMBRE DE 2020	5	
							EPS SURAMERICANA	PROTECCION	SURA			
14	JOSÉ LEONARDO PÉREZ CORREDOR	1.116.551.667	TECNICO ELECTRICISTA	TARKUS DISEÑI Y CONSTRUCCIONES	7-ene.-2021		6-ene.-2021	6-ene.-2021	6-ene.-2021	DICIEMBRE DE 2020	5	
							NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA			
15	DAIRO DE LA ROSA BADILLO	1.095.803.688	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021		13-ene.-2021	13-ene.-2021	13-ene.-2021	ENERO DE 20021	5	
							SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA			
16	SERGIO ANDRES ROJAS SANTIAGO	1.098.704.140	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021		19-ene.-2021	19-ene.-2021	19-ene.-2021	ENERO DE 20021	5	
							SANITAS	PROTECCION	SURA			
17	YOVANIS DE LA ROSA BADILLO	1.052.573.001	IMPERMEABILIZADOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021		13-ene.-2021	13-ene.-2021	13-ene.-2021	ENERO DE 20021	5	
							SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA			
18	PATROCINIO CORREDOR JOYA	91.518.170	CONDUCTOR	IMPERTEL FILTRACIONES Y HUMEDADES	20-ene.-2021		13-ene.-2021	13-ene.-2021	13-ene.-2021	ENERO DE 20021	5	
							NUEVA EPS	PORVENIR	SURA			


RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	21-ene.-2021
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
FIRMA		

	CONTROL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	PI - IN - F 21
		VERSIÓN 02
		17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	29-nov.-2020	**HASTA**	20-ene.-2021

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA			PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO	OBSERVACIÓN
							SALUD	PENSIÓN	ARL			
1	JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR	71.185.747 de Puerto Berrio (Ant)	Director de Obra	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		9-jun.-2020 EPS SANITAS	1-may.-2019 COLPENSIONES	9-jun.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
2	EDGAR JEREZ TAMI	91205625 de Bucaramanga Santanader	Residente de obra	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		23-jul.-2020 COOMEVA EPS	1-abr.-1996 PROTECCION	23-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
3	ISLEY RINCON SUAREZ	60.334.309 de Cucuta Santander	Residente de obra	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		27-jul.-2020 EPS SURA	19-dic.-1992 COLPENSIONES	23-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
4	MARTHA BEATRIZ MENDOZA CARRASCAL	60.261.351 de Teorama Norte de Santander	Residente de obra	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		27-jul.-2020 EPS SANITAS	6-may.-2010 COLPENSIONES	23-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
5	CESAR AUGUSTO CRISTANCHO SÁNCHEZ FRANCO	1.098.692.691 DE Bucaramanga	Encargado área electromecánica	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		1-ago.-2018 NUEVA EPS	27-jul.-2020 PORVENIR	23-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
6	GERSON JHAIR CUADROS LUNA	1.102.356.716 de Bucaramanga	Encargado área ambiental	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		1-jul.-2014 NUEVA EPS	11-dic.-2006 COLPENSIONES	23-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
7	WENTZER MAURICIO LEÓN TORRES	91.075.487 San Gil	Encargado área hidrosanitaria	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		1-jul.-2012 EPS SANITAS	27-jul.-2020 PORVENIR	27-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
8	DIEGO AUGUSTO SÁNCHEZ BAEZ	91.266.126 de Bucaramanga Santander	Profesional en SST	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		27-jul.-2020 EPS SANITAS	1-jul.-2014 COLPENSIONES	24-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
9	MAYRA ALEJANDRA CALA	1´098.632.716	Inspector SST	CONSORCIO JG 2020	27-jul.-2020		27-jul.-2020 COOMEVA EPS	25-ago.-2020 COLPENSIONES	27-jul.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	
10	ARIOLFO ANTONIO TOVAR	1'099.204.149	Ing. Apoyo a la dirección	CONSORCIO JG 2020	1-ago.-2020		9-jun.-2020 EPS SANITAS	8-jun.-2020 PORVENIR	27-may.-2020 SURA	DICIEMBRE DE 2020	5	

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	20-ene.-2021
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901382308	1	CONSORCIO JG 2020	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SENA JG	CRA 12 34 67 OFICINA 403	BUCARAMANGA-SANTANDER	6836422	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	857957336	9414145517	E	2021/01/06	2021/01/18	BANCOLOMBIA	0	$17,807,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1095796441	ACOSTA GOMEZ JUAN GUILLERMO		X																230201	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
2	CC	1098717075	BECERRA DIAZ LUIS DOMINGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
3	CC	74859773	BELLO JIMENEZ FERMIN																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
4	CC	91016642	BENAVIDES PARDO SAUL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
5	CC	2009296	BERMUDEZ TORRES CARLOS EDUARDO	X	X																230301	3	$87,781	$14,100	ESSC91	3	$87,781	$3,600	CCF39	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
6	CC	1116808609	BLANCO RAMOS DIEGO ARMANDO																		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC33	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
7	CC	13744644	BLANCO RODRIGUEZ JESUS DAVID	X																	230301	8	$234,081	$37,500	EPS037	8	$234,081	$9,400	CCF39	8	$234,081	$9,400	14-11	8	$234,081	$16,300	8	$0	$0	Si	$72,600
8	CC	1004842848	BOTELLO RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	X	X																230301	3	$87,781	$14,100	CCFC50	3	$87,781	$3,600	CCF39	3	$87,781	$3,600	14-11	3	$87,781	$6,200	3	$0	$0	Si	$27,500
9	CC	1094574920	CAICEDO PALACIO UBER ALFONSO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
10	CC	1098632716	CALA SOLER MAYRA ALEJANDRA																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS016	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
11	CC	88229527	CAÑAVERAL NINO MAURICIO	X																	230301	21	$614,463	$98,400	EPS044	21	$614,463	$24,600	CCF39	21	$614,463	$24,600	14-11	21	$614,463	$42,800	21	$0	$0	Si	$190,400
12	CC	74347867	CARVAJAL PULIDO RUDY ALEXANDER																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
13	CC	1116791183	CASTILLO QUINTERO LUIS HERNAN																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
14	CC	91247394	CIFUENTES MUÑOZ WILSON ANTONIO	X																	25-14	28	$819,283	$131,100	EPS002	28	$819,283	$32,800	CCF39	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
15	CC	91112283	COLLAZOS PARRA DEIBY ALEXANDER	X	X																25-14	5	$146,301	$23,500	EPS041	5	$146,301	$5,900	CCF39	5	$146,301	$5,900	14-11	5	$146,301	$10,200	5	$0	$0	Si	$45,500
16	CC	1127065141	CONTRERAS LIZARAZO JAIME JAVIER	X																	230301	21	$614,463	$98,400	ESSC24	21	$614,463	$24,600	CCF39	21	$614,463	$24,600	14-11	21	$614,463	$42,800	21	$0	$0	Si	$190,400
17	CC	1098692691	CRISTANCHO FRANCO CESAR AUGUSTO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
18	CC	1102356716	CUADROS LUNA GERSON JHAIR																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
19	CC	1051637060	CUEVAS CAMPOS OMAR XAVIER	X	X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS037	1	$29,261	$1,200	CCF39	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
20	CC	79947401	CUITIVA ROMERO FAUSTO		X																230201	22	$643,723	$103,000	EPS016	22	$643,723	$25,800	CCF39	22	$643,723	$25,800	14-11	22	$643,723	$44,900	22	$0	$0	Si	$199,500
21	CC	1104131489	DE LA OSSA MATAGIRA CARLOS ALBERTO		X																230301	22	$643,723	$103,000	EPS016	22	$643,723	$25,800	CCF39	22	$643,723	$25,800	14-11	22	$643,723	$44,900	22	$0	$0	Si	$199,500
22	CC	1007974161	DE ORO MARTINEZ JUAN DIEGO	X	X																230301	16	$468,162	$75,000	EPS048	16	$468,162	$18,800	CCF39	16	$468,162	$18,800	14-11	16	$468,162	$32,600	16	$0	$0	Si	$145,200
23	CC	1057611224	DUCON NIÑO BRAYAN MAURICIO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
24	PE	931862215011978	FERNANDEZ FIGUERA JOSE MANUEL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
25	CC	1098741169	FERREIRA OSPINA JEFFERSON FABIAN		X																230201	15	$438,902	$70,300	EPS017	15	$438,902	$17,600	CCF39	15	$438,902	$17,600	14-11	15	$438,902	$30,600	15	$0	$0	Si	$136,100
26	CC	1057585333	FIGUEROA CARDENAS OSCAR LEONARDO																		231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
27	CC	1116862621	FONTALVO JIMENEZ MIGUEL LIBARDO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
28	CC	71185747	GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO																		25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	1127919665	GALVIS BONILLA EYVAR ERNESTO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
30	CC	1090541154	GALVIS VARGAS JESUS MANUEL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
31	CC	5624573	GARCIA JOSE RAMIRO	X																	230301	28	$819,283	$131,100	ESSC24	28	$819,283	$32,800	CCF39	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
32	CC	17546035	GIRALDO SARMIENTO JESUS IVAN																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS041	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
33	CC	91212231	HERNANDEZ JIMENEZ JUAN DE LA CRUZ	X																	230301	28	$819,283	$131,100	EPS037	28	$819,283	$32,800	CCF39	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
34	CC	1101682117	HERNANDEZ VANEGAS SERGIO ANDRES	X																	230201	28	$819,283	$131,100	ESSC24	28	$819,283	$32,800	CCF39	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
35	CC	74245088	HERNANDEZ RODRIGUEZ YEISON		X																230301	17	$497,422	$79,600	EPS037	17	$497,422	$19,900	CCF39	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$497,422	$34,700	17	$0	$0	Si	$154,100
36	CC	1116547998	HIDALGO SANABRIA JHON FREDY																		230301	30	$877,803	$140,500	EPSC25	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
37	CC	78702967	HOYOS CAMACHO EDUIN ENRIQUE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
38	CC	91205625	JEREZ TAMI EDGAR																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS016	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
39	CC	1116864812	LAYA MENDOZA FRANKLIN CHAYAN	X																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC24	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
40	CC	17589020	LAYA MORENO PEDRO JOSE																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
41	CC	91075487	LEON TORRES WENTZER MAURICIO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
42	CC	86047413	LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
43	PE	933562218031989	LUNA CACERES JOSAN HUMBERTO	X																	230301	2	$58,521	$9,400	ESSC24	2	$58,521	$2,400	CCF39	2	$58,521	$2,400	14-11	2	$58,521	$4,100	2	$0	$0	Si	$18,300
44	CC	60261351	MENDOZA CARRASCAL MARTHA BEATRIZ																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF39	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
45	CC	1090435531	MORENO RAMIREZ FREDDY ALEXANDER		X																230201	18	$526,682	$84,300	ESSC91	18	$526,682	$21,100	CCF39	18	$526,682	$21,100	14-11	18	$526,682	$36,700	18	$0	$0	Si	$163,200
46	CC	13480148	MORENO CASANOVA FREDDY GUSTAVO		X																230201	4	$117,041	$18,800	EPS016	4	$117,041	$4,700	CCF39	4	$117,041	$4,700	14-11	4	$117,041	$8,200	4	$0	$0	Si	$36,400
47	CC	1090455460	MORENO RAMIREZ JOSE LUIS																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
48	CC	1116551328	MUÑOZ LOPEZ CARLOS ARTURO	X	X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS037	1	$29,261	$1,200	CCF39	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
49	CC	1057590158	NOSSA LADINO JOHAN SEBASTIAN	X	X																230301	1	$29,261	$4,700	EPS037	1	$29,261	$1,200	CCF39	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
50	CC	1098704659	OSORIO AVELLANEDA OMAR ANDRES																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
51	CC	85447142	OSPINO PALACIO RAMON GONZALO	X																	230301	28	$819,283	$131,100	EPS016	28	$819,283	$32,800	CCF39	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
52	CC	74081864	PARADA CAMARGO GEISON ANDRES	X	X																230301	14	$409,642	$65,600	EPS037	14	$409,642	$16,400	CCF39	14	$40,964	$1,700	14-11	14	$409,642	$28,600	14	$0	$0	Si	$112,300
53	CC	88244083	PAREDES ALVAREZ GEOVANNY	X																	25-14	13	$380,382	$60,900	EPS005	13	$380,382	$15,300	CCF39	13	$380,382	$15,300	14-11	13	$380,382	$26,500	13	$0	$0	Si	$118,000
54	CC	91104788	PARRA SANCHEZ DANIEL	X																	25-14	28	$819,283	$131,100	EPS037	28	$819,283	$32,800	CCF39	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$57,100	28	$0	$0	Si	$253,800
55	CC	1127924958	PEREZ NIÑO JHONNY EDUARDO		X																230301	23	$672,983	$107,700	EPS037	23	$672,983	$27,000	CCF39	23	$672,983	$27,000	14-11	23	$672,983	$46,900	23	$0	$0	Si	$208,600
56	CC	72302180	PIEDRAHITA HERNANDEZ HUGO FERNANDO		X																230301	1	$29,261	$4,700	ESSC24	1	$29,261	$1,200	CCF39	1	$29,261	$1,200	14-11	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0	Si	$9,200
57	CC	74185695	PINEDA SALCEDO JUAN	X	X																230301	20	$585,202	$93,700	EPS037	20	$585,202	$23,500	CCF39	20	$585,202	$23,500	14-11	20	$585,202	$40,800	20	$0	$0	Si	$181,500
58	CC	1100891205	PIÑEREZ GARCIA JOSE ADRIAN		X																231001	22	$643,723	$103,000	EPS002	22	$643,723	$25,800	CCF39	22	$643,723	$25,800	14-11	22	$643,723	$44,900	22	$0	$0	Si	$199,500
59	CC	1098721674	PINTO ARIAS DEIBY ALEXANDER																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
60	CC	1057580018	PONGUTA PEREZ GIOVANNY	X	X																230301	17	$497,422	$79,600	ESSC33	17	$497,422	$19,900	CCF39	17	$497,422	$19,900	14-11	17	$497,422	$34,700	17	$0	$0	Si	$154,100
61	CC	1024502083	POSSO LARGO JOHN HAROL																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
62	CC	1090444422	PRADA RUEDAS DEYVI	X	X																230301	4	$117,041	$18,800	CCFC50	4	$117,041	$4,700	CCF39	4	$117,041	$4,700	14-11	4	$117,041	$8,200	4	$0	$0	Si	$36,400
63	CC	17586603	PUERTA ROJAS OMAR TIBERIO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0	Si	$272,000
64	CC	1098753378	PULGARIN BETANCOURT JONATHAN STIVES		X																230301	14	$409,642	$65,600	ESSC33	14	$409,642	$16,400	CCF39	14	$409,642	$16,400	14-11	14	$409,642	$28,600	14	$0	$0	Si	$127,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901382308	1	CONSORCIO JG 2020	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SENA JG	CRA 12 34 67 OFICINA 403	BUCARAMANGA-SANTANDER	6836422	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	857957336	9414145517	E	2021/01/06	2021/01/18	BANCOLOMBIA	0	$17,807,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	$9,225,200	$0	$0	$9,225,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$459,000	$0	$0	$459,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,985,100	$0	$0	$1,985,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$6,073,100	$0	$0	$6,073,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$708,000	$0	$0	$708,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$3,997,000	$0	$0	$3,997,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	82	$3,997,000	$0	$0	$3,997,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$2,285,200	$0	$0	$2,285,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	82	$2,285,200	$0	$0	$2,285,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				82	$2,299,900	$0	$0	$2,299,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$1,200	$0	$0	$1,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$8,300	$0	$0	$8,300
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	4	$95,000	$0	$0	$95,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	8	$239,500	$0	$0	$239,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$17,600	$0	$0	$17,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$129,000	$0	$0	$129,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	$50,500	$0	$0	$50,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$111,500	$0	$0	$111,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$24,600	$0	$0	$24,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	$799,200	$0	$0	$799,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$42,300	$0	$0	$42,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$126,600	$0	$0	$126,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$450,200	$0	$0	$450,200
TOTAL				82	$17,807,300	$0	$0	$17,807,300

Anexo 6. Control de aportes de seguridad social Interventoría

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

	CONTROL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	PI - IN - F 21
		VERSIÓN 02
		17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	29-nov.-2020	**HASTA**	20-ene.-2021

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATANTE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA			PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO	OBSERVACIÓN
							SALUD	PENSIÓN	ARL			
1	CESAR MORA BARNEY	19.356.176	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2C INGENIEROS S.A.	23-dic.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							COOMEVA EPS	COLPENSIONES	COLMENA			
2	JAMESSON JESÚS SOSA RODRIGUEZ -	79.958.684	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2C INGENIEROS S.A.	22-nov.-2020	22-dic.-2020	22-nov.-2020	22-nov.-2020	22-nov.-2020	DICIEMBRE	5	
							FAMISANAR	PROTECCIÓN	COLMENA			
3	MITCHEL BRIAN ESPINOSA	1.069.737.799	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA BOYACÁ	2C INGENIEROS S.A.	22-nov.-2020		22-nov.-2020	22-nov.-2020	22-nov.-2020	DICIEMBRE	5	
							FAMISANAR	COLPENSIONES	COLMENA			
4	FLAVIO MORA FERNÁNDEZ	1.020.752.622	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARAUCA Y CASANARE	2C INGENIEROS S.A.	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							COOMEVA EPS	COLPENSIONES	COLMENA			
5	GIOVANNI EDUEN ACOSTA CADENA	91.293.589	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER	2C INGENIEROS S.A.	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							NUEVA EPS	COLFONDOS	COLMENA			
6	JULIETH MARTÍNEZ ANGULO	1.069.052.723	PROFESIONAL EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CALIDAD	2C INGENIEROS S.A.	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							EPS SANITAS	COLPENSIONES	COLMENA			
7	JUANITA SANTOS	1.015.476.366	SECRETARIA	2C INGENIEROS S.A.	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							COMPENSAR	PROTECCIÓN	COLMENA			
8	SANDRA CAROLINA MORA DIAZ	46.457.765	TECNÓLOGO 1	2C INGENIEROS S.A.	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							FAMISANAR	PROTECCIÓN	COLMENA			
9	KATERING FORERO HERNÁNDEZ	1.054.558.189	TECNÓLOGO 2	INDEPENDIENTE	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							FAMISANAR	PORVENIR	COLMENA			
10	MARÍA SOFÍA TRUJILLO	1.016.031.057	PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)	INDEPENDIENTE	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLMENA			
11	DINA LUZ DIAZ LÓPEZ	1.118.536.629	PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)	INDEPENDIENTE	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							SANITAS	PROTECCIÓN	COLMENA			

	CONTROL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	PI - IN - F 21
		VERSIÓN 02
		17-jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	29-nov.-2020	**HASTA**	20-ene.-2021

No.	**NOMBRE**	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**CONTRATANTE**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA**			**PERIODO COTIZADO**	**CLASE DE RIESGO**	**OBSERVACIÓN**
							SALUD	**PENSIÓN**	**ARL**			
12	OSCAR IVÁN CÁRDENAS BARÓN	1.057.599.452	PROFESIONAL DE APOYO (Adicional)	INDEPENDIENTE	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							SANITAS	COLPENSIONES	COLMENA			
13	FRED EVERARDO SUÁREZ OVALLES	88.210.995	TECNÓLOGO DE APOYO (Adicional)	INDEPENDIENTE	27-jul.-2020		27-jul.-2020	27-jul.-2020	27-jul.-2020	DICIEMBRE	5	
							NUEVA EPS	COLFONDOS	COLMENA			

RESPONSABLE		**FECHA**
NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	21-ene.-2020
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
FIRMA		

Anexo 7. Control correspondencia enviada

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	PI IN F 16
		VERSIÓN 00

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	**25-oct.-2020**	**HASTA**	**28-nov.-2020**

FECHA RADICACIÓN	**No. CONSECUTIVO**	**PERSONA Y ENTIDAD A QUIEN SE ENVÍA**	**ELABORADO POR**	**ASUNTO**	**RESPUESTA**		**FECHA DE RESPUESTA**	**CONTENIDO RESPUESTA**	**SATISFACTORIA**	
					SI	**NO**			**SI**	**NO**
3-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-096	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICADO PREVENTIVO No. 1 SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS REGIONAL ARAUCA						
3-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-097	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS	X		7-dic.-2020	REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS		
7-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-098	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA – PRORROGA N. 1						
7-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-099	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 4 DE PERENTORIO ATRASOS DE OBRA SEGÚN PROGRAMACIÓN PRESENTADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020.						
9-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-100	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	REMISIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
9-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-101	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	REMISIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA						
15-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-102	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO SOLICITUD DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
17-dic.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-103	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA – PRORROGA N.1						

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	PI IN F 16
		VERSIÓN 00

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	**25-oct.-2020**	**HASTA**	**28-nov.-2020**

FECHA RADICACIÓN	No. CONSECUTIVO	PERSONA Y ENTIDAD A QUIEN SE ENVÍA	ELABORADO POR	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA	CONTENIDO RESPUESTA	SATISFACTORIA	
					SI	NO			SI	NO
18-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-104	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507 DE 2020 y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 DE 2020.						
18-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-105	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO SOLICITUD DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL						
23-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-106	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	SOLICITUD APROBACIÓN NUEVO PERSONAL DE INTERVENTORÍA						
23-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-107	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICADO No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO REQUERIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LAVADO DE TANQUES						
23-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-108	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICADO No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO REQUERIMIENTO CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y MANUALES DE MANTENIMIENTO						
23-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-109	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO REQUERIMIENTOS PARA PAGO ACTA PARCIAL 4						
28-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-110	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 PREVENTIVO SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN, FLUJO DE FONDOS Y PLAN DE CONTINGENCIA						
28-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-110	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	CONCEPTO TÉCNICO RECONOCIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO.1 PCCNTR.1552507						

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	**25-oct.-2020**	**HASTA**	**28-nov.-2020**

FECHA RADICACIÓN	No. CONSECUTIVO	PERSONA Y ENTIDAD A QUIEN SE ENVÍA	ELABORADO POR	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA	CONTENIDO RESPUESTA	SATISFACTORIA	
					SI	NO			SI	NO
31-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-111	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 01 DE CARÁCTER PREVENTIVO SOLICITUD DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL						
31-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-112	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS – MODIFICACIÓN N.2 CONTRATO DE OBRA	X		31-dic.-2020	REMISION DE POLIZAS ACTUALIZADAS		
31-dic.-2020	RL-SENA LOTE 2-20-113	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	REMISIÓN APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS – TERCERA PARTE						
4-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-114	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA						
5-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-115	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA – PRORROGA N.2						
5-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-116	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA – MODIFICATORIO N.2						
7-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-117	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER PREVENTIVO SOLICITUD PRESENCIA PROFESIONAL SST E IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	X		13-ene.-2021	Respuesta Oficio RL-SENA LOTE 2-2020-117 COMUNICACIÓN No 1 CARÁCTER PREVENTIVO – SOLICITUD PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST E IMPLEMENTACION INMEDIATA PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA CAIDAS.		
7-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-118	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER CORRECTIVO SOLICITUD DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	PI IN F 16
		VERSIÓN 00

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	DESDE	25-oct.-2020	HASTA	28-nov.-2020

FECHA RADICACIÓN	No. CONSECUTIVO	PERSONA Y ENTIDAD A QUIEN SE ENVÍA	ELABORADO POR	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA	CONTENIDO RESPUESTA	SATISFACTORIA	
					SI	NO			SI	NO
13-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-119	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 01 DE CARÁCTER PREVENTIVO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS LABORALES						
13-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-120	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 02 DE CARÁCTER CORRECTIVO SOLICITUD DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL						
13-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-121	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 1 DE CARÁCTER CORRECTIVO SOLICITUD PRESENCIA PROFESIONAL SST E IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS						
13-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-122	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	REMISIÓN PERMISO DE PODA DE ARBOLES						
14-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-123	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Aten: WILSON JAVIER ROJAS MORENO Director administrativo y financiero Aten: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ Profesional Líder del grupo de construcciones Supervisor del contrato de interventoría	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	ADVERTENCIA ANTICIPADA – NO CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONSORCIO JG 2020						
15-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-124	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 02 DE CARÁCTER CORRECTIVO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS LABORALES						
15-ene.-2021	RL-SENA LOTE 2-20-125	CONSORCIO JG 2020 Aten: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR Representante Legal	CESAR ASHLEY MORA BARNEY R/L: 2C INGENIEROS S.A. CONTRATISTA INTERVENTOR;	COMUNICACIÓN No. 01 DE CARÁCTER PREVENTIVO SOLICITUD CONTRATACIÓN DE PERSONAL						

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	21-ene.-2021
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA		

Anexo 8. Control correspondencia recibida.

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	PI IN F 17
		VERSIÓN 00

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	**29-nov.-2020**	**HASTA**	**20-ene.-2021**

FECHA DE RECIBO DEL DOCUMENTO	PERSONA Y ENTIDAD QUIEN ENVÍA	DIRIGIDO A	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA
				SI	NO	
30-nov.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	SOLICITUD PRORROGA PERMISO INGRESO PERSONAL AL SEDES DEL SENA LOTE 2	X		SE REALIZO LA SOLICITUD DE INGRESO EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL LOTE 2
30-nov.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	SOLICITUD INGRESO NORTE DE SANTANDER	X		SE REALIZO LA SOLICITUD DE INGRESO EN LA SEDE
1-dic.-2020	JESSICA LORENA PEREZ VILLAMIL - INGENIERA CIVIL - INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA REGIONAL ARAUCA - SUPERVISION DE LA REGIONAL	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES TRABAJO EN ALTURAS REGIONAL ARAUCA	X		SE REALIZO EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO Y SE EMITIO RESPUESTA
7-dic.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	REMISION ACTUALIZACION POLIZAS	X		SE REALIZO EM TRAMITE ANTE LA ENTIDAD SENA
9-dic.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	DOCUMENTOS ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	X		SE REALIZO EM TRAMITE ANTE LA ENTIDAD SENA
9-dic.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	REMISION PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	X		SE TOMA PARA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
11-dic.-2020	JOSÉ ANDRÉS BUSTOS HERRERA - APOYO A LA SUSPERVISION DEL CONTRATO	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	NOTIFICACIÓN DE NO INICIO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS SEDES DEL CATA - CONTRATO NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - SANTANDER	X		SE TOMARON ACCIONES RESPECTO A LA SOLICITUD
12-dic.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	REPROGRAMACIÓN, FLUJO DE FONDOS Y PLAN DE CONTINGENCIA.	X		
28-dic.-2020	LUIS JAVIER GUANAY MECHE - OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	QUEJA - POR NO PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LEY POR PARTE DEL CONSORCIO JG 2020	X		SE REALIZO EL RESPECTIVO TRAMITE ANTE EL CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	**29-nov.-2020**	**HASTA**	**20-ene.-2021**

FECHA DE RECIBO DEL DOCUMENTO	PERSONA Y ENTIDAD QUIEN ENVÍA	DIRIGIDO A	ASUNTO	RESPUESTA		FECHA DE RESPUESTA
				SI	NO	
29-dic.-2020	MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN - PROFESIONAL G02 COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SENA REGIONAL CASANARE	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	TRASLADO PQRS No.: 7-2020-252308 NIS: 2020-01-326569 - EJA - POR NO PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LEY POR PARTE DEL CONSORCIO JG 2020	X		SE REALIZO EL RESPECTIVO TRAMITE ANTE EL CONTRATISTA DE OBRA
30-dic.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS NO PREVISTOS ENTREGA No. 3	X		SE REALIZO EL TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
31-dic.-2020	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS – MODIFICACIÓN N.2 CONTRATO DE OBRA	X		SE REALIZO EL TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
12-ene.-2021	FERMÍN BELLO JIMÉNEZ - MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA C Copia: INTERVENTORÍA	QUEJA - POR NO PAGO DE SALARIOS POR PARTE DEL CONSORCIO JG 2020 Y NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS EN OBRA	X		SE REALIZO EL RESPECTIVO TRAMITE ANTE EL CONTRATISTA DE OBRA
13-ene.-2021	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	Respuesta Oficio RL-SENA LOTE 2-2020-117 COMUNICACIÓN No 1 CARÁCTER PREVENTIVO – SOLICITUD PRESENCIA DEL PROFESIONAL SST E IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS.	X		
15-ene.-2021	JUAN CARLOS LÓPEZ SÁNCHEZ - AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO JG 2020 R/L: JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR - CONTRATISTA C Copia: INTERVENTORÍA	QUEJA - POR NO PAGO DE SALARIOS POR PARTE DEL CONSORCIO JG 2020 Y NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS EN OBRA	X		SE REALIZO EL RESPECTIVO TRAMITE ANTE EL CONTRATISTA DE OBRA
20-ene.-2021	SERGIO ALFONSO RAMÍREZ FIGUEROA DIRECTOR REGIONAL (E) REGIONAL NORTE DE SANTANDER	2C INGENIEROS S.A. Ing. CESAR ASHLEY MORA BARNEY INTERVENTORÍA	SOLICITUD ATENCIÓN DEFICIENCIAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. CO.I.PCCCNTR.1552507 y CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. COI.PCCNTR.1635455	X		SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS GESTIONES ANTE EL CONTRATISTA DE OBRA PARA EMITIR RESPUESTA FORMAL

RESPONSABLE	FECHA

	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	PI IN F 17 VERSIÓN 00 PAGINA 3 DE 3

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1635455 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".
INTERVENTOR	2C INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO JG 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PERIODO EVALUADO	**DESDE**	**29-nov.-2020**	**HASTA**	**20-ene.-2021**

FECHA DE RECIBO DEL DOCUMENTO	**PERSONA Y ENTIDAD QUIEN ENVÍA**		**DIRIGIDO A**	**ASUNTO**	**RESPUESTA**		**FECHA DE RESPUESTA**
					SI	**NO**	
	NOMBRE	CESAR MORA BARNEY	20-ene.-2021				
	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL					
	FIRMA						

Anexo 9.

Acta entrega de elementos de protección personal

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	José Leonardo Perez		CEDULA	1116 551 667
CENTRO DE TRABAJO	Sena Yopal	CARGO		

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	14/01/21	
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1	14/01/21	
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida	1	14/01/21	
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1	14/01/21	
21	Casco	1	14/01/21	
22	Barbuquejo 3 puntos	1	14/01/21	
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1	14/01/21	
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1	14/01/21	
32	Tapa bocas	5	14/01/21	

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Fermin Bello	CEDULA No.	74859273	
CARGO		FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	José Leonardo Perez	CEDULA No.	1116551667
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jorge luis garavito		CEDULA	1118558799
CENTRO DE TRABAJO	Sena Yopal	CARGO	ayudante	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	21/01/21	Jorge
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1	21/01/21	Jorge
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida	1	21/01/21	Jorge
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1	21/01/21	Jorge
21	Casco	1	21/01/21	Jorge
22	Barbuquejo 3 puntos	1	21/01/21	Jorge
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1	21/01/21	Jorge
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1	21/01/21	Jorge
32	Tapa bocas	5	21/01/21	Jorge

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Jorge luis garavito	CEDULA No.	1118558799	
CARGO	ayudante	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Jorge Luis garavito	CEDULA No.	1118558799
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Eduin Enrique Tovar	CEDULA	23-01-2021
CENTRO DE TRABAJO	Yopal - Casanare.	CARGO	oficial de obra

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida	1		
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1		
21	Casco	1		
22	Barbuquejo 3 puntos	1		
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1		
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
32	Tapa bocas	1		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Maira Lola Soler	CEDULA No.	1098682716	
CARGO	Coordinadora SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Eduin Enrique Tovar Oficial de obra	CEDULA No.	78.702.967
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Juan Carlos Coy Hernandez	CEDULA	1.099.208.290
CENTRO DE TRABAJO	Yopal - Cajanare	CARGO	Oficial de obra

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida	1		
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1		
21	Casco	1		
22	Barbuquejo 3 puntos	1		
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1		
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
32	Tapa bocas	1		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Maira Cala Soler	CEDULA No.	1049632716	
CARGO	Coordinadora SST	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	1.099.208.290
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPI – BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSIÓN: 01
	HSEQ	PAGINA: 1 DE 1

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Fermin Bello Jimenez	CEDULA No.	7485977 3
CARGO	Maestro	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de protección individual y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuye en mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art. 176, Art. 177 y Art, 178; Decreto 1259 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedara archivado en el área de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del consorcio.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	PROTECCIÓN DE MANOS				
Guante Caucho Natural		Guantes de Vaqueta	X	Guantes de Carnaza	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Fermin Bello Jimenez	1	17-11-2020	
Juan Carlos López S.	1	17-11-2020	
Carlos	1	17-11-2020	
	1		
Fermin Bello Jimenez	1	07-12-20	
Juan Carlos Lopez	1	07-12-20	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPI – BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSIÓN: 01
	HSEQ	PAGINA: 1 DE 1

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Fermin Bello Jimenez	CEDULA No.	7d 859773
CARGO	Maestro	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de protección individual y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuye en mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art. 176, Art. 177 y Art, 178; Decreto 1259 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedara archivado en el área de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del consorcio.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	PROTECCIÓN RESPITATORIA					
Mascarilla para aire particulado N95		Respirador Reajustable Media Cara		Mascara Full Face		

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
Fermin Bello Jimenez	3	17-11-2020	
Juan Carlos Lopez S.	3	17-NOV-2020	
Carlos Alvarado	3	17	
Fermin Bello Jimenez	6	07-12-20	
Juan Carlos Lopez	6	07 12 - 20	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	SAUL BENAVIDES PINTO	CEDULA	91.016.642
CENTRO DE TRABAJO	SENA LA 27	CARGO	Pintura

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta	1 UNID		
4	Guantes de Carnaza			
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1 UNID		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida	1 - PAR		
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1 UNID		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Ames con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol			
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	5 UNID		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	SAUL BENAVIDES	CEDULA No.	91 016642
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE		CEDULA	
CENTRO DE TRABAJO		CARGO	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol	1		
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	1		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Camisa Manga Larga			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	85497192
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Osnaider Arregoce Martinez	CEDULA	1095799348
CENTRO DE TRABAJO	Operativo	CARGO	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural	1		
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Camaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95	1		
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol	1		
30	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
31	Tapa bocas	1		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga Larga	1		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Osnaider Arrego	CEDULA No.	1095799348
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	LEIVIS JIMENEZ MARTINEZ	CEDULA	1002235803
CENTRO DE TRABAJO	SENA BUCARAMANGA	CARGO	OFICIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95	1		
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol	1		
30	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
31	Tapa bocas	1		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CAMISA MANGA LARGA	1		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Leivis Jimenez Martinez	CEDULA No.	1002235803	
CARGO	oficial	FIRMA	Leivis Jimenez.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Juan Diego	CEDULA	1007974161
CENTRO DE TRABAJO		CARGO	ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	16 Diciembre	Juan Diego
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes			
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1	16 Diciembre	Juan Diego
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol			
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	1	16 Diembre	Juan Diego

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	1007974161
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ejir Jimenez C.		CEDULA	72 052 951
CENTRO DE TRABAJO	Sena Bucaramanga	CARGO	oficial	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Camaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95	1		
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol	1		
30	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
31	Tapa bocas			

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Camisa manga larga	1		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Ejir Jimenez C.	CEDULA No.	72 052 951
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Dgner Martinez		CEDULA	3821290
CENTRO DE TRABAJO	Sena Bucaramanga	CARGO	Oficial	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95	1		
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol	1		
30	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
31	Tapa bocas			

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Manga larga			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Deiner Martinez	CEDULA No. 3821290	
CARGO	Oficial	FIRMA Deiner M.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Clifton Jimenez		CEDULA	5046991
CENTRO DE TRABAJO	Sede 27	CARGO	Oficial	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1		
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1		
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95	1		
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1		
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol	1		
30	Dispensador personal gel Antibacterial	1		
31	Tapa bocas	1		

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa manga larga	1		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Clifton Jimenez	CEDULA No.	5046991	
CARGO	Oficial	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Sergio Andres Hernandez		CEDULA	1101682117.
CENTRO DE TRABAJO	Sna Socorro.	CARGO	Oficial.	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	14/12/2020	*SERGIO HERNANDEZ
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes			
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1	14/12/2020	*SERGIO A. HERNANDEZ
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol			
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	1	14/12/2020	*SERGIO A. HERNANDEZ

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	SERGIO A. HERNANDEZ	CEDULA No.	1101682 117
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Daniel Parra Sanchez		CEDULA	91 104 788
CENTRO DE TRABAJO	Sena Socorro.	CARGO		Ayudante de obra.

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Gaucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	14/12/2020	x Daniel parra
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes			
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1	14/12/2020	x Daniel parra
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol			
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	1	14/12/2020	x Daniel parra

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	x Daniel parra	CEDULA No.	91 104 788.
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Juan de la Cruz Hernandez.	CEDULA	
CENTRO DE TRABAJO	Sena Socorro.	CARGO	Maestro de obra.

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	14/12/2020	x
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes			
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1	14/12/2020	x
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol			
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	1	14/12/2020	x

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	x	CEDULA No.	91212231.
Vo. Bo. Coordinador HSEQ.			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Kevin Sanchez.		CEDULA	1193127281
CENTRO DE TRABAJO	Sena Socorro.	CARGO	Ayudante	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	18/12/2020.	x Kevin Sánchez
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes			
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA			
20	Casco	1	18/12/2020.	x Kevin Sánchez
21	Barbuquejo 3 puntos			
22	Barbuquejo 4 puntos			
23	Chapulin			
24	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
25	Arnes con eslinga			
26	Linea de vida			
27	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
28	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
29	Dispensador personal de Alcohol			
30	Dispensador personal gel Antibacterial			
31	Tapa bocas	1	18/12/2020.	x Kevin Sánchez

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
32	Camisa manga larga	1	18/12/2020	x Kevin Sánchez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Kevin Sánchez	CEDULA No.	1193127281
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Oscar Darwin Castro	CEDULA	13925195
CENTRO DE TRABAJO	Jcno Mixto	CARGO	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta	1	13-01-2021	
4	Guantes de Carnaza	1	13-01-2021	
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1	13-01-2021	
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1	13-01-2021	
21	Casco	1	13-01-2021	
22	Barbuquejo 3 puntos			
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1	13-01-2021	
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1	13-01-2021	
32	Tapa bocas	10	13-01-2021	

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Luis Domingo Bitar	CEDULA No.	1098121075	
CARGO	Residente	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO		CEDULA No.	13925195
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Neyder Duwar Camacho Cordero	CEDULA	1096958573
CENTRO DE TRABAJO		CARGO Ayudante	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta	1	12-01-2021	
4	Guantes de Carnaza			
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1	13-01-2021	
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida	1	12-01-2021	
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1	11-01-2021	
21	Casco	1		
22	Barbuquejo 3 puntos			
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1	13-01-2021	
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1	13-01-2021	
32	Tapa bocas	10	13-01-2021	

REPOSICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Luis Domingo Becerra	CEDULA No.	1091707075	
CARGO	Residente	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado del EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Nader Camacho	CEDULA No.	1096958573
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	ENTREGA Y REPOSICION DE EPI - BIOSEGURIDAD	CODIGO: F-SST-22
		VERSION:01
	HSEQ	PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Cesar Alvarez Barajas	CEDULA	91349112
CENTRO DE TRABAJO	Sierra Nevada	CARGO	Operario

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) ENTREGADOS

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	PROTECCION DE MANOS			
2	Guantes Caucho Natural			
3	Guantes de Vaqueta			
4	Guantes de Carnaza	1	17-01-2021	Cesar Alvarez
5	PROTECCION DE OJOS			
6	Gafas transparentes	1	17-01-2021	Cesar Alvarez
7	Gafas negras			
8	Careta para Proteccion Facial			
9	PROTECCION AUDITIVA			
10	Protector Auditivo Inserción			
11	Protectores de Copa			
12	PROTECCION RESPIRATORIA			
13	Mascarilla para aire particulado N95			
14	Respirador Reajustable Media cara			
15	Mascara Full Face			
16	PROTECCION DE PIES			
17	Botas Puntera Rigida			
18	Botas de Caucho Puntera Rigida			
19	PROTECTOR DE CABEZA Y CUERPO			
20	Camisa manga larga	1	17-01-2021	Cesar Alvarez
21	Casco	1	17-01-2021	Cesar Alvarez
22	Barbuquejo 3 puntos			
23	Barbuquejo 4 puntos			
24	Chapulin			
25	PROTECCION CONTRA CAIDAS			
26	Arnes con eslinga			
27	Linea de vida			
28	Tripode profesional para trabajo en espacios confinados			
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD			
30	Dispensador personal de Alcohol	1	17-01-2021	Cesar Alvarez
31	Dispensador personal gel Antibacterial	1	17-01-2021	Cesar Alvarez
32	Tapa bocas	10	17-01-2021	

REPOSICION ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

ITEM	EPI ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Luis Eduardo Rivera	CEDULA No.	1098772075	
CARGO	Residente	FIRMA		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los equipos y elementos de proteccion individual recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo), estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979: Art. 85 y Art. 88; RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: Art.176, Art. 177 y Art. 178; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 y Art. 91; LEY 1562 DE 2012: Art. 27. Soy responsable del uso y cuidado deL EPI mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del Consorcio.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Cesar Alvarez	CEDULA No. 91349112	
Vo. Bo. Coordinador HSEQ			

Escaneado con CamScanner

Anexo 10. Soportes trabajo en alturas

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIO JG 2020

Empresa: CONSORCIO JG 2020	Municipio: Girón - Santander
Proceso: obra civil	Proyecto donde se realiza el trabajo:
Fecha: 10/12/20 (dd / mm / aaaa):	Lugar de Trabajo:
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 8:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Descripción de la tarea a realizar: Instalación de cielo raso en PVC.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ✓	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jeferson fabian Ferreto	
Miguel oswaldo Velazco	
Jhon Sebastian Sanabria	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique/Desciba cada una de las herramientas/equipos a utilizar.*
Manuales	x Martillo - Pulsa, cincel, Destornillador
Eléctricas	x Taladro
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

Nombre y Cédula responsable HSE: Maira Cala Soler 1098637716 Firma: _____

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIO JG

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escaleras
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Puntos de anclaje Línea de vida
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes de seguridad Eslinga de posicionamiento
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Cincel, Porra, Destornillador, Taladro Martillo
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIO JG

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Inspección del área	caidas al mismo nivel	- golpes - caidas	- reconocer el area para evitar golpes - caidas
Delimitar el área	caidas al mismo nivel	- Heridas - contusiones	- Precaución en el trabajo - Autocuidado
Instalación de Puc.	Trabajos en alturas	Caida al mismo o diferente nivel	- Trabajo en equipo - Buena comunicación

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIOJG

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

EPP		*Marque con una X al frente de cada elemento si se requiere y al frente especificar en caso de que sea necesario*
Casco	X	
Guantes	X	
Gafas	X	
Botas con puntera	X	
Chaleco		
Protección auditiva		
Eslinga	X	
Arnés	X	
Otras	X	línea de vida

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☒ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

CONSORCIO JG 2020	PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (espacios confinados, trabajo en alturas, trabajos en caliente, trabajos eléctricos)	CÓDIGO: F-SST-37 VERSIÓN: 01 Pág. 1 de 1

FECHA: 10/12/23 HORA DE INICIO: 8:00 HORA FINALIZACIÓN _____

LUGAR: Sede Sena Palenque

TRABAJO A REALIZAR:

Instalación de Cielo raso en PVC

TIPO DE TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

Trabajo en alturas: X Excavaciones: ___ Espacios confinados: ____ Zanjas____
otra___ cual _____

CONDICIONES INICIALES REQUERIDAS	SI	NO
Se realizó la verificación en la lista de chequeo para la actividad a ejecutar	X	
Se identificaron los riesgos e implementaros los controles requeridos	X	
Se informó y notificó a los trabajadores de peligros y controles a implementar	X	

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRE	DOCUMENTO	ARL	EPS	FIRMA
Jeferson Fabian				
Miguel Oswaldo				
Jhon Sebastián				

Nombre y Firma de Responsable de la obra.

Nombre Responsable HSE

CONSORCIO JG 2020	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (Excavaciones, zanjas, espacios confinados, trabajo en alturas)	CÓDIGO: F-SST-38
		VERSIÓN: 01
		Pág. 1 de 1

FECHA DE EXPEDICION: 10 / 12 / 2020

UBICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: Sena Palenque girón

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR: Instalación Cielo raso PVC.

RIESGOS DEL AREA DE TRABAJO:

RIESGO	SI	NO	OBSERVACIONES
Carencia de oxigeno		X	
Presencia de gases tóxicos		X	
Presencia de gases explosivos		X	
Se detectan redes de luz, teléfono	X		
Atrapamientos	X		
Caídas a distinto y mismo nivel	X		
Caídas de objetos al interior	X		
Malas posturas prolongadas	X		
Ruidos excesivos		X	
Riesgo biológico (animales)		X	
Otros:			

PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA EL TRABAJO:

Casco	✓	Arnés	✓
Guantes	✓	Tripode	✓
Botas de seguridad	✓	Anclaje	✓
Gafas	✓	Línea de vida	✓
Mascara	✓	Medidor de oxígeno y otros gases	
Respirador		Equipos de respiración	
Protector auditivo		Equipos de ventilación	
Impermeable		Iluminación	
Otros:			

CONDICION	SI	NO	OBSERVACIONES
Revisó los elementos necesarios antes de iniciar labores.	X		
Verifico si hay existencia de tuberías de gas, agua, eléctricas.	X		
El trabajador se encuentra físicamente apto para ejecutar el trabajo.	X		
Se ha verificado con el trabajador los riesgos del área y sus controles?	X		
Se señaliza y delimite el área de trabajo.	X		
El trabajador tiene entrenamiento y se encuentra capacitado para el trabajo a realizar.	X		
Las condiciones climáticas son favorables y permiten el desarrollo seguro del trabajo.	X		

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA RESPONASBLE HSE-OBRA

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIO JG 2020

Empresa: CONSORCIO JG 2020	**Municipio:** FLORIDABLANCA
Proceso: Demolición de mortero	**Proyecto donde se realiza el trabajo:**
Fecha: 15/02/21 (dd / mm / aaaa):	**Lugar de Trabajo:** CDIM - FLORIDABLANCA - SENA.
Hora de Inicio (a.m./p.m.):	**Hora de Finalización (a.m./p.m.):**
Descripción de la tarea a realizar: Demolición de mortero.	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Hube Caicedo 1094574920	Huber Alfonso
Ramon Espino 85949492	Ramon Espino
Jose Ramiro Garcia 5624573	X

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique/Desciba cada una de las herramientas/equipos a utilizar.*
Manuales	X	Pala, pica.
Eléctricas	X	Taladro, extensión electrica
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Nombre y Cédula responsable HSE: Maira Cala Solar **Firma:**

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIO JG

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10 mts Aprox
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Unicamente Andamio.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Retencion, Sujecion, Puntos Anclaje
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Andamio, Arnes, Linea Vida, Conectores,
¿Cuántos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Requeridos Para la Labor
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIO JG

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
ADECUAR ANDAMIOS	FALLAS EN INSTALACIÓN	CAIDA DE ALTURAS - GOLPES	VERIFICAR LA ESTABILIDAD DEL ANDAMIO
DEFINIR PUNTOS DE ANCLAJE	ANCLAJES NO APTOS	CAIDA DE ALTURAS	VERIFICAR PRUEBA FUERA ANCLAJE
VERIFICAR LOS EPP	MAL ESTADO	CAIDA DE PERSONAS	USAR EQUIPOS EN BUENAS CONDICIONES
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	CONDICIONES DEL TERRENO	CAIDAS AL MISMO NIVEL	REALIZAR EL AREA PARA DEMARCACIÓN
TRASLADO DE MATERIAL	CAIDA DE MATERIAL Y PERSONAS	GOLPES CAIDAS - HERIDAS	AUTO CUIDADO OJO Y MENTE EN TAREA
DEMOLICION CONCRETO	FISICO VIBRACIONES	DOLORES LUMBALES	PAUSAS ACTIVAS ROTACIÓN PERSONAL
	RUIDO - PARTICULADO MATERIAL	DOLOR CABEZA AFECCION RESPIRATORIA	USO DE EPP ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD

ANALISIS DE TRABAJO
SEGURO CONSORCIOJG

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR

EPP	*Marque con una X al frente de cada elemento si se requiere y al frente especificar en caso de que sea necesario*
Casco	X
Guantes	X
Gafas	X
Botas con puntera	
Chaleco	
Protección auditiva	
Eslinga	X
Arnés	X
Otras	X CONECTORES, MOSQUETONES, ESLINGAS, EQUIPO RETRACTIL.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

CONSORCIO JG 2020	PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR). (Excavaciones, zanjas, espacios confinados, trabajo en alturas)	CÓDIGO: F-SST-37 VERSIÓN: 01 Pág. 1 de 1

FECHA: 15/02/2021 HORA DE INICIO: _____ HORA FINALIZACIÓN _____

LUGAR: Sena Floridablanca

TRABAJO A REALIZAR:

Demolición de mortero

TIPO DE TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

Trabajo en alturas: X Excavaciones: ___ Espacios confinados: ____ Zanjas____

otra___ cual _____

CONDICIONES INICIALES REQUERIDAS	SI	NO
Se realizó la verificación en la lista de chequeo para la actividad a ejecutar	X	
Se identificaron los riesgos e implementaros los controles requeridos	X	
Se informó y notificó a los trabajadores de peligros y controles a implementar	X	

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRE	DOCUMENTO	ARL	EPS	FIRMA
Huber Caicedo	1094574970	Sura	Coomeva	
Raimondo Pino	85447142			
Jose Ramiro	5624573	X	X	J R G

Nombre y Firma de Responsable de la obra.

Nombre Responsable HSE – CONSORCIO JG 2020

NOTA ACLARATORIA: Para la firma autorizada del permiso es indispensable se cumplan con todas las condiciones iniciales requeridas y se debe anexar a este documento la lista de chequeo de la actividad a desarrollar.

Anexo 11. Actas de capacitación e inducción.

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: correcto manejo de residuos

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Fermin Bello Jimenez	7485977	Maestro		14-12-2020
2	Juan Carlos Lopez	8604413	Obrero		14-12-2020
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Actividades de alto riesgo

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Rodrigo Andrés Vega Sanabria	1006447209	Ayudante de obra		28/01/2021
2	Juan Fredy Hidalgo Sandoval	1116547988	ayudante		28/01/2021
3	Alexander Carvajal	74347817	electricista		28/01/2021
4	Jorge Luis Garavito	1118558799	ayudante	Jorge luis g.	28/01/2021
5	LEONARDO PEREZ	1116551662	Of		28-01-21
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Protocolo Bioseguridad

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Pedro Andrés Vega Sarabia	1006442094	Auxiliar de obra		20/01/2021
2	Juan Pedro Hidalgo Sarabia	1165479978	Ayudante		20/01/2021
3	Alexander Parvajal	7734784	electricista		20/01/2021
4	LEONARDO PEREZ	1116551667	Of		20/01/21
5	Jorge Luis garavito	1118558791	ayudante	Jorge luis g.	20/01/2021
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Disposición correcta de residuos

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Fermin Bello Jimenez	7456772	Ayudante		05-12-20
2	Jhon Carlos Lopez	8604712	Obrero		05-12-20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Protocolo Bioseguridad

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Juan Pineda	74185695	ayudante		14/12/20
2	Giovany Pongota	1057580018	ayudante	Giovany P.	14/12/20
3	Gerson Andres Parada	74081864	Ayudante		14/12/20
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Cuidado de las manos.

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Juan Sebastian Sanabria	1098754806	oficial	Sebastian Sanabria	10-12-2026
2	Miguel Ignacio Velasco Tique	1098710486	Oficial	Miguel Velasco	10-12-2020
3	Jeferson Fabian Ferreira	1098741169	Oficial		10-12-2020
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Miguel Ignacio Valero Tuque	1090 719 486	Oficial		10-12-2020
2	Jhon Sebastian Sanabria Rey	1098755486	oficial	Sebastian Sanabria	10-12-2020
3	Jeferson fabian ferreira	1093741169	oficial		10-12-20
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA:

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Brayan Durán	1057611224	Ayudante		16/12/2020
2	Harol Posso	1024502083	Oficial		16/12/2020
3	Leonardo Figueroa	1052585333	Oficial		16/12/2020
4	Yeison Hernandez	74245088	Oficial Pintura		16/12/2020
5	Wilson Rodriguez	1096226646	Electrico		16/12/2020
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Trabajo Seguro en Alturas

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Brayan Ducón	1057611224	Ayudante		02/12/2020
2	Leonardo Figuera	1057585333	Oficial	Leonardo Figuera	02/12/2020
3	Harol Posso	1024502083	Oficial		02/12/2020
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Trabajo seguro en Alturas

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Harol Posso	1024502083	Otraal		09/12/2020
2	Leonardo Figueroa	1057585333	Otraal		09/12/2020
3	Brayan Ducón	1057611224	Aprendiz		09/12/2020
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Riesgo y Prevención COVID

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Brayan Ducón	1057611324	Ayudante Oficial		16/12/2020
2	Harol Posso	(1102356716)	Oficial/1024502005		16/12/2020
3	Leonardo Figueroa	1057585333	Oficial	Leonardo Figueroa	16/12/2020
4	Yeison Fernandez	74245088	Oficial Pintura		16/12/2020
5	Wilson Rodriguez	1096222646	Electrico		16/12/2020
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Rotodos de Bioseguridad

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Harol Rosso	1024502083	Oficial		18/01/2021
2	Brayan Duran	1057611224	Oficial / Ayudante		18/01/2021
3	Leonardo Figueroa	1057535333	Oficial	Leonardo Figueroa	18/01/2021
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Trabajo seguro en alturas

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Harol Posso	1024502083	Oficial		18/01/2021
2	Brayan Duran	1057611224	Oficial		18/01/2021
3	Leonardo Figueroa	1057585333	Oficial		18/01/2021
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Riesgo COVID-19

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Harol Posso	1024502083	Oficial		18/01/2021
2	Brayan Rincon	1057611224	Oficial		18/01/2021
3	Harol				
4	Leonardo Fagroda	1057585333	Oficial	x Leonardo Fagroda	18/01/2021
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Trabajos en alturas Actos inseguros.

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Oscaido Arregoce M.	1095799348	oficial		15-12-2020
2	Elir Jimenez Camacho	92052951	oficial		15-12-20
3	Leuis Jimenez Martinez	1002230803	oficial	Leuis Jimenez	15-12-20
4	Elkin Jimenez	5046991	oficial		15-02-20
5	Deiner. Martinez.	3821290	ofic	Deiner M.	15-12-20
6	Juan diego de oro	1007974161	pintor	Juan diego	16-12-20
7	Huber Alfonso	1094574920	oficial	Huber Alfonso	16-12-20
8	JoseRamiroBarcia	obrero	5624573	J R B	+
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Desinfección de epp- Dotación y Herramientas de Trabajo.

	DATOS TRABAJADOR			ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Heider Alfonso	1094574920	oficial	Heider Alfonso	16-12-2020
2	Ramon Espino	85147142	Ay	Ramon Espino	16/12/2020
3	Jose Ramiro Garcia	5624573	+	+	+
4	Juan diego de oro	1007974161	ay	Juan de oro	16-12-20
5	Wilson Cifuentes	91297394	ayudante	Wilson Cifu	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Toma de Temperatura

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Hyber Alfonso	1094574920	oficial	Hyber Alfonso	16-12-2020
2	Raymond Ospino	8.704.712	AY		16/12/2020
3	JOSE Ramiro	5624573	obrero	J R G	✓
4	Juan Diego de oro	1007974161	ay	Juan de oro	16-12-20
5	Wilson Cifuentes	91297391	ayudante	Wilson Cif	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: INDUCCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Osnaider Arregoces M.	1095 799.348	oficial		15-12-2020
2	Leivis Jimenez Martinez	1002235803	oficial	Leivis Jimenez	15-12-20
3	Eljr Jimenez Campo	72052951	oficial		15-12-20
4	Olga Jimenez C	50468481	oficial		13-12-20
5	Deiner. Martinez.	3821290	Oficial		14-12-20
6	Juan Diego De Oro	1007974161	Pintor	Juan Diego	16-12-20
7	Heber Alonso Caicedo	1094574920	oficial	Heber Alonso	16/12/20
8	Jose Ramiro Garcia	56245 73	obrero	Wilson Cere	16/12/20
9	Wilson Cifuentes	91247394	ayudante		16/12/20
10	Saul Pardo	91016642	oficial	Saul Pardo	16-12-20
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACION	Código:	F-SST-40
		Versión:	1

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 3 FEBRERO

HORA DE INICIO:

LUGAR SENA 95

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: CONDUCTA RESOLUTIVA

NOMBRE CONFERENCISTA: DIEGO SANCHEZ

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Ismael Jaramillo	91132735	AYUDANTE	
Lucrecia Torres	13537324	AYUDANTE	
Saul Bernardes	9101 6642	PINTOR	
Hector Alfonso Ramirez	1094579920	of	Hector Alfonso Ramirez
Geovany P. A.	88244083	Oficial	Geovany P. A. J R G

CONSORCIO JG 2020	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACION	Código:	F-SST-40
		Versión:	1

CIUDAD Y FECHA:

HORA DE INICIO: LUGAR

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: TAREAS ALTO RIESGO

NOMBRE CONFERENCISTA: DIEGO A SANCHEZ

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Saul Benavides	91016642	Pintor	
Hader Alfaro	1094574920	OT	
Eugenio Torres	13537354	ayudante	
Jiji Ille.	91137735	Auxiliar	
R Y Monos	91118599798		R y mon
Georany P. A	88244083	oficial	Georany P.A.
Ramiro Garcia	5624573	Obrero	

CONSORCIO JG 2020	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACION	Código:	F-SST-40
		Versión:	1

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 20 ENERO 2021

HORA DE INICIO: 7:30 a

LUGAR SEDE 27

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:

NOMBRE CONFERENCISTA:

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
SAUL BENAVIDES	91016617	PINTOR	
Nestor Alonso	1094574920	of	
Eugenio Lopez	1153732214	Ayudante	
Jhi Jaylle	91132735	Ayudante	
RAMIROS DIAZ	88591718		
Geovany P.A.	88214083	oficial	Geovany P.A.
Jose Ramiro	5624573	obrero	

CONSORCIO JG 2020	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACION	Código:	F-SST-40
		Versión:	1

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 7 ENERO 2021

HORA DE INICIO: 7:00 LUGAR OBRA 27

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: lavado de manos.

NOMBRE CONFERENCISTA: Maira Cala Soler

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Saul Benavides	91016602	Pintor	
Hubert Alfonso	1094574920	of	
Excavatorista	13537	Ayudante	
Fabian Perez	91132735	ayudante	
Ramon Espino	88991712	A T	
Geovany P.A.	88244083	oficial	
Jose Garcia	5624573	obrero	

CONSORCIO JG 2020	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACION	Código:	F-SST-40
		Versión:	1

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 12 ENERO

HORA DE INICIO: 8:00 LUGAR SENA 27

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: ORDEN - ASEO -

NOMBRE CONFERENCISTA: DIEGO ASANTEA

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Javier Jaramillo.	9013273 5	Auxiliar	
Eugenia Tarazo	1253737 4	Auxiliar	
Saul Benavides	91016647	Planeador	
Nubia Abreo	1094574920	Af	
Ramon Aspiro	88594778	Aux	
Geovany P. A.	88244083	Oficial	Geovany P.A
Jose Eduardo Obrero	56245733	J R G	

CONSORCIO JG 2020	CONTROL DE ASISTENCIA CAPACITACION	Código:	F-SST-40
		Versión:	1

CIUDAD Y FECHA: BUCARAMANGA 27 enero 21

HORA DE INICIO: 7:00 LUGAR SENA 27.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: LAVADO DE MANOS

NOMBRE CONFERENCISTA: MAIRA ALEJANDRA CALA SOLER

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
SAUL BENAVIDES	91016641	PINTOR	
Nelson Alfaro	1094574920	of	
Eucaria torre-	1353720	of	
Javier Jaime.	91136735		
R.L monospina			R.L monos
Georany P.A.	88244053	oficial	Georany P.A
Ramiro Garcia	5624575	obrero	J R G

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA:

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Kevin Sanchez.	1193127281	Ayudante de obra.	Kevin Sánchez	22/12/2020.
2	Juan de la Cruz Hernandez	91212231	Maestro de obra.		22/12/2020.
3	Daniel Parra. Sanchez.	91 104 788.	Ayudante de obra.	Daniel Parra	22/12/2020
4	Sergio Hernandez	1101682117	Oficial de obra.	SERGIO A. HERNÁNDEZ.	22/12/2020.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Lavado de manos

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Jairo Bravo	91342214	Tecnico		29-01-21
2	Oscar Rodas	77925798	Ayudante		29-01-21
3	Luis Zarate	13929304	Obrero		29-01-21
4	Cesar olivares	91349112	Oficial		29-01-21
5	Gikin Guevara	1005230749	Obrero		29-01-21
6	Julian Yesid Guevara	1007917126	OBRERO		29/01/21
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Charla de Tapa Bocas

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Jose Manuel Fernandez	13357118	Maestro		29 01 2021
2	Junior Joel Palencia Contreras	1.127.349.330	Ayudante	Junior P.	29-01-2021
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

CONSORCIO JG 2020	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO
	CONTRATO DE OBRA	"Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA, a nivel nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y a monto agotable"	
	FORMATO	ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	TEMA: Charla de Ingreso

DATOS TRABAJADOR				ASISTENCIA	
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	FECHA
1	[illegible]	73925198	Ayudante	[signature]	13-01-2021
2	Neyder Duvan Camacho Cod	1096958573	Ayudante	[signature]	13-01-2021
3	Cesar Alberto Barajas	91344112	Oficial	[signature]	13-01-2021
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Leonardo Perez	FECHA:	14/01/21
AREA:		CARGO:	Oficial

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Tembiores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 14 / MES 01 / AÑO 21	Oficial obra	Nombre Jose Leonardo Perez Cedula 1118555664

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Jorge Luis Garavito	FECHA:	21/01/2021
AREA:		CARGO:	ayudante

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	—	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	—	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	—	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	—	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.		
Le socializaron las políticas de la empresa.	—	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	—	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	—	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	—	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	—	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	—	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	—	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	—	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	—	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS	MECÁNICO
- Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	- Gases - Vapores - Humos - Solventes	- Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	- Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES	**CARGA FÍSICA**	**LOCATIVOS**	**SANEAMIENTO**
- Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	-Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	- Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	- Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS	**NATURALES**	**ELÉCTRICOS**	**TRÁNSITO**
- Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	- Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	- Contacto con altas o bajas tensiones de energía	- Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 21 / MES 01 / AÑO 21	ayudante	Nombre Cedula 1118558799

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Edwin Enrique Hoyos	FECHA:	23-01-2021
AREA:	Operativa	CARGO:	Oficial de obra

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EÑ EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 23 / MES 01 / AÑO 2021	Oficial de obra	Nombre Edwin Enrique Cedula 78.702.467

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Juan Carlos Coy Hernandez	FECHA:	23-01-2021
AREA:	Operativa	CARGO:	Oficial de obra.

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	✓	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	✓	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	✓	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	✓	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
Le socializaron las políticas de la empresa.	✓	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	✓	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	✓	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	✓	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	✓	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	✓	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	✓	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	✓	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	✓	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Caracteristicas del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 23 / MES 01 / AÑO 2021	Oficial de obra	Nombre [signature] Cedula 1.099.208.290

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	SAUL BENAVIDES	FECHA:	DIC 16/2020
AREA:		CARGO:	

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 16 / MES 12 / AÑO 2020	SAUL BENAVIDES	Nombre Juan Diego Cedula 9L016642

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Ramon Ospino	FECHA:	09-12-20
AREA:		CARGO:	

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	✓	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	✓	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	✓	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	✓	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
Le socializaron las políticas de la empresa.	✓	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	✓	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	✓	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	✓	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	✓	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	✓	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	✓	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	✓	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	✓	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS	MECÁNICO
- Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	- Gases - Vapores - Humos - Solventes	- Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	- Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES	**CARGA FÍSICA**	**LOCATIVOS**	**SANEAMIENTO**
- Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	-Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	- Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	- Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS	**NATURALES**	**ELÉCTRICOS**	**TRÁNSITO**
- Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	- Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	- Contacto con altas o bajas tensiones de energía	- Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 09 / MES 12 / AÑO 20	obrero	Nombre Ramon Ospina Cedula 85747147

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Osnaider Arregoces M.	FECHA:	15-12-2020
AREA:	Operativa	CARGO:	Oficial

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	✓	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	✓	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	✓	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	✓	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
Le socializaron las políticas de la empresa.	✓	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	✓	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	✓	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	✓	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	✓	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	✓	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	✓	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	✓	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	✓	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 15 / MES 12 / AÑO 2020	Oficial	Nombre Osnaider Cedula 1095749348

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Lewis Jimenez M.	FECHA:	15/12/20
AREA:	Operativo	CARGO:	oficial

CONO2CA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA _____ / MES _____ / AÑO _____	OFICIAL	Nombre Lewis Jimenez M. Cedula 1002135803

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 2	

NOMBRE:	JOSE ROMIRO BOCHO	FECHA:	5621573
AREA:		CARGO:	

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros. -	✓	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	✓	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	✓	
Le socialización el reglamento interno de trabajo.	✓	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	✓	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
Le socializaron las políticas de la empresa.	✓	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	✓	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	✓	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	✓	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	✓	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	✓	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	✓	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	✓	
Sabe los derechos y deberes que tiene por ser empleado de la empresa	✓	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo".

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA __/ MES __/ AÑO ____ 4 9	obrero	Nombre _____ Cedula _____

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Ejir Jimenez C.	FECHA:	15/12/2020
AREA:		CARGO:	oficial

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	✓	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	✓	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	✓	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	✓	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
Le socializaron las políticas de la empresa.	✓	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	✓	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	✓	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	✓	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	✓	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	✓	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	✓	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	✓	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	✓	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS	MECÁNICO
- Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	- Gases - Vapores - Humos - Solventes	- Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	- Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES	**CARGA FÍSICA**	**LOCATIVOS**	**SANEAMIENTO**
- Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	-Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	- Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	- Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS	**NATURALES**	**ELÉCTRICOS**	**TRÁNSITO**
- Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	- Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	- Contacto con altas o bajas tensiones de energía	- Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 15 / MES 12 / AÑO 2020	Oficial	Nombre Ejir Jimenez C. Cedula 72032951

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Deiner. Martinez	FECHA:	15 - 12 - 2020
AREA:	Operativa	CARGO:	Oficial

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 15 / MES 12 / AÑO 20	AYUDANTE	Nombre Deiner. Martínez Cedula 3821290

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Clifton Jiménez	FECHA:	15/12/20
AREA:	Operativa	CARGO:	oficial

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	✓	
Horario lunes a viernes: DE _____ a _____ Sábados DE _____ a _____	✓	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	✓	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	✓	
INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
Le socializaron las políticas de la empresa.	✓	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	✓	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	✓	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	✓	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	✓	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	✓	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	✓	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	✓	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	✓	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 15 / MES 12 / AÑO 20	oficial	Nombre Clifton Jimenez Cedula 5044991

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Kevin Sanchez	FECHA:	18/12/2020.
AREA:	Construcción	CARGO:	Ayudante

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE 7:00 am a 6:30PM Sábados DE 7:00 am a 3:00 am	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 18 / MES 12 / AÑO 2020.	Ayudante, movimiento material	Nombre Kevin Sánchez Cedula 1193127281

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Juan de la Cruz. Hernandez	FECHA:	14/12/2020.
AREA:	Construcción	CARGO:	Maestro de obra.

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.		
Horario lunes a viernes: DE 7:00am a 6:30PM Sábados DE 6:00am a 3:00 PM	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elémentos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido Inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 14 / MES 12 / AÑO 2020.	Maestro de obra.	Nombre [signature] Cedula 91212231

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	CODIGO: F-SST-22
		HSEQ
		Código: F-SST-10 / Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1

NOMBRE:	SERGIO ANDRÉS HERNÁNDEZ	FECHA:	12-DIC-2020
AREA:		CARGO:	MAESTRO CONSTRUCCIÓN

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE 7.AM a 7P.M Sábados DE 7A.M a 5.PM.	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido Inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad Industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 12 / MES 12 / AÑO 2020	MAESTRO	Nombre SERGIO A HERNÁNDEZ Cedula 1106682117 Socorro

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Daniel parra sanchez	FECHA:	12
AREA:		CARGO:	

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	Si	
Horario lunes a viernes: DE 7:00am a 6:30PM Sábados DE 6:00am a 3:00PM	V	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 12 / MES 12 / AÑO 2020	AYUDANTE OPERACIÓN	Nombre Daniel parra Cedula 99 [illegible] 88

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Oscar Dario Castro	FECHA:	13-01-2021
AREA:	Sin Definir	CARGO:	Ayudante

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.		
Horario lunes a viernes: DE 7 am a 5 Pm Sábados DE 7 am a 12 Pm	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS	MECÁNICO
- Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	- Gases - Vapores - Humos - Solventes	- Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	- Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES	**CARGA FÍSICA**	**LOCATIVOS**	**SANEAMIENTO**
- Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	-Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	- Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	- Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS	**NATURALES**	**ELÉCTRICOS**	**TRÁNSITO**
- Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	- Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	- Contacto con altas o bajas tensiones de energía	- Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 13 / MES 01 / AÑO 2021	Ayudante	Nombre Oscar Cedula 73925798

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA.	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Neyder Duvan Camacho Cadena	FECHA:	13-01-2021
AREA:		CARGO:	Ayudante

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE 7 am a 5 pm Sábados DE 7 am a 12 pm	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMIDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 13 / MES 01 / AÑO 2021	Ayudante	Nombre Neyder Camacho Cedula 1096958573

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	FORMATO DE INDUCCION PERSONAL NUEVO EN OBRA	HSEQ	
		Código: F-SST-10	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

NOMBRE:	Cesar Olivares Dajajas	FECHA:	13/01/21
AREA:		CARGO:	Oficial.

CONOZCA LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PUEDAN GENERERAR

INDUCCIÓN AL CARGO Y DE LA EMPRESA	SI	NO
Le informaron el tipo de contrato, horarios laborales, tiempo de descanso entre otros.	X	
Horario lunes a viernes: DE 7 am a 5 Pm Sábados DE 7 am a 12 Pm	X	
Le informaron de las funciones a desempeñar.	X	
Le realizaron recorrido por la empresa, sitio de trabajo, presentación de compañeros y demás	X	
INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
Le socializaron el reglamento de higiene y seguridad industrial.	X	
Le socializaron las políticas de la empresa.	X	
Le socializaron sobre los comités que tiene la empresa y sus integrantes	X	
Sabe si en su área de trabajo necesita usar de Elementos de Protección Personal	X	
Le socializaron los riesgos a los cuales está expuesto en el área de trabajo.	X	
Sabe quién es el responsable de la SST y conoce los procedimientos seguros para el trabajo.	X	
Sabe que significa el termino Accidente de Trabajo.	X	
Sabe qué debe hacer en caso de ocurrir un incidente u accidente de trabajo	X	
Le dijeron qué es una emergencia y que hacer en caso que se presente, (plan de emergencias)	X	
Le socializaron el protocolo de Bioseguridad de la empresa	X	

ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMDEDADES LABORALES

FISICOS - Ruido - Iluminación - Vibraciones Temperaturas y Radiaciones	**QUIMICOS** - Gases - Vapores - Humos - Solventes	**BIOLOGICOS** - Virus - Hongos - Bacterias - Protozoos	**MECÁNICO** - Se presenta por las condiciones inadecuadas de funcionalidad
PSICOSOCIALES - Condiciones de la tarea - Jornada de trabajo - Gestión organizacional - Características del trabajo	**CARGA FÍSICA** -Posturas Prolongadas - Movimiento repetitivo - Manipulación de cargas y Esfuerzo	**LOCATIVOS** - Pisos - Techos - Pasillos - Escaleras	**SANEAMIENTO** - Residuos de líquidos y solidos - Almacenamiento - Manipulación
PÚBLICOS - Violencia social (Atracos) - Secuestros - Atentados terroristas - Asonadas	**NATURALES** - Tormentas - Temblores - Deslizamientos - Terremoto	**ELÉCTRICOS** - Contacto con altas o bajas tensiones de energía	**TRÁNSITO** - Eventos generados por colisiones, volcamientos, atropellamiento por medio de transporte

"Declaro que he recibido inducción y que me comprometo a cumplir de forma responsable con las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo"

De conformidad con lo anterior firma:

FECHA	LABOR QUE VA A DESEMPEÑAR EN LA EMPRESA	NOMBRE Y CEDULA DEL TRABAJADOR
DÍA 13 / MES 01 / AÑO 2021	Oficial	Nombre Cesar Olivares D Cedula 91349112

Escaneado con CamScanner

Anexo 12. Actas de verificación síntomas COVID-19 y toma temperatura

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301 Barrio Chapinero Alto
Tel.: (57+) ( )1 212 18 65
Móvil: (57) 315 341 91 29

YOPAL - CASANARE
Carrera 24 # 16-16 Barrio los Helechos
Tel.: (57+) ( )8 6344557

MEDELLÍN – ANTIOQUIA
Calle 103 C # 67 - 11 Barrio Girardot
Tel.: (57+) ( )4 557 57 51
Móvil: (57+)319 216 16 56

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07-12-20	Felmin	Bello Jimenez	71859773	Maestro		7: am	36.2	-			
07-12-20	Juan Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.2	-			
09-12-20	Felmin Bello	Bello Jimenez	71859773	Maestro		7: am	35.9	-			
09-12-20	Juan Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.1	-			

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
10-12-20	Felmin	Bello Jimenez	71859773	Maestro		7: am	36.1		-	5: Pm	36.2	
10-12-20	Juan Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.1			5: Pm		
11-12-20	Felmin	Bello Jimenez	71859773	Maestro		7: am	36.0		-	05 Pm	36.3	
11-12-20	Juan Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.2		-	05 Pm		

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
12-12-20	Felmin	Bello Jimenez	71859773	Maestro		7: am	35.8	-	12 Pm	36.2	
12-12-20	Juan Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.0	-	12- Pm		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
30-11-20	Fermin	Bello Jimenez	74859773	Ayudante		7: am	36.0	✓			
30-11-20	Jhon Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.3	✓			
30-11-20											
01-12-20	Fermin	Bello Jimenez	74859773	Ayudante		7: am	36.1	✓			
01-12-20	Jhon Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.2	✓			

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTA DE S
02-12-20	Fermin	Bello Jimenez	74859773	Ayudante		7: am	35.9		✓			
02-12-20	Jhon Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7:00	35.8		✓			
03-12-20												
03-12-20	Fermin	Bello Jimenez	74859773	Ayudante		7: am	35.9					
03-12-20	Jhon Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7:00	36.0		✓			
03-12-20												

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
04-12-20	Fermin	Bello Jimenez	74859773	Ayudante		7: am	36.1				
04-12-20	Jhon Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.3	✓			
05-12-20	Fermin	Bello Jimenez	74859773	Ayudante		7: am	36.0				
05-12-20	Jhon Carlos	Lopez	86047413	Obrero		7: am	36.1	✓			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07-12-20	Fermin	Bello limenez	7485977[illegible]	Maestro		7:01 am	36.2				
07-12-20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Oficio		7:04 am	36.2				

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTA DE S

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14-12-20	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.1	ok	5:00	36.1	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	36.3	—	5:00	36.1	
15/12/20	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.3	—	5:00	35.9	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	36.1	—	5:00	36.0	
16-12-20	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	35.9	—	5:00	36.1	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	36.1	—	5:00	36.0	
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
17-12-20	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.1	—	5:00	36.1	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7 am	35.9	—	5:00	36.1	
18-12-20	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.3	—	5:00	36.2	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	35.9	—	5:00	36.0	
19-12-20	fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.1	—	5:00	36.1	
	Juan Carlos	lopez	8604345	Obrero	—	7: am	36.3	—	5:00	36.1	
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
22-12-20	fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	35.8	—	5:00	36.1	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	36.1	—	5:00	36.3	
23-12-20	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.1	—	5:00	35.9	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	36.3	—	5:00	36.3	
04-01-21	Fermin	Bello	74859772	Maestro	—	7: am	36.2	—	5:00	36.3	
	Juan Carlos	lopez	8604345	obrero	—	7: am	36.1	—	5:00	36.1	

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
22-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7. AM	34.1	✓	5. PM	36.3	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
22-12-20	Giovanny	Bonilla	1057580076	oficial	No	7. AM	33.4	✓	5. PM	35.4	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
22/12/2020	Cristian Andres	Parra Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33	✓	5pm	35	✓

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
15-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	No	7 AM	36.5	✓	5 PM	36.3	✓
16-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7AM	32.9	✓	5 PM	35.1	✓
17-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7 AM	34.5	✓	5 PM	36.8	✓
18-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7 AM	353	✓	5 PM	36.4	✓
19-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7. AM	33.1	✓	5 PM	35.7	✓
20-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7. AM	35.6	✓	5 PM	36.2	✓
21-12-20	Juan	Pineda S	74185695	oficial	NO	7 AM	34.4	✓	5 PM	36.4	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
15-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	No	7. Am	33.4	✓	5. Pm	36.4	✓
16-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	NO	7. Am	34.2	✓	5 Pm	36.2	✓
17-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	No	7. Am	32.4	✓	5 Pm	35.3	✓
18-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	No	7. Am	33.4	✓	5. Pm	34.4	✓
19-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	No	7 Am	34.4	✓	5. Pm	35.4	✓
20-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	No	7. Am	33.4	✓	5. Pm	34.4	✓
21-12-20	Giovanny	Ponsuta	1057580078	oficial	No	7. Am	34.4	✓	5. Pm	35.3	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
15/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.5	✓	5 Pm	35	✓
16/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	53	✓	5 Pm	35.5	✓
17/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	32.5	✓	5pm	35	✓
18/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	32	✓	5pm	34	✓
19/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33	✓	5 Pm	35.5	✓
20/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.5	✓	5 Pm	35	✓
21/12/2020	Gerson Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	34	✓	5 Pm	34	✓

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07-12-20	Juan Pineda	Salcedo	74185695	oficial	NO	7 AM	35.4	✓	5 PM	36.7	✓
09-12-20	Juan Pineda	Salcedo	74185695	oficial	NO	7 AM	34.5	✓	5 PM	36.3	✓
09-12-20	Juan	Pineda	74185695	oficial	NO	7 AM	32.6	✓	5 PM	36.3	✓
10-12-20	Juan	Pineda	74185695	oficial	NO	7 AM	34.5	✓	5 PM	36.7	✓
11-12-20	Juan	Pineda	74185695	oficial	NO	7 AM	32.8	✓	5 PM	35.8	✓
12-12-20	Juan P	Pineda	74185695	oficial	NO	7 AM	34.9	✓	5 PM	36.4	✓
14-12-20	Juan Pineda		74185695	oficial	NO	7 AM	36.3	✓	5 PM	35.7	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07/12/20	Giovanny Ponce	Perez	1057580078	oficial	No	7. Am	33.4	✓	5. Pm	35.2	✓
08/12/20	Giovanny	Peruta	1057580078	oficial	No	7. Am	34.3	✓	5. Pm	36.7	✓
09/12/20	Giovanny	Peruta	1057580078	oficial	No	7. Am	35.4	✓	5. Pm	34.2	✓
10/12/20	Giovanny	Peruta	1057580078	oficial	No	7. Am	33.4	✓	5. Pm	35.7	✓
11/12/20	Giovanny	Peruta	1057580078	oficial	No	7. Am	34.2	✓	5 Pm	36.7	✓
12/12/20	Giovanny	Peruta	1057580078	oficial	No	7. Am	33.4	✓	5 Pm	35.2	✓
14/12/20	Giovanny	Peruta	1057580078	oficial	No	7. Am	34.2	✓	5 Pm	35.2	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.7	✓	5 Pm	35	✓
08/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.5	✓	5 Pm	35.5	✓
09/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.0	✓	5 Pm	36	✓
10/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	34.5	✓	5 Pm	34	✓
11/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	32.5	✓	5 Pm	34.5	✓
12/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.5	✓	5 Pm	34.5	✓
14/12/2020	Edison Andres	Parada Camargo	74081864	Ayudante	No	7 Am	33.5	✓	5 pm	34	✓

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
21-12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7.00	35.4	Normal	5.00	36.7	Normal
22 12 2000	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	34.7	Normal	5.00	36 2	Normal
23 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	36 2	Normal	500	35 4	Normal
24 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	35 4	Normal	500	35 7	Normal
28 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	35 2	Normal	500	34 2	Normal
29 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	34 9	Normal	5:00	34.3	Normal
30 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	35.0	Normal	5:00	34.4	Normal

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14 12 2020	Wilson	Vargas	74 337 137	Ayudante	NO	7 AM		Normal	5 PM	36 4	Normal
14 12 2020	Jan Manuel	Fariñas	13557118	Oficial	NO	7 AM	33.4	Normal	3 PM	36.0	Normal
14 12 2020	JHONNY	PEREZ	1127924958	Soldador	NO	7 AM		NORMAL	34.2	35.2	NORMAL
15-12-2020	EDWIN	Hoyos.	78.702.967	Oficial	NO	7. AM.	35.1	NORMAL	35.3	35.	NORMAL
15 12 2020	Wilson	Vargas	74331 137	Ayudante	NO	7 AM	34 3	Normal			
15 12 2020	JHONNY	PEREZ	1127924958	SOLDADOR	NO	7 AM	32.2	NORMAL	32.2		
16-12-2020	EDWIN	HOYOS.	78.702.967	Oficial	NO	7. AM.	35.1	NORMAL	5. P. M	36.3	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
16 12 2020	Wilson	Vargas	74337137	Ayud	NO	7 AM	98.3	Normal	5 PM	36 5	Normal
17. 12. 2020	EDWIN	Hoyos.	78.702.967	Oficial	NO	7 AM.	35.0	NORMAL		36.1	NORMAL
17 12 2020	Wilson	Vargas	74 337 137	Ayudante	NO	7 AM	33 4	Normal	5 PM	33.3	Normal
18-12-2020	EDWIN	Hoyos.	78.702.967	Oficial	NO	7 AM	36.2				
18 12 2020	JHONNY	PEREZ	1127924958	SOLDADOR	NO	7. AM.	35.2	NORMAL			
18 12 2020	Wilson	Vargas	74337137	Ayudante	NO	7 AM	33 4	Normal.			

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
08 12 20	Wilson	Vargas	74 337 737	Ayudante	NO	7 AM	32 1	Normal		35 2	Normal
08.12.20	Jose Manuel	Fuentes	13 375 118	Oficial	NO	7 AM	33. 8	Normal		36. 3.	Normal
08 12 20	Jhonny	perez	1127924958	Soldador	NO	7 AM	33.4	Normal		36 3	Normal
9. 12 2020	Edwin	Hoyos.	78.702.967	Oficial	NO	7. AM.	34. 8	NORMAL	5. PM	36.3	NORMAL
9 12 2020	Wilson	Vargas	74 337 737	Ayudante	NO	7 AM	32 3	Normal		36 0	Normal
9. 12. 2020	Jose Manuel	Fuentes	13 375 118	Oficial	NO	7 AM	33. 4	Normal	5:00 PM	35.8	Normal
10-12-2020	Edwin. H	Hoyos	78.702.967	Oficial	NO	7. A.M.	35.5	NORMAL	5. PM.	36.0	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
10. 12. 2020	Jose Manuel	Fuentes	13375118	Oficial	NO	7 AM	35.8	Normal	3 PM	36 2	
10 12 2020	Wilson	Vargas	74 337 737	Ayudante	NO	7 AM	34. 9	Normal	3 PM	36 5	Normal
11-12-2020	Edwin	Hoyos.	78 702.967	Oficial	NO	7. AM.	36. 3.	NORMAL	5. PM.	36.0	NORMAL
11 12 2020	Wilson	Vargas	74337 737	Ayudante	NO	7 AM	32. 4	Normal	5 PM	36 .2	Normal
11 12 207	Jhonny	perez	1127924958	Soldador	NO	7 AM	33. 2	Normal	36.2	5. PM	Normal
11. 12 2020	Jose Manuel	Fuentes	13 375 118	Oficial	NO	7 AM	35. 3	Normal	36.3	5 PM	Normal
12-12-2020	Edwin. H	Hoyos.	78.702.967	Oficial	NO	7. A.M.	35.0	NORMAL	12.7.M.	36. 3.	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
12 12 2020	Wilson	Vargas	74 337 737	Ayudante	NO	7 AM	33.4	Normal	12 P	36 3	Normal
12 12 2020	Jhonny	perez	1127924958	soldador	NO	7 AM	34.3	NORMAL		36 9	Normal
12-12-2020	Jose Manuel	Fuentes	13375118	Oficial	NO	7 AM	34.0	Normal	2. PM		
12 12 200	Jose Manuel	Fuentes	13375118	Oficial	NO	7 AM	34. 2	Normal	2 PM	36. 8	Normal
13.12.2020	Jhonny	perez	1127924958	Soldador	NO	7 AM	34.2	NORMAL			
13 12 2020	Wilson	Vargas	74337737	Ayudante	NO	7 AM	36 3	Normal			
14.12.2020	Edwin. H	Hoyos.	78.702.967	Oficial	NO	7. AM.	36.2.	NORMAL	5.	35.1.	NORMAL

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
21-12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7.00	35.4	Normal	5.00	36.7	Normal
22 12 2000	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	34.7	Normal	5.00	36 2	Normal
23 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	36 2	Normal	500	35 4	Normal
24 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	35 4	Normal	500	35 7	Normal
28 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	35 2	Normal	500	34 2	Normal
29 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	34 9	Normal	5:00	34.3	Normal
30 12 200	Jose Manuel	Fernandez	13357118	Aseo	NO	7 AM	35.0	Normal	5:00	34.4	Normal

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL D IO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
21-01-21	OMAR	PUERTA	7586603	MAESTRO	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.2	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
22-01-21	OMAR	PUERTA	7586603	MAESTRO	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
23-01-21	OMAR	PUERTA	7586603	MAESTRO	NO	7AM	36.2	NORMAL	1PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36.1	NORMAL	1PM	36.2	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36	NORMAL	1PM	36	NORMAL
25-01-21	OMAR	PUERTA	7586603	MAESTRO	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.2	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
26-01-21	OMAR	PUERTA	7586603	MAESTRO	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.2	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36	NORMAL	5PM	36	NORMAL
27-01-21	OMAR	PUERTA	7586603	MAESTRO	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116.808609	AYUDANTE	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36	NORMAL	5PM	36	NORMAL

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL L ..RIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
28-01-21	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.0	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36.	NORMAL	5PM	35.9	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36.	NORMAL
29-01-21	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7AM	36.0	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116.808609	AYUDANTE	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36.	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36.2	NORMAL	5PM	36.2	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
30-01-21	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7AM	36.1	NORMAL	1PM	36.0	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7AM	36	NORMAL	1PM	36.1	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO.	7AM	36.	NORMAL	1PM	36.1	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ ARDUEA.	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
01-12-20	OMAR	PUERTO	17.586603	MAESTRO	NO	7 AM	36,2	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1'116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	36.3	NORMAL	5 PM	36.2	NORMAL
	LUIS H.	CASTILLO	1'116.791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.1	NORMAL	5 PM	36.0	NORMAL
02-12-20	OMAR	PUERTO	17586.603	MAESTRO	NO	7. AM	36.4	NORMAL	7 PM	36.3	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1'116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	36.3	NORMAL	7 PM	36.0	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1'116.791183	OFICIAL	NO	7. AM	36.4.	NORMAL	7PM.	36.2	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
04-12-20	OMAR	PUERTO	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36		NORMAL	5PM	36.2	NORMAL
	DIEGO	BLANCO.	1116808609	AYUDA	NO	7 AM	36.3		NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7. AM	36.2		NORMAL	5 PM	36	NORMAL
05-12-20	OMAR	PUERTO	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.1		NORMAL	12 AM		NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116 808609	AYUDA	NO	7 AM	36		NORMAL	12 AM		NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7.AM	36.3		NORMAL	12 AM		NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07-12-20	OMAR	PUERTO	17586603	MAESTRO	NO	7. AM	36	NORMAL	5:15 PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUD	NO	7. AM	36.1	NORMAL	5:15 PM	36.3	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7. AM	36.3	NORMAL	5:15 PM	36.0	NORMAL
09-12-20	OMAR	PUERTO	17586603	MAESTRO	NO	7. AM	36.1	NORMAL			NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116.808609	AYUDANTE	NO	7. AM	36.2	NORMAL			NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116.791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.4	NORMAL			NORMAL

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-GST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
10-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7AM	36.1	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO.	1116808609	AUXIAR	NO	7 AM	362	NORMAL	5pm	36.2	NORMAL
	Luis H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.0	NORMAL	5 pM	36.4	NORMAL
11-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7AM	36.2	NORMA			
	DIEGO	BLANCO	1116 808609	AUXIAR	NO	7 AM	36.4	NORMAL			
	Luis H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7AM	36.0	NORMAL			

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
12-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.	NORMAL	5PM	36.1		NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AUXIAR	NO	7 AM	36.2	NORMAL	5PM	36.2		NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	35.9	NORMAL	5PM	36.		NORMAL
14-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.3		NORMAL	5 PM	36.2	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AUXIAR	NO	7 AM	36.1		NORMAL	5PM	36	NORMAL
	LUIS H.	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36		NORMAL	5 PM	36.1	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
15-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.1	NORMAL	5PM	36.	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AUXIAR	NO	7 AM	36	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.2	NORMAL	5PM	36	NORMAL
16-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.2	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AUXIAR	NO	7 AM	35.9	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	LUIS H	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36	NORMAL	5PM	35.9	NORMAL

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL L IO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
17-12-20	OMAR	PUERTA	17586.603	MAESTRO	NO	7 AM	36.1	NORMAL	5 PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	36.	NORMAL	5 PM	35.9	NORMAL
	LUIS #	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.2	NORMAL	5 PM	36.	NORMAL
18-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.2	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	36.	NORMAL	5 PM	36.1	NORMAL
	LUIS #	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.1	NORMAL	5 PM	36	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
19-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.3	NORMAL	1 PM	36.1	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	36	NORMAL	1 PM	36.1	NORMAL
	LUIS #	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.1	NORMAL	1 PM	36.2	NORMAL
21-12-20	OMAR	PUERTA	17586.603	MAESTRO	NO	7 AM	36.2	NORMAL	5PM	36	NORMAL
	DIEGO	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	36	NORMAL	5PM	36.1	NORMAL
	LUIS #	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.1	NORMAL	5PM	36	NORMAL

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
22-12-20	OMAR	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO	7 AM	36.1	NORMAL	5PM	36.2	NORMAL
	DIEGO A.	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO	7 AM	35.9	NORMAL	5PM	36.	NORMAL
	LUIS #	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO	7 AM	36.	NORMAL	5 PM	36.1	NORMAL
23-12-20	OMAR T	PUERTA	17586603	MAESTRO	NO						
	DIEGO A.	BLANCO	1116808609	AYUDANTE	NO						
	LUIS #	CASTILLO	1116791183	OFICIAL	NO						

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALU
	Brayan	Duran	1057611224	Ayudante	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.4	
	Gerson	Cuadros	1102356716	Ambiental	NO	7:00	35.7	Bueno	18:00	36.2	
25/11/2020	Harol	Rosso	1024502083	Oficial	NO	7:00	36.4	Bueno	18:00	36.2	
	Leonardo	Figueroa	1057585333	Ayudante	NO	7:00	36.2	Bueno	18:00	36.2	
	Gerson	Cuadros	"	Ambiental	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00		
26/11/2020	Brayan	Duran	"	Ayudante	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00		
	Leonardo	Figueroa	"	Ayudante	NO	7:00	36.3	Bueno	18:00		

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	E D
	Harol	Rosso	"	Oficial	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00		

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
	Brayan	Duran	1057611274	Ayudante	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.4	
25/11/2020	Gerson	Cuadros	1102356716	Ambiental	NO	7:00	35.7		18:00	36.2	
	Harol	Posso	1024502083	Oficial	NO	7:00	36.4	Bueno	18:00	36.2	
	Leonardo	Figueroa	1057585333	Ayudante	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
	Gerson	Cuadros	—"—	Ambiental	NO	7:00	35.9		18:00	36.1	
26/11/2020	Brayan	Duran	—"—	Ayudante	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.4	
	Leonardo	Figueroa	—"—	Ayudante	NO	7:00	36.3		18:00	36.0	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
26/11/2020	Harol	Posso	—"—	Oficial	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.2	
	Leonardo	Figueroa	—"—	Oficial	NO	7:00	35.8		18:00	36.4	
	Harol	Posso	—"—	Oficial	NO	7:00	35.2	Bueno	18:00	36.0	
27/11/2020	Brayan	Duran	—"—	Ayudante	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
	Gerson	Cuadros	—"—	Ambiental	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.2	
28/11/2020	Harol	Posso	—"—	Oficial	NO	7:00	35.9		18:00	36.3	Bueno
29/11/2020	Leonardo	Figueroa	—"—	Oficial	NO	7:00	36.3	Bueno	18:00	36.7	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
28/11/2020	Brayan	Duran	—"—	Ayudante	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
28/11/2020	Gerson	Cuadros	—"—	Ambiental	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.3	Bueno
	Harol	Posso	—"—	Oficial	NO	7:00	35.9		18:00	36.4	
30/11/2020	Brayan	Duran	—"—	Ayudante	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
	Leonardo	Figueroa	—"—	Oficial	NO	7:00	36.3	Bueno	18:00	36.5	Bueno
	Gerson	Cuadros	—"—	Ambiental	NO	7:00	36.0		18:00	36.0	
01/12/2020	Harol	Posso	—"—	Oficial	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.3	Bueno

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
20/12/2020	Yeison	Hernandez	—o—	Pintor	NO	7:00	35.0	OK	18:00	36.1	OK
	Geison	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	34.0		18:00	35.8	
	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	35.9		18:00	36.2	
	Brayan	Ducón	—o—	Ayudante	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
	Harol	Posso	—o—	Oficial	NO	7:00	36.1		18:00	36.3	
21/12/2020	Harol	Posso	—o—	Oficial	NO	7:00	36.2	OK	18:00	36.5	
	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	36.8	OK	18:00		

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
21/12/2020	Brayan	Ducón	—o—	Ayudante	NO	7:00	36.3	OK	18:00		
	Geison	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	36.3		18:00		
	Yeison	Hernandez	—o—	Pintor	NO	7:00	35.8		18:00		
	Wilson	Rodriguez	—o—	Electricio	NO	7:00	36.2		18:00		

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
16/12/2020	Gerson	Cuadros	—	Ambiental	NO	7:00	35.4	Bueno	18:00	36.2	Bueno
	Harol	Fosso	—	Oficial	NO	7:00	34.0		18:00	36.2	
	Leonardo	Figueroa	—	Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.1	
	Brayan	Ducon	—	Ayudante	NO	7:00	35.8		18:00	36.4	
	Wilson	Rodriguez	—	Electrico	NO	7:00	35.9		18:00	36.2	
	Yeison	Hernandez	—	Pintor	NO	7:00	34.8		18:00	36.2	
17/12/2020	Harol	Fosso	—	Oficial	NO	7:00	34.5	Bueno	18:00	36.1	Bueno

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
17/12/2020	Leonardo	Figueroa	—	Oficial	NO	7:00	35.5	Bueno	18:00	36.0	
	Brayan	Ducon	—	Ayudante	NO	7:00	36.0		19:00	36.3	
	Yeison	Hernandez	—	Pintor	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.3	Bueno
	Gerson	Cuadros	—	Ambiental	NO	7:00	36.2		19:00	36.1	
	Harol	Fosso	—	Oficial	NO	7:00	35.4		18:00	36.2	
18/12/2020	Leonardo	Figueroa	—	Oficial	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.3	Bueno
	Brayan	Ducon	—	Ayudante	NO	7:00	35.9		18:00	36.3	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
18/12/2020	Gerson	Cuadros	—	Ambiental	NO	7:00	35.4		18:00	36.0	
	Yeison	Hernandez	—	Pintor	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.0	Bueno
19/12/2020	Leonardo	Figueroa	—	Oficial	NO	7:00	36.0		18:00	36.2	Bueno
	Brayan	Ducon	—	Ayudante	NO	7:00	35.1		18:00	36.1	
	Harol	Fosso	—	Oficial	NO	7:00	35.8		18:00	36.2	
19/12/2020	Yeison	Hernandez	—	Pintor	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.0	Bueno
	Gerson	Cuadros	—	Ambiental	NO	7:00	36.0		18:00	36.0	

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14/01/2021	Harol	Rosso	—o—	Oficial	NO	7:00	35.9	Buen O	18:00	36.0	Buen O
	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	34.8		18:00	36.2	
	Brayan	Duran	—o—	Oficial	NO	7:00	35.3		18:00	36.0	
	Gerson	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	36.0		18:00	36.0	
15/01/2021	Harol	Rosso	—o—	Oficial	NO	7:00	35.8	Buen O	18:00	36.3	Buen O
	Brayan	Duran	—o—	Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.3	
	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	36.0		18:00	36.2	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
15/01/21	Gerson	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.2	Bueno
	Harol	Rosso	—o—	Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
16/01/2021	Brayan	Ducan	—o—	oficial	NO	7:00	36.0	Buen O	18:00	36.1	Buen O
	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
	Gerson	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.2	
17/01/2021	Harol	Rosso	—o—	Oficial	NO	7:00	36.3	Bueno	18:00	36.0	Bueno
	Brayan	Ducan	—o—	Oficial	NO	7:00	36.0	Bueno	18:00	36.3	Bueno

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
11/01/2021	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	35.9	Bueno	18:00	36.2	Bueno
	Gerson	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	35.7	Bueno	18:00	36.3	Bueno
18/01/2021	Harol	Rosso	—o—	Oficial	NO	7:00	35.8	Bueno	18:00	36.0	Bueno
	Gerson	Cuadros	—o—	Ambiental	NO	7:00	36.0	Buen O	18:00		
	Leonardo	Figueroa	—o—	Oficial	NO	7:00	35.9		18:00		
19/01/2021	Brayan	Ducan	—o—	Oficial	NO	7:00	36.2		18:00		

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
	Gerson	Cuadros		Ambiental	NO	7:00	36.0		18:00	36.2	
29/12/2020	Harol	Posso		Oficial	NO	7:00	36.3		18:00	36.3	
	Leonardo	Figueroa		Oficial	NO	7:00	36.7		18:00	36.3	
	Brayan	Pulgarin		Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.3	
29/12/2020	Wilson	Rodriguez		Electrico	NO	7:00	36.0		18:00	36.1	
30/12/20	Gerson	Cuadros		Ambiental	NO	7:00	36.2		18:00	35.8	
30/12/20	Wilson	Rodriguez		Electrico	NO	7:00	36.2		18:00	36.0	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
	Wilson	Rodriguez		Electrico	NO	7:00	36.0		18:00	35.9	
07/01/2021	Gerson	Cuadros		Ambiental	NO	7:00	36.2		18:00	36.3	
	Wilson	Rodriguez		Electrico	NO	7:00	36.4		18:00	36.3	
08/01/21	Gerson	Cuadros		Ambiental	NO	7:00	35.9		18:00	36.2	
	Wilson	Rodriguez		Electrico	NO	7:00	35.8		18:00	36.2	
09/01/21	Gerson	Cuadros		Ambiental	NO	7:00	36.0		18:00	36.7	
12/01/21	Gerson	Cuadros		// //	NO	7:00	35.2		18:00	36.1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
	Brayan	Pulgarin		Oficial	NO	7:00	36.0		18:00	36.2	
12/01/21	Leonardo	Figueroa		Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.2	
	Harol	Posso		Oficial	NO	7:00	35.9		18:00	36.3	
	Gerson	Cuadros		Ambiental	NO	7:00	35.9		18:00	36.0	
13/01/2021	Harol	Posso		Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.0	
	Brayan	Pulgarin		Oficial	NO	7:00	36.2		18:00	36.4	
	Leonardo	Figueroa		Oficial	NO	7:00	35.7		18:00	36.0	
	Wilson	Rodriguez		Electrico	NO	7:00	36.1		18:00	36.2	

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
16/12/20	Huber	Caicedo		AY	No	6:50	36.1	OK	5:00	36.1	—
16/12/20	José Ramiro	garcia		AY	No	6:30	36.3	OK	5:00	36.2	—
16/12/20	Ramon	Ospino		AY	No	6:50	36.1	OK	5:00	36.0	—
16/12/20	Saul	Benavidez		OF	No	6:45	36.1	OK	5:00	35.9	—
16/12/20	Wilson A	Cifuentes		AY	No	7:00	36.0	OK	5:00	36.0	—
16/12/20	Juan Diego	de oro		AY	No	6:45	36.2	OK	5:00	36.3	—
16/12/20	Clitton	Jimenez		OF	No	6:50	36.3	OK	5:00	36.1	—

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
16/12/20	Deiner	Martinez		OF	No	6:38	36.1	OK	5:00	36.1	Bueno
16/12/20	Lewis Juan	Jimenez		OF	No	6:50	36.2	OK	5:00	36.2	Bueno
17/12/20	Huber	Caicedo		OF	No	6:45	36.1	OK	5:00	36.4	Bueno
17/12/20	Ramón	Ospino		AY	No	6:30	36.2	OK	5:00	36.1	Bueno
17/12/20	José Ramiro	Garcia		AY	No	7:00	36.3	OK	5:00	36.4	Bueno
17/12/20	Saul	Benavidez		9N	No	7:05	36.0	OK	6:00	36.0	Bueno
17/12/20	Wilson A	Cifuentes		OF	No	6:58	35.9	OK	5:00	36.1	Bueno

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
17/12/20	Deiver	Martinez		OF	No	6:20	36.1	OK	5:00	36.1	Bueno
17/12/20	Lewis Juan	Jimenez		OF	No	7:00	36.2	OK	5:00	36.2	Bueno
17/12/20	Juan Diego	De oro		AY	No	6:50	36.0	OK	5:00	36.2	Bueno
17/12/20	clitton	Jimenez		OF	No	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	Bueno
18/12/20	Huber	Caicedo		OF	No	6:45	36.1	OK	5:00	36.3	Bueno
18/12/20	Ramiro	Garcia		9N	No	6:38	36.1	OK	5:00	36.1	Bueno
18/12/20	Ramón	Ospino		AY	No	6:38	36.3	OK	5:00	36.1	Bueno

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
19/12/20	Huber	Caicedo	—	OF	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.2	Bueno
19/12/20	Ramón	Ospino	—	AY	No	7:00	35.9	ok	5:00	36.1	ok
19/12/20	José Ramiro	Garcia	—	AY	No	7:00	36.2	ok	5:00	36.2	ok
19/12/20	Wilson	Cifuentes	—	OF	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.0	ok
19/12/20	Saul	Benavidez	—	OF	No	7:00	36.0	ok	5:00	36.1	ok
19/12/20	Juan Diego	De Oro	—	AY	No	7:00	36.2	ok	5:00	36.0	ok
19/12/20	Diver	Martinez	—	OF	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.1	ok

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
19/12/20	Leivis Juan	Jimenez	—	OF	No	7:00	36.4	ok	5:00	36.2	ok
19/12/20	Clifton	Jimenez	—	OF	No	7:00	36.2	ok	5:00	36.1	ok
21/12/20	Huber	Caicedo	—	OF	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.4	ok
21/12/20	Ramón	Ospino	—	AY	No	7:00	36.0	ok	5:00	36.0	ok
21/12/20	José Ramiro	Garcia	—	AY	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.0	ok
21/12/20	Wilson	Cifuentes	—	AY	No	7:00	35.9	ok	5:00	36.0	ok
21/12/20	Saul	Benavidez	—	AY	No	7:00	36.3	ok	5:00	36.2	ok

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
21/12/20	Juan Diego	De Oro	—	AY	No	7:00	36.2	ok	5:00	36.0	ok
21/12/20	Diver	Martinez	—	OF	No	7:00	35.8	ok	5:00	36.2	ok
21/12/20	Leivis Juan	Jimenez	—	OF	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.1	ok
21/12/20	Clifton	Jimenez	—	OF	No	7:00	36.2	ok	5:00	35.9	ok
22/12/20	Huber	Caicedo	—	OF	No	7:00	36.2	ok	5:00	36.1	ok
22/12/20	Ramón	Ospino	—	OF	No	7:00	36.1	ok	5:00	36.2	ok
22/12/20	José Ramiro	Garcia	—	AY	No	7:00	36.2	ok	5:00	36.0	ok

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
22/12/20	Wilson	Cifuentes	——	OF	NO	7:00	36.1	ok	5:00	36.0	ok
22/12/20	Saul	Benavidez	——	AY	NO	7:00	36.2	OK	5:00	36.1	OK
22/12/20	Juan Diego	De oro	——	AY	NO	7:00	36.0	ok	5:00	36.0	OK
22/12/20	Deiver	Martinez	——	OF	NO	7:00	359	OK	5:00	36.0	OK
22/12/20	Luis Juan	Jimenez	——	OF	NO	7:00	36.0	OK	5:00	36.3	OK
22/12/20	Clifton	Jimenez	——	AY	NO	7:00	36.3	ok	5:00	36.1	OK
23/12/20	Huber	Caicedo	——	OF	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
23/12/20	Jose Ramiro	Garcia	——	AY	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.1	OK
23/12/20	Ramón	Gonzalez	——	AY	NO	7:00	36.0	OK	5:00	36.0	OK
23/12/20	Juan diego	de oro	——	AY	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	OK
23/12/20	wilson	Cifuentes	——	OF	NO	7:00	36.2	OK	5:00	36.1	OK
23/12/20	Saul	Benavidez	——	AY	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	OK
23/12/20	Deiver	Martinez	——	OF	NO	7:00	36.2	OK	5:00	36.2	OK
23/12/20	Clifton	Jimenez	——	OF	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.0	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
23/12/20	Jorvis Juan	Jimenez	——	AY	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	OK
24/12/20	Huber	Caicedo	——	OF	NO	7:00	36.3	OK	5:00	36.1	OK
24/12/20	Ramón	Ospino	——	AY	NO	7:00	36.2	OK	5:00	36.1	OK
24/12/20	José Ramiro	García	——	AY	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	OK
24/12/20	Saul	Benavidez	——	AY	NO	7:00	36.3	OK	5:00	36.1	OK
24/12/20	wilson A	Cifuentes	——	OF	NO	7:00	36.2	OK	5:00	36.1	OK
24/12/20	Juan Diego	De oro	——	AY	NO	7:00	36.2	OK	5:00	36.0	OK

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
24/12/20	Clifton	Jimenez	—	OF	No	7:00	36.1	OK	5:00	36.0	OK
24/12/20	Leivis Juan	Jimenez	—	AY	No	7:00	36.3	OK	5:00	36.1	OK
24/12/20	Oliver	Martinez	—	OF	No	7:00	36.3	OK	5:00	36.2	OK
26/12/20	Huber	Quiroga	—	OF	No	7:00	36.6	OK	5:00	36.2	OK
26/12/20	Ramón	OSPINO	—	OF	No	7:00	36.1	OK	5:00	36.2	OK
26/12/20	José Ramiro	Garcia	—	AY	No	7:00	36.0	OK	5:00	36.0	OK
26/12/20	Saul	Benavidez	—	OF	No	7:00	36.2	OK	5:00	36.1	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
28/12/20	Huber	Coiicedo	—	OF	No	7:00	36.2	OK	5:00	36.1	OK
28/12/20	Ramon	OSPINO	—	AY	No	7:00	36.1	OK	5:00	36.0	OK
28/12/20	José Ramiro	Garcia	—	AY	No	7:00	36.0	OK	5:00	36.0	OK
28/12/20	Jesus David	Blanco	—	AY	No	7:00	36.1	OK	5:00	36.3	OK
28/12/20	Wilson	Cifuentes	—	AY	No	7:00	35.9	OK	5:00	36.1	OK
28/12/20	Saul	Benavidez	—	AY	No	7:00	36.1	OK	5:00	35.9	OK
28/12/20	Juan Diego	De Oro	—	AY	No	7:00	35.9	OK	5:00	36.2	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
29/12/20	Oliver	Martinez	—	OF	No	7:00	36.0	OK	5:00	36.1	OK
29/12/20	Leivis Juan	Jimenez	—	OF	No	7:00	36.3	OK	5:00	36.2	OK
29/12/20	Clifton	Jimenez	—	OF	NO	7:00	36.1	OK	5:00	36.1	OK

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
29-Oct.	David	Blanco.	13.744.644	Opicial.	Ninguna.	7:00 am.	36,2	OK.	5:00 pm.	36,4.	OK
	Wilson Antonio	Fuentes.	91.217.394	Opicial.	Ninguna.	7:00am	36,6	OK	5:00pm	36,3	OK
	Sol B	Benavides Pardo	91.016 642	Maestra	Ninguna	7:00am	35,7	OK	5:00pm	36,2	OK
	Juan Diego	DeOro M.	1007974161	Ayudante.	Ninguna.	7:00am..	35,8	OK	5:00pm	35,7	OK
	Ramon	Ospino	85.447142	Ayudante	Ninguno	7:00am	35,8	OK	5:00pm	36,2	OK
	Jose Ramin	Goicoa	5624.573	Ayudante	Ninguno	7:00am	35,9	OK	5:00pm	35,9	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
29-Oct	Hugo Armando	Parra.	1098767614	Ing. R-ss.	Ninguna.	7:00 m	OK	35,9	5:00pm	36,1	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
30-Dic	David	Blanco	13744644	Oficial	Ninguna	7:00am	36,3	OK	5:00pm	35,9	OK
	Wilson Antonio	Liprentes	91.247.394	Oficial	Ninguna	7:00am	36,6	OK	5:00pm	36,2	OK
	Saul	Bernardes Pacho	91.016.642	Maestro	Ninguna	7:00am	36,2	OK	5:00pm	36,5	OK
	Juan Diego	De Oro M.	1.007974161	Ayudante	Ninguna	7:00am	35,8	OK	6:00pm	35,8	OK
	Ramón	Ospino	85.447142	Ayudante	Ninguna	7:00am	35,9	OK	5:00pm	36,2	OK
	Jose Ramiro	García	5624.573	Ayudante	Ninguna	7:00am	36,4	OK	5:00pm	36,6	OK
	Jasan	Tuna	19566.563	Oficial	Ninguna	7:00am	36,2	OK	5:00pm	36,2	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
30-Dic	Alvaro Armando	Parra Medina	1098767614	Ing Res	Ninguna	7:00am	35,9	OK	5:00pm	36,0	OK

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
31-Dic	David	Blanco.	13.744644	Operaf.	Ninguna.	7:00am	36,2	OK	1:00pm	35,9	OK
	Wilson Antonio	Cipuentes.	91.247.394.	Operaf.	Ninguna	7:00am	35,7	OK	1:00pm	36,1	OK
	Saul.	Benavides P.	91.016.642	Maestro	Ninguna	7:00am	36,3	OK	1:00pm	36,2	OK
	Ramón	Ospino	85447.142	Ayudante	Ninguna	7:00am	35,7	OK	1:00pm	36,3.	OK
	Jose Ramiro	Garcia	5.624.573	Ayudante	Ninguna.	7:00am	35,8	OK	1:00pm	35,8	OK
	Jajan	Luna.	18.566883	Operaf.	Ninguna	7:00am	36,1	OK	1:00pm	36,3	OK
	Hugo Armando	Pora Medina	1.098767614	Ing. Ro.	Ninguna.	7:00am.	35,2	OK.	1:00pm.	35,5.	OK.

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
12/12/20	Jonathan	Pulgarin	—	AY	—	6:30	36.2	✓	6:00	36.2	✓
12/12/20	Huber	Caicedo	—	OF	—	6:20	36.4	✓	5:40	35.9	✓
12/12/20	Wilson	Cifuentes	—	OF	—	6:00	36.2	✓	6:00	36.1	✓
12/12/20	Saul	Benavidez	—	AY	—	6:30	36.1	✓	6:00	36.3	—
12/12/20	Ramon	Orpino	—	AY	—	6:45	36.0	✓	6:00	36.4	✓
12/12/20	Jose Ramiro	Garcia	—	AY	—	6:40	36.1	✓	6:00	35.9	✓
14/12/20	Huber	Caicedo	—	OF	—	6:20	36.2	✓	6:00	35.9	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14/12/20	Jonathan	Pulgarin	—	AY	—	6:30	36.2	✓	5:40		36.1	✓
14/12/20	Jose Ramiro	Garcia	—	AY	—	6:45	36.1	✓	6:00		35.9	—
14/12/20	Ramon	Orpino	—	OF	—	6:30	35.9	✓	6:00		36.2	—
14/12/20	Saul	Benavidez	—	OF	—	6:40	36.1	✓	6:00		36.1	—
14/12/20	Wilson A.	Cifuentes	—	AY	—	6:10	36.2	✓	5:30		36.2	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
09/12/20	Saul	Benavides	91016692	of.	NO	6:10	36.1	✓		35.8	✓
07/12/20	Huber	Caicedo	——	Of	NO	6:30	36.2	✓		36.2	✓
07/12/20	Jonathan	Pulgarin	——	A1	NO	6:50	36.0	✓		35.8	✓
09/12/20	Saul	Benavides	——	Of	NO	6:30	35.8	✓		36.1	✓
09/12/20	Jonathan	Pulgarin	——	A4	NO	6:45	35.9	✓		36.0	✓
09/12/20	Huber	Caicedo	——	Of	NO	6:10	36.3	✓		36.3	✓
	Ramon	OSPINO	——	Of	NO	6:00	36.1			36.0	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
09/12/20	José Ramiro	Garcia	——	A4	NO	6:20	36.1	✓			36.0	✓
09/12/20	Wilson Antonio	Clfuentes	——	A4	NO	6:30	36.0	✓			36.3	✓
10/12/20	Huber	Caicedo	——	Of	NO	6:45	36.3	✓			36.1	✓
10/12/20	Jonathan	Pulgarin	——	A4	NO	6:00	36.2	✓			36.1	✓
10/12/20	José Ramiro	Garcia	——	A4	NO	6:10	36.1	✓			36.2	✓
10/12/20	Ramon	OSPINO	——	Of	NO	6:25	36.1	✓			35.8	✓
10/12/20	Saul	Benavides	——	Of	NO	6:40	36.2	✓			35.9	✓

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
10/12/20	Wilson Antonio	Clfuentes	——	A4	NO	6:50	36.4	✓		36.1	✓
11/12/20	Huber	Caicedo	——	Of	NO	6:50	36.3	✓		36.2	✓
11/12/20	Jonathan	Pulgarin	——	A4	NO	6:45	36.1	✓		36.3	✓
11/12/20	Ramon	OSPINO	——	Of	NO	6:20	36.2	✓		36.3	✓
11/12/20	José Ramiro	Garcia	——	A1	NO	6:50	36.1	✓		36.2	✓
11/12/20	Saul	Benavides	——	Of	NO	6:30	36.3	✓		36.0	✓
11/12/20	Wilson Antonio	Clfuentes	——	A4	NO	6:50	36.1	✓		36.1	✓

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
31-Dic	David	Blanco.	13.744644	Oficial.	Ninguna.	7:00am	36,2	OK	1:00pm	35,9	OK
	Wilson Antonio	Cifuentes.	91.247.394.	Oficial.	Ninguna	7:00am	35,7	OK	1:00pm	36,1	OK
	Saul.	Benavidez P.	91.016.642	Maestro	Ninguna	7:00am	36,3	OK	1:00pm	36,2	OK
	Ramón	Ospino	85447.142	Ayudante	Ninguna	7:00am	35,7	OK	1:00pm	36,3.	OK
	Jose Ramiro	Garcia	5.624.573	Ayudante	Ninguna.	7:00am	35,8	OK	1:00pm	35,8	OK
	Jojan	Luna.	18.566883	Oficial.	Ninguna	7:00am	36,1	OK	1:00pm	36,3	OK
	Hugo Armando	Parra Medina	1.098767614	Ing. Ro.	Ninguna.	7:00am.	35,2	OK.	1:00pm.	35,5.	OK.

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
04 enero	David	Blanco	13.744.644	oficial	Ninguna	7:00am	35.9	ok	5:00 pm	36.1	ok
	Ramón	ospino	85.447.142	Ayudante	Ninguna	7:00 am	36.2	ok	5:00 pm	35.9	ok
	Wilson Antonio	Cifuentes	91.247.394	oficial	Ninguna	7:00 am	36.1	ok	5:00 pm	36.1	ok
	Saul	Benavidez	91.016.642	Maestro	Ninguna	7:00am	35.9	ok	5:00 pm	36.1	ok
	Jose Ramiro	Garcia	5.624.573	Ayudante	Ninguna	7:00 am	36.1	ok	5:00 pm	36.3	ok
	Jasan	Luna	18.566.883	Ayudante	Ninguna	7:00 am	35.9	ok	5:00 pm	35.9	ok
	Jesus David	Blanco	13.744.644	oficial	Ninguna	7:00 am	36.1	ok	5:00 pm	36.1	ok

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
	Clifton	Jimenez	5.046.991	oficial	Ninguna	7:00 am	36.1	ok	5:00pm	36.3	ok
	Jesus Juan	Jimenez	1.002.235.803	oficial	Ninguna	7:00am	36.2	ok	5:00pm	36.1	ok
	Deiver	Martinez	3.821.290	oficial	Ninguna	7:00am	36.3	ok	5:00 pm	36.0	ok
	Eugenio	Torres Parra	13.537.329	Ayudante	Ninguna	7:00am	36.1	ok	5:00 pm	35.9	ok

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
05/01/21	Jose Ramiro	Garcia	—	Ayudante	No	6:45	36.2	Ok	5:00	36.0	Ok
	Daviol	Blanco	—	oficial	No	6:50	36.0	ok	5:00	36.0	ok
	Ramon	ospino	—	oficial	No	6:30	36.3	Ok	5:00	36.1	Ok
	Jasan	luna	—	Oficial	No	6:25	35.8	ok	5:00	36.0	ok
	Wilson Antonio	cifuentes	—	oficial	No	6:30	36.1	ok	5:00	36.1	ok
	Saul	Benavidez	—	oficial	No	6:56	36.1	ok	4:30	35.9	ok
	Uber Alonso	Caicedo	—	oficial	No	6:35	36.1				

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
06.01.21	Saul	Benavidez	—	oficial	/	6:30	36.1	—	5:00	36.1	—
	Wilson Antonio	Cifuentes	—	oficial	/	6:50	36.3	—	5:00	36.2	—
	Jasan	luna	—	ayudante	/	6:30	35.9	—	5:00	35.9	—
	Jose Ramiro	Garcia	—	ayudante	/	6:00	35.9	—	5:00	36.3	—
	Uber Alfonso	Caicedo	—	oficial	/	6:45	35.9	—	5:00	36.3	—
	Daviol	luna	—	oficial	/	6:30	36.1	—	5:00	36.3	—
	Ramon	Ospino	—	ayudante	/	6:20	36.3	—	5:00	36.1	—

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07/01/21	Uber Alfonso	Caiceolo	—	oficial	—	7:00	36.1	—	5:00	36.1	—
	Ramon	ospino	—	ayudante	—	6:50	36.0	—	5:00	36.0	—
	Jose ramiro	Garcia	—	ayudante	—	6:45	36.3	—	5:00	36.3	—
	Wilson A.	Cifuentes	—	oficial	—	6:30	36.2	—	5:00	35.9	—
	Jasan	luna	—	oficial	—	6:35	36.1	—	5:00	35.8	—
	Daviol	Blanco	—	oficial	—	6:40	36.0	—	5:00	36.1	—
	Saul	Benavidez	—	oficial	—	6:50	36.0	—	5:00	36.3	—

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
08/01/21	Uber Alonso	Caicedo		Oficial	—	6:30	36.0	—	4:30	36.1	—
	Ramon	Ospino		Ayudante	—	7:00	36.1	—	5:00	36.3	—
	Jose Ramiro	Garcia		Ayudante	—	6:45	36.3	—	5:00	35.9	—
	Jovan humberto	luna		Oficial	—	6:35	36.2	—	5:00	36.0	—
	Jesus david	Blanco		Oficial	—	6:50	36.1	—	5:00	36.3	—
	Saul	Benavidez		Ayudante	—	7:00	36.0	—	5:00	36.2	—
	Wilson Antonio	Cifuentes		Oficial	—	6:30	36.3	—	5:00	36.1	—
	Giovany	Paredes		Oficial	—	6:45	36.3	—	5:00	36.3	—

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
09-01-21	Jovan humberto	luna		Oficial	—	6:30	36.1	—	5:00	36.0	—
	Ramon	Ospino		Oficial	—	6:45	35.8	—	5:00	35.1	—
	Uber Alonso	Caicedo		Oficial	—	6:30	36.1	—	4:30	36.2	—
	Jose ramiro	Garcia		Ayudante	—	6:20	36.3	—	5:00	36.3	—
	Jesus David	Blanco		Oficial	—	6:35	36.2	—	5:00	36.1	—
	Saul	Benavidez		Oficial	—	6:40	36.1	—	5:00	36.2	—
	Giovany	Paredes		Oficial	—	6:20	36.2	—	5:00	36.4	—
	Wilson Antonio	Cifuentes		Oficial	—	6:40	36.1	—	5:00	36.1	—

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
12-01-21	Uber	Alcedo	—	Oficial	—	6:30	36.1	—	5:00	36.0	—
	Ramon	Ospino	—	Oficial	—	6:45	36.6	—	5:00	36.6	—
	Giovany	Paredes	—	Ayudante	—	6:50	36.3	—	5:00	36.2	—
	Jose	Garcia	—	Ayudante	—	6:55	36.1	—	5:00	36.1	—
	Jovan	luna	—	Oficial	—	7:00	36.3	—	5:00	36.3	—
	David	Blanco	—	Oficial	—	7:00	36.1	—	5:00	36.1	—
	Wilson	Cifuentes	—	Oficial	—	7:00	36.1	—	5:00	36.2	—
	Saul	Benavidez	—	Ayudante	—	7:00	36.2	—	5:00	36.1	—

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14/12/2020	Juan de la Cruz	Hernandez	91212231	Maestro.	NO	7:00 am	35.1	Bien	6:30PM	35.0	Bien.
14/12/2020	Sergio Andres	Hernandez	1101682117	Oficial	No	7:00 am	35.4	Bien	6:30 PM	35.2	Bien
14/12/2020	Daniel	Parra.	91104788	Ayudante	No.	7:00 am	35.2	Bien	6:30 PM	35.3	Bien

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL		ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
16												

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
17											

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 3 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
06/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	35.8	BIEN	6:30 PM	36.0	BIEN
06/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
06/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.6	BIEN
06/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
06/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
06/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
07/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.0	BIEN	6:30 PM	36.0	BIEN
07/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
07/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
07/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
07/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.8	BIEN
07/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.0	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
08/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.2	BIEN	6:30 PM	36.1	BIEN
08/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
08/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.8	BIEN	6:30 PM	35.6	BIEN
08/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
08/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.5	BIEN
08/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
09/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.0	BIEN	6:30 PM	36.2	BIEN
09/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
09/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.8	BIEN
09/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
09/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.6	BIEN
09/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
11/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	35.8	BIEN	6:30 PM	36.2	BIEN
11/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
11/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.8	BIEN
11/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.8	BIEN	6:30 PM	35.6	BIEN
11/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.6	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
12/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.0	BIEN	1:30 PM	36.2	BIEN
12/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.4	BIEN	1:30 PM	35.6	BIEN
12/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.8	BIEN	1:30 PM	35.8	BIEN
12/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.6	BIEN	1:30 PM	35.4	BIEN
12/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.2	BIEN	1:30 PM	35.4	BIEN
12/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	1:30 PM	35.2	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
13/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
13/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
13/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
13/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
13/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
13/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
14/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
14/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
14/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
14/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN
14/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am		BIEN	6:30 PM		BIEN

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 2 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRES	CONTROL DE TEMPETARUR CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
30/12/2020	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	35.8	BIEN	6:30 PM	36.0	BIEN
30/12/2020	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
30/12/2020	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	36.0	BIEN
30/12/2020	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
30/12/2020	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
30/12/2020	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.0	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRES	CONTROL DE TEMPETARUR CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
31/12/2020	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.2	BIEN	1:30 PM	35.9	BIEN
31/12/2020	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.2	BIEN	1:30 PM	35.4	BIEN
31/12/2020	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.6	BIEN	1:30 PM	35.6	BIEN
31/12/2020	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.4	BIEN	1:30 PM	35.4	BIEN
31/12/2020	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.8	BIEN	1:30 PM	35.6	BIEN
31/12/2020	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.2	BIEN	1:30 PM	35.0	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRES	CONTROL DE TEMPETARUR CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
04/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.0	BIEN	6:30 PM	35.8	BIEN
04/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.1	BIEN	6:30 PM	36.2	BIEN
04/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.8	BIEN
04/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
04/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.6	BIEN
04/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	35.0	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRES	CONTROL DE TEMPETARUR CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
05/01/2021	ERITH JOHANY	URREA	1101694012	ING.CIVIL	NO	6:00am	36.2	BIEN	6:30 PM	36.1	BIEN
05/01/2021	JUAN DE LA CRUZ	HERNANDEZ	91212231	maestro	NO	6:00am	35.4	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
05/01/2021	SERGIO ANDRES	HERNANDEZ	1101682117	OFICIAL	NO	6:00am	35.6	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN
05/01/2021	DANIEL	PARRA	91104788	ayudante	NO	6:00am	35.8	BIEN	6:30 PM	35.8	BIEN
05/01/2021	KEVIN	SANCHEZ	1193127281	AYUDANTE	NO	6:00am	35.2	BIEN	6:30 PM	35.2	BIEN
05/01/2021	ENRIQUE	TIBRUZA	2975643	OFICIAL	NO	6:00am	36.0	BIEN	6:30 PM	35.4	BIEN

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
13/01/2021	Julian Yesid	Guevara	1007917126	obrero	NO	7:30 am	36.2	Bien	5:00 Pm		Bien
13/01/2021	ELKIN ELKIN	GUEVARA	1005230799	obrero	NO	7:30 am	34.2	BIEN	5:00 PM		Bien
13/01/2021	Luis Bernardo	Ruiz	13929304	obrero	NO	7:30 am	32.8	Bien	5:00 PM		Bien
14/01/2021	Luis Bernardo	Ruiz	13929304	obrero	NO	6:45 am	33.9	Bien	5:00 Pm		Bien
14/01/2021	Julian Guevara	Jimenez	1007917126	Obrero	NO	6:55 am	33.7	Bien	5:00 PM		Bien
14/01/21	ELKIN Guevara		1005230799	obrero	NO	6:55 am	33.7	Bien	5:00 PM		Bien
14/01/21	JAIRO BURGOS	BURGOS	91342214	Tecnico	NO	07	32.0	Bien	5:00 PM		Bien

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
14/01/2021	Jay Raul	Fequel	13357118	Maestro	NO	7.0M	35.6	BIN	5.PM		Bien
15/01/2021	Luis Bernardo	Ruiz	13929304	obrero	34.3	06:50	34.3	Bien	5:Pm		Bien
15/01/21	ELKIN Guevara		1005230799	Obrero	NO	7:00	33,9	Bien	5 PM		Bien
15/01/21	JAIRO Burgos		91342214	Tecnico	N	7.00	33.7	Bien	5pm		Bien
15/01/21	JulianGuevara	Guevara	1007917126	obrero	NO	7:00am	35.3	Bien	5Pm		Bien
15/01/21	Jaye Fequel	Figueroa	13357118	Maestro	NO	7.0M	35.0	Bien	5 Pm		Bien
16/01/2021	Luis Bernardo	Ruiz	13929304	obrero	NO	6:50AM	33.7	Bien	5 Pm		Bien

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
16/01/21	ELKIN Arley	Guevara	1005230799	obrero	NO	7:00	33,5	Bien	5 Pm		Bien
16/01/21	Julian	Guevara	1007917126	obrero	NO	7:00am	33.6	Bien	5pm		Bien
16/01/21	Luis Bernardo	Ruiz	13929304	obrero	NO	6:45AM	32.6	Bien	5Pm		Bien
17/01/21	JAIRO Burgos	Burgos	91342214	técnico	NO		32.9	BIEN	6:54		Bien
17/01/21	ELKIN Arley	Guevara	1005230799	obrero	NO	6:45	34.1	Bien	6PM		Bien
17/01/21	Julian	Guevara	1007917126	Obrero	NO	6:55	34.1	Bien	6PM		Bien
19/01/21	Edwi R Suarez	Oficio Montenegro	91278 297								

PROCESO: ASEO

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
13	Oscar	R C	Oscar	Ayudante	No	8:00	35.0	Bien	5:00 Pm	35.9	Bien
13	Nender Camacho	Camacho	1096958573	Ayudante	NO	8:00	33.0	Buena	5:00 Pm	36.7	Bien
13/01/21	Cesar	Olivares	91349112	Oficial	NO	8:00	34.6	Bien	500	36.2	Bien
14/01/21	Cesar	Olivares	91349112	Oficial	NO	7:00	34.1	Bien	5:00	35.8	Bien
	Oscar	R G			NO	7:00	34.7	Bien	5:00	36.1	Bien
14.01/21	Nender	Camacho	1096958573		NO	7:00	32.7	Bien	5:00	36.4	Bien
15/01/21	Cesar	Olivares	91349112	Oficial	NO	7:00	34.6	Bien	5:00	35.8	Bien

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
15/01/21	Oscar	Roa Castro	1395198	ayudante	no	7:00	34.4	Bien	5:00	36.1	Bien
13/01/21	Nender	Camacho	1096958573	ayudante	no	7:00	32.4	Bien	5:00 Pm	36.1	Bien
15-01-21	Jose Manuel	Jaramillo	13357116	Maestro	no	2:15	34.8	Bien	5:15 Pm	36.4	Bien
16-01-21	Cesar	Olivares	91349112	Oficial	no	7:00	34.2	Bien	34.6	36.6	Bien
17-01-21	Oscar	Ayudante	17925796	Ayudante	no	7:00	34.4	Bien	36.2	36.2	Bien
16/01/21	Jose	Barrera	13722124	Pintor	no	7:00 am	33.4	Bien	5 pm	36.7	Bien
18/01/21	Oscar	Roa	1395198	Ayudante	no	7:00	34.2	Bien	5:30	36.3	Bien

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
18/01/21	Cesar	Olivares	91349112	Oficial	no	7:00	34.4	Bien	5:30	35.7	Bien
19/01/21	Cesar	Olivares	91349112	Oficial	no	7:00	33.8	Bien			
19/01/21	Jose Manuel	Jaramillo	13357116	Maestro	NO	8:00	36.1	Bien			

CONSORCIO JG 2020	BITACORA CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL	HSEQ	
		Código: F-SST-48	Versión: 01
	PROCESO: HSEQ	Página 1 de 1	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
28/01/21	Luis Bernardo	Avila	13929304	obrero	no		35.5		5:00pm	36.1	
29-01-21	Cesar	Olivera	91349112	oficial	No	7:00	32.6	Bien.		35.2	
29/01/21	Juan	Bueno	91342214	Tecnico	NO	7:00	33.5	Bien		34.9	
29/01/21	Oscar	ROA	13925198	obrero	N	7:0	32.5	Bien		36.2	
29/01/21	Luis Bernardo	Avila	13929304	obrero	no	7:00	34.3	Bien	5:00pm	36.6	
29/01/21	Julian Yesid	Guevara.	1007917126	obrero	NO	7:00	33.9	Bien	5:00PM	36.4	
29/01/21	ELKIN GUEVARA		1005230749	obrero	NO	7:00	33.1	Bien	5:00PM	36.0	

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD

PROCESO: HSEQ

Página 1 de 1

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
23/01/21	Luis Bernardo	Ariza	13929304	obrero	Bien	6:45	34.5	Bien	12. Pm	36	Bien
27/01/21	Luis Bernardo	Ariza	13929304	obrero	Bien	6:50	33.3	Bien	05. Pm	37	Bien
27/01/21	Oscar dario		13925199	Obrero	Bien	6:50	33.9	Bien	5 PM	38.4	Bien
27/01/21	EDKIN Guevara		1005230749	Obrero	Bien	6:50	35.3	Bien	5PM	35.2	Bien
27/01/21	Julian Yesid	Guevara	1007917126	obrero	Bien	6:50	35.3	BIEN	5PM	34	BIEN
25.01/21	Jairo	Burgos	91342214	Tecnico	Bien		33.3			36.2	Bien
26-01-21	Oscar	Roa	13125198	Ayudante	Bien	7:00	34.3			36.4	Bien

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
26-01-21	Cesar	Oliveros	91344112	oficial	no	7:00	33.1	Bien		35.2	BIEN
26.01.21	Jairo	Burgos	91342214	Tecnico	no	7:00	33.4	Bien		35.4	BIEN
26/01/21	Luis Bernardo	Ariza	13929304		no	700				36.2	BIEN
26-01/21	EDKIN Guevara		1005230749	obrero	Bien	70:00	34.1	Bien		35.8	BIEN
26.01/21	Julian	Guevara	1007917126	obrero	Bien	70:00	35.0	Bien	5PM.	34.9	BIEN
27-10/21	Jairo	Burgos	91342214	Tecnico	1	700	35.0			36.1	BIEN
27-01-21	Cesar	Oliveros	91344112	Oficial	no	700	32.7	Bien		36.2	BIEN
27-01-21	Oscar	Roa	13925198	obrero	no	700	30.2	BIEN	ZA		NM

FECHA	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	ENFERMEDAD PRE EXISTENTE	HORA DE INGRESO	CONTROL DE TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD	HORA DE SALIDA	CONTROL TEMPETARURA CORPORAL	ESTADO DE SALUD
27-01-21	EDKIN Guevara		1005230749	obrero	Bien	6:55	35.2	Bien		36.2	BIEN
27.01.21	Luis Bernardo	Ariza	13929304	obrero	Bien	6:57	33.9	Bien		36.8	BIEN
27/01/21	Julian Yesid	Guevara	1007917126	obrero	Bien	6:57	33.3	Bien	5:AM	35.2	Bien
29/01/21	Jairo	Burgos	91342214	Tecnico	1	700	37.5	BIEN		35.2	BIEN
28-01-21	Oscar	Roa	13925198	ayudante	no	7:00	34.2	Bien		36.4	BIEN
28-01-21	Cesar	Oliveros	91344112	oficial	no	7:00	32.6	Bien		37.1	BIEN
28-01-21	Arley Guevara	JIMENEZ	1005230749	obrero	no	7:00	33.2	Bien		36.5	BIEN
