ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA** SUBPROCESO **CONSULTORÍA** TITULO **INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 2**	CONSTRUMARCA S.A.S. NIT. 800.509.427 - 9

INFORME N°	**8**	**PERIODO:**	**9/10/2021** (de/mm/yyyy)	**AL:**	**15/10/2021** (dd/mm/yyyy)
CONTRATO DE OBRA Nº	**795 DE 2021**	**CONTRATISTA:**	**AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S**		
CONTRATO INTERVENTORÍA Nº	**798 DE 2021**	**CONTRATISTA:**	**CONSTRUMARCA SAS**		

OBJETO: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.".**

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA:	**20/8/2021** (dd/mm/yyyy)	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA:**	**4/2/2022** (dd/mm/yyyy)
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:	**20/8/2021** (dd/mm/yyyy)	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:**	**7/3/2022** (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

LEGAL:

La interventoría radicó ante la secretaria distrital de habitat el informe semanal No.07.
El contratista presentó cronograma general de actividades para la fase I de validación y la fase II de ejecución, el cual fue aprobado por la interventoría y remitido a la SDHT el 11 de octubre de 2021.

TÉCNICO:

lunes: Se realizó validaciones en la localidad de Ciudad Bolivar para los siguientes MVCB_5339, MVCB_5338, MVCB_5342, MVCB_5267, MVCB_5270, MVCB_5204, MVCB_5163, MVCB_5168, MVCB_5167, MVCB_5160, MVCB_5210, MVCB_5553
martes:Se realizó validaciones en la localidad de Ciudad Bolivar para los siguientes MVCB_0964, MVCB_2340, MVCB_5329, MVCB_2830, MVCB_2920, MVCB_0571, MVCB_2733, MVCB_3385, MVCB_0538, MVCB_3399, MVCB_3139.
miercoles:Se realizó validaciones en la localidad de Ciudad Bolivar para los siguientes, MVCB_1460, MVCB_3228, MVCB_3227, MVCB_3226, MVCB_3235, MVCB_1786, MVCB_3285, MVCB_1378, MVCB_2772
jueves:se realizaron validaciones en la localidad de ciudad bolivar de los siguientes mvs ,, MVCB_3293, MVCB_4378, MVCB_0277, MVCB_4354, MVCB_2899, MVCB_2797, MVCB_4328. Se realizaron aperturas en la localidad de Rafael Uribe Uribe de los siguientes MV: MV 091, MV 204, MV 330, MV 765, MV 148 y MV 152.
viernes:Se realizó reunión interventoría y contratista con el fin de poder analizar y revisar los presupuestos de las visitas de validacion presentados por el contratista. Se realizaron validaciones en la localidad de ciudad bolivar de los siguientes mvs ,MVBCB_1216, MVBCB_2597, MVBCB_2663, MVBCB_2645, MVBCB_2554, MVBCB_2556. Tambien se realizaron validaciones en la localidad de Rafael Uribe Uribe de los MV: MV 044 y MV 116.
sabado:Se realizó reunión interventoría y contratista con el fin de poder analizar y revisar los presupuestos de las visitas de validacion presentados por el contratista. MVBCB_1444, MVBCB_2663, MVBCB_2649,MVBCB_1163.

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION		APERTURA		CIERRE		DIAS DE ATRASO SEGUN ESTADO	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
			PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL						
2	MV_04993		24-sep-21		12-oct-21				21	CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	ROSALBINA ZABALA MENDOZA		
3	MV_091	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	12-oct-21	14-oct-21			-2	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO		De acuerdo al presupuesto realizado se consolido el cambio de cubierta del frente del predio, adecuacion de cocina, bajantes de aguaslluvias e instalacion de flanches dentro de las actividades a ejecutar.
8	MV_148	**Apertura**	14-sep-21	14-sep-21	12-oct-21	14-oct-21			-2	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE		De acuerdo al presupuesto presentado por el contratista se intervendrá la cubierta con instalacion de canales, flanches e instalacion de cielo rasos.
9	MV_152	**Apertura**	14-sep-21	17-sep-21	12-oct-21	14-oct-21			-2	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS		De acuerdo al presupuesto presentado por el contratista se intervendra la cubierta del tercer piso con instalacion de canales, flanches.
14	MV_164	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	13-oct-21				0	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA		
15	MV_202	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	13-oct-21				0	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ		

16	MV_204	**Apertura**	16-sep-21	16-sep-21	13-oct-21	14-oct-21			1	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL		De acuerdo al presupuesto presentado por el contratista se intervendra la cubierta del tercer piso y adecuaciones y mejoramiento alcoba costado norte del mismo nivel.
21	MV_330	**Apertura**	17-sep-21	17-sep-21	12-oct-21	14-oct-21			2	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR		De acuerdo al presupuesto presentado por el contratista se intervendra la cubierta del en el primer y segundo nivel del predio.
25	MV_415	**RENUNCIA**	20-sep-21							CL 36F SUR 11A 02	LOMAS	DIEGO FERNEY CAMACHO MONTAÑO		RENUNCIA
27	MV_42764-IDU		13-sep-21						32	CARRERA 27F 71D 34 SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Convenio 1481 - IDU	FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO		
35	MV_507	**validada**	23-sep-21	23-sep-21	12-oct-21				0	Cl 36H SUR 11C 81	LOMAS	EDELMIRA RAMIREZ DE ORJUELA		demolicion de enchape piso, alistados pisos,pañetes pinturas
38	MV_520	**RENUNCIA**	21-sep-21							CL 36H SUR 11C 51	LOMAS	NUBIA RAMIREZ RUEDA		RENUNCIA
45	MV_765	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	13-oct-21	14-oct-21			1	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO		De acuerdo al presupuesto presentado por el contratista se intervendra la cubierta del segundo piso y adecuaciones y mejoramiento de las alcobas de este nivel
47	MVBL_1875	**RENUNCIA**	14-sep-21							CL 66 SUR 89A 77	BOSA LA LIBERTAD	MARIA LUZ BONILLA		RENUNCIA
56	MVCB_1257	**validada**	20-sep-21	22-sep-21	19-oct-21				2	CL 70M SUR 18L 71	TRANSICION HABITARTE 2019	QUERUBIN OSPINA		alistado pisos, enchapes piso, demolicion de enchape muros en cocina, pintura
69	MVCB_1422	**validada**	21-sep-21	22-sep-21	19-oct-21				1	CL 70I SUR 18L 60	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CRUZ RAMIREZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
72	MVCB_1444	**validada**	7-oct-21	9-oct-21	15-oct-21				2	CL 70H SUR 18L 40	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA LIGIA SUAREZ GOMEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
79	MVCB_1536	**validada**	21-sep-21	22-sep-21	20-oct-21				1	KR 18M 70M 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE LOS ANGELES SALCEDO PRECIADO		
82	MVCB_1554	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	14-oct-21				0	CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
84	MVCB_1569	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	20-oct-21				1	KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
85	MVCB_1596	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	20-oct-21				1	CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH ORJUELA DE TAPIERO		pañetes en general, enchapes en pisos general, enchapes de muros en cocina y baño, combo sanitario, pañetes y pinturas
89	MVCB_1627	**validada**	27-sep-21	15-sep-21	14-oct-21				-12	KR 19 70H 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIZABETH ROJAS CARDENAS		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
90	MVCB_1629	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	14-oct-21				0	KR 19 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY AREVALO TALERO		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
92	MVCB_1723	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CECILIA BARATO BETANCOURT		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
93	MVCB_1727	**validada**	27-sep-21	20-sep-21	20-oct-21				-7	KR 18Q 70J 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
94	MVCB_1736	**RENUNCIA**	16-sep-21							KR 18P 70J 03 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SIXTO ALFONSO LAITON COY		RENUNCIA
98	MVCB_1753	**validada**	27-sep-21	20-sep-21	20-oct-21				-7	CL 70I SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
99	MVCB_1762	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	14-oct-21				0	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
110	MVCB_1888	**validada**	22-sep-21	15-sep-21	14-oct-21				-7	KR 18N 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDITH GARCIA SOZA		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
118	MVCB_2176	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	14-oct-21				1	CL 69B BIS A SUR 18R 39	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
130	MVCB_2599	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	14-oct-21				0	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta


142	MVCB_2912	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	14-oct-21				0	DG 69A BIS B SUR 18M 10	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
144	MVCB_2937	**validada**	24-sep-21	15-sep-21	14-oct-21				1	TV 18N BIS 69A 92 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA ARIZA MORENO		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
166	MVCB_3088	**validada**	17-sep-21	17-sep-21	14-oct-21				0	TV 18 W 69 C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
183	MVCB_3639	**RENUNCIA**	16-sep-21							TV 18N BIS 69A 67 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SALOMON TRIANA SALGUERO		RENUNCIA
194	MVCB_5116	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	14-oct-21				1	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA GALINDO RANGEL		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
199	MVCB_5145	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	19-oct-21				0	CL 69P SUR 18N 42	TRANSICION HABITARTE 2019	WILSON CORTES CONTRERAS		Demolicion de pañetes en general, pisos meson cocina, baño, alistados pisos , pañetes nuevos, pinturas, alistados enchapes combo sanitario
210	MVCB_5209	**RENUNCIA**	24-sep-21							DG 69Q SUR 18N 73	HABITARTE 2019-MV	MARCELINDA MURCIA		RENUNCIA
213	MVCB_5223	**validada**	17-sep-21	22-sep-21	14-oct-21				1	CL 69 P BIS C SUR 18P-49	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE GUSTAVO GRAJALES		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
215	MVCB_5250	**RENUNCIA**	23-sep-21							TV 18P 69Q 18 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	YHON ALEXANDER PEREZ PULIDO		RENUNCIA
219	MVCB_5279	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	19-oct-21				0	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ		demolicion de enchapes pisos y muros, pinturas, cambio de combo sanitario
222	MVCB_5316	**validada**	8-sep-21	8-sep-21	19-oct-21				0	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO		actividades de pañetes . pisos , alistado, baño
232	MVCB_5398	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	14-oct-21				0	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
238	MVCB_5414	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	14-oct-21				0	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
241	MVCB_5418	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	14-oct-21				0	KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
256	MVCB_5556	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	19-oct-21				0	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS		se realizará colocacion de cielo raso, preparación de superficie para instalacion de enchape piso , pinturas, demolición de meson en cocina, enchape en muros,
257	MVJA_0091		2-oct-21		14-oct-21				13	CL 61A SUR 18N 27	TRANSICION - JALISCO	JOSE ALEXANDER GOMEZ MORA		
258	MVJA_0187		1-oct-21		11-oct-21				14	CL 61C SUR 18N 09	TRANSICION - JALISCO	OVIDIO GOMEZ VARGAS		
259	MVJA_0261		30-sep-21		11-oct-21				15	CL 61D SUR 18P 12 IN 11	TRANSICION - JALISCO	MARIA DE LOS ANGELES SILVA DUQUE		
261	MVJA_0307		30-sep-21		11-oct-21				15	CL 62 BIS SUR 18K 10	TRANSICION - JALISCO	DAGOBERTO RODRIGUEZ CANTOR		
262	MVJA_0316		1-oct-21		11-oct-21				14	CL 62 BIS SUR 18K 28	TRANSICION - JALISCO	MARIA EBELIA LEAL		
263	MVJA_0369		30-sep-21		11-oct-21				15	CL 62 SUR 18J 70	TRANSICION - JALISCO	JOSE LEOPOLDO PEÑALOZA		
265	MVJA_0387		15-sep-21		11-oct-21				30	CL 62 SUR 18K 59	TRANSICION - JALISCO	MARTIN MEDINA BERRIO		

268	MVJA_0853		29-sep-21		12-oct-21				16	CL 63A SUR 18R 13	TRANSICION - JALISCO	RAFAEL ENRIQUE URIBE LOZANO		
269	MVJA_0917		30-sep-21		12-oct-21				15	CL 63C SUR 18P 05	TRANSICION - JALISCO	ERNESTO TIBANA BLANCO		
272	MVJA_1265		1-oct-21		12-oct-21				14	CL 64D SUR 18M 20	TRANSICION - JALISCO	DIANA MARCELA MRTINEZ RODRIGUEZ		
274	MVJA_1405		2-oct-21		14-oct-21				13	CL 65 SUR 18R 42	TRANSICION - JALISCO	CESAR CRUZ MOLANO		
277	MVJA_2105		30-sep-21		12-oct-21				15	DG 64A SUR 19B 39	TRANSICION - JALISCO	MARIA DEL TRANSITO POLANIA CRUZ		
279	MVJA_2438		1-oct-21		11-oct-21				14	KR 18K BIS 61 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA LEONOR AVENDANO		
280	MVJA_2512		1-oct-21		11-oct-21				14	KR 18L 61B 26 SUR	TRANSICION - JALISCO	ALEX ARNULFO OLAYA DURAN		
281	MVJA_2536		1-oct-21		12-oct-21				14	KR 18L 63D 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	GRACIELA CARBONEL DE GUZMAN		
288	MVJA_2830	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-21				0	KR 18M BIS 62 16 SUR	JALISCO	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	ADELANTO / ATRASO
EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
TOTAL VALOR VALIDADO FRENTE DE OBRA		0%	

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS	NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR	NUMERO VIVIENDAS APERTURADAS	NUMERO DE VIVIENDAS POR APERTURAR	NUMERO VIVIENDAS TERMINADAS	NUMERO VIVIENDAS POR TERMINAR	NUMERO DE VIVIENDAS PAGADAS	CASOS ESPECIALES RENUNCIAS
310	256	54	6	304	0	310	0	7

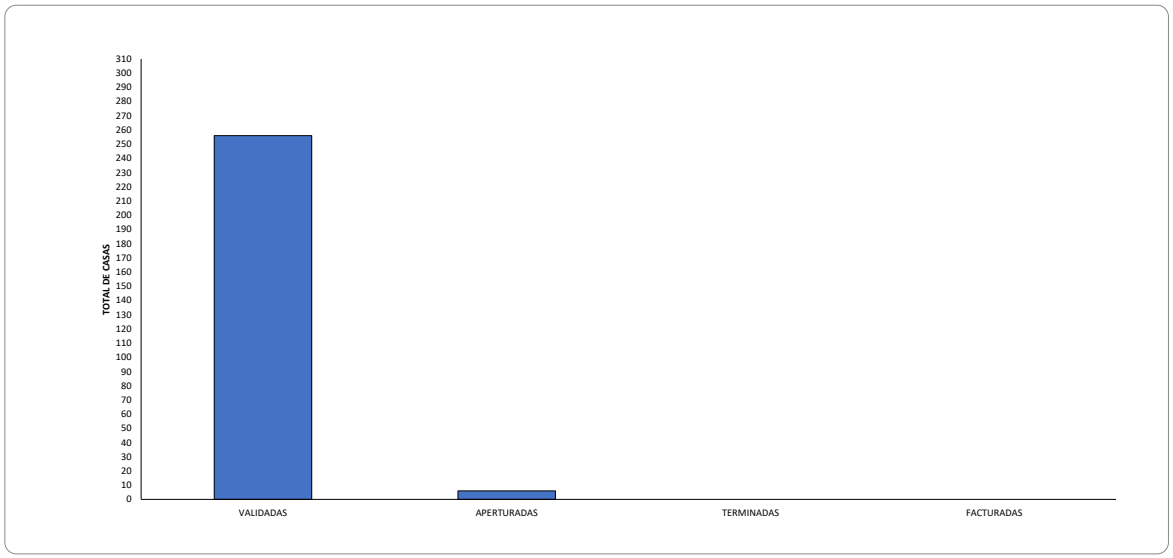

3. PLAZO

Fecha de terminación de ejecución de obra.			**4/2/2022**
CANT. DÍAS	**Total**	**Transcurrido**	**Faltantes**
Contractual	165	56	109
Proyección	165	56	109

4- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	**Fecha Terminación Obra**	**% Tiempo Transcurrido**
Semana Anterior	0	4/2/2022	29,70%
Semana Actual	0	4/2/2022	33,94%

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

JUSTIFICACIÓN:

Se continúa la fase I de validación. Se realizaron 43 visitas de validación en Ciudad Bolivar y 2 visitas de validación en Rafael Uribe Uribe. Total validaciones en la semana: 45 MV.
Durante la semana se reunieron los profesionales técnicos de interventoria y contratista con el fin de revisar y aprobar los presupuestos de validación, como resultado de las visitas a los diferentes viviendas. Se identificó que en todas las viviendas se deben hacer ajustes a los presupuestos entregados por la secretaria puesto que se detectan cambios de actividades, aclarando que los cambios que se generen son en base a los parametros establecidos por la secretaria, con el fin de optimizar los recursos y lograr tener un mayor impacto en la vivienda.
Se inició la fase II de ejecución, con 6 aperturas en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

6- DESCRIPCIÓN CASOS ESPECIALES

Esta semana no se identificaron casos especiales.

7- CONTROL DE COSTOS


Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha a Corte		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$		$	%
Directos+AIU+IVA	$ 5.130.409.981,00				$ 5.130.409.981,00	100,00%
TOTAL	$ 5.130.409.981,00				$ 5.130.409.981,00	100,00%

8- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan atrasos en la validación de algunas viviendas, el atraso maximo es de 32 días en una vivienda.
Tambien se presentan adelantos en la validación de algunas viviendas, el adelanto máximo es de 29 días en una vivienda.
Se ha solicitado al contratista dar estricto cumplimiento a la programación presentada y aprobada por la interventoría, para evitar dicha situación e inconvenientes con los beneficiarios.

9- ESTADO DEL TIEMPO

lunes - clima seco
martes - clima seco
miercoles - llovio despues de medio dia
jueves - clima seco
viernes - clima seco
sabado - clima seco



Interventoría- GRUPO 2
CONTRAUMARCA S.A.S



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MV-044
OBSERVACIONES:	Fase I -Validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MV-044
OBSERVACIONES:	Fase I -Validacion




FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MV-116
OBSERVACIONES:	Fase I -Validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MV-116
OBSERVACIONES:	Fase I -Validacion



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-091
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-091
OBSERVACIONES:	Fase Apertura




FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-204
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-204
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-330
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-330
OBSERVACIONES:	Fase Apertura




FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-765
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-765
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-148
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-148
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-152
OBSERVACIONES:	Fase Apertura



FECHA:	6/10/2021
LUGAR:	MV-152
OBSERVACIONES:	Fase Apertura

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT** **REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME**	CONSTRUMARCA



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5160
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5163
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5163
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5168
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5204
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5210
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5267
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5270
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5338
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5339
OBSERVACIONES:	validacion




FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5342
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	11/10/2021
LUGAR:	MVCB_5553
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_0538
OBSERVACIONES:	validacion

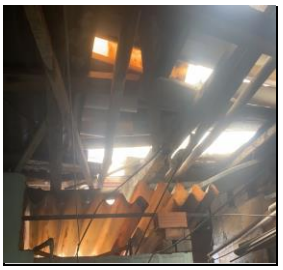

FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_0571
OBSERVACIONES:	validacion




FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_0964
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_2340
OBSERVACIONES:	validacion

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT** **REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME**	CONSTRUMARCA



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_2733
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_2830
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_2920
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_3139
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_3399
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	12/10/2021
LUGAR:	MVCB_5329
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_1378
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_1378
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_1460
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_1786
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_2772
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_3226
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_3227
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_3228
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	13/10/2021
LUGAR:	MVCB_3235
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_2428
OBSERVACIONES:	validacion


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT** **REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME**	CONSTRUMARCA



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_3293
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_4378
OBSERVACIONES:	validacion

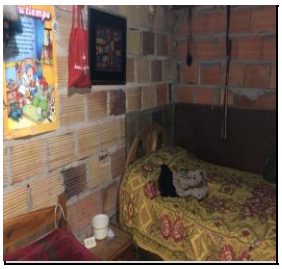

FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_0277
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_4354
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_2899
OBSERVACIONES:	validacion



FECHA:	14/10/2021
LUGAR:	MVJA_2797
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	validacion

Fecha: 19/10/2021	**Periodo:** 9 al 15 octubre de 2021	**Informe No.:** Semanal No. 008
Proyecto: **CONTRATO 798 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT GRUPO 1 Y 2 - 2021."**		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 798 del 2021
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE		LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	795 del 2021
OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
CONTRATISTA	Ambientalmente Ingeniería S.A.S
PLAZO	5 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	20 de agosto del 2021
FECHA FINAL	4 de febrero del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	DIANA LOAIZA

GRUPO 2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. Durante la semana reportada en el informe se dió continuidad a las actividades de Visitas de Validación y el inicio de aperturas en el territorio de Rafael Uribe- Uribe y Ciudad Bolívar. Estas visitas se realizaron según la proyección y programación del contratista, sin embargo, nos permitieron identificar las necesidades habitacionales fundamentales de los beneficiarios del proyecto y en la misma medida las diferentes situaciones de vulnerabilidad socioeconómica que presentan las familias.
   Esta programación no se cumplió en su totalidad.
B. Estas visitas también nos permitieron el reconocimiento geográfico del territorio de Rafael Uribe-Uribe donde se desarrollarán los mejoramientos de vivienda, de esta manera se logró dimensionar diferentes aspectos que representan fortalezas y dificultades al realizar la ejecución

de obras en el territorio, entre estos principalmente los temas de accesibilidad a las viviendas, temas de seguridad.

C. Durante la segunda semana del mes octubre del año en curso, se plasmó por medio de convenciones en el plano de Transición Habitarte del 2019, Jalisco y Rafael Uribe Uribe de las validaciones efectuadas hasta la fecha en las matrices expuestas en los PAC de interventoría y contratista.

D. En relación con la verificación de las caracterizaciones se efectúa, la revisión de la matriz cuantitativa y cualitativa respecto a correcciones de forma teniendo presente la retroalimentación que llevo a cabo, secretaria Distrital del Hábitat SDHT, en cuanto a:
Casilla BB: Eliminar comentario u otros.
Casilla BF: Eliminar comentario otra por casilla vacía.
Casilla S: Se establece el no aplica.
Casilla N: Se unifica criterio de Ciudad de Bogotá D.C.
Casilla P: Se unifica criterio para dejar el correo electrónico en mayúscula sostenida.

E. Se escogió 3 beneficiarios para el desarrollo de la actividad de historias de vida

F. El día 13 de octubre de 2021, se realiza comité de obra en SDHT.

G. Esta semana de octubre se adelantó trabajo de revisión de la matriz cuantitativa y cualitativa de consolidación de información de caracterización social de la fase de validación en Ciudad Bolívar.

H. **CARACTERIZACIÓN O VISITAS DE VALIDACIÓN SOCIAL**

Durante el periodo, se continúa acompañando y verificando por parte de la interventoría **Construmarca S.A.S**, en donde se realizó la división por grupos de profesionales, los cuales efectúan acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones realizadas por los equipos técnico y social del contratista.
En un primer momento se efectúa la presentación con el beneficiario de los dos consorcios, se procede a realizar el protocolo de bioseguridad, seguido a esto, realizar la entrevista y medición dentro del hogar. Asimismo, indagación con respecto al carnet de vacunación del COVID-19. Posteriormente se lleva a cabo la solicitud de documentos para verificar la información relacionada con la identidad de la persona a la cual se le otorgó el subsidio. En un tercer momento se hace entrega de un folleto el cual nombra aspectos relevantes que fueron socialización en la reunión de inicio, para tener en cuenta en la fase de ejecución. Para finalizar se le informa que se efectuará nuevamente contacto telefónico para establecer la segunda visita donde se explicará el presupuesto y aprobación de este por el beneficiario.

VISITAS DE VALIDACIONES						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Sábado 9 de octubre de 2021						
1	MVCB_1444	CL 70H SUR 18L 40	NUEVA COLOMBIA	BLANCA LIGIA SUAREZ	09/10/2021	Se establecen compromisos de arreglos locativos, por parte de la beneficiaria, necesarios para realizar el mejoramiento en el predio. Área técnica brinda la información apropiada para este caso atendiendo las inquietudes de la beneficiaria. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad. Los compromisos se establecen por Acta.
2	MVCB_2663	CL 70D SUR 18I 91	LAS MANITAS	FREDDY ORDOÑEZ	09/10/2021	Durante la visita se evidencia agrietamiento de los muros laterales de la vivienda debidas a asentamiento. Por ello se establece por acta este hallazgo para dejar de manera preventiva frente al mejoramiento en el predio. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación y el acta de hallazgos técnicos, firmada por el beneficiario a conformidad.
3	MVCB_2649	CL 70C SUR 18I 79	LAS MANITAS	MARCO AURELIO BERNAL	09/10/2021	Durante la visita se evidenció que la vivienda presenta dificultades estructurales que afectan el mejoramiento de vivienda, por ello el área técnica determinó solicitar una visita técnica con acompañamiento de SDHT y establecer el proceso de la vivienda. Se establece por Acta está decisión y la información referente al beneficiario, se encuentra pendiente definir está visita con la institución. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por el beneficiario a conformidad.
4	MVCB_1163	KR 18J 69F 23 SUR	NUEVA COLOMBIA	DORA IDALI GALINDO TRIVIÑO	09/10/2021	Durante la visita se evidenció que la vivienda presenta dificultades estructurales que afectan el mejoramiento de vivienda a realizar, por ello se establecieron compromisos de arreglos locativos por parte de la beneficiaria. Dichos compromisos se consignan por Acta. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
Lunes 11 de octubre del 2021						

5	MVCB _5204	DG 69Q BIS SUR 18N 60	VILLAS EL DIAMANTE	MERCEDES ALBINO RODRIGUEZ	11/10/2021	La visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria con la debida autorización escrita. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por el representante de la beneficiaria a conformidad.
6	MVCB _5270	DG 69Q SUR 18N 43 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ALEJANDRINA RODRIGUEZ	11/10/2021	La beneficiaria no habita en el predio por motivos de salud, por ello se le solicita que delegue a una persona de su confianza para el momento de la realización de las obras. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
7	MVCB _5210	DG 69Q SUR 18N 69 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	NANCY DUARTE CALDERON	11/10/2021	Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
8	MVCB _5167	CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	VILLAS EL DIAMANTE	LUIS HERNANDO SOSA	11/10/2021	Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por el beneficiario a conformidad.
9	MVCB _5342	TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ASCENCION MELO FERRUCHO	11/10/2021	se realiza caracterización social y se firma a satisfacción
10	MVCB _5339	TV 18N BIS 69R 40 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA ANUNCIACION JIMENEZ	11/10/2021	se realiza caracterización social y se firma a satisfacción
11	MVCB _5168	CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	VILLAS EL DIAMANTE	ISABEL PERALTA RUIZ	11/10/2021	La familia es mono parental de jefatura femenina, la beneficiaria vive con dos hijos adultos, uno de ellos es pensionado debido a un accidente laboral que le incapacita laboralmente y su hijo menor trabaja independiente y estudia en el SENA. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
12	MVCB _5338	TV 18N BIS 69R 50 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	SAULINA AREVALO BUITRAGO	11/10/2021	Se realiza caracterización social y se firma a satisfacción
13	MVCB _5267	TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	MARBILUZ JAVELA PALOMINO	11/10/2021	Se hace caracterización social y se firma a satisfacción
14	MVCB _5163	CL 69P SUR 18N 40	VILLAS EL DIAMANTE	ALEJANDRO AVELLANEDA	11/10/2021	La visita fue atendida por la hija del beneficiario con respectiva autorización escrita. La familia es nuclear con jefatura masculina, se evidencia alta fragilidad socio económica y áreas de la vivienda en deterioro. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la representante del beneficiario.
15	MVCB _5160	CL 69N SUR 18N 29 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JOSE EFRAIN ROMERO	11/10/2021	La visita fue atendida por la madre del beneficiario con respectiva autorización escrita, se evidencia alta vulnerabilidad socio

						económica y recursos insuficientes para realizar mejoras en el predio. Se explican todas las especificaciones técnicas para cambiar cubierta a partir de inquietudes manifestadas por los beneficiarios del hogar. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la representante del beneficiario.
16	MVCB _5553	DG 69Q SUR 18N 94	VILLAS EL DIAMANTE	NUBIA PALOMINO OSORIO	11/10/2021	Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
X	MVCB _5209	DG 69Q SUR 18N 73	VILLAS DEL DIAMANTE	MARCELINDA MURCIA	11/10/2021	Se realizó Visita de Validación al predio de la beneficiaria y al atendernos no nos permitió ingresar y manifestó que su decisión era renunciar al subsidio de mejoramiento de vivienda. Las razones que la beneficiaria expuso eran básicamente de información errónea que tenía del proyecto. El área social, durante la visita, explicó el proyecto y la información veraz del desarrollo de los procesos en las vivie3ndas, corrigendo los conceptos de la beneficiaria. A pesar de que se explicó correctamente el proceso la beneficiaria no se retractó de su decisión y firma el acta y el formato de renuncia.
Martes 12 de octubre de 2021						
17	MVJA_ 2830	KR 18M BIS 62 16 SUR	ALTOS DE JALISCO	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA	12/10/2021	Maria Luisa Contreras. Visita de validación. Equipo conformado por Johana Rodriguez, Julian Peña, Carolina Navarro. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación, firmada por la beneficiaria a conformidad.
18	MVJA_ 3385	KR 18Q 63A 15 SUR	BARRIO GIBRALTAR I Y II	SONIA JANETH PAEZ	12/10/2021	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Johana Rodriguez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad.
X	MVJA_ 3328	KR 18P BIS B 62A 31 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO	ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA	12/10/2021	Se realiza visita para validación MVJA 33 28 la visita es atendida por la hija del beneficiario la señora Camila Andrea Cabrera. Al llegar a la vivienda manifiesta que ella desea renunciar del proceso del mejoramiento de vivienda ya que días anteriores había conversado con su papá el beneficiario el señor Israel Antonio Cabrera y se había tomado dicha decisión. la parte social del contratista y de interventoría socializan a la hija del beneficiario quien manifestó que es tutora del señor Israel que este consorcio no había realizado antes una

						visita de validación a lo que ella responde que se le hizo hace dos años. luego de esta conversación se pacta nuevamente una visita para validación por parte del consorcio ambientalmente para el día viernes 15 del presente mes qué cosa. Nota la señora Camila es muy enfática en que si no se le realizan las actividades que ella pretende ella desea renunciar del mejoramiento de vivienda.
19	MVJA_2733	KR 18M 62A 20 SUR	ALTOS DE JALISCO	MARIA DEL CARMEN LEAL QUESADA	12/10/21	María del Carmen leal. Visita de validación. Equipo conformado por Julián Peña y Johana Rodríguez. Familia unipersonal, beneficiaria firma a conformidad la información recibida. Sin acompañamiento de interventoría.
20	MVJA_0964	CL 63D SUR 18K 38	DOMINGO LAIN I	MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA	12/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento de interventoría.
21	MVJA_0571	CL 62A SUR 18N 15	ALTOS DE JALISCO	RITO JULIO ROJAS SAENZ	12/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento de interventoría.
22	MVJA_3399	KR 18Q 63D 18 SUR	BARRIO GIBRALTAR I Y II	PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ	12/10/21	Paola Andrea Castrillón. Visita de Validación. Equipo conformado por Yessenia Gámez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. La visita evidencia alta fragilidad socio económica de familia monoparental de jefatura femenina. La beneficiaria a cargo de 2 hijos y con redes de apoyo familiares. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
23	MVJA_2340	KR 18J BIS 63D 20 SUR	DOMINGO LAIN I	MANUEL ANTONIO ROMERO LEON	12/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento.
24	MVJA_0538	CL 62A SUR 18L 39	LA ESCALA 3ER SECTOR	DORIS VASQUEZ	12/10/21	Visita de Validación. Visita de Validación. Equipo conformado por Yessenia Gámez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. Visita de Validación. La visita fue atendida por la hija de la beneficiaria con la debida autorización escrita. La familia es monoparental de jefatura femenina la beneficiaria a cargo de 2 hijos en etapa de vida escolar y no cuenta con redes de apoyo. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la

						representante de la beneficiaria a conformidad.
25	MVCB _5329	TV 18N BIS 69R 21 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	HERCILIA SOTELO VEGA	12/10/21	
26	MVJA_ 2920	KR 18N 62 49 SUR	ALTOS DE JALISCO	FERNANDO CRUZ ORTEGON	12/10/21	
27	MVJA_ 3139	KR 18P 62A 24 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO	JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS	12/10/21	
Miércoles 13 de octubre de 2021						
28	MVJA_ 2772	KR 18M 64A 17 SUR	DOMINGO LAIN II SECTOR Y CONDOMINIO DEL BOSQUE	ROSA RUBIANO OCHOA	13/10/21	Visita de Validación. Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. La visita fue atendida por la beneficiaria, se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
29	MVJA_ 1378	CL 65 SUR 18N 47	LAS DELICIAS DEL SUR ZONA 19	JOSE GONZALO HILARION PARRA	13/10/21	Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. El beneficiario no asistió a la reunión de inicio por lo que área social brinda la información correspondiente y se consigna en el formato la gestión. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por el beneficiario a conformidad.
30	MVJA_ 1786	DG 64 BIS SUR 19 23	SAN LUIS	GEORGINA SALAZAR	13/10/21	Visita de Validación. Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. La beneficiaria vive fuera de la ciudad por motivos de salud, por esta razón recurre a su hijo y su sobrina para que la apoyen en el proceso de mejoramiento. La validación fue atendida por su sobrina con la debida autorización escrita y con apoyo del hijo de la beneficiaria por vía telefónica. Durante la visita el área técnica evidenció alta humedad en el primer piso, hallazgo que se sustenta con registro fílmico y fotográfico. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la representante de la beneficiaria a conformidad.
31	MVJA_ 1460	CL 65B SUR 18M 16	LUCERO MEDIO	WILSON MAURICIO BRICEÑO	13/10/21	Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. Familia nuclear con jefatura masculina, la visita fue atendida por la esposa del beneficiario con respectiva autorización escrita. Se socializa

						toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la representante del beneficiario a conformidad.
32	MVJA_3228	KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO	JORGE ENRIQUE LANCHEROS RENGIFO	13/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento
33	MVJA_3227	KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO	FRANZ GARRY PARRA ROJAS	13/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamien
34	MVJA_3235	KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO	FLOR ALBA BUCURU HERRADA	13/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento.
35	MVJA_3285	KR 18P BIS B 61A 84 SUR	ALTOS DE JALISCO	LUIS ALFREDO CASTRO MENJURA	13/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento.
36	MVJA_3226	KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ	ALTOS DE JALISCO	CARMEN ROSA ACUNA PEREZ	13/10/21	Visita de validación. Equipo conformado por Julian Peña y Yesenia Gamez. Se socializa la documentación de validación, beneficiario firma a conformidad. Visita sin acompañamiento.
Jueves 14 de octubre de 2021						
37	MVJA_3293	KR 18P BIS B 61C 11 SUR	ALTOS DE JALISCO	GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ	14/10/21	Visita de Validación. Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. Por medio de la visita el área técnica evidenció que hay deficiencias estructurales de la vivienda los cuales se socializaron al beneficiario. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por el beneficiario a conformidad.
38	MVJA_4328	TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	ALTOS DE JALISCO	SOR MARIA GOMEZ NARANJO	14/10/21	Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
39	MVJA_4354	TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	ALTOS DE JALISCO	ALICIA ALMARIO NUNEZ	14/10/21	La familia es monoparental, la beneficiaria es adulto mayor con apoyo de su hija, se explica la gestión de autorización de un familiar pues ella eventualmente se ausenta por compromisos de salud. Se socializa toda la documentación correspondiente a la

						validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
40	MVJA_4378	TV 18R 61B 51 SUR	BARRIO GIBRALTAR I Y II	LUZ DARY GUAPACHA LARGO	14/10/21	Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad. Beneficiaria es adulto mayor quien vive con su hija y dos nietos, se observa alta fragilidad socio económica.
41	MVJA_0277	CL 61D SUR 18R 54	BARRIO GIBRALTAR I Y II	DIOSELINA FLOREZ MONTES	14/10/21	La visita evidencia alta vulnerabilidad socio económica por la beneficiaria quien es adulto mayor con apoyo de su hija quién vive en otro predio. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
42	MVJA_2797	KR 18M BIS 61B 13 SUR	ROCIO ALTOS DEL SUR	LUZ MILA VASQUEZ PAEZ	14/10/21	Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.
43	MVJA_2899	KR 18N 61A 64 SUR	ROCIO ALTOS DEL SUR	JAIRO MUÑOZ HERNANDEZ	14/10/21	Familia nuclear de jefatura masculina, el beneficiario y su esposa a cargo de una hija menor en etapa de vida escolar, socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por el beneficiario a conformidad.
Viernes 15 de octubre de 2021						
44	MV_116	KR 9H 39 05 SUR	LOMAS	PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN	15/10/2021	Visita de validación efectiva. Se realiza proceso de validación técnica y social, la visita es atendida por la persona autorizada, en este caso la hija del beneficiario: Lucy Ferrer. Quien firmó a conformidad.
45	MV_O44	KR 9D 38 24	LOMAS	ANA BEATRIZ RINCON RAMOS	15/10/2021	Visita de validación efectiva. Se realiza proceso de validación técnica y social, la visita es atendida por la misma beneficiaria. Quien firmó a conformidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sabado 9 de octubre de 2021	
	
VALIDACION. MVCB_1444 BLANCA LIGIA SUAREZ	VALIDACION. MVCB_2663 FREDDY ORDOÑEZ

	
VALIDACION. MVCB_2649 MARCO AURELIO BERNAL	VALIDACION. MVCB_1163 DORA IDALI GALINDO
	
VALIDACION. MVCB_5204 MERCESDES ALBINO	VALIDACION. MVCB_5270ALEJANDRINA RODRIGUEZ
	
VALIDACION. MVCB_5210 NANCY DUARTE	RENUNCIA. MVCB_5209 MARCELINDA MURCIA
	
VALIDACION. MVCB_5167 HERNAN SOSA	VALIDACION. MVCB_5342 ASCENCION MELO

	
VALIDACION. MVCB_5339 MARIA JIMENEZ	VALIDACION. MVCB_5168 ISABEL PERALTA
	
VALIDACION. MVCB_5338 SAULINA AREVALO	VALIDACION. MVCB_5267 MARBI LUZ JAVELA
	
VALIDACION. MVCB_5163 FABIO AVELLANEDA	VALIDACION. MVCB_5160 JOSE ROMERO
	
VALIDACION. MVCB_5553 NUBIA PALOMINO	

Martes 12 de octubre de 2021	
	
MVJA_2830 MARIA LUISA CONTRERAS. VISITA DE VALIDACIÓN	MVJA_3385 SONIA JANETH PAEZ. VISITA DE VALIDACIÓN. SIN ACOMPAÑAMIENTO INT.
	
MVJA_3328 ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA. VISITA VALIDACIÒN	MVJA_2733 MARIA DEL CARMEN LEAL QUESADA VISITA DE VALIDACIÒN SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INT.
	
MVJA_0964 MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA_VISITA DE VALIDACIÒN. SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INT.	MVJA_0571 RITO JULIO ROJAS SAENZ_ VISITA DE VALIDACIÒN. SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INT.

	
MVJA_3399 _ PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ VISITA DE VALIDACIÒN	MVJA_2340 _ MANUEL ANTONIO ROMERO LEON_ VISITA DE VALIDACIÒN SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INT.
	
MVCB_0538 DORIS VÁSQUEZ_VISITA DE VALIDACIÒN	MVCB_5329 HERCILIA SOTELO VEGA
	
MVJA_2920 FERNANDO CRUZ ORTEGON	MVJA_3139 JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS
Miércoles 13 de octubre de 2021	
	
MVJA_2772_ROSA RUBIANO OCHOA VISITA DE VALIDACIÒN	MVJA_1378_JOSÉ GONZALO HILARIÓN VISITA DE VALIDACIÒN

	
MVJA_1786 GEORGINA SALAZAR VISITA DE VALIDACIÒN	MVJA_1460 WILSON MAURICIO BRICEÑO VISITA DE VALIDACIÒN
	
MVJA_3228 FRANZ GARRY PARRA ROJAS VISITA DE VALIDACIÒN SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INT.	MVJA_3227 JORGE ENRIQUE LANCHEROS RENGIFO VISITA DE VALIDACIÒN SIN ACOMPANAMIENTO DE INT.
	
MVJA_3235 FLOR ALBA BUCURU HERRADA VISITA DE VALIDACIÒN SIN INT.	MVJA_3285 LUIS ALFREDO CASTRO MENJURA VISITA DE VALIDACIÒN SIN INT.
	
MVJA_3226 CARMEN ROSA ACUNA PEREZ VISITA DE VALIDACIÒN SIN INT	

Jueves 14 octubre de 2021



MVJA_3293_GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ VISITA DE VALIDACIÒN



MVJA_4354_ALICIA NUÑEZ_ VISITA DE VALIDACIÒN



MVCB_4328_ SOR MARIA GOMEZ NARANJO VISITA DE VALIDACIÒN.



MVCB_4378_ LUZ DARY GUAPACHA VISITA DE VALIDACIÒN



MVCB_0277_ DIOSELINA FLORES MONTES VISITA DE VALIDACIÒN.



MVCB_2797_LUZ MILA VASQUEZ PAEZ VISITA DE VALIDACIÒN.



MVCB_2899 JAIRO MUÑOZ VISITA DE VALIDACIÒN

Viernes 15 de Octubre de 2021	
	
VALIDACIÓN MV_116 PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN	VALIDACIÓN MV_ 044 ANA BEATRIZ RINCÓN RAMOS

APERTURAS

Durante la semana se realizó el inicio de las aperturas, en un primer momento se realiza protocolo de bioseguridad antes de ingresar a la vivienda, los profesional SST, técnicos u sociales aplica alcohol en manos y suela de los zapatos a cada uno de los profesionales, luego se procede a ingresar a la vivienda para realizar la presentación por parte del profesional social del proyecto al beneficiario u autorizado, seguidamente se procede a realizar socialización de carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social de inicio de obra, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se brindan recomendaciones a tener en cuenta durante la ejecución de la obra, el movimiento de enseres es responsabilidad del beneficiario y su grupo familiar, no se realizan intervenciones en conexiones de agua, luz o gas.

Se recuerda que el beneficiario es quien se compromete a generar espacio para almacenamiento de materiales y disposición de escombros dependiendo las condiciones del predio. Se hace entrega de kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia del Covid -19, la cual es pegada en la puerta principal de la vivienda para que sea tenida en cuenta por la familia del beneficiario y por el personal de obra.se socializa la carta del trato digno. Finalmente se resuelven dudas e inquietudes del beneficiario (a).

Se procede a solicitar al beneficiario las firmas en cada uno de los documentos socializados con anterioridad. Procede a firmar los profesionales del contratista e interventoría.

VISITAS DE APERTURAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Jueves 14 de octubre de 2021						

X	202	KR 11ª 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ	14/10/2021	No efectiva. Visita de apertura no efectiva debido a que el beneficiario no estuvo de acuerdo con las actividades y presupuesto establecido para su vivienda. Por tanto, el equipo técnico - social del contratista e interventoría realizó acta donde queda registrado lo sucedido, firman los profesionales pero el beneficiario no lo hace. Por tanto este caso queda en espera de nuevas indicaciones.
1	MV_330	CL 36 D SUR 11 A 65	LOMAS	ELÍAS NIÑO CORREDOR	14/10/2021	El día 14 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la visita es el mismo beneficiario quien firma a conformidad.
2	MV_148	CL41 SUR 10 A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE	14/10/2021	El día 14 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las

						recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la visita es la persona autorizada señora. Ángela Patricia Garzón.
3	MV_ 152	CL 41 SUR 10 A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	14/10/2021	El día 14 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la

						documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la visita es la misma beneficiaria quien firma a conformidad.
4	MV_765	CALLE 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO	9/10/2021	El día 14 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la visita es la misma beneficiaria quien firma a conformidad.
5	MV_204	KR 11 A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNÁNDEZ GIL	14/10/2021	El día 14 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del

						beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la visita es la hija de la beneficiaria señora: Jacqueline Rico Fernández. Quien está autorizada mediante carta, la autorizada firma a conformidad.
6	MV_ 091	KR 9 H39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO	14/10/2021	El día 14 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la

						visita es la misma beneficiaria quien firma a conformidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Martes 12 Octubre de 2021	
	
Instalación Valla Punto de Atención PAC Lomas	
Jueves 14 de Octubre de 2021	
	
APERTURA MV_330 ELIAS NIÑO CORREDOR	APERTURA MV_148 JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE
	

APERTURA MV_152 MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	APERTURA MV_765 ANA PAULINA SARMIENTO
	
APERTURA MV_204 CARMEN FERNÁNDEZ GIL	APERTURA MV_091 MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO

. **ATENCIÓN PQR** No se atendieron PQRS

PQR				
N.º	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA

a. ENTREGAS

Durante las presentes semanas se realizaron ___

No se realizaron entregas para esta ocasión

ENTREGAS DE OBRA						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**	**OBSEVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA

b. HISTORIAS DE VIDA

Durante el proceso de validación se identificaron y se escogieron las siguientes historias de vida para posterior registro fílmico:

1. MV_ 462 Nombre beneficiario (a): AMPARO OLAYA
Localidad: Rafael Uribe Uribe Desarrollo: Lomas
Dirección: Cl 36 Sur No 11C-13
2. MVCB- 5414: Beneficiario: JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA
Dirección: CL 70C SUR 18R 41 MJ Desarrollo: VILLAS EL DIAMANTE
3. MVCB- 3580Beneficiario: JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO
Dirección: TV 18N BIS A 69A 53 SUR Desarrollo: JUAN PABLO II

c. ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

- Se denota atrasos en la apertura de las viviendas a consecuencia de no contar con los presupuestos aprobados. Debido a dicha situación, retrasa los procesos del contrato.
- Por otro lado, se observa un equipo organizado por parte del contratista no se han presentado dificultades para acceder a la vivienda y que se retrasen los procesos. Se evidencia que algunos números telefónicos no están vigentes debido a esto se han visitado algunas viviendas sin confirmación previa. En algunas visitas han surgido preguntas respecto al presupuesto y áreas a intervenir según el estado actual de la vivienda. Se observa en las casas aspectos constructivos de origen como la humedad que afecta la intervención de las áreas y por ende se debe efectuar modificaciones en los presupuestos.
- Se observa en algunas viviendas aspectos constructivos de origen que impiden la intervención en la totalidad del área a ejecutar, respecto a: Fisuras en la estructura las cuales impiden la intervención en algunas áreas locativas. Causando modificaciones en el presupuesto levantado por la Caja de Vivienda Popular, por ende, se les manifiesta a los profesionales del contratista el levantamiento de acta por la afectación en la garantía al momento de la apertura de la obra. La mayoría de las viviendas presentan humedad debido al sector y el terreno donde se encuentran asentadas.
- Se denota que algunos beneficiarios no pudieron asistir a la reunión de socialización por lo que se explica las fases del proyecto y los principales aspectos a tener en cuenta durante el mismo. En el aspecto de la verificación del esquema de vacunación los beneficiarios cuentan con esquema incompleto, debido a que están a la espera de la vacuna moderna y otros no refieren que lo tengan.
- A nivel sociofamiliar los beneficiarios que fueron validados se infieren diferentes necesidades socioeconómicas y habitacionales de las familias dentro del territorio y el impacto de la Pandemia por el SARS COV 2 en la población, lo cual influyó en cuanto al número de personas que habitan las viviendas, identificando de manera predominante, la tipología extendida. Respecto a las personas a cargo del aspecto económico, máximo común, cesante y una o dos laboran como independientes y se encuentran a cargo de la economía familiar.
- Se evidencia que durante el inicio de las aperturas hubo cambios notorios en la programación respecto a que no se llevó como se tenía planeado.
- Durante la segunda semana del mes de octubre del año en curso, se dio continuidad a las actividades de acompañamiento y verificación por parte de la interventoría Construmarca, Profesional Social Daniela Monzón, Andrés Melo Técnico, junto con el equipo contratista de Ambientalmente; Ricardo Jaimes, Sergio Alzate, Arquitectos y Pablo Orjuela Profesional social; En el TCO/ Jalisco. Según programación del contratista. El día 11 de octubre, se tenía estipulado la validación de los siguientes mejoramientos de vivienda, MVCJA: 2547, 0261, 0187, 4299, 4290, 2512,2438.

  Sin embargo, dichas actividades no fueron posibles siendo postergadas y realizando contacto telefónico e informando del incidente presentado en la zona de robo a mano armada, por dos individuos que atacaron al técnico de interventoría, Andrés Melo a quien lo despojaron de sus pertenencias; celular, billetera, documentos y dinero efectivo. Y al Sr Ovidio Gómez Vargas del MVJA_0187 beneficiario al cual se había llamado para encontrar al equipo de la validación y quien, por defender al mismo, fue herido por uno de los asaltantes, los cuales huyeron hacia la avenida Boyacá. Se evidencia, que a pesar que se llevó a cabo el protocolo de seguridad en cuanto ha; estar todo el equipo siempre unido, y solicitar el acompañamiento del beneficiario. No fue posible evitar el incidente. Dicho motivo ocasiono, el cese de las actividades propuestas por

el contratista mientras se efectuaba la denuncia ante la policía del CAI del barrio lucero. Por dicha situación se elabora estrategia de mecanismo de cuidado para mitigar el riesgo y dar respuesta a la problemática social que se presenta en el territorio y que aqueja a la comunidad. Por parte de los profesionales sociales que estuvieron involucrados en la situación.

d. CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	7
Caracterizaciones	252
Renuncias	5
Aperturas	0
Cierres PQR	0
Entregas	0

e. PROGRAMACIÓN SEMANA SIGUIENTE

Se llevarán a cabo las actividades correspondientes a la programación del contratista.

LINA ESTEFANIA CELEITA YATE
COORDINADORA SOCIAL INTERVENTORÍA.

CONSTRUMARCA S.A.S.	**INFORME SEMANAL PAPSO** **INTERVENTORIA**
	SEMANA 8

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 DE 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021
CONTRATISTA	CONSTRUMARCA S.A.S.
PLAZO	6 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	7 DE MARZO DE 2022

INFORME SEMANAL DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) POR PARTE DEL CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO SEGÚN LA CIRCULAR 001
MV VALIDADOS

Reportar las medidas sanitarias y lineamientos técnicos para el trabajo seguro durante la emergencia nacional, control para la prevención y mitigación el contagio por COVID19, que promueve por medio de actividades de prevención de la salud del personal de CONSTRUMARCA S.A.S, para poder controlar la propagación del virus a nivel nacional como también a todo el personal como contratistas y del equipo de interventoría.

En los Pac de interventoría y del contratista se realiza la desinfección del personal que ingresa a las instalaciones.

El personal administrativo de interventoría y del contratista se turna para realizar la desinfección de las superficies de las instalaciones donde se encuentran laborando.

Durante la semana el vehículo que se utiliza en los recurridos del territorio, el conductor realiza la desinfección a diario antes de empezar las actividades diarias.

Fase I.

Validación: El profesional social del contratista antes de ingresar a la vivienda, le hace entrega de un tapabocas desechable al beneficiario y las personas que se encuentran en la vivienda.

En el momento de la visita de validación, antes de realizar el ingreso a la vivienda se realiza la desinfección de la persona social, técnico y sst del contratista y de interventoría que va a ingresar al MV a realizar sus actividades correspondientes a la validación, el profesional social realiza la verificación de las carnes de la vacunación COVID y realiza el diligenciamiento del formato vacunas COVID y la documentación correspondiente a la validación.

MV VALIDADOS

No	ID DE LA VIVIENDA - MV	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
1	MVCB_5163	CL 69P SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
2	MVCB_5339	TV 18N BIS 69R 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
3	MVCB_5168	CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
4	MVCB_5167	CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
5	MVCB_5160	CL 69N SUR 18N 29 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
6	MVCB_5338	TV 18N BIS 69R 50 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
7	MVCB_5270	DG 69Q SUR 18N 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
8	MVCB_5210	DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
9	MVCB_5267	TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR

10	MVCB_5342	TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
11	MVCB_5553	DG 69Q SUR 18N 94	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
12	MVCB_5209	DG 69Q SUR 18N 73	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
13	MVJA_0964	CL 63D SUR 18K 38	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
14	MVJA_2340	KR 18J BIS 63D 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
15	MVCB_5204	DG 69Q BIS SUR 18N 60	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
16	MVCB_5329	TV 18N BIS 69R 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
17	MVJA_2830	KR 18M BIS 62 16 SUR	JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
18	MVJA_2920	KR 18N 62 49 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
19	MVJA_0571	CL 62A SUR 18N 15	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
20	MVJA_2733	KR 18M 62A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
21	MVJA_3385	MVJA_3385	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
22	MVJA_0538	CL 62A SUR 18L 39	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
23	MVJA_3399	KR 18Q 63D 18 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
24	MVJA_3139	KR 18P 62A 24 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR

25	MVJA_3227	KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
26	MVJA_3285	KR 18P BIS B 61A 84 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
27	MVJA_3228	KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
28	MVJA_3235	KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
29	MVJA_3226	KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
30	MVJA_2772	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
31	MVJA_1378	CL 65 SUR 18N 47	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
32	MVJA_1786	DG 64 BIS SUR 19 23	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
33	MVJA_1460	CL 65B SUR 18M 16	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
34	MVJA_2899	KR 18N 61A 64 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
35	MVJA_4328	TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
36	MVJA_4354	TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
37	MVJA_2797	KR 18M BIS 61B 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
38	MVJA_0277	CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
39	MVJA_4378	TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR

40	MVJA_3293	KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
41	MV_116	KR 9H 39 05 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE
42	MV_044	KR 9D 38 24 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE

Fase II.

Apertura: Se realiza la desinfección antes de ingresar a la vivienda a las profesiones sociales, técnicos y sst del contratista que van a realizar las actividades correspondientes a la apertura con el acompañamiento de los profesionales de interventoría.

Le socializa los cuidados que se deben tener con el personal operativo y administrativo que visita la vivienda durante el mejoramiento de vivienda con respecto al covid, se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario aclarándoles que los personales operativos deben llegar con su propio kit de desinfección, se hace entrega de 15 tapabocas, un litro de alcohol, un litro de hipoclorito. Un litro de jabón líquido, un litro de gel antibacterial y un paquete toallas de papel.

Se le realiza la socialización de la señalización que se deja instalada en una parte visible de la vivienda a los beneficiarios.

MV APERTURADOS

No	MN	DIRECCION	BARRIO	LOCALIDAD
1	MV_330	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	RAFAEL URIBE
2	MV_204	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE
3	MV_148	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	RAFAEL URIBE
4	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	RAFAEL URIBE

5	MV_765	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	RAFAEL URIBE
6	MV_091	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE

REGISTRO FOTOGRAFICO

Evidencia fotográfica de la gestión realizada del protocolo de bioseguridad durante el desarrollo de los mejoramientos vivienda por parte de interventoría y el contratista.

Entrega del kit de desinfección al beneficiario	**Entrega del kit de desinfección al beneficiario**	**Entrega del kit de desinfección al beneficiario**
		
Desinfección del personal administrativo de interventoría y del contratista antes de ingresar a la vivienda	**Desinfección del personal administrativo de interventoría y del contratista antes de ingresar a la vivienda**	**Desinfección del personal administrativo de interventoría y del contratista antes de ingresar a la vivienda**
		

CONSTRUMARCA S.A.S	**INFORME SEMANAL PAPSO** **INTERVENTORIA**
	SEMANA 8

Elaborado



Dalia Cárdenas
Profesional SST
Construmarca S.A.S

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 09 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 15 de octubre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830509427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$5.130.409.981
Valor Adicional 1	N.A
Valor Actualizado	$5.130.409.981
Plazo Inicial	5 MESES 15 DIAS
Plazo Prórroga 1	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES 15 DIAS
Fecha de Iniciación	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación Inicial	4 de febrero de 2022
Fecha de Terminación Actual	4 de febrero de 2022
No. de empleos generados	15

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$615.594.670
Valor Adicional 1	N.A
Valor Actualizado	$615.594.670
Plazo Inicial	6 MESES 15 DIAS
Plazo Prorroga 1	N.A
Plazo Actualizado	6 MESES 15 DIAS
Fecha de Iniciación	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación Inicial	7 marzo de 2022
Fecha de Terminación Actual	7 marzo de 2022
No. De empleos generados	11

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LINA MARIA SAZIPA MORENO (Escriba el nombre del Supervisor Habitat)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra 1-2021-41954 (Escriba el número del oficio radicado Habitat) **de fecha** 11/10/2021 (dd-mm-aa)

A. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO VISITADOS DURANTE LA SEMANA SISO - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD COVID 19

No	ID DE LA VIVIENDA - MV	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD	Estado del MV	KIT DE PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO A LO IMPLEMENTADO POR EL CONTRATISTA
1	MVCB_5163	CL 69P SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
2	MVCB_5339	TV 18N BIS 69R 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
3	MVCB_5168	CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
4	MVCB_5167	CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
5	MVCB_5160	CL 69N SUR 18N 29 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
6	MVCB_5338	TV 18N BIS 69R 50 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
7	MVCB_5270	DG 69Q SUR 18N 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
8	MVCB_5210	DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
9	MVCB_5267	TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
10	MVCB_5342	TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
11	MVCB_5553	DG 69Q SUR 18N 94	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
12	MVCB_5209	DG 69Q SUR 18N 73	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
13	MVJA_0964	CL 63D SUR 18K 38	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
14	MVJA_2340	KR 18J BIS 63D 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 09 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 15 de octubre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

15	MVCB_5204	DG 69Q BIS SUR 18N 60	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
16	MVCB_5329	TV 18N BIS 69R 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
17	MVJA_2830	KR 18M BIS 62 16 SUR	JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
18	MVJA_2920	KR 18N 62 49 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
19	MVJA_0571	CL 62A SUR 18N 15	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
20	MVJA_2733	KR 18M 62A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
21	MVJA_3385	KR 18Q 63A 15 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
22	MVJA_0538	CL 62A SUR 18L 39	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
23	MVJA_3399	KR 18Q 63D 18 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
24	MVJA_3139	KR 18P 62A 24 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
25	MVJA_3227	KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
26	MVJA_3285	KR 18P BIS B 61A 84 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
27	MVJA_3228	KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
28	MVJA_3235	KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
29	MVJA_3226	KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
30	MVJA_2772	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
31	MVJA_1378	CL 65 SUR 18N 47	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
32	MVJA_1786	DG 64 BIS SUR 19 23	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
33	MVJA_1460	CL 65B SUR 18M 16	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
34	MV_330	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	RAFAEL URIBE	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
35	MV_204	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
36	MV_148	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	RAFAEL URIBE	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
37	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	RAFAEL URIBE	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 09 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 15 de octubre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

38	MV_765	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	RAFAEL URIBE	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
39	MV_091	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
40	MVJA_2899	KR 18N 61A 64 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
41	MVJA_4328	TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
42	MVJA_4354	TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
43	MVJA_2797	KR 18M BIS 61B 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
44	MVJA_0277	CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
45	MVJA_4378	TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
46	MVJA_3293	KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
47	MV_116	KR 9H 39 05 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
48	MV_044	KR 9D 38 24 SUR	LOMAS	RAFAEL URIBE		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 09 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 15 de octubre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFÍCO - KIT, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN









COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA
RESUMEN Manejo de Residuos y escombros Seguimiento:	SEMANA		
Durante el periodo no se ejecutaron labores generadoras de residuos.	MES		
	PROYECTO		

COMPONENTE SST: Actividades Ejecutadas:

Contratista:
Se continua con las validaciones en los predios donde se van a realizar los mejoramientos de viviendas y se realiza la apertura de los MV en el territorio de lomas.

Semana 8
Durante el periodo de las actividades de campo - fase I validación, se realiza la entrega de tapabocas a los beneficiarios que se encuentran en el predio durante la visita de la validación y se realiza la apertura de obra de los MV en el territorio de Lomas; en las aperturas se le hace entrega a los beneficiarios del kit de desinfeccion que consta de un litro de alcohol, un litro de jabon liquido, un litro de gel antibacterial, 15 tapabocas, un litro de hipoclorito y se le socializa al beneficiario la señalizacion que se deja publicada en la vivienda sobre los cuidados que se deben tener .
Se hace la entrega de los informes correspondientes de la semana 7. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimiento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Durante la visita de seguimiento realizada por los profesionales de Secretaria Distrital del Hábitat se hace acompañamiento.

Interventoría: Descripción de actividades en SST de la semana.
Semana 8
Seguimiento al plan de trabajo presentado por la empresa AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S, el cual ha sido cumplido a cabalidad en las actividades propuestas.
Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 7. También se hizo acompañamiento a las validaciones y en las aperturas de los MV en el territorio de Lomas, verificando el cumplimiento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Accidentes e incidentes:
Contratista: 0
Interventoría:0

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 09 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 15 de octubre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

PERSONAL MANO DE OBRA - HORAS HOMBRE TRABAJADAS

CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACONES REALIZADAS	1	PERSONAS INCAPACITADAS		CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACIONES REALIZADAS	1	PERSONAS INCAPACITADAS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA		11	TELETRABAJO	0		CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA		15	TELETRABAJO	0	

DATOS	HORAS TRABAJADAS			HORAS CAPACITACION			AUSENTISMO											
	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS CONTRATISTA	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS INTERVENTORIA	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS TOTAL	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN CONTRATISTA	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN INTERVENTORIA	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN TOTAL	DIAS AUSENTISMO ENFERMEDAD GENERAL		# CASOS COVID CONFIRMADOS		DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS CONFIRMADOS		# CASOS COVID SOSPECHOSOS		DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS SOSPECHOSOS		DIAS AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL		DIAS TOTAL AUSENTISMO	
							CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT
HHT SEMANA	1250	327	1577	1,00	0,25	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHT MES	1250	327	1577	3,00	1,25	4,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHT PROYECTO	1250	327	1577	5,00	2,25	7,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIOSEGURIDAD INDICADORES

Indicadores - Contratista		Indicadores - Interventoría	
a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100:	0,00 %	a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100:	0,00 %
b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %	b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100	0,00 %
c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %	c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %
d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100.	100,00 %	d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100	100,00 %
e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.	100,00 %	e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.	100,00 %

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
El desarrollo de las actividades se viene realizando coordinadamente entre contratista y la interventoría; procurando cumplir con los protocolos y seguimientos semanales, a fin de reportar lo realizo en el punto PAC, trabajadores y hogares, según lo solicitado por la Secretaría Distrital del Hábitat.

RECOMENDACIONES: Cumplir con las responsabilidades contractuales y la legislación vigente y aplicable contractualmente.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 8 (Consecutivo) **DEL** 09 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 15 de octubre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ADICIONALES

INFORMACIÓN GENERAL	DESINFECCION DEL PERSONAL DEL PROYECTO ANTES DE INGRESAR AL A VIVIENDA









DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES

6. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma	x	
2. Registro Fotográfico		x
3.Anexo XXXXXXXX		x
4. Anexo XXXXXXXXX		x
5. Otro		

Cual?

Nota: Si lo requiere.

Se deja constancia que este informe fue remitido el **20-oct-2021** al correo electrónico del profesional de apoyo técnico de la Secretaría Distrital del Hábitat

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los quince de octubre (Día en letras) 15/10/2021 (Día en números)

días del mes de OCTUBRE (Mes en letras) de 2021 (Año de firma del informe)

DALIA CARDENAS

(Nombre) Interventor a cargo

INFORME SEMANAL No. 8
AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. 795 de 2021

OBJETO DEL PROYECTO

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2021

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN 3

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 4

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10

2.INFORME TÉCNICO 16

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA. 16

3.RECURSO HUMANO 22

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD**, la secretaria Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe Uribe.

La empresa Ambientalmente ingeniería S.A.S, celebró el contrato No. 795 de 2021 cuyo objeto corresponde a **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021**

Durante este periodo se inició la primera fase de validación en los territorios de habitarte, jalisco y lomas.

A continuación, se realiza una descripción del avance de las actividades en cada una de las localidades y conciernen al período evaluado del 9 de octubre de 2021 al 16 de octubre de 2021, correspondiente al informe técnico mensual No. 08.

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERISA S.A.S
NIT	900628905
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MANRIQUE PINZON
DATOS DE CONTACTO	administrativo@ambientalmente.com.co
N° CONTRATO	795-2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 – 2021
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	5 meses y 15 días
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	20 agosto del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de febrero de 2021
FIRMA INTERVENTORA	Construmarca s.a.s
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.130.409,5

1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el Supervisor.
3. Elaborar y entregar a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Acompañamiento social de acuerdo con el alcance del anexo técnico.
4. Presentar al interventor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable), para la ejecución del contrato.

5. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción acta de inicio, un plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas, el cual deberá contener los respectivos formatos que se estimen convenientes por parte de interventoría y acordes al documento entregado, el cual deberá ser de estricto cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución de la obra.
6. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.
7. Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la SDHT.
8. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos.
9. Alimentar y hacer entrega de los formatos suministrados por la SDHT como la Caracterización social y el registro de la aplicación de prácticas sostenibles y hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.
10. Suministrar los equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos durante la ejecución del contrato.
11. Realizar reuniones con la Interventoría tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con el Interventor y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
12. El contratista se obliga a entregar a la interventoría los documentos adicionales y en original producto de la ejecución de cada uno de los mejoramientos de vivienda junto con todos los informes, anexos, planos récord y demás documentos que se documenten el estado de este.
13. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos (planos y Especificaciones técnicas), características y condiciones técnicas que hacen parte del presente contrato.
14. Desarrollar las obras de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas de ser el caso por el contratista de obra.
15. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el constructor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de

condiciones, sin perjuicio de 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Común para cada grupo 20 la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar previamente el reemplazo.
16. Asumir cualquier gasto adicional resultante de las modificaciones no aprobadas por el interventor.
17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la interventoría del contrato, con fin de adelantar las acciones a que haya lugar.
18. Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación.
19. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas.
20. Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.
21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades. 22. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.
23. Suscribir en conjunto con la interventoría, el acta de inicio y las actas de recibo a satisfacción de cada una de las Intervenciones de Mejoramiento de Vivienda y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.
24. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
25. Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables.
26. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.
27. Mantener al día debidamente organizada y archivada la documentación del contrato, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría.

28. Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.
29. Adelantar la debida vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.
30. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la SDHT, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.

31. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.
32. Dar estricto cumplimiento a la programación del mejoramiento, teniendo en cuenta que, si no se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según lo propuesto y tasado por la supervisión.
33. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 21 Supervisor, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por la SDHT en el Pliego de Condiciones.
34. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica.
35. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del

contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.
36. El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que la SDHT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones. 37. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.
38. Una vez terminada la ejecución de cada vivienda y a la firma del acta de entrega física de la obra y recibo a satisfacción, hacer entrega a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras, entrega que deberá ser indicada en el acta de recibo a satisfacción de cada vivienda. 39. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo tecnico a cabalidad.
40. Las demás de acuerdo con el anexo técnico del contrato

1.2 Descripción del proyecto

Para la ejecución de la obra en cumplimiento al objetivo general del proyecto se considera la implementación de tres fases:

Fase de validación: En la ejecución de esta fase programa y desarrolla una (1) reunión con los beneficiarios del proyecto de cada bloque de viviendas e informarlos del objetivo del contrato, los actores involucrados, los puntos de atención a la comunidad y los días y horarios de atención. Esto con el fin de resolver las expectativas e inquietudes de la comunidad y demás generalidades de las viviendas entregadas por la SDHT.

Durante esta primera fase, se realizará el proceso de actualización de la caracterización social de cada una de las familias que conforman cada uno de los

bloques, así como, identificar las posibles familias que harán parte de las historias de vida.

Desde el componente técnico se realizará la validación del estado de cada vivienda que conforma el bloque. Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de estructuración, se modificará el alcance inicialmente previsto en cada una de las unidades de vivienda verificadas por parte de la entidad estructuradora, de tal modo que se requerirá adelantar una validación de la información para determinar el alcance final a realizar en cada una de las viviendas.

Dicho alcance contempla como mínimo la realización de las siguientes actividades:

- Realizarlas mediciones pertinentes.
- Determinar las cantidades de obra a tener en cuenta por unidad de vivienda.
- Actualizar presupuestos por unidad de vivienda de ser el caso.

Fase de ejecución de obras: Durante esta fase se procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda, ejecutando las obras de acuerdo con los presupuestos de obra finales y sus especificaciones técnicas para cada una de las mismas.

Para seguimiento de la ejecución se realizarán actas de inicio de obra, de entrega y recibo a satisfacción por cada vivienda. Así mismo, se contará con una bitácora por vivienda, en donde se registrarán las actividades adelantadas desde el primer día de ejecución hasta su finalización, garantizando que en la misma se consignen los imprevistos y observaciones al respecto de la obra programada.

Las obras para ejecutar corresponden a todas aquellas tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas, como: habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento de una vivienda.

Fase de cierre del proyecto: En esta fase se deberá hacer entrega de cada una de las viviendas beneficiarias con su respectiva adecuación u obra contemplada con recibido a satisfacción del beneficiario y la interventoría, de igual manera, concluir

los diferentes procesos establecidos en el proyecto. Se entregará un informe final de ejecución de obras.

En cuanto al componente social, se presentará un *"informe de análisis"* de impacto social el cual debe contener las lecciones aprendidas, observaciones, percepciones, recomendaciones, conclusiones, número de personas beneficiadas y las diferentes actividades y acciones desarrolladas durante la ejecución.



Figura 1. Fases del proyecto

1.3 Localización del Proyecto

El contrato se ejecutará en los territorios de Habitarte- Ciudad Bolívar, Lomas-Rafael Uribe Uribe, Jalisco- Ciudad Bolívar y Bosa la libertad – Bosa.



Figura 2. Localidades de Bogotá.

1.4 Territorio de Habitarte – Ciudad Bolívar.

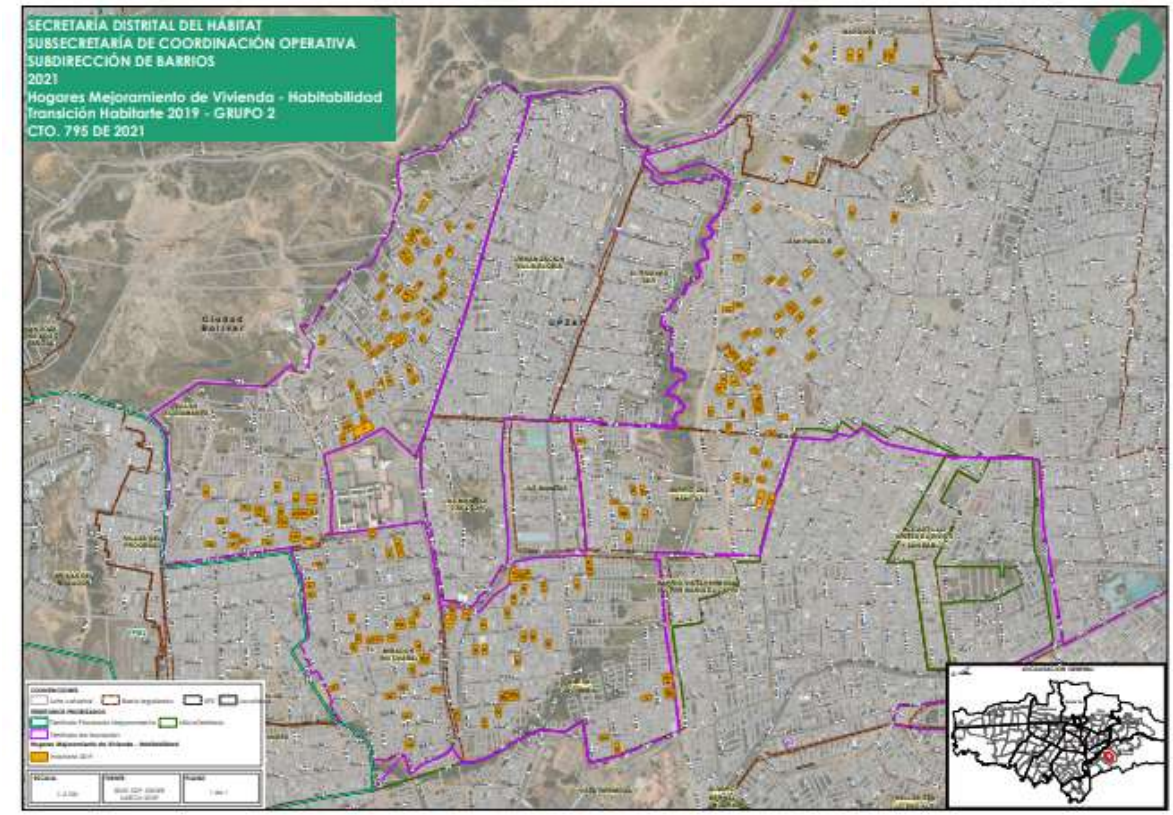


Figura 3. Plano de Habitarte – Ciudad Bolívar.

1.4.1 Territorio de Jalisco – Ciudad Bolívar.

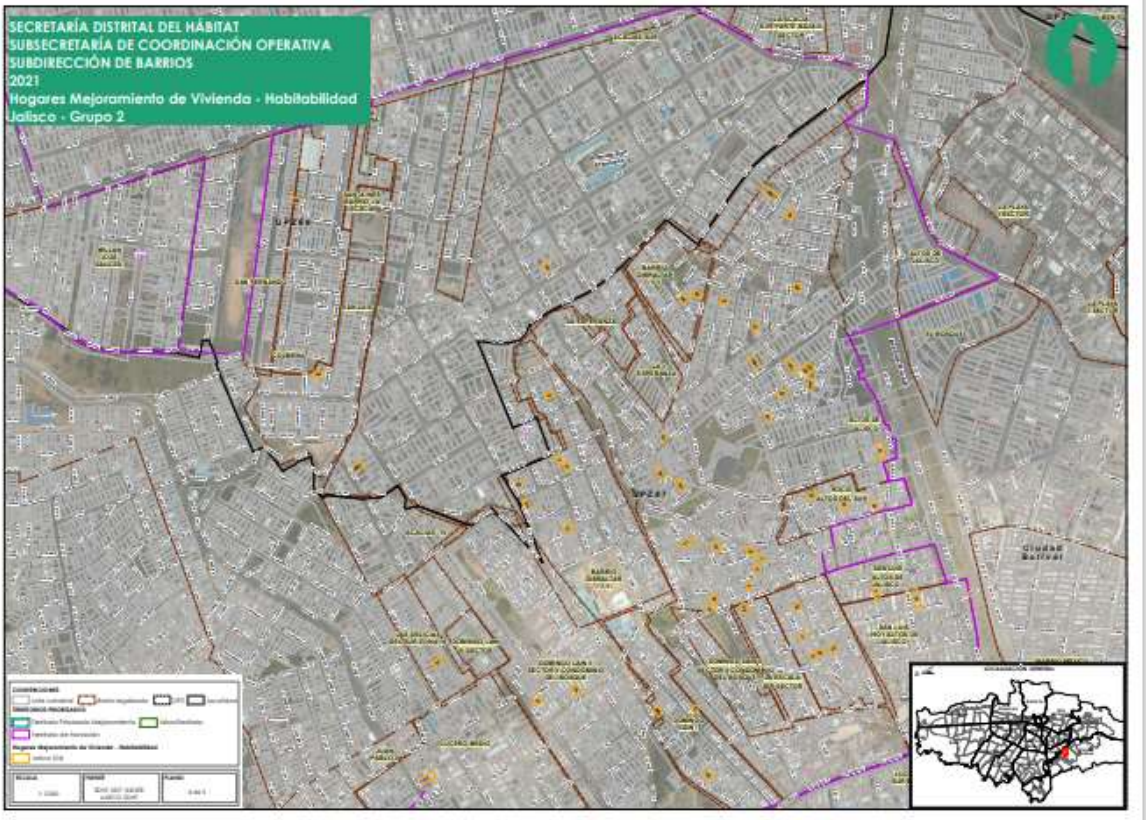


Figura 3. Plano de Jalisco – Ciudad Bolívar.

1.3.3 Territorio de Lomas – Rafael Uribe Uribe.

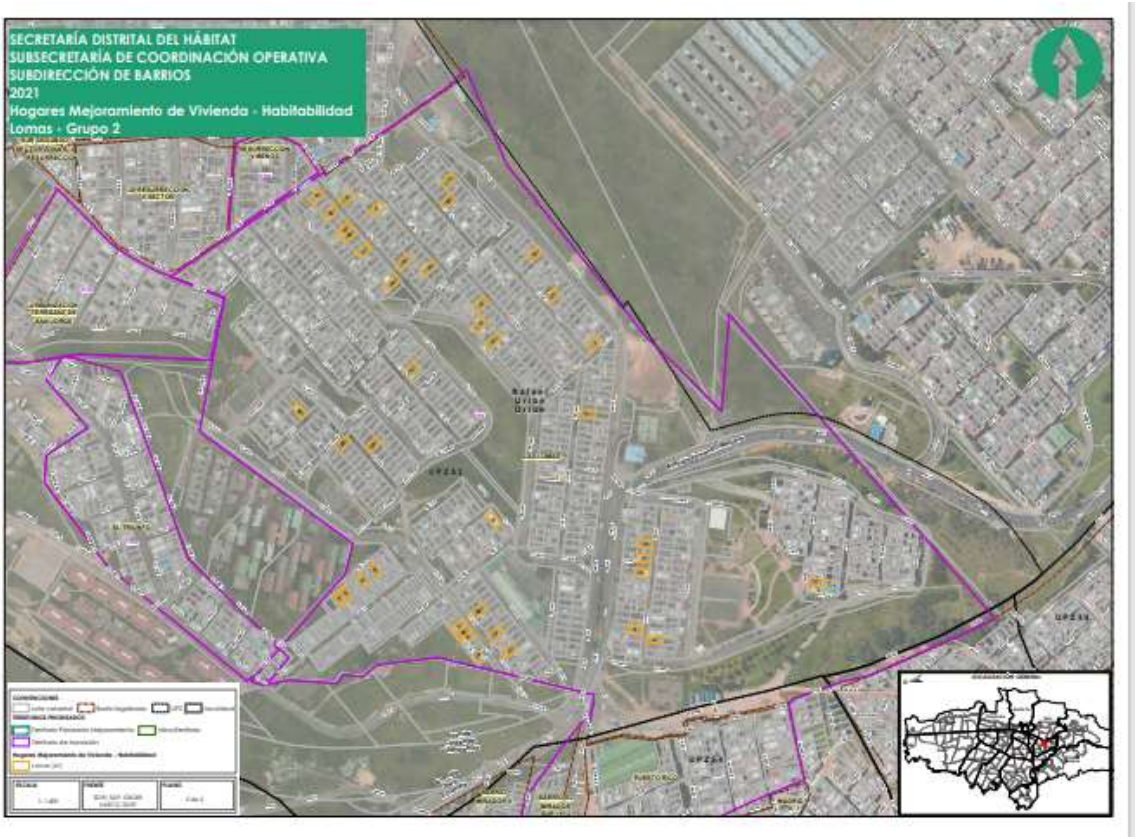


Figura 4. Plano de Lomas – Rafael Uribe Uribe.

1.3.4 Territorio de Bosa la Libertad – Bosa.

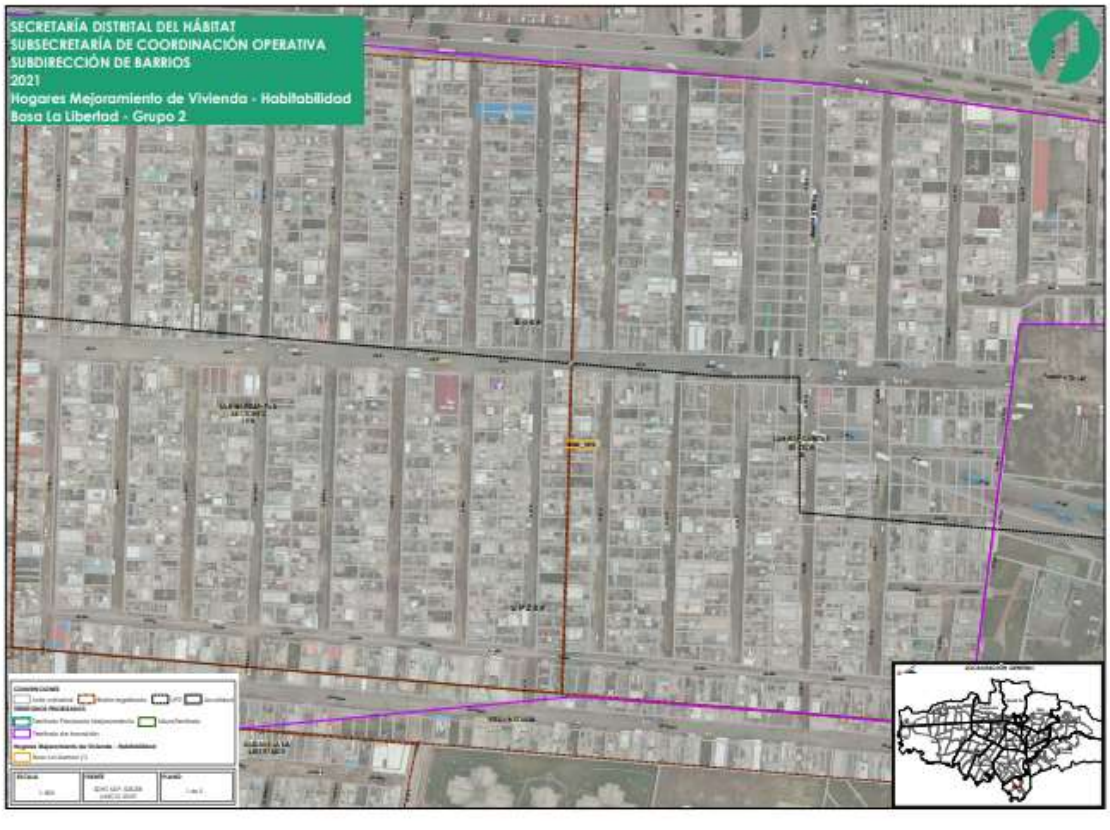


Figura 5. Plano de Bosa la libertad – Bosa.

2.INFORME TÉCNICO

2.1 Actividades realizadas hasta la fecha.

El programa de mejoramiento de vivienda coordinado por la subdirección de Barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat hizo entrega mediante Actas de Reunión debidamente suscritas, junto con los expedientes de los siguientes Mv:



Figura 6. Mapa de localidades con numero de viviendas.

Para dar inicio al proyecto se comenzó con la primera fase de validación, implementando las metodologías de trabajo, se realizaron 4 grupos de trabajos conformados por los siguientes:

- Residente Técnico
- Residente Social
- Residente subcontratista
- Residente Técnico Interventoría
- Residente Social Interventoría.

Esto con el fin de darle un orden al proyecto, se implementó esta metodología para que cada grupo de trabajo estén unidos desde la primera fase hasta el cierre del proyecto. Así puedan ponerse de acuerdo y responder todos por las viviendas asignadas.

Posterior a este proceso, primero los grupos se dirigieron a cada vivienda para corroborar los documentos que las familias ingresaron al momento de postularse para el beneficio que brindo la secretaria distrital del hábitat.

Luego que se realizó correctamente este proceso, los técnicos se encargaron de validar las viviendas de acuerdo con las mediciones del área a intervenir y las condiciones en la que se encontraba cada vivienda, teniendo en cuenta el costo asignado según el subsidio. También, el área social se encargó de recopilar la mayor información en formatos establecidos y se entregaron por vivienda tapabocas para seguir con el protocolo de bioseguridad.

Ahora están en proceso de realizar los respectivos presupuestos para entregárselos a interventoría y que sea para su aprobación.

2.2 Avance de la Validación.

Se hace el análisis de las viviendas intervenidas en la validación, para sacar cuantas viviendas están validadas y cuantas faltan por validar. Cabe resaltar que en esta semana no se validó todos los días, ya que en varios días prepararon la documentación para hacer el cierre de presupuesto.

IDENTIFICACION MV/ FECHA DE VALIDACION	ESTADO	FECHA APERTURA	DIRECCION	BARRIO	NOMBRE	VALOR PRESUPUESTO
MVCB_2649	VALIDADO PRESUPUESTO	9/10/2021	CL 70C SUR 18I 79	TRANSICION HABITARTE 2019	MARCO AURELIO BERNAL RIVERA	$ 12.026.635,70
MVCB_2663	VALIDADO PRESUPUESTO	9/10/2021	CL 70D SUR 18I 91	TRANSICION HABITARTE 2019	FREDY ALEXANDER ORDOÑEZ GALINDO	$ 11.495.445,40

MVCB_1163	VALIDADO PRESUPUESTO	9/10/2021	KR 18J 69F 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORA IDALI GALINDO TRIVIÑO	$ 11.983.190,20
MVCB_1444	VALIDADO PRESUPUESTO	9/10/2021	CL 70H SUR 18L 40	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA LIGIA SUAREZ GOMEZ	$ 11.967.926,60
MVCB_5338	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	TV 18N BIS 69R 50 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SAULINA DEL TRANSITO AREVALO BUITRAGO	$ 11.317.311,00
MVCB_5339	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	TV 18N BIS 69R 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ANUNCIACION JIMENEZ DE AGREDO	$ 11.698.023,70
MVCB_5342	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ASCENCION MELO FERRUCHO	$ 11.571.735,60
MVCB_5163	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	CL 69P SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO ALEJANDRO AVELLANEDA AVELLANEDA	$ 11.696.050,00
MVCB_5270	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	DG 69Q SUR 18N 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEJANDRINA RODRIGUEZ PALACIO	$ 11.981.549,90
MVCB_5204	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	DG 69Q BIS SUR 18N 60	TRANSICION HABITARTE 2019	MERCEDES ALBINO RODRIGUEZ	$ 11.843.083,20
MVCB_5210	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	NANCY DUARTE CALDERON	$ 11.936.962,10
MVCB_5267	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARBILUZ JAVELA PALOMINO	$ 11.895.606,60
MVCB_5553	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	DG 69Q SUR 18N 94	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA PALOMINO OSORIO	$ 11.870.803,00
MVCB_5160	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	CL 69N SUR 18N 29 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EFRAIN ROMERO RODRIGUEZ	$ 12.532.977,10

MVCB_5167	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS HERNANDO SOSA ACEVEDO	$ 12.495.477,30
MVCB_5168	VALIDADO PRESUPUESTO	11/10/2021	CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	ISABEL PERALTA RUIZ	$ 12.518.206,60
MVJA_2830	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	KR 18M BIS 62 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA	$ 11.817.381,00
MVJA_0571	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	CL 62A SUR 18N 15	TRANSICION HABITARTE 2019	RITO JULIO ROJAS SAENZ	$ 9.315.577,20
MVJA_2733	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	KR 18N 62 49 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FERNANDO CRUZ ORTEGON	$ 11.674.375,30
MVJA_2920	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	KR 18P 62A 24 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS	$ 11.954.125,80
MVJA_3139	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	KR 18Q 63D 18 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ	$ 12.510.513,00
MVJA_3399	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	CL 62 SUR 18K 59	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN MEDINA BERRIO	$ 11.370.783,20
MVJA_0538	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	CL 62A SUR 18L 39	TRANSICION HABITARTE 2019	DORIS VASQUEZ	$ 11.101.861,50
MVJA_0964	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	KR 18M 62 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MICHAEL STIVEN CAMACHO VEGA	$ 11.816.590,80
MVJA_2340	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION HABITARTE 2019	DIOSELINA FLOREZ MONTES	$ 10.589.665,10
MVJA_3385	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	CL 63A SUR 18R 13	TRANSICION HABITARTE 2019	RAFAEL ENRIQUE URIBE LOZANO	$ 11.911.630,90

MVCB_5329	VALIDADO PRESUPUESTO	12/10/2021	CL 63D SUR 18K 38	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA	$ 8.721.038,80
MVJA_1378	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	KR 18P BIS B 62A 31 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA	$ 11.924.766,40
MVJA_3226	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALICIA ALMARIO NUNEZ	$ 11.464.058,30
MVJA_3228	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	KR 18J BIS 63D 20 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MANUEL ANTONIO ROMERO LEON	$ 12.204.425,50
MVJA_3235	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA RUBIANO OCHOA	$ 11.960.932,10
MVJA_3285	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ	$ 11.947.458,70
MVJA_1786	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	KR 18Q 63A 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SONIA JANETH PAEZ	$ 12.020.879,40
MVJA_3227	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ DARY GUAPACHA LARGO	$ 12.371.711,70
MVJA_2772	VALIDADO PRESUPUESTO	13/10/2021	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA RUBIANO OCHOA	$ 11.947.458,70
MVJA_2797	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	KR 18M BIS 61B 13 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MILA VASQUEZ PAEZ	$ 9.315.577,20
MVJA_2899	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	KR 18N 61A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIRO MUÑOZ HERNANDEZ	$ 12.276.050,00
MVJA_0277	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION HABITARTE 2019	DIOSELINA FLOREZ MONTES	$ 11.911.630,90

MVJA_4354	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALICIA ALMARIO NUNEZ	$ 12.204.425,50
MVJA_3293	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ	$ 12.020.879,40
MVJA_4378	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ DARY GUAPACHA LARGO	$ 12.134.936,10
MVJA_4328	VALIDADO PRESUPUESTO	14/10/2021	TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SOR MARIA GOMEZ NARANJO	$ 12.113.014,70
MV_044	VALIDADO PRESUPUESTO	15/10/2021	KR 9D 38 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA BEATRIZ RINCON RAMOS	$ 12.482.899,10
MV_116	VALIDADO PRESUPUESTO	15/10/2021	KR 9H 39 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN	$ 10.597.343,40

En esta semana se logró aperturar los siguientes mv:

MV_044	**VALIDADO PRESUPUESTO**	**15/10/2021**	**KR 9D 38 24 SUR**	**TRANSICION HABITARTE 2019**	**ANA BEATRIZ RINCON RAMOS**	**$ 12.482.899,10**
mv_330	APERTURADA	14/10/2021	Cl 36 D SUR 11A 65	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIAS NIÑO CORREDOR	$ 11.668.112,60
MV_152	APERTURADA	14/10/2021	CL 41 SUR 10A 50	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	$ 12.068.229,10
Mv_204	APERTURADA	14/10/2021	KR 11A 41 44 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CARMEN FERNANDEZ GIL	$ 12.338.999,60
Mv_148	APERTURADA	14/10/2021	Cl 41 SUR 10A 74	TRANSICION HABITARTE 2019	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE	$ 12.010.680,60
Mv_765	APERTURADA	14/10/2021	Cl 40 SUR 11A 83	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA PAULINA SARMIENTO	$ 12.371.271,80

Mv_091	APERTURA DA	14/10/2021	KR 9 H 39 58 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO	$ 12.515.352,00

3.RECURSO HUMANO

Para la consecución de las actividades y avance del proyecto, se cuenta con el siguiente personal profesional revisado y aprobado por la interventoría:

MES DE SEPTIEMBRE

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	ESTADO
Coordinadora Social	Diana Loaiza Cantor	52.731.408	Aprobada
Profesional Social	Yessenia Gámez	1.120.745.285	Aprobada
Profesional Social	Pablo Chitiva	1.030.647.671	Aprobada
Profesional Social	Marguie Rincón	1.015.449.947	Aprobada
Profesional Social	Lina Colorado	1.019.022.812	Aprobada
Director de Obra	Carlos García	79.883.138	Aprobada
Residente de Obra	Ricardo Jaime	19.144.052	Aprobada
Residente de Obra	María Isabel Garzón	52.890.684	Aprobada
Residente de Obra	Horacio Triviño Gutiérrez	79.144.042	Aprobada
Residente de Obra	Julián Peña	1.013.624.438	Aprobada
Profesional sst	Giovanna Ibáñez	2787257	Aprobada

MES DE OCTUBRE

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	ESTADO
Coordinadora Social	Diana Loaiza Cantor	52.731.408	Aprobada
Profesional Social	Yessenia Gámez	1.120.745.285	Aprobada

Profesional Social	Pablo Chitiva	1.030.647.671	Aprobada
Profesional Social	Laydi Jhoana	1.015.449.947	Aprobada
Profesional Social	Lina Colorado	1.019.022.812	Aprobada
Director de Obra	Carlos García	79.883.138	Aprobada
Residente de Obra	Ricardo Jaime	19.144.052	Aprobada
Residente de Obra	María Isabel Garzón	52.890.684	Aprobada
Residente de Obra	Horacio Triviño Gutiérrez	79.144.042	Aprobada
Residente de Obra	Julián Peña	1.013.624.438	Aprobada
Profesional sst	Giovanna Ibáñez	2787257	Aprobada

4. CORRESPONDENCIA

Correspondencias enviadas hasta el momento,

RADICADO 29	**Entrega de programación segunda fase**	**11-sep-21**	**Consorcio Construmarca**

5. CONCLUSION

Durante todo el proceso de validaciones se logró identificar 44 viviendas las cuales fueron validadas a satisfacción, donde los técnicos pudieron medir correctamente las áreas intervenidas e identificar cada una de las actividades, saber la cantidad de materiales de las viviendas, la parte sst logro entregar los tapabocas en cada validación por vivienda y pudo llenar todos los formatos requeridos por la entidad y por ultimo los sociales llegaron a conocer la necesidad de cada una de estas viviendas y de sus habitantes, en cada visita se identificó los mayores inconvenientes estructurales con los que cuentan las familias pertenecientes al


mejoramiento de vivienda identificando en cada una de ellas sus fortalezas y debilidades enmarcadas en la pobreza y la falta de apoyo por parte del estado.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


Se relacionaron actividades relevantes realizadas en los bloques en este periodo.


16/09/2021 10:19:18 a. m.
-140° SE
#CONSTRUMARCA
#MVCB_2644
Número de índice: 22


4°32'55"N -74°9'11"W
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 16/09/2021 11:13:13 a. m. COT
Local: 16/09/2021 11:13:10 a. m. COT

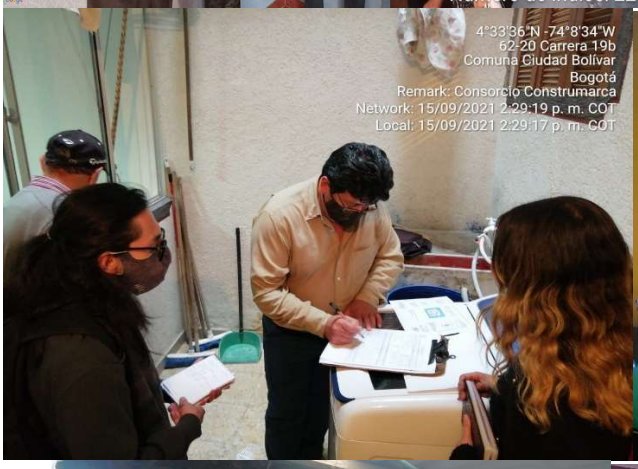
4°33'36"N -74°8'34"W
62-20 Carrera 19b
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 15/09/2021 2:29:19 p. m. COT
Local: 15/09/2021 2:29:17 p. m. COT


15 de septiembre de 2021 1:03 p. m.

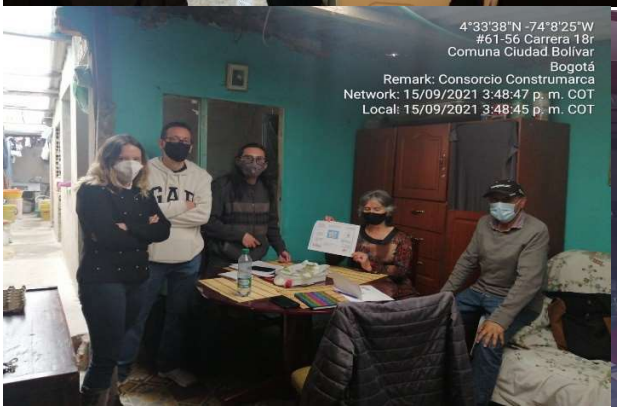
4°33'38"N -74°8'25"W
#61-56 Carrera 18r
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 15/09/2021 3:48:47 p. m. COT
Local: 15/09/2021 3:48:45 p. m. COT

