ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA** SUBPROCESO **CONSULTORÍA** TITULO **INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 2**	CONSTRUMARCA S.A.S. NIT. 830.509.427 - 9

INFORME N°	**10**	**PERIODO:**	**23/10/2021** (de/mm/yyyy)	**AL:**	**29/10/2021** (dd/mm/yyyy)
CONTRATO DE OBRA N°	**795 DE 2021**	**CONTRATISTA:**	**AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S**		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	**798 DE 2021**	**CONTRATISTA:**	**CONSTRUMARCA SAS**		

OBJETO: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.".**

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA:	**20/8/2021** (dd/mm/yyyy)	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA:**	**4/2/2022** (dd/mm/yyyy)
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:	**20/8/2021** (dd/mm/yyyy)	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:**	**7/3/2022** (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

LEGAL:

La interventoría radicó ante la Secretaria Distrital de Habitat el informe semanal No.09 e informe mensual No.2.
La interventoría solicitó al contratista mediante oficio 798-2021G2-056-2021 hacer entrega de certificados de calidad y fichas técnicas de materiales e insumos. El contratista dió respuesta mediante oficio AMB-34-2021, el cual se encuentra en revisión por parte del área técnica.
La interventoría solicitó al contratista mediante oficio 798-2021G2-057-2021 hacer entrega de soportes de pagos con recursos del anticipo para legalización del mismo.

TÉCNICO:

sabado: se realizo las aperturas de los MVCB-_5410, MVCB_1596, MVCB_1727
lunes: se realizo las apertura del MVCB_1762, MVCB 1569 y las validaciones de los mvs MV_04993 y MVCB_1833 (Se realizó revision de los presupuestos de las visitas de validacion presentados por el contratista).
martes:se realizo la validacion de los mvs MVCB_2866 y MVCB_3118 (Se realizó visita de seguimiento a predios aperturados territorio Lomas donde se evidenció que no hay personal de obra ni materiales)
miercoles: se realizó las aperturas de los MVCB_1368 y MVCB_1723. Se realizó revision de los presupuestos de las visitas de validacion presentados por el contratista en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
jueves: se realizó la validacion del MVCB_0091. Se realizó revision de los presupuestos de las visitas de validacion presentados por el contratista en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
viernes: se realizó la apertura del MVCB_1833, validación del MV_42764 IDU, MVCB_2547 y MVCB_2474. (Se realizo visita de seguimiento a predios aperturados territorio Lomas donde se evidencio que no hay personal de obra ni materiales)

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION		APERTURA		CIERRE		DIAS DE ATRASO SEGUN ESTADO	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
			PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL						
1	MV_044	**validada**	14-oct-21	15-oct-21	29-nov-21				1	KR 9D 38 24 SUR	LOMAS	ANA BEATRIZ RINCON RAMOS		Se verificó el predio donde requiere cambio de la cubierta total, sin embargo se observa problemas de ventilacion en la parte posterior del predio, se debe hacer retiro de cielo rasos y mejoramiento del baño de la alcoba principal
2	MV_04993	**validada**	24-sep-21	25-oct-21	12-oct-21				31	CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	ROSALBINA ZABALA MENDOZA		en esta vivienda se va a aintervenir cocina, baño y 2 habitaciones
3	MV_091	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	12-oct-21	14-oct-21	17-nov-21		2	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO	**0%**	En visita de seguimiento realizado por la interventoria no se evidencio materiales y personal de obra del contratista realizando las actividades registradas en el presupuesto como son cambio de cubierta y enchapes de cocina. Se registra un atraso en el inicio de las obras de 17 dias los cuales el contratista debe generar plan de contingencia.
4	MV_113	**Validada**	24-sep-21	27-sep-21	29-nov-21				3	KR 9H 37 27 SUR	LOMAS	LUZ HELENA OSORIO CASTRO		
5	MV_115	**Validada**	24-sep-21	15-oct-21	29-nov-21				21	KR 9H 37 35 SUR	LOMAS	LUIS ANTONIO ROPERO ARDILA		
6	MV_116	**Validada**	14-oct-21	15-oct-21	29-nov-21				1	KR 9H 39 05 SUR	LOMAS	PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN		El propietario realizo el cambio de la cubierta del 3 piso, se verifico el cambio de cubierta en 2 piso, adecuacion de cocina y baño y cielo raso.
7	MV_124	**Validada**	24-sep-21	27-sep-21	29-nov-21				3	KR 9H 39 51 SUR	LOMAS	BLANCA INES FIQUE AREVALO		

8	MV_148	**Apertura**	14-sep-21	14-sep-21	12-oct-21	14-oct-21	17-nov-21		2	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE	**0%**	En visita de seguimiento realizado por la interventoria no se evidencio materiales y personal de obra del contratista realizando las actividades registradas en el presupuesto como son cambio de cubierta. Se registra un atraso en el inicio de las obras de 17 dias los cuales el contratista debe generar plan de contingencia.
9	MV_152	**Apertura**	14-sep-21	17-sep-21	12-oct-21	14-oct-21	17-nov-21		-2	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	**0%**	En visita de seguimiento realizado por la interventoria no se evidencio materiales y personal de obra del contratista realizando las actividades registradas en el presupuesto como son cambio de cubierta. Se registra un atraso en el inicio de las obras de 17 dias los cuales el contratista debe generar plan de contingencia.
10	MV_155	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	29-nov-21				0	CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON		
11	MV_159	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	29-nov-21				0	CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO		
12	MV_162	**validada**	14-sep-21	17-sep-21	29-nov-21				3	CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO		
13	MV_163	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	29-nov-21				0	CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS		
14	MV_164	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	13-oct-21				0	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA		
15	MV_202	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	13-oct-21				0	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ		
16	MV_204	**Apertura**	16-sep-21	16-sep-21	13-oct-21	14-oct-21	18-nov-21		1	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL	**0%**	En visita de seguimiento realizado por la interventoria no se evidencio materiales y personal de obra del contratista realizando las actividades registradas en el presupuesto como son cambio de cubierta y pañetes tercer piso. Se registra un atraso en el inicio de las obras de 17 dias los cuales el contratista debe generar plan de contingencia.
17	MV_209	**Validada**	16-sep-21	17-sep-21	29-nov-21				1	KR 11A 41 28 SUR	LOMAS	CLARA LUCIA TORRES BUITRAGO		
18	MV_213	**validada**	17-sep-21	16-sep-21	29-nov-21				-1	KR 11A 41 16 SUR	LOMAS	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA		
19	MV_228	**validada**	17-sep-21	17-sep-21	29-nov-21				0	KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ		
20	MV_282	**validada**	17-sep-21	17-sep-21	29-nov-21				0	KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO		
21	MV_330	**Apertura**	17-sep-21	17-sep-21	12-oct-21	14-oct-21	17-nov-21		2	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR	**0%**	En visita de seguimiento realizado por la interventoria no se evidencio materiales y personal de obra del contratista realizando las actividades registradas en el presupuesto como son cambio de cubierta. Se registra un atraso en el inicio de las obras de 17 dias los cuales el contratista debe generar plan de contingencia.
22	MV_344	**validada**	17-sep-21	17-sep-21	3-nov-21				0	CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA		
23	MV_361	**Validada**	20-sep-21	27-sep-21	29-nov-21				7	CL 36F SUR 11C 36	LOMAS	ROSA HERMINDA RODRIGUEZ GOMEZ		
24	MV_398	**validada**	20-sep-21	20-sep-21	29-nov-21				0	CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS		
25	MV_415	**RENUNCIA**	20-sep-21							CL 36F SUR 11A 02	LOMAS	DIEGO FERNEY CAMACHO MONTAÑO		RENUNCIA
26	MV_42760-IDU	**validada**	23-sep-21	7-oct-21	30-nov-21				14	CALLE 71 I BIS SUR 27A-05	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Convenio 1481 - IDU	NELSON DARIO GUERRERO CASTEBLANCO		Se realizara la instalacion de piso en el segundo piso del predio, adecuacion de cocina y zona de ropas y pintura general de las habitaciones
27	MV_42764-IDU	**validada**	13-sep-21	29-oct-21					46	CARRERA 27F 71D 34 SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Convenio 1481 - IDU	FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO		se realizara cambio de enchapes en pisos, baño, pintura, preparacion de muros para pinturas, cambio de aparatos sanitarios, arreglos de muros

28	MV_42802-IDU	**validada**	7-oct-21	7-oct-21	30-nov-21				0	CL 71G BIS SUR 27A 33	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Convenio 1481 - IDU	JOSE RICARDO GARZON MENDEZ		se realizara el cambio de la cubierta del predio la cual presenta fallas en su instalacion y funcionamiento.
29	MV_42803-IDU	**validada**	7-oct-21	7-oct-21	30-nov-21				0	CARRERA 27D 71D-58SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Convenio 1481 - IDU	EDWIN ANDRES CASTRO		Se realizara cambio de cubierta en el predio, en razon a que la actual registra mala instalacion y funcionamiento.
30	MV_447	**validada**	20-sep-21	20-sep-21	2-nov-21				0	CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO		
31	MV_462	**validada**	20-sep-21	20-sep-21	2-nov-21				0	CL 36 SUR11C 13	LOMAS	AMPARO OLAYA		
32	MV_483	**validada**	23-sep-21	23-sep-21	2-nov-21				0	CL 36G SUR 11C 63	LOMAS	MARIO DELFIN VELASCO		demolicion de enchape piso, alistados pisos,pañetes pinturas
33	MV_500	**validada**	23-sep-21	23-sep-21	2-nov-21				0	CL 36H SUR 11C 95	LOMAS	ELSA REYES BAQUERO		demolicion de enchape piso, alistados pisos,pañetes pinturas
34	MV_506	**validada**	23-sep-21	23-sep-21	2-nov-21				0	CL 36H SUR 11C 82	LOMAS	MARIA MARGARITA CRUZ		cambio cubierta
35	MV_507	**validada**	23-sep-21	23-sep-21	12-oct-21				0	CI 36H SUR 11C 81	LOMAS	EDELMIRA RAMIREZ DE ORJUELA		demolicion de enchape piso, alistados pisos,pañetes pinturas
36	MV_512	**validada**	23-sep-21	23-sep-21	2-nov-21				0	CL 36H SUR 11C 69	LOMAS	MARIA GLADYS BRICEÑO MARTINEZ		demolicion de enchape piso, alistados pisos,pañetes pinturas
37	MV_515	**validada**	21-sep-21	21-sep-21	2-nov-21				0	CL 36H SUR 11C 63	LOMAS	LEONOR RINCON CORREDOR		
38	MV_520	**RENUNCIA**	21-sep-21							CL 36H SUR 11C 51	LOMAS	NUBIA RAMIREZ RUEDA		RENUNCIA
39	MV_530	**validada**	21-sep-21	21-sep-21	3-nov-21				0	CL 36H SUR 11C 28	LOMAS	MARIA SORAIDA PARRA LEGUIZAMON		
40	MV_532	**validada**	21-sep-21	21-sep-21	3-nov-21				0	CI 36H SUR 11C 23	LOMAS	GUSTAVO CUESTA AMAYA		
41	MV_543	**validada**	21-sep-21	21-sep-21	3-nov-21				0	CL 36H SUR 11A 58	LOMAS	VICTOR MANUEL CARDENAS RINCON		
42	MV_546	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	3-nov-21				0	CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA		
43	MV_627	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	3-nov-21				0	CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO		
44	MV_748	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	3-nov-21				0	CI 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES		
45	MV_765	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	13-oct-21	14-oct-21	18-nov-21		1	CI 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO	**0%**	En visita de seguimiento realizado por la interventoria no se evidencio materiales y personal de obra del contratista realizando las actividades registradas en el presupuesto como son cambio de cubierta. Se registra un atraso en el inicio de las obras de 17 dias los cuales el contratista debe generar plan de contingencia.
46	MV_788	**validada**	13-sep-21	16-sep-21	3-nov-21				3	KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO		
47	MVBL_1875	**RENUNCIA**	14-sep-21							CL 66 SUR 89A 77	BOSA LA LIBERTAD	MARIA LUZ BONILLA		RENUNCIA
48	MVCB_1115	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	5-nov-21				0	DG 69D SUR 18J 51	TRANSICION HABITARTE 2019	ZORAIDA VERA		Se realizara el cambio de cubierta del 3 piso con actividades adicionales de desmonte de cubierta y estructura existente, retiro de cieloraso en liston de madera, retiro de canal en lamina y actidades complementarias pinura de habitaciones
49	MVCB_1116	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	5-nov-21				0	DG 69D SUR 18J 47	TRANSICION HABITARTE 2019	JESUS ELIAS AYALA GUZMAN		Se realizara mejoramiento de las areas de cocina, baño instalando enchape de piso y pared, instalacion de aparatos sanitarios, mejoramiento del piso del predio y pañete y pintura en la parte superio de los muros del predio.
50	MVCB_1118	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	29-nov-21				0	DG 69D SUR 18J 39	TRANSICION HABITARTE 2019	JOHN RAMIREZ MALDONADO		Se realiza emjoramiento de las areas de cocina y baño en primer piso y habitaciones del segun piso del predio con actividades de instalacion de tableta y pintura en muros.
51	MVCB_1119	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	29-nov-21				0	DG 69D SUR 18J 35	TRANSICION HABITARTE 2019	NOEMI MALDONADO DE RAMIREZ		Se realizara mejoramiento en las habitaciones del segundo nivel del predio con estuco y pintura de cuartos, cambio de cubierta del predio, cambio del cielo raso de las habitaciones.
52	MVCB_1152	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	5-nov-21				0	DG 69D BIS SUR 18J 39	TRANSICION HABITARTE 2019	FLORALBA AVILA		Se verifico el predio evidadencia que el mejoramiento solicitado corresponde al tercer piso del predio, el cual esta conformado por una zona de lavado y habitaciones, se realizara instalacion de cielo raso en alcobas, enchape de piso y pared en zona de ropas y pañete de muros laterales, mejoramiento de pisos en habitacion primer piso

53	MVCB_1163	**validada**	6-oct-21	9-oct-21	29-nov-21				3	KR 18J 69F 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORA IDALI GALINDO TRIVIÑO		Se realizara mejoramiento de las areas de baño, cocina con cambio e instalacion de enchape, aparatos sanitarios y meson de cocina, pintura general. se Observa grietas en los muros de la cocina y sala las cuales fueron notificadas al propietario
54	MVCB_1216	**validada**	7-oct-21	8-oct-21	29-nov-21				1	DG 69G SUR 18J 27	TRANSICION HABITARTE 2019	YORMARY GALINDO ORDOÑEZ		Se verifico el predio y se evidencio problemasen la cubierta actaul, sin embargo se informo a la propietaria que se reaslizara el mejoramiento en las areas de cocina, baño y alcobas.
55	MVCB_1248		20-sep-21		11-dic-21				0	CL 70N SUR 18L 84	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA OLIVA BUSTOS		
56	MVCB_1257	**Apertura**	20-sep-21	22-sep-21	19-oct-21	21-oct-21	18-nov-21		2	CL 70M SUR 18L 71	TRANSICION HABITARTE 2019	QUERUBIN OSPINA	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
57	MVCB_1268	**validada**	21-sep-21	22-sep-21	29-nov-21				1	CL 70M SUR 18L 50	TRANSICION HABITARTE 2019	MONICA CRISTINA PEREZ BARRIGA		alistado pisos, enchapes piso, demolicion de enchape muros en cocina, pintura
58	MVCB_1269	**validada**	21-sep-21	22-sep-21	29-nov-21				1	CL 70M SUR 18L 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DORIS SEGURA		alistado pisos, enchapes piso, demolicion de enchape muros en cocina, pintura
59	MVCB_1270	**validada**	21-sep-21	22-sep-21	29-nov-21				1	CL 70M SUR 18L 58	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIA CUCUNUBA DE CRUZ		demolicion de enchape en pisos, alistado pisos, enchape pisos, muros en baño y cocina, pintura
60	MVCB_1271	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	31-ene-22				0	CL 70 M SUR 18 L 62	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
61	MVCB_1324	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	3-ene-22				0	CL 70K SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
62	MVCB_1340	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	3-ene-22				0	CL 70K SUR 18L 16	TRANSICION HABITARTE 2019	YOLANDA VARGAS ESPAÑA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
63	MVCB_1353	**validada**	20-sep-21	21-sep-21	5-nov-21				1	CL 70K SUR 18L 68	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ PATIÑO ARDILA		
64	MVCB_1355	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	5-ene-22				0	CLL 70K # 18L-76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ODILIA PRADA DIAZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
65	MVCB_1368	**Apertura**	24-sep-21	21-sep-21	3-nov-21	27-oct-21			-7	CL 70J SUR 18L 35	TRANSICION HABITARTE 2019	OTILIA PICO BARRERA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
66	MVCB_1370	**Apertura**	21-sep-21	21-sep-21	24-nov-21	21-oct-21	24-dic-21		-34	CL 70J SUR 18L 27	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO MURILLO RODRIGUEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
67	MVCB_1392	**validada**	25-sep-21	21-sep-21	3-nov-21				-4	CL 70J SUR 18L 70	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ GILMA CUCUNUBA BARRERA		alistado piso, enchape piso, pañete , pinturas
68	MVCB_1401	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	3-ene-22				0	CL 70I SUR 18L 69	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
69	MVCB_1422	**validada**	21-sep-21	22-sep-21	19-oct-21				1	CL 70I SUR 18L 60	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CRUZ RAMIREZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
70	MVCB_1430	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	20-nov-21	22-oct-21	20-dic-21		-29	CL 70H SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
71	MVCB_1434	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	4-ene-22				0	CL 70H SUR 18L 21	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
72	MVCB_1444	**validada**	7-oct-21	9-oct-21	15-oct-21				2	CL 70H SUR 18L 40	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA LIGIA SUAREZ GOMEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
73	MVCB_1445	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	30-nov-21				0	CL 70H SUR 18L 46	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALONSO MORA MEJIA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
74	MVCB_1446	**validada**	20-sep-21	7-oct-21	30-nov-21				17	CL 70H SUR 18L 52	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARY MAYORGA MACANA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
75	MVCB_1447	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	5-nov-21				0	TV 18M 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	VITALIA CARDENAS DUCUARA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
76	MVCB_1466	**validada**	18-sep-21	14-sep-21	28-dic-21				-4	CL 70 H SUR 18J 64	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
77	MVCB_1475	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	2-dic-21				0	CL 70G SUR 18K 33	TRANSICION HABITARTE 2019	MIGUEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde

78	MVCB_1497	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	30-nov-21				0	CL 70H SUR 18J 81	TRANSICION HABITARTE 2019	PABLO VALBUENA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
79	MVCB_1536	**Apertura**	21-sep-21	22-sep-21	20-oct-21	21-oct-21	19-nov-21		1	KR 18M 70M 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE LOS ANGELES SALCEDO PRECIADO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
80	MVCB_1551	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	30-nov-21				0	KR 18N 70I 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LORENA AVILA SUAREZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
81	MVCB_1552	**validada**	25-sep-21	20-sep-21	3-nov-21				-5	KR 18N 70I 14 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA		preparacion de pisos, enchape pisos, pinturas
82	MVCB_1554	**Apertura**	10-sep-21	10-sep-21	14-oct-21	21-oct-21	13-nov-21		7	CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
83	MVCB_1557	**validada**	25-sep-21	21-sep-21	3-nov-21				-4	KR 18M 70I 11 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE JOAQUIN PACHECO QUIROGA		pañetes en general, enchapes en pisos general, enchapes de muros en cocina y baño, combo sanitario, pañetes y pinturas
84	MVCB_1569	**Apertura**	15-sep-21	16-sep-21	20-oct-21	25-oct-21			5	KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
85	MVCB_1596	**Apertura**	15-sep-21	16-sep-21	20-oct-21	23-oct-21	19-nov-21		3	CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH ORJUELA DE TAPIERO	**0%**	pañetes en general, enchapes en pisos general, enchapes de muros en cocina y baño, combo sanitario, pañetes y pinturas
86	MVCB_1602	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	30-nov-21				1	CL 70G SUR 18N 28	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
87	MVCB_1605	**validada**	22-sep-21	21-oct-21	29-nov-21				0	CL 70G SUR 18N 44 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA ACOSTA USECHE		pañetes en general, enchapes en pisos general, enchapes de muros en cocina y baño, combo sanitario, pañetes y pinturas
88	MVCB_1612	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	4-nov-21				0	CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
89	MVCB_1627	**Apertura**	27-sep-21	15-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	KR 19 70H 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIZABETH ROJAS CARDENAS	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
90	MVCB_1629	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	14-oct-21	21-oct-21	13-nov-21		7	KR 19 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY AREVALO TALERO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
91	MVCB_1676	**validada**	27-sep-21	20-sep-21	1-dic-21				-7	CL 70I SUR 18N 08	TRANSICION HABITARTE 2019	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
92	MVCB_1723	**Apertura**	15-sep-21	16-sep-21		27-oct-21			0	CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CECILIA BARATO BETANCOURT	**0%**	demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
93	MVCB_1727	**Apertura**	27-sep-21	20-sep-21	20-oct-21	23-oct-21	19-nov-21		3	KR 18Q 70J 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO	**0%**	alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
94	MVCB_1736	**RENUNCIA**	16-sep-21							KR 18P 70J 03 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SIXTO ALFONSO LAITON COY		RENUNCIA
95	MVCB_1741	**validada**	27-sep-21	21-sep-21	4-nov-21				-6	CL 70J SUR 18N 26	TRANSICION HABITARTE 2019	ORLANDO VELASCO ARDILA		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
96	MVCB_1743	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	4-nov-21				1	CL 70J SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ERNESTO TENORIO SANCHEZ		cambio de cubierta, pañetes, pinturas, alistado en pisos, enchape pisos
97	MVCB_1744	**validada**	27-sep-21	20-sep-21	4-nov-21				-7	CL 70J SUR 18N 48	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
98	MVCB_1753	**Apertura**	27-sep-21	20-sep-21	20-oct-21	22-oct-21	19-nov-21		2	CL 70I SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
99	MVCB_1762	**Apertura**	10-sep-21	10-sep-21	14-oct-21	25-oct-21	24-nov-21		11	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA	**0%**	en esta vivienda se realizaran actividades en cubierta remplazandola junto con la estructura
100	MVCB_1769	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	30-nov-21				0	CL 70J SUR 18N 53	TRANSICION HABITARTE 2019	GERARDO VEGA VICTORIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
101	MVCB_1782	**validada**	6-oct-21	6-oct-21	1-dic-21				0	CL 70K SUR 18Q 14 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	GLICERIO RODRIGUEZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
102	MVCB_1790	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	1-dic-21				1	KR 18Q 70J 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JULIA BERNAL BELLO		alistado pisos, enchape pisos, meson cocina, enchape muros en baño y cocina

103	MVCB_1792	**validada**	21-sep-21	14-sep-21	29-nov-21				-7	KR 18R 70K 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELDA INES CANDELA ZABALA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
104	MVCB_1823	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	2-nov-21				0	CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
105	MVCB_1833	**Apertura**	27-sep-21	25-oct-21	2-nov-21	29-oct-21			28	CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO		en esta vivienda se realizara el cambio de cubierta con estructura nueva
106	MVCB_1834	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	2-nov-21				0	CL 70K SUR 18N 09	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
107	MVCB_1845	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	28-dic-21				0	KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
108	MVCB_1868	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	27-dic-21				0	KR 18P 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
109	MVCB_1879	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	27-dic-21				0	KR 18 P 70 K 36	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA MEDINA NIÑO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
110	MVCB_1888	**Apertura**	22-sep-21	15-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	KR 18N 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDITH GARCIA SOZA	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
111	MVCB_1911	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	27-dic-21				0	CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
112	MVCB_2112	**validada**	21-sep-21	7-oct-21	29-nov-21				16	KR 18W 69B 06 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR MIREYA NIVIA CHAVEZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
113	MVCB_2122	**validada**	24-sep-21	21-oct-21	2-nov-21				0	KR 18W 68C 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO JEREZ BLANCO		Se proyecta realizar alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso, muros baño y cocina, combo sanitario.
114	MVCB_2149	**validada**	22-sep-21	17-sep-21	30-nov-21				-5	KR 18V 68C 47 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO		
115	MVCB_2151	**validada**	24-sep-21	20-sep-21	2-nov-21				-4	KR 18V 68C 51 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA STELLA ALARCON MORALES		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
116	MVCB_2160	**RENUNCIA**	20-sep-21		27-dic-21				0	KR 18V 68C 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EDILBERTO RIVERA SANCHEZ		RENUNCIA
117	MVCB_2162	**validada**	7-oct-21	7-oct-21	4-nov-21				0	KR 18V 68C 91 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	OLGA CECILIA RUIZ		Se realiza mejoramiento en las habitaciones del predio con cambio de cubierta, estuco y pintura de paredes e instalacion de pisos, sin embargo se evidencio la cocina y baño del predio no reune las condiciones minimas de calidad y ante la falta de muros de cerramiento de estos espacios no se podran intervenir
118	MVCB_2176	**Apertura**	15-sep-21	16-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	CL 69B BIS A SUR 18R 39	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
119	MVCB_2192	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	2-nov-21				1	KR 18R BIS 69B 29 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
120	MVCB_2212	**validada**	18-sep-21	20-sep-21	28-dic-21				2	CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
121	MVCB_2387	**validada**	18-sep-21	16-sep-21	28-dic-21				-2	KR 18K BIS 69T 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
122	MVCB_2431	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	2-nov-21				0	KR 18M BIS 69A 76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
123	MVCB_2465	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	5-nov-21				1	DG 69A BIS C SUR 18L 85	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY LIZCANO CORNELIO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
124	MVCB_2471	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	5-nov-21				0	DG 69A BIS C SUR 18L 51	TRANSICION HABITARTE 2019	AMPARO OSPINA ORTIZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
125	MVCB_2474	**validada**	22-sep-21	29-oct-21	2-nov-21				37	KR 18L BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CONSUELO RAMIREZ		Se realizara adecuaciones de pintura y pañete en las alcobas, pañetes y pinturas y enchapes en la zona de ropas y parcialmente en la cocina
126	MVCB_2547	**validada**	27-sep-21	29-oct-21	4-nov-21				32	KR 18K 70B 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MERCEDES HUERTAS		Se realizara adecuaciones de pintura y pañete en las alcobas, pañetes y pinturas y enchapes en la zona de ropas y parcialmente en la cocina
127	MVCB_2554	**validada**	8-oct-21	8-oct-21	2-dic-21				0	CL 70B SUR 18J 27	TRANSICION HABITARTE 2019	MARY NATALY BECERRA GOMEZ		Se realizara adecuaciones de pintura y pañete en las alcobas, pañetes y pinturas y enchapes en la zona de ropas y parcialmente en la cocina

128	MVCB_2556	**validada**	8-oct-21	8-oct-21	2-dic-21				0	CL 70B SUR 18J 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDILIA CHACON MORA		Se realizara mejoramiento en las areas de habitaciones y cocina con pañete,estuco y pintura de muros, cielo razo en alcobas, ademas de meson de cocina
129	MVCB_2597	**validada**	8-oct-21	8-oct-21	2-nov-21				0	KR 18L BIS B 69A 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE JESUS SAMACA DE PIRAGAUTA		Se realizara mejoramiento en las areas de habitaciones y cocina con pañete,estuco y pintura de muros, cielo razo en alcobas, ademas de meson de cocina
130	MVCB_2599	**Apertura**	14-sep-21	14-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
131	MVCB_2644	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	30-nov-21				0	CL 70C SUR 18I 99	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA AMPARO TORRES ARIAS		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
132	MVCB_2645	**validada**	8-oct-21	8-oct-21	4-nov-21				0	CL 70C SUR 18I 95	TRANSICION HABITARTE 2019	NORA TERESA PENAGOS CAYCEDO		Se realizara mejoramiento en las areas de habitaciones y cocina con pañete,estuco y pintura de muros, instalacion de piso en alcobas.
133	MVCB_2649	**validada**	8-oct-21	9-oct-21	4-nov-21				1	CL 70C SUR 18I 79	TRANSICION HABITARTE 2019	MARCO AURELIO BERNAL RIVERA		En visita realizada se evidencio que la vivienda registra un asentamiento bastante considerable ubicado hacia la parte posterior del predio, lo cual imposibilita cual actividad que se ejecute, dado que los muros registra grietas, desniveles fuertes en el piso y cualquier adecuacion que se realice genera posventa.
134	MVCB_2663	**validada**	8-oct-21	9-oct-21	5-nov-21				1	CL 70D SUR 18I 91	TRANSICION HABITARTE 2019	FREDY ALEXANDER ORDOÑEZ GALINDO		Se realizara adecuaciones en el baño de la vivienda, patio de ropas, y alcobas con la instalacion de enchape de piso. ademas pañete y pintura en alcobas.
135	MVCB_2705	**validada**	18-sep-21	17-sep-21	28-dic-21				-1	TV 18Q 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GUILLERMO MORALES SALINAS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
136	MVCB_2769	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	5-nov-21				0	KR 18L BIS B 69A 41 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
137	MVCB_2772	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	5-nov-21				0	DG 69A BIS C SUR 18L 78	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA SANCHEZ ARDILA		
138	MVCB_2803	**validada**	18-sep-21	21-oct-21	28-dic-21				41	CL 69 C SUR 18 U 63	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ALEXANDER DIAZ FETIVA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones, elaboracion meson en concreto en la cocina e instalacion de combo sanitario.
139	MVCB_2838	**validada**	19-sep-21	15-sep-21	1-dic-21				-4	DG 69C BIS SUR 18M 84	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
140	MVCB_2866	**validada**	24-sep-21	26-oct-21	mié 3/11/21				32	DG 69C SUR 18N 59	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO OLAYA CIFUENTES		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran
141	MVCB_2876	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	2-nov-21				0	DG 69C SUR 18N 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDUARDO AREVALO SOSA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde.
142	MVCB_2912	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	14-oct-21				0	DG 69A BIS B SUR 18M 10	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
143	MVCB_2931	**RENUNCIA**	24-sep-21		mar 2/11/21				0	TV 18N 69A 91 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA INES VILLAMIL CAÑON		RENUNCIA
144	MVCB_2937	**Apertura**	24-sep-21	15-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	TV 18N BIS 69A 92 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA ARIZA MORENO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
145	MVCB_2942	**validada**	20-sep-21	22-oct-21	lun 27/12/21				0	TV 18 N BIS 69 A 72 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CRISTINA GARCIA DE ARDILA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
146	MVCB_2963	**validada**	24-sep-21	15-sep-21	3-nov-21				-9	DG 69A BIS D SUR 18M 18	TRANSICION HABITARTE 2019	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
147	MVCB_2964	**validada**	22-sep-21	22-oct-21	mar 30/11/21				0	DG 69A BIS D SUR 18M 24	TRANSICION HABITARTE 2019	AURA CECILIA ANTOLINEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como pañete, enchape de piso y paredes instalacion de aparatos sanitarios.
148	MVCB_2965	**validada**	24-sep-21	22-oct-21	mié 3/11/21				0	DG 69A BIS D SUR 18M 28	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA GLADYS LAVERDE		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como pañete, enchape de piso y paredes instalacion de aparatos sanitarios.
149	MVCB_2966	**validada**	24-sep-21	15-sep-21	3-nov-21				-9	DG 69A BIS D SUR 18M 32	TRANSICION HABITARTE 2019	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
150	MVCB_2968	**validada**	24-sep-21	15-sep-21	3-nov-21				-9	DG 69A BIS D SUR 18M 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBERTO ANTONIO ISAZA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
151	MVCB_2971	**RENUNCIA**	24-sep-21		jue 4/11/21				0	TV 18M BIS B 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ PATRICIA MORALES		RENUNCIA
152	MVCB_2972	**validada**	22-sep-21	7-oct-21	3-nov-21				15	TV 18M BIS B 69A 57 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ DARY ROBAYO RAMIREZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
153	MVCB_2973	**validada**	24-sep-21	15-sep-21	4-nov-21				-9	TV 18M BIS B 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde

154	MVCB_2975	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	30-nov-21				0	TV 18M BIS B 69A 69 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PEDRO DE ALCANTARA REYES		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
155	MVCB_2976	**validada**	22-sep-21	15-sep-21	29-nov-21				-7	TV 18M BIS B 69A 73 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCENETH OLAYA TABORDA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
156	MVCB_2977	**validada**	15-sep-21	16-sep-21	1-dic-21				1	TV 18M BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
157	MVCB_2986	**validada**	27-sep-21	15-sep-21	1-dic-21				-12	TV 18N 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORIS GUARIN		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
158	MVCB_3002	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	5-nov-21				0	DG 69A BIS B SUR 18M 03	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
159	MVCB_3006	**validada**	27-sep-21	15-sep-21	1-dic-21				-12	KR 18M BIS B 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EMILIO VARGAS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
160	MVCB_3008	**validada**	24-sep-21	20-sep-21	3-nov-21				-4	KR 18M BIS B 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
161	MVCB_3012	**validada**	22-sep-21	7-oct-21	3-nov-21				15	KR 18M BIS A 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ OSORIO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y se pondran pisos en habitaciones
162	MVCB_3013	**validada**	24-sep-21	15-sep-21	2-nov-21				-9	KR 18M BIS A 69A 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y se pondran pisos en habitaciones
163	MVCB_3019	**validada**	8-oct-21	7-oct-21	2-nov-21				-1	KR 18M BIS A 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA SULINDA VILLAMIL CANOM		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
164	MVCB_3025	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	29-nov-21				0	KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
165	MVCB_3032	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	2-nov-21				0	KR 18M BIS 69A 89 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLENY JARAMILLO ROMERO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
166	MVCB_3088	**Apertura**	17-sep-21	17-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	TV 18 W 69 C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
167	MVCB_3117	**validada**	17-sep-21	21-oct-21	4-nov-21				0	CL 69B BIS SUR 18U 14	TRANSICION HABITARTE 2019	MARÍA INÉS CÁRDENAS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones con actividades tales como enchape de piso y pared, instalacion de aparatos sanitario elaboracion de meson en concreto cocina.
168	MVCB_3118	**validada**	17-sep-21	26-oct-21	2-nov-21				39	CL 69B BIS SUR 18U 18	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MYRIAM GÓMEZ ARDILA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran
169	MVCB_3162	**validada**	22-sep-21	22-oct-21	30-nov-21				0	KR 18R 69 09 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLARAIBEL MORENO FERRUCHO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones con actividades tales como pañete y pintura muros, enchape de piso y pared, instalacion de aparatos sanitario elaboracion de meson en concreto cocina.
170	MVCB_3171	**validada**	16-sep-21	16-sep-21	3-nov-21				0	KR 18R 69 75 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCICIO ALFONSO FORERO		
171	MVCB_3266	**Apertura**	21-sep-21	7-oct-21	30-nov-21	22-oct-21	30-dic-21		-39	KR 18U BIS A 68C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCIA SANCHEZ POBLADOR	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
172	MVCB_3462	**validada**	7-oct-21	7-oct-21	1-dic-21				0	TV 18P BIS 69A 88 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MIGUEL GUZMAN		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
173	MVCB_3479	**validada**	21-sep-21	7-oct-21	29-nov-21				16	TV 18P BIS 69A 36 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SARA ELISA PRIETO CASTILLO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
174	MVCB_3505	**validada**	8-oct-21	7-oct-21	1-dic-21				-1	TV 18P 69A 25 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CHARLIE EDGARDO GARCIA CABALLERO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
175	MVCB_3545	**validada**	21-sep-21	17-sep-21	30-nov-21				-4	TV 18P 69A 46 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTHA VICTORIA MENDEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
176	MVCB_3576	**validada**	22-sep-21	22-oct-21	1-dic-21				0	TV 18N BIS A 69A 39 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA FLOR RAMIREZ ESTRADA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones incluyendo instalacion de cielo raso
177	MVCB_3580	**validada**	23-sep-21	15-sep-21	3-nov-21				-8	TV 18N BIS A 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara

178	MVCB_3582	**validada**	23-sep-21	22-oct-21	4-nov-21				29	TV 18N BIS A 69A 57 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	AMIRA YANETH VEGA BUITRAGO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones realizando actividades de pañete muros, enchape de piso y paredes instalcion de aparatos y elaboracion de meson en concreto en la cocina.
179	MVCB_3583	**validada**	20-sep-21	17-sep-21	1-dic-21				-3	TV 18N BIS A 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH LUCILA TOVAR		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
180	MVCB_3590		16-sep-21		1-dic-21				0	TV 18N BIS A 69A 87 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE HERNANDO RUIZ FLOREZ		
181	MVCB_3606	**validada**	25-sep-21	15-sep-21	29-nov-21				-10	TV 18N BIS A 69A 62 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA ZULETA OROZCO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
182	MVCB_3617	**validada**	20-sep-21	15-sep-21	1-dic-21				-5	TV 18N BIS A 69A 26 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EVELIA MORALES GARCIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
183	MVCB_3639	**RENUNCIA**	16-sep-21							TV 18N BIS 69A 67 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SALOMON TRIANA SALGUERO		RENUNCIA
184	MVCB_5064	**validada**	18-sep-21	7-oct-21	2-dic-21				19	TV 18P BIS 69K 08 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA JIMENEZ FONSECA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
185	MVCB_5071	**validada**	18-sep-21	7-oct-21	2-dic-21				19	TV 18P BIS A 69K 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA VELASCO OVALLE		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
186	MVCB_5079	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	5-nov-21				0	TV 18R 69K 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ		se realizará demolicion de meson cocina, enchape en cocina, pintura en general, alistado pisos , combo sanitario
187	MVCB_5086	**Apertura**	18-sep-21	7-oct-21	2-dic-21	21-oct-21	1-ene-22		-42	DG 69L BIS SUR 18P 64 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	GERMAN CASTRO HERNANDEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
188	MVCB_5091	**validada**	16-sep-21	7-oct-21	2-dic-21				21	CL 69L BIS SUR 18N 42 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO GOMEZ JIMENEZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
189	MVCB_5100		17-sep-21		2-dic-21				0	CL 69N SUR 18P 20 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MELANIA MANCILLA HERNANDEZ		
190	MVCB_5101	**validada**	17-sep-21	7-oct-21	2-dic-21				20	CL 69N SUR 18P 24 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JULIA GALINDO RANGEL		demolicion de meson de cocina, preparacion de pisos para enchape. alistados, preparacion de muros para aplicacion de pinturas, enchapes pisos, muros en cocina y baño, combo sanitario
191	MVCB_5103	**validada**	17-sep-21	7-oct-21	2-dic-21				20	DG 69L BIS SUR 18P 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LAUREANO RODRIGUEZ VASQUEZ		demolicion de meson de cocina, preparacion de pisos para enchape. alistados, preparacion de muros para aplicacion de pinturas, enchapes pisos, muros en cocina y baño, combo sanitario
192	MVCB_5106	**Apertura**	22-sep-21	7-oct-21	4-nov-21	21-oct-21	4-dic-21		-14	TV 18P BIS 69L 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA MILENA RUIZ VILLAMIL	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
193	MVCB_5115	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	1-dic-21				0	CL 69N SUR 18P 19	TRANSICION HABITARTE 2019	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
194	MVCB_5116	**Apertura**	15-sep-21	16-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA GALINDO RANGEL	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
195	MVCB_5117	**validada**	22-sep-21	7-oct-21	4-nov-21				15	TV 18P BIS 69N 09 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY PAOLA RAMIREZ ROMERO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
196	MVCB_5119	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	1-dic-21				0	CL 69P BIS C SUR 18P 52	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ANTONIO VEGA		Se realizará alistado de pisos, enchapes en pisos en general, enchapes en muros de baño y cocina, pañetes y pintura
197	MVCB_5126	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	27-dic-21				0	CL 69N SUR 18N 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	HERNANDO GONZALEZ LOZANO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
198	MVCB_5140	**validada**	16-sep-21	7-oct-21	2-dic-21				21	CL 69L BIS SUR 18N 59 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	DIANA MATILDE GOMEZJIMENEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
199	MVCB_5145	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	19-oct-21				0	CL 69P SUR 18N 42	TRANSICION HABITARTE 2019	WILSON CORTES CONTRERAS		Demolicion de pañetes en general, pisos meson cocina, baño, alistados pisos , pañetes nuevos, pinturas, alistados enchapes combo sanitario
200	MVCB_5150	**validada**	18-sep-21	22-sep-21	27-dic-21				4	CLL 69 P SUR - 18 P 20	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA NELLY MARTINEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
201	MVCB_5160	**Apertura**	11-oct-21	11-oct-21	2-dic-21	21-oct-21	1-ene-22		-42	CL 69N SUR 18N 29 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EFRAIN ROMERO RODRIGUEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo

202	MVCB_5163	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	5-nov-21				0	CL 69P SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO ALEJANDRO AVELLANEDA AVELLANEDA		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
203	MVCB_5165	**validada**	14-sep-21	14-sep-21	27-dic-21				0	TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON		se relizará cambio de enchape pisos, pinturas, enchapes de muros, alistado pisos enchapes pisos, muros, combo sanitario
204	MVCB_5167	**Apertura**	11-oct-21	11-oct-21	27-dic-21	21-oct-21	26-ene-22		-67	CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS HERNANDO SOSA ACEVEDO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
205	MVCB_5168	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	27-dic-21				0	CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	ISABEL PERALTA RUIZ		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
206	MVCB_5179	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	2-nov-21				0	CL 69P BIS A SUR 18N 16	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MAGDALENA LONDOÑO DE POSADA		Pañetes muros, pinturas, cambio y enchape en meson de cocina
207	MVCB_5182	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	2-dic-21				0	TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ISABEL MORENO FONSECA		Pañetes muros, pinturas, cambio y enchape en meson de cocina
208	MVCB_5202	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	2-nov-21				0	DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA		Pañetes muros, pinturas, cambio y enchape en meson de cocina, enchape pisos y muros en cocina, combo sanitario
209	MVCB_5204	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	30-nov-21				0	DG 69Q BIS SUR 18N 60	TRANSICION HABITARTE 2019	MERCEDES ALBINO RODRIGUEZ		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
210	MVCB_5209	**RENUNCIA**	24-sep-21		1-dic-21					DG 69Q SUR 18N 73	HABITARTE 2019-MV	MARCELINDA MURCIA		RENUNCIA
211	MVCB_5210	**Apertura**	11-oct-21	11-oct-21	1-dic-21	22-oct-21	31-dic-21		-40	DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	NANCY DUARTE CALDERON	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
212	MVCB_5217	**validada**	24-sep-21	22-oct-21	2-nov-21				28	CL 69Q SUR 18P 12	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA TRIANA DE SOSA		En la vivienda se van a realizar actividades de alistado de pisos, enchape en baños cocina y piso en las habitaciones adicionalmente se pintara
213	MVCB_5223	**Apertura**	17-sep-21	22-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	CL 69 P BIS C SUR 18P-49	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE GUSTAVO GRAJALES	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
214	MVCB_5249	**validada**	8-sep-21	8-sep-21	27-dic-21				0	DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA PRIETO CASTRO		reubicacion de cocina, pinturas , enchapes pisos y muros
215	MVCB_5250	**RENUNCIA**	23-sep-21		2-nov-21	6-dic-21	2-dic-21			TV 18P 69Q 18 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	YHON ALEXANDER PEREZ PULIDO		RENUNCIA
216	MVCB_5254	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	2-nov-21				0	DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO		
217	MVCB_5267	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	1-dic-21				0	TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARBILUZ JAVELA PALOMINO		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
218	MVCB_5270	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	5-nov-21				0	DG 69Q SUR 18N 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEJANDRINA RODRIGUEZ PALACIO		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
219	MVCB_5279	**Apertura**	9-sep-21	9-sep-21	19-oct-21	21-oct-21	18-nov-21		2	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
220	MVCB_5281	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	3-nov-21				0	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSALBA CHAVARRO PARRA		alistados pisos, enchapes pisos en general y muros en cocina y baño , pintura
221	MVCB_5290	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	2-dic-21				0	DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MANUEL CASTRO		demolicion de meson en cocina, ambio de enchapes en pisos en general, enchapes de muros en baño y cocina, pintura
222	MVCB_5316	**Apertura**	8-sep-21	8-sep-21	19-oct-21	21-oct-21	18-nov-21		2	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
223	MVCB_5322	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	2-dic-21	28-oct-21			0	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS		arreglo de pisos, alistados, enchapes pisos, pinturas, enchape meson cocina, pañetes y enchapes muros
224	MVCB_5325	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	5-nov-21				0	DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA TULIA RUIZ		se realizará , reubicacion de baño, pañetes, cubierta en cocina, enchapes
225	MVCB_5329	**Apertura**	22-sep-21	12-oct-21	4-nov-21	21-oct-21	4-dic-21		-14	TV 18N BIS 69R 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	HERCILIA SOTELO VEGA	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
226	MVCB_5338	**Apertura**	11-oct-21	11-oct-21	4-nov-21	22-oct-21	4-dic-21		0	TV 18N BIS 69R 50 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SAULINA DEL TRANSITO AREVALO BUITRAGO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
227	MVCB_5339	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	4-nov-21				0	TV 18N BIS 69R 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ANUNCIACION JIMENEZ DE AGREDO		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
228	MVCB_5342	**Apertura**	11-oct-21	11-oct-21	5-nov-21	21-oct-21	5-dic-21		-15	TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ASCENCION MELO FERRUCHO	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
229	MVCB_5345	**validada**	8-sep-21	8-sep-21	2-dic-21				0	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES		Se realizará demolcion de enchapes piso en baño, pañetes, enchapes pisos y cocina, meson de cocina
230	MVCB_5347	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	2-dic-21				0	TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISMAEL CRUZ FIERRO		arreglo en muros para aplicación de pinturas, enchapes en pisos, demolicion y meson en cocina, enhape en muros de baño y coina
231	MVCB_5392	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	2-dic-21				0	CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA		enchape pisos en general, pinturas muros, cielo raso

232	MVCB_5398	**Apertura**	9-sep-21	9-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
233	MVCB_5399	**validada**	23-sep-21	10-sep-21	4-nov-21				-13	CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	RODRIGO DELGADO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
234	MVCB_5406	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	30-nov-21				0	CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ		alistados pisos, pañetes en general , demolcion enchape de meson cocina, enchapes pisos, pinturas en general, cambio de combo sanitario, enchapes muros
235	MVCB_5407	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	4-nov-21				0	CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
236	MVCB_5410	**Apertura**	10-sep-21	10-sep-21	1-dic-21	23-oct-21	31-dic-21		0	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	**0%**	enchape piso, cielo raso , pañete y pintura en muros
237	MVCB_5411	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	4-nov-21				0	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
238	MVCB_5414	**Apertura**	9-sep-21	9-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
239	MVCB_5416	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	2-nov-21				0	CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
240	MVCB_5417	**validada**	23-sep-21	14-sep-21	4-nov-21				-9	CL 70C SUR 18R 17 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
241	MVCB_5418	**Apertura**	9-sep-21	9-sep-21	14-oct-21	22-oct-21	13-nov-21		8	KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR	**0%**	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
242	MVCB_5419	**validada**	9-sep-21	9-sep-21	3-nov-21				0	CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
243	MVCB_5421	**validada**	23-sep-21	22-sep-21	4-nov-21				-1	CL 70D SUR 19A 16	TRANSICION HABITARTE 2019	VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
244	MVCB_5430	**validada**	8-sep-21	8-sep-21	3-nov-21				0	CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
245	MVCB_5434	**validada**	8-sep-21	8-sep-21	3-nov-21				0	CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	ALFONSO GARCIA GARAVITO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
246	MVCB_5435	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	3-nov-21				0	CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
247	MVCB_5451	**validada**	25-sep-21	9-sep-21	29-nov-21				-16	KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
248	MVCB_5453	**validada**	25-sep-21	9-sep-21	29-nov-21				-16	KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EMELINA PALACIOS MATEUS		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
249	MVCB_5455	**validada**	21-sep-21	14-sep-21	1-dic-21				-7	KR 19C 70C 42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA JACQUELINE ROJAS		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
250	MVCB_5462	**validada**	13-sep-21	13-sep-21	27-dic-21				0	CL 70C SUR 19B 27	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO		se realizará demolicion de enchapes piso en baño, pañetes, enchapes pisos y cocina, meson de cocina
251	MVCB_5468		21-sep-21		1-dic-21				0	KR 19B 70D 13 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FLORALBA SIMIJACA CAMACHO		
252	MVCB_5477	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	27-dic-21				0	KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCRECIA LARIN LOZANO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
253	MVCB_5488	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	1-dic-21				0	KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	INES GALVIS CHAVEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
254	MVCB_5521	**validada**	10-sep-21	10-sep-21	29-nov-21				0	CL 70C SUR 19G 06	TRANSICION HABITARTE 2019	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
255	MVCB_5553	**validada**	11-oct-21	11-oct-21	1-dic-21				0	DG 69Q SUR 18N 94	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA PALOMINO OSORIO		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
256	MVCB_5556	**Apertura**	13-sep-21	13-sep-21	19-oct-21	21-oct-21	18-nov-21		2	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS	0%	se van a realizar actividades en cubierta realizando el cambio de la estructura por una nueva con antocorrosivo
257	MVJA_0091	**validada**	2-oct-21	28-oct-21	14-oct-21				26	CL 61A SUR 18N 27	TRANSICION - JALISCO	JOSE ALEXANDER GOMEZ MORA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran
258	MVJA_0187		1-oct-21		11-oct-21				0	CL 61C SUR 18N 09	TRANSICION - JALISCO	OVIDIO GOMEZ VARGAS		


259	MVJA_0261		30-sep-21		11-oct-21				0	CL 61D SUR 18P 12 IN 11	TRANSICION - JALISCO	MARIA DE LOS ANGELES SILVA DUQUE		
260	MVJA_0277	**validada**	13-oct-21	14-oct-21	30-dic-21				1	CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION - JALISCO	DIOSELINA FLOREZ MONTES		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
261	MVJA_0307		30-sep-21		11-oct-21				0	CL 62 BIS SUR 18K 10	TRANSICION - JALISCO	DAGOBERTO RODRIGUEZ CANTOR		
262	MVJA_0316		1-oct-21		11-oct-21				0	CL 62 BIS SUR 18K 28	TRANSICION - JALISCO	MARIA EBELIA LEAL		
263	MVJA_0369		30-sep-21		11-oct-21				0	CL 62 SUR 18J 70	TRANSICION - JALISCO	JOSE LEOPOLDO PEÑALOZA		
264	MVJA_0370	**validada**	15-sep-21	15-sep-21	30-nov-21				0	CL 62 SUR 18J 71	TRANSICION - JALISCO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON		panetes en general, alistado pisos, pinturas, enchapes en pisos, muros de baño y cocina, meson de cocina y combo sanitario
265	MVJA_0387		15-sep-21		11-oct-21				0	CL 62 SUR 18K 59	TRANSICION - JALISCO	MARTIN MEDINA BERRIO		
266	MVJA_0538	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	30-dic-21				0	CL 62A SUR 18L 39	TRANSICION - JALISCO	DORIS VASQUEZ		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
267	MVJA_0571	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	29-dic-21				0	CL 62A SUR 18N 15	TRANSICION - JALISCO	RITO JULIO ROJAS SAENZ		en esta vivienda se va a realizar cambio de cubierta
268	MVJA_0853		29-sep-21		12-oct-21				0	CL 63A SUR 18R 13	TRANSICION - JALISCO	RAFAEL ENRIQUE URIBE LOZANO		
269	MVJA_0917		30-sep-21		12-oct-21				0	CL 63C SUR 18P 05	TRANSICION - JALISCO	ERNESTO TIBANA BLANCO		
270	MVJA_0964	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	30-dic-21				0	CL 63D SUR 18K 38	TRANSICION - JALISCO	MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
271	MVJA_1028	**validada**	15-sep-21	15-sep-21	30-dic-21				0	CL 63F SUR 18Q 10	TRANSICION - JALISCO	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ		demolicion de enchapes en baño y cocina, alistado en pisos en general, pinturas , enchapes en baño y cocina
272	MVJA_1265		1-oct-21		12-oct-21				0	CL 64D SUR 18M 20	TRANSICION - JALISCO	DIANA MARCELA MRTINEZ RODRIGUEZ		
273	MVJA_1378	**validada**	12-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				1	CL 65 SUR 18N 47	TRANSICION - JALISCO	JOSE GONZALO HILARION PARRA		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
274	MVJA_1405		2-oct-21		14-oct-21				0	CL 65 SUR 18R 42	TRANSICION - JALISCO	CESAR CRUZ MOLANO		
275	MVJA_1460	**validada**	12-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				1	CL 65B SUR 18M 16	TRANSICION - JALISCO	WILSON MAURICIO BRICEÑO		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
276	MVJA_1786	**validada**	12-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				1	DG 64 BIS SUR 19 23	TRANSICION - JALISCO	GEORGINA SALAZAR		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
277	MVJA_2105		30-sep-21		12-oct-21				0	DG 64A SUR 19B 39	TRANSICION - JALISCO	MARIA DEL TRANSITO POLANIA CRUZ		
278	MVJA_2340	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	30-dic-21				0	KR 18J BIS 63D 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MANUEL ANTONIO ROMERO LEON		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
279	MVJA_2438		1-oct-21		11-oct-21				0	KR 18K BIS 61 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA LEONOR AVENDANO		
280	MVJA_2512		1-oct-21		11-oct-21				0	KR 18L 61B 26 SUR	TRANSICION - JALISCO	ALEX ARNULFO OLAYA DURAN		
281	MVJA_2536		1-oct-21		12-oct-21				0	KR 18L 63D 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	GRACIELA CARBONEL DE GUZMAN		
282	MVJA_2659	**validada**	15-sep-21	15-sep-21	30-dic-21				0	KR 18L BIS A 62A 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS		demolicion de meson de cocina, preparacion de pisos para enchape. alistados, preparacion de muros para aplicacion de pinturas, enchapes pisos, muros en cocina y baño, combo sanitario
283	MVJA_2714	**validada**	15-sep-21	15-sep-21	30-dic-21				0	KR 18M 62 35 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA		cambios de enchapes en pisos, meson de cocina, preparacion de muros para pinturas, combo sanitario, enchapes en pisos y muros en cocina y baño
284	MVJA_2721		29-sep-21		11-oct-21				0	KR 18M 62 54 SUR	TRANSICION - JALISCO	MICHAEL STIVEN CAMACHO VEGA		
285	MVJA_2733	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	29-dic-21				0	KR 18M 62A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARIA DEL CARMEN LEAL QUESADA		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
286	MVJA_2772	**validada**	12-oct-21	13-oct-21	30-dic-21				1	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	ROSA RUBIANO OCHOA		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
287	MVJA_2797	**validada**	13-oct-21	14-oct-21	29-dic-21				1	KR 18M BIS 61B 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	LUZ MILA VASQUEZ PAEZ		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
288	MVJA_2830	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-21				0	KR 18M BIS 62 16 SUR	JALISCO	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas

289	MVJA_2899	**validada**	12-oct-21	14-oct-21	29-dic-21				2	KR 18N 61A 64 SUR	TRANSICION - JALISCO	JAIRO MUÑOZ HERNANDEZ		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
290	MVJA_2915		21-sep-21		11-oct-21				0	KR 18N 62 24 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARIA MAGDALENA GALEANO		
291	MVJA_2920	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	29-dic-21				0	KR 18N 62 49 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO CRUZ ORTEGON		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
292	MVJA_3139	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	29-dic-21				0	KR 18P 62A 24 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
293	MVJA_3144		18-sep-21		11-oct-21				0	KR 18P 62A 39 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CELIA ROMERO DUARTE		
294	MVJA_3226	**validada**	13-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				0	KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CARMEN ROSA ACUNA PEREZ		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
295	MVJA_3227	**validada**	13-oct-21	13-oct-21	29-dic-21				0	KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	JORGE ENRIQUE LANCHEROS RENGIFO		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
296	MVJA_3228	**validada**	13-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				0	KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	FRANZ GARRY PARRA ROJAS		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
297	MVJA_3235	**validada**	13-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				0	KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	FLOR ALBA BUCURU HERRADA		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
298	MVJA_3285	**validada**	13-oct-21	13-oct-21	28-dic-21				0	KR 18P BIS B 61A 84 SUR	TRANSICION - JALISCO	LUIS ALFREDO CASTRO MENJURA		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
299	MVJA_3293	**validada**	13-oct-21	14-oct-21	28-dic-21				1	KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION - JALISCO	GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
300	MVJA_3328		23-sep-21		12-oct-21				0	KR 18P BIS B 62A 31 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA		
301	MVJA_3385	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	28-dic-21				0	KR 18Q 63A 15 SUR	TRANSICION - JALISCO	SONIA JANETH PAEZ		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
302	MVJA_3399	**validada**	12-oct-21	12-oct-21	30-dic-21				0	KR 18Q 63D 18 SUR	TRANSICION - JALISCO	PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ		en esta vivienda se van a realizar actividades como enchapes en baños y cocina y se intervendran las habitaciones con pisos en enchapes y pinturas
303	MVJA_3405		9-sep-21		12-oct-21				0	KR 18Q BIS 63A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARY INGRE MILENA		
304	MVJA_3462	**validada**	15-sep-21	15-sep-21	30-dic-21				0	KR 18R 61 57 SUR	TRANSICION - JALISCO	REINALDA GAMBOA		alistado pisos, pañetes en general, enchape pisos en general, enchape en muros, meson de cocina, baño
305	MVJA_3713	**validada**	14-oct-21	15-sep-21	30-dic-21				-29	KR 19 62A 23 SUR	TRANSICION - JALISCO	ANA ADELINA PARRAGA MOYA		enchape pisos en general, enchape en meson cocina, baño, pinturas
306	MVJA_4290		9-sep-21		11-oct-21				0	TV 18Q BIS 61B 40 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA YANET SABOGAL ARDILA		
307	MVJA_4299		1-oct-21		13-oct-21				0	TV 18Q BIS A 61A 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	DORA CECILIA ACOSTA CASTAÐEDA		
308	MVJA_4328	**validada**	13-oct-21	14-oct-21	28-dic-21				1	TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	TRANSICION - JALISCO	SOR MARIA GOMEZ NARANJO		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
309	MVJA_4354	**validada**	13-oct-21	14-oct-21	30-dic-21				1	TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION - JALISCO	ALICIA ALMARIO NUNEZ		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas
310	MVJA_4378	**validada**	13-oct-21	14-oct-21	28-dic-21				1	TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION - JALISCO	LUZ DARY GUAPACHA LARGO		En esta vivienda se van a realizar actividades de enchapes en pisos y paredes segun especificaciones y pinturas en las areas priorizadas

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	ADELANTO / ATRASO
EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE	$ -	0%	
PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
TOTAL VALOR VALIDADO FRENTE DE OBRA		0%	

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS	NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR	NUMERO VIVIENDAS APERTURADAS	NUMERO DE VIVIENDAS POR APERTURAR	NUMERO VIVIENDAS TERMINADAS	NUMERO VIVIENDAS POR TERMINAR	NUMERO DE VIVIENDAS PAGADAS	CASOS ESPECIALES RENUNCIAS
310	275	35	44	266	0	310	0	10

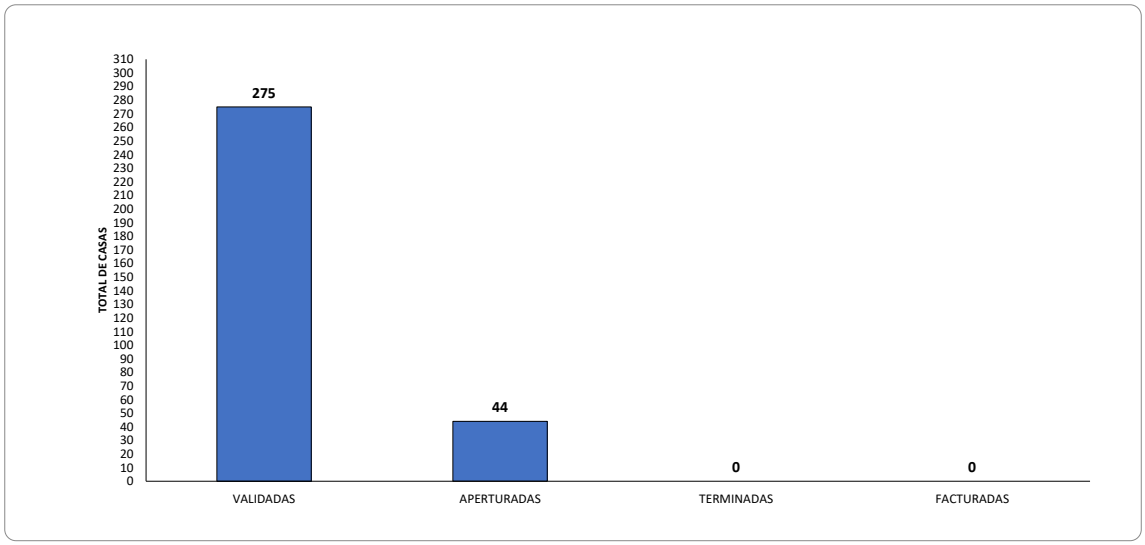

3. PLAZO

Fecha de terminación de ejecución de obra.	4/2/2022

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	165	70	95
Proyección	165	70	95

4- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	0	4/2/2022	38,18%
Semana Actual	0	4/2/2022	42,42%

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

JUSTIFICACIÓN:

Se continúa la fase I de validación. Se realizaron 8 visitas de validación. Total validaciones en la semana: 8 MV.
Durante la semana se reunieron los profesionales técnicos de interventoria y contratista con el fin de revisar y aprobar los presupuestos de validación, como resultado de las visitas a los diferentes viviendas. Se identificó que en todas las viviendas se deben hacer ajustes a los presupuestos entregados por la secretaria puesto que se detectan cambios de actividades, aclarando que los cambios que se generen son en base a los parametros establecidos por la secretaria, con el fin de optimizar los recursos y lograr tener un mayor impacto en la vivienda.
Se continúa la fase II de ejecución, con 8 aperturas en la localidad de Ciudad Bolívar. Total aperturas Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe: 44 MV

Se realizó visita de seguimiento a las viviendas aperturadas en la localidad de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, evidenciando ausencia de materiales y personal de obra del contratista.
Al finalizar la semana se pudo verificar la llegada de algunos materiales como cemento, arena, tejas, perfileria metálica, combos sanitarios.

6- DESCRIPCIÓN CASOS ESPECIALES

Esta semana no se identificaron casos especiales.

7- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha a Corte		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$		$	%
Directos+AIU+IVA	$ 5.130.409.981,00	$ 5.130.409.981,00			$ 5.130.409.981,00	100,00%
TOTAL	$ 5.130.409.981,00	$ 5.130.409.981,00			$ 5.130.409.981,00	100,00%


8- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan atrasos en la validación de algunas viviendas, el atraso maximo es de 46 días en una vivienda.
Tambien se presentan adelantos en la apertura de algunas viviendas, el adelanto máximo es de 67 días en una vivienda.
Se ha solicitado al contratista dar estricto cumplimiento a la programación presentada y aprobada por la interventoría, para evitar dicha situación e inconvenientes con los beneficiarios, especialmente en aquellas viviendas que aun no se han validado y presentan atraso.

En comité de seguimiento No.4, se le requirió al contratista presentar cronograma actualizado y acciones a implementar para corregir el atraso en la terminación de validaciones y aperturas que se lleva a la fecha.
La interventoría remitio al contratista oficio 798-2021G2-053-2021- Cumplimiento cronograma general de actividades.

9- ESTADO DEL TIEMPO

lunes -Con fuerte presencia de lluvia en la tarde
martes - Con fuerte presencia de lluvia en la tarde
miercoles - Con fuerte presencia de lluvia en la tarde
jueves - Con fuerte presencia de lluvia en la tarde
viernes - Con fuerte presencia de lluvia en la tarde
sabado - Con fuerte presencia de lluvia en la tarde



Interventoría- GRUPO 2
CONTRUMARCA S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021** **CONTRATO No. 798 DE 2021** **REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME 10**	CONSTRUMARCA S.A.S. NIT: 830.509.427 - 9



FECHA:	23/10/2021
LUGAR:	MVCB_5410
OBSERVACIONES:	Fase II -Apertura



FECHA:	23/10/2021
LUGAR:	MVCB_1596
OBSERVACIONES:	Fase II -Apertura



FECHA:	23/10/2021
LUGAR:	MVCB_1727
OBSERVACIONES:	Fase II -Apertura



FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MVCB_1569
OBSERVACIONES:	Fase II -Apertura



FECHA:	27/10/2021
LUGAR:	MVCB_1368
OBSERVACIONES:	Fase II -Apertura



FECHA:	27/10/2021
LUGAR:	MVCB_1723
OBSERVACIONES:	Fase II -Apertura




FECHA:	28/10/2021
LUGAR:	MVCB_5322
OBSERVACIONES:	Revalidación



FECHA:	29/10/2021
LUGAR:	MV_42764 IDU
OBSERVACIONES:	Fase I -Validación



FECHA:	29/10/2021
LUGAR:	MVCB_2547
OBSERVACIONES:	Fase I -Validación



FECHA:	29/10/2021
LUGAR:	MVCB_2474
OBSERVACIONES:	Fase I -Validación

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	



FECHA: 26/10/2021
LUGAR: MV-091
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 26/10/2021
LUGAR: MV-091
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 26/10/2021
LUGAR: MV-148
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 26/10/2021
LUGAR: MV-148
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 26/10/2021
LUGAR: MV-152
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 26/10/2021
LUGAR: MV-152
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 29/10/2021
LUGAR: MV-330
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 29/10/2021
LUGAR: MV-330
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 06/10/2021
LUGAR: MV-765
OBSERVACIONES: Visita seguimiento



FECHA: 06/10/2021
LUGAR: MV-765
OBSERVACIONES: Visita seguimiento

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

FECHA:
LUGAR:
OBSERVACIONES:

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME 10




FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MVCB_1762
OBSERVACIONES:	APERTURA



FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MVCB_1762
OBSERVACIONES:	APERTURA



FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MVCB_1833
OBSERVACIONES:	VALIDACION

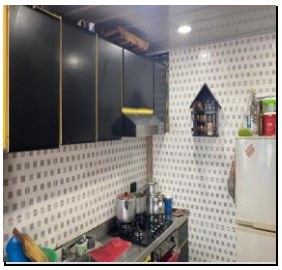

FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MVCB_1833
OBSERVACIONES:	VALIDACION




FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MV_04993
OBSERVACIONES:	VALIDACION



FECHA:	25/10/2021
LUGAR:	MV_04993
OBSERVACIONES:	VALIDACION



FECHA:	26/10/2021
LUGAR:	MVCB_3118
OBSERVACIONES:	VALIDACION

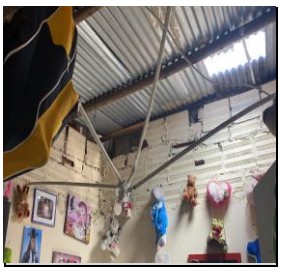

FECHA:	26/10/2021
LUGAR:	MVCB_3118
OBSERVACIONES:	VALIDACION



FECHA:	26/10/2021
LUGAR:	MVCB_2866
OBSERVACIONES:	VALIDACION



FECHA:	26/10/2021
LUGAR:	MVCB_2866
OBSERVACIONES:	VALIDACION



FECHA:	29/10/2021
LUGAR:	MVCB_3118
OBSERVACIONES:	APERTURA



FECHA:	29/10/2021
LUGAR:	MVCB_3118
OBSERVACIONES:	APERTURA

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

FECHA:	
LUGAR:	
OBSERVACIONES:	

Fecha: 1 /11/2021	**Periodo:** 23 al 29 octubre de 2021	**Informe No.:** Semanal No. 010
Proyecto: **CONTRATO 798 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT GRUPO 1 Y 2 - 2021."**		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 798 del 2021
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE		LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	795 del 2021
OBJETO	**EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.**
CONTRATISTA	Ambientalmente Ingeniería S.A.S
PLAZO	5 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	20 de agosto del 2021
FECHA FINAL	4 de febrero del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	DIANA LOAIZA

GRUPO 2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. Durante la semana reportada en el informe se dio continuidad a las actividades de Visitas de Validación, inicio de aperturas en el territorio de Rafael Uribe- Uribe y Ciudad Bolívar y visitas de seguimiento de obra. Estas visitas se realizaron según la proyección y programación del contratista, sin embargo, nos permitieron identificar las necesidades habitacionales fundamentales de los beneficiarios del proyecto y en la misma medida las diferentes situaciones de vulnerabilidad socioeconómica que presentan las familias.
   Esta programación no se cumplió en su totalidad.
B. Estas visitas también nos permitieron el reconocimiento geográfico del territorio de Rafael Uribe- Uribe donde se desarrollarán los mejoramientos de vivienda, de esta manera se logró dimensionar diferentes aspectos que representan fortalezas y dificultades al realizar la ejecución de obras en el territorio, entre estos principalmente los temas de accesibilidad a las viviendas, temas de seguridad.
C. Durante la tercera semana del mes octubre del año en curso, se plasmó por medio de convenciones en el plano de Transición Habitarte del 2019, Jalisco y Rafael Uribe Uribe de las validaciones efectuadas hasta la fecha en las matrices expuestas en los PAC de interventoría y contratista.

D. En la semana en mención de octubre se realizó la verificación de la documentación tanto carpeta y bitácora según la programación general para la fase de apertura.
E. Se realizó la radicación de 4 renuncias, para un total de nueve renuncias oficiales hasta la fecha.
F. También reportamos la situación de riesgo que se presentó el día 26 de octubre de 2021 en el territorio de Marandú, en el que sucedió un atraco que puso en riesgo la vida e integridad de cuatro profesionales que se encontraban en la realización de Visitas de Inicio y Apertura. La persona se acercó precipitadamente a las profesionales con palabras groseras y amenazas de muerte apuntándonos con una pistola. Las actividades de la jornada se lograron efectuar en su totalidad según la programación, pero se debe dejar registro en estos informes de impases de esta naturaleza.
G. El día lunes 25 de octubre de 2021 se instaló por parte del contratista valla informativa del Punto de Atención al Ciudadano PAC en el salón comunal Escala II sector, ubicado en la Carrera 18M 61D - 50 sur. Se realiza acta social y técnica explicando los motivos de seguridad que no permitieron realizar una atención personal en horarios establecidos. Sin embargo, la atención se prestará vía correo electrónico y vía llamada telefónica. Está información se encuentra en la valla informativa. El acta es firmada por el presidente de acción comunal, señor: Miguel Amaya y los profesionales del contratista e interventoría.
H. El día 27 de octubre se realiza seguimiento a la vivienda MVCB_5322 de la señora Luz Olvey Martínez Arias quien efectuó la ampliación de su vivienda ya que contaba con una casa prefabricada con sala y comedor, baño y una habitación donde convive con toda su familia (4) integrantes y un patio trasero. Dicho compromiso, se estableció en el momento de la validación, con el fin de ajustar el presupuesto acorde a las necesidades de la familia. Al momento del seguimiento se evidencia el levantamiento de una estructura de dos habitaciones sala, baño y cocina. Está pendiente la instalación de la cubierta para dar inicio a la ejecución de obra. Dicho MV está en proyección para postulación de historia de vida.
I. Se realizó comité de obra el día 27 de octubre en el PAC de obra.

J. CARACTERIZACIÓN O VISITAS DE VALIDACIÓN SOCIAL

Durante el periodo, se continúa acompañando y verificando por parte de la interventoría **Construmarca S.A.S**, en donde se realizó la división por grupos de profesionales, los cuales efectúan acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones realizadas por los equipos técnico y social del contratista.
En un primer momento se efectúa la presentación con el beneficiario de las dos Empresas, se procede a realizar el protocolo de bioseguridad, seguido a esto, realizar la entrevista y medición dentro del hogar. Asimismo, indagación con respecto al carnet de vacunación del COVID-19. Posteriormente se lleva a cabo la solicitud de documentos para verificar la información relacionada con la identidad de la persona a la cual se le otorgó el subsidio. En un tercer momento se hace entrega de un folleto el cual nombra aspectos relevantes que fueron socialización en la reunión de inicio, para tener en cuenta en la fase de ejecución. Para finalizar se le informa que se efectuará nuevamente contacto telefónico para establecer la segunda visita donde se explicará el presupuesto y aprobación de este por el beneficiario.

VISITAS DE VALIDACIONES						
N.º	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES
Lunes 25 de octubre del 2021						

1	MVCV_1833	CL 70K SUR 18N 23	MIRADOR (NUTIVARA)	MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO	25/10/2021	Validación efectiva. Se realiza visita al predio de la beneficiaria, con el fin de llevar a cabo el proceso de validación social y técnica. Se indaga sobre la vacunación contra el covid 19 en el caso de la beneficiaria y su grupo familiar. La visita fue atendida por la misma beneficiaria quien firma a conformidad.
2	MV_04993	CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	EL PARAISO	ROSALBINA ZABALA MENDOZA	25/10/2021	Validación efectiva. Se realiza visita al predio de la beneficiaria, con el fin de llevar a cabo el proceso de validación social y técnica. Se indaga sobre la vacunación contra el covid 19 en el caso de la beneficiaria y su grupo familiar. La visita fue atendida por la misma beneficiaria quien firma a conformidad.
Martes 26 de octubre del 2021						
X	MVCB_2931	TV 18N 69A 91 SUR	JUAN PABLO II	GLORIA VILLAMIL	RENUNCIA 26/10/2021	Visita de Validación fallida y renuncia. El proceso con este caso se ha realizado durante varias visitas concertadas. Se debe a que la vivienda no cuenta con muros estructurales, ni redes sanitarias, y placas de cimentación ni columnas, por lo que no es posible intervenir las zonas priorizadas por el proyecto de mejoramiento de vivienda. Se aclara que se hizo un proceso de varias visitas a solicitud de la beneficiaria, ya que ella intentó realizar el levantamiento de los muros, pero sus recursos no le permitieron, por tanto, el día de hoy en la visita firma la renuncia voluntaria al subsidio de mejoramiento de vivienda.
x	MVCB_2160	KR 18V 68C 83 SUR	MARANDU	EDILBERTO RIVERA	RENUNCIA 26/10/2021	Visita de Validación fallida y firma de renuncia. El beneficiario sustenta su renuncia voluntaria al subsidio de mejoramiento de vivienda a las dificultades estructurales de la vivienda y que, por fallecimiento de su esposa, la beneficiaria titular, él y sus hijos se encuentran en el proceso de sucesión del predio y por tanto la decisión de renunciar.

	3	MVCB_3118	CL 69B BIS SUR 18U 18	MARANDU	LUZ MIRYAM GOMEZ	26/10/2021	Visita de Validación. Durante la visita se aclara que el cambio de cubierta que solicitaron la beneficiaria y su esposo será analizado en comité técnico, se aclaran las especificaciones técnicas respectivas y que el proceso debe llevarse a cabo con la beneficiaria titular. Se socializa toda la documentación correspondiente a la validación firmada por la beneficiaria a conformidad.	
	4	MVCB_2866	DG 69C SUR 18N 59	JUAN PABLO II	FAVIO OLAYA CIFUENTES	26/10/2021	Visita de Validación. Se evidencia alto grado de deterioro de la cubierta actual por lo cual se	

						identifica filtraciones de agua lluvia en todos los pisos. Se determina intervenir la cubierta por ser una prioridad.
Jueves 28 de octubre del 2021						
X	MVJA_1405	CL 65 SUR 18R 42	ACACIAS SUR	CESAR CRUZ MOLANO	28/10/2021	Se realiza visita para validación social y técnica al MVJA -1405 beneficiario César Cruz Molano al llegar a la vivienda no fue posible realizar dicha actividad ya que no nos abrieron la puerta se aclara que ya es la segunda vez que se intenta realizar esta validación y no ha sido posible
5	MVJA_0091	CL 61A SUR 18N 27	ALTOS DE JALISCO	ALEXANDER GOMEZ	28/10/2021	Se realiza visita de validación social y técnica MVJA -0091 beneficiario José Alexander Gómez se socializa folleto social y se firman documentos a satisfacción
Viernes 29 de octubre del 2021						
6	MVCB_2474	KR 18L BIS B 69A 77 SUR	BARRIO LAS MANITAS	CONSUELO RAMIREZ	29/10/21	Se realiza visita de acompañamiento y verificación por parte de la Interventoría. Se efectúa la presentación del equipo, entrega de tapabocas. Explicación de los aspectos de la validación, entrevista para el diligenciamiento de la caracterización social y por último socialización de folleto donde se le manifiesta al beneficiario aspectos a tener en cuenta durante la obra. La beneficiaria firma conformidad la documentación. La vivienda cuenta con cuatro pisos de ellos cuales el piso a Intervenir está en arriendo sin embargo, se le informa a la beneficiaria que no deben desalojar el espacio para el desarrollo de las actividades.
7	MV_4 2764 - IDU	CARRERA 27F 71D 34 SUR	EL MIRADOR	FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO	29/10/21	Se realiza visita de acompañamiento y verificación por parte de la Interventoría. Se efectúa la presentación del equipo, entrega de tapabocas. Explicación de los aspectos de la validación, entrevista para el diligenciamiento de la caracterización social y por ultimo socialización de folleto donde se le manifiesta al beneficiario aspectos a tener en cuenta durante la obra. El beneficiario firma conformidad la documentación. En cuanto

						a la	

						validación técnica se le manifiesta al beneficiario que al efectuarse la reparación de los muros, puede que se vuelva a presentar el agrietamiento de los mismos ya que son aspectos de origen de la vivienda producto del asentamiento. El beneficiario comprende lo informado. La familia se constituye por dos personas mayores.
8	MVCB _2547	KR 18K 70B 16 SUR	LAS MANITAS	MARIA MERCEDES HUERTAS	29/10/21	Se realiza visita de acompañamiento y verificación por parte de la Interventoría. Se efectúa la presentación del equipo, entrega de tapabocas. Explicación de los aspectos de la validación, entrevista para el diligenciamiento de la caracterización social y por último socialización de folleto donde se le manifiesta al beneficiario aspectos a tener en cuenta durante la obra. La beneficiaria firma conformidad la documentación. La vivienda se encuentra en obra negra, y no está habitada, intervención en segundo piso.

J. APERTURAS

Durante la semana se continuó con las aperturas, en un primer momento se realiza protocolo de bioseguridad antes de ingresar a la vivienda, los profesional SST, técnicos u sociales aplica alcohol en manos y suela de los zapatos a cada uno de los profesionales, luego se procede a ingresar a la vivienda para realizar la presentación por parte del profesional social del proyecto al beneficiario u autorizado, seguidamente se procede a realizar socialización de carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social de inicio de obra, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se brindan recomendaciones a tener en cuenta durante la ejecución de la obra, el movimiento de enseres es responsabilidad del beneficiario y su grupo familiar, no se realizan intervenciones en conexiones de agua, luz o gas.

Se recuerda que el beneficiario es quien se compromete a generar espacio para almacenamiento de materiales y disposición de escombros dependiendo las condiciones del predio. Se hace entrega de kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia del Covid -19, la cual es pegada en la puerta principal de la vivienda para que sea tenida en cuenta por la familia del beneficiario y por el personal de obra, se socializa la carta del trato digno. Finalmente se resuelven dudas e inquietudes del beneficiario (a).

Se procede a solicitar al beneficiario las firmas en cada uno de los documentos socializados con anterioridad. Procede a firmar los profesionales del contratista e interventoría.

VISITAS DE APERTURAS						
N.º	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES
Sábado 23 de octubre de 2021						
1	MVCB_1 727	KR 18Q 70J 08 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO	23/10/2021	Se realiza visita de apertura en la que se socializa el presupuesto de ejecución, el acta social y técnica con las especificaciones contra covid 19 y los puntos a tener en cuenta durante obras y se realiza entrega de kit de bioseguridad. Se firma toda la documentación a conformidad de la autorizada.
2	MVCB_1 596	CL 70F SUR 18N 52	MIRADOR (NUTIVARA)	RUTH ORJUELA DE TAPIERO	23/10/2021	Se realiza visita de apertura en la que se socializa el presupuesto de ejecución, el acta social y técnico con las especificaciones contra covid 19 y los puntos a tener en cuenta durante obras y se realiza entrega de kit de bioseguridad. Se firma toda la documentación a conformidad de la beneficiaria
3	MVCB_5 410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	23/10/2021	Se realiza visita de apertura en la que se socializa el presupuesto de ejecución, el acta social y técnico con las especificaciones contra covid 19 y los puntos a tener en cuenta durante obras y se

						realiza entrega de kit de bioseguridad. Se firma toda la documentación a conformidad de la beneficiaria.
Lunes 25 de agosto						

4	MVCB_1 569	KR 18R 70F 21 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO	25/10/2021	Se realiza visita de apertura en la que se socializa el presupuesto de ejecución, el acta social y técnico con las especificaciones contra covid 19 y los puntos a tener en cuenta durante obras y se realiza entrega de kit de bioseguridad. Se firma toda la documentación a conformidad de la beneficiaria
5	MVCB_1 762	CL 70K SUR 18N 24	MIRADOR (NUTIVARA)	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA	25/10/2021	El día 25 de octubre de 2021 se realiza visita de apertura de obra, donde se socializa carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social, presupuesto de inicio, protocolo de bioseguridad, se recuerdan las recomendaciones necesarias durante el proceso de ejecución de obra, no prestar dinero y herramientas a los maestros, el traslado de enceres es responsabilidad directa del beneficiario y grupo familiar no se realiza intervención en conexiones de agua, luz o gas. Se solicita al beneficiario adecuar un espacio para disponer de los materiales de obra y del escombro. Se hace entrega de Kit de bioseguridad y señalización preventiva para mitigar la contingencia por la pandemia del Covid- 19, se socializa carta del trato digno y finalmente se da respuesta a inquietudes o preguntas por parte del beneficiario (a). Quien firma la documentación socializada y nota de apertura en bitácora a conformidad. Quien atiende la visita es la misma beneficiaria en compañía de su hija: Elizabeth Neira Godoy.
Miércoles 27 de octubre 2021						

6	MVCB_1 368	CL 70J SUR 18L 35	NUEVA COLOMBIA	OTILIA PICO	27/10/2021	Se realiza visita de apertura en la que se socializa el presupuesto de ejecución, el acta social técnica con	

						las especificaciones contra COVID 19 y los puntos a tener en cuenta durante obras y se realiza entrega de kit de bioseguridad. Se firma toda la documentación a conformidad de la beneficiaria
7	MVCB_1 723	CL 70I SUR 18Q 09	MIRADOR NUTIVARA	CECILIA BARATO BETANCOURT	27/10/2021	Se realiza visita de apertura en la que se socializa el presupuesto de ejecución, el acta social técnica con las especificaciones contra COVID 19 y los puntos a tener en cuenta durante obras y se realiza entrega de kit de bioseguridad. Se firma toda la documentación a conformidad de la beneficiaria
Viernes 29 de octubre 2021						
8	MVCB_1 833	CL 70K SUR 18N 23	MIRADOR NUTIVARA	MYRIAM RUBIELA PAZ	29/10/2021	Visita de Inicio y Apertura de obras de mejoramiento de vivienda. Equipo conformado por Johanna Rodríguez, Julián Peña, Erick Veloza, Carolina Navarro. La visita permitió evidenciar que la vivienda tiene alta presencia de humedad. Se realiza todo el protocolo de bioseguridad y entrega de kits correspondientes. Área técnica socializa el presupuesto de obras y atiende las inquietudes de la beneficiaria. Área social explica el Acta de Inicio y reitera las recomendaciones pertinentes, realiza la presentación de Bitácora y canales de comunicación. Toda la documentación es firmada por la beneficiaria a conformidad.

K. SEGUIMIENTO DE OBRA

SEGUIMIENTO DE OBRA						
N.º	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES
Martes 26 de Octubre de 2021						

1	MV_ 148	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMÚDEZ HACHE.	26/10/2021	Se realiza visita de seguimiento de obra por parte del área social y técnica de interventoría. Se evidencia que a la fecha no hay material de obra, no hay personal de obra realizando las intervenciones correspondientes al cambio de cubierta. El beneficiario manifiesta a los profesionales sus dudas frente a las demoras en la ejecución, ya que de alguna manera altera las actividades cotidianas de la familia al interior de la vivienda. Se solicita por parte de la interventoría, al contratista iniciar obra lo más pronto posible, teniendo en cuenta la programación establecida. Se deja nota de seguimiento en bitácora. La visita fue atendida por el mismo beneficiario.
2	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	26/10/2021	Se realiza visita de seguimiento de obra por parte del área social y técnica de interventoría. Se evidencia que a la fecha no hay material de obra, no hay personal de obra realizando las intervenciones correspondientes al cambio de cubierta. La beneficiaria manifiesta a los profesionales sus dudas frente a las demoras en la ejecución, ya que de alguna manera altera las actividades cotidianas de la familia al interior de la vivienda. Se solicita por parte de la interventoría, al contratista iniciar obra lo más pronto posible, teniendo en cuenta la programación establecida. Se deja nota en bitácora. La visita fue atendida por la misma beneficiaria.

	3	MV_765	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO	26/10/2021	Se realiza visita de seguimiento de obra por parte del área social y técnica de interventoría. Se evidencia que a la fecha no hay material de obra, no hay personal de obra realizando las intervenciones correspondientes al cambio de cubierta. La hija de la beneficiaria manifiesta a los	

						profesionales sus dudas frente a las demoras en la ejecución, ya que de alguna manera altera las actividades cotidianas de la familia al interior de la vivienda. Se solicita por parte de la interventoría, al contratista iniciar obra lo más pronto posible, teniendo en cuenta la programación establecida. Se deja nota en bitácora.
4	MV_091	KR 9 H39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO	26/10/2021	Se realiza visita de seguimiento de obra por parte del área social y técnica de interventoría. Se evidencia que a la fecha no hay material de obra, no hay personal de obra realizando las intervenciones correspondientes al cambio de cubierta. La beneficiaria manifiesta a los profesionales sus dudas frente a las demoras en la ejecución, ya que de alguna manera altera las actividades cotidianas de la familia al interior de la vivienda. Se solicita por parte de la interventoría, al contratista iniciar obra lo más pronto posible, teniendo en cuenta la programación establecida. Se deja nota en bitácora.
Viernes 29 de Octubre de 2021						
5	MV_330	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR	29/10/2021	Se realiza visita de seguimiento de obra, área social y técnica interventoría y contratista dónde se evidencia que no hay material de obra, no hay personal trabajando en la vivienda. Se solicita por parte de la interventoría al contratista, iniciar obra lo más pronto posible para poder hacer entrega a satisfacción y evitar inconvenientes con el beneficiario. La visita es atendida por la hermana del señor: Elías Niño Corredor. Se deja nota en bitácora.

	6	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	29/10/2021	Se realiza visita de seguimiento de obra dónde se evidencia material, hay un trabajador preparando alistado de formaleta para fundir mesón de concreto en el área de la	

						cocina. Se dejan notas del área social y técnica en bitácora.
7	MVCB_ 1 888	KR 18N 70L 05 SUR	MIRADOR NUTIVARA	LUZ EDID GARCIA	V1. 29/10/2021	Seguimiento realizado por áreas técnica y social. Se realiza la presentación del Subcontratista GAG y se establece fecha para entrega de material y de inicio de labores de obras de mejoramiento. Se atiende las inquietudes manifestadas por la beneficiaria sobre especificaciones técnicas
8	MVCB_ 5 398	CALLE 70 C SUR 18R- 12	VILLAS DEL DIAMANTE	WILLINGTON GUEVARA	V1.29/10/2021	Visita de Seguimiento. Se realiza la presentación de la empresa subcontratista G.A.G y se establece fecha de entrega de material y de inicio de labores de obras de mejoramiento de vivienda. Se atiende las inquietudes sobre especificaciones técnicas manifestadas por los beneficiarios del hogar.
9	MVCB_ 5 414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JUAN CARLOS CAICEDO	V1.29/10/2021	Visita de Seguimiento. Se realiza la presentación de la empresa subcontratista G.A.G y se establece fecha de entrega de material y de inicio de labores de obras de mejoramiento de vivienda. Se atiende las inquietudes sobre especificaciones técnicas manifestadas por los beneficiarios del hogar.
10	MVCB_ 3 088	TV 18 W 69 C 23 SUR	MARANDU	ANA SILVIA CIFUENTES	V1.29/10/2021	Visita de Seguimiento. Se realiza la presentación de la empresa subcontratista G.A.G y se establece fecha de entrega de material y de inicio de labores de obras de mejoramiento de vivienda. Se atiende las inquietudes sobre especificaciones técnicas manifestadas por los beneficiarios del hogar.

	11	MVCB_2 937	TV 18N BIS 69A 92 SUR	JUAN PABLO II	BETULIA ARIZA	V1.29/10/2021	Visita de Seguimiento. Se realiza la presentación de la empresa subcontratista G.A.G y se establece fecha de entrega de material y de inicio de labores de obras de mejoramiento de vivienda. Se atiende las inquietudes sobre especificaciones técnicas	

						manifestadas por los beneficiarios del hogar.

L. ATENCIÓN PQR No se atendieron PQRS

PQR				
N.º	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA

M. ENTREGAS

Durante las presentes semanas se realizaron ____
No se realizaron entregas para esta ocasión

ENTREGAS DE OBRA						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**	**OBSEVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA

N. HISTORIAS DE VIDA

Durante el periodo relacionado en este informe se realizó la programación para la realización de la filmación de la FASE: ANTES de las historias de vida seleccionadas. Se proyectaran y relacionaran en el informe de la siguiente semana.

1. MV_ 462 Nombre beneficiario (a): AMPARO OLAYA
Localidad: Rafael Uribe Uribe Desarrollo: Lomas
2. MVCB- 5414: Beneficiario: JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA
Desarrollo: VILLAS EL DIAMANTE
3. MVCB- 3580Beneficiario: JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO
SUR Desarrollo: JUAN PABLO II

O. RENUNCIAS

En la presente semana se llevaron a cabo tres renuncias, para un total de 10 renuncias.

- MVCB_2931 GLORIA VILLAMIL
- MVCB_2160 EDILBERTO RIVERA
- 2971 LUZ PATRICIA MORALES: este MV está en proceso debido a que la documentación no está firmada por la beneficiaria sino por la hija que es la autorizada, sin embargo está en gestión de la documentación pertinente.

P. ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

- Se denota atrasos en la apertura de las viviendas a consecuencia de no contar con los presupuestos aprobados. Debido a dicha situación, retrasa los procesos del contrato.
- Por otro lado, se observa un equipo organizado por parte del contratista no se han presentado dificultades para acceder a la vivienda y que se retrasen los procesos. Se evidencia que algunos números telefónicos no están vigentes debido a esto se han visitado algunas viviendas sin confirmación previa. En algunas visitas han surgido preguntas respecto al presupuesto y áreas a intervenir según el estado actual de la vivienda. Se observa en las casas aspectos constructivos de origen como la humedad que afecta la intervención de las áreas y por ende se debe efectuar modificaciones en los presupuestos.
- Se observa en algunas viviendas aspectos constructivos de origen que impiden la intervención en la totalidad del área a ejecutar, respecto a: Fisuras en la estructura las cuales impiden la intervención en algunas áreas locativas. Causando modificaciones en el presupuesto levantado por la Caja de Vivienda Popular, por ende, se les manifiesta a los profesionales del contratista el levantamiento de acta por la afectación en la garantía al momento de la apertura de la obra. La mayoría de las viviendas presentan humedad debido al sector y el terreno donde se encuentran asentadas.
- Se denota que algunos beneficiarios no pudieron asistir a la reunión de socialización por lo que se explica las fases del proyecto y los principales aspectos a tener en cuenta durante el mismo. En el aspecto de la verificación del esquema de vacunación los beneficiarios cuentan con esquema incompleto, debido a que están a la espera de la vacuna moderna y otros no refieren que lo tengan.
- A nivel socio familiar los beneficiarios que fueron validados se infieren diferentes necesidades socioeconómicas y habitacionales de las familias dentro del territorio y el impacto de la Pandemia por el SARS COV 2 en la población, lo cual influyó en cuanto al número de personas que habitan las viviendas, identificando de manera predominante, la tipología extendida. Respecto a las personas a cargo del aspecto económico, máximo común, cesante y una o dos laboran como independientes y se encuentran a cargo de la economía familiar.
- Se evidencia que durante el desarrollo de las aperturas hubo cambios notorios en la programación respecto a que no se llevó como se tenía planeado.

CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	7
Caracterizaciones	275
Renuncias	10
Aperturas	44
Historia de vida	3
Cierres PQR	0
Entregas	0

PROGRAMACIÓN SEMANA SIGUIENTE

Se llevarán a cabo las actividades correspondientes a la programación del contratista.

Lina Celeita.

LINA ESTEFANIA CELEITA YATE
COORDINADORA SOCIAL INTERVENTORÍA

.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE VALIDACIÓN

Jueves 21 de Octubre de 2021

	
VALIDACIÓN MV_1833 MIRYAM RUBIELA PAZ MURILLO	VALIDACIÓN MV_04993 ROSALBINA ZABALA MENDOZA
Martes 26 de octubre del 2021	
	
MVCB_2931 VISITA DE VALIDACION FALLIDA Y FIRMA DE RENUNCIA	MVCB_2160 VISTA DE VALIDACION FALLIDA Y FIRMA DE RENUNCIA
	
VALIDACION. MVCB_2866 FAVIO OLAYA	VALIDACION. MVCB_3118 LUZ MYURIAM GOMEZ
Jueves 28 de octubre	

	
VALIDACION MVJA_0091 JOSE GOMEZ	VISITA FALLIDA MVJA_1405 CESAR CRUZ
Viernes 29 de octubre del 2021	
	
MV_42764-IDU_VALIDACIÒN _FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO.	MVCB_VALIDACIÒN _FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO
	
MVCB_2474_VALIDACIÒN_ CONSUELO RAMIREZ	

REGISTRO FOTOGRÁFICO APERTURAS

Sábado 23 de octubre del 2021	
	
MVCB_5410_APERTURA_ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	MVCB_1596_APERTURA_RUTH ORJUELA DE TAPIERO
	
MVCB_1727_APERTURA_ENRIQUE SABINO LEON BARRETO	
Lunes 25 de octubre 2021	
	
MVCB_1569_APERTURA_ RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO	APERTURTA MV_1762 GILMA MARÍA GODOY DE NEIRA
Miércoles 27 de octubre del 2021	
	

APERTURA.MVCB_1368 OTILIA PICO	APERTURA. MVCB_1723 CECILIA BARATO
Viernes 29 de octubre 2021	
	
APERTURA. MVCB_1833 RUBIELA PAZ MURILLO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUIMIENTO DE OBRA

Martes 26 de Octubre de 2021	
	
SEGUIMIENTO MV_148 JORGE ALIRIO BERMÚDEZ HACHE.	SEGUIMIENTO MV_ 152 MARÍA ELVIRA CALDERÓN LANCHEROS
	
SEGUIMIENTO DE OBRA MV_765 ANA PAULINA SARMIENTO	SEGUIMIENTO MV_091 MARÍA ROSALBA TORO DE RESTREPO.
Viernes 29 de Octubre de 2021	

	
SEGUIMIENTO DE OBRA MV_330 ELIAS NIÑO CORREDOR	SEGUIMIENTO MV_152 MARIA ELVIRA CALDERÓN LANCHEROS
	
SEGUIMIENTO. MVCB_5398 WILLINGTON GUEVARA	SEGUIMIENTO.MVCB_5414 JUAN CARLOS CAICEDO
	
SEGUIMIENTO MVCB_3088 ANA CIFUENTES	SEGUIMIENTO MVCB_2937 BETULIA ARIZA
	
SEGUIMIENTO. MVCB_1888 EDID GARCIA	

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE CUIDADO

	
Instalación Valla Punto de Atención al Ciudadano PAC Ciudad Bolívar – Sector Jalisco 25-10-2021	Comunicación con líder comunitario Jalisco- Ciudad Bolívar
	
Comunicación con líder comunitario Jalisco- Ciudad Bolívar	Acta de reuniones – Jalisco Ciudad Bolívar.

CONSTRUMARCA S.A.S.	**INFORME SEMANAL PAPSO** **INTERVENTORIA**
	SEMANA 10

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 DE 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021
CONTRATISTA	CONSTRUMARCA S.A.S.
PLAZO	6 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	7 DE MARZO DE 2022

INFORME SEMANAL DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) POR PARTE DEL CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO SEGÚN LA CIRCULAR 001
MV VALIDADOS

Reportar las medidas sanitarias y lineamientos técnicos para el trabajo seguro durante la emergencia nacional, control para la prevención y mitigación el contagio por COVID19, que promueve por medio de actividades de prevención de la salud del personal de CONSTRUMARCA S.A.S, para poder controlar la propagación del virus a nivel nacional como también a todo el personal como contratistas y del equipo de interventoría.

En los Pac de interventoría y del contratista se realiza la desinfección del personal que ingresa a las instalaciones.

El personal administrativo de interventoría y del contratista se turna para realizar la desinfección de las superficies de las instalaciones donde se encuentran laborando.

Durante la semana el vehículo que se utiliza en los recurridos del territorio, el conductor realiza la desinfección a diario antes de empezar las actividades diarias.

Fase I.

Validación: El profesional social del contratista antes de ingresar a la vivienda, le hace entrega de un tapabocas desechable al beneficiario y las personas que se encuentran en la vivienda.

El profesional social, técnico y sst del contratista y de interventoría realizan el ingreso MV a realizar sus actividades correspondientes a la validación, el profesional social realiza la verificación del carnet de la vacunación COVID de los habitantes de la vivienda y realiza el diligenciamiento del formato de vacunación COVID y la documentación correspondiente a la misma.

MV VALIDADOS

No	ID DE LA VIVIENDA - MV	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
1	MV_04993	CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	CUIDAD BOLIVAR
2	MVCB_1833	CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
3	MVCB_3118	CL 69B BIS SUR 18U 18	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
4	MVCB_2866	DG 69C SUR 18N 59	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
5	MVJA_0091	CL 61A SUR 18N 27	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR
6	MV_42764-IDU	CARRERA 27F 71D 34 SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL -CABLE / Convenio 1481 - IDU	CUIDAD BOLIVAR
7	MVCB_2547	KR 18K 70B 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
8	MVCB_2474	KR 18L BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR

Fase II.

Apertura:

Se socializa los cuidados que se deben tener con el personal operativo y administrativo que visita la vivienda durante las actividades constructivas con respecto al covid, se realiza la entrega del kit de desinfección al beneficiario.

En cada MV se entregó un kit de bioseguridad el cual contenía:

- 1 litro de jabón antibacterial.
- 1 litro de gel antibacterial.
- 1 litro de alcohol antibacterial.
- 1 litro de hipoclorito de sodio.
- 15 unidades de tapabocas en empaques individuales para los beneficiarios
- 10 unidades de tapabocas en empaque individuales para los trabajadores
- 2 unidades de bolsas para residuos.
- 1 paquete por 150 unidades de toallas desechables para manos.

Se le realiza la socialización de la señalización que se deja instalada en una parte visible de la vivienda a los beneficiarios.

MV APERTURADOS

1	MVCB_1762	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
2	MVCB_1833	CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
3	MVCB_1569	KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
4	MVCB_1368	CL 70J SUR 18L 35	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
5	MVCB_1723	CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
6	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR

7	MVCB_1596	CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR
8	MVCB_1727	KR 18Q 70J 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Evidencia fotográfica de la gestión realizada del protocolo de bioseguridad durante el desarrollo de los mejoramientos vivienda por parte de interventoría y el contratista.

Entrega del kit de desinfección al beneficiario	Entrega del kit de desinfección al beneficiario	Entrega del kit de desinfección al beneficiario
		
Socialización de folleto con las precauciones que de deben tener con los trabajos durante el proceso constructivo durante el mejoramiento de vivienda	Socialización de folleto con las precauciones que dé deben tener con los trabajos durante el proceso constructivo durante el mejoramiento de vivienda	Socialización de folleto con las precauciones que de deben tener con los trabajos durante el proceso constructivo durante el mejoramiento de vivienda
		

CONSTRUMARCA S.A.S	**INFORME SEMANAL PAPSO** **INTERVENTORIA**
	SEMANA 10

Elaborado



Dalia Cárdenas
Profesional SST
Construmarca S.A.S

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 DE 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021
CONTRATISTA	CONSTRUMARCA S.A.S.
PLAZO	6 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	7 DE MARZO DE 2022

INFORME SEMANAL DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2021

En cumplimiento al contrato N° 798 DE 2021 la interventoría CONSTRUMARCA S.A.S, se verifica estándares mínimos de los requisitos legales y normativos aplicables al desarrollo del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades que tuvieron seguimiento durante el periodo comprendido entre el 23 al 29 de octubre de 2021.

Se hace la verificación de la información entregada por parte del contratista AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S, referente al tema del sistema de Gestión SST quienes, de conformidad con la legislación, han realizado entrega a lo señalado en el presente informe.

Es por ello que, para el periodo del 23 al 29 de octubre 2021, se da seguimiento a los principales parámetros requeridos, en los siguientes temas:

1.Revisión del informe semanal 9 del contratista correspondiente al periodo del 16 al 22 de octubre del presente año.

2.El contratista hace entrega de la charla con el personal administrativo, sobre implementación de la nueva señalética y socialización del procedimiento de los trabajos en alturas en el informe semanal.

3. El contratista hace entrega de las capacitaciones del personal operativo que va a realizar las actividades constructivas en los MV que se van a intervenir.

4. En el informe semanal hacen la relación de los pagos de la seguridad social del personal administrativo del contratista y el paz y salvo de la profesional sst que se retiró del proyecto.

5.El contratista hace entrega de las planillas de pago canceladas del personal contractual.

Elaborado por:



Dalia Cadenas
Profesional SST
Construmarca S.A.S.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 10 (Consecutivo) **DEL** 23 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 29 de 0ctubre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S (Escriba el nombre o razon social del Interventor) **NIT** 830509427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$5.130.409.981
Valor Adicional 1	N.A
Valor Actualizado	$5.130.409.981
Plazo Inicial	5 MESES 15 DIAS
Plazo Prórroga 1	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES 15 DIAS
Fecha de Iniciación	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación Inicial	4 de febrero de 2022
Fecha de Terminación Actual	4 de febrero de 2022
No. de empleos generados	$ 15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$615.594.670
Valor Adicional 1	N.A
Valor Actualizado	$615.594.670
Plazo Inicial	6 MESES 15 DIAS
Plazo Prorroga 1	N.A
Plazo Actualizado	6 MESES 15 DIAS
Fecha de Iniciación	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación Inicial	7 marzo de 2022
Fecha de Terminación Actual	7 marzo de 2022
No. De empleos generados	$ 11

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LINA MARIA SAZIPA MORENO (Escriba el nombre del Supervisor Habitat)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra 1-2021-39587 (Escriba el número del oficio radicado Habitat) **de fecha** 23/09/2021 dd-mm-aa

A. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO VISITADOS DURANTE LA SEMANA SISO - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD COVID 19

No	ID DE LA VIVIENDA - MV	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD	Estado del MV	KIT DE PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO A LO IMPLEMENTADO POR EL CONTRATISTA
1	MV_04993	CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
2	MVCB_1833	CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
3	MVCB_3118	CL 69B BIS SUR 18U 18	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
4	MVCB_2866	DG 69C SUR 18N 59	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
5	MVJA_0091	CL 61A SUR 18N 27	TRANSICION - JALISCO	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
6	MV_42764-IDU	CARRERA 27F 71D 34 SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL -CABLE / Convenio 1481 - IDU	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
7	MVCB_2547	KR 18K 70B 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
8	MVCB_2474	KR 18L BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
12	MVCB_1762	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
13	MVCB_1833	CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
14	MVCB_1569	KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
15	MVCB_1368	CL 70J SUR 18L 35	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
16	MVCB_1723	CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
17	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 10 (Consecutivo) **DEL** 23 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 29 de 0ctubre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

18	MVCB_1596	CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario
19	MVCB_1727	KR 18Q 70J 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CUIDAD BOLIVAR	ABIERTO	Se realiza la apertura de la vivienda y se hace entrega del kit de desinfección al beneficiario

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 10 (Consecutivo) **DEL** 23 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 29 de 0ctubre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

C

REGISTRO FOTOGRAFÍCO - KIT, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN









COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA
Durante el tiempo que lleva el proyecto en desarrollo no se a generado escombros ni residuos por que no se han comensado las adtividades contrictivas del proyecto.	SEMANA		
	MES		
	PROYECTO		

COMPONENTE SST: Actividades Ejecutadas:

Contratista:
Se continua con las validaciones en los predios donde se van a realizar los mejoramientos de viviendas y se realizan aperturas en la localidad de Ciudad Bolivar.
Semana 10
Durante el periodo de las actividades de campo - fase I validación. Se realiza la entrega de tapabocas a los beneficiarios que se encuentran en el predio durante la visita de la validación y se relaiza la aprtura de los MV en la localidad de Cuidad Bolivar , en las aperturas se le hace entrega a los beneficiarios el kit de desinfeccion que consta de un litro de alcohol, un litro de jabon liquido, un litor de gel antibacterial, 15 tapabocas, un litor de hopoclorito y se le socoaliza al beneficioario la señalizacion que se deja publucada en la vivienda del beneficioario de los cuidados que se deben tener .
Se hace la entrega de los informes correspondientes de la semana 9. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimiento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se incluyó la actualización del protocolo como actividad adicional, sin embargo, en aras de la protección ambiental y en vista que en lo corrido del proyecto se han presentado nuevas normas se propone que la actualización sea digital, mientras se trate de solo normatividad que no cambie la esencia del protocolo o haya un cambio radical en el mismo.

Interventoría: Descripción de actividades en SST de la semana.
Semana 10
Seguimiento al plan de trabajo presentado por la empresa AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S, el cual ha sido cumplido a cabalidad en las actividades propuestas.
Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 9. También se hizo acompañamiento a las validaciones y en las aperturas de los MV en la localidad de Cuidad Boliavr , verificando el cumplimiento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Accidentes e incidentes:
Contratista: 0
Interventoría:0

PERSONAL MANO DE OBRA - HORAS HOMBRE TRABAJADAS

CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACONES REALIZADAS	1	PERSONAS INCAPACITADAS		CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACIONES REALIZADAS	1	PERSONAS INCAPACITADAS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA		10	TELETRABAJO	0		CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA		15	TELETRABAJO	0	
	HORAS TRABAJADAS		HORAS CAPACITACION			AUSENTISMO					

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 10 (Consecutivo) **DEL** 23 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 29 de 0ctubre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

DATOS	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS CONTRATISTA	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS INTERVENTORIA	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS TOTAL	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN CONTRATISTA	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN INTERVENTORIA	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN TOTAL	DIAS AUSENTISMO ENFERMEDAD GENERAL		# CASOS COVID CONFIRMADOS		DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS CONFIRMADOS		# CASOS COVID SOSPECHOSOS		DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS SOSPECHOSOS		DIAS AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL		DIAS TOTAL AUSENTISMO	
							CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT
HHT SEMANA	1250	327	1577	1,00	0,25	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHT MES	1250	327	1577	3,00	1,25	4,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHT PROYECTO	1250	327	1577	5,00	2,25	7,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIOSEGURIDAD INDICADORES

Indicadores - Contratista		Indicadores - Interventoría	
a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100:	0,00 %	a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100:	0,00 %
b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %	b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100	0,00 %
c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %	c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %
d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100.	100,00 %	d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100	100,00 %
e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.	100,00 %	e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.	100,00 %

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES: El desarrollo de las actividades se viene realizando coordinadamente entre contratista y la interventoría; Procurando cumplir con los protocolos y seguimientos semanales, a fin de reportar lo realizo en el punto PAC, trabajadores y hogares, según lo solicitado por la Secretaría Distrital del Hábitat.

RECOMENDACIONES: Cumplir con las responsabilidades contractuales y la legislación vigente y aplicable contractualmente.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 10 (Consecutivo) **DEL** 23 de octubre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 29 de 0ctubre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE S.A.S **NIT** 900628905-1

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9 (Escriba el NIT del Contratista)

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ADICIONALES

INFORMACIÓN GENERAL	ENTREGA DEL KIT DE DESIFECCION DE AL LOS BENEFICIARIOS









DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES

6. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma	x	
2. Registro Fotográfico		x
3.Anexo XXXXXXXX		x
4. Anexo XXXXXXXXX		x
5. Otro		

Cual?

Nota: Si lo requiere.

Se deja constancia que este informe fue remitido el **XXXXXXXXX**X al correo electrónico del profesional de apoyo técnico de la Secretaría Distrital del Hábitat

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los vente y nueve de octubre (Día en letras) 29/10/2021 (Día en números)

días del mes de OCTUBRE (Mes en letras) de 2021 (Año de firma del informe)

DALIA CARDENAS

(Nombre) Interventor a cargo

INFORME SEMANAL No. 10
AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. 795 de 2021

OBJETO DEL PROYECTO

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2021

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN 3

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 4

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10

2.INFORME TÉCNICO 16

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA. 16

3.RECURSO HUMANO 19

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD**, la secretaria Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe Uribe.

La empresa Ambientalmente ingeniería S.A.S, celebró el contrato No. 795 de 2021 cuyo objeto corresponde a **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021**

Durante este periodo se inició la primera fase de validación en los territorios de habitarte, jalisco y lomas.

A continuación, se realiza una descripción del avance de las actividades en cada una de las localidades y conciernen al período evaluado del 23 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021, correspondiente al informe técnico semanal No. 10.

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERISA S.A.S
NIT	900628905
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MANRIQUE PINZON
DATOS DE CONTACTO	administrativo@ambientalmente.com.co
N° CONTRATO	795-2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 – 2021
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	5 meses y 15 días
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	20 agosto del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de febrero de 2021
FIRMA INTERVENTORA	Construmarca s.a.s 798-2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.130.409,5

1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el Supervisor.
3. Elaborar y entregar a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Acompañamiento social de acuerdo con el alcance del anexo técnico.
4. Presentar al interventor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida con sus respectivos soportes

que acrediten las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable), para la ejecución del contrato.
5. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción acta de inicio, un plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas, el cual deberá contener los respectivos formatos que se estimen convenientes por parte de interventoría y acordes al documento entregado, el cual deberá ser de estricto cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución de la obra.
6. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.
7. Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la SDHT.
8. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos.
9. Alimentar y hacer entrega de los formatos suministrados por la SDHT como la Caracterización social y el registro de la aplicación de prácticas sostenibles y hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.
10. Suministrar los equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos durante la ejecución del contrato.
11. Realizar reuniones con la Interventoría tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con el Interventor y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
12. El contratista se obliga a entregar a la interventoría los documentos adicionales y en original producto de la ejecución de cada uno de los mejoramientos de vivienda junto con todos los informes, anexos, planos récord y demás documentos que se documenten el estado de este.
13. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos (planos y Especificaciones técnicas), características y condiciones técnicas que hacen parte del presente contrato.
14. Desarrollar las obras de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas de ser el caso por el contratista de obra.
15. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el constructor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás

personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Común para cada grupo 20 la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar previamente el reemplazo.

16. Asumir cualquier gasto adicional resultante de las modificaciones no aprobadas por el interventor.

17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la interventoría del contrato, con fin de adelantar las acciones a que haya lugar.

18. Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación.

19. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas.

20. Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.

21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades. 22. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.

23. Suscribir en conjunto con la interventoría, el acta de inicio y las actas de recibo a satisfacción de cada una de las Intervenciones de Mejoramiento de Vivienda y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.

24. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

25. Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables.

26. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

27. Mantener al día debidamente organizada y archivada la documentación del contrato, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría.
28. Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.
29. Adelantar la debida vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.
30. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la SDHT, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de esta como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.

31. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.
32. Dar estricto cumplimiento a la programación del mejoramiento, teniendo en cuenta que, si no se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según lo propuesto y tasado por la supervisión.
33. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 21 Supervisor, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por la SDHT en el Pliego de Condiciones.
34. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica.

35. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.
36. El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que la SDHT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones. 37. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.
38. Una vez terminada la ejecución de cada vivienda y a la firma del acta de entrega física de la obra y recibo a satisfacción, hacer entrega a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras, entrega que deberá ser indicada en el acta de recibo a satisfacción de cada vivienda. 39. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo tecnico a cabalidad.
40. Las demás de acuerdo con el anexo técnico del contrato

1.2 Descripción del proyecto

Para la ejecución de la obra en cumplimiento al objetivo general del proyecto se considera la implementación de tres fases:

Fase de validación: En la ejecución de esta fase programa y desarrolla una (1) reunión con los beneficiarios del proyecto de cada bloque de viviendas e informarlos del objetivo del contrato, los actores involucrados, los puntos de atención a la comunidad y los días y horarios de atención. Esto con el fin de resolver las

expectativas e inquietudes de la comunidad y demás generalidades de las viviendas entregadas por la SDHT.

Durante esta primera fase, se realizará el proceso de actualización de la caracterización social de cada una de las familias que conforman cada uno de los bloques, así como, identificar las posibles familias que harán parte de las historias de vida.

Desde el componente técnico se realizará la validación del estado de cada vivienda que conforma el bloque. Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de estructuración, se modificará el alcance inicialmente previsto en cada una de las unidades de vivienda verificadas por parte de la entidad estructuradora, de tal modo que se requerirá adelantar una validación de la información para determinar el alcance final a realizar en cada una de las viviendas.

Dicho alcance contempla como mínimo la realización de las siguientes actividades:

- Realizarlas mediciones pertinentes.
- Determinar las cantidades de obra a tener en cuenta por unidad de vivienda.
- Actualizar presupuestos por unidad de vivienda de ser el caso.

Fase de ejecución de obras: Durante esta fase se procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda, ejecutando las obras de acuerdo con los presupuestos de obra finales y sus especificaciones técnicas para cada una de las mismas.

Para seguimiento de la ejecución se realizarán actas de inicio de obra, de entrega y recibo a satisfacción por cada vivienda. Así mismo, se contará con una bitácora por vivienda, en donde se registrarán las actividades adelantadas desde el primer día de ejecución hasta su finalización, garantizando que en la misma se consignen los imprevistos y observaciones al respecto de la obra programada.

Las obras para ejecutar corresponden a todas aquellas tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas, como: habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y

sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento de una vivienda.

Fase de cierre del proyecto: En esta fase se deberá hacer entrega de cada una de las viviendas beneficiarias con su respectiva adecuación u obra contemplada con recibido a satisfacción del beneficiario y la interventoría, de igual manera, concluir los diferentes procesos establecidos en el proyecto. Se entregará un informe final de ejecución de obras.

En cuanto al componente social, se presentará un *"informe de análisis"* de impacto social el cual debe contener las lecciones aprendidas, observaciones, percepciones, recomendaciones, conclusiones, número de personas beneficiadas y las diferentes actividades y acciones desarrolladas durante la ejecución.



Figura 1. Fases del proyecto

1.3 Localización del Proyecto

El contrato se ejecutará en los territorios de Habitarte- Ciudad Bolívar, Lomas-Rafael Uribe Uribe, Jalisco- Ciudad Bolívar y Bosa la libertad – Bosa.



Figura 2. Localidades de Bogotá.

1.4 Territorio de Habitarte – Ciudad Bolívar.

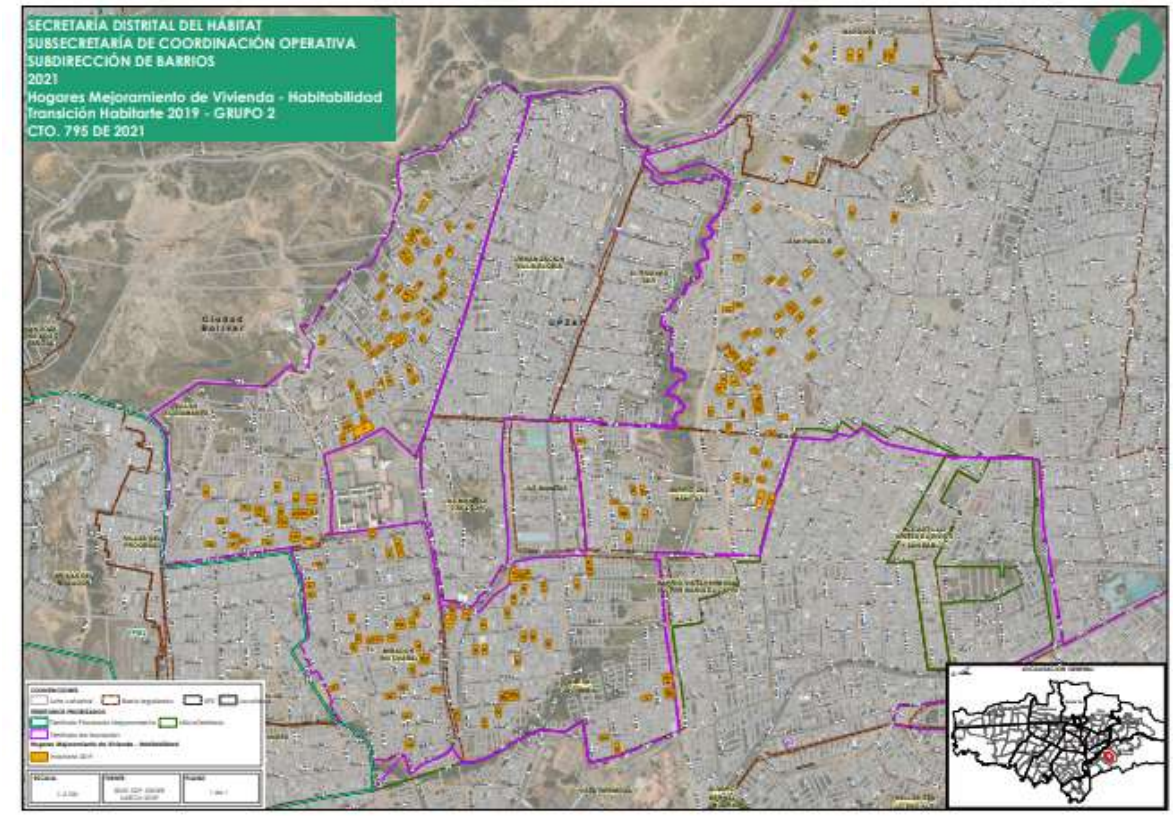


Figura 3. Plano de Habitarte – Ciudad Bolívar.

1.4.1 Territorio de Jalisco – Ciudad Bolívar.

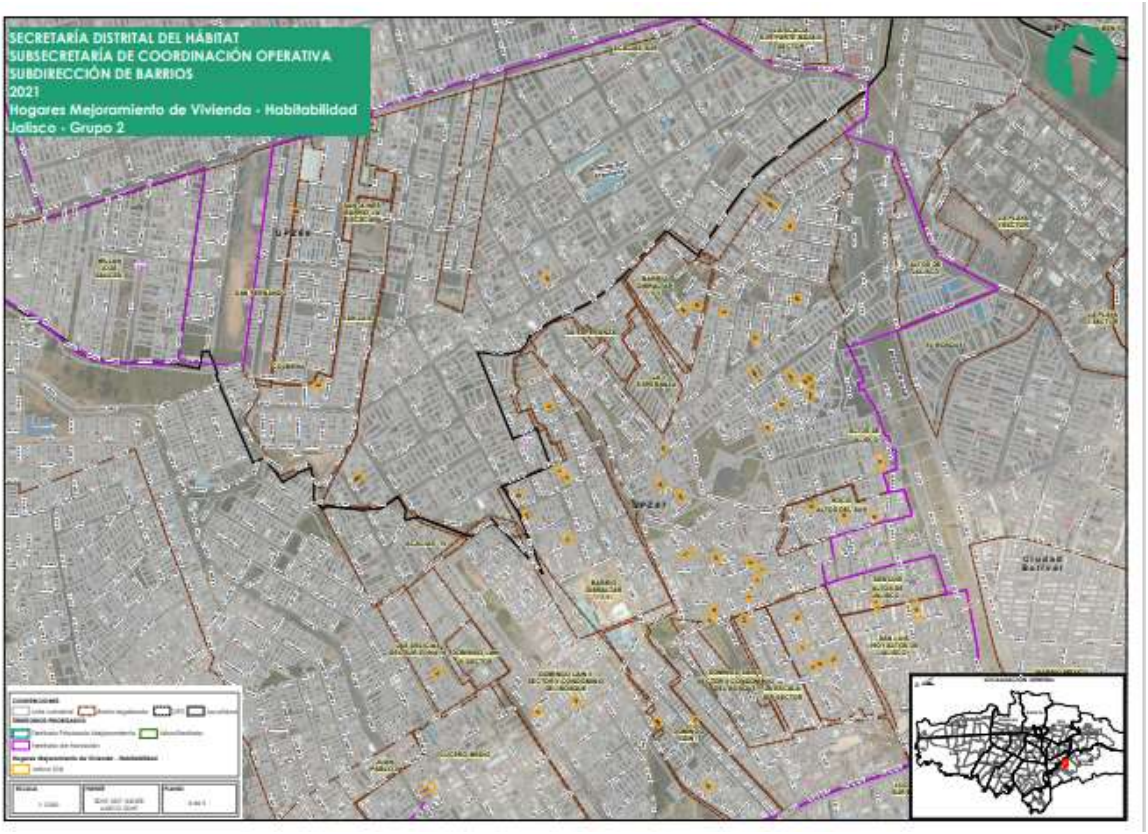


Figura 3. Plano de Jalisco – Ciudad Bolívar.

1.3.3 Territorio de Lomas – Rafael Uribe Uribe.

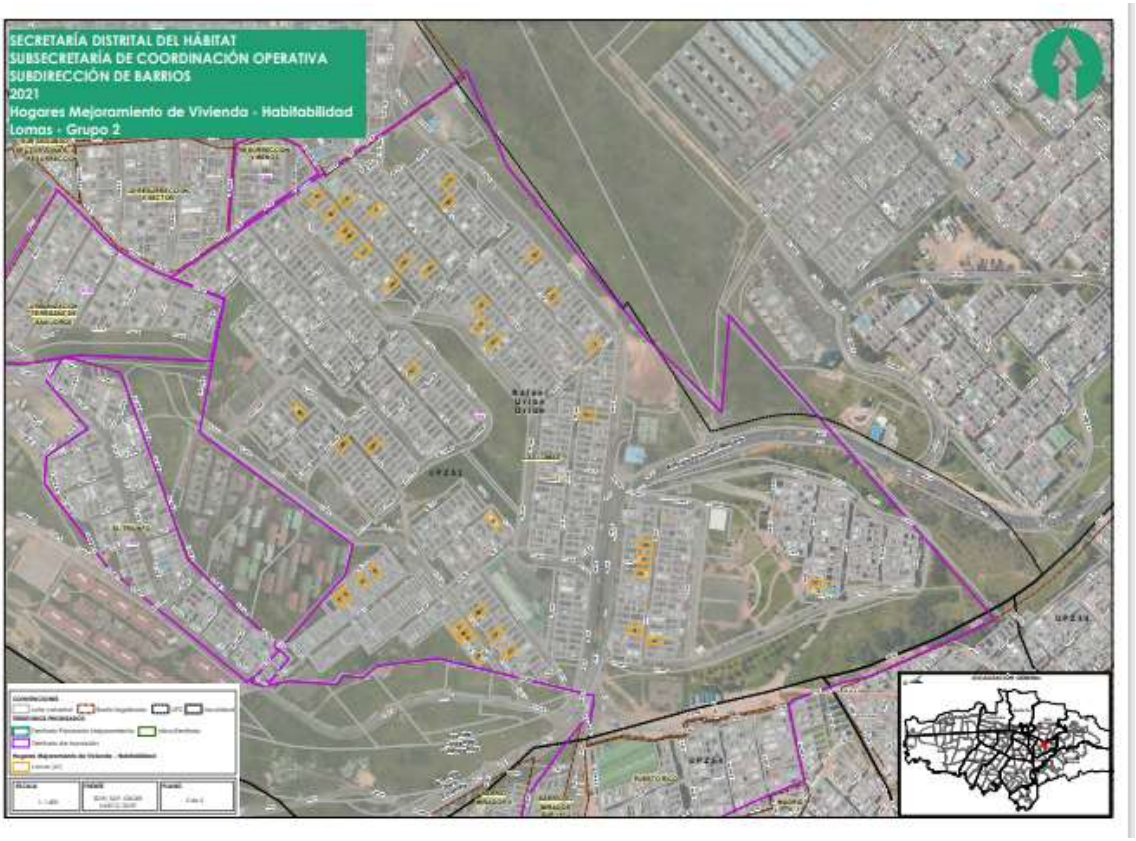


Figura 4. Plano de Lomas – Rafael Uribe Uribe

1.3.4 Territorio de Bosa la Libertad – Bosa.

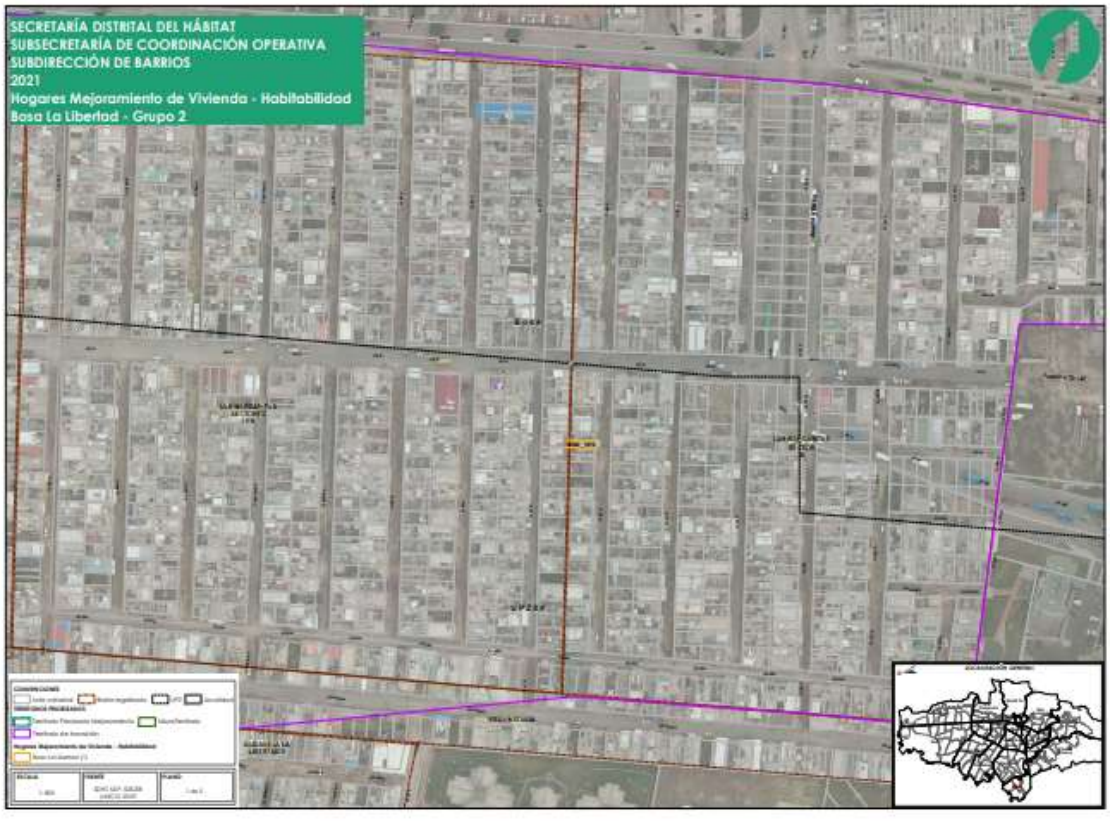


Figura 5. Plano de Bosa la libertad – Bosa.

2.INFORME TÉCNICO

2.1 Actividades realizadas hasta la fecha.

El programa de mejoramiento de vivienda coordinado por la subdirección de Barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat hizo entrega mediante Actas de Reunión debidamente suscritas, junto con los expedientes de los siguientes Mv:



Figura 6. Mapa de localidades con número de viviendas.

Para dar inicio al proyecto se comenzó con la primera fase de validación, implementando las metodologías de trabajo, se realizaron 4 grupos de trabajos conformados por los siguientes:

- Residente Técnico
- Residente Social
- Residente subcontratista
- Residente Técnico Interventoría

- Residente Social Interventoría.

Esto con el fin de darle un orden al proyecto, se implementó esta metodología para que cada grupo de trabajo estén unidos desde la primera fase hasta el cierre del proyecto. Así puedan ponerse de acuerdo y responder todos por las viviendas asignadas.

Posterior a este proceso, primero los grupos se dirigieron a cada vivienda para corroborar los documentos que las familias ingresaron al momento de postularse para el beneficio que brindo la secretaria distrital del hábitat.

Luego que se realizó correctamente este proceso, los técnicos se encargaron de validar las viviendas de acuerdo con las mediciones del área a intervenir y las condiciones en la que se encontraba cada vivienda, teniendo en cuenta el costo asignado según el subsidio. También, el área social se encargó de recopilar la mayor información en formatos establecidos y se entregaron por vivienda tapabocas para seguir con el protocolo de bioseguridad.

Ahora están en proceso de realizar los respectivos presupuestos para entregárselos a interventoría y que sea para su aprobación.

2.2 Avance de la Validación.

Se hace el análisis de las viviendas intervenidas en la validación, para sacar cuantas viviendas están validadas y cuantas faltan por validar. Cabe resaltar que en esta semana no se validó todos los días, ya que en varios días prepararon la documentación para hacer el cierre de presupuesto.

- **Fase 1 (Validaciones)**

CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	**CIUDAD BOLÍVAR**	**MV_04993**	**25-oct**	**$ 10.177.738,00**
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1833	25-oct	$ 11.934.365,96
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_2866	26-oct	$ 11.765.048,20
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_3118	26-oct	$ 11.638.325,30

TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_5322	27-oct	$ 11.420.439,30
TRANSICION - JALISCO	CIUDAD BOLÍVAR	MVJA_0091	28-oct	$ 9.254.709,00
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_2474	29-oct	$ 9.004.792,20
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_2547	29-oct	$ 11.999.527,70
TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Convenio 1481 - IDU	CIUDAD BOLÍVAR	MV_42764-IDU	29-oct	$ 12.704.532,00

En esta semana se logró aperturar los siguientes mv:

TRANSICION HABITARTE 2019	**CIUDAD BOLÍVAR**	**MVCB_1368**	**25-oct**	**$ 8.400.789,60**
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1723	25-oct	$ 10.535.722,90
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_5410	23-oct	$ 11.840.690,90
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1569	25-oct	$ 12.269.732,20
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1596	23-oct	$ 12.264.692,10
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1727	23-oct	$ 11.962.761,70
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1762	25-oct	$ 11.973.094,92
TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLÍVAR	MVCB_1833	25-oct	$ 11.476.239,88

A continuación, se muestra la tabla global de avance de las fases validación y ejecución.

TERRITORIO	VALIDACION	APERTURA	RENUNCIA
CIUDAD BOLIVAR	236	37	7

LOMAS	39	6	2
BOSA	0	0	1
TOTAL	275	44	10

3.RECURSO HUMANO

Para la consecución de las actividades y avance del proyecto, se cuenta con el siguiente personal profesional revisado y aprobado por la interventoría:

MES DE OCTUBRE

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	ESTADO
Coordinadora Social	Diana Loaiza Cantor	52.731.408	Aprobada
Profesional Social	Yessenia Gámez	1.120.745.285	Aprobada
Profesional Social	Pablo Chitiva	1.030.647.671	Aprobada
Profesional Social	Laydi Jhoana	1.015.449.947	Aprobada
Profesional Social	Lina Colorado	1.019.022.812	Aprobada
Director de Obra	Carlos García	79.883.138	Aprobada
Residente de Obra	Ricardo Jaime	19.144.052	Aprobada
Residente de Obra	María Isabel Garzón	52.890.684	Aprobada
Residente de Obra	Horacio Triviño Gutiérrez	79.144.042	Aprobada
Residente de Obra	Julián Peña	1.013.624.438	Aprobada
Profesional sst	Giovanna Ibáñez	2787257	Aprobada

4. CORRESPONDENCIA

Correspondencias enviadas hasta el momento,

RADICADO 32	**Entrega de informe social semanal**	**23-oct-21**	**Consorcio Construmarca**
RADICADO 33	Entrega de cinco (5) renuncias al subsidio de mejoramiento de vivienda	27-oct-21	Consorcio Construmarca
RADICADO 34	Respuesta al oficio 798-2021D2-056-2021 con asunto: contrato de obra 795 de 2021- certificados de calidad de materiales e insumos	28-oct-21	Consorcio Construmarca

5. CONCLUSION

Durante todo el proceso de validaciones se logró identificar 275 viviendas las cuales fueron validadas a satisfacción y 44 aperturas, donde los técnicos pudieron medir correctamente las áreas intervenidas e identificar cada una de las actividades, saber la cantidad de materiales de las viviendas, la parte sst logro entregar los tapabocas en cada validación por vivienda y pudo llenar todos los formatos requeridos por la entidad y los sociales llegaron a conocer la necesidad de cada una de estas viviendas y de sus habitantes alimentando la matriz de caracterización social. Por otro lado, en esta semana se logro que el material llegara para dar como inicio de la obra el martes de la siguiente semana.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se relacionaron actividades relevantes realizadas en los bloques en este periodo.













Se anexan las fotos del respectivo material que serán utilizados en la fase dos de ejecución de las viviendas.



COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL SOCIAL No 10

Fecha:	**Periodo**: DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2021		**Informe: 10**
29 DE OCTUBRE DE 2021	**Proyecto**: CONTRATO 795 DE 2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT			**Contrato No.:** 795 DE 2021

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	795 DE 2021
OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORÍA	CM CONSTRUMARCA

1. **RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:**

GRUPO 2

ACTIVIDADES GENERALES: Se realizó entrega del informe mensual N° 2, se ajustaron las matrices según las observaciones requeridas, se asistió a comité integral, se radicaron las renuncias que han surgido a la fecha.

1.1 SOCIALIZACIONES
No se realizó ninguna socialización en los territorios.

1.2 CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Se realizaron 08 caracterizaciones, se realiza la entrega de folleto informativo de ejecución de obra y se socializa punto por punto lo que se espera de los beneficiarios o encargados cuando se dé la ejecución de obras.

VALIDACIONES						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	MV_42764-IDU	CARRERA 27F 71D 34 SUR	El Mirador	FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO	29/10/2021	La vivienda presenta amplias grietas en las paredes, parte técnica refiere al beneficiario que estas se deben al asentamiento de la vivienda, beneficiario queda enterado de esta situación
2	MVCB_2547	KR 18K 70B 16 SUR	LAS MANITAS	MARIA MERCEDES HUERTAS	29/10/2021	La beneficiaria indica que el área destinada para la cocina no cuenta

						con instalaciones hidrosanitarias pero que antes de iniciar obra ella las tendrá listas
3	MVCB_2474	KR 18L BIS B 69A 77 SUR	BARRIO LAS MANITAS	CONSUELO RAMIREZ	29/10/2021	La mayoría de los ingresos de la vivienda vienen de arriendo de ciertos pisos de la casa
4	MVCB_3118	CL 69B BIS SUR 18U 18	MARANDU	LUZ MYRIAM GÓMEZ ARDILA	26/1072021	
5	MVCB_2866	DG 69C SUR 18N 59	JUAN PABLO II	FABIO OLAYA CIFUENTES	26/1072021	
6	MVJA_0091	CL 61A SUR 18N 27	ALTOS DE JALISCO	JOSE ALEXANDER GOMEZ MORA	28/1072021	
7	MVCB_1833	CLL 70 K SUR 18 N 23	MIRADOR NUTIVARA	MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO	25-10-2021	
8	MV_04993	CLL 70 T SUR 27 C 23 MJ 1	EL PARAISO	ROSALBINA ZABALA MENDOZA	25-10-2021	

1.3 APERTURAS

Se realizaron 08 aperturas, se realizó entrega de kit de bioseguridad, se da la explicación de derechos y deberes a través de la carta de trato digno y se realiza la socialización del acta técnico-social en la cual se explican la gestión integral para combatir COVID-19 y los puntos a tener en cuenta durante la ejecución de obras anteriormente explicados durante la visita de validación a través del folleto informativo.

APERTURAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA INICIO DE OBRAS**	**OBSERVACIONES**
1	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	23/10/2021	
2	MVCB_1596	CL 70F SUR 18N 52	MIRADOR (NUTIVARA)	RUTH ORJUELA DE TAPIERO	23/10/2021	
3	MVCB_1727	KR 18Q 70J 08 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO	23/10/2021	Recibe visita de apertura y firma documentación la autorizada María Inés Ruge (conyugue)
4	MVCB_1569	KR 18R 70F 21 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO	25/10/2021	
5	MVCB_1368	CL 70J SUR 18L 35	NUEVA COLOMBIA	OTILIA PICO BARRERA	27/10/2021	
6	MVCB_1723	CL 70I SUR 18Q 09	MIRADOR (NUTIVARA)	CECILIA BARATO BETANCOURT	27/10/2021	

7	MVCB_1762	CL 70K SUR 18N 24	MIRADOR NUTIVARA	GILMA MARIA GODOY	25-10-2021	
8	MVCB_1833	CLL 70 K SUR 18 N 23	MIRADOR NUTIVARA	MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO	29-10-2021	

1.4 SEGUIMIENTOS RELEVANTES

MVCB- 1405: Se realizó vista para validación social y técnica la cual había sido programada con anterioridad con el beneficiario quien había manifestado que estaría presente para dicha actividad, pero al llegar a la vivienda no fue posible darle cumplimiento a esta debido a que no fuimos atendidos.

MV_ 330: Elías Niño Corredor. Se realizó visita de seguimiento de obra, dónde se evidencio el cumplimiento de los compromisos por parte del beneficiario, para la ejecución del mejoramiento de vivienda. La visita es atendida por la hermana del beneficiario.

MV_ 152: María Elvira Calderón Lancheros: Se realizó visita de seguimiento de obra en compañía de la interventoría áreas social y técnica, donde se evidencia avance de obra en el alistamiento de muro para enchape de cocina y estructura para el montaje del mesón del espacio cocina. Beneficiaria recibe la visita sin novedad.

MVCB_5100: MELANIA MANCILLA HERNANDEZ: Se realizaron dos visitas a la vivienda de la beneficiaria a fin de contar con la documentación solicitada para continuar con el proceso de mejoramiento, lo anterior dada la novedad de fallecimiento de la beneficiaria, en la visita realizada el día 29 de octubre uno de los hijos y la nuera atienden la visita manifestando que solo dos de los 4 hijos se encuentran dispuestos a firmar la autorización para continuar con el proceso, entregan copia de acta de defunción y dos registros civiles, acordando nuevo contacto para definir si esta documentación es suficiente o indicar nuevos requerimientos de acuerdo al caso.

1.5 ATENCIÓN PQR

PQR				
N.º	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**

1.6 ENTREGAS

Durante las presentes semanas se realizaron _0__

ENTREGAS DE OBRA					
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**

1.7 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se realiza atención a la comunidad en el PAC ubicado en el sector Nueva Colombia CARRERA 70 J SUR # 18 N - 26 NUEVA COLOMBIA – CIUDAD BOLÍVAR; Los días:

Martes: 8:30 am a 12:00 pm
Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm
Sábados: 8:30 a 12:00 pm

Donde se atendieron a _0___

1.8 HISTORIAS DE VIDA

HISTORIAS DE VIDA				
N.º	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1				

1.9 RENUNCIAS

Se llevaron a cabo 02 renuncias durante la semana.

RENUNCIAS					
N.º	***ID_DMV***	***DIRECCIÓN***	***DESARROLLO***	***NOMBRE BENEFICIARIO***	***OBSERVACIONES Y FECHA***
1	MVCB_2160	KR 18V 68C 83 SUR	MARANDU	EDILBERTO RIVERA SANCHEZ	
2	MVCB_2931	TV 18N 69A 91 SUR	JUAN PABLO II	GLORIA INES VILLAMIL CAÑON	

1.10 ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

1.11 CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	6
Caracterizaciones	269
Aperturas	38
Cierres PQR	0
Entregas	0
Historias de vida	3
Renuncias	10

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL SOCIAL No 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
MVCB_5410 ***KR 19D BIS 70C 10 SUR*** ***VILLAS EL DIAMANTE*** ***ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ*** ***23/10/2021 - APERTURA***	***MVCB_1596*** ***CL 70F SUR 18N 52*** ***MIRADOR (NUTIVARA)*** ***RUTH ORJUELA DE TAPIERO*** ***23/10/2021 - APERTURA***
	
MVCB_1727 ***KR 18Q 70J 08 SUR*** ***MIRADOR (NUTIVARA)*** ***ENRIQUE SABINO LEON BARRETO*** ***23/10/2021 - APERTURA***	***MVCB_1569*** ***KR 18R 70F 21 SUR*** ***MIRADOR (NUTIVARA)*** ***RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO*** ***25/10/2021 - APERTURA***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL SOCIAL No 10

	
MVCB_1368 ***CL 70J SUR 18L 35*** ***NUEVA COLOMBIA*** ***OTILIA PICO BARRERA*** ***27/10/2021 - APERTURA***	***MVCB_1723*** ***CL 70I SUR 18Q 09*** ***MIRADOR (NUTIVARA)*** ***CECILIA BARATO BETANCOURT*** ***27/10/2021 - APERTURA***
	
MV_42764-IDU ***CARRERA 27F 71D 34 SUR*** ***El Mirador*** ***FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO*** ***29/10/2021 – VALIDACIÓN***	***MVCB_2547*** ***KR 18K 70B 16 SUR*** ***LAS MANITAS*** ***MARIA MERCEDES HUERTAS*** ***29/10/2021 – VALIDACIÓN***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL SOCIAL No 10

	
MVCB_2474 ***KR 18L BIS B 69A 77 SUR*** ***BARRIO LAS MANITAS*** ***CONSUELO RAMIREZ*** ***29/10/2021 – VALIDACIÓN***	***Actividad: SEGUIMIENTO DE OBRA*** ***MVC_152*** ***Fecha:29/10/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTRIZACION SOCIAL ***MVCB: 3118*** ***Fecha: 26 /10/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTRIZACION SOCIAL*** ***MVCB: 2866*** ***Fecha: 26 /10/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL SOCIAL No 10

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTRIZACION SOCIAL MVJA:0091 ***Fecha: 28 /10/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTRIZACION SOCIAL/ FALLIDA*** ***MVJA: 1405*** ***Fecha: 28 /10/2021***
	
Actividad: RENUNCIA ***MVCB: 2931*** ***Fecha: 26 /10/2021***	***Actividad: RENUNCIA*** ***MVCB: 2160*** ***Fecha: 26 /10/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL SOCIAL No 10



Actividad: SEGUIMIENTO
MV: 330
Fecha:29/10/2021



Actividad: SEGUIMIETO DE OBRA
MV:152
Fecha:29/10/2021



MVCB_1762
CL 70K SUR 18N 24
MIRADOR NUTIVARA
GILMA MARIA GODOY
VISITA DE APERTURA



MVCB_1833
CLL 70 K SUR 18 N 23
MIRADOR NUTIVARA
MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO
VISITA DE VALIDACIÓN

	INFORME DE BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
	CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	795 DE 2021
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021
CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.
PLAZO	5 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	4 DE FEBRERO DE 2022

La empresa ***AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S,*** presenta la gestión desarrollada del proyecto en materia de bioseguridad y protocolo, se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades desarrolladas durante el período del 23 de octubre al 29 de octubre de 2021.

1. ACTIVIDADES DE PROTOCOLO EN LA FASE DE VALIDACIÓN.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
Descripción de las Actividades Ejecutadas, Relacionadas con Seguridad Y Bioseguridad	
Cumplimiento del protocolo	Se realizan observaciones al personal operativo respecto a los parametros establecidos en el protocolo de Bioseguridad, para ser aplicados en campo: 1. Areas de desinfección 2. Ingreso del personal al area de trabajo 3. Entrega de tapabocas 4. Registro fotografico 5. Acompañamiento permanente de los auxiliares SST en el proyecto 6. Se realiza control y seguimiento en las condiciones de salud de los beneficarios
Acompañamiento y seguimiento	El area SST realizó seguimientos aleatorios para verificar el cumplimiento en la implementacion del protocolo de Bioseguridad, realizando control de que se entreguen los tapabocas a los beneficiarios y de que se llene su formato de vacunación.

- ✓ En esta semana del 23 al 29 de octubre se realizaron 8 validaciones, por ende, se hizo entrega de 16 tapabocas. (Ver anexo 1).
- ✓ (Se Anexará en un PDF un scanner con los formatos de entrega de tapabocas, estará adjunto por fuera del informe).

- ✓ Se hizo el registro de vacunación también para estos MV validados. (Se Anexará en un PDF un scanner con los registros, el cual estará adjunto por fuera del informe).

A. ACTIVIDADES DE PROTOCOLO EN APERTURAS.

- ✓ Se exigió el uso del tapabocas tanto para los beneficiarios como para todo el personal de Ambientalmente y de Construmarca.
- ✓ Se implementó una señalética de protocolo en cada MV. (Ver anexo 2).
- ✓ Esos mismos días se hizo entrega a cada MV, de un kit de bioseguridad (el cual está descrito en el APU que ya fue oficiado a interventoría). (Ver evidencia en Anexo 3). **OBSERVACIÓN:** Se enviará un scanner con los formatos de entrega de kit, adjunto por fuera del documento.

2. DATOS DE BIOSEGURIDAD.

Generación de Residuos			
Tipo de Residuo	**observaciones**	**Tipo de Residuo**	**observaciones**
ORDINARIOS	recogidos	**Elementos de bioseguridad**	**entregados**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Se hace la entrega del registro fotográfico, la información mencionada en este numeral, respecto a las actividades de bioseguridad.

-REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE TAPABOCAS. (Ver Anexo 1).

-REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADA EN LAS APERTURAS POR MV. (Ver Anexo 2).

-REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN LOS OCHO (8) MV APERTURADOS. (Ver Anexo 3).

4. FASE DEL PROYECTO:

Se inició el día 14/10/2021 la fase de APERTURA.
La apertura se inició en el frente de trabajo LOMAS, se aperturaron 6 mv, seguido se aperturaron 30 mv el día 21 oct y 22 oct en ciudad bolívar, el día 23 oct se aperturaron 3 mv, el día 25 oct se aperturaron 2 mv, el día 27 oct se aperturaron 2 y el día 29 oct se aperturó 1 mv.

- ✓ En total tenemos un registro de 44 aperturas.
- ✓ Para el período del 23 de octubre al 29 de octubre se registran 8 aperturas.

5. CHARLAS Y NOTIFICACIONES DE RIESGOS:

Durante el período del 23 de octubre al 29 de octubre, se realizó una charla con los residentes técnicos y sociales, en la cual se trataron los temas:

- ➢ **IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA SEÑALÉTICA PARA LOS MV A APERTURAR.**
- ➢ **SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS.**

(VER ANEXO 4.)

6. ANEXOS

- ➢ ANEXO 1: Entrega de tapabocas.
- ➢ ANEXO 2: Señalética por MV.
- ➢ ANEXO 3: Entrega de kit de bioseguridad.
- ➢ ANEXO 4: Charla con el personal de ambientalmente.


ANEXO 1. ENTREGA DE TAPABOCAS EN VALIDACIÓN.	
Img 1. Entrega TP MVCB_ 1833	**Img 2. Entrega TP MV_ 04993**
	

	INFORME DE BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
	CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	

Img 3. Entrega TP MVCB_3118



Img 4. Entrega TP MVCB_2866

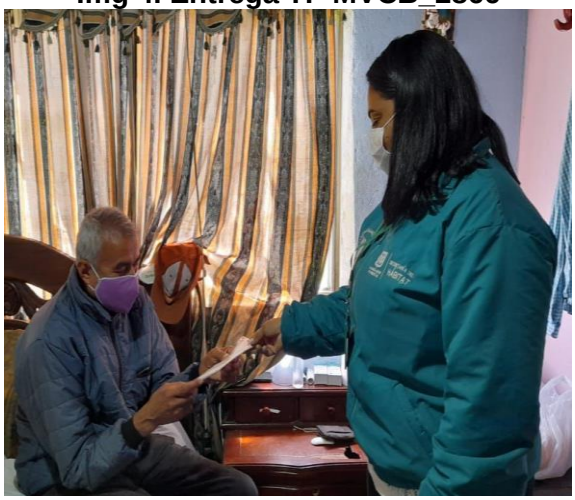

Img 5. Entrega TP MVJA_0091



Img 6. Entrega TP MVCB_2474



Img 7. Entrega TP MVCB_2547



Img 8. Entrega TP 42764 IDU




	INFORME DE BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
	CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	

ANEXO 2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN APERTURA

Img 1. Señalética MVCB_5410



Img 2. Señalética MVCB_1596

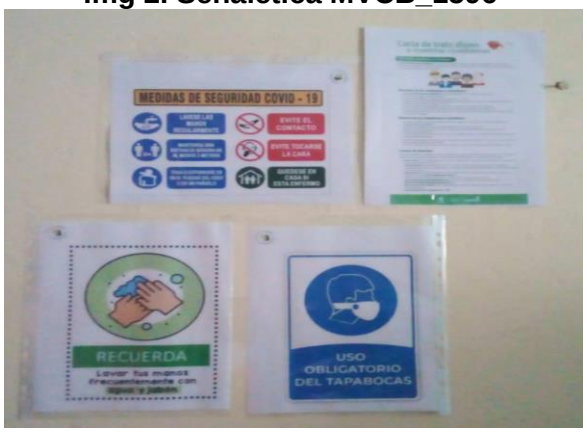


Img 3. Señalética MVCB_1727




Img 4. Señalética MVCB_1569



Img 5. Señalética MVCB_1762

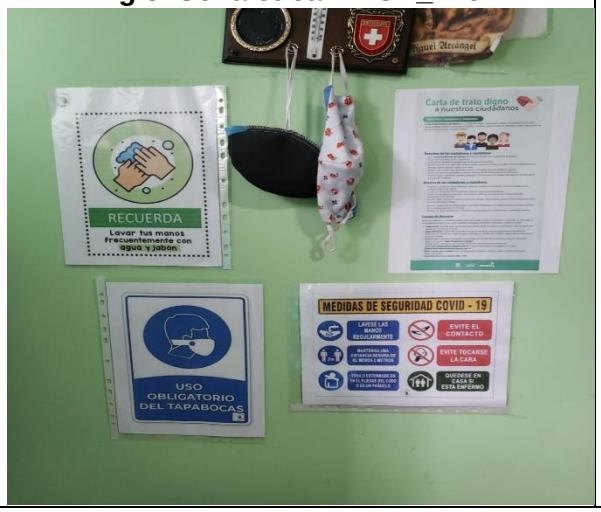

Img 6. Señalética MVCB_1368

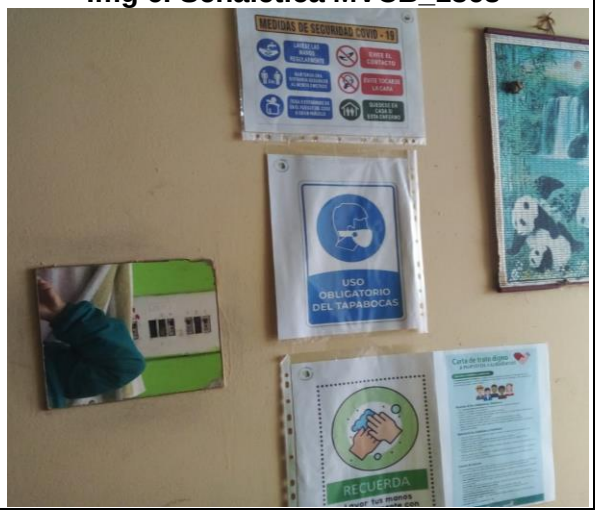

Img 7. Señaletica MVCB_1723	**Img 8. Señaletica MVCB_1833**
	

ANEXO 3. BENEFICIARIOS CON SUS RESPECTIVOS KITS

Img 1. MVCB_5410	**Img 2. MVCB_1596**
	
Img 3. MVCB_1727	**Img 4. MVCB_1569**
	

	INFORME DE BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
	CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	

Img 5. MVCB_1762 	**Img 6. MVCB_1368** 
Img 7. MVCB_1723 	**Img 8. MVCB_1833** 

	INFORME DE BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**	
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	

ANEXO 4. CHARLA PARA EL PERSONAL AMBIENTALMENTE.

REGISTRO ASISTENCIA A CHARLA

AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA

FOR-HSE-021 | Emision: 22/06/2021 | Versión: 01 | Páginas: 1 de 1

Tema: Implementación nueva señalética.

Capacitador: Silvia Gómez Fecha: 28-10-2021

Duración: 30 min

Proyecto: 795 Firma:

NOMBRES	APELLIDOS	DOC. DE IDENTIDAD	FIRMA
Yesenia Gomez Salas	Gomez Salas	1120.745.785	
Oscar Mateo	Hoyos Gaviria	80226086	
Pablo Alexander	Ospina Chitiva	1030603671	
RICARDO JAIMES RUIZ	JAIMES RUIZ	19[illegible].052	
JOHNNY	RODRIGUEZ ACALA	52458805	
Horacio Triviño G.	Triviño G.	79144042	
Maria Isabel Garzón	Garzón Forero	52.890.684	

SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL



Img 1. Inquietudes del P.E. A



Img 2. Inquietudes del P.E.A



Img 3. Socialización señalética.



Img 4. Explicación al personal.

	INFORME DE BIOSEGURIDAD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
	CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	



Img 5. Indicación sobre posición de señalética.



Img 6. Conclusión de la charla.

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	795 DE 2021
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021
CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.
PLAZO	5 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	4 DE FEBRERO DE 2022

La empresa ***AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S,*** presenta la gestión desarrollada del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades desarrolladas durante el período del 23 de octubre al 29 de octubre de 2021.

1. PERSONAL

De acuerdo a las novedades de ingreso de personal al proyecto se hace seguimiento al pago de parafiscales del último mes, se establecen la verificación en el numeral de pagos.

Se informa que hubo una renuncia, renunció la coordinadora SST.

- **1** Guiovanna Andrea Ibáñez – Coordinadora SST retirada.

POSDATA: Aún no se ha hecho nueva contratación y en el Anexo 1 se encuentra el paz y salvo de la señora Guiovanna.

	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
	CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**
	FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS	

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERÍODO:

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE	AGST-SEP
DIANA LOAIZA	
HORACIO TRIVIÑO	
MARIA GARZON	
RICARDO JAIMES	
PABLO ORJUELA	
YESENIA GAMEZ	
JULIAN PEÑA	
LINA COLORADO	

SS No Presentada
SS al Día
SS Incompleta

Observación: Estas planillas las podemos encontrar en el anexo 2.

A. DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE OBRA AFILIADO:

Se envió a interventoría un correo con la documentación de afiliación de la mano de obra, los cuales ya iniciaron la etapa de apertura de mv.

B.CHARLAS Y NOTIFICACIONES DE RIESGOS:

Durante el período del 23 de octubre al 29 de octubre, se realizó una charla con los residentes técnicos y sociales, en la cuál se trataron los temas:

-IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA SEÑALÉTICA PARA LOS MV A APERTURAR.
-SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS.

(Ver anexo 3).

2. ESTADÍSTICAS SST.

No de Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	Total Horas Hombre Trabajadas	Cuadrillas o Frentes de Trabajo	Auxiliares SST
10	**8**	**560**	3	1

Accidente / Incidente	Ambiental	Tiempo Perdido (horas)	Daños en Equipos	Tiempo Perdido (horas)	Tiempo Perdido (horas)	TOTAL TIEMPO PERDIDO
Incidente	0	0	0	0	0	0
Accidente	0	0	0	0	0	0

No se reporta ningún accidente/ incidente, ni para el contratista ni para interventoría durante este período.

3. FASE DEL PROYECTO.

Se inició el día 14/10/2021 la fase de APERTURA.
La apertura se inició en el frente de trabajo LOMAS, se aperturaron 6 mv, seguido se aperturaron 30 mv el día 21 oct y 22 oct en ciudad bolívar, el día 23 oct se aperturaron 3 mv, el día 25 oct se aperturaron 2 mv, el día 27 oct se aperturaron 2 y el día 29 oct se aperturó 1 mv. La documentación del personal de obra ya fue enviada a interventoría.

- ✓ En total tenemos un registro de 44 aperturas.
- ✓ Para el período del 23 de octubre al 29 de octubre se registran 8 aperturas.

4. ANEXOS.

- ANEXO 3: Charla con el personal sobre implementación de nueva señalética y socialización del procedimiento en alturas.
- ANEXO 2: Paz y salvo de la coordinadora SST.
- ANEXO 1: Planillas de pago canceladas del personal contractual.

	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEMANAL **INFORME N° 10**	
CONTRATO 795 DE 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **29 DE OCTUBRE DE 2021**	
FRENTE DE TRABAJO: MANITAS, JALISCO Y LOMAS		

ANEXO 1.

Imagen 1. Planilla Pagada Pablo Orjuela.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-09-27, 07:34:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	PABLO ALEXANDER ORJUELA CHITIVA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1030647671
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040580151
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1143544373
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	$ 259.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 145.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 113.600	$ 0
		SubTotales:		$ 259.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 259.000

Imagen 2. Planilla Pagada Yesenia Gámez.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1120745285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESENIA VIVIANA GAMEZ SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 28B 75 53 AP 102	TELÉFONO:	3031202
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4410299691**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997113616		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										**$ 145.400**	**$ 0**	**$ 145.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													**$ 113.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RESIDENTE EXTERIOR	TRIBUTA TARIFA	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	CÓD. COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	CÓD. COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	CÓD. COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CÓD.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1120745285	GAMEZ SALAS YESENIA VIVIANA	NODEFINIDO		$ 908.526				NO	SI															231001-COLFONDOS	40	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	40	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600																										

TOTAL	**$ 259.000**

Imagen 3. Planilla pagada Ricardo Jaimes.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-19144052 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2021-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	113.600	0	113.600
Periodo salud:	2021-09	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	21332023 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2021-09-06	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	1120472729	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 113.600

PAGADO

Imagen 4. Certificado de pensionado Horacio Triviño.



compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) HORACIO ADOLFO TRIVIÑO GUTIERREZ identificado(a) con cedula ciudadanía 79.144.042, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar por la Empresa FONDO DE PENSIONES PORVENIR NIT 800224808, en calidad de Pensionado según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20210501	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 13 días del mes de Octubre de 2.021

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO CER-AFI
17025943

Imagen 5. Planilla pagada Julián Peña- Dualidad.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901361043-3	DUALIDAD CONSTRUCTORES SAS		TV 94 22I 20 OF 203	7548633	[redacted]	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					25	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2021-09	2021-08	E	10/09/2021	53261474	$4.558.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	147.911	0		0		0	0	0	0	147.911	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.480	0		0		0	0	0	0	8.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	360.286	0		0		0	0	0	0	360.286	16
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	291.306	0	0	0	0	0	0		291.306	7
230301	Porvenir	800224808-8	180.000	0	0	0	0	0	0		664.500	14
231001	Colfondos	800227940-4	22.000	0	0	0	0	0	0		38.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	78.000	0	0	0	0	0	0		82.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	526.100				526.100	0	0	1.023.900			0	1.023.900	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	589.500	0	0	589.500	25

PAGADA

Imagen 6. Planilla pagada Lina Colorado.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019022812		COLORADO CASTRO LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 77 69 A 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1154023844	9424369535	I	2021/10/05	2021/10/05	BANCO DE BOGOTA	0	$271,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$617,052	$12,400			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$617,052	$12,400			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$617,052	$12,400			$0	$0		$0	$0
1	CC 1019022812	COLORADO LINA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF24	30	$617,052	$12,400		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$617,052	$12,400			$0	$0		$0	$0

Imagen 7. Planilla Pagada Diana Loaiza.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52731408	DIANA MARCELA LOAIZA CANTOR	Carrera 22F # 105-62	2454442	diloaiza@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-09	2021-09	I	06/10/2021	53180609	$259.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES


Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400

PAGADA

Imagen 8. Planilla Pagada María Garzón

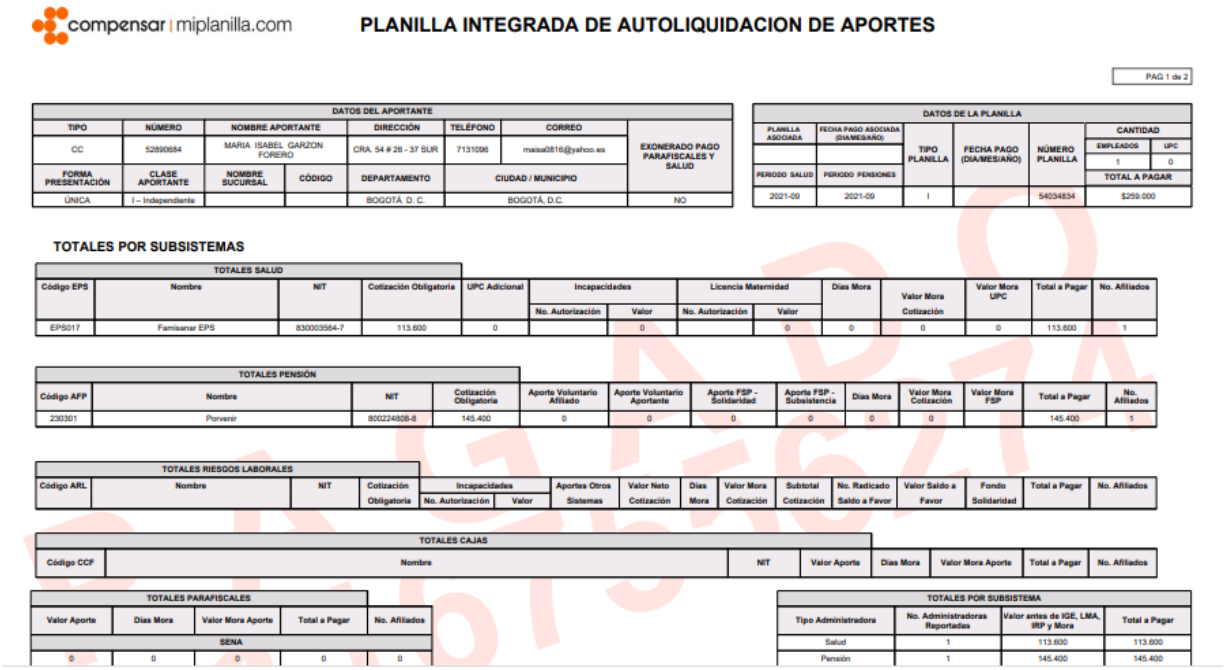

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52890684	MARIA ISABEL GARZON FORERO		CRA. 54 # 28 - 37 SUR	7131096	maisa0816@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2021-09	2021-09	I		54034834	$259.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados


TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400

ANEXO 2.
Imagen 1. Paz y Salvo señora Guiovanna Ibañez.

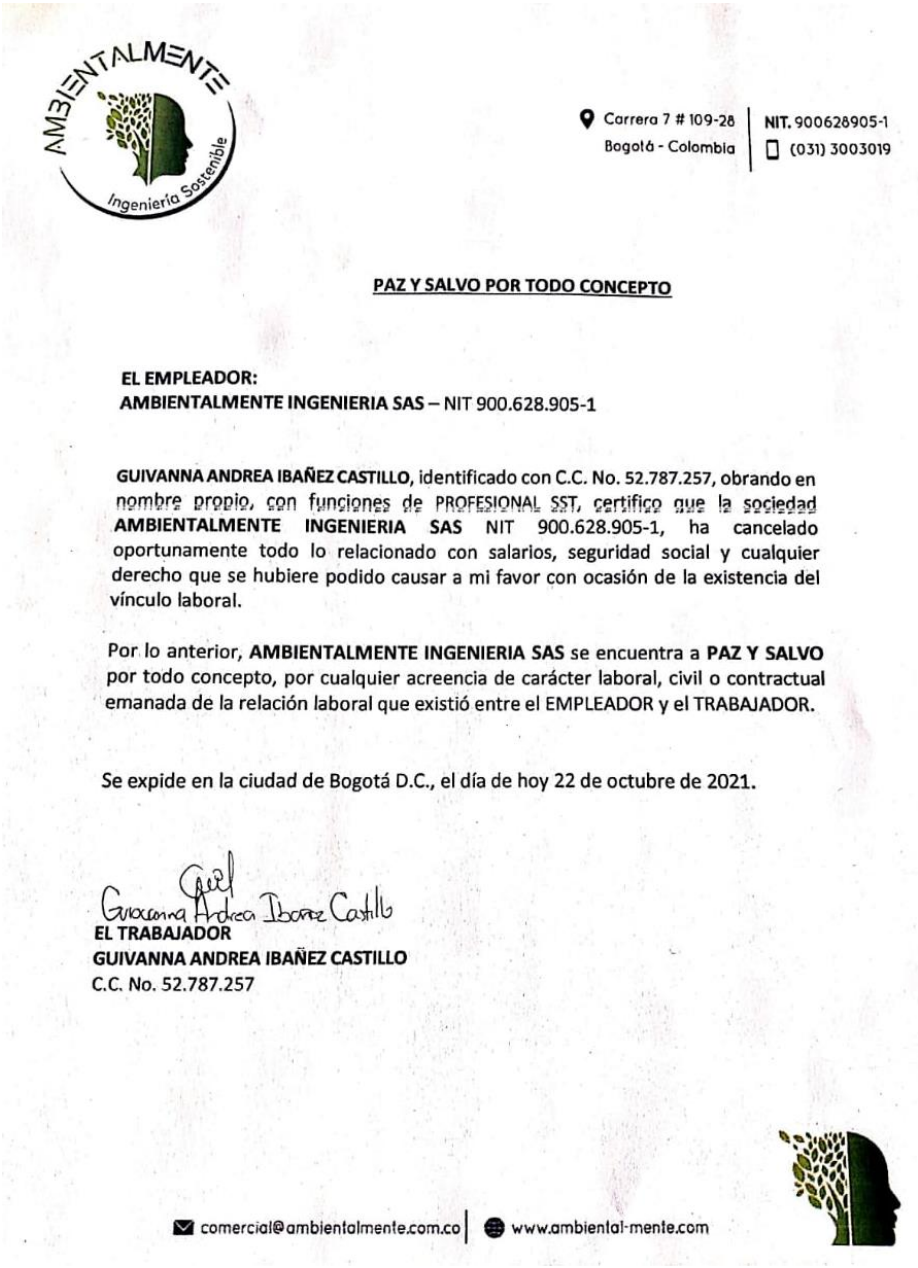

Carrera 7 # 109-28
Bogotá - Colombia
NIT. 900628905-1
(031) 3003019

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

EL EMPLEADOR:
AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS – NIT 900.628.905-1

GUIVANNA ANDREA IBAÑEZ CASTILLO, identificado con C.C. No. 52.787.257, obrando en nombre propio, con funciones de PROFESIONAL SST, certifico que la sociedad **AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS** NIT 900.628.905-1, ha cancelado oportunamente todo lo relacionado con salarios, seguridad social y cualquier derecho que se hubiere podido causar a mi favor con ocasión de la existencia del vínculo laboral.

Por lo anterior, **AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, por cualquier acreencia de carácter laboral, civil o contractual emanada de la relación laboral que existió entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día de hoy 22 de octubre de 2021.

Guiovanna Andrea Ibañez Castillo

EL TRABAJADOR
GUIVANNA ANDREA IBAÑEZ CASTILLO
C.C. No. 52.787.257

comercial@ambientalmente.com.co | www.ambiental-mente.com

ANEXO 3. CHARLA PARA EL PERSONAL AMBIENTALMENTE.

REGISTRO ASISTENCIA A CHARLA

AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLA		
	FOR-HSE-021	Emision: 22/06/2021 Versión: 01	Páginas: 1 de 1

Tema: Implementación nueva señalética.

Capacitador: Silvia Gómez Fecha: 28-10-2021

Duración: 30 min

Proyecto: 795 Firma:

NOMBRES	APELIDOS	DOC. DE IDENTIDAD	FIRMA
Yesenia Gomez Salas	Gomez Salas	1120.745.785	
Oscar Mateo	Hoyos Gaviria	80226086	
Pablo Alexander	Ospina Chitiva	1030603671	
RICARDO JAIMES RUIZ	JAIMES RUIZ	19[illegible].052	
JOHNNY	RODRIGUEZ ACALA	52458805	
Horacio Triviño G.	Triviño G.	79144042	
Maria Isabel Garzón	Garzón Forero	52.890.684	

SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL



Img 1. Inquietudes del P.E. A



Img 2. Inquietudes del P.E.A



Img 3. Socialización señalética.



Img 4. Explicación al personal.



Img 5. Indicación sobre posición de señalética.



Img 6. Conclusión de la charla.
