enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**FMI019**
		VERSIÓN:	**06**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-04-30**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	3 de junio de 2020	Y EL	2 de junio de 2020
OBJETO	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN				
LOCALIZACIÓN	<Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**	
CONTRATO No.:	<Escriba el número de contrato>	CONTRATO No.:	2020516
CONTRATISTA:	<Nombre o razón social del Interventor>	CONTRATISTA:	JPS INGENIERÌA SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAZO INICIAL:		PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:		FECHA DE INICIACIÓN:	3 de junio de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
*FECHA DE REINICIACIÓN:		*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	NA
VALOR INICIAL :		VALOR INICIAL :	$ 1.733.666.231,88
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	NA
VALOR ACTUALIZADO:		VALOR ACTUALIZADO:	NA
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>	VALOR PAGADO:	NA
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	1.733.666.231,88

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
				POLIZA DE CUMPLIMIENTO	6/05/2020	6/09/2021	$ 346.733.247,00
				POLIZA PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES, ETC.	6/05/2020	6/01/2024	$ 86.683.312,00
				POLIZA CALIDAD DEL SERVICIO	6/05/2020	11/08/2023	$ 520.099.870,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
			A LA FECHA NO SE HAN TRAMITADO PAGOS		

4. CURVA "S"

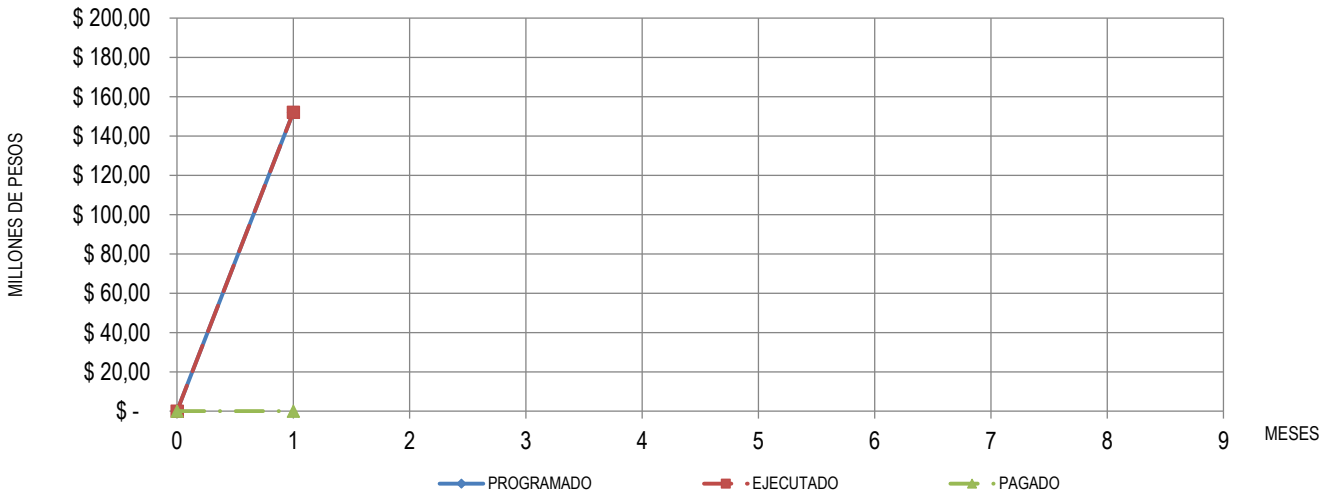

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de ENTerritorio.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DIRECTOR INTERVENTORÍA
