enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**FMI019**
		VERSIÓN:	**06**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-04-30**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	13	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	18 de junio de 2021	Y EL	17 de julio de 2021
OBJETO	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 DEL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - LOS MANGOS – ARIZONA (PUTUMAYO) Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN				
LOCALIZACIÓN	PUTUMAYO				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**	
CONTRATO No.:	<Escriba el número de contrato>	CONTRATO No.:	2020516
CONTRATISTA:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de junio de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
*FECHA DE REINICIACIÓN:		*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE JULIO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de julio de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	TRECE (13) MESES Y 14 DIAS	PLAZO ACTUALIZADO:	Trece (13) MESES y 14 dias
VALOR INICIAL :	566.295.091,53	VALOR INICIAL :	1.733.666.231,85
VALOR ADICION(ES):	NA	VALOR ADICION(ES):	NA
VALOR ACTUALIZADO:	NA	VALOR ACTUALIZADO:	1.722.666.231,85
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>	VALOR PAGADO:	1.330.660.546,31
VALOR POR PAGAR:	566.295.091,53	VALOR POR PAGAR:	392.005.685,54

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
				POLIZA DE CUMPLIMIENTO	3/06/2020	17/01/2022	$ 346.733.247,00
				POLIZA PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES, ETC.	3/06/2020	17/05/2024	$ 86.683.312,00
				POLIZA CALIDAD DEL SERVICIO	3/06/2020	3/07/2023	$ 520.099.870,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS**		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
			Acta 1 pago 25% subproductos A01 y A02	21/09/2020	$ 132.154.482,54
			Acta 2 pago 35% subproductos B01 y B02	21/09/2020	$ 185.016.275,55
			Acta 3 pago 30% subproductos B03 y B04	29/10/2020	$ 105.723.586,03
			Acta 4 pago 10% subproducto C	29/10/2020	$ 52.861.793,01
			Acta 5 pago 2.5% subproducto D.01	17/11/2020	$ 17.378.122,27
			Acta 6 pago parcial 52% ensayos	18/12/2020	$ 170.695.108,92
			Acta 7 pago parcial 52% ensayos	22/12/2020	$ 50.767.382,49
			Acta 8 pago parcial 15% ensayos	26/02/2021	$ 50.652.172,69
			Acta 9 pago 7,5% producto D05	3/03/2021	$ 52.134.366,79
			Acta 10 pago 5% producto D06	16/03/2021	$ 34.756.244,52
			Acta 11 pago 20% producto D02	16/03/2021	$ 139.024.978,09
			Acta 12 pago 2,5% producto D03	16/03/2021	$ 17.378.122,27
			Acta 13 pago 10% producto D04	16/03/2021	$ 69.512.489,06
			Acta 14 pago 5% producto D11	16/03/2021	$ 34.756.244,52
			Acta 15 pago 5% producto D07	17/03/2021	$ 34.756.244,52
			Acta 16 pago parcial 7% ensayos	29/04/2021	$ 23.366.077,21
			Acta 17 pago pacial 39% gestion predial	30/04/2021	$ 38.080.000,00
			Acta 18 pago 5% producto D08	29/04/2021	$ 34.756.244,52
			Acta 19 pago parcial 33,7% gestion predial	1/06/2021	$ 86.890.611,31

4. CURVA "S"

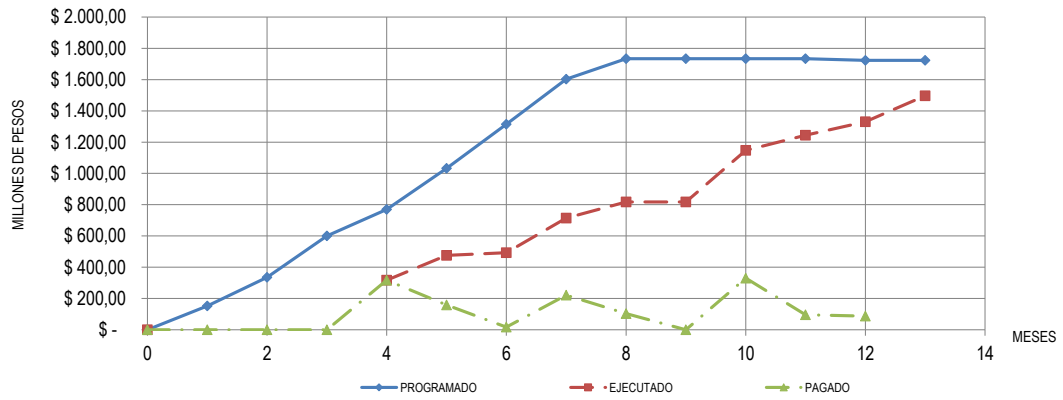

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de ENTerritorio.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DIRECTOR INTERVENTORIA
PABLO SEGURA
