EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO No. SGR 2020517

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ).

INFORME MENSUAL 7
ENTRE DICIEMBRE 3 DE 2020 Y ENERO 2 DE 2021

JPS Ingeniería S.A.
Consultoría-Interventoría-Obras Civiles

VERSIÓN 0

BOGOTÁ, D.C., ENERO DE 2021

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO No. SGR 2019967

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ)

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
0	ENERO DE 2021	Documento original

BOGOTÁ, D.C., ENERO DE 2021

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. GENERALIDADES 9
2.1 OBJETIVO GENERAL. 9
2.2 ALCANCE. 9
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO. 10
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 10
3.2 OBJETO DE CONTRATO. 12
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA. 17
4.1. ACTIVIDADES EN CAMPO 17
4.2. APROBACIÓN DE PRODUCTOS A1-A2, B1-B2 17
4.3. ENTREGABLES A1-A2 Y B1-B2 17
4.4. PRODUCTOS B3, B Y C 18
4.5. ENTREGA DE PRODUCTOS EN ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN 19
4.5.1. D .01 ESTUDIO DE TRÁNSITO 19
4.5.2. D.02 A -LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD VIAL Y ESTUDIOS DE SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO. 19
4.5.3. D.03 DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO, DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTUDIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES Y PROYECTADAS. 21
4.5.4. D.04 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA DE DETALLE, ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, PONTONES, VIADUCTOS, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. 22
4.5.5. D.05 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN. 23
4.5.6. D.06 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO. 23
4.5.7. D.07 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y, DISEÑOS ESTRUCTURALES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS HIDRÁULICAS. 23
4.5.8. D.08 GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO, COMPONENTE SOCIAL, PAGA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 24
4.5.9. D.09 CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL CUAL SE INCLUYAN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 25

4.5.10. D.10 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y DOCUMENTOS, PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO. 26
4.5.11. D.11 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 1523 DE 2012, DE ACUERDO CON LA ESCALA DE DISEÑO DEL PROYECTO. 26
4.5.12. E.01 PLAN DE OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 26
4.5.13. F.01 INFORME DE FACTIBILIDAD. 26
4.5.14. G.01 PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO ESTRUCTURADO. 27
4.5.15. H.01 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE LOS OCAD. 27
4.5.16. H.02 DOCUMENTOS MODELOS REQUERIDOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL. 27
5. INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA 27
6. CONTROL DE PERSONAL 27
7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 27
8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 28
9. FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 28


LISTADO DE TABLAS

Cuadro 2.1 Objeto del Contrato 12
Tabla 3.1 Información Contractual. Fuente: Contrato N° 2020517. 13
Tabla 3.1 Personal mínimo requerido. 15

1. INTRODUCCIÓN.

El corredor Vía Central Líbano - La Unión Peneya (Caquetá), es una vía terciaria de gran importancia para los municipios de La Montañita y El Paujil ya que comunica los habitantes del centro poblado La Unión Peneya y a 13 veredas de ambos municipios con las cabeceras Municipales de La Montañita y El Paujil. La vía además contribuye con la red de conexión a la capital del departamento de Caquetá y favorece el acceso a la actividad agropecuaria y de abastecimiento de la canasta familiar. Sin embargo, las deficiencias de mantenimiento periódico, tanto de la superficie de rodadura como de las obras de drenaje sumado a la alta pluviosidad de la zona, han provocado el deterioro de varios tramos que ya se encuentran en mal estado y con drenajes inoperantes., en la siguiente ilustración se muestra su localización:

Ilustración 1 Localización de los municipios de El Paujil y La Montañita en el departamento de Caquetá en Colombia

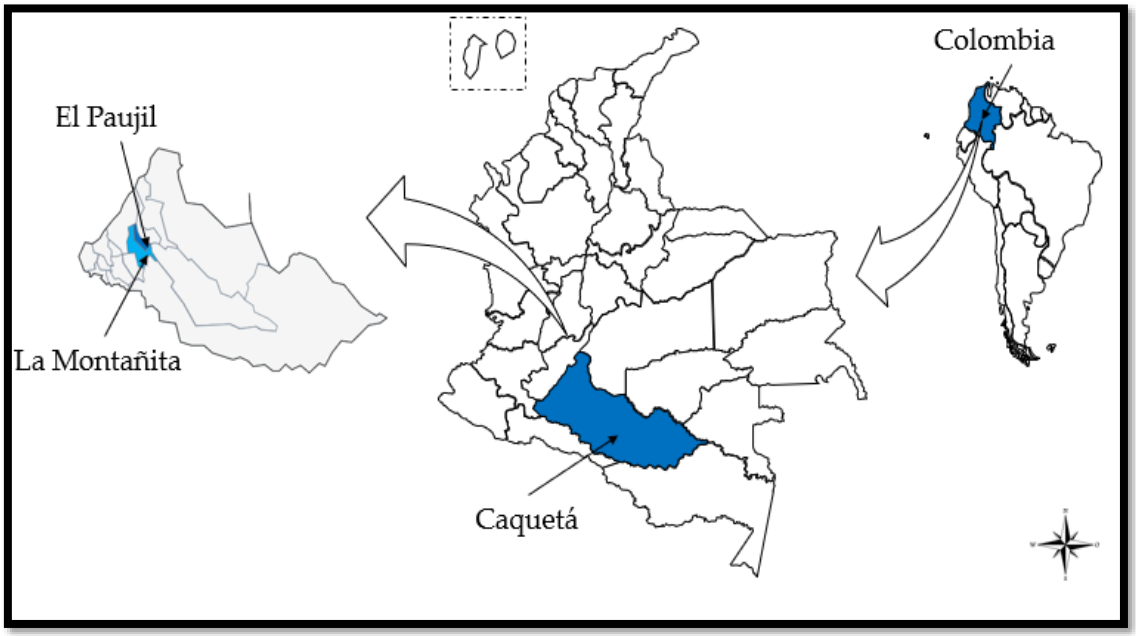

Fuente: Mapa político en vectores de Colombia – Departamentos Y Municipios MOE"

Ilustración 2. Vía Central Líbano - La Unión Peneya (Caquetá)



Fuente: Elaboración propia

El corredor vial limita al norte con el límite geográfico del municipio de El Paujil – Caquetá y al sur con el límite geográfico del municipio de La Montañita. El municipio de El Paujil se encuentra ubicado al occidente del Caquetá y al nororiente en relación con Florencia. Limita al norte con el departamento del Huila y con el municipio de El Doncello, al sur con los municipios de La Montañita y Cartagena del Chairá, al oriente con el municipio de El Doncello, y al occidente con el municipio de La Montañita. Su cabecera está a 50 kilómetros de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá. El municipio posee una extensión de 1.338 kilómetros cuadrados. Por otro lado, el municipio de La Montañita limita al norte con los municipios de Florencia y El Paujil; por el oriente con los municipios del Paujil y Cartagena del Chaira, por el occidente con los municipios de Milán y Florencia y por el sur con el municipio de Solano. El municipio posee una extensión de 1484 kilómetros cuadrados[1].

[1] INFORME 2: PERFIL INICIATIVA 618410304245 "Pavimentar en asfalto caliente, tres tramos de vías terciarias del Municipio de la Montañita Caquetá-ENTerritorio"

La Vía Central Líbano - La Unión Peneya, la cual comunica el caserío de La Unión Peneya, las veredas El Treinta Bajo, La Argelia, El Treinta, Balcones, El Jordán, Palma Azul, Galicia, La Palma Arriba, La Tigrera, El Vergel, Agua Blanca, La Florida y Corea con la vía Principal entre los Municipios de El Paujil y La Montañita, el deterioro de la vía ocasiona que los desplazamientos se desarrollen en una mayor cantidad de tiempo y el transporte de vehículos tipo campero se restrinja, lo cual incrementa considerablemente su precio y limita la capacidad de personas por vehículo.

Esta vía terciaria es de gran importancia para los municipios de La Montañita y El Paujil ya que comunica los habitantes del centro poblado La Unión Peneya y a 13 veredas de ambos municipios con las cabeceras Municipales de La Montañita y El Paujil, y para desplazarse a la capital del departamento y acceder además a los servicios básicos como salud, educación, y todas las actividades comerciales inherentes a la actividad agropecuaria y de abastecimiento de la canasta familiar, sin embargo las deficiencias de mantenimiento periódico tanto de la superficie de rodadura cómo de las obras de drenaje sumado a la alta pluviosidad de la zona han provocado el deterioro de varios tramos que ya se encuentran en mal estado y con drenajes inoperantes.

El corredor vial de intervención corresponde a un recorrido de aproximadamente 35 km, cuenta con un tramo inicial de 3.5 km pavimentados, el resto está sin pavimentar a excepción de 3 pequeños tramos en alta pendiente, se observó que en la mayor parte del trayecto se realizaron intervenciones parciales con afirmado; sin embargo en algunos puntos se identificó la presencia de lodos, hay una gran cantidad de obras hidráulicas pero muchas de ellas se encuentran obstruidas o sin adecuado funcionamiento debido a falta de limpieza, sobre todo después de la intervención con afirmado, pues no se conformaron cunetas. Adicional a esto, la mayoría de los puentes tiene un ancho entre 4m y 4.5m lo cual limita el tránsito por los puentes a un solo carril.

Con base en lo anterior, Se celebró el Contrato Interadministrativo (ENTerritorio No. 219140) y ART SC 0331 19, suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio y ENTERRITORIO cuyo objeto es “realizar la estructuración y formulación de proyectos de inversión del sector transporte en el marco de la implementación de los PDET, para presentar al Sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación, conforme a lo establecido en la normatividad vigente”.

2. GENERALIDADES.

2.1 Objetivo General.

Presentar a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO, el informe mensual de consultoría No. 7, del periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021.

2.2 Alcance.

El propósito de este informe mensual es presentar las actividades de consultoría que se han ejecutado durante el periodo del 3 diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021, cumpliendo estrictamente con las normas técnicas vigentes y aplicables a cada especialidad, garantizando la correcta terminación de los "**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ)".**

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

3.1 Descripción General del Contrato.

Contrato de consultoría No. 2020517 firmado entre JPS INGENIERÍA S.A. y la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio tiene como objeto la "FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ)".

De acuerdo con el alcance actual del contrato, se establece que se deberá ejecutar en 3 fases, con un plazo de ejecución de 8 meses a partir de la fecha de firma de acta de inicio, los alcances de cada una de las fases se describen a continuación:

- ETAPA DE PREINVERSIÓN, Formulación, estructuración y estudios y diseños definitivos de proyectos con cumplimiento de requisitos SGR y otras fuentes de financiación, FASE DE **FORMULACIÓN**. Con un plazo de ejecución de 2 meses.

A.01	Verificación de información preliminar
A.02	Diagnóstico del corredor
B.01	Diseños y estudios técnicos en fase de formulación
B.02	Informe Técnico de Alternativas de Diseño
B.03	Evaluación Socioeconómica y Viabilidad del Proyecto
B.04	Socialización de la Alternativa Seleccionada
C.01	Mecanismo de Sostenibilidad

- ETAPA DE PREINVERSIÓN, Formulación, estructuración y estudios y diseños definitivos de proyectos con cumplimiento de requisitos SGR y otras fuentes de financiación, FASE DE **ESTRUCTURACIÓN.** Con un plazo de ejecución de Cuatro y medio (4.5) Meses.

D.01	Estudio de Tránsito
D.02	Levantamiento topográfico, Estudio de trazado y diseño geométrico, Seguridad vial y Estudios de señalización y Plan de manejo de tránsito.
D.03	Diseño urbanístico y paisajístico, Diseño Eléctrico y de Alumbrado Público, Estudio de redes de servicios públicos existentes y proyectadas.
D.04	Estudio de geología y geomorfología para ingeniería de detalle, Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, viaductos, obras de arte y otras estructuras de contención.
D.05	Estudio de hidrología e hidráulica y socavación
D.06	Estudio geotécnico y diseño de pavimento.
D.07	Estudio y diseño de estructuras y, Diseños estructurales de muros de contención y obras hidráulicas
D.08	Gestión predial, Gestión Ambiental y Social del Proyecto, Componente social, PAGA, Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Estudio de impacto Ambiental
D.09	Cantidades de obra, Análisis de precios unitarios y Presupuesto, Cronograma de ejecución del proyecto en el cual se incluyan las etapas precontractuales, ejecución de obra e interventoría y liquidación del proyecto, costos de Operación y Mantenimiento.
D.10	Planos de construcción y documentos, proceso constructivo del proyecto
D.11	Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de acuerdo con la escala de diseño del proyecto.
E.01	Plan de Operación y Sostenibilidad
F.01	Informe de factibilidad
G.01	Presentación final del proyecto estructurado
H.01	Presentación del proyecto ante los OCAD
H.02	Documentos modelos requeridos para la etapa Precontractual

- ETAPA DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN TERRITORIO, Con un plazo de ejecución de Uno y medio (1.5) Meses.
    - Informe de acompañamiento: Tramites ante entidades para aprobación del proyecto en OCAD, y realizar los ajustes a los estudios cuando así lo solicite el OCAD.

3.2 Objeto de Contrato.

A continuación, se presenta información de contrato de consultoría.

3.2.1 Contrato de Consultoría.

Cuadro 2.1 Objeto del Contrato

No. de Contrato	Objeto del Contrato
ENTerritorio 2020517	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Fuente: JPS INGENIERÍA S.A.

3.3 Fecha de Suscripción, Legalización, Plazo y Valor de Contrato.

3.3.1 Contrato de Consultoría.

En la tabla 3.1 se relaciona la información contractual del contrato de consultoría SGR - 2019967

Tabla 3.1 Información Contractual. Fuente: Contrato N° 2020517.

CONTRATO ENTerritorio 2020517	
Contratista	JPS INGENIERÍA S.A.
Plazo inicial de ejecución	8 meses
Fecha de inicio	JUNIO 3 de 2020
Fecha de terminación	FEBRERO 2 DE 2021
Valor inicial del contrato	$ 1.713.211.170,99
Valor actual del contrato	$ 1.713.211.170,99


Fuente: JPS INGENIERÍA S.A.

3.4 Localización del Proyecto.

El corredor vial limita al norte con el límite geográfico del municipio de El Paujil – Caquetá y al sur con el límite geográfico del municipio de La Montañita. El municipio de El Paujil se encuentra ubicado al occidente del Caquetá y al nororiente en relación con Florencia. Limita al norte con el departamento del Huila y con el municipio de El Doncello, al sur con los municipios de La Montañita y Cartagena del Chairá, al oriente con el municipio de El Doncello, y al occidente con el municipio de La Montañita. Su cabecera está a 50 kilómetros de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá. El municipio posee una extensión de 1.338 kilómetros cuadrados.

Por otro lado, el municipio de La Montañita limita al norte con los municipios de Florencia y El Paujil; por el oriente con los municipios del Paujil y Cartagena del Chaira, por el occidente con los municipios de Milán y Florencia y por el sur con el municipio de Solano. El municipio posee una extensión de 1484 kilómetros cuadrados.

Ilustración 3. Ubicación Municipio La Montañita (Caquetá)

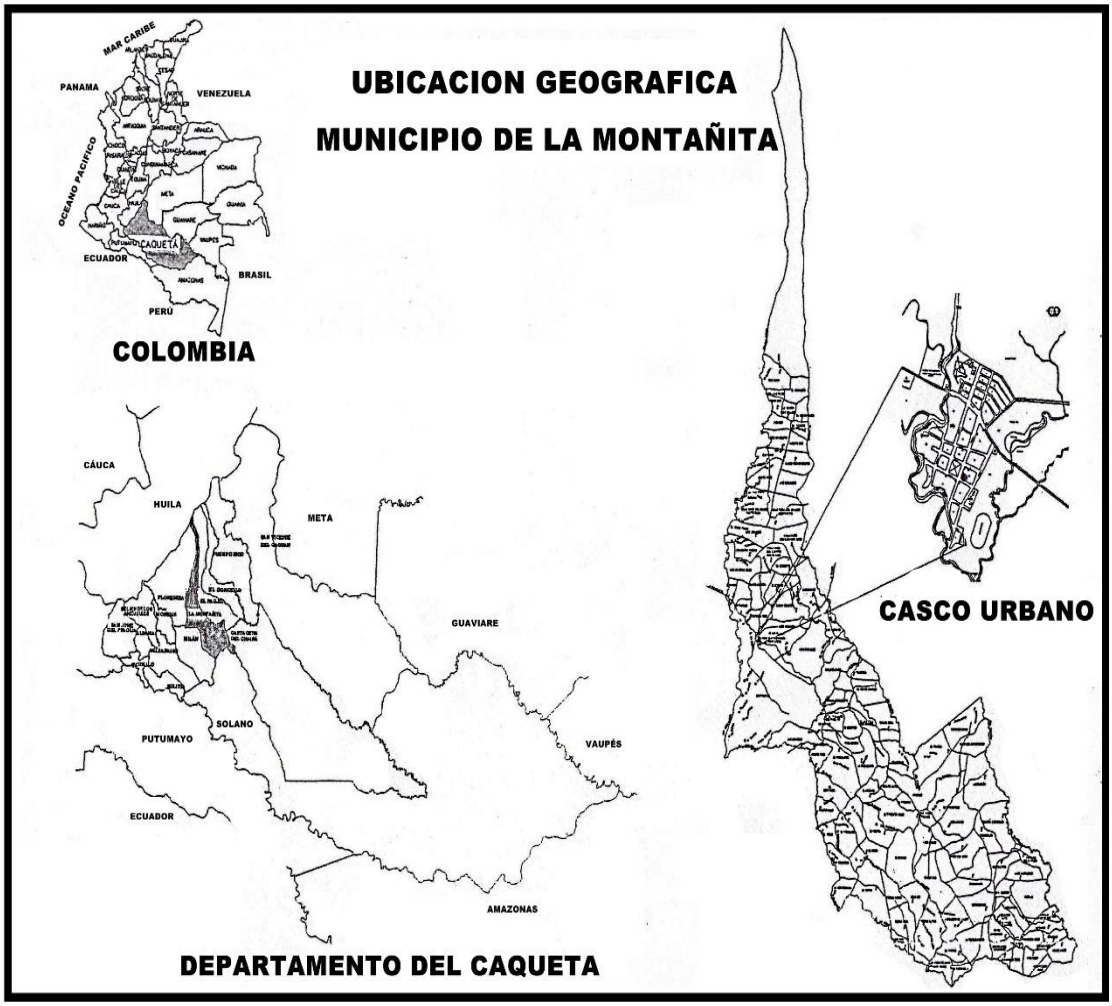

Fuente Cartografía EOT La Montañita.

Ilustración 4. Ubicación del Corredor Vial vía central Líbano – La Unión Peneya.



Fuente Elaboración Propia.

3.5 Personal Mínimo Requerido.

Para la Elaboración de estudios y diseños del corredor vial vía central Líbano – La Unión Peneya, en fase de formulación estructuración y acompañamiento, de conformidad con los requisitos que establece el sistema general de regalías, la consultoría da cumplimiento al personal mínimo requerido en el contrato de consultoría No. SGR – 2020517.

A fin de referenciar el personal mínimo requerido para la Fase I – Formulación, análisis y selección de alternativas, se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 3.1 Personal mínimo requerido.

N°	NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
1	**DAVID TIERRADENTRO**	DIRECTOR
2	**JAVIER ZORRO**	COORDINADOR
3	**LUIS HENRY PULIDO DONCEL**	ESP VIAS Y TRASNPORTE
4	**ENRIQUE MARÍN BENAVIDES**	GEOLOGO
5	**BELSY CRISTINA RAMIREZ NARANJO**	ESP GEOTECNIA

N°	NOMBRE PROFESIONAL	CARGO
6	**RICHARD ACOSTA**	ESP PAVIMENTOS
7	**ANDRES GOMEZ**	ESP HIDRÁULIA E HIDROLOGIA
8	**JUAN DIEGO SANJUANELO**	TOPOGRAFO
9	**SOFIA BELEÑO**	PROFESIONAL SGR
10	**MAURO VEGA**	ESP DISEÑO GEOMETRICO
11	**CARLOS SALGUERO**	ESP ESTRUCTURAL
12	**JAVIER ORTIZ**	FINANCIERO JUNIOR
13	**KAREM SARMIENTO**	ABOGADO JUNIOR
14	**WALTER MANRRIQUE**	ESP AMBIENTAL
15	**MARTHA BERNAL PEÑUELA**	SOCIAL
16	**LEIDY CALDERON**	ESP FORESTAL
17	**ALEXANDER FRANCO**	ARQUEOLOGO
18	**ERIKA ZUÑIGA**	SISO
19	**HENRY CAÑON**	COSTOS Y PRESUPUESTOS
20	**CAMILA ORTIZ**	ING AUXILIAR DE APOYO
21	**MONICA CORTES**	ESP URBANISMO
22	**VLADIMIR PEREZ**	ESP REDES SECAS
23	**WILLIAM CARMONA**	CADENERO 1
24	**JOSÉ RICARDO ARAGON**	CADENERO 2
25	**EDUARDO PARRA**	DIBUJANTE
26	**CRISTIAN ZULUAGA**	SECRETARIO
27	**OSCAR OSUNA**	AUX DE CAMPO AMBIENTAL

Fuente: JPS INGENIERÍA S.A.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA.

4.1. ACTIVIDADES EN CAMPO

En el periodo correspondiente al presente informe, se informa que las actividades de campo han finalizado el día diciembre de 2 de 2020, debidamente reportado en el Informe Mensual N° 06 del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2020.

4.2. APROBACIÓN DE PRODUCTOS A1-A2, B1-B2

A la fecha del presente informe se encuentran aprobados en su totalidad los documentos que componen los productos A1-A2 y B1-B2 como se muestra en los siguientes cuadros con la relación de aprobaciones emitidas por la Interventoría.

4.3. ENTREGABLES A1-A2 y B1-B2

PRODUCTO	AREA	ENTREGA CONSULTOR	OBSERVACIONES INTERVENTORIA		ENTREGA CONSULTOR	
AA1 Verificación de la información preliminar	Diseño Geométrico	21/07/2020	020-C-87	30/07/2020	JPS-2020517- 801	11/08/2020
A2 Diagnostico del corredor		11/8/2020	2020-C-168 **Aprobación**	28/8/2020		
B1 Diseño y estudios técnicos en fase de formulación	Transito	21/07/2020	020-C-73	29/07/2020	JPS-2020517-780	8/08/2020
			020-C-132 **Aprobación**	14/08/2020		
B2 Informe Técnico de Alternativas de Diseño	Geotecnia	21/07/2020	020-C-85	30/07/2020	JPS- 2020517- 785	10/08/2020
			2020-C-140 **Aprobación**	18/08/2020		

PRODUCTO	AREA	ENTREGA CONSULTOR	OBSERVACIONES INTERVENTORIA		ENTREGA CONSULTOR	
	Hidráulica	21/07/2020	020-C-63	28/07/2020	JPS-2020517-786	10/08/2020
			020-C-126	14/08/2020		
			2020-C-164 **Aprobación**	26/08/2020		
	Pavimentos	21/07/2020	020-C-85	30/07/2020	JPS-2020517- 803	12/08/2020
			2020-C-140 **Aprobación**	18/08/2020		
	Geología	21/07/2020	020-C-67	29/07/2020	JPS-2020517-810	14/08/2020
			020-C-153 **Aprobación**	21/08/2020		
	Ambiental	21/07/2020	020-C-79	29/07/2020	JPS-2020517-805	12/08/2020
			020-C-151 **Aprobación**	20/08/2020		
	Forestal	21/07/2020	020-C-105	4/08/2020	JPS-2020517-805	12/08/2020
			020-C-151 **Aprobación**	20/08/2020		
	Social	21/07/2020	020-C-71 **Aprobación**	29/07/2020	JPS-2020517-805	12/08/2020
	Predial	21/07/2020	020-C-89	31/07/2020	JPS-2020517-0807-20	13/08/2020
			020-C-89	14/08/2020		
			020-C-149 **Aprobación**	20/08/2020		
	Costos y Presupuestos	21/07/2020	020-C-178-2 Aprobación	14/09/2020		

4.4. PRODUCTOS B3, B Y C

En el periodo del presente informe se aprobaron por parte de la Interventoría los Subproductos B3 y C y la reunión de socialización con las diferentes entidades territoriales se realizó el 9/10/2020, aunque se aclara que la presentación de la alternativa escogida y el análisis socioeconómico y de sostenibilidad se presentó ante la entidad el 08/09/2020.

PRODUCTO	ENTREGA CONSULTOR	OBSERVACIONES INTERVENTORIA		ENTREGA CONSULTOR	
B3 - EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO	18/08/2020	2020-C-199 **Aprobación**	05/10/2020		
B4 - SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA	Reunión realizada el 09/10/2020				
C - MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD.	18/08/2020	2020-C-218 **Aprobación**	19/10/2020		

4.5. ENTREGA DE PRODUCTOS EN ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN

4.5.1. D .01 ESTUDIO DE TRÁNSITO

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1171-20 del 27-oct-2020 y aprobado por la firma interventora mediante comunicado 2020-C-236 del 05-nov-2020.

4.5.2. D.02 A -LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD VIAL Y ESTUDIOS DE SEÑALIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.

Estudios Topográficos:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1189-20 del 30-oct-2020 y observado por la firma interventora mediante comunicado 2020-C-247 del 17-nov-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 01 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1345-20 del 25-nov-2020 y con alcance mediante comunicado JPS-2020517-

1411-20 del 04-dic-2020. En segunda revisión de la firma interventora, se generaron nuevas observaciones mediante comunicado 2020-C-287 del 15-dic-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 02 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1504-20 del 21-dic-2020. En tercera revisión de la firma interventora, se genera APROBACIÓN PARCIAL mediante comunicado 2020-C-299 del 28-dic-2020.

- Esta firma consultora se encuentra ajustando los aspectos complementarios finales requeridos por la interventoría para la aprobación definitiva del producto.

Diseño Geométrico:

- Producto entregado en su versión inicial mediante comunicado JPS-2020517-1089-20 del 06-oct-2020. En primera revisión de la firma interventora, se generan observaciones iniciales mediante comunicado 2020-C-211 del 16-oct-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 01 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1282-20 del 17-nov-2020 con alcance mediante comunicado JPS-2020517-1315-20 del 19-nov-2020. En segunda revisión de la firma interventora, se generan observaciones mediante comunicados 2020-C-251 del 20-nov-2020 y 2020-C-257 del 25-nov-2020, respectivamente.

- En comunicado JPS-2020517-1339-20 del 24-nov-2020, esta firma consultora se permite presentar aclaración de observaciones al producto entregado, por lo cual, se realiza mesa de trabajo técnica entre consultoría e interventoría el día 27-nov-2020 y se acuerda la entrega del producto con los requerimientos expresados por el especialista de la firma interventora.

- Producto con atención de observaciones N° 02 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1417-20 del 07-dic-2020 y se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.

Diseño de Señalización y Seguridad Vial:

- Producto inicial entregado mediante comunicado JPS-2020517-1282-20 del 17-nov-2020 con alcance mediante comunicado JPS-2020517-1315-20 del 19-nov-2020. En primera revisión de la firma interventora, se generan observaciones mediante comunicado 2020-C-268 del 07-dic-2020.

- Se realiza mesa de trabajo técnica entre consultoría e interventoría el día 27-nov-2020 y se acuerda la entrega del producto con los requerimientos expresados por el especialista de la firma interventora.

- Producto con atención de observaciones N° 02 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1417-20 del 07-dic-2020. Producto en revisión por parte de la firma interventora.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

- Producto inicial entregado mediante comunicado JPS-2020517-1282-20 del 17-nov-2020 con alcance mediante comunicado JPS-2020517-1315-20 del 19-nov-2020. En primera revisión de la firma interventora, se generan observaciones mediante comunicado 2020-C-268 del 07-dic-2020.

- Producto en proceso de atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

4.5.3. D.03 DISEÑO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO, DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESTUDIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES Y PROYECTADAS.

Diseño Urbanístico y Paisajístico:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1314-20 del 19-nov-2020. El producto se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.

Diseño eléctrico y de alumbrado público, Estudio de redes Secas:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1321-20 del 23-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-297 del 24-dic-2020.

- Producto en proceso de atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

4.5.4. D.04 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA PARA INGENIERÍA DE DETALLE, ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, PONTONES, VIADUCTOS, OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.

Estudio de geología para ingeniería:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1281-20 del 17-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-253 del 23-nov-2020.

- Producto en proceso de atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de estructuras y estudio de estabilización de taludes:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1281-20 del 17-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante los comunicados 2020-C-278 y 2020-C-281 del 10-dic-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 01 entregado por esta firma consultora mediante comunicado JPS-2020517-1537-20 del 24-dic-2020 y se encuentra en revisión de la firma interventora.

4.5.5. D.05 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN.

Estudio de hidrología, hidráulica y socavación:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1291-20 del 17-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-252 del 20-nov-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 01 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1397-20 del 03-dic-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones N° 02 mediante comunicado 2020-C-271 del 07-dic-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 02 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1556-20 del 29-dic-2020. Dicha entrega se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.

4.5.6. D.06 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO.

Estudio geotécnico y diseño de pavimento:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1313-20 del 19-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-276 del 10-dic-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 01 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1557-20 del 30-dic-2020. Dicha entrega se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.

4.5.7. D.07 ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y, DISEÑOS ESTRUCTURALES DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS HIDRÁULICAS.

Estudio y diseño de estructuras:

- Producto entregado para el diseño del Puente Coconuco K13+920 mediante comunicado JPS-2020517-1290-20 del 17-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-284 del 11-dic-2020.
  Se encuentra en atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

- Producto entregado para el diseño de los Puentes K7+700 y K17+220 mediante correo electrónico del 21-dic-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-293 del 21-dic-2020.
  Se encuentra en atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

- Producto entregado para el diseño de box coulvert mediante comunicado JPS-2020517-1452-20 del 12-dic-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-288 del 16-dic-2020.
  Se encuentra en atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

- Producto entregado para el diseño del puente Quebrada La Niña K30+850 mediante comunicado JPS-2020517-1505-20 del 21-dic-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-302 del 29-dic-2020.
  Se encuentra en atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

4.5.8. D.08 GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO, COMPONENTE SOCIAL, PAGA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Gestión Predial:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1536-20 del 24-dic-2020. Se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.

  Gestión ambiental y social del proyecto, componente social, paga, diagnóstico ambiental de alternativas y estudio de impacto ambiental:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1288-20 del 17-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-262 del 01-dic-2020.

- Producto con atención de observaciones N° 01 entregado mediante comunicado JPS-2020517-1541-20 del 28-dic-2020. Dicha entrega se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.

  Inventario Forestal:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1538-20 del 24-dic-2020. En revisión por parte de la firma interventora.

4.5.9. D.09 CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL CUAL SE INCLUYAN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Estudio de cantidades, APU, presupuesto:

- Producto en estructuración por parte de la firma consultora, cumpliendo con lo establecido en el contrato y en las áreas técnicas revisadas por la firma interventora, cuyo insumo es indispensable para la entrega final.

4.5.10. D.10 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y DOCUMENTOS, PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO.

Planos de construcción y documentos, proceso constructivo del proyecto:

- Producto en estructuración por parte de esta firma consultora para entrega a la interventoría en la Etapa Diseños Fase III – Estructuración.

4.5.11. D.11 ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 1523 DE 2012, DE ACUERDO CON LA ESCALA DE DISEÑO DEL PROYECTO.

Análisis de riesgos de desastres:

- Producto entregado mediante comunicado JPS-2020517-1289-20 del 17-nov-2020. En revisión por parte de la firma interventora, se generaron observaciones mediante comunicado 2020-C-301 del 29-dic-2020.

- Producto se encuentra en proceso de atención de observaciones por parte de esta firma consultora.

4.5.12. E.01 PLAN DE OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.

- Producto en estructuración por parte de esta firma consultora para entrega a la interventoría en la Etapa Diseños Fase III – Estructuración.

4.5.13. F.01 INFORME DE FACTIBILIDAD.

- Producto en estructuración por parte de esta firma consultora para entrega a la interventoría en la Etapa Diseños Fase III – Estructuración.

4.5.14. G.01 PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO ESTRUCTURADO.

- Entrega una vez finalizada la aprobación de los productos de estudios y diseños del contrato y dentro de los plazos establecidos en la programación.

4.5.15. H.01 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE LOS OCAD.

- Presentación que se ejecutará una vez finalizada la aprobación de los productos de estudios y diseños del contrato y a su vez, dentro de los plazos establecidos en la programación.

4.5.16. H.02 DOCUMENTOS MODELOS REQUERIDOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL.

- Documentos en estructuración por parte de esta firma consultora dentro de los plazos establecidos por el contrato.

5. INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

En el Anexo 1 es presentado el formato FMI019, el cual incluye la información del contrato general del proyecto, el estado de las garantías y el resumen de pagos.

6. CONTROL DE PERSONAL

En el Anexo 2 es presentado el formato FMI021, el cual incluye el control del personal que ha participado en el periodo comprendido del presente informe, junto con los respectivos pagos de seguridad social.

7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

En el Anexo 3 es presentado el formato FMI022, el cual incluye la relación de correspondencia enviada y recibida en el periodo comprendido del presente informe, junto con la respectiva copia de los radicados.

8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

En el Anexo 4 es presentado el formato FMI030, el cual incluye la relación de documentos técnicos y/o administrativos enviados durante el periodo comprendido del presente informe, junto con la respectiva constancia de envió.

9. FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el Anexo 5 es presentado el formato FMI037, el cual incluye la relación de fotografías tomadas durante la ejecución de actividades en campo, durante el periodo comprendido del presente informe, junto con la respectiva descripción de las fotos.

ANEXOS

	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	FMI019
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	06
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-30

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	3 de diciembre de 2020	Y EL	2 de enero de 2021
OBJETO	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.				
LOCALIZACIÓN	CORREDOR VIAL QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ),				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CONTRATO No.:	2020570	CONTRATO No.:	2020517
CONTRATISTA:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de junio de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA	*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	2 de marzo de 2021	PLAZO ACTUALIZADO:	2 de marzo de 2021
VALOR INICIAL :	566.295.091,53	VALOR INICIAL :	$ 1.713.211.170,99
VALOR ADICION(ES):	NA	VALOR ADICION(ES):	NA
VALOR ACTUALIZADO:	NA	VALOR ACTUALIZADO:	NA
VALOR PAGADO:	NA	VALOR PAGADO:	NA
VALOR POR PAGAR:	566.295.091,53	VALOR POR PAGAR:	1.713.211.170,99

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
				POLIZA DE CUMPLIMIENTO	6/05/2020	6/09/2021	$ 342.642.235,00
				POLIZA PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES, ETC.	6/05/2020	6/01/2024	$ 85.660.559,00
				POLIZA CALIDAD DEL SERVICIO	6/05/2020	11/08/2023	$ 513.963.351,30

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
			Primer pago. 25% del valor de la fase de Formulación. Subproductos A01 Verificación de información preliminar y A02 Diagnóstico del corredor	2/10/2020	128.697.074,96
			Segudo Pago 35% delvalor de la fase deFormulación Subproductos B.01 Diseños y estudios técnicos en fase de formulación y B.02 Informe Técnico de Alternativas de Diseño	2/10/2020	180.175.904,95
			Tercer Pago 20% del valor de la fase de Formulación Subproductos B.03 Evaluación Socioeconómica y Viabilidad del Proyecto y B.04 Socialización de la Alternativa Seleccionada	20/10/2020	102.957.659,97
			Cuarto Pago 10% del valor de la fase de Formulación Subproducto C.01 Mecanismo de Sostenibilidad	29/10/2020	51.478.829,99
			Quinto Pago 2,5% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.01 Estudio de Tránsito	1/12/2020	18.134.021,00
			Sexto Pago 30,87% del valor de Bolsa de Ensayos	18/12/2020	92.939.007,21
			Séptimo Pago 25,61% del valor de Bolsa de Ensayos	22/12/2020	77.087.909,77

4. CURVA "S"

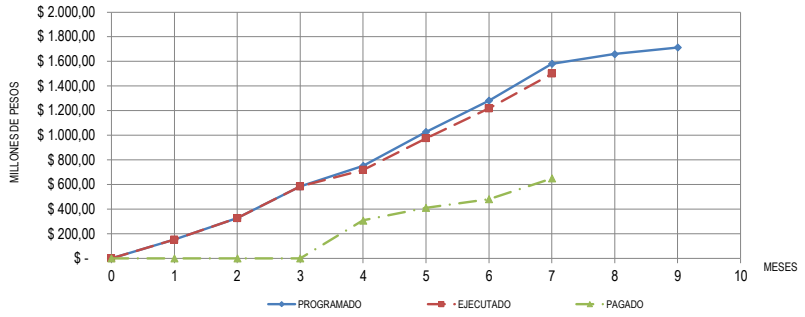

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de ENTerritorio.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DIRECTOR INTERVENTORÍA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**FMI021**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3-nov Y EL 3-dic PLAZO: 8 MESES

CONTRATISTA: JPS INGENIERÍA S.A. CONTRATO No. 2020517

INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS CONTRATO No. 2020570

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES diciembre de 2020 / enero 2021																															OBSERVACIONES
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
CARGO																																	
DIRECTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Trabajo de Oficina
ESPECIALISTAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			Trabajo de Oficina. Trabajo en campo de los Especialistas Ambiental, Social, Forestal y Biólogo
RESIDENTE / COORDINADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Trabaj ode oficina
ALMACENISTA																																	
OFICIAL																																	
AYUDANTE																																	Trabajo de Campo
TOPÓGRAFO																																	Trabajo de Campo
CADENEROS																																	Trabajo de Campo
COMISIÓN DE GEOTÉCNIA																																	
PERSONAL CONTRATISTA	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** 360

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
De fuera de la región		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada		0	0,00%	
Profesionales - Técnicos		0	0,00%	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**FMI021**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3-nov Y EL 3-dic PLAZO: 8 MESES

CONTRATISTA: JPS INGENIERÍA S.A. CONTRATO No. 2020517

INTERVENTOR: CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS CONTRATO No. 2020570

PROVEEDORES			
Local			
Nacional			
Internacional			

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**FMI022**
		VERSIÓN:	**03**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	2020517
OBJETO:	**FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**
CONTRATISTA:	***JPS INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA***
INTERVENTOR:	***CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS***
SUPERVISOR:	***OLGA NATHALIA VARGAS RAMIREZ***

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
		CORRESPONDENCIA ENVIADA		
3/12/2020	JPS-2020517-1390-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 6	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
3/12/2020	JPS-2020517-1394-20	Entrega geología versión 1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO GECARE
3/12/2012	JPS-2020517-1397-20	Rta observaciones Hidráulica	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
4/12/2012	JPS-2020517-1411-20	Entrega Producto D.04 Topografía	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
7/12/2020	JPS-2020517-1416-20	Entrega revisión acta 1	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO INTERDISEÑOS PJ
7/12/2020	JPS-2020517-1417-20	Entrega corrección gemétrico mesa de trabajo 27 noviembre	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
9/12/2020	JPS-2020517-1427-20	Entrega cronograma prórroga a julio 25 de 2021	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO INTERDISEÑOS PJ
10/12/2020	JPS-2020517-1440-20	Propuesta No realización Monitoreos Ambientales durante la etapa de Estudios y	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
10/12/2020	JPS-2020517-1442-20	Entrega documentos soporte para cobro de Acta No. 7	JPS INGENIERÍA S.A.	ENTERRITORIO
12/12/2020	JPS-2020517-1452-20	ENTREGA Box Culvert	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
18/12/2020	JPS-2020517-1491-20	Monitoreos Ambientales	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
21/12/2020	JPS-2020517-1504-20	Entrega topografía correcciones 2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
21/12/2020	JPS-2020517-1505-20	entrega diseño estructural puente la niña	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
22/12/2020	JPS-2020517-1521-20	Entrega avance Arqueología	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/12/2020	JPS-2020517-1536-20	Entrega avance predial	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/12/2020	JPS-2020517-1537-20	Entrega avance Geotecnia	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
24/12/2020	JPS-2020517-1538-20	Entrega avance Forestal	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
28/12/2020	JPS-2020517-1541-20	Entrega Avance PAGA	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
29/12/2020	JPS-2020517-1556-20	Entrega Hidráulica versión 2	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
29/12/2020	JPS-2020517-1557-20	Entrega diseño de pavimentos	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
30/12/2020	JPS-2020517-1567-20	Entrega informe Mensual N°6	JPS INGENIERÍA S.A.	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS
		CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
7/12/2020	2020-C-268	Rta JPS-2020517-1282. Observaciones PMT	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
7/12/2020	2020-C-271	Rta JPS-2020517-1297. Observaciones Estudio de Hidráulica	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
9/12/2020	001412	Rta a Solicitud de Información vía Líbano - Unión Peneya	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EL PAUJIL	JPS INGENIERÍA S.A.
10/12/2020	2020-C-276	Rta JPS-2020517-1313. Observaciones Diseño de Pavimentos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
10/12/2020	2020-C-278	Rta JPS-2020517-1278. Observaciones taludes	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
10/12/2020	2020-C-281	Rta JPS-2020517-1287. Observaciones al estudio de Suelos para Fundaciones	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
11/12/2020	2020-C-284	Rta JPS-2020517-1290. Observaciones Puente Coconuco	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
15/12/2020	2020-C-287	Rta JPS-2020517-1411. Observaciones Topografía	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
16/12/2020	2020-C-288	Rta JPS-2020517-1452. Observaciones Box coulvert	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
21/12/2020	DTC-5204	Respuesta a solicitud de permisos ambientales	CORPOAMAZONÍA	JPS INGENIERÍA S.A.
21/12/2020	2020-C-293	Correo electrónico. Observaciones Puentes k7+700 y k17+220	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
23/12/2020	2020-C-295	Solicitud informe mensual No. 6	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
24/12/2020	2020-C-297	Atn JPS-2020517-1321. Observaciones Redes eléctricas	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
28/12/2020	2020-C-299	Atn JPS-2020517-1321. Observaciones Redes eléctricas	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
29/12/2020	2020-C-301	Rta JPS-2020517-1289. Observaciones documento análisis de riesgos	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.
29/12/2020	2020-C-302	Rta JPS-2020517-1505. Diseño puente la Niña	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	JPS INGENIERÍA S.A.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020517
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
	Metodologías								
1	TOPOGRAFIA	1	NA	31/07/2020	Interventoría	-	-	X	
2	DISEÑO GEOMETRICO	1	NA	22/07/2020	Interventoría	-	-	X	
3	TRANSITO	1	NA	22/07/2020	Interventoría	-	-	X	
4	GEOLOGIA	1	NA	8/08/2020	Interventoría	-	-	X	
5	GEOTECNIA	1	NA	23/07/2020	Interventoría	-	-	X	
6	PAVIMENTOS	1	NA	14/07/2020	Interventoría	-	-	X	
7	ESTRUCTURAS	1	NA	29/07/2020	Interventoría	-	-	X	
8	HIDRAULICA	1	NA	15/07/2020	Interventoría	-	-	X	
9	AMBIENTAL	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
10	SOCIAL	1	NA	22/07/2020	Interventoría	-	-	X	
11	PREDIAL	1	NA	14/07/2020	Interventoría	-	-	X	
12	ARQUEOLOGIA	1	NA	3/08/2020	Interventoría	-	-	X	
13	REDES SECAS	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
14	URBANISMO	1	NA	11/08/2020	Interventoría	-	-	X	
15	COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	NA	14/07/2020	Interventoría	-	-	X	
	A1 Verificación de la información preliminar, A2 Diagnostico del corredor, B1 Diseño y estudios técnicos en fase de formulación, B2 Informe Técnico de Alternativas de Diseño.								
1	DISEÑO GEOMÉTRICO	1	NA	28/08/2020	Interventoría	-	-	X	
2	TRANSITO	1	NA	14/08/2020	Interventoría	-	-	X	
3	GEOTECNIA	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
4	HIDRÁULICA	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
5	PAVIMENTOS	1	NA	18/08/2020	Interventoría	-	-	X	
6	GEOLOGÍA	1	NA	21/08/2020	Interventoría	-	-	X	
7	AMBIENTAL	1	NA	20/08/2020	Interventoría	-	-	X	
8	FORESTAL	1	NA	20/08/2020	Interventoría	-	-	X	
9	SOCIAL	1	NA	12/08/2020	Interventoría	-	-	X	
10	PREDIAL	1	NA	20/08/2020	Interventoría	-	-	X	
11	COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	NA	14/09/2020	Interventoría	-	-	X	
	B3 Evaluación Socioeconómica y Viabilidad del Proyecto, B4 Socialización de la Alternativa Seleccionada y C Mecanismo de Sostenibilidad.								
1	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y VIABILIDAD DEL PROYECTO	1	NA	5/10/2020	Interventoría	-	-	X	
2	SOCIALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA	1	NA	9/10/2020	Interventoría	-	-	X	
3	MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD.	1	NA	16/10/2020	Interventoría	-	-	X	
						-	-		
	ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN								
D01	ESTUDIO DE TRÁNSITO	1	NA	27/10/2020		-	-	X	APROBADO
D02	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1	NA	21/12/2020		-	-	X	APROBACIÓN PARCIAL
D02	SEGURIDAD VIAL Y PMT	4	NA	19/11/2020		-	-	X	SEGURIDAD VIAL: En revisión de interventoría PMT: En atención de observaciones por la consultoría
D02	DISEÑO GEOMETRICO 17/11/2020	5	NA	7/12/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D03	URBANISMO Y PAISAJISMO	6	NA	19/11/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D03	INVENTARIO REDESELECTRICAS	7	NA	23/11/2020		-	-	X	En atención de observaciones por la consultoría
D04	ESTUDIO DE GEOLOGIA	8	NA	17/11/2020		-	-	X	En atención de observaciones por la consultoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**FMI030**
		VERSIÓN:	**04**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-05-06**

CONTRATO No. :	2020517
OBJETO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
SUPERVISOR:	OLGA NATHALIA VARGAS

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D04	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	9	NA	24/12/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D05	ESTUDIO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA	10	NA	29/12/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D06	DISEÑO DE PAVIMENTOS	11	NA	30/12/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D07	DISEÑO DE ESTRUCTURAS	12	NA	21/12/2020		-	-	X	En atención de observaciones por la consultoría
D08	PAGA, GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL	13	NA	24/12/2020		-	-	X	En revisión de la Interventoría
D09	PRESUPUESTO	14	NA	-		-	-	X	En elaboración por parte de la consultoría
D010	PLANOS Y PROCESO CONSTRUCTIVO	15	NA	-		-	-	X	En elaboración por parte de la consultoría
D011	ANALISIS DE RIESGO	16	NA	17/11/2020		-	-	X	En atención de observaciones por la consultoría

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes enero del 2021.

ENTREGA	RECIBE
Firma	Firma
NOMBRE: [illegible] TIERRADENTRO NOVA	**NOMBRE**
Fecha: ENERO 2 DE 2021	Fecha:

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO:	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPTO CAQUETÁ
CONTRATISTA:	JPS INGENIERÍA S.A.
CONTRATO No.:	CONSORCIO CELQO - INTERDISEÑOS
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	Enero 2 de 2021

DENTRO DEL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE FINALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO Y SE EJECUTARON PROCESOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS TÉCNICAS COMO TRABAJO DE OBIFICA EN PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN, POR LO CUAL, NO SE PRESENTA REGISTRO FOTOGRÁFICO YA QUE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS FUERON CULMINADAS.
