enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	FMI019
		VERSIÓN:	06
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-30

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	9	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	3 de febrero de 2021	Y EL	2 de marzo de 2021
OBJETO	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS - FASE 3 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, CORREDOR QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.				
LOCALIZACIÓN	CORREDOR VIAL QUE CONECTA LA VÍA CENTRAL LÍBANO Y LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ).				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CONTRATO No.:	2020570	CONTRATO No.:	2020517
CONTRATISTA:	CONSORCIO CELQO INTER-DISEÑOS	CONTRATISTA:	JPS INGENIERÌA SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de junio de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA	*FECHA DE REINICIACIÓN:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	17 de abril de 2021	PLAZO ACTUALIZADO:	17 de abril de 2021
VALOR INICIAL :	566.295.091,53	VALOR INICIAL :	$ 1.713.211.170,99
VALOR ADICION(ES):	NA	VALOR ADICION(ES):	NA
VALOR ACTUALIZADO:	NA	VALOR ACTUALIZADO:	NA
VALOR PAGADO:	NA	VALOR PAGADO:	$ 1.027.925.411,37
VALOR POR PAGAR:	566.295.091,53	VALOR POR PAGAR:	$ 685.285.759,62

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
				POLIZA DE CUMPLIMIENTO	6/05/2020	6/09/2021	$ 342.642.235,00
				POLIZA PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES, ETC.	6/05/2020	6/01/2024	$ 85.660.559,00
				POLIZA CALIDAD DEL SERVICIO	6/05/2020	11/08/2023	$ 513.963.351,30

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
			Primer pago. 25% del valor de la fase de Formulación. Subproductos A01 Verificación de información preliminar y A02 Diagnóstico del corredor	2/10/2020	128.697.074,96
			Segundo Pago 35% delvalor de la fase deFormulación Subproductos B.01 Diseños y estudios técnicos en fase de formulación y B.02 Informe Técnico de Alternativas de Diseño	2/10/2020	180.175.904,95
			Tercer Pago 20% del valor de la fase de Formulación Subproductos B.03 Evaluación Socioeconómica y Viabilidad del Proyecto y B.04 Socialización de la Alternativa Seleccionada	20/10/2020	102.957.659,97
			Cuarto Pago 10% del valor de la fase de Formulación Subproducto C.01 Mecanismo de Sostenibilidad	29/10/2020	51.478.829,99
			Quinto Pago 2,5% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.01 Estudio de Tránsito	1/12/2020	18.134.021,00
			Sexto Pago 30,87% del valor de Bolsa de Ensayos	18/12/2020	92.939.007,21
			Séptimo Pago 25,61% del valor de Bolsa de Ensayos	22/12/2020	77.087.909,77
			Octavo Pago 4,32% del valor de Bolsa de Ensayos	3/03/2021	13.774.785,50
			Noveno Pago 7,5% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.06 Estudio de Hidrología e Hidráulica y Socavación	3/03/2021	54.402.063,00
			Décimo Pago 5,0% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.06 Estudio geotécnico y diseño de pavimento	26/02/2021	36.268.042,00
			Décimo primer Pago 20,0% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.02 Levantamiento topográfico,Estudio de trazado y diseño geométrico,Seguridad vial y Estudios de señalización y Plan de manejo de tránsito.	En trámite	145.072.168,01
			Décimo segundo Pago 2,5% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.03 Diseño urbanístico y paisajístico, Diseño Eléctrico y de Alumbrado Público, Estudio de redes de servicios públicos existentes y proyectadas.	En trámite	18.134.021,00
			Décimo tercer Pago 10,0% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.04 Estudio de geología y geomorfologia para ingeniería de detalle, Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, pontones, viaductos, obras de arte y otras estructuras de contención.	En trámite	72.536.084,00
			Décimo cuarto Pago 5,0% del valor de la fase de Estructuración Subproducto D.11 Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523 de 2012, de acuerdo con la escala de diseño del proyecto.	En trámite	36.268.042,00

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**FMI019**
		VERSIÓN:	**06**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2019-04-30**

4. CURVA "S"

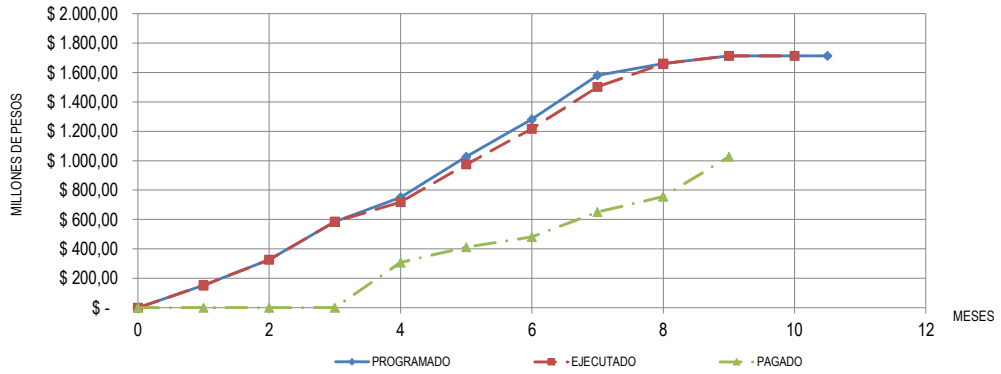

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de ENTerritorio.
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DIRECTOR INTERVENTORÍA
