ALCALDÍA DE SINCELEJO	INFORME TECNICO	Sincelejo Unidos transformamos más

DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO DE SINCELEJO

CONTRATO DE OBRA
N0. SA-047-MC-2021

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE”

INFORME MENSUAL N°1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 11 NOVIEMBRE DE 2021 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021

2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL CONTRATO 3
1.1 CONTRATO DE OBRA 3
2. INTRODUCCIÓN 4
3. OBJETIVOS 5
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
3.2. OBJETIVOS GENERALES 5
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 5
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
4.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO 6
4.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO 7
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS 8
6. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA 22
7. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA 22
8. MANO DE OBRA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 23
9. CONCLUSIONES 24

INFORME MENSUAL N°1

1. INFORMACION DEL CONTRATO

1.1 CONTRATO DE OBRA

FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO NUMERO:	No. SA-047-MC-2021
CONTRATISTA:	VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSÓ
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE
MUNICIPIO:	SINCELEJO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 98.143.077
PLAZO DE EJECUCION:	2 MESES

2. INTRODUCCIÓN

El municipio de Sincelejo en aras de hacer de esta una ciudad de paz mejorando cada día sus espacios e infraestructura, procede después de realizar un estudio previo donde se reflejó que La instalación de la sede de bomberos de municipio de Sincelejo actualmente se encuentra en muy malas condiciones, pues presenta deterioro en su estructura y acabados, por tal motivo se ejecutará el proyecto que buque la comodidad necesaria en sus instalaciones

Ante lo anterior La Alcaldía de Sincelejo inició el proceso de selección para la contratación de la **"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE"**. Como resultado de este proceso, se firmó el 11 de noviembre de 2021 el contrato de No. SA-047-MC-2021con representado legalmente por VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO.

El presente documento constituye el primer Informe, detalla en forma resumida las actividades adelantadas por el contratista en el proyecto de la **"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE"**, hasta la fecha 04 de diciembre 2021

Este informe, presenta el avance de los contratos de obra en los aspectos técnicos y ambientales, así como las observaciones y recomendaciones realizadas en la ejecución del proyecto, de acuerdo al programa de trabajo.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO – SUCRE

3.2. OBJETIVOS GENERALES

- Buscar un espacio con condiciones óptimas y adecuadas para las instalaciones de la sede del cuerpo de bomberos de Sincelejo

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO – SUCRE"** se encuentra ubicado en el municipio de Sincelejo y tiene como objetivo solucionar la problemática de deterioro de estas instalaciones, pues se busca brindar la comodidad y la riqueza a nivel físico para la ocupación de los 15 miembros que al día conforman al Cuerpo de Bomberos Oficial y los usuarios que recurren a los servicios prestados en el inmueble.

Este proyecto busca mejorar las condiciones físicas deteriorada por diferentes factores como lo son: las filtraciones en las cubiertas, vigas canales y humedades en los muros internos y externos, y, en consecuencia, daños en el cielo raso. Todas estas afectaciones aumentan las posibilidades de eventos adversos y posteriores

incidentes que pondrían en riesgo la integridad física y la vida de las personas que laboran en el lugar o que la visitan en solicitud de los servicios ofrecidos en el inmueble

4.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO

La ciudad de Sincelejo se encuentra ubicada al noroeste del país de 9º 18' 17'' latitud norte, 75º 23” latitud oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una extensión total de 28.134 ha, con una altura sobre el nivel del mar de 213 msnm.

La ciudad de sincelejo tine una extension total de 28.410.31 KM2, de los cuales 2.143,1 en areas urbanas lo que equivale al 7.53% KM2 y un area rural de 26.367,21 equivalente añ 92,47% KM2; la temperatura media anual está cercana a los 27.15ºC; con una mínima promedio anual de 19,7ºC y una máxima de 35,3ºC. Sincelejo se encuentra a 213 metros sobre el nivel del mar y se encuentra ubicado a 987 Kms de la Capital de la República, a 459 Kms de Medellín, a 140 Kms de Montería, a 220 Kms de Barranquilla, a 180 Kms de Cartagena y a 40 Kms del Puerto de Tolú.

Sincelejo limita al sur con el municiio de sampues y con el deartamento de cordoba, al oeste con los municiio de palmito y tolu, al norte con los municipios de tolu y toluviejo y al este con los municipios de corozal y morroa



Figura 1. Localización del Municipio de Sincelejo, Sucre.

4.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MUNICIPIO

El proyecto a ejecutar se encuentra ubicado en el barrio Argelia en la zona urbana del municipio de Sincelejo:




Figura 2. Localización de la estación de bomberos del Municipio de Sincelejo, Sucre.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se detallan cada una de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2021 y el 04 de diciembre de 2021

- **DESMONTE CIELO RASO ICOPOR**

  Se realizaron 53,92 M2 de desmonte de cielo raso de icopor de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final.

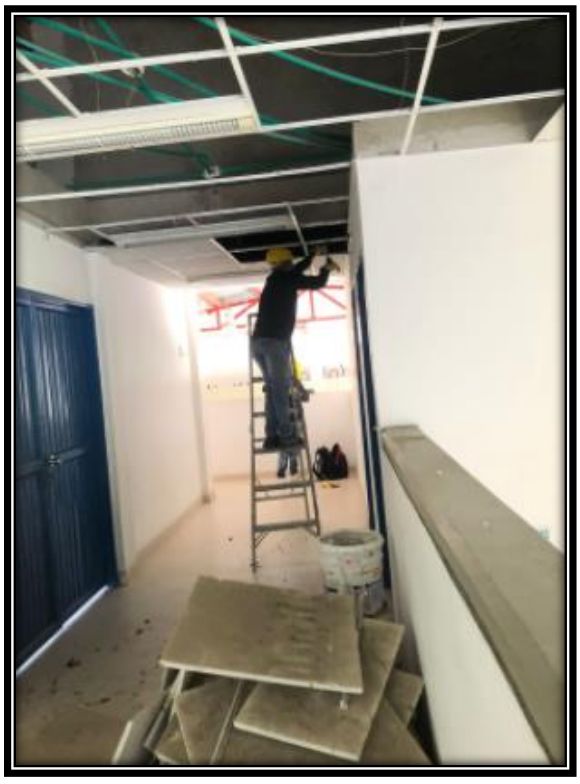

- **DESMONTE Y ACARREO DE APARATOS SANITARIOS**

  Se realizó el desmonte de 8 UNIDADES aparatos sanitarios de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final.



- **TRAZADO Y REPLANTEO**

  Se realizaron 67,28 M2 el trazado y replanteo utilizando personal experto, incluyo demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos y referencias



- **DEMOLICION MESON CONCRETO**

  Se realizaron 2,64 M2 de demolición de mesón de concreto, debido a que presentaban fisuras y los materiales provenientes de la demolición fueron ubicados en un sitio de disposición final.

- **DEMOLICION DE ENCHAPE**

  Se realizaron 38,30 M2 de demolición de enchape de los baños de la sede de bomberos, y los materiales provenientes de la demolición fueron ubicados en un sitio de disposición final



- **DEMOLICION DE CERAMICA**

Se realizaron 12,14 M2 de demolición de cerámica de los baños de la sede de bomberos, y los materiales provenientes de la demolición fueron ubicados en un sitio de disposición final



- **DEMOLICION DE MURO 0.10 BLOQUE CEMENTO**

  Se realizaron 7,02 M2 de demolición de muro en bloque 0.10 de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes de la demolición fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS**

  Se realizó el desmonte de 3 unidades de puertas de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final



- **DESMONTE DE BARANDA**

  Se realizó el desmonte de 2,8 ML de barandas de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **DESMONTE DE ILUMUNACION DE EMERGENCIA**

  Se realizó el desmonte de 20 unidades de iluminación de emergencia de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **DESMONTE DE LUNIMARIAS HALOGENAS TIPO CAMPANA**

  Se realizó el desmonte de 6 unidades de luminarias halógenas tipo campana de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **DESMONTE DE LUMINARIAS 2X23 T8**

  Se realizó el desmonte de 60 unidades de luminarias 2X23 T8 de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **DESMONTE DE EQUIPOS DE VENTILACION**

  Se realizó el desmonte de 6 unidades de equipos de ventilación de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **DESMONTE DE ILUMINACION PERIMETRAL**

  Se realizó el desmonte de 17 unidades de iluminación perimetral de las instalaciones de la sede de bomberos, y los materiales provenientes del desmonte fueron ubicados en un sitio de disposición final

- **LEVANTE BLOQUE 0.09 (5 MPA) 9 x 19 x 39**

Se realizó el levante de 7,54 M2 de bloque 0.09 de 5MPA de las instalaciones de la sede de bomberos, de acuerdo a las especificaciones dadas.





- **CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTREMURO S=0.12x0.20**

  Se suministraron materiales para la fabricación, transporte, colocación, vibrado y curado de los concretos de cemento hidráulico, utilizados para la construcción de machones de entre muros de 0.12 X 0.20 de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto. Se realizaron 8 ML de machones de entre muros.

- **ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI**

  Se suministró, figuro y coloco acero de refuerzo de 60000 PSI para elementos estructurales de concreto, se instalaron 86,02 KG de acero de refuerzo



- **CIELO RASO LAMINA ICOPOR**

  Se instalaron 54,26 M2 de cielo raso de lámina de icopor de las instalaciones de la sede de bomberos.



- **ENCHAPE CERAMICA 25x35**

  Se instalaron 57,94 M2 de enchape cerámica de 25 X 35 para los baños de las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **PISO BALDOSA ANTIDESLIZANTE**

  Se instalaron 12,14 M2 de piso baldosa antideslizante para los baños de las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%

- **BARANDA METALICA TUBO GALVIZADO 3``**

  Se instalaron 2,80 ML de baranda metálica tubo galvanizado 3”, en los pasillos de las instalaciones y las escaleras de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **PUERTA METALICA LAMINA GALVANIZADA. CAL. 22**

  Se instalaron 4,35 M2 de puerta metálica lámina galvanizada cal 22 en las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%

- **DESMONTE REJA METALICA**

  Se desmontaron 42 M2 de reja metálicas en las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJA METALICA DE ACCESO A GARAGE PRINCIPAL**

  Se realizó el mantenimiento correctivo de 42 M2 de reja metálica de acceso al garaje principal de la sede de bomberos, esta actividad se finalizó al 100%

- **S.E.I LAMPARAS LED DE EMERGENCIA R 3 W**

  Se instalaron 18 Unidades de S.E.I. Lámparas led emergencia 3w en todas las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **S.E.I LUMINARIAS HIGHBAY PARA BODEGA 150 W**

  Se instalaron 6 Unidades de S.E.I. Luminarias hibhgay para bodegas de 150 W de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%





- **S.E.I LUMINARIAS HERMETICA 36 W**

  Se instalaron 50 Unidades de S.E.I. Luminarias herméticas de 36 W de las instalaciones de la sede de bomberos.



- **S.E.I REFLECTORES LED 120 W ALTA EFICIENCIA**

  Se instalaron 3 Unidades de reflectores led 120 W alta eficiencia de las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **S.E.I LUMINARIAS LED WALL PACK 50 W PERIMETRAL**

  Se instalaron 14 Unidades de las luminarias led Wall pack 50 W perimetrales de las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **S.E.I VENTILADOR DE TECHO**

  Se instalaron 8 Unidades de ventiladores de techo de las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **S.E.I AIRE ACONDICIONADO**

  Se instalaron 4 Unidades de aire acondicionado de las instalaciones de la sede de bomberos. Esta actividad se finalizó al 100%



- **IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**

  Se impermeabilizaron 53,92 M2 de cubierta de las instalaciones de la sede de bomberos, de acuerdo a las especificaciones dada.



6. CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

Para la ejecución de las actividades el contratista hasta la fecha ha utilizado personal capacitado, los cuales son necesarios para llevar a cabo las labores asignadas.

7. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA

La obra en todo su conjunto garantiza el buen manejo de desechos a través de la recolección de los mismos. En las etapas iníciales del proyecto se adelantaron actividades de retiro de elementos sobrantes de desmonte y demolición, dichos elementos se encuentran apostados en el sitio para luego ser llevados a su disposición final.

Dentro de la finalidad del proyecto se buscó disminuir con medidas de prevención y mitigación de eventos que impactan el “medio natural” tales como deterioro de la

calidad del aire, ruido, contaminación de fuentes hídricas, gestión de residuos sólidos, etc.

8. MANO DE OBRA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La normativa de seguridad industrial se viene cumpliendo satisfactoriamente, lo que ha ameritado un fuerte trabajo a fin de que el personal de obra cumpla con la normatividad vigente en tal sentido y, por otra parte, en lo que respecta al respeto de los trabajadores del entorno de la obra a fin de mitigar los riesgos de accidentes.

En términos generales se usan: cascos, guantes, botas, entre otras los cuales fueron suministrados por la empresa contratista, Todo el personal de obra cuenta con afiliación al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional de acuerdo al reporte que realizó la contratista de obra, así mismo se veló que los subcontratistas de obra cumplieran con estar afiliados para la realización de labores del proyecto.

Las cuadrillas de trabajo requeridas se incorporan a la obra previa afiliación legal a salud, pensión y riesgos laborales (ARL), acorde a las normas colombianas.





9. CONCLUSIONES

En este primer informe mensual se logran evidenciar un avance significativo en cada una de las actividades ejecutadas por el contratista, pues se han realizado el 87,72% de las actividades contratadas. Además, se evidencia que se cumple cada uno de los protocolos de bioseguridad y seguridad en el trabajo de cada uno de los trabajadores.



_____

VICTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

C.C. N º. 1.101.816.024 de OVEJAS – SUCRE

DIRECCION: CARRERA 14 # 16 – 63 LA PAJUELA

Espacio para
Logo Corporativo

VICTOR MANUEL BARRETO SALCEDO
NIT 1.101.816.024-7
CR 91 27 C 4 BRR PIONEROS
Tel: (57) 3017207879
Sincelejo - Colombia
barsa2006victor@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. VMBS-13

Señores	MUNICIPIO DE SINCELEJO		
NIT	800.104.062-6	**Teléfono**	2740240
Dirección	CALLE 18 # 25 A-246	**Ciudad**	Sincelejo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2021, 17:38
Expedición	15/12/2021, 08:18
Vencimiento	13/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL Nº 1 (87,72%) AL CONTRATO DE OBRA N SA-047-MC-2021 QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL CUERPOS DE BOMBEROS OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.00	86,095,400.00

Total items: 1

Total Bruto	86,095,400.00
Total a Pagar	86,095,400.00

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-13 por $ 86,095,400.00

Observaciones:
Valor TOTAL COBRADO. $ 86.095.400
Valor neto a pagar $ 86.095.400

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764017904637 aprobado en 20210910 prefijo VMBS desde el número 1 al 30 Vigencia: 6 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 10
CUFE: 5cb3b20566c1456e70a47abadebb7479291f50ba877511f94b373bb7ff54efe453e60ff0cf09221d97671093d57dcc84

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1101816024-7	victor manuel barreto salcedo	cra 14 n 1663	3017207879	ingvictor0929@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	06/12/2021	55221255	$297.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	24.300	0		0		0	0	0	0	24.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	24.300	0		0		0	0	0	0	24.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	97.000	0	0	0	0	0	0		97.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	97.000	0	0	0	0	0	0		97.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.400				6.400	0	0	6.400			64	6.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	48.600	0	0	48.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	48.600	48.600
Pensión	2	194.000	194.000
Riesgos Laborales	1	6.400	6.400
CCF	1	48.600	48.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	297.600	297.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	1101816024-7	victor manuel barreto salcedo		cra 14 n 1663	3017207879	ingvictor0929@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SUCRE	SINCELEJO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	06/12/2021	55221255	$297.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	92495144	GUEVARA VASQUEZ EDILBERTO MANUEL	1	0			S	X																25-14	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS002	605.684	24.300	14-4	605.684	1	3.200	CCF41	605.684	24.300	0	0	0	0	0
2	CC	92534968	MONTERROZA OTERO MARIO ALBERTO	1	0			S	X																230301	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS005	605.684	24.300	14-4	605.684	1	3.200	CCF41	605.684	24.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1101816024
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL II BARRETO SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SINCELEJO	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7820331380**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1240827658

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 0**	**$ 224.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN											SALUD								ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1101816024	BARRETO SALCEDO VICTOR MANUEL II	INDEPEND		$ 1.400.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 399.000**

Planilla Pagada
