ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04**	
FECHA 15 de septiembre de 2021	**HORA 11:00 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Rut Yurdley Sánchez Manosalva	Secretaria Distrital de Movilidad
Marco Sierra	Secretaria Distrital de Movilidad
Nelson Ricardo Beltrán Mojica	Director de Interventoría
John Jairo Arbeláez	Especialista de Transito de Interventoría
Juan José Lamk	Represéntate Legal
Luis Arnaldo Grandas Olarte	Residente de Interventoría
Liliana Yanneth Bohórquez Avendaño	Directora de obra del Contratista
Jeisson Núñez Triana	Especialista de Transito de Contratista

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos de acta anterior.
2. Programación de obra detallada para la semana que inicia.
3. Reporte resumen del avance de obra del contrato.
4. Formato de seguimiento de señalización del contrato.
5. Hoja de vida del contrato actualizada y completa, con corte a la semana anterior
6. Reporte del seguimiento de garantías del contrato objeto de supervisión.
7. Varios.
8. Aprobación acta comité.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


1. Compromisos de acta anterior.

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
No quedaron compromisos acta N° 3			

2. Programación de obra detallada para la semana que inicia.

Se presenta la programación del Contratista enviada del 15 al 21 septiembre de 2021.

TEMA	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04**	
FECHA 15 de septiembre de 2021	**HORA 11:00 am**	**LUGAR Virtual**

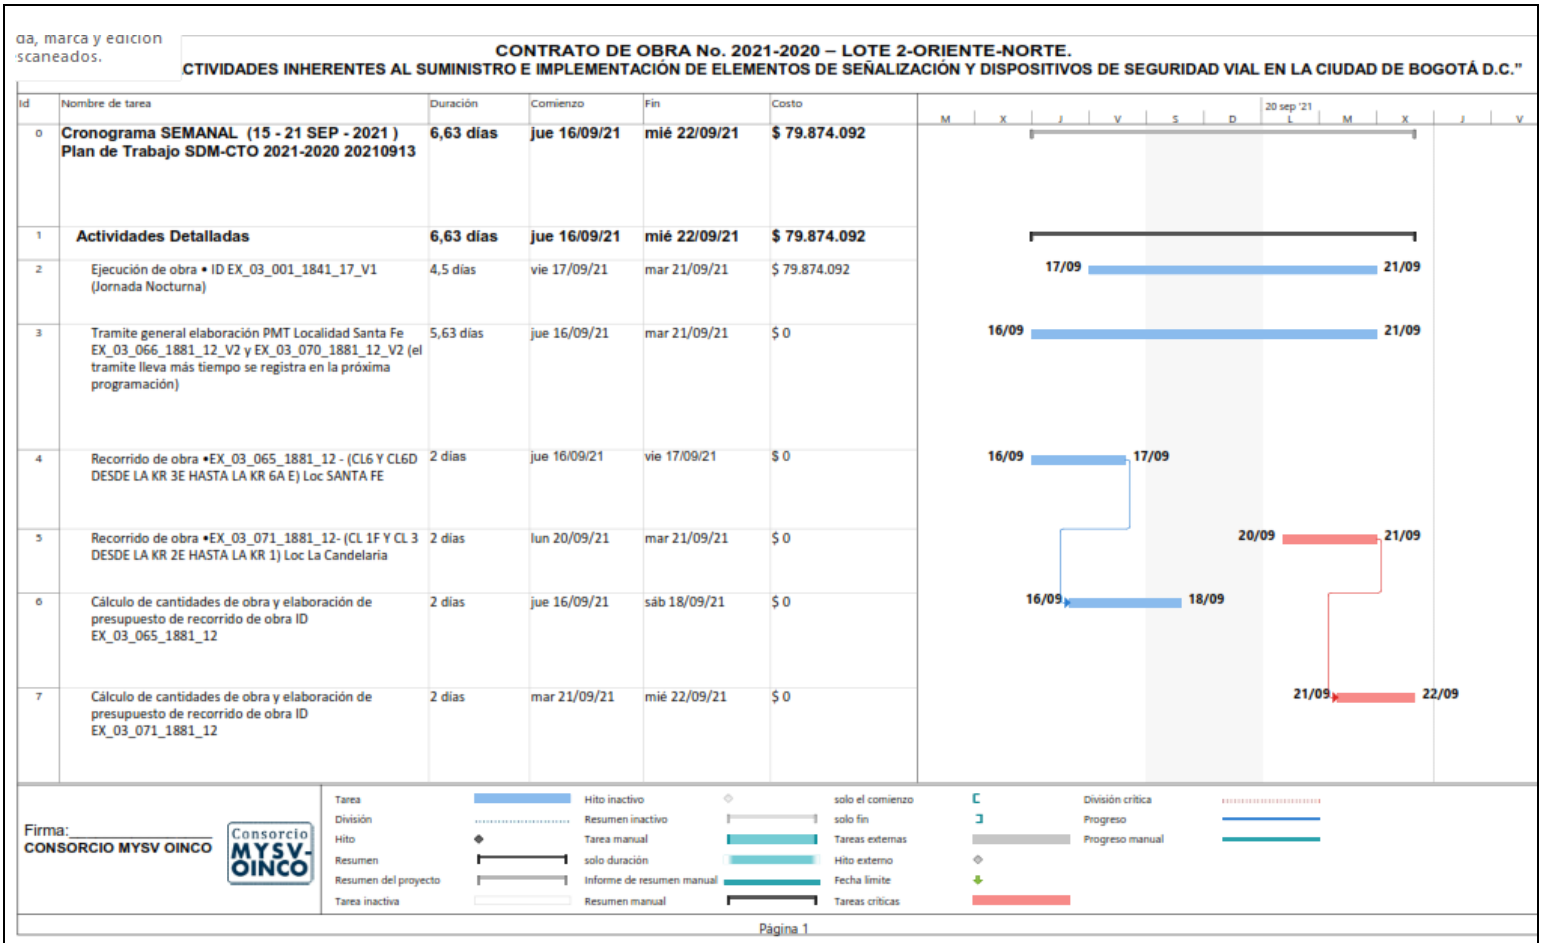

oa, marca y edicion scaneados.

CONTRATO DE OBRA No. 2021-2020 – LOTE 2-ORIENTE-NORTE.
CTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	**Cronograma SEMANAL (15 - 21 SEP - 2021) Plan de Trabajo SDM-CTO 2021-2020 20210913**	**6,63 días**	**jue 16/09/21**	**mié 22/09/21**	**$ 79.874.092**
1	**Actividades Detalladas**	**6,63 días**	**jue 16/09/21**	**mié 22/09/21**	**$ 79.874.092**
2	Ejecución de obra • ID EX_03_001_1841_17_V1 (Jornada Nocturna)	4,5 días	vie 17/09/21	mar 21/09/21	$ 79.874.092
3	Tramite general elaboración PMT Localidad Santa Fe EX_03_066_1881_12_V2 y EX_03_070_1881_12_V2 (el tramite lleva más tiempo se registra en la próxima programación)	5,63 días	jue 16/09/21	mar 21/09/21	$ 0
4	Recorrido de obra •EX_03_065_1881_12 - (CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E) Loc SANTA FE	2 días	jue 16/09/21	vie 17/09/21	$ 0
5	Recorrido de obra •EX_03_071_1881_12- (CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1) Loc La Candelaria	2 días	lun 20/09/21	mar 21/09/21	$ 0
6	Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX_03_065_1881_12	2 días	jue 16/09/21	sáb 18/09/21	$ 0
7	Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX_03_071_1881_12	2 días	mar 21/09/21	mié 22/09/21	$ 0

Firma:_____
CONSORCIO MYSV OINCO

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Tareas críticas, División crítica, Progreso, Progreso manual

Página 1

Reporte resumen del avance de obra del contrato

- **Periodo de reporte:** 16 de septiembre al 22 de septiembre de 2021.
- **Contrato y nombre del contratista:** Contrato De Obra No. 2021–2020 Zona 2.
- **Valor inicial del contrato de obra:** Diecisiete mil ochocientos veintinueve millones treinta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte. ($17.829.038.350)

RESUMEN DE ASIGNACIONES CLASIFICANDO SEGÚN SU ESTADO

N	ASIGNACIÓN	CLASIFICACIÓN	ESTADO
1	EX_03_001_1841_17_V0	Normal	Inspeccionado
2	EX_03_070_1881_12_V2	Normal	Inspeccionado
3	CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA.dwg	Prioritario	En implementación

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

4	EX_03_066_1881_12_V2	Normal	Inspeccionado
5	EX_03_078_1881_12_V4.dwg	Normal	Pendiente de Inspeccionado
6	MV_13_153_1249_11_V5.dwg	Normal	Pendiente de Inspeccionado
7	TPD_PL_2342_V2.dwg	Normal	Pendiente de Inspeccionado
8	EX_03_065_1881_12	Normal	Pendiente de Inspeccionado
9	EX_03_071_1881_12	Normal	Pendiente de Inspeccionado
10	EX_03_076_1881_12	Normal	Pendiente de Inspeccionado
11	EX_03_085_1881_12	Normal	Pendiente de Inspeccionado
12	EX_17_001_1841_17	Normal	Pendiente de Inspeccionado
13	EX_17_034_1881_12	Normal	Pendiente de Inspeccionado
14	EX_17_036_1881_12	Normal	Pendiente de Inspeccionado
15	MV_02_280_941_09	Normal	Pendiente de Inspeccionado

Respecto a la tabla anterior el contratista indica que solo tiene conocimiento de entrega de 12 ID de formar formal a través de oficios y solicita con todo respeto que se formalice la entrega de los demás ID. La interventoría manifiesta que se hará el respectivo oficio para cumplir con la solicitud del contratista, pero hace una aclaración donde indica que ya el georreferenciador de la interventoría le compartió 16 diseños al georreferencias del contratista

Reporte de las jornadas de trabajo programado, jornadas de trabajo ejecutadas y jornadas de lluvia. Tanto en horario diurno como en horario nocturno.

1. Dentro de la labor de implantación e inspeccionado no se presentaron lluvias, en la jornada de trabajo.
2. Se finalizó la implantación del ID CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA-1. correspondiente a la intersección de la calle 85 con AV Kr 7.
3. Se finalizó la inspección de los ID EX_03_066_1881_12 V2.

3. Reporte resumen del avance de obra del contrato.


Reporte resumen del avance de obra del contrato.

% Avance en tiempo:	**3,28%**
Días para finalizar el plazo del contrato:	854 días
Valor ejecutado mensual subdivido por componente (señalización vertical y horizontal):	
% Financiero Programado:	1.20%

TEMA	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04**	
FECHA 15 de septiembre de 2021	**HORA 11:00 am**	**LUGAR Virtual**

% Financiero Ejecutado:	0,16%
Valor Ejecutado Mensual Señalización Vertical:	$ 802.347,00
Valor Ejecutado Mensual Señalización Horizontal:	$ 26.972.992,00

Gráfica de avance de la Inversión:

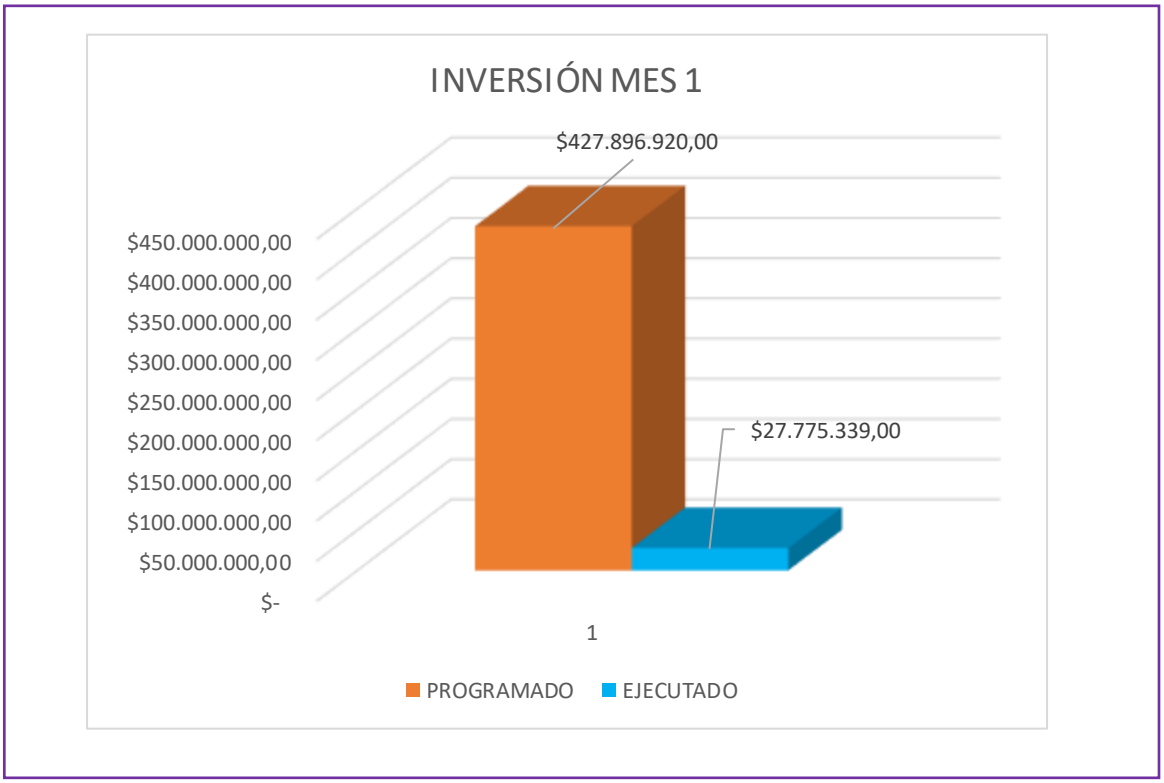

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

PRESUPUESTO AV K7 CON CALLE 85 ID CPS CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA-1					PRESUPUESTO INICIAL		CORTE 13 - SEP -2021		SALDO (+/-)	
CIV	ITEM	DESCRIPCION	unidad	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2000835	15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 296.069	1	$ 296.069	1	$ 296.069	0	$ 0
	18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 253.139	2	$ 506.278	2	$ 506.278	0	$ 0
	31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	$ 1.224	415	$ 507.960	358,8	$ 439.171	56,2	$ 68.789
	32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	$ 1.649			72,30	$ 119.223	-72,30	-$ 119.223
	33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	$ 1.874	133,4	$ 249.992	84,60	$ 158.540	48,80	$ 91.451
	34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	$ 9.345	304,058	$ 2.841.422	310,71	$ 2.903.585	-6,65	-$ 62.163
	55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	$ 4.617	415	$ 1.916.055	358,80	$ 1.656.580	56,20	$ 259.475
	56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	$ 5.888			72,30	$ 425.702	-72,30	-$ 425.702
	57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	$ 7.758	133,4	$ 1.034.917	84,60	$ 656.327	48,80	$ 378.590
	58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	$ 46.187	82,699	$ 3.819.619	127,01	$ 5.866.211	-44,31	-$ 2.046.592
	59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	$ 41.997	116,74	$ 4.902.730	35,77	$ 1.502.233	80,97	$ 3.400.497
	67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	$ 74.176	38,26	$ 2.837.974	30,32	$ 2.249.016	7,94	$ 588.957
	68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	$ 3.663	237,699	$ 870.691	66,09	$ 242.088	171,61	$ 628.604
	70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	$ 11.955	312	$ 3.729.960	282,00	$ 3.371.310	30,00	$ 358.650
	75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	$ 64.530	78	$ 5.033.340	70,00	$ 4.517.100	8,00	$ 516.240
	80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm.	UND	$ 71.000	20	$ 1.420.000	20,00	$ 1.420.000	0,00	$ 0
	94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	$ 4.061	13	$ 52.793	13,00	$ 52.793	0,00	$ 0
	100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	$ 32.092	37,59	$ 1.206.338	43,41	$ 1.393.114	-5,82	-$ 186.775
		Valor Total				$ 31.226.138		$ 27.775.339		$ 3.450.798

Observaciones.

- Se compartió con el contratista las últimas versiones de los 16 ID entregados por la SDM.
- Se realizó la revisión de la localización de la zona de influencia de los siguientes ID's dentro de las localidades pertenecientes al contrato: EX_03_001_1841_17_V1, EX_03_041_670_11_V3, EX_03_065_1881_12_V2, EX_03_066_1881_12_V2, EX_03_070_1881_12_V2, EX_03_071_1881_12_V1, EX_03_076_1881_12_V2, EX_03_085_1881_12_V1, EX_17_001_1841_17_V0, EX_17_034_1881_12_V2, EX_17_036_1881_12_V2, MV_02_280_941_09_V11, CPS_676_MV_01_04_V29, EX_03_078_1881_12_V4, MV_13_153_1249_11_V5, TPD_PL_2342_V2

- Hasta el día de hoy 14 de septiembre de 2021 el contratista no ha entregado ID's para revisión en el componente de Georreferenciación.

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

TRÁMITES PARA APROBACIONES DE PMT

El contratista presentó para revisión y aprobación el PMT General:

PMTS POR EMERGENCIA:

PMT002E - ID CPS_676_MV_01_04_V29 para la intervención de andenes de la CL 85 entre AK 7 y la KR 1, intervención 24 horas para señalización vertical

PMT004E - ID CPS_676_MV_01_04_V29 AK 7 entre CL 82 y 85 e intersección de la AK 7 X Cl 92 con actividades de señalización con cierre parcial en horario nocturno entre la 01:00 y las 04:30 am

PMTS POR ORDINARIOS:

PMT005N ID EX_03_001_1841_17_V1 para actividades de demarcación localidad de Santafé
PMT006N ID CPS_676_MV_01_04_V29 entre CL 82 y 85 e intersección de la AK 7 X Cl 92 con actividades de señalización con cierre parcial en horario nocturno entre la 01:00 y las 04:30 am. La secretaría Distrital Aclara que este PMT ya fuer aprobado el 6 de sept de 2021

Con respeto al trámite de radicación el contratista manifiesta que no es claro quien debe radicar los PMT, ya SDM indica que en los pliegos esta claro quien es la persona que debe radicarlos. A esta instrucción el directo de la interventoría manifiesta que la interventoría se procederá a realizar dichos trámites ante la SDM. En cabeza de nuestro especialista

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO

HOJA DE VIDA DEL CONTRATO ACTUALIZADA Y COMPLETA, CON CORTE A LA SEMANA ANTERIOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

No CONSECUTIVO	ID	UBICACIÓN	LOCALIDAD	ELEMENTOS A IMPLEMENTAR (SUBCATEGORÍA)	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD ESTIMADA		CUANTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE PONDERACIÓN			TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN		DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN		%Avance de implementación a la fecha de corte	Observaciones del avance/Alertas	Estado de Ejecución	Prioridad
						UN	CANT	Suministrados	Instalados	Estado de vinculación	Fecha inicio	Fecha Fin	Fecha de inicio real	Días faltantes				
1	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA DG 7Sur ENTRE KR 3 Y KR 11B E	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Inspeccionado a P	NORMAL
2	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9 A DG 3A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NOMAL
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2E Y KR 8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Inspeccionado a P	PRIORIDAD
4	CPS_676_MV_01_04_V29_0	AV KR 7 ENTRE CL 85 Y CL 32	02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert									02/09/2021				En ejecución	NORMAL
5	EX_03_078_1881_12_V4		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
6	MV_13_153_1249_11_V5		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
7	TPD_PL_2342_V2		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
8	EX_03_041_670_11	DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
9	EX_03_065_1881_12	CL 12 HASTA LA AK 1 ENTRE LA CL 22 Y LA KR 5E	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
10	EX_03_071_1881_12	CL 2B #5-78, KR 6 #1F-15, CL 6ABIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
11	EX_03_076_1881_12	KR 3E Y KR 7E DESDE CL 9B HASTA CL 10	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
12	EX_03_085_1881_12	CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
13	EX_17_001_1841_17	CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
14	EX_17_034_1881_12	AC 1B HASTA AC 2B ENTRE KR 1D Y KR 3	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
15	EX_17_036_1881_12	CL 33B HASTA CL 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
16	MV_02_280_941_09	KR 5 ENTRE CL 24 HASTA TV 2 CON AV CIRCUNVALAR	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: NOCHE ☐ NOCHE 24H ☐

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES:

OBSERVACIONES:

No.	ASIGNACIONES							LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD						
	ID Diseño	Fecha de Entrega Diseño	Medio de Entrega	Tipo (CP - Emergencia-Ciclorruta - Compromiso - Diseño)	Subcategoría	No. CP	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección	Polígono			
											Tramos			
											Puntual			
											Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
1	CPS_676_MV_01_04_V29	23/08/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Intervención Integral	1	Vertical y Horizontal	02 - Chapinero	90 PARDO RUBIO	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	4,664606	-74,046893	4,664446	-74,046917
2	EX_03_001_1841_17_V1	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	CL 4 HASTA DG 7Sur ENTRE KR 3 Y KR 11B E	4,589662	-74,073502	4,594038	-74,079941
3	EX_03_066_1881_12_V2	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	CL 9 A DG 3A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	4,592940	-74,069778	4,591976	-74,066079
4	EX_03_070_1881_12_V2	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	KR 2E Y KR 8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	4,587220	-74,072242	4,587540	-74,069983
5	EX_03_041_670_11	09/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14				
6	EX_17_034_1881_12	09/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelaria		CL 12 HASTA LA AK 1 ENTRE LA CL 22 Y LA KR 5E				
7	EX_17_036_1881_12	09/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelaria		CL 2B #5-78, KR 6 #1F-15, CL 6ABIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7				
8	EX_17_001_1841_17	09/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelaria		KR 3E Y KR 7E DESDE CL 9B HASTA CL 10				
9	EX_03_065_1881_12	09/09/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Medida de pacificación	2	Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E				
10	EX_03_071_1881_12	09/09/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Medida de pacificación	3	Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1				
11	EX_03_076_1881_12	09/09/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Medida de pacificación	4	Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		AC 1B HASTA AC 2B ENTRE KR 1D Y KR 3				
12	EX_03_085_1881_12	09/09/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Medida de pacificación	5	Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 33B HASTA CL 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1				
13	MV_02_280_941_09	09/09/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Medida de pacificación	6	Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		KR 5 ENTRE CL 24 HASTA TV 2 CON AV CIRCUNVALAR				

REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

Consorcio MYSV-OINCO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE RESULTADO
INSPECCIÓN DE OBRA

DATOS DEL CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATO SDM-2021-2020
CONTRATISTA CONSORCIO MYSV OINCO
DATOS DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 2)
CONTRATO SDM-2021-2013
INTERVENTORÍA CONSORCIO SV BOGOTÁ
ID DE DISEÑO EX_03_070_1881_12 **VERSIÓN DEL DISEÑO:** **FECHA DE INSPECCIÓN:** _07/09/2021
LOCALIDAD SANTA FE
UPZ 95. LOURDES
DIRECCIÓN DESDE CALLE 2 HASTA CALLE 3B
BAHIA:_____ CICLORUTA:_____ ZE:___X CORREDOR: _____

CONDICIONES GENERALES

No CONSECUTIVO	CIV	TRAMO	TPD			CONTAMINACIÓN			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE PAVIMENTO			AFECTACIÓN POR CONDICIONES GEOMETRICAS			IMPLEMENTAR		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA					TIPO DE MEDIDA			GARANTIAS EN MESES
																						CORTA DURACIÓN	LARGA DURACIÓN				ML	M2	UND	
			A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BAJO)	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BAJO)	B	R	M	A (ASFALTO)	C (CONCRETO)	A (ADOQUIN)	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BAJO)	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERM OP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA				
1	3001352	DG 2D CON KRA 2A ESTE			X			X	X			X	X		X			X		X						X		X		34
2	3001390	DG 2D CON KRA 2A ESTE			X			X	X			X	X		X			X		X						X		X		34
3	3001339	DG 2D CON KRA 3 ESTE			X			X	X			X			X			X		X						X		X		34
4	3001439	KRA 5 ESTE ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2D	X					X	X				X		X			X		X						X	X	X		21
5	3001439	KRA 5 ESTE ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2D	X					X	X				X		X			X		X								X		10
6	3001439	KRA 5 ESTE ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2D	X					X	X				X		X			X			X								X	10
7	3001447	CALLE 2D ENTRE CALLE 3 Y KRA 6 ESTE			X			X		X			X		X			X		X						X		X		25
8	3001447	CALLE 2D ENTRE CALLE 3 Y KRA 6 ESTE			X			X		X			X		X			X			X								X	16
9	3001397	CALLE 3 CON KRA 3 ESTE	X					X	X				X		X			X		X						X		X		21
10	3001387	CALLE 3 ENTRE KRA 5B ESTE Y KRA 5 ESTE	X					X	X				X		X			X		X						X	X	X		21
11	3001422	CALLE 3 ENTRE KRA 5B ESTE	X					X	X				X		X			X		X						X	X	X		21
12	3001422	CALLE 3 ENTRE KRA 5B ESTE	X					X	X				X		X			X			X								X	10
13	3001371	KRA 5 ESTE CON CALLE 3			X			X	X				X		X			X		X						X		X		99
14	3001398	KRA 3 ESTE	X					X	X				X		X			X		X						X	X	X		21
15	3001398	KRA 3 ESTE	X					X	X				X		X			X			X								X	10
16	3001334	KRA 5 B ESTE ENTRE CALLLE 3B Y CALLE 3A			X			X	X				X		X			X		X						X	X	X		34
17	3001334	KRA 5 B ESTE ENTRE CALLLE 3B Y CALLE 3A			X			X	X				X		X			X			X								X	20
18	3002990	CALLE 3BIS CON KRA 5B ESTE	NO SE IMPLEMENTAN DCH PORQUE LOS ANCHOS Y ESPACIOS DE TRABAJO NO CUMPLEN																											
19	3002889	CALLE 3BIS CON KRA 5B ESTE	X					X	X				X		X			X		X						X		X		21
20	3001506	KRA 8 ESTE ENTRE DG 3 BIS B Y DG 3BIS A			X			X	X				X		X			X		X						X	X	X		34
21	3002880	CALLE 3BIS CON KRA 8 ESTE	X					X	X				X		X			X		X						X	X	X		21
22	3001506	KR 8 ESTE ENTRE DG 3BISA Y DG 3BISB			X			X	X				X		X			X		X						X	X	X		34
23	3001542	KR 8 ESTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 3BIS			X			X	X				X		X			X		X						X	X	X		34
24	3001559	KR 8 ESTE ENTRE CALLE 2C Y CALLE 3			X			X	X				X		X			X		X						X	X	X		34
25	3001560	TV 7ABIS ESTE CON KRA 8ESTE		X				X		X			X		X			X		X						X	X	X		21
26	3001539	KR 8 ESTE ENTRE CALLE 2C Y CALLE 3			X			X		X			X		X			X		X						X		X		25
27	3001517	CALLE 3 ENTRE KRA 7A ESTE Y KRA 7ESTE		X				X		X			X			X		X		X						X	X	X		22
28	3001551	KRA 7 ESTE CON CALLE 3			X			X		X			X		X			X		X						X		X		25
29	3001495	CALLE 3 ENTRE KR 7A ESTE Y KRA 6A ESTE		X				X		X			X		X			X		X						X		X		21
30	3001422	CALLE 3 CON KRA 6A ESTE		X				X		X			X		X			X		X						X		X		21
31	3001531	TV 5BIS ESTE ENTRE CALLE 2BIS B Y KRA 5 AESTE		X				X	X				X			X		X		X						X	X	X		28
32	3001545	KRA 5 ESTE CON TV 5BIS ESTE		X				X	X				X			X		X		X						X	X	X		28
33	3002268	KRA 5 ESTE CON CALLE 2A		X				X	X				X			X		X		X						X		X		28
34	3001468	KRA 5 ESTE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2C		X				X	X				X			X		X		X						X	X	X		28
35	3001468	KRA 5 ESTE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2C		X				X	X				X			X		X			X								X	16
36	3001481	CALLE 2C ENTRE KR 5ESTE Y KRA 6ESTE			X			X	X			X			X			X		X						X	X	X		34
37	3001481	CALLE 2C ENTRE KR 5ESTE Y KRA 6ESTE			X			X	X			X			X			X			X								X	20
38	3001509	KRA 6ESTE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2C			X			X	X				X			X		X		X						X		X		35
39	3001448	KRA 6ESTE ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2D			X			X	X				X			X		X		X						X	X	X		35
40	3001447	CALLE 2D ENTRE KRA 6A ESTE Y KRA 6 ESTE			X			X	X				X		X			X		X						X	X	X		34
41	3001507	CALLE 2 C CON KRA 6 ESTE			X			X	X			X				X		X		X						X	X	X		35

REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual




REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	16/07/2021	16/07/2024	$ 5,348,711,505.00
PRESTACIONES SOCIALES	16/07/2021	16/01/2027	$ 3,565,807,670.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	16/12/2023	16/07/2024	$ 5,348,711,505.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	16/12//2023	16/01/2029	$ 5,348,711,505.00
N° Póliza NB-100036498 - Seguros Mundial - - Fecha Aprobación: 03/08/2021 Responsabilidad Civil Extracontractual			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	16/07/2021	16/01/2024	$ 891,451,917.50

REPORTE DEL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

ANTES

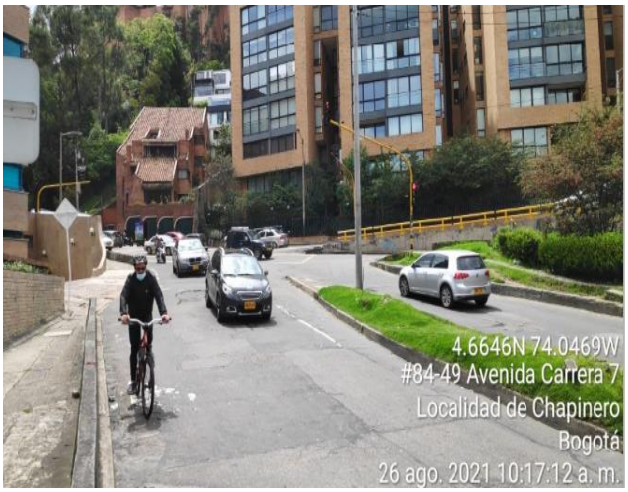

DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



4. Temas varios

Para aclarar el tema del diseño del ID CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA., es necesarios realizar una reunión o mesa de trabajo entre las tres partes para definir realmente el alcance del mismo y su última versión. La reunión se programará para la siguiente semana.

TEMA	COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 04	
FECHA 15 de septiembre de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

5. Aprobación de presente Acta.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Notificar por escrito los diseños entregados por la SDM desde de la plataforma designada por ellos para ese proceso.	Interventoría	Inmediato
Solicitud de cronograma tentativo para quitar la ciclorruta de la AV K 7 por semanas.	Contratista	16-9-2021
Entrega del PAC para octubre y noviembre 2021	Contratista/interventoría	17-9-2021
Programar reunión con SIG	Interventoría	21-9-2021

APROBADO

Liliana Y Bohórquez A.

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
