ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 07**

FECHA 06 de octubre de 2021	**HORA 9:00 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Rut Yurdley Sánchez Manosalva	Secretaria Distrital de Movilidad
Juan Camilo Rodríguez Cárdenas	Secretaria Distrital de Movilidad
Ross Slendy Martínez Angulo	Secretaria Distrital de Movilidad
Marco Sierra	Secretaria Distrital de Movilidad
Miguel Andrés Forero	Secretaria Distrital de Movilidad
John Alexander Torres Pérez	Secretaria Distrital de Movilidad
Nelson Ricardo Beltrán Mojica	Director de Interventoría
John Jairo Arbeláez	Especialista de Transito de Interventoría
Juan José Lamk	Represéntate Legal
Luis Arnaldo Grandas Olarte	Residente de Interventoría
Liliana Yanneth Bohórquez Avendaño	Directora de obra del Contratista
Jeisson Núñez Triana	Especialista de Transito de Contratista

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos de acta anterior.
2. Programación de obra detallada para la semana que inicia.
3. Reporte resumen del avance de obra del contrato.
4. Formato de seguimiento de señalización del contrato.
5. Hoja de vida del contrato actualizada y completa, con corte a la semana anterior
6. Reporte del seguimiento de garantías del contrato objeto de supervisión.
7. Varios.
8. Aprobación acta comité.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Compromisos de acta anterior.

   Para el primer compromiso la SDM indica que no ha recibido respuesta y manifiesta que en el momento que se cuente con ella se remitirá correo.

   Para el segundo compromiso no se cumplió y se reitera la necesidad se presentarlo de forma prioritaria.

   Para el tercer compromiso, la SDM reitera que se debe cambiar la redacción del compromiso, porque las obligaciones de tramitarlo son del contratista y de radicarlo de la Interventoría, a su vez el contratista informa que en la mañana de hoy se realizó reunión con la subdirección de PMT y se aclararon los temas para el trámite de los PMT.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Revisión Garantías generales contrato 2021-2020	SDM	06-10-2021
Plan de Contingencia	Contratista	29-9-2021
Aprobación PMT 24 horas	Interventoría / SDM	06-10-2021

2. Programación de obra detallada para la semana que inicia.


   PROGRAMACIÓN OBRA

   Resumen breve actividades:
   Se programan actividades de implementación en el ID EX_03_001_1841_17 y EX_02_356_946_10_V6

   PROGRAMACIÓN INTERVENTORÍA

   Resumen breve actividades:
   Seguimiento a las actividades de implementación en el ID EX_03_001_1841_17 y EX_02_356_946_10_V6.

Se presenta la programación del Contratista enviada del 6 de octubre al 12 de octubre de 2021.

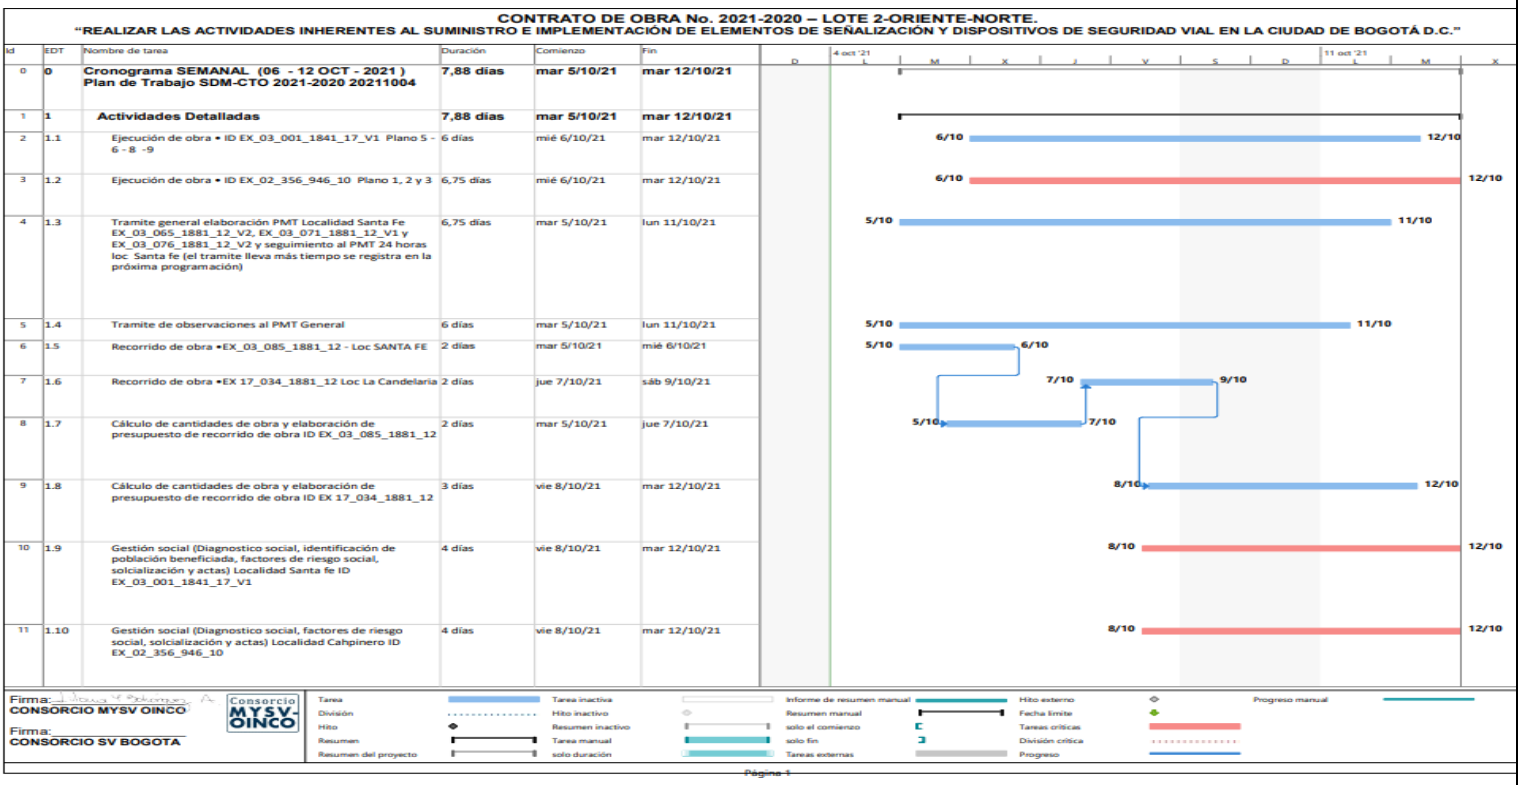

CONTRATO DE OBRA No. 2021-2020 – LOTE 2-ORIENTE-NORTE.
"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	**Cronograma SEMANAL (06 - 12 OCT - 2021) Plan de Trabajo SDM-CTO 2021-2020 20211004**	**7,88 días**	**mar 5/10/21**	**mar 12/10/21**
1	1	**Actividades Detalladas**	**7,88 días**	**mar 5/10/21**	**mar 12/10/21**
2	1.1	Ejecución de obra • ID EX_03_001_1841_17_V1 Plano 5 - 6 - 8 -9	6 días	mié 6/10/21	mar 12/10/21
3	1.2	Ejecución de obra • ID EX_02_356_946_10 Plano 1, 2 y 3	6,75 días	mié 6/10/21	mar 12/10/21
4	1.3	Tramite general elaboración PMT Localidad Santa Fe EX_03_065_1881_12_V2, EX_03_071_1881_12_V1 y EX_03_076_1881_12_V2 y seguimiento al PMT 24 horas loc Santa fe (el tramite lleva más tiempo se registra en la próxima programación)	6,75 días	mar 5/10/21	lun 11/10/21
5	1.4	Tramite de observaciones al PMT General	6 días	mar 5/10/21	lun 11/10/21
6	1.5	Recorrido de obra •EX_03_085_1881_12 - Loc SANTA FE	2 días	mar 5/10/21	mié 6/10/21
7	1.6	Recorrido de obra •EX 17_034_1881_12 Loc La Candelaria	2 días	jue 7/10/21	sáb 9/10/21
8	1.7	Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX_03_085_1881_12	2 días	mar 5/10/21	jue 7/10/21
9	1.8	Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX 17_034_1881_12	3 días	vie 8/10/21	mar 12/10/21
10	1.9	Gestión social (Diagnostico social, identificación de población beneficiada, factores de riesgo social, solcialización y actas) Localidad Santa fe ID EX_03_001_1841_17_V1	4 días	vie 8/10/21	mar 12/10/21
11	1.10	Gestión social (Diagnostico social, factores de riesgo social, solcialización y actas) Localidad Cahpinero ID EX_02_356_946_10	4 días	vie 8/10/21	mar 12/10/21

Firma:
CONSORCIO MYSV OINCO
Firma:
CONSORCIO SV BOGOTA

El contratista informa que se presentó la programación semanal y el cronograma completo de la intervención del ID EX_02_356_946_10_V6, la SDM indica que recibió ese cronograma y solicita que para estos compromisos se de mayor celeridad ya que son compromisos que vienen del secretario directamente.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES DE INTERVENTORÍA													
Contrato:	2021-2013												
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 2) CONTRATO 2020-2013												
Periodo:	Desde	6 de octubre de 2021	hasta	12 de octubre de 2021									
1. Presentación actividades semanales contrato adjunto de obra													



2. Actividades de Interventoría para cumplimiento de funciones

Actividad	6/10/21 M	7/10/21 J	8/10/21 V	9/10/21 S	10/10/21 D	11/10/21 L	12/10/21 M	Responsable
Reunión con contratista para seguimiento semanal								Director Interventoría
Ejecución de obra • ID EX_03_001_1841_17_V1 Plano 5 - 6 - 8 -9								Residente Nocturno y aux. Ing.
Ejecución de obra • ID EX_02_356_946_10 Plano 1, 2 y 3								Residente Nocturno y aux. Ing.
Tramite general elaboración PMT Localidad Santa Fe EX_03_065_1881_12_V2, EX_03_071_1881_12_V1 y EX_03_076_1881_12_V2 y seguimiento al PMT 24 horas loc Santa fe (el tramite lleva más tiempo se registra en la próxima programación)								Especialista de Tránsito
Tramite de observaciones al PMT General								Especialista de Tránsito
Recorrido de obra •EX_03_085_1881_12 - Loc SANTA FE								Residente diurno y aux. Ing.
Recorrido de obra •EX 17_034_1881_12 Loc La Candelaria								Residente diurno y aux. Ing.
Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX_03_085_1881_12								Residente diurno y aux. Ing.
Cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuesto de recorrido de obra ID EX 17_034_1881_12								Residente diurno y aux. Ing.
Gestión social (Diagnostico social, identificación de población beneficiada, factores de riesgo social, solcialización y actas) Localidad Santa fe ID EX_03_001_1841_17_V1								Residente diurno y aux. Ing.
Gestión social (Diagnostico social, factores de riesgo social, solcialización y actas) Localidad Cahpinero ID EX_02_356_946_10								Residente diurno y aux. Ing.
Verificación presupuestos diseños								Director Interventoría

EJECUCIÓN FÍSICA

ACTIVIDADES CONTRATISTA 22- AL 28 DE SEPTIEMBRE

Se realizan actividades en el ID EX_03_001_1841_17_V1 de implementación de señalización horizontal plano 3 y 6.
Se inició con las actividades en el ID EX_02_356_946_10 de señalización horizontal de los planos 1


% Avance en tiempo:	**5,55%**
Días para finalizar el plazo del contrato:	834

VALOR EJECUTADO MENSUAL SUBDIVIDO POR COMPONENTE (SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL):

% Financiero Programado Contrato:	5,95%
% Financiero Ejecutado Contrato:	0,99%
Valor Programado para el mes	$ 1.061.535.699,00
% Financiero Programado para el mes:	75,00%
% Financiero Ejecutado para el mes:	15,91%
Atraso / Adelanto mes	-59,09%
Valor Ejecutado Mensual Señalización Vertical:	$ 802.347,00
Valor Ejecutado Mensual Señalización Horizontal:	$ 144.277.896,59
Suministros	$ 31.284.800,00
Valor ejecutado en el mes	$ 176.365.043,59

GRÁFICA DE AVANCE DE LA INVERSIÓN:

Para el periodo el avance reportado es del 0,99% vs el avance aculado del 5,94%, eso indica que se trae un atraso del 4,96% con respecto al global del contrato

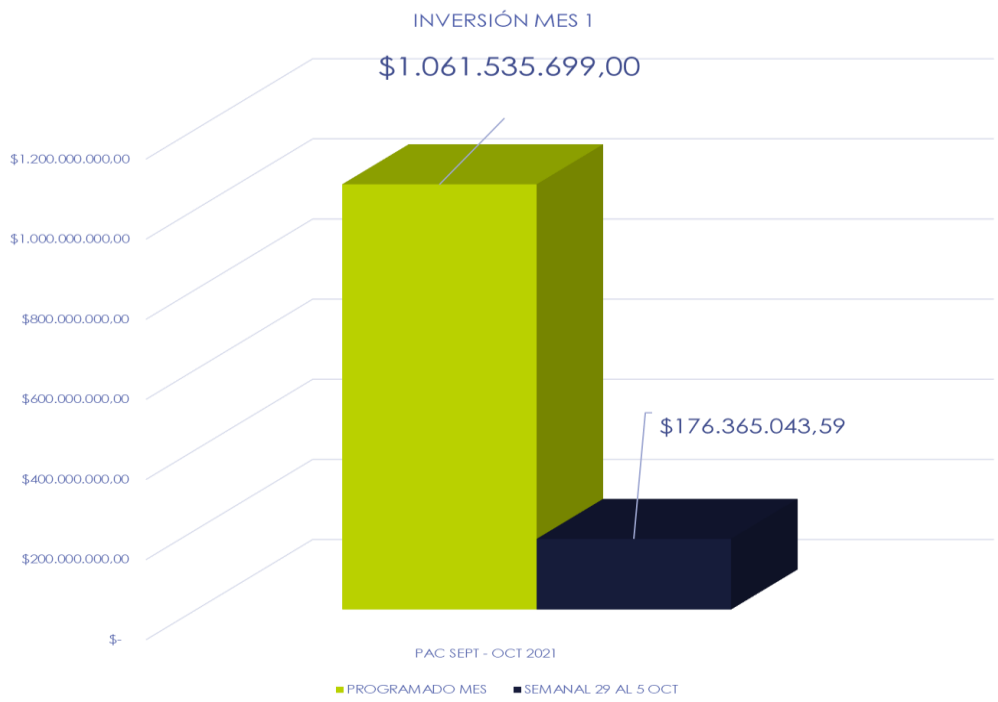

La SDM indica que de acuerdo con lo expresado por la interventoría pregunta que si ya se tiene alguna estrategia para lograr el cumplimento de las metas trazadas, el contratista informa que hoy se dará respuesta al requerimiento hecho por la interventoría y en el se plasmará las posibles alternativas para lograr el cumplimiento de las metas.

TRÁMITES PARA APROBACIONES DE PMT
PMT General - **LOTE 2-ZONA ORIENTE – NORTE**
Aprobado mediante oficio SDM-SPMT-20213126464821 fechado septiembre 22 de 2021

PMTS POR EMERGENCIA:

En proceso el PMT012E - ID EX_02_356_946_10_V6 - bahías de parqueo como prueba piloto de estacionamiento en vía por medio de cobro.

PMTS POR ORDINARIOS:

PMT MASIVO - PMT014M_EX_02_356_946_10_V6 – Continuación
PMT MASIVO - PMT015M_EX_03_001_1841_17_V1 - CL 4 hasta DG 7 Sur entre KR 3 y KR 11B E
PMT MASIVO - PMT016N_EX_03_001_1841_17_V1 - DG 2BIS - KR 3A, KR 2BIS - TV 2A y KR 6A E - CL 3 S
PMT MASIVO - PMT017M_EX_03_076_1881_12_V2 - CL 19 hasta CL 26 entre KR 10 y KR 3

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

No CONSECUTIVO	ID	UBICACIÓN	LOCALIDAD	ELEMENTOS A IMPLEMENTAR (SUBCATEGORÍA)	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD ESTIMADA		CUANTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE PONDERACIÓN			TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN		DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN		%Avance de implementación a la fecha de corte	Observaciones del avance/Alertas	Estado de Ejecución	Prioridad
						UN	CANT	Suministrados	Instalados	Estado de vinculación	Fecha inicio	Fecha Fin	Fecha de inicio real	Días faltantes				
1	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA DG 75ur ENTRE KR 3 Y KR 11B E	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Inspeccionado a P	NORMAL
2	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9 A DG 3A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NOMAL
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2E Y KR 8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Inspeccionado a P	PRIORIDAD
4	CPS_676_MV_01_04_V29_0	AV KR 7 ENTRE CL 85 Y CL 32	02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert									2/09/2021				En ejecución	NORMAL
5	EX_03_078_1881_12_V4		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
6	MV_13_153_1249_11_V5		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
7	TPD_PL_2342_V2		02 - CHAPINERO	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
8	EX_03_041_670_11	DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
9	EX_03_065_1881_12	CL 12 HASTA LA AK 1 ENTRE LA CL 22 Y LA KR 5E	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
10	EX_03_071_1881_12	CL 2B #5-78, KR 6 #1F-15, CL 6ABIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
11	EX_03_076_1881_12	KR 3E Y KR 7E DESDE CL 9B HASTA CL 10	17 - CANDELARIA	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
12	EX_03_085_1881_12	CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
13	EX_17_001_1841_17	CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
14	EX_17_034_1881_12	AC 19 HASTA AC 26 ENTRE KR 10 Y KR 3	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
15	EX_17_036_1881_12	CL 33B HASTA CL 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL
16	MV_02_280_941_09	KR 5 ENTRE CL 24 HASTA TV 2 CON AV CIRCUNVALAR	03 - SANTA FÉ	Señalización Horiz y Vert													Por inspeccionar	NORMAL

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: NOCHE [ ] NOCHE 24H [ ]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES:

OBSERVACIONES:

HOJA DE VIDA DEL CONTRATO ACTUALIZADA Y COMPLETA, CON CORTE A LA SEMANA ANTERIOR

No.	ASIGNACIONES							LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD			Polígono					
											Puntual		Tramos			
	ID Diseño	Fecha de Entrega Diseño	Medio de Entrega	Tipo (CP - Emergencia-Cicloruta - Compromiso - Diseño)	Subcategoría	No. CP	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
1	CPS_676_MV_01_04_V29	23/08/2021	Correo	Compromiso Prioritario	Intervención Integral	1	Vertical y Horizontal	02 - Chapinero	90 PARDO RUBIO	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	4,664606	-74,046893	4,664446	-74,046917	4,618842	-74,068297
2	EX_03_001_1841_17_V1	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	CL 4 HASTA DG 7Sur ENTRE KR 3 Y KR 11B E	4,589862	-74,073502	4,584038	-74,079941	4,576438	-74,074313
3	EX_03_066_1881_12_V2	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	CL 9 A DG 3A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	4,592940	-74,069778	4,591976	-74,066079	4,584105	74,068004
4	EX_03_070_1881_12_V2	19/08/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé	96 LOURDES	KR 2E Y KR 8E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	4,587220	-74,072242	4,587540	-74,069983	4,583003	-74,072295
5	EX_03_041_670_11	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14						
6	EX_17_034_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelria		CL 12 HASTA LA AK 1 ENTRE LA CL 22 Y LA KR 5E						
7	EX_17_036_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelria		CL 2B #5-78, KR 6 #1F-15, CL 6ABIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7						
8	EX_17_001_1841_17	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Zona escolar		Vertical y Horizontal	17 - La Candelria		KR 3E Y KR 7E DESDE CL 9B HASTA CL 10						
9	EX_03_065_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E						
10	EX_03_071_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 1F Y CL 3 DESDE LA KR 2E HASTA LA KR 1						
11	EX_03_076_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		AC 19 HASTA AC 26 ENTRE KR 10 Y KR 3						
12	EX_03_085_1881_12	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		CL 33B HASTA CL 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1						
13	MV_02_280_941_09	9/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé		KR 5 ENTRE CL 24 HASTA TV 2 CON AV CIRCUNVALAR						
14	EX_03_078_1881_12	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé								
15	MV_13_153_1249_11_V5	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé								
16	TPD_PL_2342_V2	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	03 - Santa Fé								
17	EX_02_356_946_10	23/09/2021	Correo	Diseño Normal	Medida de pacificación		Vertical y Horizontal	02 - Chapinero								

REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Consorcio MYSV-OINCO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE RESULTADO
INSPECCIÓN DE OBRA

DATOS DEL CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATO SDM-2021-2020
CONTRATISTA CONSORCIO MYSV OINCO


DATOS DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 2)
CONTRATO SDM-2021-2013
INTERVENTORÍA CONSORCIO SV BOGOTÁ

ID DE DISEÑO EX_03_071_1881_12 **VERSIÓN DEL DISEÑO:** **FECHA DE INSPECCIÓN:** 17/09/2021
LOCALIDAD SANTA FE
UPZ 96 LOURDES
DIRECCIÓN CALLE 1F Y CALLE 3 DESDE KR HASTA KRA 2 E
BAHIA: **CICLORUTA:** **ZE:** **CORREDOR:**

CONDICIONES GENERALES

No CONSECUTIVO	CIV	TRAMO	TPD			CONTAMINACIÓN			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE PAVIMENTO			AFECTACIÓN POR CONDICIONES GEOMETRICAS			IMPLEMENTAR		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						TIPO DE MEDIDA			GARANTIAS EN MESES
																						CORTA DURACIÓN	LARGA DURACIÓN					ML	M2	UND	
			A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BAJO)	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BAJO)	B	R	M	A (ASFALTO)	C (CONCRETO)	A (ADOQUIN)	A (ALTO)	M (MEDIO)	B (BAJO)	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERM OP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA				
1	3001188	CALLE 3A ENTRE KRA 1 ESTE Y KRA 1B ESTE			X	X			X				X		X			X		X					X		X	X		25
2	3001262	KRA 1 ESTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 3A		X				X	X				X			X		X		X					X			X		28
3	3001331	KRA 1 ESTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2B		X				X	X				X			X		X		X					X			X		28
4	3001268	CALLE 3 ENTRE KRA 1 ESTE Y KRA 1A ESTE	X					X			X		X		X			X		X					X		X	X		28
5	30000437	KRA 1A ESTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2B		X				X	X				X			X		X		X					X		X	X		28
6	3002269	CALLE 3 ENTRE KRA 1A ESTE Y KRA 1B ESTE	X					X			X		X		X			X		X					X		X	X		28
7	3001267	KRA 1B ESTE ENTRE CALLE 3 Y DG 3A		X				X	X				X			X		X		X		X					X	X		10
8	3001270	CALLE 3 ENTRE KRA 1B ESTE Y DG 3A	X					X			X		X		X			X		X					X		X	X		28
9	3001270	CALLE 3 ENTRE KRA 1B ESTE Y DG 3A	X					X			X		X		X			X			X								X	28
10	3001269	DG 3A ENTRE CALLE 3A Y CALLE 3		X				X	X				X			X		X		X		X					X	X		10
11	3001269	DG 3A ENTRE CALLE 3A Y CALLE 3		X				X	X				X			X		X		X								X		21
12	3001270	CALLE 3 ENTRE KRA 1B ESTE Y DG 3A	X					X			X		X		X			X		X								X		28
13	3001271	KRA 2 ESTE ENTRE DG3ABIS Y CALLE 3			X		X			X			X		X			X		X		X					X	X		8
14	3001271	KRA 2 ESTE ENTRE DG3ABIS Y CALLE 3			X		X			X			X		X			X		X		X						X		18
15	3002862	CALLE 3 ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE 3	X					X		X			X			X		X		X					X		X			7
16	3002862	CALLE 3 ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE 3	X					X		X			X			X		X		X					X			X		13
17	3001329	DG 2D ENTRE VIA PEATONAL Y CALLE 3		X				X		X			X		X			X		X					X		X	X		21
18	3001329	DG 2D ENTRE VIA PEATONAL Y CALLE 3		X				X		X			X		X			X		X					X			X		14
19	3002186	KRA 2 ESTE CALLE 2A Y CALLE 3		X				X	X				X		X			X		X		X					X	X		9
20	3002186	KRA 2 ESTE CALLE 2A Y CALLE 3		X				X	X				X		X			X		X		X						X		17
21	3002186	KRA 2 ESTE CALLE 2A Y CALLE 3		X				X	X				X		X			X			X								X	14
22	3001519	KRA 2 ESTE ENTRE CALLE 2A Y VIA PEATONAL		X			X		X				X		X			X		X					X		X			23
23	3001533	KRA 2 ESTE ENTRE VIA PEATONAL Y CALLE 1F BIS		X			X		X				X		X			X		X					X		X			23
24	3001514	CALLE 1F ENTRE KRA 2 ESTE Y KRA 1A ESTE		X				X	X				X			X		X		X					X		X	X		28
25	3001514	CALLE 1F ENTRE KRA 2 ESTE Y KRA 1A ESTE		X				X	X				X			X		X			X								X	16
26	3001514	CALLE 1F ENTRE KRA 2 ESTE Y KRA 1A ESTE		X				X	X				X			X		X		X					X			X		21
27	3002175	TRANSVERSAL 1 ENTRE KRA 1A ESTE Y KRA 1		X				X		X			X			X		X		X					X		X	X		19
28	3002175	TRANSVERSAL 1 ENTRE KRA 1A ESTE Y KRA 1		X				X		X			X			X		X		X								X		9
29	3002175	TRANSVERSAL 1 ENTRE KRA 1A ESTE Y KRA 1		X				X		X			X			X		X			X								X		15
30	3001529	KRA 1AE ENTRE CALLE 1F Y CALLE 1F BIS			X		X		X				X		X			X		X		X						X	X		9
31	3001529	KRA 1AE ENTRE CALLE 1F Y CALLE 1F BIS			X		X		X				X		X			X			X									X	16
32	3001501	KRA 1AE ENTRE CALLE 1F BIS Y CALLE 2			X		X			X			X		X			X		X		X						X	X		8
33	3001501	KRA 1AE ENTRE CALLE 1F BIS Y CALLE 2			X		X			X			X		X			X		X		X						X	X		18
34	3001501	KRA 1AE ENTRE CALLE 1F BIS Y CALLE 2			X		X			X			X		X					X		X								X	14
35	3001496	CALLE 2 ENTRE KRA 1A ESTE Y KRA 1B ESTE			X			X		X			X			X		X		X		X						X	X		9
36	3001477	KRA 1AE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2BIS			X			X		X			X			X		X		X		X							X		9
37	3001459	KRA 1A ESTE ENTRE CALLE 2			X			X			X		X			X		X		X		X						X	X		8
38	3001459	KRA 1A ESTE ENTRE CALLE 2			X			X			X		X			X		X			X									X	18
39	3002184	KRA 1A ESTE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2BIS			X			X			X		X			X		X		X		X						X			8
40	3002860	KRA 1A ESTE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B			X			X		X			X		X					X		X							X		9
41	3001409	CALLE 2A ENTRE KRA 1A ESTE Y KRA 1 ESTE			X			X		X			X		X					X		X						X	X		9
42	3001410	KRA 1 ESTE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2B			X			X		X			X		X					X		X							X		9
43	3001424	CALLE 2 BIS ENTRE KRA 1A Y KRA 1		X				X			X		X		X			X		X		X						X			17

Nota: El formato costa de 5 hojas, algunos CIV después del cálculo de la garantía da por debajo de 6 meses

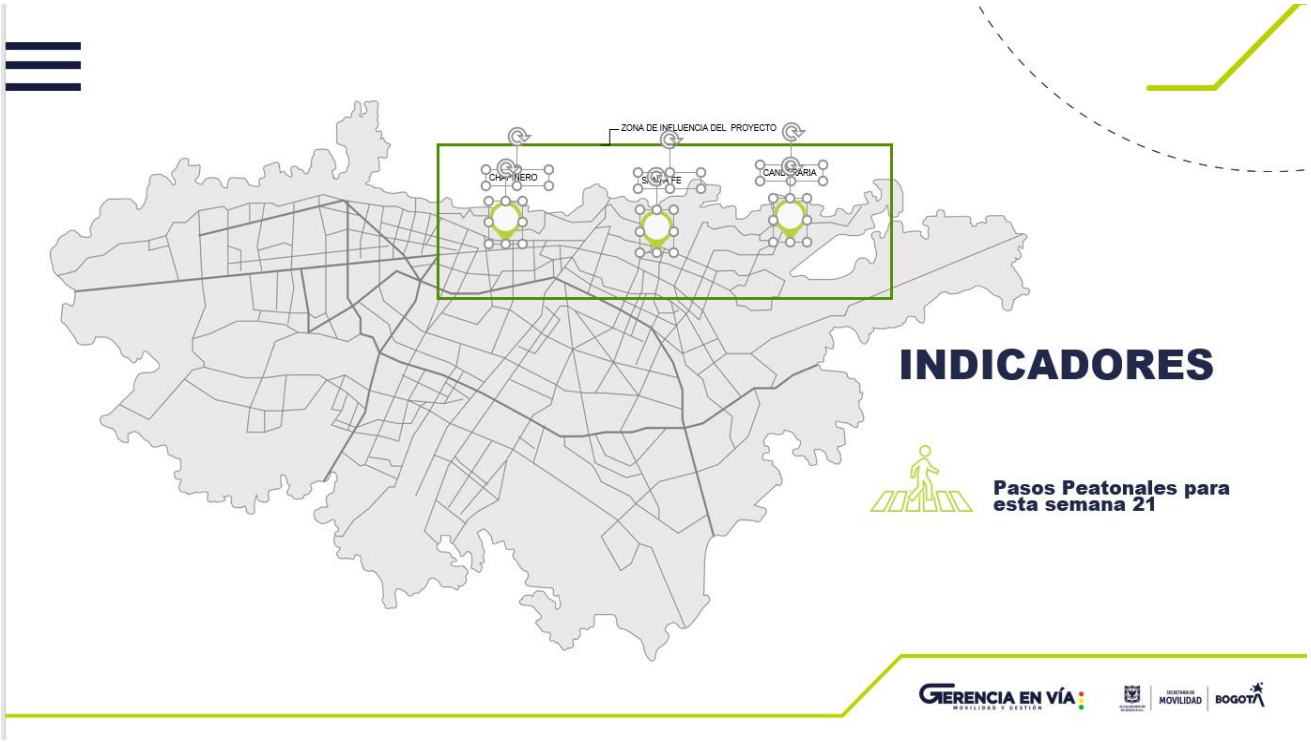

REPORTE DEL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ANTES
CALLE 1. CRA. 4



DESPUÉS
CALLE 1. CRA. 4



ANTES
CALLE 93B CON CRA 18



DESPUÉS
CALLE 93B CON CRA 18



COMPARATIVO SEMANAS: 15 A 21 DE SEPT - 22 A 29 DE SEPT

El avance semanal fue de $ 36,132,009,59 por consiguiente no se cumplió el PAC de la semana



CONCLUSIÓN

El contratista presenta atraso de 5% con respecto a la ejecución presupuestal
Se deben poner en marcha de forma inmediata los planes de contingencia

TEMAS VARIOS

1. La SDM solicita se presente los indicadores de corte mensual el cual debe ser incluido en el informe mensual.

2. Se solicita incluir en las actas a los funcionarios de la SDM, ya que no están quedando

3. La SDM informa que se remitió un correo electrónico con información de cuáles son trámites para entrega de almacén.

4. Se pone en discusión el tema de estacionamiento en vía y el contratista y la interventoría informan las observaciones que se encontraron en el proceso de implantación en vía, como es un parqueadero de discapacitados sobre un sumidero, la SDM indica que estas cosas no deben pasar y se tomaran los correctivos necesarios para la correcta implantación y solicita se envíe un correo con todas las observaciones para dar solución.

   El contratista pregunta

   - .¿Si dentro de la ejecución se llega a presentar un problema similar se puede tomar la decisión en sitio de eliminar un cupo de estacionamiento?

   - Con respecto al diseño de la señalización, como el contrato no tiene ese ítem de diseño, pero si le interesa y se hará y solicita mesa de trabajo.

     Con respeto a este tema de diseño la SDM indica que es viable la solicitud

   La SDM solicita revisar la cantidad de cupos que se deben implementar, ya que a la fecha se han asignado algunos cupos con ID entregado. Con respeto a esta reconvención la Supervisora del contrato pregunta que, si a este contrato se le asignaran más diseños y se indica que sí, que son alrededor de 1000 sobre la localidad de chapinero.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Revisión Garantías generales contrato 2021-2020	SDM	13-10-2021
Plan de Contingencia	Contratista	Inmediata
Entrega de Indicadores Mensuales	Interventoría	08-10-2021

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
