Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
		Pagina: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No.:	8	FECHA DEL INFORME:	martes, 7 de diciembre de 2021

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-30-0626-21	Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE VIAS.
Contratista:	ASFALTOS Y VÍAS S.A.S		
NIT:	800.191.307-6		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 380.000.000	Plazo Inicial:	255	dias	Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	

ACTA DE SUSPENSIÓN		ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:	ACTA DE REINICIO No.2:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 380.000.000		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	255	dias
Fecha de iniciación:	09 de abril de 2021		Fecha de vencimiento:	viernes, 24 de diciembre de 2021	


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
	CUMPLIMIENTO	NA				
	PRESTACIONES SOCIALES	NA				
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	Na				
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NA				

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	50,00%	31,56%	-18,44%
Durante el periodo	12,50%	10,69%	-1,81%
Acumulad Actual	87,50%	77,24%	-10,26%

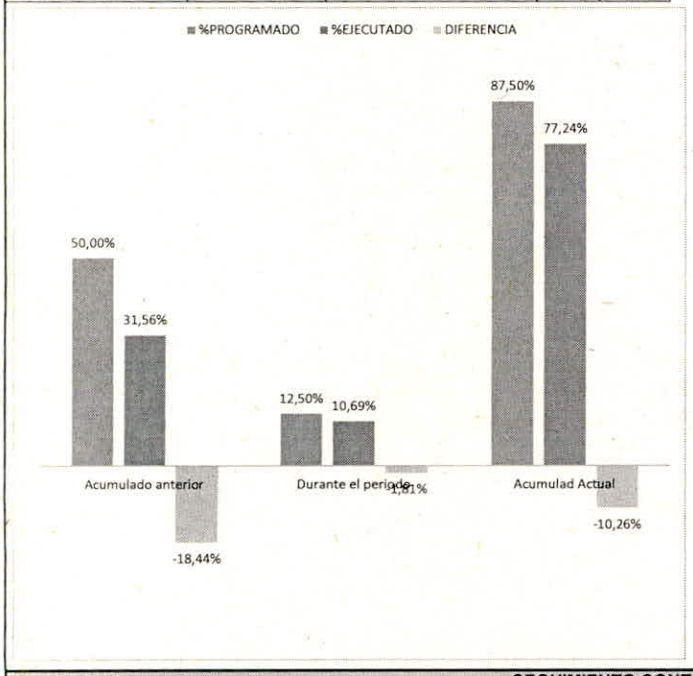

PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	12,50%	87,50%
Valor de la Obra	$ 47.500.000	$ 332.500.000

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	10,69%	77,24%
Valor de la Obra	$ 40.611.278	$ 293.510.525

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 380.000.000
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 293.510.525
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 86.489.475
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 22.539.052		$ 22.539.052	5,93%	21-05-21
2	$ 22.245.787		$ 22.245.787	5,85%	21-06-21
3	$ 35.123.559		$ 35.123.559	9,24%	21-07-21
4	$ 40.029.844		$ 40.029.844	10,53%	02-09-21
5	$ 42.105.017		$ 42.105.017	11,08%	20-09-21
6	$ 38.351.426		$ 38.351.426	10,09%	19-10-21
7	$ 52.504.562		$ 52.504.562	13,82%	18-11-21
8	$ 40.611.278		$ 40.611.278	10,69%	07-12-21
9			$ 0	0,00%	
10			$ 0	0,00%	
11			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 241.005.963	$ -	$ 293.510.525	77,24%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo	$ 22.539.052	Acta 01						
Junio	$ 22.245.787	Acta 02						
Julio	$ 35.123.559	Acta 03						
Septiembre	$ 40.029.844	Acta 04						
Septiembre	$ 42.105.017	Acta 05						
Octubre	$ 38.351.426	Acta 06						
Noviembre	$ 52.504.562	Acta 07						
Diciembre	$ 40.611.278	Acta 08						

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo:	PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	001
		Pagina:	2 de 3

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Responder si se cuenta con la documentación al día:							
Estudios y diseños:						Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Planos de obra:						Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	N.A.
Especificaciones técnicas						La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:						Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Bitacora:						Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI
						El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI
Empleos Directos:		Hombres:		Mujeres:		Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, LA CANTIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

NINGUNA

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

SE REALIZA PAVIMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PROPORCIONAL A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL	Reison Arley Jaramillo C.
CARGO:	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Código:	PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	001
		Pagina:	3 de 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



