Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

Yopal, 20 de Diciembre del 2021.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 11/11/2021 hasta 10/12/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2021-10-11

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-12-25

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-25

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $12.566.400,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $12.566.400,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 10/12/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 presenta una ejecución del 80% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$12.566.400,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$12.566.400,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$2.513.280,00		
TOTAL	$12.566.400,00	$0,00	$10.053.120,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar la revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC). 2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC). 3. Realizar visitas técnicas a los de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC). 4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la ejecución de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC). 5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor de los proyectos de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC). 6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Con relación al contrato de obra pública No 2228 del 2020 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas exigidas dentro del contrato, teniendo en cuenta el proceso de recibo final de obra que se adelanta. Mediante trabajo de campo se realizó verificación técnica a los componentes ejecutados en cumplimiento del objeto contractual. Con relación al contrato de obra pública No 2175 del 2019 que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN ALOJAMIENTO PARA TROPA PROTOTIPO DEL EJERCITO NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CANTON MILITAR EL REMANSO PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA DECIMOSEXTA BRIGADA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas exigidas dentro del contrato, teniendo en cuenta el proceso de recibo final de obra que se adelanta. Mediante mesas de trabajo se verifico el informe para recibo final y sus	80,00	1.1

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

anexos evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas en los diferentes componentes técnicos que comprende el proyecto. ACTIVIDAD PERMANENTE		
Se realizó mediante verificación en campo el desarrollo de los procesos técnicos ejecutados, los cuales se soportaron mediante memorias de cálculo y anexos documentales presentados por el contratista de obra EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ con referencia al contrato de obra 2228 de 2020 cuyo objeto es; MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE. ACTIVIDAD PERMANENTE	80,00	1.2
Se ha programado y coordinado visita técnica de obra con las partes involucradas en el proyecto para analizar estado de ejecución, avance administrativo, financiero, económico, y legal del contrato de obra pública No 2228 de 2020, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE." Con ocasión a la suscripción del acta de recibo final de obra. ACTIVIDAD PERMANENTE	80,00	1.3
Una vez realizada la verificación en campo de la ejecución de obra para dar trámite al acta de recibo final de obra, se realizó verificación a los informes y demás anexos; en donde se determinó balance de cantidades definitivas para determinar así el acta de recibo final. Lo anterior con ocasión de obra pública 2228 de 2020 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE". ACTIVIDAD PERMANENTE	80,00	1.4
Se programó y realizo comité técnico para verificar la subsanación de las observaciones emitidas por la supervisión al informe para recibo final de obra y sus anexos. Junto con contratista de obra se realizó este comité en donde se avaló esta componente, para determinar las cantidades definitivas con ocasión a la suscripción del acta de recibo final de obra del contrato No 2228 de 2020 cuyo objeto es; "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE". ACTIVIDAD PERMANENTE	80,00	1.5
Se programó y realizo comité técnico para verificar la subsanación de las observaciones emitidas por la supervisión al informe para recibo final de obra y sus anexos. Junto con contratista de obra se realizó este comité en donde se avaló esta componente, para determinar las cantidades definitivas con ocasión a la suscripción del acta de recibo final de obra del contrato No 2175 de 2019 cuyo objeto es; "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN ALOJAMIENTO PARA TROPA PROTOTIPO DEL EJERCITO NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CANTON MILITAR EL REMANSO PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA DECIMOSEXTA BRIGADA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." ACTIVIDAD PERMANENTE	80,00	1.6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.°B.°:

Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V.01

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2021

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE

Objeto: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Contratista o Ejecutor	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
Rep. Legal:	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
Contrato No.	2228 DE 2020-12-22
Valor Inicial:	$74.216.316
Valor Anticipo (30%):	$ 22.264.894,80
Valor Adicionado 1:	
Valor Adicionado 2:	
Valor Total:	$ 74.216.316,00
Valor Ejecutado:	$ 25.348.405,04
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Prorrogas:	PRORROGA No 1 POR VEINTE (20) DIAS.
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Suspensiones:	N/A
Fecha de Iniciación:	3 de agosto de 2021
Terminación Inicial:	2 de noviembre de 2021
Terminación Actual:	22 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	22/12/2020	3 meses	$ 74.216.316,00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	16/03/2021			
3, ACTA DE INICIO DE OBRA	3/08/2021			Informe preliminar de supervision previo al acta de inicio.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	5/10/2021		$ 22.264.894,80	
5. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	22/10/2021			Se suscribió acta de fijación de precios no previstos de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra. Actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.
6.ACTA DE MODIFIACION DE CANTIDADES DE OBRA,	22/10/2021			1. En el transcurso de la ejecución progresiva de las actividades de obra concernientes al contrato de obra la de referencia, se han venido encontrando algunos condiciones que alteran la ejecución del proyecto, y que requieren la inclusión de nuevas actividades no previstas contractualmente y la fluctuación de mayores y menores cantidades de las actividades ya contempladas, siempre soportadas desde la parte técnica y profesional buscando que el producto final cumpla en todas las áreas con la normatividad Colombiana para este tipo de proyecto, y con la funcionalidad para la cual planificada.
7. PRORROGA No 1	28/10/2021	VEINTE (20) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2228 de 2020 por un termino de veinte (20) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
34. DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/11/2021			

3. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : **34,15%** **$ 25.348.405,04** % PROGRAMACION OBRA: **37,00%** **$ 27.460.036,92**

*** COMPONENTE TECNICO:**

En el transcurso de la ejecución del proyecto se han encontrado actividades que son necesarias realizar para el óptimo funcionamiento del comando de atención inmediata (CAI), además, algunos ítems contractuales se ajustaron en mayores o menores cantidades, a fin de cumplir el objeto contractual y suplir las necesidades técnicas requeridas para el proyecto. Que teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista de obra la modificatoria No 1, como nuevo balance de obra no genera erogación económica alguna a la entidad contratante.

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:

CAPITULO 1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
CAPITULO 2.00 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS.
CAPITULO 3.00 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
CAPITULO 4.00 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS
CAPITULO 5.00 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
CAPITULO 6.00 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
CAPITULO 11.00 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
CAPITULO 12.00 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS

Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V.01

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según acta de inicio suscrita el 03/08/2021 al contrato de obra No. 2228 de 2020.

Poliza No. 42223 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	3/08/2021	2/03/2022	$ 7.421.632,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2/11/2021	2/11/2023	$ 7.421.632,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3/08/2021	2/03/2022	$ 22.264.895,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3/08/2021	2/11/2024	$ 3.710.816,00

Poliza No. 15155 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/08/2021	2/11/2021	$ 181.405.202,00

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ -	
% Ejecucion financiera		0,00%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$74.216.316,00		
Valor Adicional	$0,00		
Anticipo (30%)		$ 22.264.894,80	
Valor ejecutado			$ -
Vr/Amortizado		$ -	
Vr por Amortizar		$ 22.264.894,80	
Valor por ejecutar			$ 74.216.316,00
Sumas	$74.216.316		$ 74.216.316,00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El día 22 de noviembre 2021 se suscribió acta de terminación por vencimiento de plazo.

El día 3 de diciembre de 2021 se realizó memorado 730 41-23 810 con asunto "Primer solicitud de entrega de Informe para recibo final de obra. "con referencia "CONTRATO DE OBRA No 2228 DE 2020-12-22 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE." Y se remitió al contratista de obra, EDWAR MAURICIO GALINDO FERNANDEZ NIT. 86.060.591-0.

El día 3 y 6 de diciembre de 2021 se realizó visita técnica a la obra localizada en el municipio de Paz de Ariporo, para realizar la inspección de las obras ejecutadas, allí se realizó proceso de medición correspondiente a todas las actividades de obra que comprenden el presupuesto oficial, las cuales se determinaran para la suscripción del acta de recibo final, correspondiente al contrato de obra pública no. 2228 de 2020.

Se ha realizado revisión y verificación al informe de recibo final de obra y sus anexos técnicos, los cuales se han observado aspectos a corregir, para avanzar en el proceso de suscripción del acta de recibo final de obra.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO






TRABAJOS DE ADECUACIÓN INTERIOR





TRABAJOS DE ADUCACION EN FACHADAS

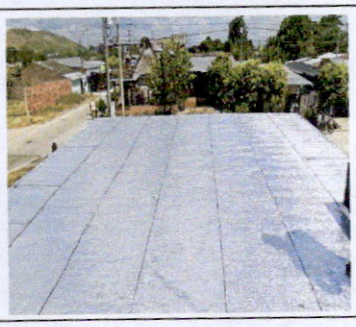



ADECUACION INTERIOR - COMPONENTE ELECTRICO





ADECUACION AL REVESTIMIENTO DE FACHADAS

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES ? : _____

HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES ? : _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐

PORQUE ? _____

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐

PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

En el transcurso de la ejecución del proyecto se han encontrado actividades que son necesarias realizar para el óptimo funcionamiento del comando de atención inmediata (CAI), además, algunos ítems contractuales se ajustaron en mayores o menores cantidades, a fin de cumplir el objeto contractual y suplir las necesidades técnicas requeridas para el proyecto.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional contratado - CPSP No. 1863 de 2021

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA
Acta de posesión 0012 del 26 de Abril de 2021

INFORME SEMANAL DE SUPERVISION
FO-AB-37
2014-01-02
V.02

HOJA 1 de 1	Fecha		DD	MM	AA
			20	12	2021

OFICINA DE CONSTRUCCIONES

DATOS GENERALES

Periodo DE: 11/11/2021 AL: 10/12/2021

Nombre de Apoyo a la Supervisión: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

NO.2228 DE 2020-12-22 MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

N/A

RELACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ENTRADA O SALIDA	ASUNTO Y/O REFERENCIA	ENVIADO POR	DIRIGIDO A	ANEXOS	No FOLIOS	OBJETO DE LA CORRESPONDENCIA	OBSERVACIONES
5-nov-21	730 41-23 739	SALIDA	RESPUESTA OFICIO 310.15-348 DEL 29 DE OCTUBE DE 2021.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	OMAR ARMANDO BAYONA VARON. Secretario General y de gobierno – Paz de Ariporo, Casanare			Informacion del contrato 2228 de 20210	
18-nov-21	730 41-23 778	SALIDA	Informe para recibo final de obra.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL			Solicitud de informe y demas documentos necesarios para dar cumplimiento en el recibo final de obra del contrato 2084 de 2018	
12-nov-21	730 41-23 764	SALIDA	Solicitud de informe de recibo final contrato de obra 2175 de 2019 (Urgente).	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO ALOJAMIENTOS SEGUNDA ETAPA. R/L ABEL HELIT ALVARADO NUÑEZ.			Requerimiento No 1 del informe para recibo final de obra.	

RELACION DE COMITES

FECHA	NUMERO	TEMAS TRATADOS	OBSERVACIONES
6/12/2021		Seguimiento técnico en la revisión al informe como soporte para el recibo final de obra del contrato de obra publica 2175 de 2019. mediante mesa de trabajo realizada con el ingeniero Enrique Rodríguez Avella profesional de la Unión Temporal Alojamiento Militar 2, contratista de obra, se socializa las observaciones subsanadas con el fin de avazar en la suscripcion del acta de recibo final de obra.	

OBSERVACIONES GENERALES	APOYO A LA SUPERVISION	SUPERVISOR
	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ Firma	BRENDA RORAIMA BARRERA Firma

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-11	2021-11	22107728	I	2021-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22107728	2021-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.011.000	321.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.011.000	251.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.011.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	583.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-11	2021-11	22107728	I	2021-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22107728		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.011.000	2.011.000	2.011.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	321.800	0	0	0	321.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	321.800	0	0	0	321.800
EPS(Administradoras: 1)				1	251.400	0	0	0	251.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	251.400	0	0	0	251.400
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	0	10.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.500	0	0	0	10.500
Gran Total					583.700	0	0	0	583.700
