MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Pago:
ARAMIREZ
2796

NIT 890980917-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2021-02853

Fecha de Pago: 13-12-2021 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA H ,Id: 811022650

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO SOLIDADRIDAD, Nº 025-2021 ,AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HÈLIDA PARA LA RECUEPERACION Y MITIGACIÒN DE PROCESO EROSIVO.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 1002
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,802,070.00 **Vlr Deducc.:** 312,135.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,489,935.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCO AGRARIO	414483011260	pse	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA	$4,489,935.00
				Total:	**$4,489,935.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5%		$4,802,070	$240,104	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$4,802,070	$72,031
TOTAL Deducibles:			**$312,135.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2021-2796

Fecha/Estado
30/11/2021 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA H ,Id: 811022650

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO SOLIDADRIDAD, Nº 025-2021 ,AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HÈLIDA PARA LA RECUEPERACION Y MITIGACIÒN DE PROCESO EROSIVO.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 1002

CREAFAM

Vlr Bruto: 4,802,070.00 **Vlr Deducc.:** 312,135.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,489,935.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
305	1002	10603	01	2.3.07.01.03.05.04	CONVENIO # 514-2020 OBRAS CIVILES Y BIOLÓGICAS PARA RECUPERAR LOS SUELOS EROSIONADOS DEL MUNICIPIO	$4,802,070.00

121 → 1260 PST

TOTAL: **$4,802,070.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 5%		$4,802,070	$240,104	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$4,802,070	$72,031

TOTAL Deducibles: **$312,135.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

09 DIC 2021

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente! 2796.

Fecha: El Peñol, 24 de noviembre de 2021
Señor: Técnica Administrativa

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: AUNAR ESFUERZOS LOGISTICCOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESOS EROSIVOS

Beneficiario: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HELIDA**
Cédula o Nit: 811022650-4

Artículo:	**Valor: $**
Artículo: 23.07.01.03.05.04 Convenio N°514 Obras Civiles y Biológicos para recuperar los suelos erosionados del Municipio	**Valor: $4.802.070**
Artículo:	**Valor: $**
Artículo:	**Valor: $4.802.070**

Cordialmente,

LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO
Directora Administrativa de planeacion

El Peñol, 29 de octubre de 2021.

INFORME N° 2 Y FINAL AL CONVENIO SOLIDARIO N° 025 DEL 30 DE JULIO DEL 2021 SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HELIDA Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO.

VALOR: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($33.805.683).

APORTES:
MPIO: $ 25.405.683
J.A.C: $ 8.400.000

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONVENIO

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE PROCESO EROSIVO EN LA VEREDA LA HELIDA, COORDENADAS: X: 6°1110.42" Y:75°1413.69", Z: 2015

ITEM	Actividad	Und	Cant	valor unitario	valor total	Aporte Mpio	Aporte J.A.C
1	Construcción de muro de gavión en piedra en malla de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión, formando ojos hexagonales, Las mallas de los gaviones se ligarán sólidamente empleando alambre No.13. Para el llenado se utilizarán piedras, con tamaños entre 10 y 20 centímetros de diámetro disponiéndolas de modo que entre ellas quede el menor espacio posible. La cara del gavión que queda en contacto con el suelo (piso y talud) se debe recubrir con Geotextil no cocido, se colocarán tirantes de alambre en sentido horizontal, del mismo calibre del que forma la malla, cada 33 cm de altura, con el fin de evitar deformaciones de las caras por la presión del material; estos tirantes se distanciarán entre 70 y 80 cm entre sí, en el sentido longitudinal, , se procederá a cerrar la tapa, forzando las aristas para que	M3	34	389.968	13.258.912	13.258.912	

	coincidan al menos en puntos distantes de 30 cm. en sentido longitudinal ; en cada punto se hará una sutura con alambre. Por último y luego de terminado el cierre de la tapa, se coserán las aristas de cada gavión, con las correspondientes de los gaviones contiguos para dar una íntima trabazón a toda la obra.						
2	Construcción de cuneta de vía en "v" con un desarrollo de 0.80 y espesor de 0.08 mts en concreto	ML	70	137.202	9.604.140	9.604.140	
3	Construcción de filtro (70*0,40*0,40), con canto rodado, geotextil y tubería p.v.c perforada.	M3	11,2	164.154	1.838.525	1.838.525	
4	Realización de excavación manual en material heterogéneo de 0-2 mts	ML	25,5	27.612	704.106	704.106	
5	Administración y acompañamiento en la ejecución de obras	MES	3	2.800.000	8.400.000		8.400.000
	SUB TOTAL				**33.805.683**	**25.405.683**	**8.400.000**

Periodo reportado: Del 18 de septiembre al 29 de octubre.
En La fecha se realizó visita de supervisión al convenio en mención, Las obras se reciben a entera satisfacción, los trabajos ejecutados se observan de buena calidad y de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Se hace un otrosí el día 17 de septiembre con el objeto de hacer un cambio en las cantidades de cuneta y gaviones a construir.


Las obras realizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA DESPUES DEL OTRO SI

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE PROCESO EROSIVO EN LA VEREDA LA HELIDA, COORDENADAS: X: 6°1110.42" Y:75°1413.69", Z: 2015							
	Actividad	**Und**	**Cant**	**Vr/ Unit**	**Vr/ total**	**Aporte Mpio**	**Aporte J.A.C**
1	Construcción de cuneta de vía en "v" con un desarrollo de 0.80 y espesor de 0.08 mts en concreto	Ml	35	137.202	4.802.070	4.802.070	0
2	Administración y acompañamiento en la ejecución de las obras	Mes	1	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000
	TOTAL				**7.602.070**	**4.802.070**	**2.800.000**

1. **CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE VÍA EN "V" CON UN DESARROLLO DE 0.80 Y ESPESOR DE 0.08 MTS EN CONCRETO:** Se construyen 35 ml de cuneta en concreto para la captación y adecuada disposición de las aguas de escorrentía y las provenientes del nacimiento ubicado en la parte alta del muro de gavión, estas aguas son depositadas en una obra transversal existente en la vía. Ver fotos N° 1 y 2



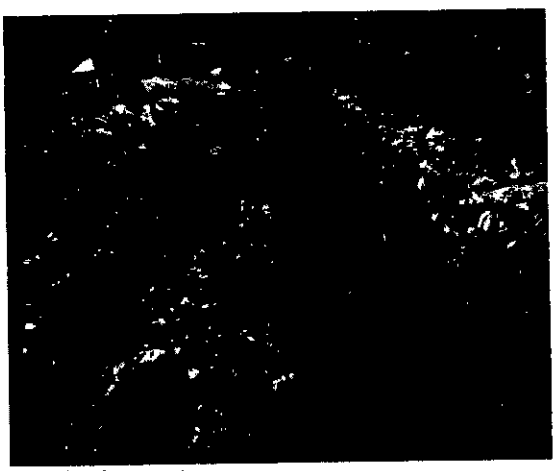

Fotos N° 1 y 2, Construcción de cuneta

2. **ADMINISTRACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**: La comunidad ha delegado una persona que esta permanentemente en la obra para la consecución de materiales y al igual que un funcionario de la administración municipal esta presto para la solución de dudas e inquietudes.

El manejo ambiental de la obra se realizó conforme lo acordado en el formato de Cornare "Manejo Aspectos e Impactos Ambientales, Peligros y riesgos ocupacionales" incluido en la ficha Bpia-c digital.

Atentamente,

HECTOR HERNAN SALAZAR GARCIA
Representante J.A.C Vereda La Helida.

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN – CONVENIO SOLIDARIO	

CONVENIO SOLIDARIO No 025 DEL 22 DE JULIO DE 2021

Fecha: 29 de octubre de 2021

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HELIDA
CÉDULA O NIT	811022650-4
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO.
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINÇO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($33.805.683).
APORTE MUNICIPIO DE EL PEÑOL	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (25.405.683)
APORTE JAC LA HELIDA	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (8.400.000)
ADICIONES	0
VALOR MÁS ADICIONES	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($33.805.683).
DURACIÓN INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
AMPLIACIONES	0
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del convenio solidario 025 del 22 de julio de 2021, se presenta el Informe de avance de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

	PROCESO	CONTRACTUAL	
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN – CONVENIO SOLIDARIO	

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato:

El contratista presenta la ejecución de las actividades, donde se evidencia un avance del 49% en el objeto del convenio solidario que está enfocado en AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO.

Se hace el otrosi N° 1 el día 17 de septiembre con el objeto de hacer un cambio en las actividades.

Además, se ha contado con una persona de la Junta de Acción Comunal de vereda Bonilla para la Administración y acompañamiento en la ejecución de las obras establecidas dentro del convenio, las cuales son:

Las actividades reales a desarrollar una vez se suscriben el otro si son las siguientes:

- Construcción de 46 m^3 de muro flexible con gavión y piedra con malla calibre 14 y geotextil
- Construcción de cuneta de vía en "v" con un desarrollo de 0.80 y espesor de 0.08 mts en concreto
- Construcción de filtro (70*0,40*0,40), con canto rodado, geotextil y tubería p.v.c perforada.
- Realización de excavación manual en material heterogéneo de 0-2 mts
- Administración y acompañamiento en la ejecución de las obras

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

FICHA TÉCNICA

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE PROCESO EROSIVO EN LA VEREDA LA HELIDA, COORDENADAS: X: 6°1110.42" Y:75°1413.69", Z: 2015

ITEM	Actividad	Und	Cant	valor unitario	valor total	Aporte Mpio	Aporte J.A.C
1	Construcción de muro de gavión en piedra en malla de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión, formando ojos hexagonales, Las mallas de los gaviones se ligarán sólidamente empleando alambre No.13. Para el llenado se utilizarán piedras, con tamaños entre 10 y 20	M3	46	389.968	17.938.528	17.938.528	

	centímetros de diámetro disponiéndolas de modo que entre ellas quede el menor espacio posible. La cara del gavión que queda en contacto con el suelo (piso y talud) se debe recubrir con Geotextil no cocido, se colocarán tirantes de alambre en sentido horizontal, del mismo calibre del que forma la malla, cada 33 cm de altura, con el fin de evitar deformaciones de las caras por la presión del material; estos tirantes se distanciarán entre 70 y 80 cm entre sí, en el sentido longitudinal, , se procederá a cerrar la tapa, forzando las aristas para que coincidan al menos en puntos distantes de 30 cm. en sentido longitudinal ; en cada punto se hará una sutura con alambre. Por último y luego de terminado el cierre de la tapa, se coserán las aristas de cada gavión, con las correspondientes de los gaviones contiguos para dar una íntima trabazón a toda la obra.						
2	Construcción de cuneta de vía en "v" con un desarrollo de 0.80 y espesor de 0.08 mts en concreto	ML	36	137.202	4.939.272	4.939.272	
3	Construcción de filtro (70*0,40*0,40), con canto rodado, geotextil y tubería p.v.c perforada.	M3	11,2	164.154	1.838.525	1.838.525	
4	Realización de excavación manual en material heterogéneo de 0-2 mts	ML	25,5	27.612	704.106	704.106	
5	Administración y acompañamiento en la ejecución de obras	MES	3	2.800.000	8.400.000		8.400.000
	SUB TOTAL				**33.805.683**	**25.405.683**	**8.400.000**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad	Und	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario	Valor Total	Aporte Municipio	Aporte JAC	Evidencia

Construcción de cuneta de vía en "V" con un desarrollo de 0.80 y espesor de 0.08 mts en concreto	Ml	35	$137.202	4.802.070	4.802.070	$0	
Administración y acompañamiento en la ejecución de las obras	Mes	2	2.800.000	5.600.000	0	2.800.000	
TOTAL				**7.602.070**	**4.802.070**	**2.800.000**	

c) Seguimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:

- El Solidario desarrollo las actividades establecidas dentro del convenio según los lineamientos y especificaciones técnicas.
- Acata las instrucciones dadas por parte del Municipio para dar correcta ejecución del Convenio.
- El solidario presenta de manera oportuna el Informe de las actividades realizadas.
- Aporto la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control por parte del municipio.
- El solidario aporto en la Administración y acompañamiento en la ejecución de las obras como se estipulo en el convenio solidario N°025-2021.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Periodo de cotización	Nro. de Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total Pagado en el Periodo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: N/A

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (Si Aplica):

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
	SI	**NO**
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	X	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	
Observaciones adicionales:	N/A	

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación y Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
305	230701030504	Convenio #514-2020 obras civiles y biológicas para recuperar los suelos erosionados del municipio	$25.405.683

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

c) Relación de pagos realizados: Pago que se realizó a la J.A.C LA HELIDA: A la fecha se le efectuó un pago por un valor de 18.642.634.

Nro.	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1002	230701030504	25.405.683	FE6	13/10/2021	18.642.634	6.763.049	100%

Nro.	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Convenio	$25.405.683
Adiciones	0
Total valor de contrato más adiciones	$25.405.683
Pagos realizados (Acumulado)	18.642.634

Pago autorizado del mes	**$4.802.070**
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

a. Estado de las garantías del contrato (Si Aplica).

Nombre Aseguradora	Nro. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado $
			Desde	Hasta		
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago de los meses septiembre – octubre de 2021 del Convenio Solidario 025 del 22 de julio de 2021.
Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el (primer) pago parcial por valor de **$ 4.802.070**, para el cumplimiento del 100% de lo establecido en el convenio solidario.

Atentamente,

LILIANA PATRICIA LOPÉZ GIRLDO
Coordinadora Administrativa de Planeación

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT. 890980917-1

Cra 18 N° 02-91 Plaza de Bolívar

DEBE A

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HELIDA, CON NIT N°811022650-4, REPRESENTADA POR EL SEÑOR HECTOR HERNAN SALAZAR GARCIA, CON CEDULA N° 70.950.956

LA SUMA DE: ($4.802.070) **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA PESOS M/L**

Por concepto de: Pago del informe N° 2 y final del convenio solidario Nro. 025 del 1 de julio de 2021 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO.

El Peñol, octubre 29 de 2021,

Cordialmente,

HECTOR HERNAN SALAZAR GARCIA
R/L J.A.C Vereda La Helida.

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 60431001

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

El Peñol, octubre 29 de 2021

Señores: **ALCALDÍA DE EL PEÑOL– ANTIOQUIA**

ASUNTO: Carta de certificación de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar

Atentamente,

Nombre: HECTOR HERNAN SALAZAR GARCIA

Firma:

Cargo: Representante Legal J.A.C La Helida

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

DIRECCION AMBIENTAL MUNICIPAL DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO N° 1

CONVENIO SOLIDARIO N° 025-2021

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	CONTRATISTA	JAC LA HELIDA NIT: 811.022.650-4	OBJETO
FECHA DE INICIO	30/07/2021	FECHA DEL CONTRATO	22/07/2021	AUNAR ESFUERZOS LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO.
PLAZO INICIAL	3 MESES	VALOR INICIAL	$33.805.683	
FECHA TERMINACION	29/10/2021	VALOR ADICIONES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA ACTA	29/10/2021	
FECHA FINAL TERMINACION	3 MESES	VALOR ACTA No. 01	$24.242.634	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA			
ACTA DE REINICIO	NA	VALOR ACTA No. 02	$7.602.070	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA N° 1		ACTA N° 2		ACUMULADOS	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNU.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT. ACUMUL.	VALOR ACOMULADO
1	Construcción de muro de gavión en piedra en malla de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión, formando ojos hexagonales	M3	46	389.968	17.938.528	46,00	$ 17.938.528	0,00	-	46	17.938.528
2	Construcción de cuneta de vía en "V" con un desarrollo de 0.80 y espesor de 0.08 mts en concreto	MI	36	137.202	4.939.272	0,00	$ -	35	4.802.070	35	4.802.070
3	Construcción de filtro (70°0,40°0,40), con canto rodado, geotextil y tubería p.v.c perforada.	M3	11,2	164.154	1.838.525	0,00	$ -	0,00	-	0	-
4	Realización de excavación manual en material heterogéneo de 0-2 mts	M3	25,5	27.612	704.106	25,50	$ 704.106	0,00	-	25,5	704.106
5	Administración y acompañamiento en la ejecución de obras	MES	3	2.800.000	8.400.000	2,00	$ 5.600.000	1,00	2.800.000	3	8.400.000
	VALOR TOTAL				33.805.683		24.242.634		7.602.070		31.844.704
	VALOR ACTA	SIETE MILLONES SEICIENTOS DOS MIL SETENTA PESOS									
	VALOR A PAGAR POR EL MUNICIPIO	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA PESOS									4.802.070

SORANY ANDREA MARÍN MARÍN
ALCALDESA MUNICIPAL

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
COORDINADORA DE DESARROLLO RURAL
Y MEDIO AMBIENTE

LILIANA LOPEZ GIRALDO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PLANEACION

ELABORO: ALONSO OCHOA - TECNOLOGO AMBIENTAL

Junta De Acción Comunal
La Hélida

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HELIDA
NIT: 811022650-4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
VEREDA LA HELIDA, Peñol, Antioquia, Colombia
Tel. 3104472382
Email. lahelidajac@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764019694337 válida desde 2021-10-19 hasta 2023-04-19 rango desde FE7 hasta FE100.

Cliente:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890980917
Dirección:	CRA 18 2-91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8515855
Email:	sistemas@elpenol-Antioquia.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	15/12/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE8**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:15:52**
FECHA FIRMADO:	**23/11/2021 20:15:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	11	2021	15	12	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	09	Pago del Informe N° 2 y Final deldel Convenio Solidario Nro. 025 del 1 de Julio de 2021. El objeto del Convenio es AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOSY HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA LA HELIDA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO	94	1,00	$4.802.070,00		0,00	$4.802.070,00

Notas:

SON: (cuatro millones ochoclentos dos mil setenta pesos)
CUFE: dc62f3aae75213bf8ca53aaf466eee5466a65736fe3139804c4f7f134a3af1b682de8e323116a75c086cd11776575ddf

Subtotal:	$4.802.070,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.802.070,00

Favor hacer Consignación en la Cuenta de ahorros CREAFAM N° 60431001 a Nombre de la Junta de Acción Comunal Vereda La Helida

Firma Digital: XCgJSHb/JuTXYlde6vPCArlQLyM5XY1cVXVoYU3W68FRBYMH57Bu7w6Xz6JI8B+fz/T1aCxBALbFl9j8cY6N1V2Ab3XlnvIth+weP34xePVlyRScbuV
zaQA2cneiY/4OsKECTnafOg+48QkbKnEvz7MPnykMZpB5uedQDp09CodXU0SeKlqxj7hI1V8mrzBmx90C9v5apuTZ8DHU3tJcMNrvRDQ2h0c87UmtYU
nHDe+yq4xvMpliv95eZgxH3/RUReZR540Qm+oTzUlduB6NZ/3sZYEVIPQxgZ8ALjERSVOO6WzlIVPT7qwcKEJwNN0/j1aAme2R6EACQv9IAKkMaA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0
