INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA No. 04

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.2671646 DE 30 DE JULIO DEL 2021		
CONTRATISTA:				AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S.A.S		
NIT				900.688.449-0		
OBJETO:				SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO YA EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER.		
VALOR INICIAL:				QUINIENTOS SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($ 507.069.595,60)		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				HASTA EL (30) DICIEMBRE DE 2021 HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
SUPERVISOR:				ANDRES FERNANDO BALCAZAR CASTAÑO, ACTO ADMINISTRATIVO: 30-07-2021		
FECHA DE INICIACIÓN:				10 DE AGOSTO DEL 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:				30 DE DICIEMBRE DEL 2021		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
VALOR A PAGAR				TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE ($37.250.905,24)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 10-10-2021	HASTA: 09-11-2021	

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A TODO COSTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EXISTENTES	• Oficio **A-SERV-17-12-2021** acta de entrega parcial #4 • Relación de equipos • Soporte de actividades

Ayrcol s.a.s
Aire y Refrigeración de Colombia
NIT. 900.688.449-0
TEL. 6420087 - 6524471

ELBERTO FIGUEROA ARIAS
C.C.91.257.315 de Bucaramanga
Contrato Numero CO1.PCCNTR.2671646


Ayrcol s.a.s
Aire y Refrigeración de Colombia
Nit.: 900.688.449 0

# DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.2671646
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA	AYRCOL S.A.S
DIRECCION	CALLE: 46#21-27
CUIDAD	BUCARAMANGA
TELEFONO	6420087
CONTENIDO	CUENTA DE COBRO

TABLA DE CONTENIDO

OFICIO A-SERV-17-12-2021 ACTA DE ENTREGA PARCIAL #4
RELACION DE EQUIPOS
SOPORTE DE ACTIVIDADES

OFICIO A-SERV-17-12-2021 ACTA DE ENTREGA PARCIAL #4

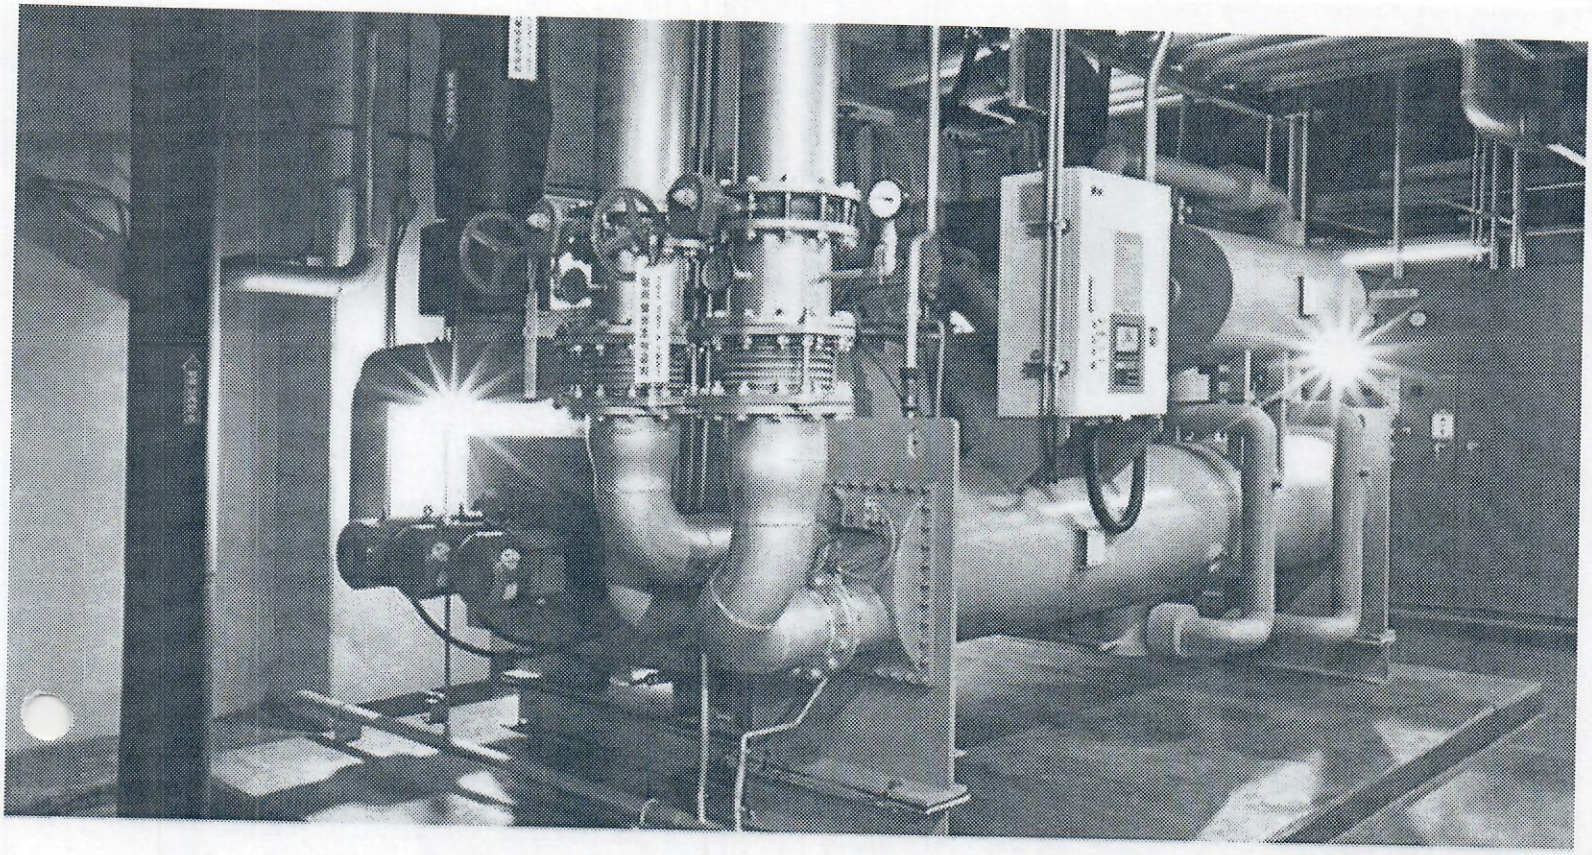

Ayrcol S.A.S.

DISEÑO E INSTALACION DE:

Equipos de aire acondicionado
Sistemas de tecnologia variable
Sistemas de ducteria
Cuartos frios
Chiller
Sistemas con filtracion especial para laboratorios y hospitales

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

Sistema de ventilacion mecanica
Torres de enfriamiento
Repuestos y accesorios de instalacion

MANTENIMIENTO

Correctivo y preventivo

Fijo: (7) 642 0087-695 1378
Cel: 315 893 8845
proyectos@ayrcol.co
ingenieria@ayrcol.co
Cr: 21 # 46-10

Bucaramanga, Diciembre 17 de 2021

Señores:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Atte: Andres Fernando Balcazar Castaño
Cuidad

OFICIO: A-SERV-17-12-21
ASUNTO: ACTA DE ENTREGA PARCIAL SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATO No Y FECHA	CO1.PCCNTR.2671646 30/07/2021
CONTRATISTA:	AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S.A.S-AYRCOL S.A.S
NIT CONTRATISTA:	900.688.449-0
PROYECTO:	"SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO YA EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER"
CONTIENE	INFORME DE ACTIVIDADES
PERIODO DESDE:	OCTUBRE 10 DE 2021
PERIODO HASTA:	NOVIEMBRE 09 DE 2021

Ayrcol

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL O FINAL

A-SERV-17_12_21

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

FECHA		
17	DICIEMBRE	2021

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CO1.PCCNTR.2671646	"SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE AIRES ACONDICIONDOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO YA EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER"	AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S.A.S

CUARTO CORTE-PALACIO AMARILLO

REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
0334 TALENTO HUMANO 2 PISO	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 317.081,61	$ 317.081,61
0333 TALENTO HUMANO 2 PISO	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 317.081,61	$ 317.081,61
0331 OFICINA SALON PRINCIPAL SECRETARIA DESPACHO	SPLIT/60,000 Btu/hr (5 TR)	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.404,08	$ 376.404,08
0329 SALA DE JUNTAS SECRETARIA DEL INTERIOR	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 317.081,61	$ 317.081,61
0332 OFICINA CONTIGUA DESPACHO DEL INTERIOR	MINI SPLIT/9,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 165.299,15	$ 165.299,15
0539 CONTROL INTERNO	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	$ 112.008,10	$ 7.840,57	X	UND	1	$ 165.299,15	$ 165.299,15
0540 CONTROL INTERNO	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 165.299,15	$ 165.299,15
0541 CONTROL INTERNO	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 194.176,71	$ 194.176,71
0757 OFICINA TURISMO	SPLIT/60,000 Btu/hr (5 TR)	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.404,08	$ 376.404,08
0543 TALENTO HUMANO OFICINA 203	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 194.176,71	$ 194.176,71
0544 LICENCIA DE INCAPACIDADES OFICINA 204	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 194.176,71	$ 194.176,71
0758 PAZ Y DERECHOS HUMANOS	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 317.081,61	$ 317.081,61

0537 GESTION DE INGRESOS	PISO TECHO/36.000 Btu/hr	PCB PRINCIPAL	UND	1	$ 1.321.699,13	$ 1.321.699,13		UND	1		$ -
0548 AUDITORIO	SPLIT 54,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11					
		LAMINA RIGIDA DOBLE FOIL POLIISOCIANURATO MT2	M2	5	$ 184.484,80	$ 922.424,00	X	UND	1	$ 421.124,47	$ 421.124,47
0549 AUDITORIO	SPLIT/54,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 421.124,47	$ 421.124,47
1544/0550 AUDITORIO	SPLIT/54,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11					
		UNIDAD COMPRESOR DE 54,000 BTU	UND	1	$ 4.612.112,10	$ 4.612.112,10					
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,4	$ 75.770,74	$ 30.308,30	X	UND	1	$ 421.124,47	$ 421.124,47
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,4	$ 95.536,93	$ 38.214,77					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,3	$ 65.887,64	$ 19.766,29					
		FREON DUPONT R410 1 LIBRAS	UND	10	$ 30.308,49	$ 303.084,90					
0759 OFICINA FORES	SPLIT/60,000 Btu/hr (5 TR)	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 1/3"HP 3/V CERRADO	UND	1	$ 480.977,70	$ 480.977,70					
		FREON DUPONT R22 1 LIBRAS	UND	10	$ 28.990,08	$ 289.900,80		UND	1		$ -
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,3	$ 75.770,74	$ 22.731,22					
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,3	$ 95.536,93	$ 28.661,08					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	$ 65.887,64	$ 13.177,53					
1545 INFRAESTRUCTURA OF 420	SPLIT/120,000 Btu/hr (10 TR)	UNIDAD COMPRESOR DE 120.000 BTU	UND	1	$ 5.534.534,12	$ 5.534.534,12					
		FILTRO SECADOR DE 3/8" SOLDABLE PARA PISO TECHO NO INVERTER	UND	1	$ 105.419,70	$ 105.419,70		UND	1		$ -
		FREON DUPONT R22 1 LIBRAS	UND	10	$ 28.990,42	$ 289.904,20					
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,3	$ 75.770,41	$ 22.731,12					
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,3	$ 95.536,60	$ 28.660,98					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	$ 65.887,31	$ 13.177,46					
1546 RECURSOS FISICOS	SPLIT/60,000 Btu/hr (5 TR)	MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 1/3"HP 3/V CERRADO	UND	1	$ 480.977,70	$ 480.977,70		UND	1		$ -
0536 INFRAESTRUCTURA MINERIA	SPLIT/60,000 Btu/hr (5 TR)	UNIDAD COMPRESOR DE 60,000 BTU	UND	1	$ 3.426.140,50	$ 3.426.140,50					
		FREON DUPONT R22 1 LIBRAS	UND	10	$ 28.990,08	$ 289.900,80					
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,3	$ 75.770,74	$ 22.731,22		UND	1		$ -
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,3	$ 95.536,93	$ 28.661,08					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	$ 65.887,64	$ 13.177,53					
		FILTRO SECADOR DE 3/8" SOLDABLE PARA PISO TECHO NO INVERTER	UND	1	$ 105.420,03	$ 105.420,03					
0535 SECRETARIA DE DESARROLLO	CASSETTE/60,000 Btu/hr	PCB PRINCIPAL	UND	1	$ 1.554.940,21	$ 1.554.940,21		UND	1		$ -

	Correctivos	Preventivos
SUBTOTALES	$ 20.283.935,05	$ 4.362.935,59
TOTAL	$	24.646.870,64

CUARTO CORTE-SECRETARIA DE SALUD

REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
1548 PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 165.299,15	$ 165.299,15
1547/1549 DESPACHO PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD	MINI SPLIT/12,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 165.299,15	$ 165.299,15
		UNIDAD COMPRESOR DE 12,000BTU	UND	1	$ 857.852,79	$ 857.852,79					
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,2	$ 75.770,74	$ 15.154,15					
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,2	$ 95.536,93	$ 19.107,39					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	$ 65.887,64	$ 13.177,53					
		FREON DUPONT R-410A 1 LIBRAS	UND	4	$ 30.308,49	$ 121.233,96					
1550 DIRECCION DE DESARROLLO	SPLIT/120,000 Btu/hr (10 TR)	UNIDAD COMPRESOR DE 120.000 BTU	UND	1	$ 5.534.534,12	$ 5.534.534,12		UND	1		$ -
		FILTRO SECADOR DE 3/8" SOLDABLE PARA PISO TECHO NO INVERTER	UND	1	$ 105.419,70	$ 105.419,70					
		FREON DUPONT R22 1 LIBRAS	UND	10	$ 28.990,42	$ 289.904,20					
		OXIGENO 1/2 M3	UND	0,3	$ 75.770,41	$ 22.731,12					
		ACETILENO 1/2 KILOGRAMO	UND	0,3	$ 95.536,60	$ 28.660,98					
		NITROGENO 1/2 M3	UND	0,2	$ 65.887,31	$ 13.177,46					
		MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 1/3"HP CERRADO	UND	1	$ 480.977,37	$ 480.977,37					

SUBTOTALES	Correctivos	Preventivos
	$ 7.531.052,87	$ 330.598,30
TOTAL	$	7.861.651,17

CUARTO CORTE-PASAPORTES

REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
0328 RACK	MINI SPLIT/9,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,13	$ 112.008,10	$ 14.561,05	X	UND	1	$ 165.299,15	$ 165.299,15
0321 SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
0324 SALA DE ESPERA PRIMER PISO	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
0323 SALA DE ESPERA PRIMER PISO	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65

0325 OFICINA PRIMER PISO	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
0322 SEGUNDO PISO SALA DE ESPERA	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
0327 ADMINISTRACION SEGUNDO PISO	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
0320 OFICINA DOCTORA ADMINISTRACION	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
0326 COORDINACION SEGUNDO PISO	CASSETTE/36,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,26	$ 112.008,10	$ 29.122,11	X	UND	1	$ 376.270,65	$ 376.270,65
SUBTOTALES										**Correctivos**	**Preventivos**
										$ 247.537,90	**$ 3.175.464,35**
TOTAL										**$**	**3.423.002,25**

CUARTO CORTE-ARCHIVO DEPARTAMENTAL											
REPORTE Y DEPENDENCIA	**EQUIPO Y CAPACIDAD**	**CORRECTIVO**	**UND**	**CANT.**	**V/R UNIT**	**V/R PARCIAL**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**UND**	**CANT.**	**V/R UNIT**	**V/R PARCIAL**
1632 GRUPO HOSPITALES	MINI SPLIT/24,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	$ 112.008,10	$ 7.840,57	X	UND	1	$ 317.081,61	$ 317.081,61
1633 SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	$ 112.008,10	$ 7.840,57	X	UND	1	$ 194.176,71	$ 194.176,71
1634 COORDINACION GESTION DOCUMNETAL	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	GAL	0,07	$ 112.008,10	$ 7.840,57	X	UND	1	$ 194.176,71	$ 194.176,71
1516 GESTION DOCUMENTAL	PISO TECHO/36.000 Btu/hr	QUIMICO DESINCRUSTANTE CHEN SAID	UND	0,07	$ 112.008,10	$ 7.840,57	X	UND	1	$ 374.800,88	$ 374.800,88
SUBTOTALES										**Correctivos**	**Preventivos**
										$ 31.362,27	**$ 1.080.235,91**
TOTAL										**$**	**1.111.598,18**

CUARTO CORTE-LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA											
REPORTE Y DEPENDENCIA	EQUIPO Y CAPACIDAD	CORRECTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	CANT.	V/R UNIT	V/R PARCIAL
1009 LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	MINI SPLIT/18,000 Btu/hr	TUBERIA DE COBRE 1/4"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT	ML	2	$ 22.402,02	$ 44.804,04		UND	1		$ -
		TUBERIA DE COBRE 1/2"INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)-1MT	ML	2	$ 31.625,91	$ 63.251,82					
		AISLAMIENTO 1/4"-1MT	ML	2	$ 10.199,75	$ 20.399,50					
		AISLAMIENTO 1/2"-1MT	ML	2	$ 10.673,74	$ 21.347,48					
		FREON DUPONT R22 1 LIBRA	LB	2	$ 28.990,08	$ 57.980,16					
SUBTOTALES										Correctivos	Preventivos
										$ 207.783,00	$ -
TOTAL										$	207.783,00

GRAN TOTAL	$ 37.250.905,24

Para constancia firma:

Ayrcol s.a.s
Aires y Refrigeraciones de Colombia
NIT. 900.686.448-0
TEL. 6420087 - 6524471


Elberto Figueroa Arias
Representante Legal

Andrés Fernando Balcázar Castaño
Supervisor contrato

Ayrcol S.a.s
Aire y Refrigeración de Colombia
Nit.: 900.688.449 0

RELACION DE EQUIPOS

Calle 46 N° 21-27 La Concordia Tel.: 6420087 Cel.: 315 893 8845 airecolombia@hotmail.com
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial

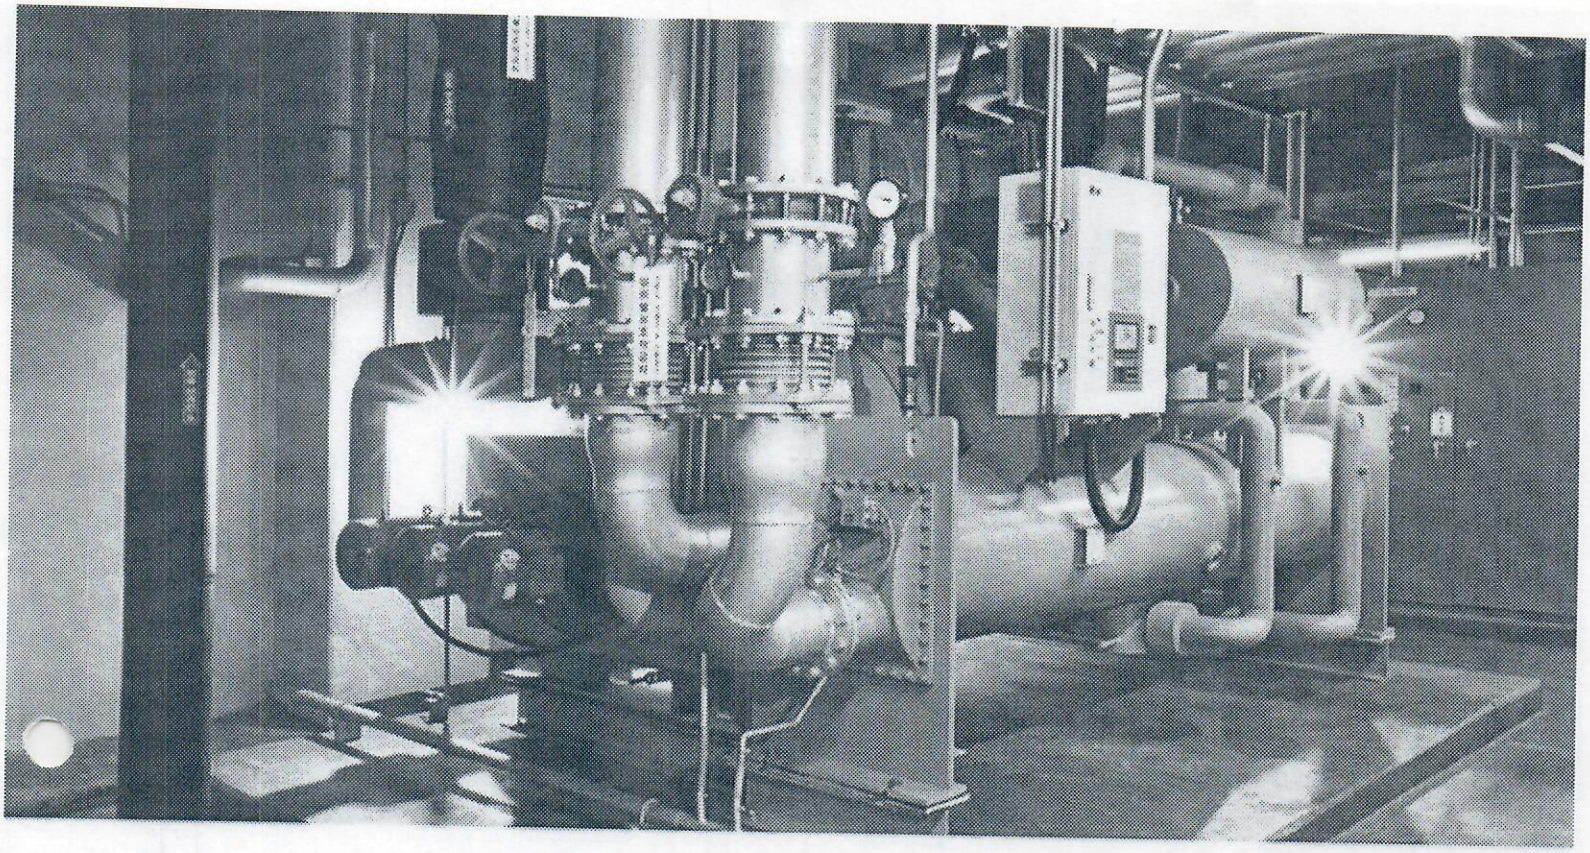

Ayrcol S.A.S.

DISEÑO E INSTALACION DE:

Equipos de aire acondicionado
Sistemas de tecnologia variable
Sistemas de ducteria
Cuartos frios
Chiller
Sistemas con filtracion especial para laboratorios y hospitales

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

Sistema de ventilacion mecanica
Torres de enfriamiento
Repuestos y accesorios de instalacion

MANTENIMIENTO

Correctivo y preventivo

Fijo: (7) 642 0087-695 1378
Cel: 315 893 8845
proyectos@ayrcol.co
ingenieria@ayrcol.co
Cr: 21 # 46-10

RELACION DE EQUIPOS

PALACIO AMARILLO				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	TALENTO HUMANO 2 PISO	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
2	TALENTO HUMANO 2 PISO	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	24,000 Btu/hr
3	OFICINA SALON PRINCIPAL SECRETARIA DESPACHO	1	SPLIT/YORK	60,000 Btu/hr
4	SALA DE JUNTAS SECRETARIA DEL INTERIOR	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
5	OFICINA CONTIGUA DESPACHO DEL INTERIOR	1	MINI SPLIT/YORK	9,000 Btu/hr
6	CONTROL INTERNO	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
7	CONTROL INTERNO	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
8	CONTROL INTERNO	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	18,000 Btu/hr
9	OFICINA TURISMO	1	SPLIT/YORK	60,000 Btu/hr
10	TALENTO HUMANO OFICINA 203	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	18,000 Btu/hr
11	LICENCIA DE INCAPACIDADES OFICINA 204	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	18,000 Btu/hr
12	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
13	GESTION DE INGRESOS	1	PISO TECHO/LG	36,000 Btu/hr
14	AUDITORIO	1	SPLIT/LG	54,000 Btu/hr
15	AUDITORIO	1	SPLIT/LG	54,000 Btu/hr
16	AUDITORIO	1	SPLIT/LG	54,000 Btu/hr
17	OFICINA FORES	1	SPLIT/CIAC	60,000 Btu/hr
18	INFRAESTRUCTURA OF 420	1	SPLIT/STARLIGHT	120,000 Btu/hr
19	RECURSOS FISICOS	1	SPLIT/CIAC	60,000 Btu/hr
20	INFRAESTRUCTURA MINERIA	1	SPLIT/STARLIGHT	60,000 Btu/hr
21	SECRETARIA DE DESARROLLO	1	CASSETTE/CONFORTFRESH	60,000 Btu/hr

SECRETARIA DE SALUD				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
2	DESPACHO PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD	1	MINI SPLIT/SAMSUNG	12,000 Btu/hr
3	DIRECCION DE DESARROLLO	1	SPLIT/AIREFLEX	120,000 Btu/hr

PASAPORTES				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	RACK	1	MINI SPLIT/LG	9,000 Btu/hr
2	SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
3	SALA DE ESPERA PRIMER PISO	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
4	SALA DE ESPERA PRIMER PISO	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
5	OFICINA PRIMER PISO	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
6	SEGUNDO PISO SALA DE ESPERA	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
7	ADMINISTRACION SEGUNDO PISO	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
8	OFICINA DOCTORA ADMINISTRACION	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr
9	COORDINACION SEGUNDO PISO	1	CASSETTE/LG	36,000 Btu/hr

ARCHIVO DEPARTAMENTAL				
ITEM	ZONA	CANT.	TIPO Y MARCA DE AIRE	CAPACIDAD
1	GRUPO HOSPITALES	1	MINI SPLIT/LG	24,000 Btu/hr
2	SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr

3	COORDINACION GESTION DOCUMNETAL	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr
4	GESTION DOCUMENTAL	1	PISO TECHO/LG	36,000 Btu/hr

LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA				
ITEM	**ZONA**	**CANT.**	**TIPO Y MARCA DE AIRE**	**CAPACIDAD**
1	LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	MINI SPLIT/LG	18,000 Btu/hr

Para constancia firma.

Ayrcol s.a.s
Aire y Refrigeración de Colombia
NIT. 900.688.449-0
TEL: 6820087 - 6524471

Elberto Figueroa Arias
Representante Legal Ayrcol S.A.S

Ayrcol s.a.s
Aire y Refrigeración de Colombia
Nit.: 900.688.449 0

SOPORTE DE ACTIVIDADES

Calle 46 N° 21-27 La Concordia Tel.: 6420087 Cel.: 315 893 9845 airecolombia@hotmail.com
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial



Ayrcol S.A.S.

DISEÑO E INSTALACION DE:

Equipos de aire acondicionado
Sistemas de tecnologia variable
Sistemas de ducteria
Cuartos frios
Chiller
Sistemas con filtracion especial para laboratorios y hospitales

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

Sistema de ventilacion mecanica
Torres de enfriamiento
Repuestos y accesorios de instalacion

MANTENIMIENTO

Correctivo y preventivo

Fijo: (7) 642 0087-695 1378
Cel: 315 893 8845
proyectos@ayrcol.co
ingenieria@ayrcol.co
Cr: 21 # 46-10

INFORME PARCIAL AVANCE DE OBRA

Al:	**Señor Andrés Fernando Balcázar Castaño** Supervisor
De:	**Edberg Abel Antolinez Rivera** Ingeniero Director de Proyecto
Asunto:	Informe de las labores efectuadas durante el 10 de Octubre al 09 de Noviembre
Objeto:	"SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE AIRES ACONDICIONDOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO YA EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER"
Contrato No:	CO1.PCCNTR.2671646
Fecha:	Bucaramanga, 17 de Diciembre del 2021

Previo un cordial saludo me dirijo ante usted para hacerle alcance del informe de los trabajos realizados en el **PALACIO AMARILLO**, **SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA PASAPORTES, ARCHIVO DEPARTAMENTAL** así:

1. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Comprende todo lo relacionado a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, regidos por las siguientes rutinas o procedimientos:

1.1 RUTINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

UNIDADES INTERNAS-EVAPORADORAS

En cada visita de mantenimiento preventivo se realizaron las siguientes actividades:

- Determinar estado de operación de los equipos
- Des incrustación con producto químico no acido Biodegradable
- Lavado de serpentines, drenajes y gabinetes
- Lubricación de motores ventiladores
- Limpieza de filtros de partículas
- Reajuste de tornillería
- Lavado de aspas ventiladores
- Verificación temperaturas y amperajes
- Limpieza de contactos de controles, PCBs principales y Displays
- Limpieza de rejillas de suministro y retorno
- Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos
- Llenar planilla de control de mantenimiento preventivo

UNIDADES EXTERNAS-CONDENSADORAS

En cada visita de mantenimiento preventivo se realizaron las siguientes actividades:

- Determinar estado de operación de las condensadoras
- Des incrustación con producto químico no acido Biodegradable
- Lavado de serpentines y gabinetes
- Lavado de aspas, lubricación de motores ventiladores
- Reajuste de tornillería
- Verificación de carga de gas refrigerante
- Verificación temperaturas y amperajes
- Comprobación de buen funcionamiento de los protectores de seguridad
- Limpieza de contactos de controles, PCBs principales y Displays
- Revisión y limpieza tableros eléctricos de distribución parciales
- Revisión del aislamiento térmico tubería de cobre
- Verificación de los soportes de neopreno condensadoras
- Monitoreo de temperaturas suministro y salida de aire
- Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos
- Llenar planilla de control de mantenimiento preventivo

1.2 RUTINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El mantenimiento correctivo se produce una vez que se presenta la avería y por lo tanto no tiene Una periodicidad concreta. Este tipo de mantenimiento aumenta su importancia en la medida que el mantenimiento preventivo es menor.

Una tarea de mantenimiento correctivo típica consta de las siguientes actividades:

- Detección del Fallo
- Localización del fallo
- Desmonte
- Recuperación o Sustitución
- Montaje
- Pruebas
- Verificación

2. REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1 PALACIO AMARILLO

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(TALENTO HUMANO 2 PISO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0334

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Talento Humano. 2º piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

M/to preventivo realizado en aire TIPO mini split marca samsung de 24.000 BTU.
- Se utilizo 1/2 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal - Luis f.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Talento humano 2° piso		
Tipo de aire: Mini split.	Marca: Samsung.	Capacidad: 24.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

AMADO RODRIGUEZ
Nombre:
Cargo: PROF. UNIVERITARIO

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(TALENTO HUMANO 2 PISO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0333

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Talento Humano 2º piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca Samsung de 24.000 BTU.
-Se utilizo 1/2 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Rodolfo I- Lusf.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Talento humano 2º piso

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	Samsung.	24.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

AMADO RODRIGUEZ
Nombre:
Cargo: PROF. UNIVERSITARIO

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca YORK. **(OFICINA SALON PRINCIPAL SECRETARIA DESPACHO)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0331

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Salon Principal Secretaria Despacho.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mto preventivo realizado en aire tipo central de 5 TR marca York. ubicado en oficina secretaria del interior
-Se utilizo 1 Litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Pola leal - luis f.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Salon Principal S. Despacho

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Central.	York	5TR.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Aurora Cortidor Villamil
Cargo: Asistente Despacho-Interior

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(SALA DE JUNTAS SECRETARIA DEL INTERIOR)**







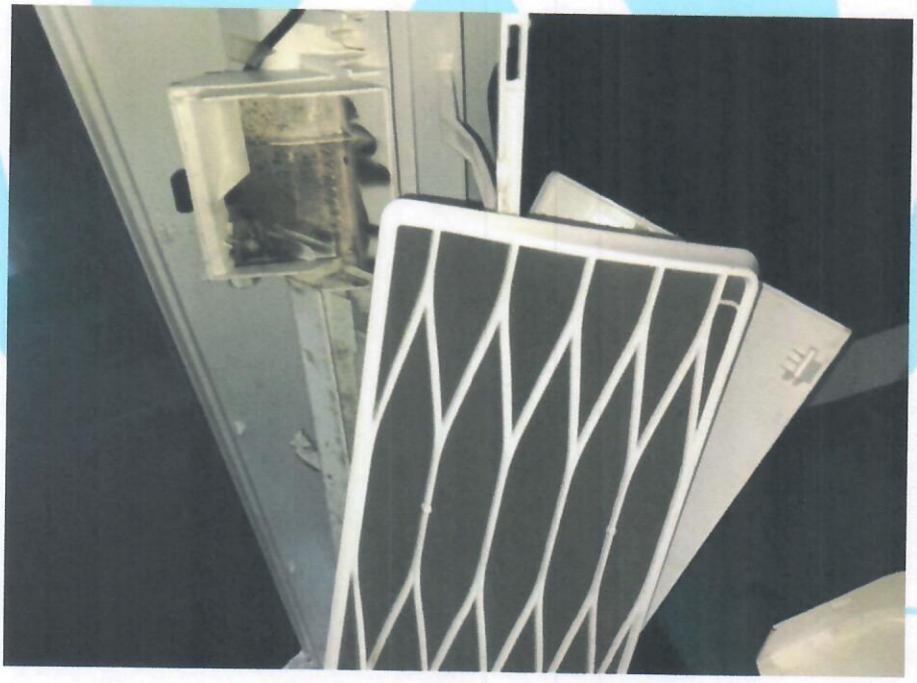

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0329

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Juntas secretaria del Interior
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca LG de 24.000 Btu.

Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal - luis f.		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo		Secretaria Interior Sala de Juntas		
Tipo de aire: Mini Split	Marca: LG.		Capacidad: 24.000 B.T.U.	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Ayrena Cortés Villarreal
Cargo: Asistente Despacho - Interior

✓ Mantenimiento Mini Split de 9,000 Btu/hr, marca YORK. **(OFICINA CONTIGUA DESPACHO DEL INTERIOR)**

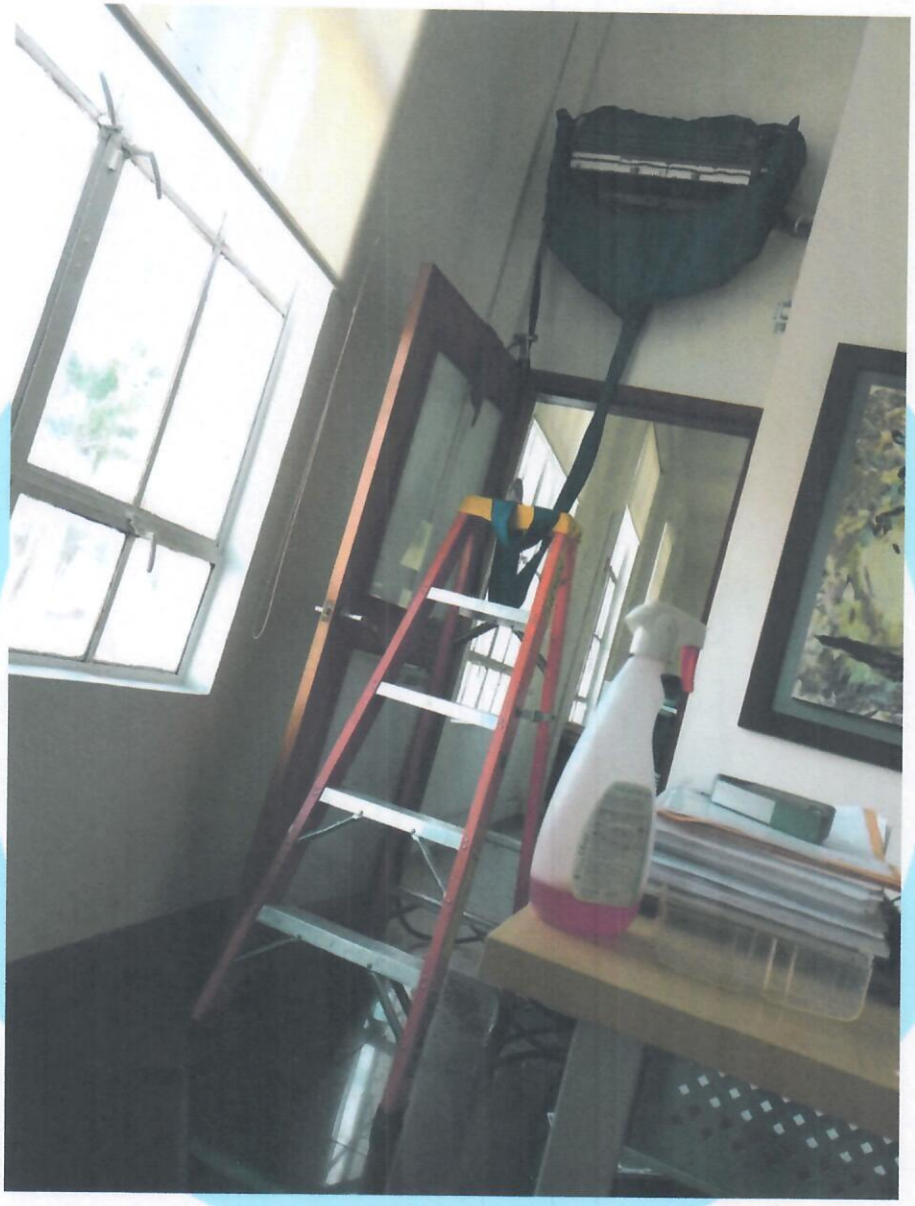

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0332

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Palacio Amarillo.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Contigua Despacho del Interior
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire Tipo mini split marca York. de 9000 Btu ubicado en oficina contigua Despacho
- Se utilizo ½ Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola - luis fernando.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Oficina Contigua Despacho

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split.	York.	9000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Arcena Cortidor Villareal
Cargo: Asistente-Despacho-Interior

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(CONTROL INTERNO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0539

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO:
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN: Control Interno.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control Interno
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo aire mini split Samsung de 12.000 Btu/hr:
- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrostante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	11	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio amarillo		control interno		
Tipo de aire: MNSPLIT	Marca: Samsung	Capacidad: 12.000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Benjamin Gutierrez S
Cargo: Jefe control interno

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(CONTROL INTERNO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0540

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: B/manga.
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control Intaro
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo aire mini split. Samsung de 12.000 Btu/hr.

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.L	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	11	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio amarillo		Control Interno		
Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:		
INVERTIT	Samsung	12.000		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Benjamin Gutierrez S
Cargo: Jefe Control Interno

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(CONTROL INTERNO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0541

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: Cll 37 UBICACIÓN:
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control Interno.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realito mantenimiento preventivo aire mini split Samsung. de 18.000 Btu/hr.

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	11	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio amarillo	CONTROL interno

Tipo de aire.	Marca:	Capacidad:
MINSPLIT	SAMSUNG	18.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Benjamin Gutierrez S.


Nombre: Benjamin S

Cargo: Jefe control Interno

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca YORK. **(OFICINA TURISMO)**

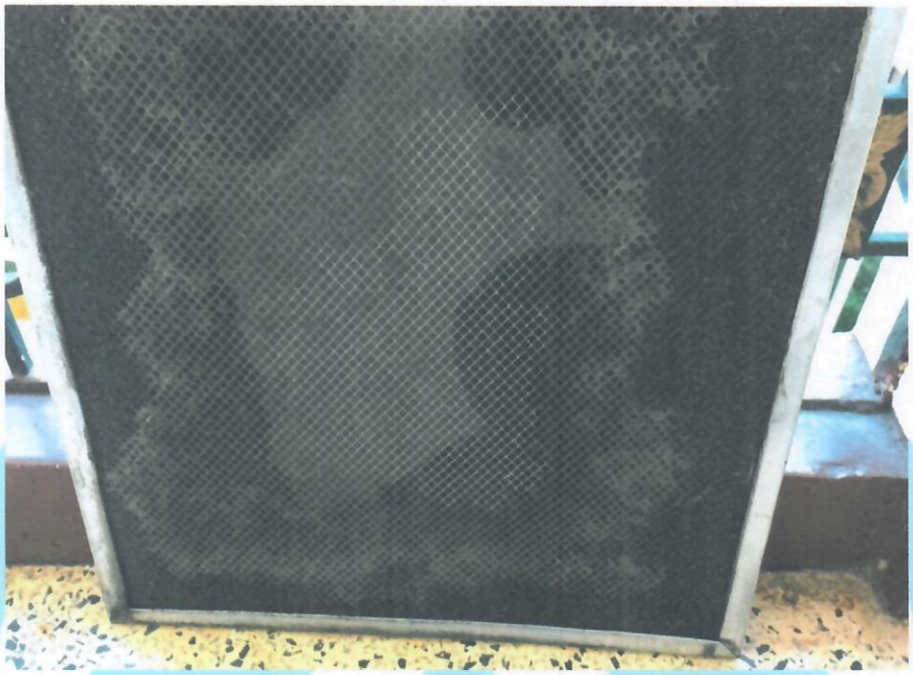



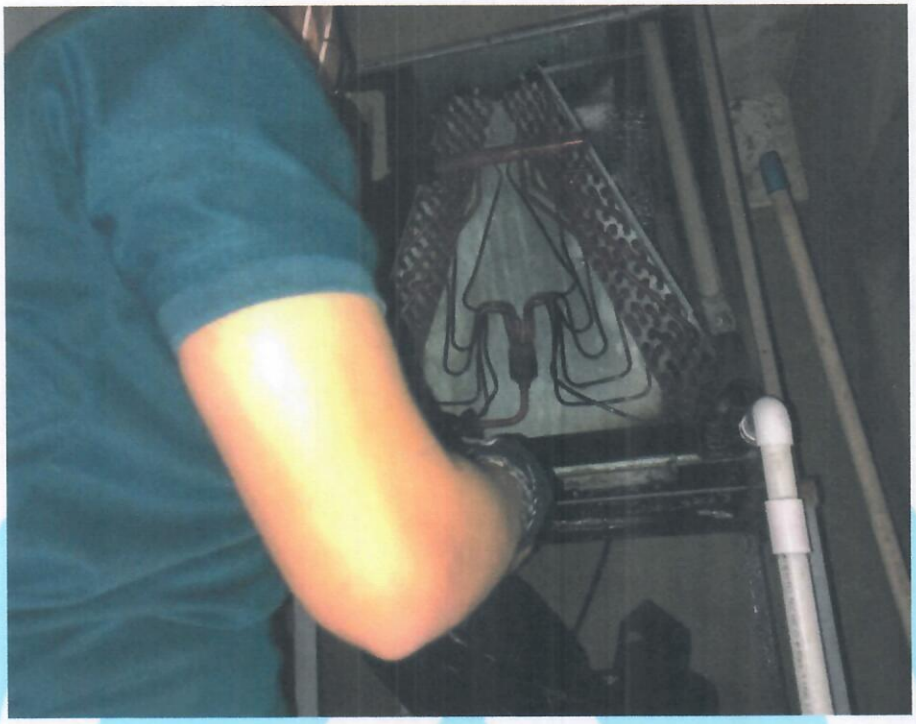





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0757

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN: OFICINA turismo
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: OFICINA turismo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Mantenimiento General a aire acondicionado 60.000 Btu
Limpieza Regilas de confeccion de Equipo Revicion amperaules compresor y Motores Ventiladores

se utilizo 1 litro de desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis Paola	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	11	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio amarillo	Oficina 409 Secretaria de cultura - Salón de Trabajo

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
SPLIT	YORK	60.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elizabeth Peña Leon

Nombre: Elizabeth Peña Leon.
Cargo: coordinadora Compras

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(TALENTO HUMANO OFICINA 203)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0543

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini split Samsung
DIRECCIÓN: cll 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: /
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Talento humano Oficina 203.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

-Se realizo mantenimiento preventivo aire mini split Samsung de 18.000 Btu/hr

-Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio amarillo	OFICINA 203 Talento Humano

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
MINSPLIT	Samsung	18.000

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Yaneth Parra
01-10-21


Para constancia firma:

_____

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(LICENCIA DE INCAPACIDADES OFICINA 204)**



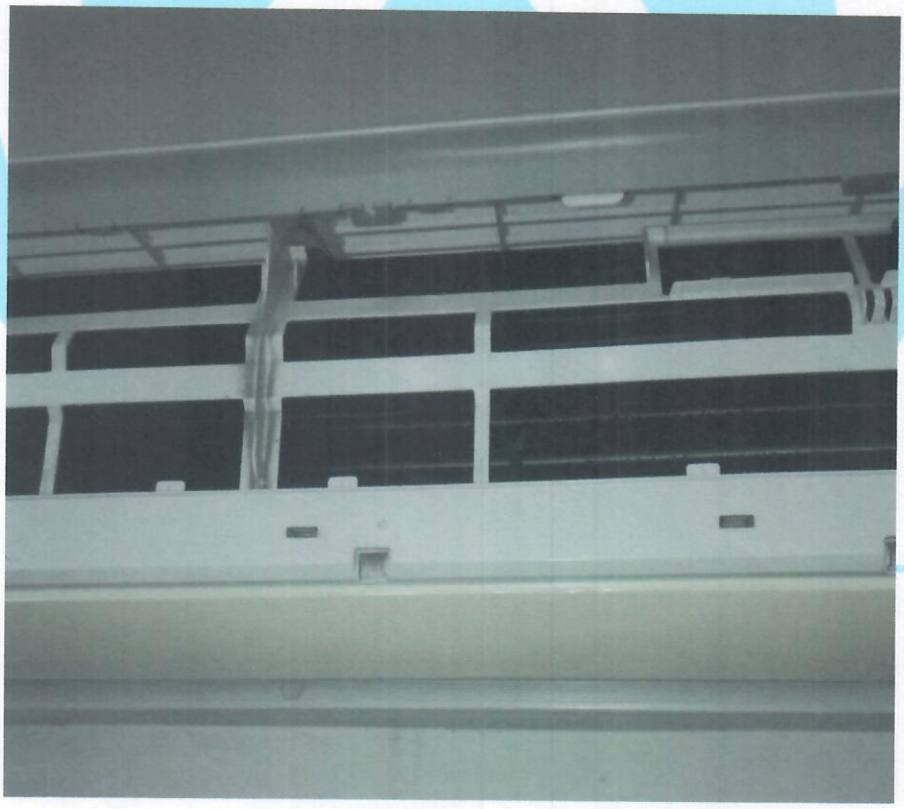

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0544

CLIENTE: Departamento de Santander. MODELO: Mini split Samsung.
DIRECCIÓN: cll: 37 UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Licencia de Incapacidades oficina 204
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Se realizo mantenimiento preventivo aire mini split Samsung de 18.000 Btu/hr.

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.l.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio amarillo	OFICINA 204 Licencia de incapacidades

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
MINSPLIT	Samsung	18.000 BTU

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Yaneth Parra
11-10-21

Para constancia firma:

_____

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(PAZ Y DERECHOS HUMANOS)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0758

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: Calle 37
UBICACIÓN: Oficina 404
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Paz y derechos Humanos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo Mantenimiento General a aire acondicionado Limpieza de centrifugo del Equipo y Revicion General del Equipo amperajes del compresor y motores Ventiladores

- Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Pablo Luis		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	11	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio amarillo	oficina 404 Paz y Derechos. Humanos

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
MINSPLIT	L. G.	24.000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Martha Luz Rodriguez M.


Nombre:
Cargo: Auxiliar Administrativo.

✓ Mantenimiento Piso Techo de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(GESTION DE INGRESOS)**

Cambio de tarjeta



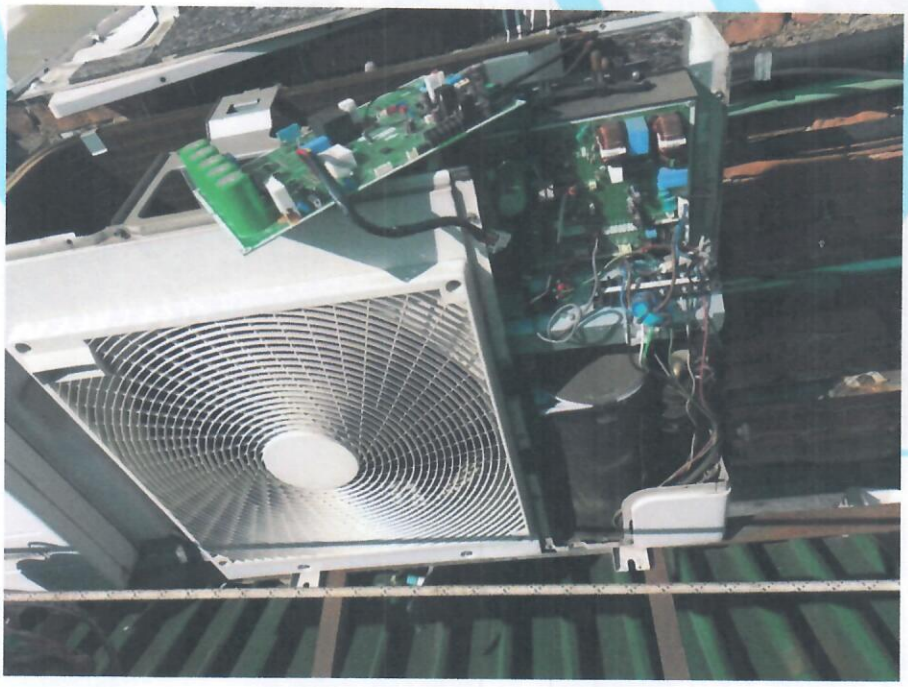

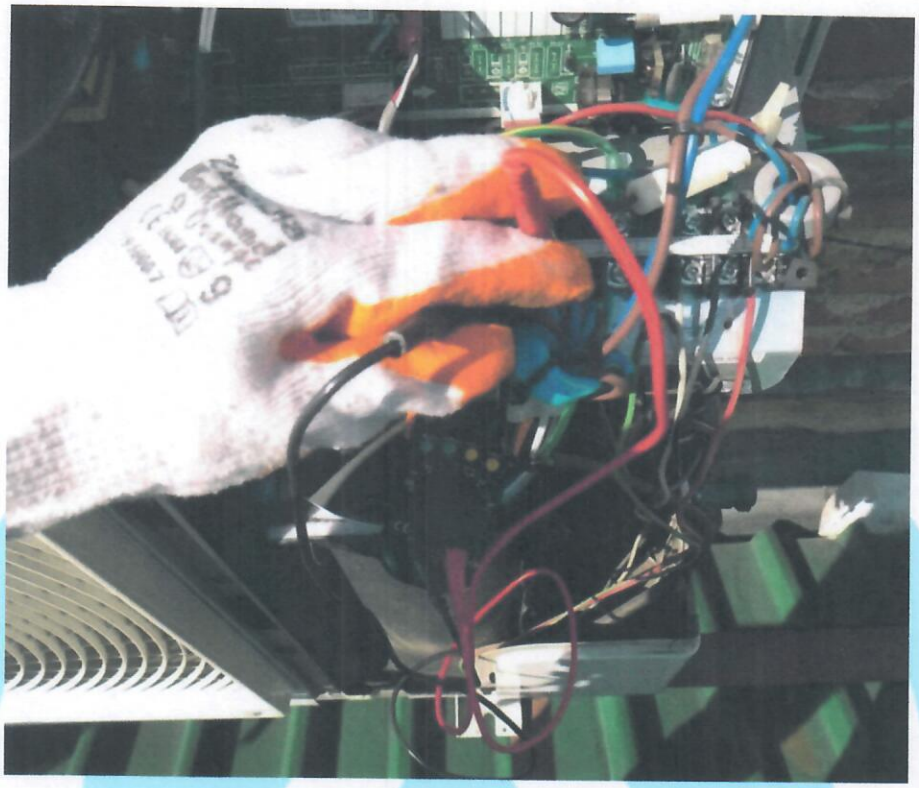

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0537

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Gestion de Ingresos.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: Correctivo
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Cubierta
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e instalación de tarjeta principal en condensadora de aire acondicionado Tipo Piso techo de la oficina gestion de Ingresos.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Pedro leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	11	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Gestion de Ingresos.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Piso Techo	LG.	36000

Actividad: Correctivo [X] Preventivo [ ] Instalacion [ ]


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: Feisal Duarte Cruz
Cargo: CPS

✓ Mantenimiento Split de 54,000 Btu/hr, marca LG. **(AUDITORIO)**

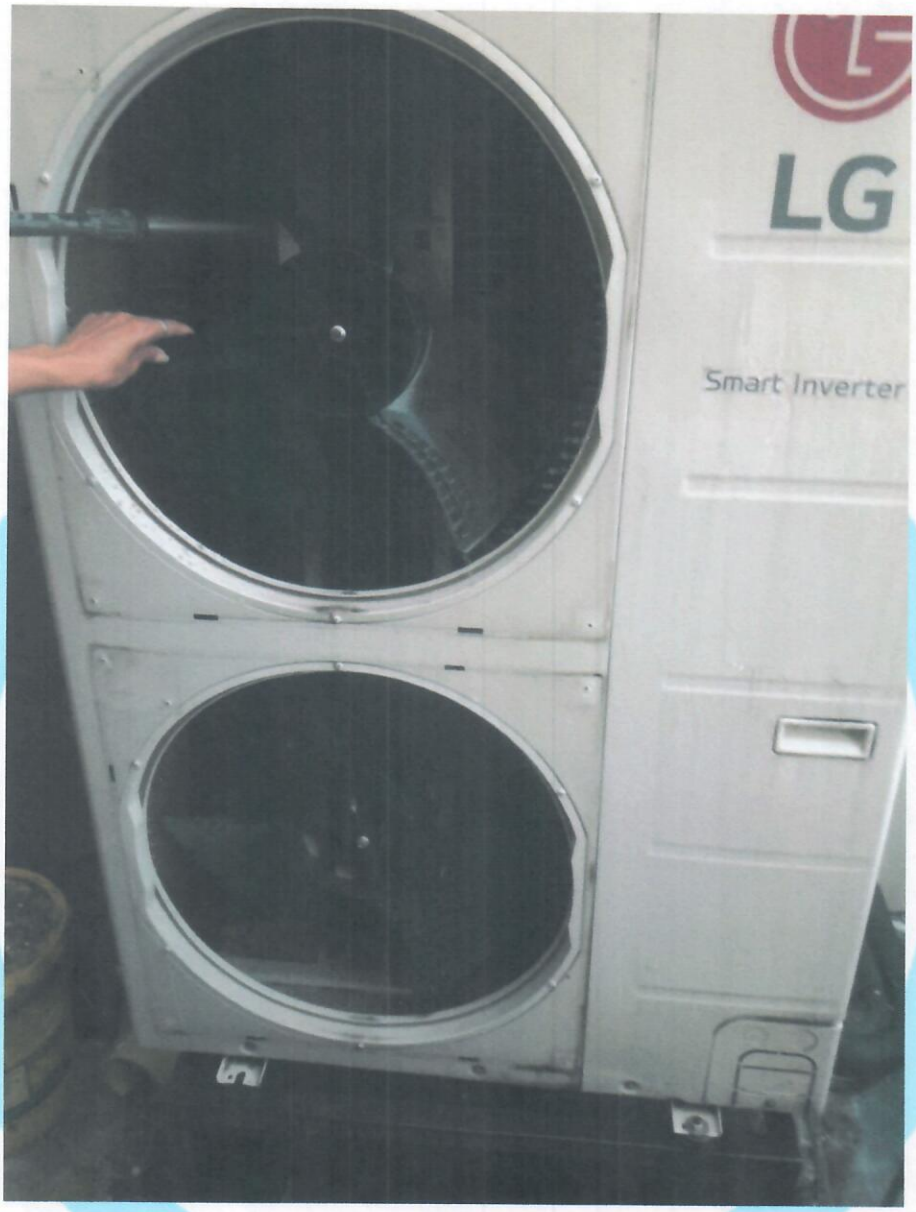



LG
Smart Inverter


LG

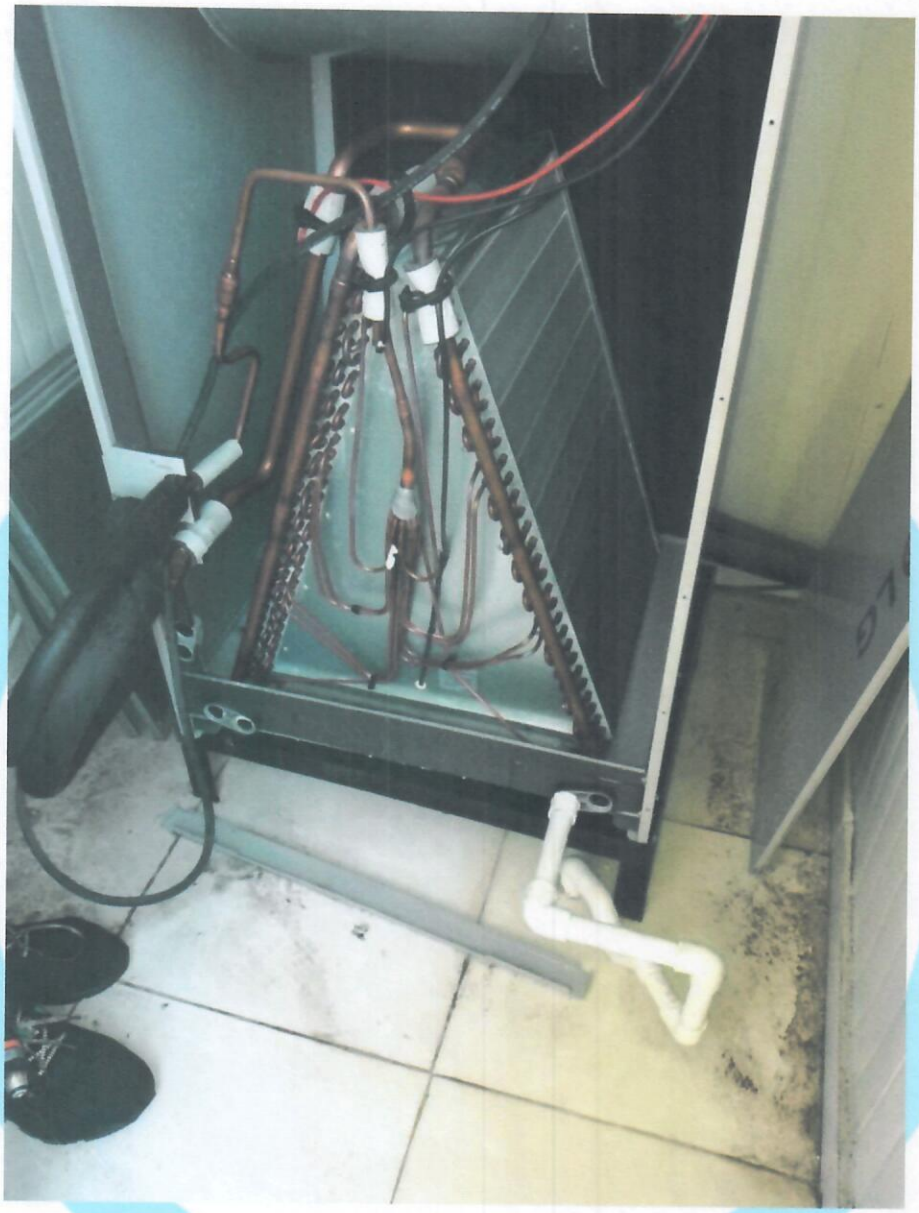

Cambio de ducteria.



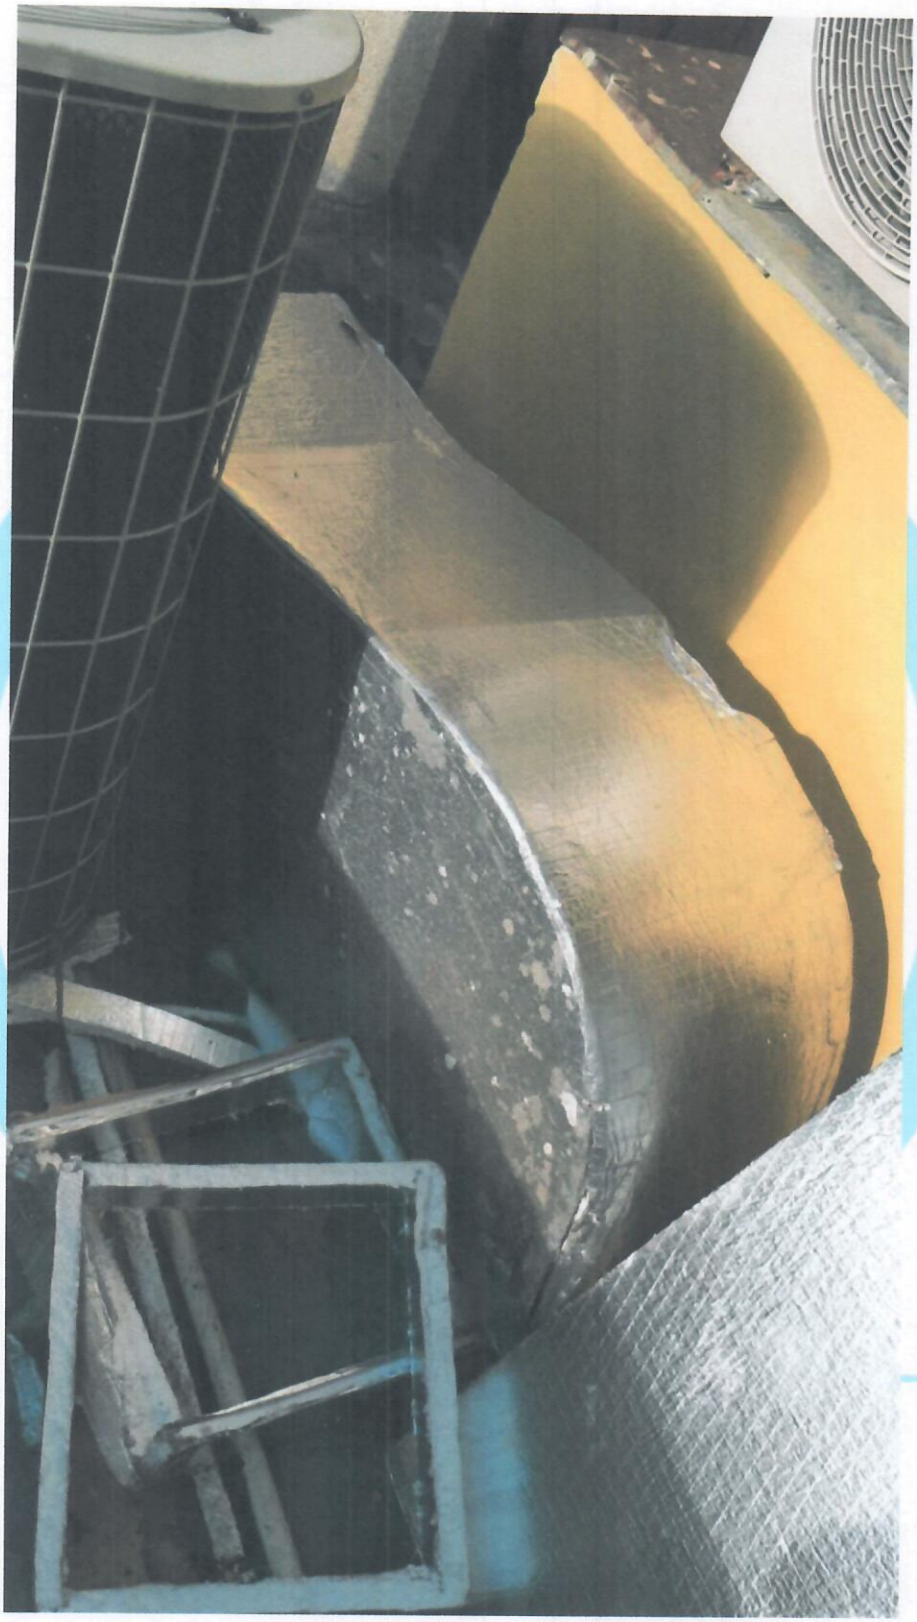

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0548

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Split dacto de 54.000 Btu/hr.
DIRECCIÓN: C11 37 UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio Augusto Espirosci
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento general preventivo a un aire acondicionado de 54.000 Btu/hr, split dacto.

Se utilizo 1 litro de liquido desincrustante.

Cambio de conductos de aire en lamina rigida de poliisocianurato

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo	Auditorio Agosto

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Split	L.G	54.000 Btu/hr

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Coordinador R. fisicos

✓ Mantenimiento Split de 54,000 Btu/hr, marca LG. **(AUDITORIO)**




WARNING

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0549

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Split ducto de 54.000 Btu/hr.
DIRECCIÓN: cll 37
UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio Augusto Espinosa
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento general preventivo a un aire acondicionado de 54.000 Btu/hr, Split ducto.

Se utilizo 1 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		28	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio amarillo		Auditorio		
Tipo de aire: SPLIT	Marca: L.G		Capacidad: 54.000	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Coordinador R. Fisicos


✓ Mantenimiento Split de 54,000 Btu/hr, marca LG. **(AUDITORIO)**




LG
Smart Inverter

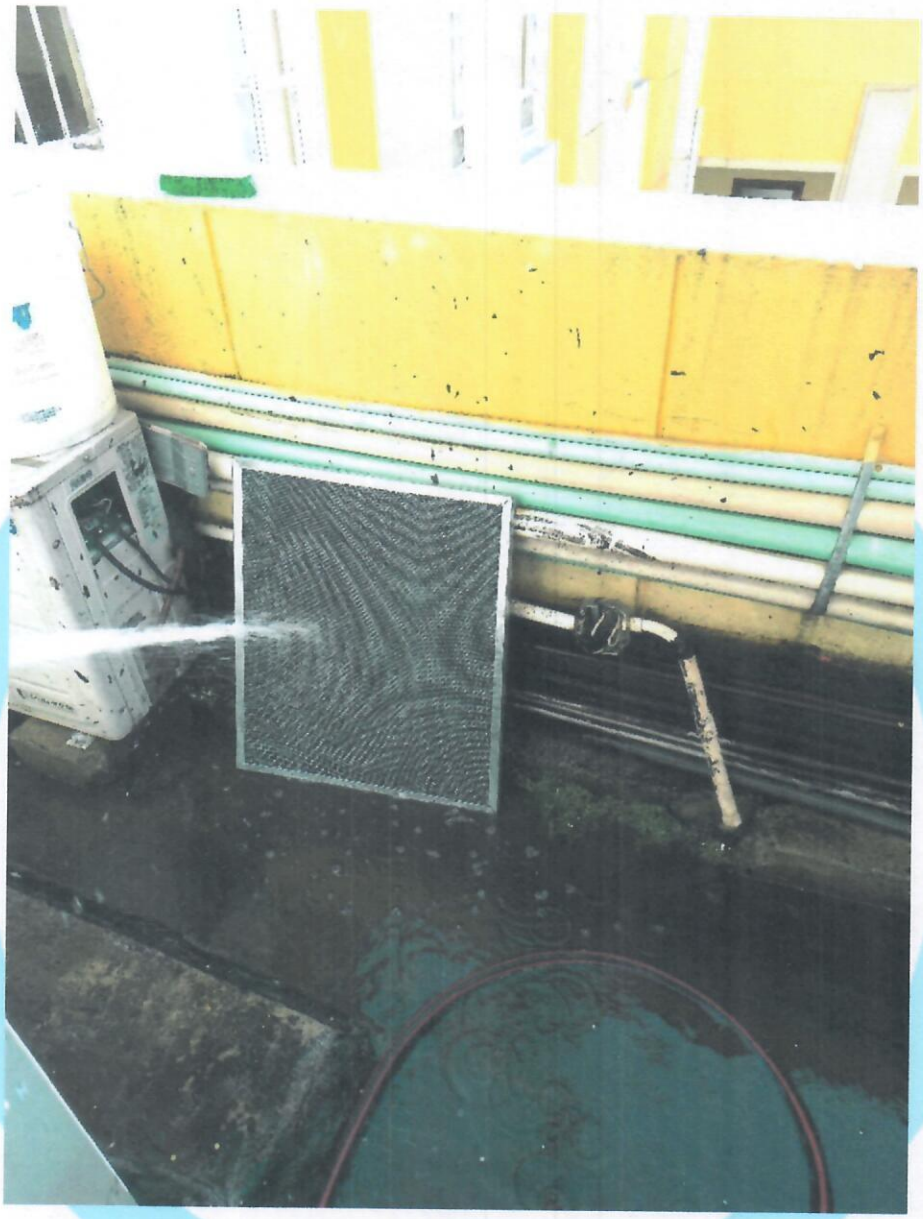

Cambio de compresor

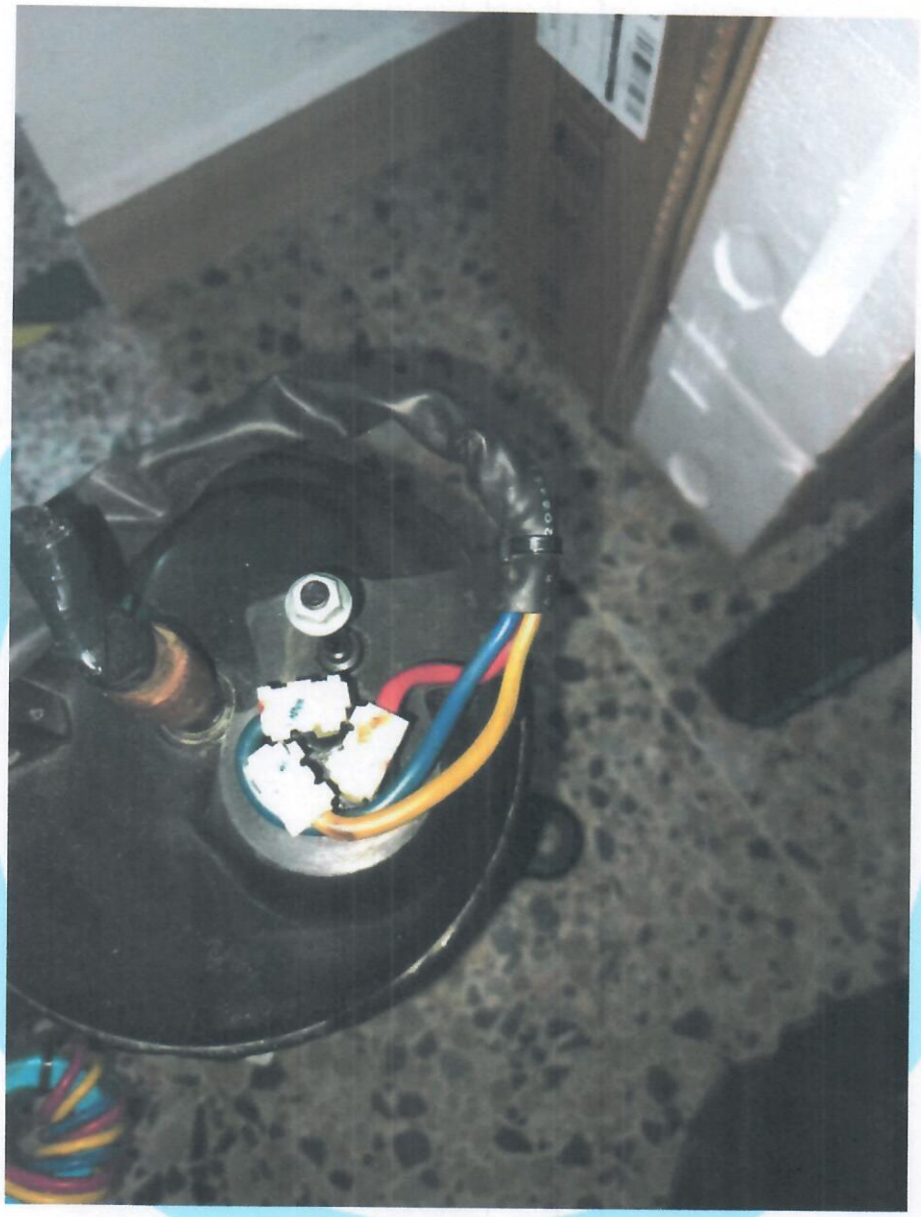

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.




GPT442MBA
DC MOTOR
3 PH DC 380V
LG



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1544

CLIENTE: Departamento de Santander.
DIRECCIÓN: Calle 37.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio Agusto Espinosa.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro, Instalación, compresor 60.000 Btu/hr, para una condensadora carga de refrigerante R410A, 10 libras, Soldaduras y accesorios de cobre. Gases soldables (Oxigeno, acetileno) y nitrogeno para presurizar.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F. C.		

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0550

CLIENTE: Departamento de Santander MODELO: Split ducto de 54.000 Btu/hr.
DIRECCIÓN: Cll 37. UBICACIÓN:
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Auditorio Agusto Espinosa
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento general preventivo a un aire acondicionado de 54.000 Btu/hr, Split ducto.

Se utilizo 1 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		26	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio amarillo		Auditorio		
Tipo de aire: SPLIT	Marca: L·C	Capacidad: 54.000		
Actividad:	Correctivo ☑	Preventivo ☑	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Coordinadora R. Fisicos

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca CIAC. **(OFICINA FORES)**

Cambio motor unidad condensadora





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0759

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN: calle 37
UBICACIÓN: Cubierta
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [ ] OTROS: [✓]
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Flores
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro 1 Motor para una condensadora 1 1/3 y carga de Refrigerant R 22
10 Libras
Corección de un escape de la tubería de cobre

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis FC		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	11	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Palacio Amarillo.	Oficina fores.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Split. ducto.	CIAC	5TR

Actividad: Correctivo [X] Preventivo [ ] Instalacion [ ]

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: Recursos Fisicos
coordinador


- ✓ Mantenimiento Split de 120,000 Btu/hr, marca STARLIGHT. **(INFRAESTRUCTURA OF 420)**

Cambio de compresor



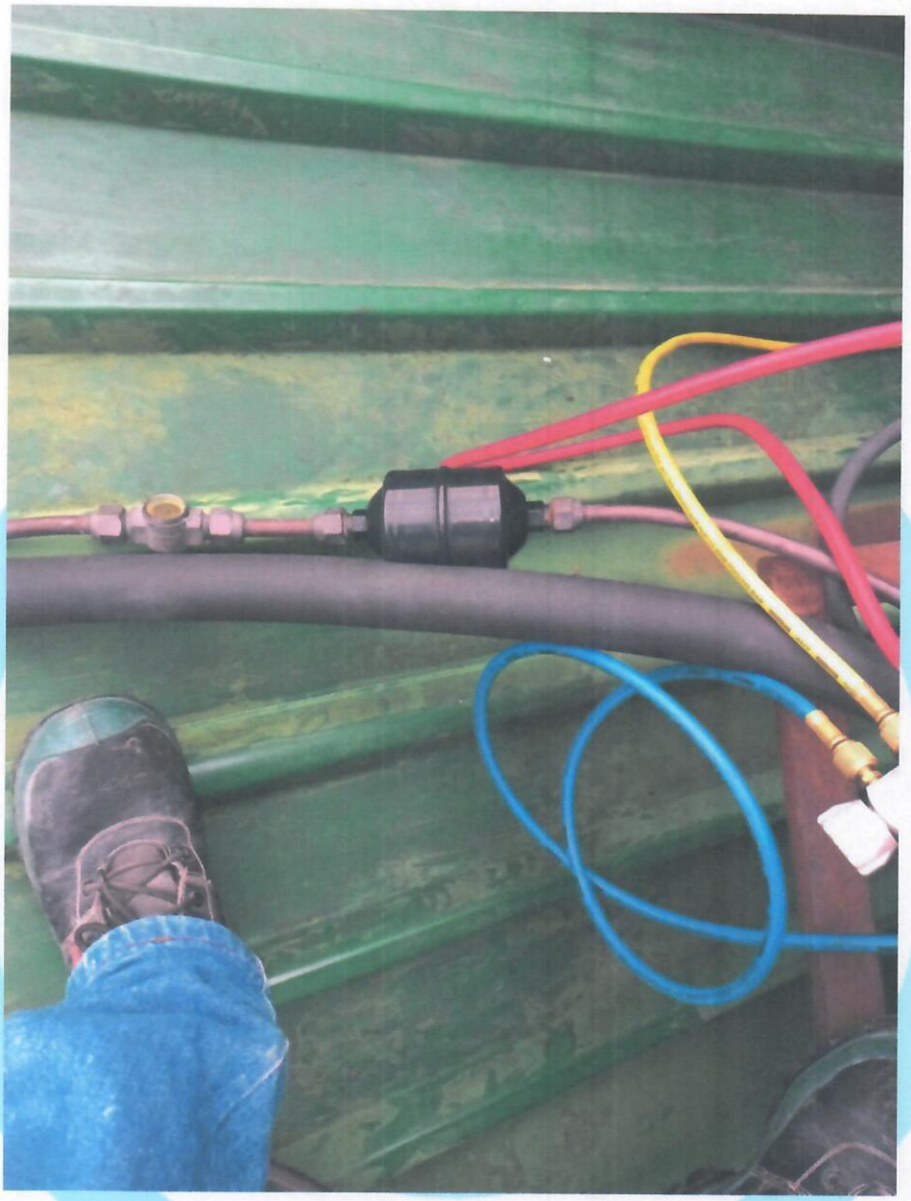




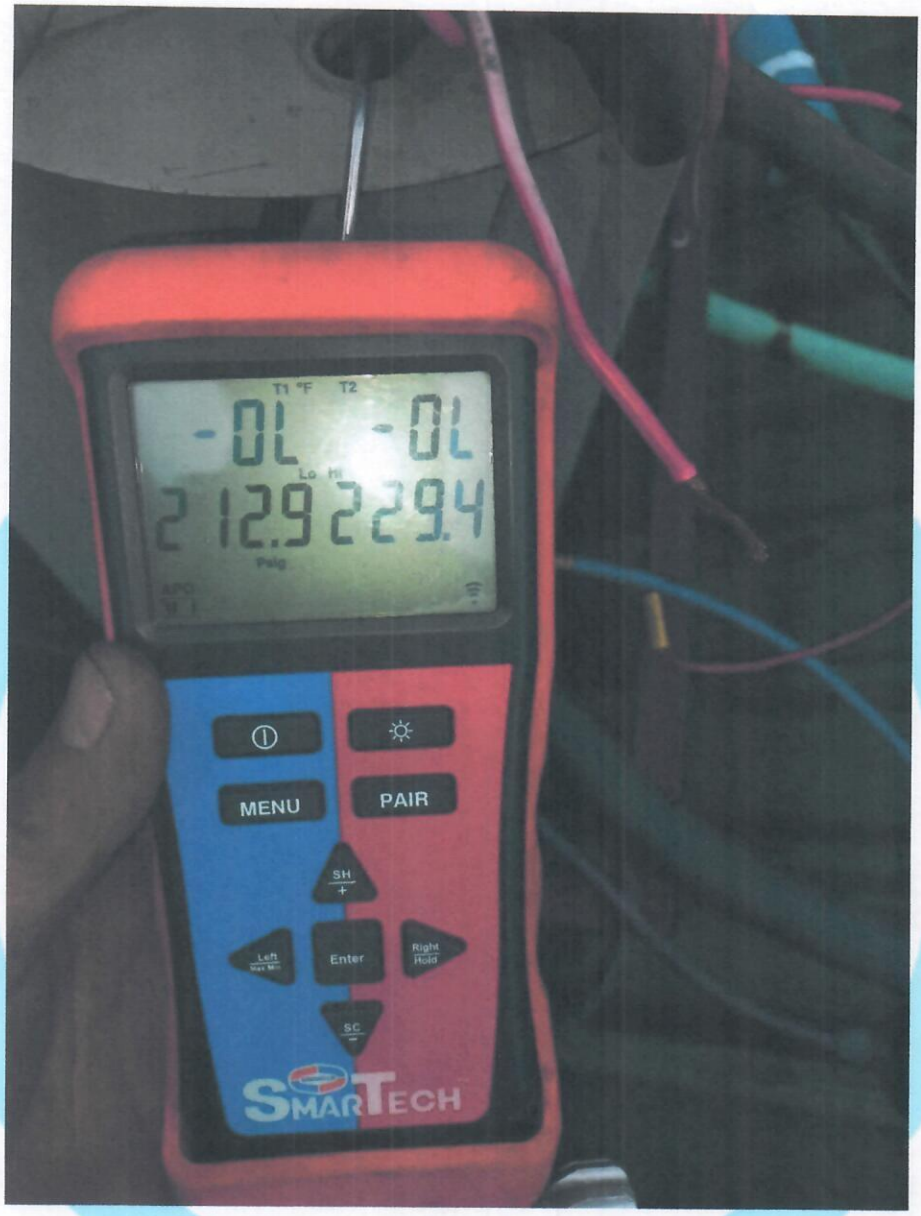

Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.



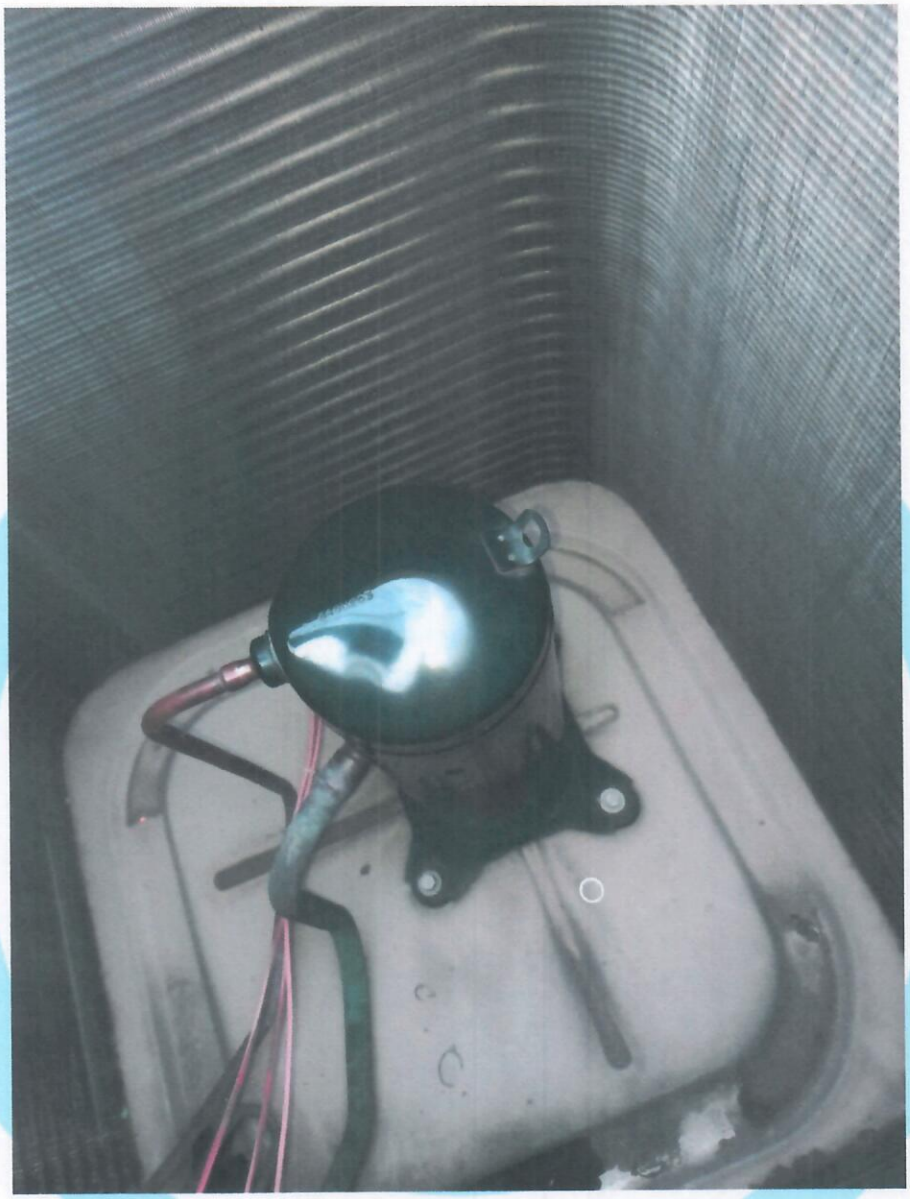

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	M.	AÑO
	03	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1545

CLIENTE: Departamento de Santander
DIRECCIÓN: Cll: 37.
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
UBICACIÓN EQUIPO: Infraestructura OF 420.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación de Compresor de 10TR
Suministro y cambio de Filtro Secador 3/8"
Carga de Refrigerante R410A. - 10 libras
Soldadura, accesorios de Cobre
Retardador de arranque.
Gases para soldadora (Oxigeno, acetileno)
Nitrogeno para presurización

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F.C.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	11	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Gobernación		Infraestructura. Of. 420.		
Tipo de aire: Split. Ducto.	Marca: Starlight	Capacidad: 10.TR.		
Actividad:	Correctivo [X]	Preventivo [ ]	Instalacion [ ]	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca CIAC. **(RECURSOS FISICOS)**

Cambio motor unidad condensadora

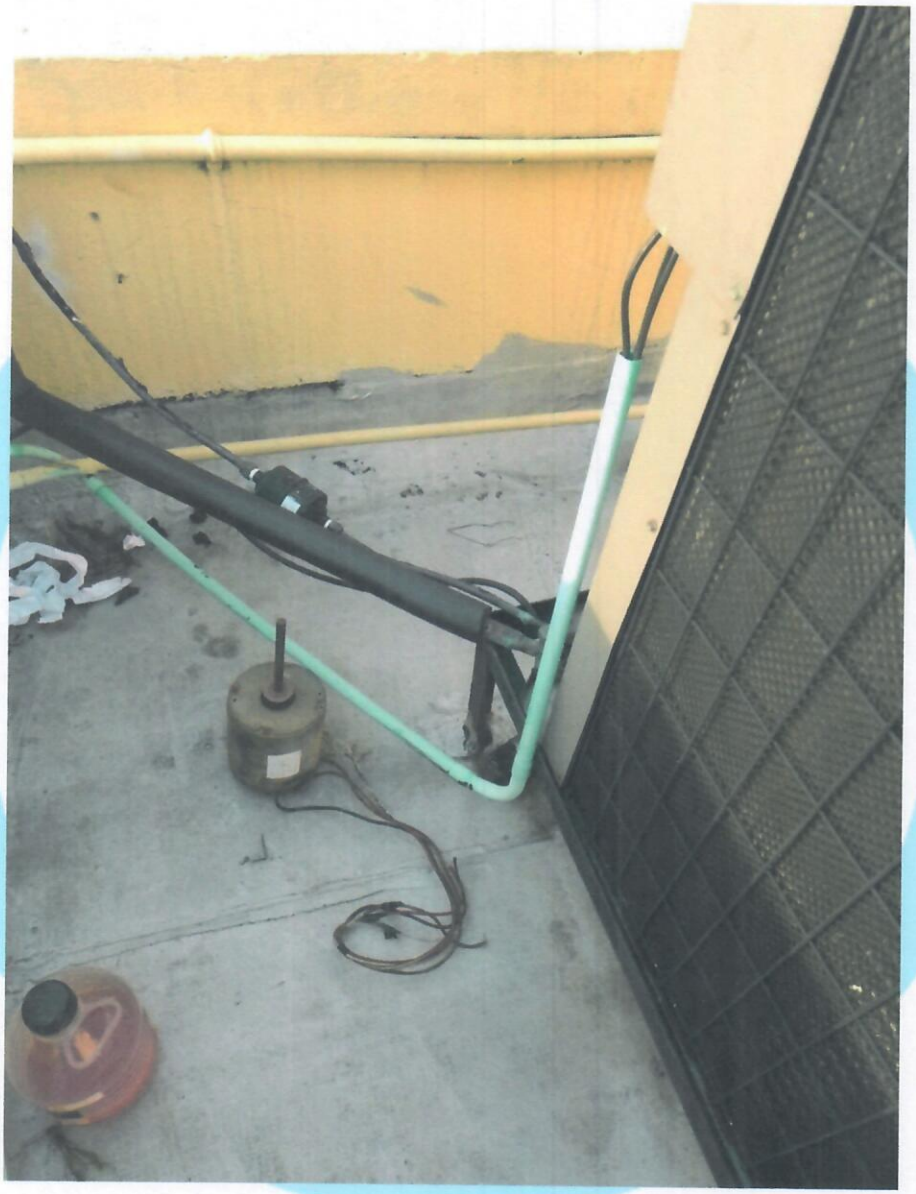





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1546

CLIENTE: Departamento de Santander

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Recursos fisicos

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro y cambio de motor de 1/3 Hp en condensadora de equipo de 60.000 Btu/hr

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Luis F. C.	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		03	11	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Gobernación		Recursos fisicos.		
Tipo de aire: Split. Ducto.	Marca:	Capacidad: 60.000. Btu.		
Actividad:	Correctivo ☒	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Laura Adriana Tosano

Nombre: Laura Adriana Tosano
Cargo: Auxiliar Administrativo

- ✓ Mantenimiento Split de 60,000 Btu/hr, marca STARLIGHT. **(INFRAESTRUCTURA MINERIA)**

Cambio de compresor













Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0536

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Infraestructura - Mineria
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: correctivo. REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Cubierta.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e instalacion de compresor de 5 en condensadora de equipo
Suministro e instalacion de filtro secador de 3/8
Carga de Refrigerante R 22, soldadura, accesorios de cobre.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal.		

Recibido a Satisfacción


	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		13	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Infraestructura - Minero		
Tipo de aire: Split. ducto.	Marca: Starlight	Capacidad: STR.		
Actividad:	Correctivo ☒	Preventivo ☐	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Enrique Vargas P.
Cargo: Prof. Universitario.

✓ Mantenimiento Cassette de 60,000 Btu/hr, marca CONFORTFRESH. **(SECRETARIA DE DESARROLLO)**

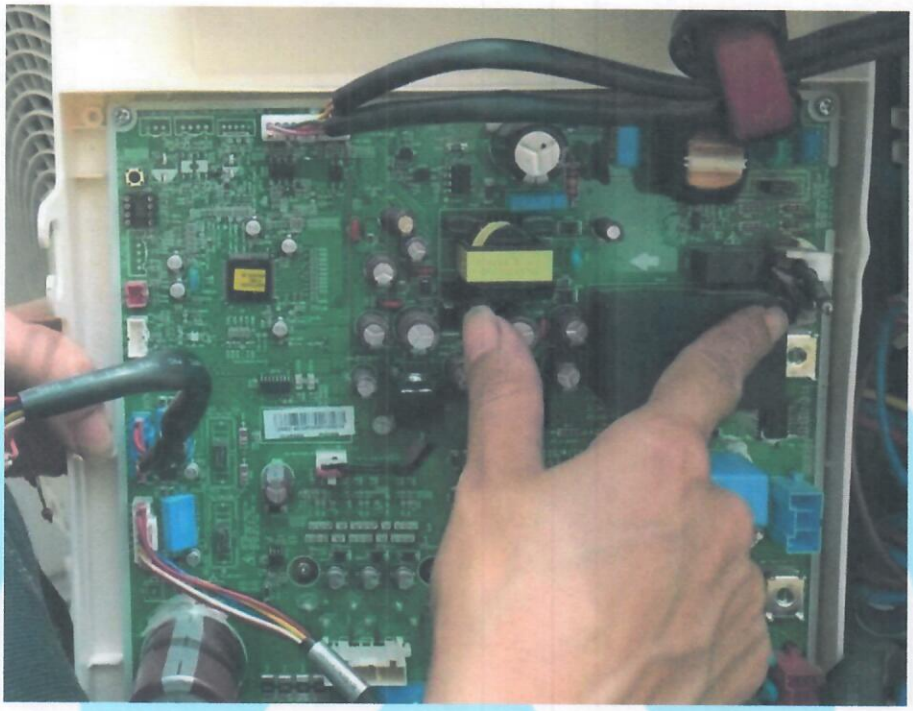

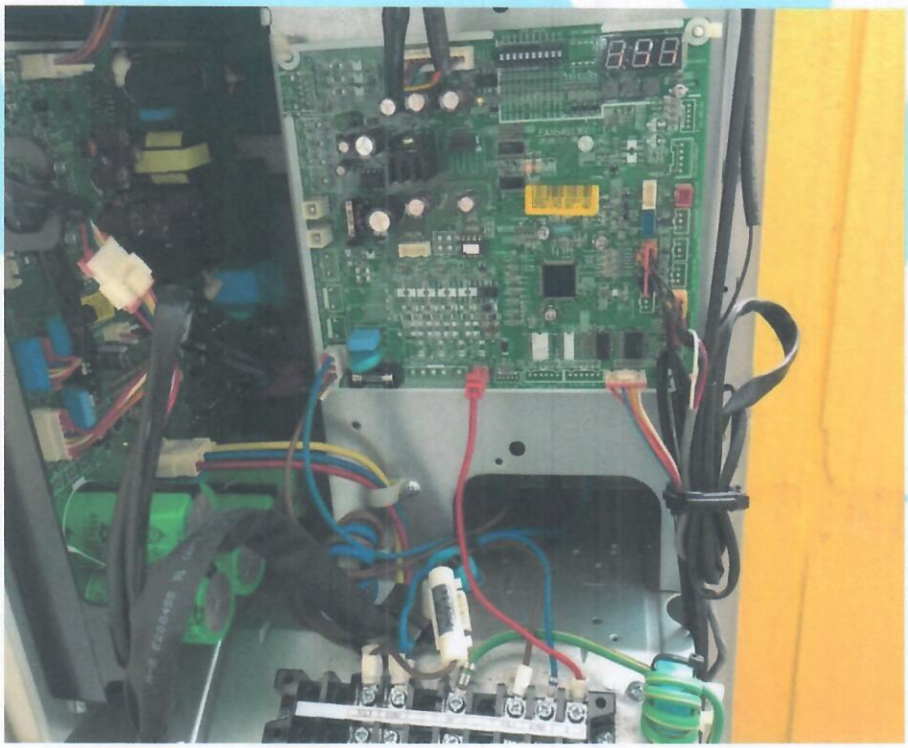

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0535

CLIENTE: Gobernacion — MODELO:

DIRECCIÓN: — UBICACIÓN: Secretaria Desarrollo.

CIUDAD: Bucaramanga.

MANTENIMIENTO: Correctivo — REVISIÓN: — MONTAJE: — OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Cubierta.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e instalación de tarjeta principal en condensadora de aire acondicionado tipo casette de la oficina Secretaria de desarrollo

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		13	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Palacio Amarillo.		Secretaria Desarrollo.		
Tipo de aire: Case He	Marca: ConfortFresh.	Capacidad: 5TR.		
Actividad:	Correctivo ☒	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo: Coordinador Recursos Fisicos

2.2 SECRETARIA DE SALUD

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD)**





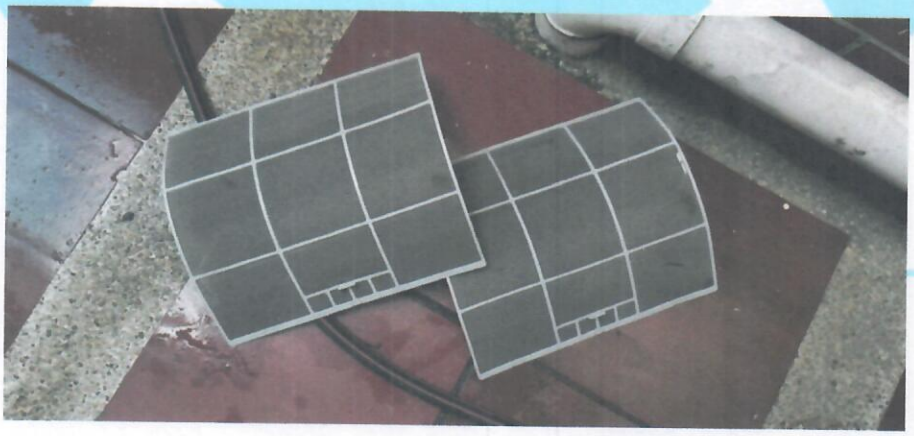

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1548

CLIENTE: Departamento de Santander
DIRECCIÓN: Secretaria de Salud.
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Planeación y mejoramiento en Salud
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split Samsung de 12.000 Btu/hr.

Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Duvan Tarazona.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	11	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria De Salud	Planeación y Mejoramiento En Salud.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini-Split	Samsung	12-000 BTU

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yirley Marcela Avila Becerra

Nombre: cc 1090452564.

Cargo: Profesional Universitario SSS.

✓ Mantenimiento Mini Split de 12,000 Btu/hr, marca SAMSUNG. **(DESPACHO PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD)**







Cambio de compresor






SAMSUNG










Ayrcol
Aire y Refrigeración de





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1549

CLIENTE: Departamento de Santander.
DIRECCIÓN: Secretaria de Salud
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho Planeación y mejoramiento en Salud
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación compresor de 12.000 Btu/hr, Incluye gases para soldar (Oxigeno, Acetileno) y Nitrogeno para presurización. Recarga completa de Gas refrigerante R410A.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Duvan Tarazona.	6420087.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1547

CLIENTE: Departamento de Santander.
DIRECCIÓN: Cll 37 - Secretaria de Salud
CIUDAD: B/manga.
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Despacho planeación y Mejoramiento en Salud.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split Samsung de 12.000 Btu/hr

Se utilizo 1/2 litro de liquido desincrustante.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Duvan Tarazona	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		06	11	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Secretaria De Salud		Despacho Planeación y Mejoramiento En Salud		
Tipo de aire: Mini - Split	Marca: SamSung	Capacidad: 12.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yirley Marcela Avila Becerra
Nombre: cc. 1090452561
Cargo: Profesional Universitario SSJ

✓ Mantenimiento Split de 120,000 Btu/hr, marca AIREFLEX. **(DIRECCION DE DESARROLLO)**











Ayrcol sas
Aire y Refrigeración de Colombia




Cambio motor



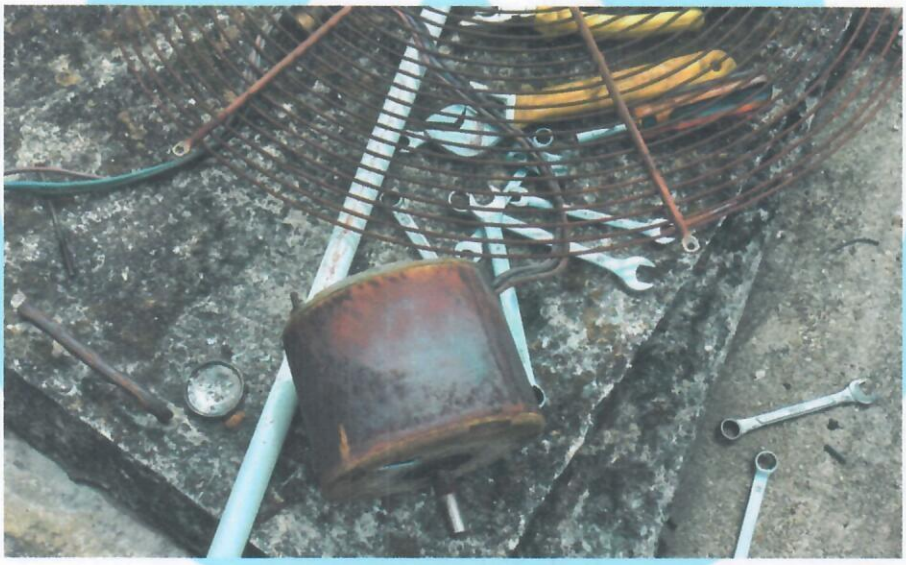



Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

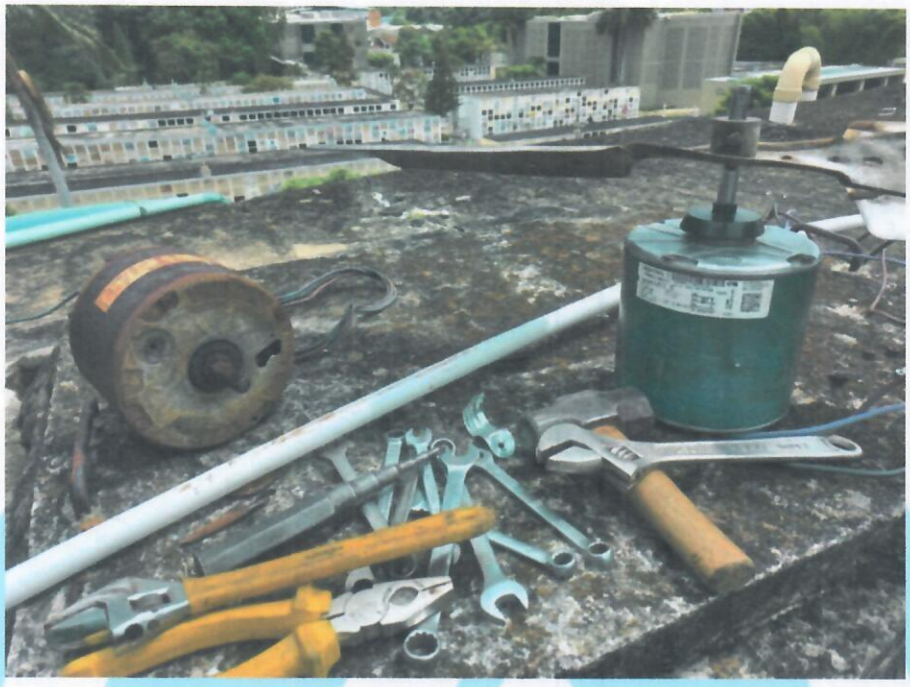

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1550

CLIENTE: Departamento de Santander.
DIRECCIÓN: Secretaria de Salud.
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Direccion de desarrollo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalacion Compresor de 10TR, Incluye gases para Soldadura (Oxigeno, Acetileno), Nitrogeno para presurizacion Recarga de gas completa refrigerante. R22

Cambio motor unidad condensadora. 1/3 Hp.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Edwin Gómez	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		3	11	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
SECRETARIA DE SALUD		DIRECCION DESARROLLO DE SERVICIOS VIJILANCIA Y CONTROL		
Tipo de aire: SPLIT DUCTO	Marca: AIREFLEX	Capacidad: 120.000 BTU		
Actividad:	Correctivo ☒	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

2.3 PASAPORTES

✓ Mantenimiento Mini Split de 9,000 Btu/hr, marca LG. **(RACK)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0328

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Rack.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mtto preventivo realizado en aire tipo mini split marca LG de 9000 Btu ubicado en Rack.

- Se utilizo 1/2 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Rada leal - Luis f.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Oficina Pasaporte	Rack.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini split.	LG.	9000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS- Ofic. Pasaportes.

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO No. 0321

CLIENTE: Gobernación

DIRECCIÓN: MODELO:

CIUDAD: Bucaramanga. UBICACIÓN: Edificio Pasaporte.

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Juntas 2º piso.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36.000 Btu marca LG ubicado en sala de Juntas segundo piso
-Se utilizo 1 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO: Paola leal-luis fernando.

AYRCOL:

CLIENTE:

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Oficina Pasapoite	Sala de Juntas. 2° piso

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casete	LG	36000 Btu

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: cps- ofic. Pasaportes

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(SALA DE ESPERA PRIMER PISO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0324

CLIENTE: Gobernacion
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Espera 1er piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36.000 Btu marca LG ubicado en sala de espera 1er piso.
- Se utilizo 1 Litro de liquido desincrostante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal - Luis fernando		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Oficina Pasaportes		Piso 1		
Tipo de aire: Cassette	Marca: LG		Capacidad: 36.000 Btu.	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS. - OFIC. PASAPORTES

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(SALA DE ESPERA PRIMER PISO)**

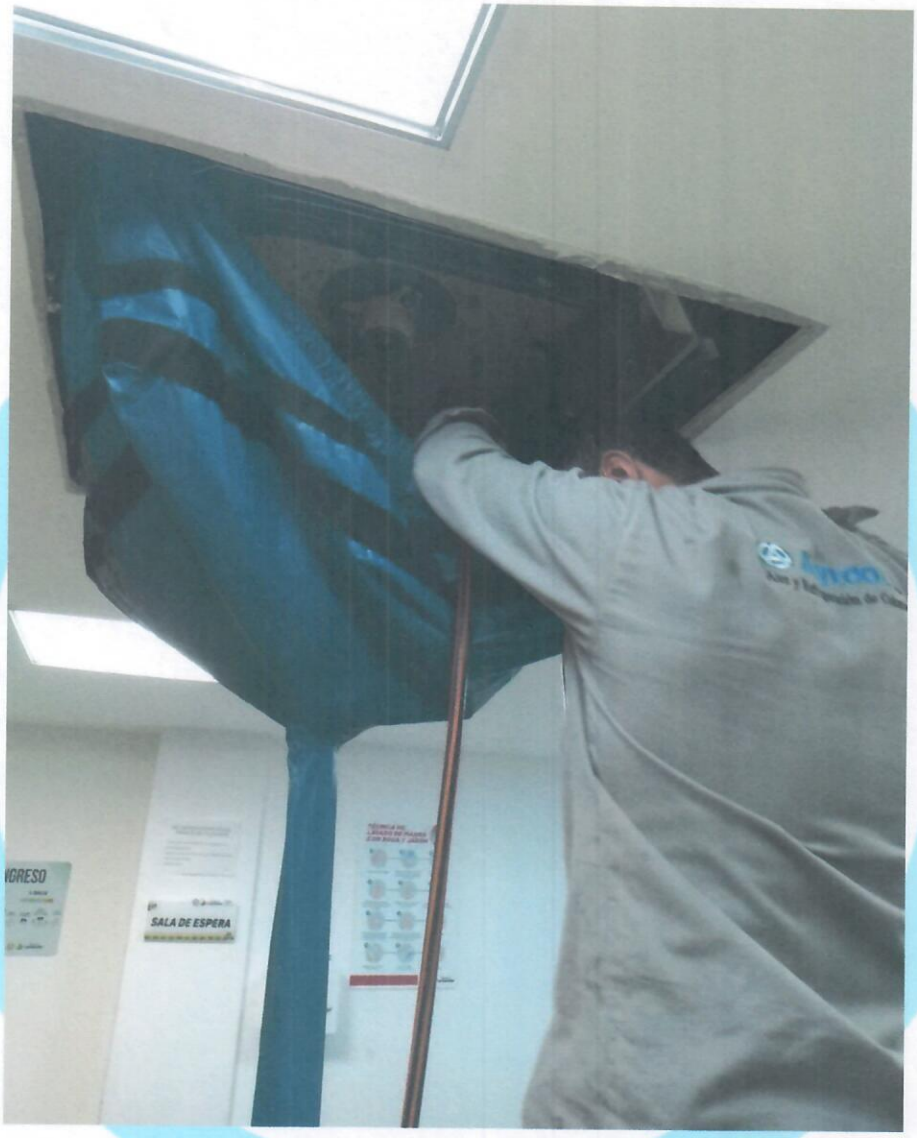

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0323

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Espera 1er piso
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36.000 Btu marca LG ubicado en sala de Espera 1er piso.
-Se utilizo 1 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal - luis fernando		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Oficina Pasaportes		1 Piso		
Tipo de aire: Casete	Marca: LG	Capacidad: 36000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS – OFIC. PASAPORTES

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(OFICINA PRIMER PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0325

CLIENTE: Gobernación **MODELO:**

DIRECCIÓN: **UBICACIÓN:** Edificio Pasaporte

CIUDAD: Bucaramanga.

MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**

UBICACIÓN EQUIPO: Oficina 1er piso.

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36000. Btu marca LG ubicado en oficina 1er piso
Se utilizo 1 litro de desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal-Luis Fernando		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Oficina Pasaportes.	1 Piso

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Casette	LG	36.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS- OFIC. PASAPORTES

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(SEGUNDO PISO SALA DE ESPERA)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0322

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: 2° piso sala de Espera.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36.000 Btu marca LG ubicado en 2° Piso.
-Se utilizo 1 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal - Luis Fernando		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Oficina Pasaportes.	2 Piso Sala

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Cassete.	LG.	36.000 Btu.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS- OFIC. PASAPORTES.

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(ADMINISTRACION SEGUNDO PISO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0327

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Administración 2 segundo piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36000 Btu marca LG. ubicado en administración 2 segundo piso.
- se utilizo 3 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal - Luis f.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Oficina Pasaportes.		2 Piso ACMINS 2		
Tipo de aire: Cassete	Marca: LG.	Capacidad: 36000 Btu		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS- Ofic. Pasaportes

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(OFICINA DOCTORA ADMINISTRACION)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0320

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Doctora Administración
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36000 Btu marca LG ubicado en oficina de Doctora. Administración
Se utilizo 1 Litro de Liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola Leal-Luis Fernando		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Oficina Pasaportes.		2 PIS REMODELACION		
Tipo de aire: Casette	Marca: LG	Capacidad: 36000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos.

Nombre:
Cargo: CPS- OFIC Pasaportes

✓ Mantenimiento Cassette de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(COORDINACION SEGUNDO PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	10	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 0326

CLIENTE: Gobernación
MODELO:
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: Edificio Pasaporte.
CIUDAD: Bucaramanga.
MANTENIMIENTO: X
REVISIÓN:
MONTAJE:
OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinación 2º piso.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento realizado en aire tipo casette de 36000 Btu marca LG ubicado en Coordinación
- Se utilizo 1 Litro de liquido desincrustante

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Paola leal - luis f.		

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	10	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Oficina Pasaporte.		Coordinación 2° piso		
Tipo de aire: Casete	Marca: LG	Capacidad: 36.000 Btu.		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sandra Castellanos

Nombre:
Cargo: CPS- OFIC. PASAPORTE

2.4 ARCHIVO DEPARTAMENTAL

- ✓ Mantenimiento Mini Split de 24,000 Btu/hr, marca LG. **(GRUPO HOSPITALES)**






LG
RUTA DE EVACUACIÓN

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	Oct	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1632

CLIENTE: Gobernacion de santander.
DIRECCIÓN: Antigua licorera de santander.
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo Hospitales
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 24.000 BTU. marca LG

* Quimico de desincrustacion 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Andres Gutierrez	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		29	oct	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Archivo Departamental.		Grupo Hospitales		
Tipo de aire: Mini split.	Marca: LG		Capacidad: 24.000	
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yolanda Naranjos
Cargo: Tecnico Administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca LG. **(SALA DE JUNTAS SEGUNDO PISO)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	oct	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1633

CLIENTE: Gobernacion de santander.
DIRECCIÓN: Antigua licorera de santander.
CIUDAD: floridablanca
MANTENIMIENTO: X. REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de juntas segundo Piso
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento general x preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 BTU. marca LG

* Quimico de desincrustancion 1/4 litro.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Andres Gutierrez	Edberg	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		29	oct	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Archivo Departamental	Sala de Juntas 2do piso.

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split	LG	18000 BTU.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: auxiliar administrativo

✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca LG. **(COORDINACION GESTION DOCUMNETAL)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	oct	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1634

CLIENTE: Gobernacion de santander.
DIRECCIÓN: Antigua licorera de santander.
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinacion Gestion. Documental.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18000 BTU. marca LG

* Quimico de limpieza 1/4 litro.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Andres Gutierrez	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		29	oct	21

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Archivo Departamental.	Coordinacion Gestion Documental

Tipo de aire:	Marca:	Capacidad:
Mini Split	LG	18.000.

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo: auxiliar administrativo

✓ Mantenimiento Piso techo de 36,000 Btu/hr, marca LG. **(GESTION DOCUMNETAL)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	oct	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1516

CLIENTE: Gobernacion de santander.
DIRECCIÓN: Antigüa licorera de Santander.
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Gestion Documental.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo piso techo. de 36000 BTU marca LG

* Quimico de desincrustacion 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Andrè Gutierrez.	Edberg.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		29	oct	21
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Archivo Departamental.		Gestion Documental		
Tipo de aire: Piso techo	Marca: LG	Capacidad: 36000		
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☐	Instalacion ☐	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Yolanda Naranjo
Cargo: Tecnico Administrativo

2.5 LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA

- ✓ Mantenimiento Mini Split de 18,000 Btu/hr, marca LG. **(LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS)**

Corrección de fuga









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	11	21

ORDEN DE SERVICIO
No. 1009

CLIENTE: Departamento de Santander
MODELO: Mini split LG 18.000 Btu/hr
DIRECCIÓN:
UBICACIÓN: laboratorio departamental
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Laboratorio de microbiologia de alimentos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e Instalación de tuberia de 1/4" y 1/2" mas aislamiento termico, cable de Comunicación

Reajuste de gas refrigerante R22

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Ruan Tarazona.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		04	11	2021
Dependencia		Ubicación fisica de recepcion		
Laboratorio Departamental		Laboratorio de micro-Biologia de alimentos.		
Tipo de aire: mini split	Marca: LG	Capacidad: 18.000 BTU		
Actividad:	Correctivo [x]	Preventivo [ ]	Instalacion [ ]	

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.2671646 de 2021 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Magda Orozco

Nombre:
Cargo: Prof. Universitario
