9CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 21000691-H4 DE 2021.
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
OBJETO	RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA.
VALOR	$ 227.519.383.98 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2021.
VALOR FINAL	$ 227.519.383.98 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD
CDP	18621 de 26-04-2021
RP	45521 de 08-06-2021
FECHA LEGALIZACIÓN	11 de Junio de 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

En la ciudad de Palmira (V), a los 13 días del mes de Agosto de 2021, se reunieron:
El Ing. **DIEGO MAURICIO ESTRADA** obrando como contratista, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como Supervisor y **JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1,** de las obras el Contrato 21000691-H4

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

18/06/2021

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

N/A

ADICIONES EN VALOR

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

18/09/2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	SALA RADAR			INCLUYE AIU			
1,01	DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	UND	4,00	$ 493.427,00	$ 1.973.708,00	2,00	$ 986.854,00
1,02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	369,77	$ 2.519,00	$ 931.450,63	71,53	$ 180.177,00
1,03	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	6,00	$ 10.725,00	$ 64.350,00	6,00	$ 64.350,00
1,04	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	4,80	$ 12.516,00	$ 60.076,80	4,80	$ 60.077,00
1,05	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	36,00	$ 33.038,00	$ 1.189.368,00	18,00	$ 594.684,00
1,06	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	28,80	$ 87.001,00	$ 2.505.628,80	0,00	$ -
1,07	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	57,60	$ 33.096,00	$ 1.906.329,60	0,00	$ -
1,08	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	369,77	$ 13.060,00	$ 4.829.196,20	156,00	$ 2.037.360,00
1,09	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	3,53	$ 9.853,00	$ 34.781,09	0,00	$ -
1,1	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	1,28	$ 336.854,00	$ 431.173,12	0,00	$ -
1,11	DESM.MARCO + NAVE	UND	1,00	$ 24.002,00	$ 24.002,00	0,00	$ -
1,12	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	2,00	$ 311.673,00	$ 623.346,00	0,00	$ -
1,13	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	3,80	$ 512.574,00	$ 1.947.781,20	0,00	$ -

1,14	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	2,00	$ 146.135,00	$ 292.270,00	0,00	$ -
1,15	DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	7,60	$ 103.552,00	$ 786.995,20	0,00	$ -
1,16	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	3,00	$ 38.600,00	$ 115.800,00	3,00	$ 115.800,00
1,17	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	22,32	$ 87.828,00	$ 1.960.320,96	0,00	$ -
1,18	CARTERA C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	ML	19,60	$ 47.014,00	$ 921.474,40	0,00	$ -
1,19	SALIDA S1 EMT	UND	6,00	$ 141.758,00	$ 850.548,00	0,00	$ -
1,2	SAL LAMP EMT	UND	6,00	$ 135.895,00	$ 815.370,00	0,00	$ -
1,21	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	6,00	$ 28.973,00	$ 173.838,00	6,00	$ 173.838,00
1,22	SAL TOMA 220 EMT	UND	6,00	$ 157.578,00	$ 945.468,00	0,00	$ -
1,23	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	6,00	$ 210.329,00	$ 1.261.974,00	0,00	$ -
1,24	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	20,00	$ 40.682,00	$ 813.640,00	0,00	$ -
1,25	REPELLO MURO 1:3	M2	52,80	$ 27.195,00	$ 1.435.896,00	47,87	$ 1.301.825,00
1,26	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	63,00	$ 6.737,00	$ 424.431,00	63,00	$ 424.431,00
1,27	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	63,00	$ 50.984,00	$ 3.211.992,00	63,00	$ 3.211.992,00
1,28	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	63,00	$ 187.581,00	$ 11.817.603,00	63,00	$ 11.817.603,00
1,29	ALISTADO PISO 5 CM	M2	15,91	$ 35.180,00	$ 559.713,80	15,91	$ 559.714,00
1,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	15,91	$ 56.308,00	$ 895.860,28	15,91	$ 895.860,00
1,31	MANTENIMIENTO PUERTA DOBLE HOJA	UND	3,00	$ 626.855,00	$ 1.880.565,00	3,00	$ 1.880.565,00
2	**ALMACEN**						
2,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	12,00	$ 5.117,00	$ 61.404,00	12,00	$ 61.404,00
2,02	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	38,84	$ 33.038,00	$ 1.283.195,92		$ -
2,03	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	26,84	$ 87.001,00	$ 2.335.106,84		$ -
2,04	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	12,00	$ 33.096,00	$ 397.152,00		$ -
2,05	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	12,00	$ 87.828,00	$ 1.053.936,00		$ -
2,06	CARTERA C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	ML	7,60	$ 47.014,00	$ 357.306,40		$ -
2,07	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	61,00	$ 13.060,00	$ 796.660,00		$ -
2,08	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	24,00	$ 13.149,00	$ 315.576,00		$ -
2,09	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	1,00	$ 311.673,00	$ 311.673,00		$ -
2,1	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	2,00	$ 512.574,00	$ 1.025.148,00		$ -

2,11	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	1,00	$ 146.135,00	$ 146.135,00		$ -
2,12	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	1,44	$ 336.854,00	$ 485.069,76		$ -
2,13	ALISTADO PISO 5 CM	M2	12,00	$ 35.180,00	$ 422.160,00		$ -
2,14	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	12,00	$ 56.308,00	$ 675.696,00		$ -
2,15	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	19,40	$ 16.305,00	$ 316.317,00		$ -
2,16	SALIDA S1 EMT	UND	1,00	$ 141.758,00	$ 141.758,00		$ -
2,17	SAL LAMP EMT	UND	4,00	$ 135.895,00	$ 543.580,00		$ -
2,18	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	4,00	$ 28.973,00	$ 115.892,00		$ -
2,19	SAL TOMA 220 EMT	UND	3,00	$ 157.578,00	$ 472.734,00		$ -
2,2	BALA PANEL LED 24W	UND	4,00	$ 83.975,00	$ 335.900,00		$ -
2,21	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 53.773,00	$ 53.773,00		$ -
2,22	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	30,00	$ 40.682,00	$ 1.220.460,00		$ -
2,23	DESM.MARCO + NAVE	UND	1,00	$ 24.002,00	$ 24.002,00		$ -
2,24	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	3,00	$ 17.820,00	$ 53.460,00		$ -
2,25	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	4,00	$ 2.987,00	$ 11.948,00		$ -
2,26	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	12,00	$ 10.725,00	$ 128.700,00		$ -
2,27	DESM.REJA METALICA	M2	15,00	$ 16.127,00	$ 241.905,00	15,00	$ 241.905,00
2,28	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	30,96	$ 33.038,00	$ 1.022.856,48		$ -
2,29	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	21,96	$ 87.001,00	$ 1.910.541,96		$ -
2,30	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	9,00	$ 33.096,00	$ 297.864,00		$ -
2,31	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	9,00	$ 87.828,00	$ 790.452,00		$ -
2,32	CARTERA C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	ML	9,60	$ 47.014,00	$ 451.334,40		$ -
2,33	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	30,00	$ 13.060,00	$ 391.800,00		$ -
2,34	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	100,00	$ 13.149,00	$ 1.314.900,00		$ -
2,35	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	1,00	$ 311.673,00	$ 311.673,00		$ -
2,36	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT	M2	2,00	$ 512.574,00	$ 1.025.148,00		$ -
2,37	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	1,00	$ 146.135,00	$ 146.135,00		$ -
2,38	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	1,44	$ 336.854,00	$ 485.069,76		$ -
2,39	ALISTADO PISO 5 CM	M2	9,00	$ 35.180,00	$ 316.620,00		$ -

2,4	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	9,00	$ 56.308,00	$ 506.772,00		$ -
2,41	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	11,20	$ 16.305,00	$ 182.616,00		$ -
2,42	SALIDA S1 EMT	UND	1,00	$ 141.758,00	$ 141.758,00		$ -
2,43	SAL LAMP EMT	UND	2,00	$ 135.895,00	$ 271.790,00		$ -
2,44	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	2,00	$ 28.973,00	$ 57.946,00		$ -
2,45	SAL TOMA 220 EMT	UND	3,00	$ 157.578,00	$ 472.734,00		$ -
2,46	BALA PANEL LED 24W	UND	2,00	$ 83.975,00	$ 167.950,00		$ -
2,47	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 53.773,00	$ 53.773,00		$ -
2,48	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	10,00	$ 40.682,00	$ 406.820,00		$ -
3	BOMBEROS						
3,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	16,00	$ 33.838,00	$ 541.408,00	9,00	$ 304.542,00
3,02	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	10,00	$ 520.329,00	$ 5.203.290,00	1,00	$ 520.329,00
3,03	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	5,00	$ 289.757,00	$ 1.448.785,00		$ -
3,04	GRIFO ORINAL PARED PUSH 1/2 PULG + RACOR	UND	11,00	$ 197.137,00	$ 2.168.507,00	6,00	$ 1.182.822,00
3,05	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JGO	11,00	$ 1.049.883,00	$ 11.548.713,00		$ -
3,06	DESMONTE DE DESAGUE LAVAMANOS	UND	10,00	$ 21.287,00	$ 212.870,00	1,00	$ 21.287,00
3,07	DESTAPONAR LAVAMANOS	UND	10,00	$ 31.453,00	$ 314.530,00	6,00	$ 188.718,00
3,08	DESTAPONAR SANITARIO	UND	38,00	$ 38.372,00	$ 1.458.136,00	38,00	$ 1.458.136,00
3,09	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	10,00	$ 24.747,00	$ 247.470,00	10,00	$ 247.470,00
3,1	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD	UND	10,00	$ 194.285,00	$ 1.942.850,00		$ -
3,11	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	10,00	$ 254.635,00	$ 2.546.350,00	2,00	$ 509.270,00
3,12	MEZCLADOR DUCHA 8 PULG (MED)	UND	10,00	$ 134.129,00	$ 1.341.290,00		$ -
3,13	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	33,44	$ 676.653,00	$ 22.627.276,32	33,44	$ 22.627.276,00
3,14	DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE BATIENTE [OX]	M2	16,23	$ 375.661,00	$ 6.096.978,03		$ -
3,15	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A.INOX	UND	6,00	$ 222.377,00	$ 1.334.262,00		$ -
3,16	DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A.INOX	UND	6,00	$ 209.038,00	$ 1.254.228,00		$ -
3,17	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	6,00	$ 324.141,00	$ 1.944.846,00		$ -
3,18	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT	UND	6,00	$ 1.463.680,00	$ 8.782.080,00		$ -
3,19	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	120,00	$ 2.521,00	$ 302.520,00	55,00	$ 138.655,00
3,2	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 13.060,00	$ 1.567.200,00	55,00	$ 718.300,00

3,21	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	13,00	$ 12.091,00	$ 157.183,00		$ -
3,22	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	7,00	$ 29.008,00	$ 203.056,00	7,00	$ 203.056,00
3,23	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	7,00	$ 52.709,00	$ 368.963,00	7,00	$ 368.963,00
3,24	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	15,75	$ 1.143.661,00	$ 18.012.660,75	9,45	$ 10.807.596,00
3,25	CERRADURA PICO-LORO PTA ALUM	UND	2,00	$ 95.388,00	$ 190.776,00		$ -
3,26	INSTAL CERRAD.PTA.ALUM.PICO-LORO	UND	1,00	$ 45.463,00	$ 45.463,00		$ -
3,27	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	1,27	$ 69.116,00	$ 87.777,32		$ -
3,28	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	1,27	$ 133.800,00	$ 169.926,00		$ -
3,29	MALLAS DEPORTIVAS EN NYLON ENKA 100% DE ALTA RESISTENCIA Y CON PROTECCION UV	M2	622,01	$ 15.518,00	$ 9.652.351,18	622,01	$ 9.652.351,00
3,3	INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA	UND	4,00	$ 328.713,00	$ 1.314.852,00		$ -
3,31I	INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO	M2	17,50	$ 48.137,00	$ 842.397,50		$ -
3,32	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED	UND	6,00	$ 2.476.767,00	$ 14.860.602,00		$ -
3,33	SOPORTE PARA DOS REFLECTORES	UND	3,00	$ 272.187,00	$ 816.561,00		$ -
3,34	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	101,84	$ 9.853,00	$ 1.003.429,52	20,00	$ 197.060,00
3,35	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.559,56	$ 5.090,00	$ 13.028.160,40		$ -
3,36	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	7,78	$ 1.226.239,00	$ 9.535.234,46		$ -
3,37	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	101,84	$ 26.957,00	$ 2.745.300,88		$ -
3,38	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	51,84	$ 29.878,00	$ 1.548.875,52		$ -
3,39	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	980,40	$ 2.341,00	$ 2.295.116,40		$ -
3,4	REDISEÑO	M2	72,00	$ 15.217,00	$ 1.095.624,00	72,00	$ 1.095.624,00
3,41	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3"	UND	6,00	$ 194.363,00	$ 1.166.178,00	6,00	$ 1.166.178,00
3,42	MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO DE 50M3 INCLUYE PINTURA	GBL	1,00	$4.444.808,00	$ 4.444.808,00		$ -

	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		31,00%		$ 226.207.037,88		$ 76.016.072,00
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				$172.677.128,15		$58.027.535,88
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		$ 36.262.196,91		$ 12.185.782,53
	IMPREVISTOS		6,00%		$ 10.360.627,69		$ 3.481.652,15
	UTILIDAD		4,00%		$ 6.907.085,13		$ 2.321.101,44
	SUBTOTAL				$ 226.207.037,88		$ 76.016.072,00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 1.312.346,10		$ 441.009,20
	TOTAL				$ 227.519.383,98		$ 76.457.081,20

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 227.519.383.98 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 227.519.383.98 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL,** previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

NOTA: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas: (Indicar entre otros, el número de acta, valor bruto, valor neto, valor IVA, valor otros descuentos).

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

(indicar si a la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista valor alguno por concepto del contrato ejecutado).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 227.519.383.98		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$		
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 76.457.081,20**	
VALOR NO EJECUTADO		**$151.062.302,78**	
VALOR PAGADO			$0
VALOR DESCUENTOS			$0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 227.519.383.98
TOTALES	$ 227.519.383.98	$ 227.519.383.98	$ 227.519.383.98

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron.
(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
Contratista.

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la supervisión del Contrato
U.A.E.A.C.

VoBo

VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Valle.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha- Infraestructura
Revisó: Diego Mauricio López. - Jurídico

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA	VALOR INICIAL	CANTIDADES DE OBRA
			$227.519.383,98	ACTA DE COBRO PARCIAL
DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL VALLE	CONTRATO No. 21000691-H4 DE 2021		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	FECHA: 13/08/2021
	AEROPUERTO		VALOR FINAL	CONTRATISTA: DIEGO MAURICIO ESTRADA
	ALFONSO BONILLA ARAGON		$227.519.383,98	
	PLAZO INICIAL: Tres (3) Meses PLAZO FINAL: Tres (3) Meses		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
1	SALA RADAR			INCLUYE AIU						
1,01	DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	UND	4,00	$ 493.427,00	$ 1.973.708,00	2,00	$ 986.854,00	2,00	$ 986.854,00	50%
1,02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	369,77	$ 2.519,00	$ 931.450,63	71,53	$ 180.177,00	71,53	$ 180.177,00	19%
1,03	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	6,00	$ 10.725,00	$ 64.350,00	6,00	$ 64.350,00	6,00	$ 64.350,00	100%
1,04	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	4,80	$ 12.516,00	$ 60.076,80	4,80	$ 60.077,00	4,80	$ 60.077,00	100%
1,05	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	36,00	$ 33.038,00	$ 1.189.368,00	18,00	$ 594.684,00	18,00	$ 594.684,00	50%
1,06	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	28,80	$ 87.001,00	$ 2.505.628,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,07	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	57,60	$ 33.096,00	$ 1.906.329,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,08	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	369,77	$ 13.060,00	$ 4.829.196,20	156,00	$ 2.037.360,00	156,00	$ 2.037.360,00	42%
1,09	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	3,53	$ 9.853,00	$ 34.781,09	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,1	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	1,28	$ 336.854,00	$ 431.173,12	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,11	DESM.MARCO + NAVE	UND	1,00	$ 24.002,00	$ 24.002,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,12	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	2,00	$ 311.673,00	$ 623.346,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,13	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	3,80	$ 512.574,00	$ 1.947.781,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,14	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	2,00	$ 146.135,00	$ 292.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,15	DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	7,60	$ 103.552,00	$ 786.995,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,16	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	3,00	$ 38.600,00	$ 115.800,00	3,00	$ 115.800,00	3,00	$ 115.800,00	100%
1,17	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	22,32	$ 87.828,00	$ 1.960.320,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,18	CARTERA C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	ML	19,60	$ 47.014,00	$ 921.474,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,19	SALIDA S1 EMT	UND	6,00	$ 141.758,00	$ 850.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,2	SAL LAMP EMT	UND	6,00	$ 135.895,00	$ 815.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,21	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	6,00	$ 28.973,00	$ 173.838,00	6,00	$ 173.838,00	6,00	$ 173.838,00	100%
1,22	SAL TOMA 220 EMT	UND	6,00	$ 157.578,00	$ 945.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,23	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	6,00	$ 210.329,00	$ 1.261.974,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,24	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	20,00	$ 40.682,00	$ 813.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,25	REPELLO MURO 1:3	M2	52,80	$ 27.195,00	$ 1.435.896,00	47,87	$ 1.301.825,00	47,87	$ 1.301.825,00	91%
1,26	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	63,00	$ 6.737,00	$ 424.431,00	63,00	$ 424.431,00	63,00	$ 424.431,00	100%
1,27	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	63,00	$ 50.984,00	$ 3.211.992,00	63,00	$ 3.211.992,00	63,00	$ 3.211.992,00	100%
1,28	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	63,00	$ 187.581,00	$ 11.817.603,00	63,00	$ 11.817.603,00	63,00	$ 11.817.603,00	100%
1,29	ALISTADO PISO 5 CM	M2	15,91	$ 35.180,00	$ 559.713,80	15,91	$ 559.714,00	15,91	$ 559.714,00	100%
1,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	15,91	$ 56.308,00	$ 895.860,28	15,91	$ 895.860,00	15,91	$ 895.860,00	100%
1,31	MANTENIMIENTO PUERTA DOBLE HOJA	UND	3,00	$ 626.855,00	$ 1.880.565,00	3,00	$ 1.880.565,00	3,00	$ 1.880.565,00	100%
2	ALMACEN									
2,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	12,00	$ 5.117,00	$ 61.404,00	12,00	$ 61.404,00	12,00	$ 61.404,00	100%
2,02	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	38,84	$ 33.038,00	$ 1.283.195,92		$ -	0,00	$ -	0%
2,03	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	26,84	$ 87.001,00	$ 2.335.106,84		$ -	0,00	$ -	0%
2,04	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	12,00	$ 33.096,00	$ 397.152,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,05	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	12,00	$ 87.828,00	$ 1.053.936,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,06	CARTERA C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	ML	7,60	$ 47.014,00	$ 357.306,40		$ -	0,00	$ -	0%
2,07	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	61,00	$ 13.060,00	$ 796.660,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,08	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	24,00	$ 13.149,00	$ 315.576,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,09	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	1,00	$ 311.673,00	$ 311.673,00		$ -	0,00	$ -	0%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
2,1	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	2,00	$ 512.574,00	$ 1.025.148,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,11	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	1,00	$ 146.135,00	$ 146.135,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,12	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	1,44	$ 336.854,00	$ 485.059,76		$ -	0,00	$ -	0%
2,13	ALISTADO PISO 5 CM	M2	12,00	$ 35.180,00	$ 422.160,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,14	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	12,00	$ 56.308,00	$ 675.696,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,15	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	19,40	$ 16.305,00	$ 316.317,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,16	SALIDA S1 EMT	UND	1,00	$ 141.758,00	$ 141.758,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,17	SAL LAMP EMT	UND	4,00	$ 135.895,00	$ 543.580,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,18	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	4,00	$ 28.973,00	$ 115.892,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,19	SAL TOMA 220 EMT	UND	3,00	$ 157.578,00	$ 472.734,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,2	BALA PANEL LED 24W	UND	4,00	$ 83.975,00	$ 335.900,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,21	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 53.773,00	$ 53.773,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,22	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	30,00	$ 40.682,00	$ 1.220.460,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,23	DESM.MARCO + NAVE	UND	1,00	$ 24.002,00	$ 24.002,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,24	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	3,00	$ 17.820,00	$ 53.460,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,25	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	4,00	$ 2.987,00	$ 11.948,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,26	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	12,00	$ 10.725,00	$ 128.700,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,27	DESM.REJA METALICA	M2	15,00	$ 16.127,00	$ 241.905,00	15,00	$ 241.905,00	15,00	$ 241.905,00	100%
2,28	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	30,96	$ 33.038,00	$ 1.022.656,48		$ -	0,00	$ -	0%
2,29	MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH	M2	21,95	$ 87.001,00	$ 1.910.541,95		$ -	0,00	$ -	0%
2,30	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	9,00	$ 33.096,00	$ 297.864,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,31	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	9,60	$ 87.828,00	$ 790.452,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,32	CARTERA C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	ML	9,60	$ 47.014,00	$ 451.334,40		$ -	0,00	$ -	0%
2,33	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	30,00	$ 13.060,00	$ 391.800,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,34	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	100,00	$ 13.149,00	$ 1.314.900,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,35	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	1,00	$ 311.673,00	$ 311.673,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,36	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT.	M2	2,00	$ 512.574,00	$ 1.025.148,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,37	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	1,00	$ 146.135,00	$ 146.135,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,38	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	1,44	$ 336.854,00	$ 485.059,76		$ -	0,00	$ -	0%
2,39	ALISTADO PISO 5 CM	M2	9,00	$ 35.180,00	$ 316.620,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,4	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	9,00	$ 56.308,00	$ 506.772,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,41	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	11,20	$ 16.305,00	$ 182.616,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,42	SALIDA S1 EMT	UND	1,00	$ 141.758,00	$ 141.758,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,43	SAL LAMP EMT	UND	2,00	$ 135.895,00	$ 271.790,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,44	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	2,00	$ 28.973,00	$ 57.946,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,45	SAL TOMA 220 EMT	UND	3,00	$ 157.578,00	$ 472.734,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,46	BALA PANEL LED 24W	UND	2,00	$ 83.975,00	$ 167.950,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,47	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 53.773,00	$ 53.773,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,48	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"	ML	10,00	$ 40.682,00	$ 406.820,00		$ -	0,00	$ -	0%
3	BOMBEROS									
3,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	16,00	$ 33.838,00	$ 541.408,00	9,00	$ 304.542,00	9,00	$ 304.542,00	56%
3,02	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	10,00	$ 520.329,00	$ 5.203.290,00	1,00	$ 520.329,00	1,00	$ 520.329,00	10%
3,03	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	5,00	$ 289.757,00	$ 1.448.785,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,04	GRIFO ORINAL PARED PUSH 1/2 PULG + RACOR	UND	11,00	$ 197.137,00	$ 2.168.507,00	6,00	$ 1.182.822,00	6,00	$ 1.182.822,00	55%
3,05	TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO	JGO	11,00	$ 1.049.883,00	$ 11.546.713,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,06	DESMONTE DE DESAGUE LAVAMANOS	UND	10,00	$ 21.287,00	$ 212.870,00	1,00	$ 21.287,00	1,00	$ 21.287,00	10%
3,07	DESTAPONAR LAVAMANOS	UND	10,00	$ 31.453,00	$ 314.530,00	6,00	$ 188.718,00	6,00	$ 188.718,00	60%
3,08	DESTAPONAR SANITARIO	UND	38,00	$ 38.372,00	$ 1.458.136,00	38,00	$ 1.458.136,00	38,00	$ 1.458.135,00	100%
3,09	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	10,00	$ 24.747,00	$ 247.470,00	10,00	$ 247.470,00	10,00	$ 247.470,00	100%
3,1	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD	UND	10,00	$ 194.285,00	$ 1.942.850,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,11	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	10,00	$ 254.635,00	$ 2.546.350,00	2,00	$ 509.270,00	2,00	$ 509.270,00	20%
3,12	MEZCLADOR DUCHA 8 PULG (MED)	UND	10,00	$ 134.129,00	$ 1.341.290,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,13	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	33,44	$ 676.653,00	$ 22.627.276,32	33,44	$ 22.627.276,00	33,44	$ 22.627.276,00	100%
3,14	DIV.BANO VIDRIO 8MM NAVE BATIENTE [OX]	M2	16,23	$ 375.661,00	$ 6.096.976,03		$ -	0,00	$ -	0%
3,15	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO A.INOX	UND	6,00	$ 222.377,00	$ 1.334.262,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,16	DISPENSADOR JABON 1.2 LTS A.INOX	UND	6,00	$ 209.038,00	$ 1.254.228,00		$ -	0,00	$ -	0%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		EJECUTADO ACOMULADO		
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	<-% ACUM
3,17	EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	6,00	$ 324.141,00	$ 1.944.846,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,18	SECADOR MANOS TORNADO 1500W AUT.	UND	6,00	$ 1.463.680,00	$ 8.782.080,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,19	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	120,00	$ 2.521,00	$ 302.520,00	55,00	$ 138.655,00	55,00	$ 138.655,00	46%
3,2	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 13.050,00	$ 1.567.200,00	55,00	$ 718.300,00	55,00	$ 718.300,00	46%
3,21	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	13,00	$ 12.091,00	$ 157.183,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,22	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	7,00	$ 29.008,00	$ 203.056,00	7,00	$ 203.056,00	7,00	$ 203.056,00	100%
3,23	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	7,00	$ 52.709,00	$ 368.963,00	7,00	$ 368.963,00	7,00	$ 368.963,00	100%
3,24	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	15,75	$ 1.143.661,00	$ 18.012.660,75	9,45	$ 10.807.596,00	9,45	$ 10.807.596,00	60%
3,25	CERRADURA PICO-LORO PTA.ALUM	UND	2,00	$ 95.388,00	$ 190.776,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,26	INSTAL.CERRAD.PTA.ALUM.PICO-LORO	UND	1,00	$ 45.463,00	$ 45.463,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,27	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	1,27	$ 69.116,00	$ 87.777,32		$ -	0,00	$ -	0%
3,28	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	1,27	$ 133.800,00	$ 169.926,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,29	MALLAS DEPORTIVAS EN NYLON ENKA 100% DE ALTA RESISTENCIA Y CON	M2	622,01	$ 15.518,00	$ 9.652.351,18	622,01	$ 9.652.351,00	622,01	$ 9.652.351,00	100%
3,3	INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA	UND	4,00	$ 328.713,00	$ 1.314.852,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,31	INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO	M2	17,50	$ 48.137,00	$ 842.397,50		$ -	0,00	$ -	0%
3,32	REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 48 LED	UND	6,00	$ 2.476.767,00	$ 14.860.602,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,33	SOPORTE PARA DOS REFLECTORES	UND	3,00	$ 272.187,00	$ 816.561,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,34	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	101,84	$ 9.853,00	$ 1.003.429,52	20,00	$ 197.060,00	20,00	$ 197.060,00	20%
3,35	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.559,56	$ 5.090,00	$ 13.028.160,40		$ -	0,00	$ -	0%
3,36	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	7,78	$ 1.226.239,00	$ 9.535.234,46		$ -	0,00	$ -	0%
3,37	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	101,84	$ 26.957,00	$ 2.745.390,88		$ -	0,00	$ -	0%
3,38	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	51,84	$ 29.678,00	$ 1.538.875,52		$ -	0,00	$ -	0%
3,39	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	980,40	$ 2.341,00	$ 2.295.116,40		$ -	0,00	$ -	0%
3,4	REDISEÑO	M2	72,00	$ 15.217,00	$ 1.095.624,00	72,00	$ 1.095.624,00	72,00	$ 1.095.624,00	100%
3,41	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3"	UND	6,00	$ 194.363,00	$ 1.166.178,00	6,00	$ 1.166.178,00	6,00	$ 1.166.178,00	100%
3,42	MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO DE 50M3 INCLUYE PINTURA	GBL	1,00	$ 4.444.808,00	$ 4.444.808,00		$ -	0,00	$ -	0%

	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		31,00%		$ 226.207.037,88		$ 76.016.072,00		$ 76.016.072,00	33,60%
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				$ 172.677.128,15		$ 58.027.535,88		$ 58.027.535,88	
	ADMINISTRACIÓN		21,00%		$ 36.262.196,91		$ 12.185.782,53		$ 12.185.782,53	
	IMPREVISTOS		6,00%		$ 10.360.627,69		$ 3.481.652,15		$ 3.481.652,15	
	UTILIDAD		4,00%		$ 6.907.085,13		$ 2.321.101,44		$ 2.321.101,44	
	SUBTOTAL				$ 226.207.037,88		$ 76.016.072,00		$ 76.016.072,00	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 1.312.346,10		$ 441.009,20		$ 441.009,20	
	TOTAL				$ 227.519.383,98		$ 76.457.081,20		$ 76.457.081,20	33,60%

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
Representante Legal
CONTRATISTA:

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ GUANCHA
Apoyo a la supervisión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA

SALA RADAR

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,01	DESMONTE REUBICACION PUESTO TRABAJO	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2				Laboratorio
											Sala de Descanso Adecuada
						TOTAL	2,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,02	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
											RADAR
			1,00	1,05	2,35		1,00		2,47		BAÑOS HOMBRE PISO 1
			1,00	2,92	2,70		1,00		7,88		PASILLO MURO BATERIAS SANITARIAS PASILLO
			1,00	1,35	1,35		1,00		1,82		
			1,00	1,55	4,02		1,00		6,23		DESCANSO CONTROLADORES PISO 2
			1,00	1,30	3,00		1,00		3,90		
			1,00	3,00	4,90		1,00		14,70		AERONAVEGACION
			1,00	2,65	2,65		1,00		7,02		MURO PERPENDICULAR
			1,00	2,42	1,65		-1,00		-3,99		VENTANA
											RADAR
			2,65	1,00	5,15		1,0		13,65		CIELO FALSO DESCANSO CONTROLADORES
			1,00	2,90	2,65		1,0		7,69		MURO BAJO AIRE ACONDICIONADO
			1,00	2,90	2,80		1,0		8,12		AERONAVEGACION
			1,70	1,00	1,20		1,0		2,04		RESANES CIELO FALSO Y LATERALES AIRE ACONDICIONADO
						TOTAL			71,53		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,03	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			2	3			1		6		Sala descanso Antigua Acceso
						TOTAL			6,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,04	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,2	2			2		4,8		Poyo Cuatro Ups
				2,4							
						TOTAL			4,80		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,05	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3	3			2				Sala de descanso AdecuadaDivision
			3	3			2		18		Bodega Cuarto UPS
						TOTAL			18,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,08	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
									0,00		FACHADA INGRESO BATERIAS SANITARIAS PISO
			1,00	2,30	1,40		1,00		3,00		BAÑO HOMBRES
							1,00		0,00		
			1,00	2,88	2,65		1,00		8,00		PASILLO MURO BATERIAS SANITARIAS PASILLO
			1,00	1,00	1,30		1,00		1,00		
									0,00		
			1,00	2,90	5,11		1,00		15,00		DESCANSO CONTROLADORES PISO 2
			1,00	0,85	0,64		6,00		3,00		VANOS INGRESO LUZ DIA
			1,00	0,85	0,60		6,00		3,00		
									0,00		
			1,00	2,91	4,85		1,00		14,00		AERONAVEGACION
									0,00		
									0,00		BODEGA UPS
			1,00	3,03	4,22		2,00		26,00		BODEGA CENTRAL
			1,00	3,03	3,68		2,00		22,00		
			1,00	2,45	2,08		-1,00		-5,00		PUERTA
			1,00	1,44	1,20		-1,00		-2,00		VENTANA
									0,00		
									0,00		RADAR
			1,00	2,80	2,58		1,00		7,00		AERONAVEGACION (MURO BAJO AIRE ACONDICIONADO)
			1,00	2,90	2,75		1,00		8,00		AERONAVEGACION
									0,00		DESCANSO CONTROLADORES PISO 2
			1,65	1,00	1,20		1,00		2,00		RESANES CIELO FALSO Y LATERALES AIRE ACONDICIONADO
			1,00	3,00	4,93		1,00		15,00		BODEGA TRANSFORMADORES
			1,00	2,95	6,55		2,00		39,00		
			1,00	1,60	1,60		-1,00		-3,00		VENTANA
						TOTAL			156,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,16	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							3				Sala Adecuada Nueva
						TOTAL	3,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,21	APERTURA VANO PARA LAMPARA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							6				Sala Adecuada Nueva
							3				BATERIAS SANITARIAS MUJERES PISO 1
							3				DESCANSO TECNICOS PISO 1
						TOTAL	6,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,25	REPELLO MURO 1:3	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,7	3,3			2		24,42		Bodega Cuarto UPS
			4,3	3,3			2		28,38		
			1,00	3,03	4,22		2,0		25,57		BODEGA UPS
			1,00	3,03	3,68		2,0		22,30		BODEGA CENTRAL
						TOTAL			47,87		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,26	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			6,60	1,00	5,60		1		37,00		Bodega Cuarto UPS
			3,65	1,00	7,20		1		26,00		
						TOTAL			63,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,27	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			6,60	1,00	5,60		1		37,00		Bodega Cuarto UPS
			3,65	1,00	7,20		1		26,00		
						TOTAL			63,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,28	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			4,2		15		1				Bodega Cuarto UPS
			6,6	1	5,6		1		37		
			3,65	1	7,2		1		26		
						TOTAL			63,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,29	ALISTADO PISO 5 CM	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,70		4,30		1,00		15,91		Bodega Cuarto UPS
						TOTAL			15,91		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,30	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,7		4,3		1		15,91		Bodega Cuarto UPS
						TOTAL			15,91		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
1,31	MANTENIMIENTO PUERTA DOBLE HOJA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1				PUERTA UPS X 2C
							1				PUERTA BODEGA CENTRALX 2C
							1				PUERTA BODEGA TRANSFORMADORES X 2C

						TOTAL	3,00				

ALMACEN

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
2,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3		4				12		Almacen 1 Piso - Cuarto de lubricantes
						TOTAL			12,00		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
2,27	DESM.REJA METALICA	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
									15		Ampliacion Oficina Archivo
						TOTAL			15,00		

BOMBEROS

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
3,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							7,00				Orinales Cuartel General
							1,00				Orinal Hangar
							1,00				Orinal Gimnasio
											Orinal Guardia
											Sanitarios Cuartel General
											Sanitario Mujeres
											Sanitario Hangar
											Gimnasio
											Oficiales
											Gusradi
						TOTAL	9,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
3,02	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							1,00				Orinales Cuartel General
						TOTAL	1,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
3,04	GRIFO ORINAL PARED PUSH 1/2 PULG + RACOR	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							4,00				CUARTEL GENERAL
							1,00				HANGAR
							1,00				GIMNASIO
						TOTAL	6,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL				LOCALIZACIÓN
3,06	DESMONTE DE DESAGUE LAVAMANOS	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR

					1,00				Cocina
				TOTAL	1,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,07	DESTAPONAR LAVAMANOS	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							4,00				Cuartel General
							2,00				Hangar
											Gimnasio
											Mujeres
											Oficiales
											Guardia
						TOTAL	6,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,08	DESTAPONAR SANITARIO	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Expansión	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							16,00				Orinales- Sanitarios - Lavamanos - Duchas- Cuartel General
							4,00				Orinal- Sanitario - ducha - lavamanos I Hangar
							4,00				Orinal - Sanitario - Ducha - Lavamanos Gimnasio
							2,00				Sanitario - Lavamanos Guardia
							5,00				Sanitario - Lavamanos - Orinal - Ducha
							3,00				Sanitario- Ducha - Lavamanos Mujeres
							4,00				Sanitario - Orinal - ducha -Lavamanos Oficiales
						TOTAL	38,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,09	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							4,00				Cuartel General
							2,00				Hangar
							1,00				Gimnasio
							1,00				Mujeres
							1,00				Oficiales
							1,00				Guardia
						TOTAL	10,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,11	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							2,00				Hangar
											Gimnasio
						TOTAL	2,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,12	MEZCLADOR DUCHA 8 PULG (MED)	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
							4,00				Cuartel General
							2,00				Hangar
							1,00				Gimnasio
							1,00				Mujeres
							1,00				Oficiales
							1,00				Guardia
						TOTAL	10,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,13	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,50	1,60			2,00		11,20		Baños Cuartel Genral
			3,50	1,60			1,00		5,60		Duchas Cuartel General
			1,30	1,60			8,00		16,64		Intermedios
						TOTAL			33,440		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,19	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			5,40	1,00	5,68		1,0		31,00		CUARTEL GENERAL
			2,50	1,00	2,70		1,0		7,00		HANGAR
			1,70	1,00	2,60		1,0		4,00		BAÑO MUJERES
			3,00	1,00	2,60		1,0		8,00		BAÑO GIMNASIO
			2,50	1,00	1,70		1,0		4,00		BAÑO OFICIALES
			1,20	1,00	1,20		1,0		1,00		BAÑO GUARDIA
						TOTAL			55,000		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,2	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			5,40	1,00	5,68		1,0		31,00		CUARTEL GENERAL
			2,50	1,00	2,70		1,0		7,00		HANGAR
			1,65	1,00	2,50		1,0		4,00		BAÑO MUJERES
			3,00	1,00	2,50		1,0		8,00		BAÑO GIMNASIO
			2,50	1,00	1,50		1,0		4,00		BAÑO OFICIALES
			1,20	1,00	1,20		1,0		1,00		BAÑO GUARDIA
						TOTAL			55,000		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,21	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,00	1,80			2,00		3,60		Cuartel general - Baños - Duchas
			1,00	1,80			1,00		1,80		Baño Hangar
			1,00	1,80			1,00		1,80		Baño Mujeres
			1,00	1,80			1,00		1,80		Baño Gimnasio
			1,00	1,80			1,00		1,80		Baño Oficiales
			1,00	1,80			1,00		1,80		Baño Guardia
						TOTAL			13,000		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,22	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,00	1,80			2,00				Cuartel general - Baños - Duchas
			1,00	1,80			1,00				Baño Hangar
			1,00	1,80			1,00				Baño Mujeres
			1,00	1,80			1,00				Baño Gimnasio
			1,00	1,80			1,00				Baño Oficiales
			1,00	1,80			1,00				Baño Guardia
						TOTAL	7,000				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,23	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,00	1,80			2,00				Cuartel general - Baños - Duchas
			1,00	1,80			1,00				Baño Hangar
			1,00	1,80			1,00				Baño Mujeres
			1,00	1,80			1,00				Baño Gimnasio
			1,00	1,80			1,00				Baño Oficiales

			1,00	1,80			1,00				Baño Guardia
						TOTAL	7,000				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,24	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			3,50	3,00	0,30		3,00	5,00		9,45	Cuartel general - Baños - Duchas
						TOTAL				9,45	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,29	MALLAS DEPORTIVAS EN NYLON ENKA 100% DE ALTA RESISTENCIA Y CON PROTECCION UV	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			17,77	26,47	35,00		1,00	470,39	622,01		
			23,50	1,00	35,00				822,50		
						TOTAL	1,000		622,01		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,34	PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,80	5,40			12,00		51,84		yh
			5,00	10,00			1,00		50,00		
			6,70	3,00	1,00		1,00		20,00		
						TOTAL			20,0		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,37	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,80	5,40			12,00		51,84		Columnas Tanque de almacenamiento Se
			5,00	10,00			1,00		50,00		
						TOTAL			101,84000		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,38	KORAZA DOS VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			0,80	5,40			12,00		51,84		Columnas Tanque de almacenamiento Se
						TOTAL			51,84000		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,39	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	Volumen (M³)	Altura (M)	Longitud (Km)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Cantidad M³K	LUGAR
			20,00		15,00					300,00	Columnas Tanque de almacenamiento Se
			20,00		15,00					300,00	
						TOTAL				600,00	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
3,40	REDISEÑO	M2	Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
			1,00	6,00			12,00			72,00	Columnas Tanque de almacenamiento Se
			6,80	1,00	10,60		1,00	1,00	72,00		
						TOTAL			72,00000	72,00	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,41	EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3"	UND					6,00				Columnas Tanque de almacenamiento Sei
						TOTAL	6,00				

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES					TOTAL			LOCALIZACIÓN
			Ancho (M)	Altura (M)	Longitud (M)	Descuento:	Cant (Und)	Long Total (ML)	Area (M²)	Volumen (M³)	LUGAR
3,42	MANTENIMIENTO TANQUE ELEVADO DE 50M3 INCLUYE PINTURA	GBL					1,00				Tanque de almacenamiento Se
						TOTAL	1,00				

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
Representante Legal
CONTRATISTA.

CAP. DE AERONAVEGACION
JUAN DAVID RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervision

VoBo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE COBRO PARCIAL

NUMERO: 21000691-H4 DE 2021

CONTRATISTA: **DIEGO MAURICIO ESTRADA**

SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U)	$76.457.081,20
Porcentaje estimado para el A.I.U	31,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Directo	$58.027.535,88
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado de Utilidad)	$2.321.101,44
IVA Utilidad x 19% estimado para el IVA	$441.009,20

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ.
Representante Legal
CONTRATISTA:

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión

V.B.o

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA AEROPUERTO: CONTRATO No. 21000691-H4 DE 2021 PLAZO INICIAL: NOVENTA (90) DIAS PLAZO ADICIONAL: PLAZO FINAL:	VALOR INICIAL: $ 227.519.383,98 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA SOBRE U. VALOR FINAL : $ 227.519.383,98 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA : DIEGO MAURICIO ESTRADA SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ.

ACTA DE COBRO PARCIAL

El día 13 de Agosto del 20121 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon (Palmira Valle del Cauca), se reunieron el Ingeniero DIEGO MAURICIO ESTRADA contratista de obra, MILTON CESAR SANCHEZ , quién actúa como Supervisor, y JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL; con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 18 de Junio y el 13 de Agosto del 2021, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra ACTA DE COBRO PARCIAL , las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		$ 227.519.383,98
2.Valor Adicional		
3, Valor total del Contrato (1+2)		$ 227.519.383,98
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	$ -
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 227.519.383,98
6, Valor Presente Acta No. 01		$ 76.457.081,20
7. Amortización en esta acta	0%	$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ -
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		$ 76.457.081,20
10, Pagos Actas Anteriores		$ -
11, Valor pagado a la Fecha		$ -
12, Saldo por pagar del presente Contrato		$ 227.519.383,98
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		33,60%

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoria mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Interventoria contratada por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

Contratista:
DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
Representante Legal

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision

V.o B.o
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL VALLE

INFORME DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA ACTA PARCIAL Nº 1

JUNIO 18 AL 13 DE AGOSTO DEL 2021

CONTRATISTA:

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO No. 21000691-H4 DE 2021

Objeto:

"REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA"


SANTIAGO DE CALI, 13 de agosto del 2021

- ## INTRODUCCIÓN

Este informe de Construcción, se hace una presentación del registro fotográfico de los procesos constructivos de obra a la Aeronáutica Civil del contratista DIEGO MAURICIO ESTRADA, en la etapa de ejecución del contrato de obra.


FRENTE DE OBRA RADAR

- ## RASQUETEADA-LIJADA-RESANE

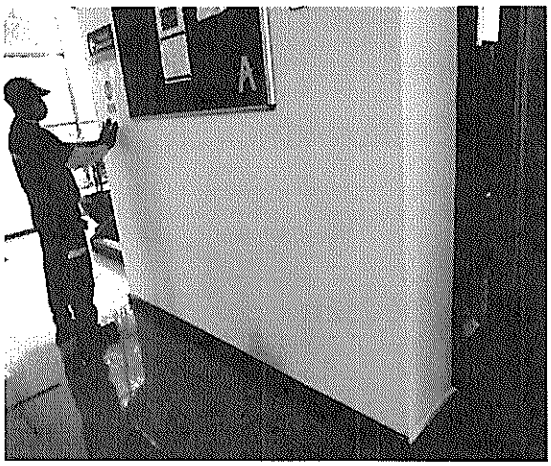





- **DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM**


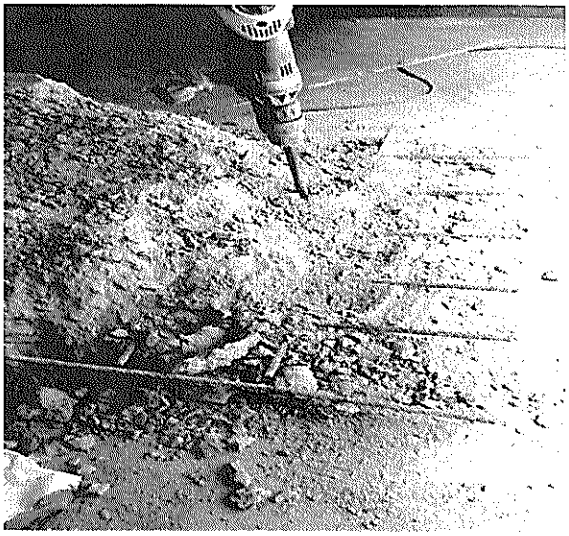
- **VINILO MURO TIPO 1 [3M]**

- **DESMONTE DE LUMINARIAS - APERTURA VANO PARA LAMPARA**

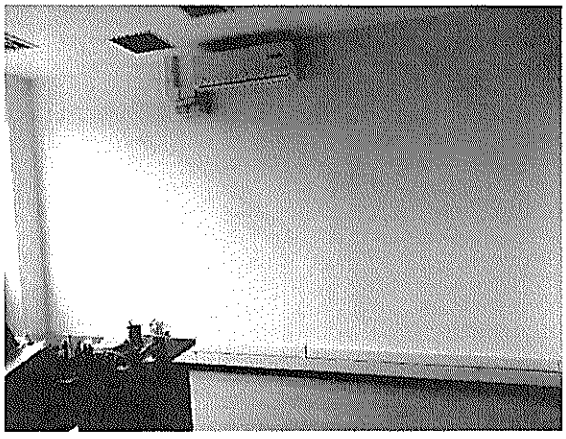



- **REPELLO MURO 1:3**

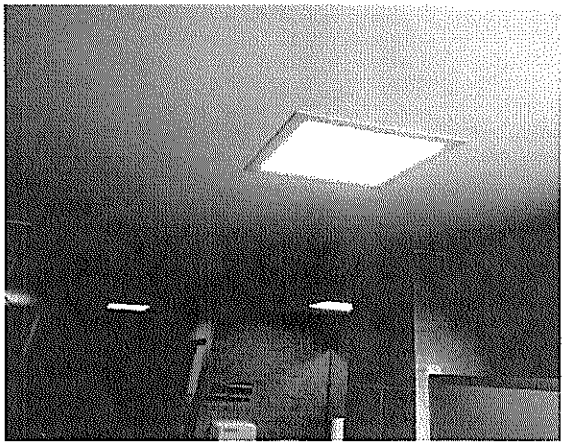


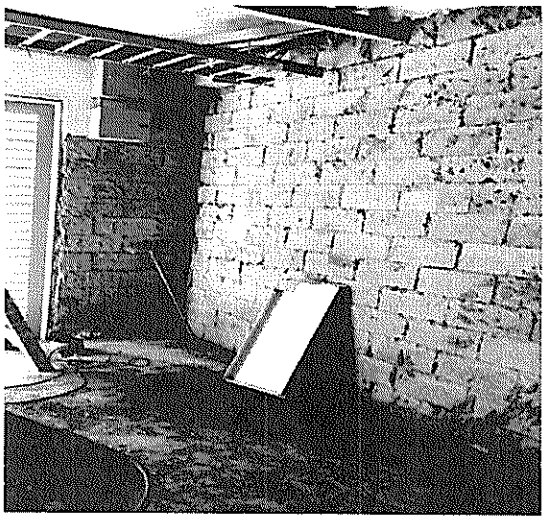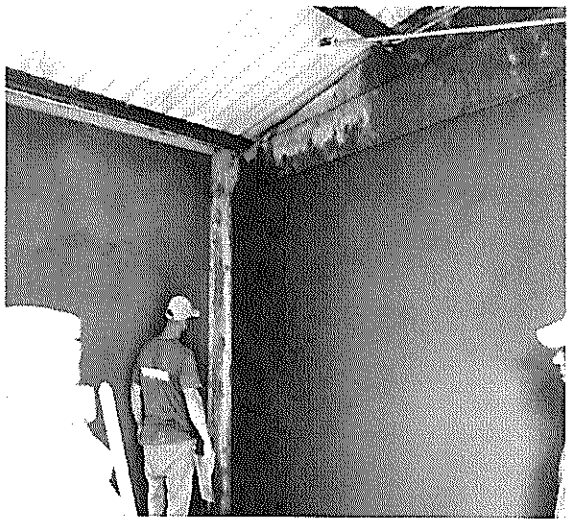
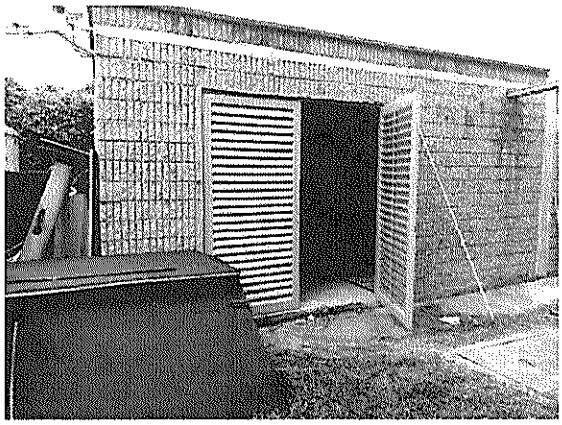
- **CUBIERTA UPS RADAR**



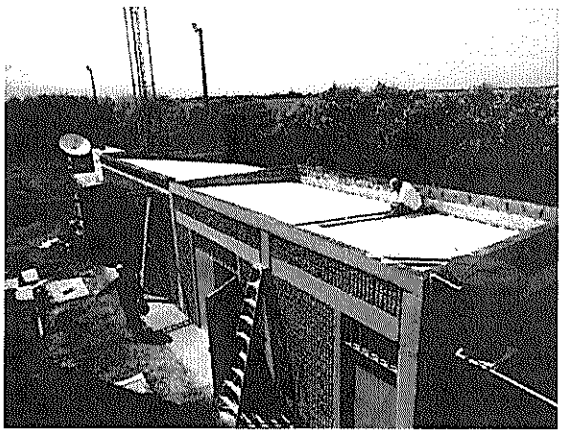


- **MANTENIMIENTO PUERTA DOBLE HOJA**

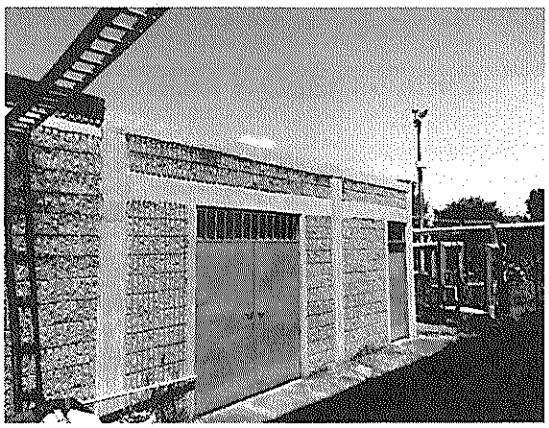





FRENTE DE OBRA BOMBEROS

- **DESM.APARATO SANITARIO – DESTAPONAR SANITARIO**

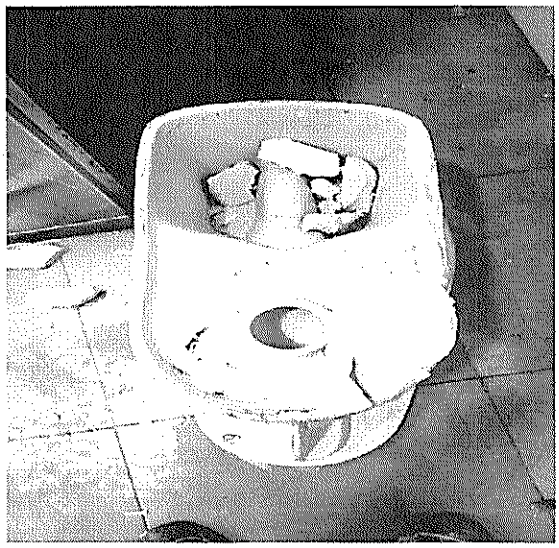



- **RASQUETEADA-LIJADA-RESANE - VINILO CIELO Y MURO TIPO 1 [3M]**

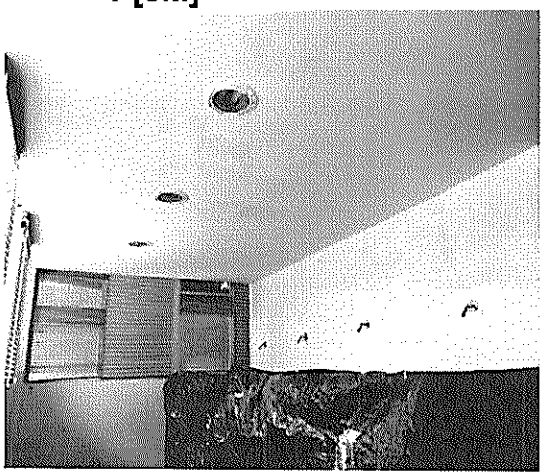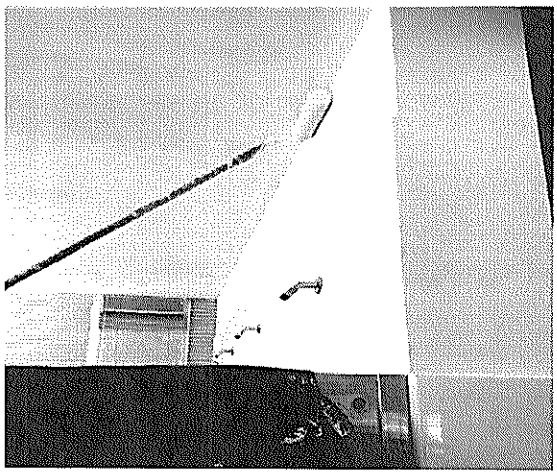- **ESMALTE MARCO-NAVE METALICO 0.70-1.00**



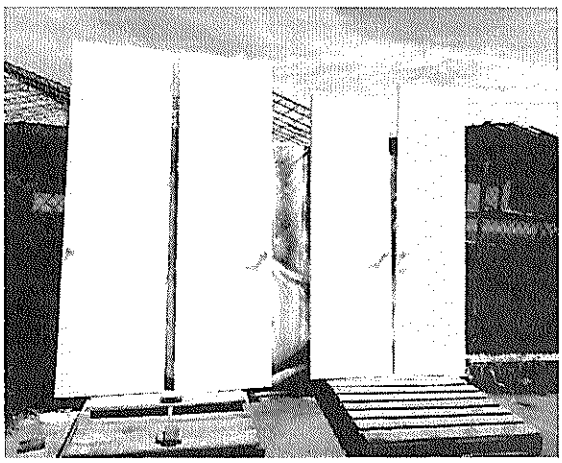

INFORME DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – MATRIZ DE RIESGO - BIOSEGURIDAD

JUNIO 18 AL 13 DE AGOSTO DEL 2021

CONTRATISTA:

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO No. 21000691-H4 DE 2021

Objeto:

"REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA"

SANTIAGO DE CALI, 13 de agosto del 2021

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe, presenta las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra No. 21000691-H4 DE 2021 cuyo objeto es: "REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA", celebrado entre DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ y La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

Este informe de Construcción, hace una descripción a la Aeronáutica Civil de las actividades realizadas por el área de GSST de DIEGO MAURICIO ESTRADA, en la etapa de construcción del contrato de obra, desarrollado entre 18 de junio al 13 de agosto de 2021, en el marco del Plan de Gestión de SST.

2. OBJETIVO

- ✓ Desarrollar Plan de capacitación y entrenamiento orientado en la prevención de peligros y riesgos presentes en las diferentes actividades a desarrollar.
- ✓ Identificar, evaluar y controlar factores de riesgos derivados de las condiciones peligrosas y actos sub estándares presentes en el medio del trabajo, que pueden causar accidentes en la salud de los trabajadores.
- ✓ Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto, a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que contribuyen al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

3. ALCANCE

El presente informe describe los resultados alcanzados en la gestión de SST por parte de **la empresa DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ,** en el inicio de las actividades en obra, a partir del **28** de **junio** de 2021 y su desarrollo durante el mes julio-agosto de 2021.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

"REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA" -
CONTRATO No. 21000691-H4 DE 2021

5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5.1 PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

- **Personal Vinculado a obra - Subcontratista de Mano de Obra:**
  - ✓ Junio: En total durante el mes de junio se realizó la afiliación de 3 personas a obra, todos los colaboradores cuentan con afiliación a las EPS, AFP y la ARL correspondiente.
  - ✓ Julio: En el mes de julio se presentaron novedades de ingreso de 1 persona y posteriormente se realizaron novedades de retiro de 1 trabajador.
  - ✓ Agosto: Al corte de 06 de agosto se realizó la afiliación de 1 personas a obra

5.2. INDUCCIONES Y CAPACITACION DE SEGURIDAD

En el mes de junio se realizaron inducciones de seguridad a trabajadores que ingresaron a la empresa **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**, dándoles a conocer los riesgos presentes en las diferentes actividades y el control para la exposición.

Se continúa con el diligenciamiento quincenal de las reuniones, donde se indican a diario los riesgos de obra, el control de la asistencia de personal y el seguimiento adecuado de los protocolos de bioseguridad.

DIEGO MAURICIO ESTRADA	INFORME DE ACTIVIDADES DE GESTIÓNDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATO No. 4143.010.26.1.1473- 2020 " REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA"

DIEGO MAURICIO ESTRADA	ACTA DE REUNION EN OBRA Y ASISTENCIA	Versiòn: 02 Fecha: 31-10-2020

Acta de:	CAPACITACION RIESGOS EN OBRA Y ASISTENCIA				
Fecha:	06 JUNIO 2021.				
Hora Inicio:	07:30.	Hora Fin:	08:00.	Acta No.	1.

	OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSION
1	Entrega de elementos de protección, importancia del uso adecuado de los elementos de protección.
2	Socialización sobre riesgos en obra y como evitarlos.
3	Importancia de las medidas de control y prevención del COVID 19.
4	Temas varios de obra.


LISTADO DE ASISTENTES PERSONAL DE OBRA O EXTERNO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Luis Luis Pinilla	6499290.	Jose Luis Hernandez.
Jose Freddy Muñoz.	76025016.	Freddy Muñoz.
Cristian Alfonso Mesa	Supervisor.	

Firma de quien elabora: Cristian Mesa.

DME DIEGO MAURICIO ESTRADA	**INFORME DE ACTIVIDADES DE GESTIÓNDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **CONTRATO No. 4143.010.26.1.1473- 2020** " REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA"




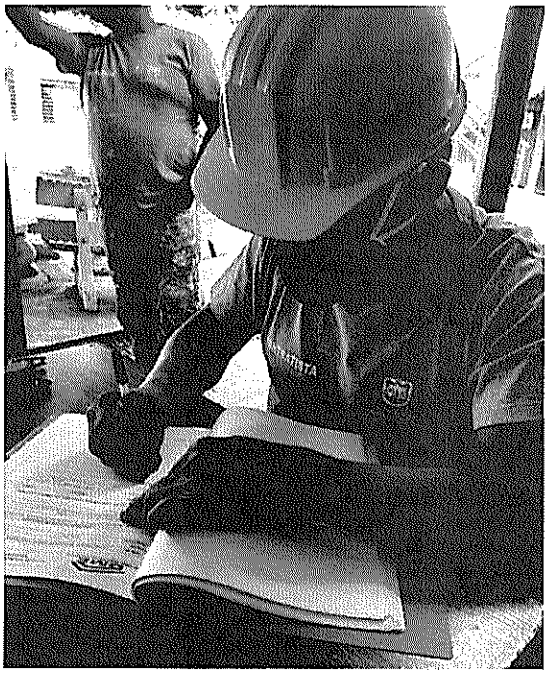


5.3. ENTREGA DE EPP Y DOTACION.

En el ingreso del personal al proyecto, la empresa **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ,** entrego a cada uno de los trabajadores los implementos de protección personal, los cuales se entregan de acuerdo a la actividad que se esté realizando, esta entrega se controla en formatos y se hace inspección de estos elementos para realizar la reposición oportuna.

Cada día se realiza la validación del uso de los elementos antes de iniciar obras, así mismo se valida durante la ejecución de las diferentes actividades que el personal continúe con el uso de los implementos de protección, dicha revisión se deja evidenciada en bitácora.

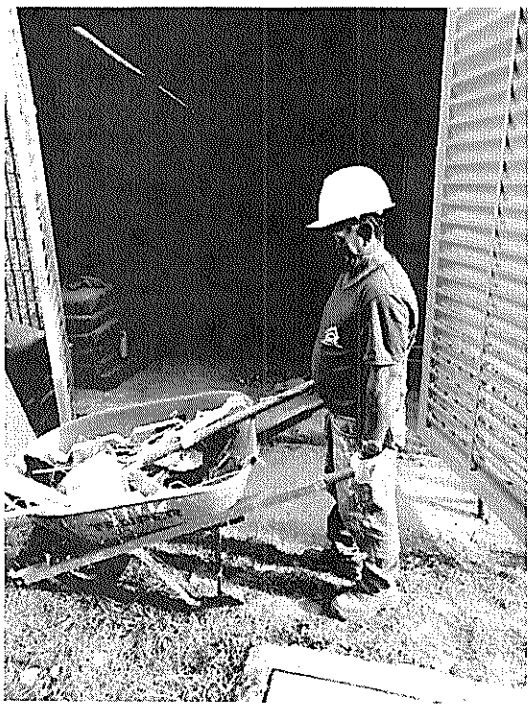


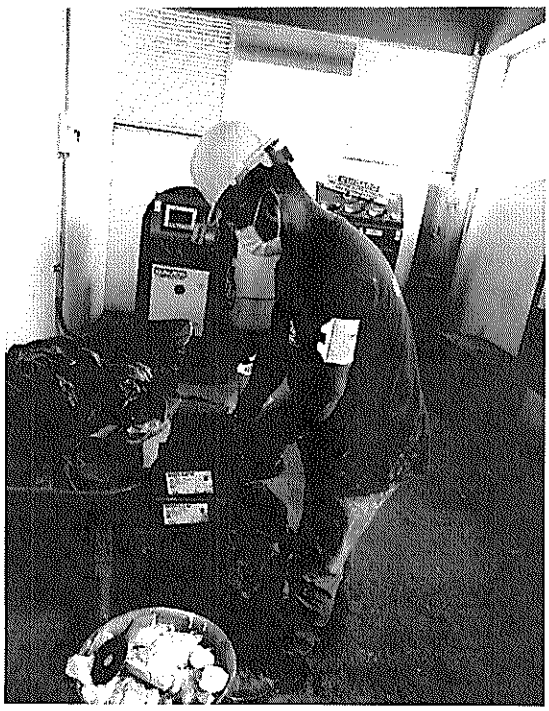

Así mismo, se realiza un control en formatos de la entrega de estos elementos para garantizar el uso y la reposición de los mismos en cado de desgaste o daño.

5.4 HIDRATACION.

Se han definido puntos de hidratación en las instalaciones con el fin de que los trabajadores puedan reponer los líquidos naturales que se pierden en la ejecución de algunas actividades.
Así mismo se dispone dos espacios en el día (uno en cada jornada) para que las personas se dirijan a los puntos para lavado de manos e hidratación.

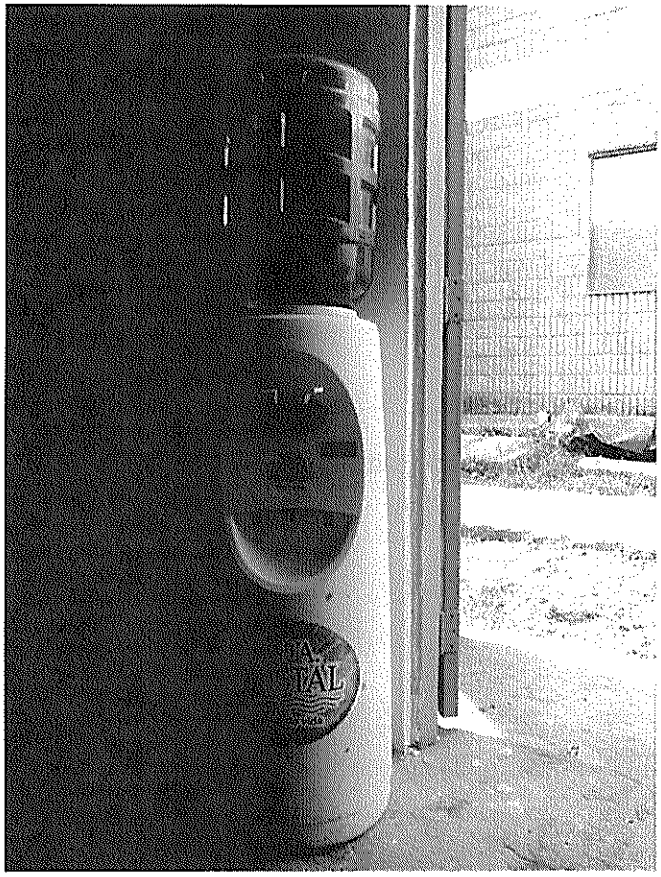

6. CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

La empresa **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**, en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud, en todo lo relacionado con la Pandemia provocada por el Virus SARS-CoV-2 (Covid-19), ha implementado los protocolos de Bioseguridad contando con la aprobación y en compañía de la ARL SURA. Estos protocolos se han implementado tanto en la parte administrativa de la empresa, como en las obras.

Para el cumplimiento de los protocolos y el bienestar de los trabajadores y a su vez el de la comunidad aledaña al proyecto en ejecución, la empresa **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ** cuenta con las siguientes medidas:

- Punto o Lugar de Aislamiento Para Posible Caso.
- Punto de Hidratación.

Teniendo en cuenta las medidas definidas en los protocolos, en la Obra se realizan los siguientes controles con el fin de validar los aspectos definidos en los protocolos.

- Ingreso a la Obra:

  - Toma de datos y verificación de condiciones de salud de cada trabajador.
  - Lavado de manos.

7. CONCLUSIONES.

De la gestión de SST realizada en entre el 27 de junio al 06 de agosto del 2021, se obtuvieron las siguientes conclusiones.

- Al cierre del informe, la obra cuenta 4 trabajadores de obra, incluido el maestro, los cuales se encuentran con afiliación a la EPS, la ARL y demás afiliaciones definidas por la legislación laboral. Así mismo se entregan planillas de pago de la seguridad social.

- Se realizan capacitaciones al personal en el momento de su ingreso a obra sobre los riesgos en el trabajo, el trabajo seguro, la importancia del uso de los implementos de protección personal y el control y protección de su salud en tiempos de pandemia.
- Se adopta hábitos de prevención, autocuidado y estilos de vida saludables en los trabajadores.
- Se controla el uso y la disposición de los elementos de protección personal en la obra.
- Se ha realizados los controles y el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad definidos por la empresa y aprobados por la ARL para la prevención y promoción para la contención del coronavirus covid-19.
- No se han presentado accidentes de trabajo.

Anexos:

1. Relación del personal de Obra vinculado con fechas de ingreso, retiro y activos.
2. Planillas de seguridad social del mes de julio.

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA	

EL GRUPO SALUD OCUPACIONAL

CERTIFICA

Que el contratista, "DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ" se compromete a entregar los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.º de Contrato: PROCESO 21000691 -H4- DE 2021
Objeto del contrato: "RVLCO203 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA"
Nombre del supervisor designado por Aero civil: JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.

La anterior se expide a los 18 DIAS DE JUNIO DEL AÑO 2021 por el Servidor Público (nombre) WILLY ARNALDO PACHECO (firma) Willy Pacheco

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 21000691-H4 DE 2021

RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA

Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodriguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha: **13 de agosto de 2021.**

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la Supervisión.

Firma: _____
Apoyo a la Supervisión.

DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ - DME INGENIERIA
NIT: 6,105,951-3 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4330 Tarifa AutoRenta 0.80%
CRA 47 A # 10-35 CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3238425 3104960076 Fax:
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 301-4 3.30x mil

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -		
Dirección	SEC AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON		
Ciudad	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	**C.C. ó NIT**	805,008,407 - 0
País	COLOMBIA	**Teléfono**	4185103
E-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Vendedor		**Zona**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
№ FE - 38

Fecha	01 SEP. 2021		
Hora	05:19 PM	**Orden No.**	ACTA 1
Pago	Credito a 0 Días	**Vence**	01 SEP. 2021

N°	CÓDIGO	DESCRIPCION	%DSC	%IVA	%R.F	VALOR
1	001	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU	0.00	0.0	0.00	58,027,536
2	001	ADMINISTRACION (21%)	0.00	0.0	0.00	12,185,783
3	001	IMPREVISTOS (6%)	0.00	0.0	0.00	3,481,652
4	001	UTILIDAD (4%)	0.00	19.0	0.00	2,321,101

AEROCIVIL
Radicado: R 202108738I Fecha:29/09 2021 09:28:40.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRUPO ADMINISTRATIVO Y
Asunto: 0089 - FACTURACION
Anexos: 0 RECIBIDO

Despacho a AERONAUTICA CIVIL
Dirección SEC AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON
Teléfono 4185103
Ciudad PALMIRA
Departamento VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto
73,694,971	0.0	0	0
2,321,101	19.0	0	441,009

SUBTOTAL	$76,016,072
- Descuento	$0
- Otr Descuentos	$0
BASE GRAVABLE	**$76,016,072**
+ IVA	$441,009
+ Impuesto al Consumo	$0
- Retefuente	$0
- Autorret. Renta 0.80%	$0
- ICA Retenido	$0
- IVA Retenido	$0
TOTAL NETO	**$76,457,081**

Observaciones
#$24-12-00-500; 21000691 H4 DE 2021; juand.rodriguez@aerocivil.gov.co#$

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización numeración de facturación electrónica N° 18763005707008 de 05/05/2020 desde FE 1 hasta FE 1000 con vigencia de 24 Meses

INFO@DMEINGENIERIA.COM

CUFE:
b05a68d7bf7f36aa5dc5b973d8e3c166
56df7f8cfd68cfe733278447082962d36
37a70136f7daafd0cea86ac955f9a22

Empresa

Aceptada y Recibido

Bob Nunn
Sept. 29/21

EN MI CALIDAD DE CONTADORA PÚBLICA TITULADA

MATRICULA PROFESIONAL 159592-T

Me permito certificar que:

Me permito certificar que en la ejecución del Contrato **21000691-H4 de 2021,** cuyo objeto es ***"RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA.":***

- El Ingeniero **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHÁVEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.105.951, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden con el sistema de seguridad social, cuando ha existido la obligación en lo que se refiere a: aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales, de igual manera cuando ha existido la obligación ha efectuado sus aportes a cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y al servicio nacional de aprendizaje (Sena). Respetando lo dispuesto en los Artículos 11 y 12 del decreto reglamentario 1406 de 1999.

- El Ingeniero **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHÁVEZ**, se encuentra al día en el pago de: a) Retenciones en la fuente, b) Impuesto sobre las ventas y c) Impuestos de industria y comercio, cuando ha surgido la obligación.

- El Ingeniero **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHÁVEZ**, se encuentra al día con todos sus proveedores de materiales y servicios.

Esta certificación se hace tomando como base la información contable a 12 de agosto del año 2021.

Se firma en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).

DIEGO MAURICIO ESTRADA CH
C.C. 6.105.951 de Cali.
Representante Legal

CLARA ROSA ECHEVERRY B
CC. 1.130.594.982 de Cali
Contadora Pública TP.159592-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 47 a 10-42	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1124512728	9424433959	I	2021/09/13	2021/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400
1	CC	6105951	ESTRADA DIEGO																	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total Afiliados(1)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 47 a 10-42	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1124512728	9424433959	I	2021/09/13	2021/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$435,400	$0	$0	$435,400

2021/09/09 11:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 47 a 10-42	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1136787930	9424775451	N	2021/09/13	2021/09/20	BANCO DAVIVIENDA	7	$765,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$5,000,000	$880,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,000		$0	$0		$1,531,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$2,500,000	$440,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$13,000		$0	$0		$765,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$2,500,000	$440,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$13,000		$0	$0		$765,500
1	CC	6105951	ESTRADA DIEGO										A								230201	30	($1,500,000)	($240,000)	EPS010	30	($1,500,000)	($187,500)		0	$0	$0	14-11	30	($1,500,000)	($7,900)	0	$0	$0	No	($435,400)
2	CC	6105951	ESTRADA DIEGO								X	C									230201	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0	No	$1,200,900
Total Afiliados(1)																							$2,500,000	$440,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$13,000		$0	$0		$765,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 47 a 10-42	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1136787930	9424775451	N	2021/09/13	2021/09/20	BANCO DAVIVIENDA	7	$765,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$440,000	$0	$0	$440,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$440,000	$0	$0	$440,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$0	$0	$312,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
TOTAL				1	$765,500	$0	$0	$765,500

2021/09/20 12:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DME INGENIERIA	Cra 47 a 10-42, Casa	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1124506536	9424434148	E	2021/09/13	2021/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,505,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ins ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DME INGENIERIA (7 Afiliados)							$5,678,288	$908,800			$5,451,156	$218,400			$5,678,288	$227,500			$6,359,682	$150,600		$0	$0		$1,505,300
Centro de Trabajo: AEROCIVIL - AEROPUERTO (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
1	CC	16461660	MEZA CARLOS		230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
2	CC	1144145850	FLOREZ HARRISON		231001	30	$908,526	$145,400	EPS012	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)							$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)							$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
3	CC	1107515687	DUQUE ANDRES		231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
4	CC	31577766	MONTEALEGRE MAYERLINE		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
5	CC	1130633612	ROCHA KATERINE		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
Centro de Trabajo: SERVICIO DOMESTICO (2 Afiliados)							$1,135,658	$181,800			$908,526	$36,400			$1,135,658	$45,500			$1,817,052	$9,600		$0	$0		$273,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$1,135,658	$181,800			$908,526	$36,400			$1,135,658	$45,500			$1,817,052	$9,600		$0	$0		$273,300
6	CC	48656353	MERA BERTHA		230301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
7	CC	1062280389	WINA YODY		230301	4	$227,132	$36,400		0	$0	$0	CCF57	4	$227,132	$9,100	14-11	30	$908,526	$4,800	4	$0	$0	No	$50,300
Total Afiliados(7)							$5,678,288	$908,800			$5,451,156	$218,400			$5,678,288	$227,500			$6,359,682	$150,600		$0	$0		$1,505,300

2021/09/09 11:07 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DME INGENIERIA	Cra 47 a 10-42, Casa	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1124506536	9424434148	E	2021/09/13	2021/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,505,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$908,800	$0	$0	$908,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$472,600	$0	$0	$472,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$150,600	$0	$0	$150,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$150,600	$0	$0	$150,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$227,500	$0	$0	$227,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$227,500	$0	$0	$227,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$218,400	$0	$0	$218,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$109,200	$0	$0	$109,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				7	$1,505,300	$0	$0	$1,505,300

2021/09/09 11:07 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DME INGENIERIA	Cra 47 a 10-42, Casa	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1086121397	9423200139	E	2021/08/12	2021/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,505,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DME INGENIERIA (7 Afiliados)								$5,678,288	$908,800			$5,451,156	$218,400			$5,678,288	$227,500			$6,359,682	$150,600		$0	$0		$1,505,300
Centro de Trabajo: AEROCIVIL - AEROPUERTO (1 Afiliados)								$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)								$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
1	CC	16461660	MEZA CARLOS			230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (1 Afiliados)								$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)								$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0		$281,500
2	CC	1144145850	FLOREZ HARRISON			231001	30	$908,526	$145,400	EPS012	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)								$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)								$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$0	$0		$669,000
3	CC	1107515687	DUQUE ANDRES			231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
4	CC	31577766	MONTEALEGRE MAYERLINE			25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
5	CC	1130633612	ROCHA KATERINE			230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
Centro de Trabajo: SERVICIO DOMESTICO (2 Afiliados)								$1,135,658	$181,800			$908,526	$36,400			$1,135,658	$45,500			$1,817,052	$9,600		$0	$0		$273,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)								$1,135,658	$181,800			$908,526	$36,400			$1,135,658	$45,500			$1,817,052	$9,600		$0	$0		$273,300
6	CC	48656353	MERA BERTHA			230301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
7	CC	1062280389	MINA YODY			230301	4	$227,132	$36,400		0	$0	$0	CCF57	4	$227,132	$9,100	14-11	30	$908,526	$4,800	4	$0	$0	No	$50,300
Total			**Afiliados(7)**					$5,678,288	$908,800			$5,451,156	$218,400			$5,678,288	$227,500			$6,359,682	$150,600		$0	$0		$1,505,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DME INGENIERIA	Cra 47 a 10-42, Casa	CALI-VALLE	3238425	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1086121397	9423200139	E	2021/08/12	2021/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,505,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$908,800	$0	$0	$908,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$472,600	$0	$0	$472,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$150,600	$0	$0	$150,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$150,600	$0	$0	$150,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$227,500	$0	$0	$227,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$227,500	$0	$0	$227,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$218,400	$0	$0	$218,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$109,200	$0	$0	$109,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				7	$1,505,300	$0	$0	$1,505,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 47 a 10-42	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1085255941	9423172834	I	2021/08/12	2021/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400
1	CC	6105951	ESTRADA DIEGO							X										230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total Afiliados(1)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$7,900		$0	$0		$435,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6105951		ESTRADA CHAVEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 47 a 10-42	CALI-VALLE	3238425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1085255941	9423172834	I	2021/08/12	2021/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$435,400	$0	$0	$435,400

2021/08/06 11:04 AM

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**No.21000691-H4 DE 2021**
Nombre del Contratista:	DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
Periodo informe:	18 de junio de 2021 al 13 de 13 de agosto de 2021.
Nombre de Supervisor:	**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**Infraestructura.**

2. OBJETO DEL CONTRATO

RVLC0203 REALIZAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA SALA RADAR, ALMACEN Y BOMBEROS PALMIRA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 18 de junio de 2021 al 13 de 13 de agosto de 2021.		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
a. Presentar previo a la iniciación del contrato la matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad ocupacional	Contratista hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en salud ocupacional	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000691-H4 DE 2021.

	para contratistas de la aeronáutica civil, debidamente diligenciada en físico y en medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.	– con aceptación y certificación de la parte del área Salud ocupacional fechada el día 18 de junio de 2021.	
b.	Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.	Contratista cumple con los protocolos de Bioseguridad según los aprobados y verificado por el área de salud ocupacional y apoyo a la supervisión.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000691-H4 DE 2021. Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
c.	Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas.	Contratista hace entrega de cronograma de ejecución en obra el cual es aprobado – con aceptación por parte del supervisor.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000691-H4 DE 2021.
d.	Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.	Certificado de aprobación de Pólizas y garantías actualizadas según acta de inicio.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000691-H4 DE 2021.
e.	Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía	Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000691-H4 DE 2021. Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.
f.	Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución.	Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial.	Secop II – Carpeta de Proceso No. 21000691-H4 DE 2021. Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1.
g.	Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.	Ejecuta cada ítems según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial, se realiza seguimiento mediante el cronograma de actividades y se verifica con el flujo de inversión del mismo.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1. Tabla de comparativo de avance y seguimiento a obra.

h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR.	Contratista realiza acopio de material sobrante de obra (escombros), es retirado por medio de volqueta y dispuesto en botadero.	Evidencia de registro fotográfico.
i. Todos los trabajadores a utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión	Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista. La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista.	Planillas de aportes al sistema de seguridad social.
j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad.	Se evidencia la implementación y aplicación de la matriz de riesgos laborares en las diferentes áreas de trabajo guiados y supervisados por una profesional en el área.	Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.

k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria.	Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria.	
l. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos.	Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo.	
m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor.	Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación.	Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico.
n. Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables.	A la fecha no se han reportado daños en ninguna área de trabajo ocasionadas por el contratista.	N/A
o. Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	El plan de calidad se aprobará una vez se realice el acta de recibo final con su previa aprobación de la parte de supervisión con el fin de establecer las fechas exactas.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato y alcance del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del ingeniero residente en obra, la profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.
Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	x	
2		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

33.60%

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ACTAS PARCIALES OBRA							
	VALOR ACTAS	**VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES**	**% EJECUCION**	**TOTAL A PAGAR**	**ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**	**PERIDO DE FACTURACION**
ACTA COBRO PARCIAL No.1	$ 76.457.081,20	$ 76.457.081,20	33.60 %	$ 76.457.081,20	$ 76.457.081,20	$151.062.302,78	18 de Junio de 2021. 13 de agosto
ACTA COBRO FINAL							

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

33.60%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

V o B°

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
Cc. 16.889.912 de Florida (V).
SUPERVISOR

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Cc. 74.451.949 de Nobsa (Boy).
Apoyo a la supervisión.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.
