INFORME SEMANAL 17
GRUPO No. 1



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021

SEMANA 17 DEL 06 DE DIC. AL 12 DE DIC. DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).

ETAPA DE VALIDACIÓN

En este informe ejecutivo, comprendido del 06 de Dic. al 12 de Dic. del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la semana Diecisiete, se realizan las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como continuar con aperturas y actividades de obra en general en los territorios de *Marandu: Juan Pablo II: Urbanización Compartir: Potosí: Las Brisas: Jerusalén: acacias: Unir.*

Se continúa las actividades de obra en las viviendas en el sector de Habitarte por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** pero es importante indicar que el porcentaje de percepción de inseguridad es bastante alto, así mismo se continua con la validación en el sector de UNIR (50 viviendas) y demás sectores al igual que la apertura e inicio de actividades de obra en cada una de ellas.


Existen dos puntos de atención a la comunidad (PAC) localizado en:

Habitarte - Cra18Q# 69-22 sur


Unir: Calle 75 #119-26.

Pac de Jerusalén

Avance de Validaciones.

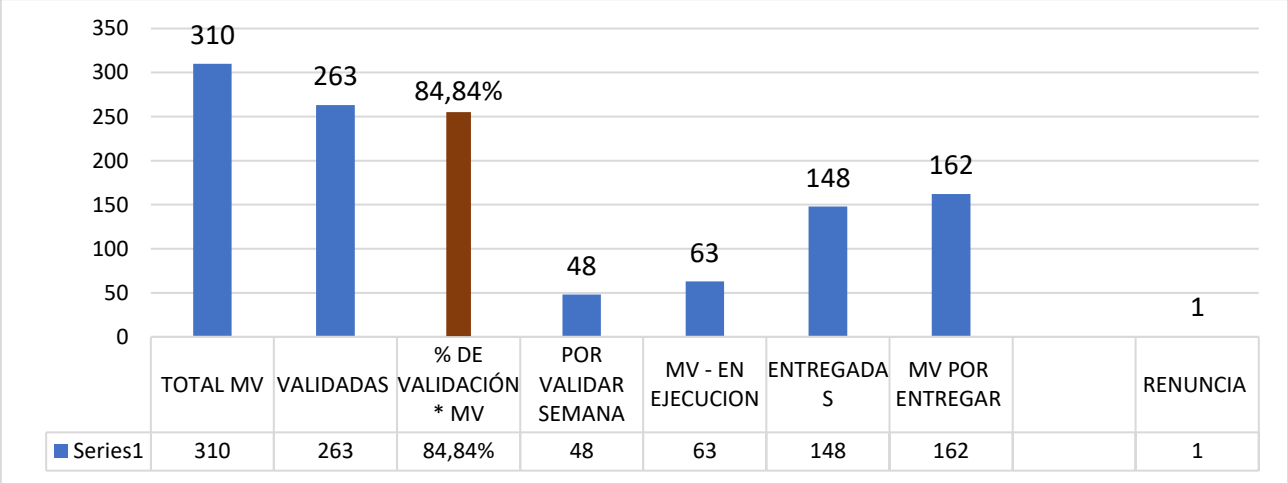

Avance de validaciones realizadas al 12 de Diciembre 2021: **Total 263**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 63**
Validaciones por realizar: 48 **en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **1**
Entregadas**: 148**

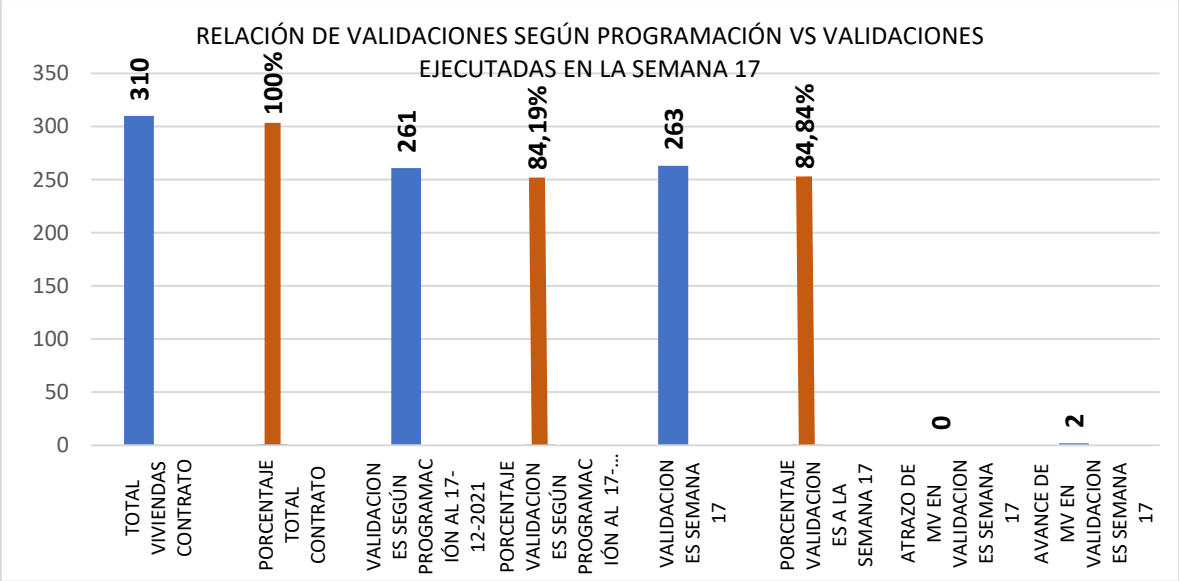

Para el presente informe (semana 17) el contratista: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** se **encuentra en cumplimiento** de las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 17 de diciembre del 2021 deberá finalizar con 261 validaciones y a la fecha posee 263 validaciones terminadas.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco	JUAN PABLO II	25	63	25	0	0	0	25	0	100,00%	25
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	0	3	0	100,00%	3
Técnico Responsable	Jerusalén	POTOSI	35		23	12	0	12	3	20	16,69%	3
Subtotal			63	63	51	12	0	12	31	20	72,23%	31

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Astrid Gonzalez	Juan Pablo II	25	63	25	0	20	1	22	2	89,40%	22
		Urb. Compartir	2		2	0	2	0	2	0	100,00%	2
Técnico Responsable		Acacias	1		1	0	1	0	1	0	100,00%	1
		Potosi	31		22	9	1	9	4	18	19,68%	4
		Jerusalen	4		2	2	1	1	1	2	28,75%	1
Subtotal			63	63	52	11	25	11	30	22	67,57%	30

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	6	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		37	13	16	12	16	22	38,92%	16
Técnico Responsable	Arq.Leonardo Solano											
Subtotal			59	59	46	13	0	12	25	22	69,46%	25

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	Arq. David García Cortes	Juan Pablo II	26	64	26	0	11	2	24	0	95,69%	24
		Urbanización compartir	2		2	0	1	0	2	0	100,00%	2
Técnico Responsable		Jerusalén	13		13	0	0	5	2	6	31,54%	2
		Potosí	23		23	0	0	10	4	9	30,26%	4
Subtotal			64	64	64	0	12	17	32	15	64,37%	32


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Camila Giraldo	Marandu	7	62	7	0	5	1	5	1	72,86%	5
		Juan Pablo II	14		14	0	8	2	12	0	98,21%	12
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	5	1	5	0	95,00%	5
		Potosi	33		23	10	0	7	8	18	29,39%	8
		Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
		Jerusalen	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			62	62	50	12	18	11	30	21	49,24%	30

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Camila Giraldo	Marandu	7	311	7	0	5	1	5	1	72,86%	5
		Juan Pablo II	99		99	0	45	5	92	2	96,66%	92
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		13	0	8	1	12	0	98,75%	12
		Potosi	122		91	31	1	38	19	65	24,00%	19
		Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
		Jerusalen	18		15	3	1	6	3	9	20,10%	3
		UNIR	50		37	13	16	12	16	22	38,92%	16
		Acacias	1		1	0	1	0	1	0	100,00%	1
Subtotal			311		263	48	77	63	148	100	56,41%	148

2. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO


GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA
RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 17 DEL 05 DE DIC. AL 12 DE DIC. DE 2021

Para la semana 17, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

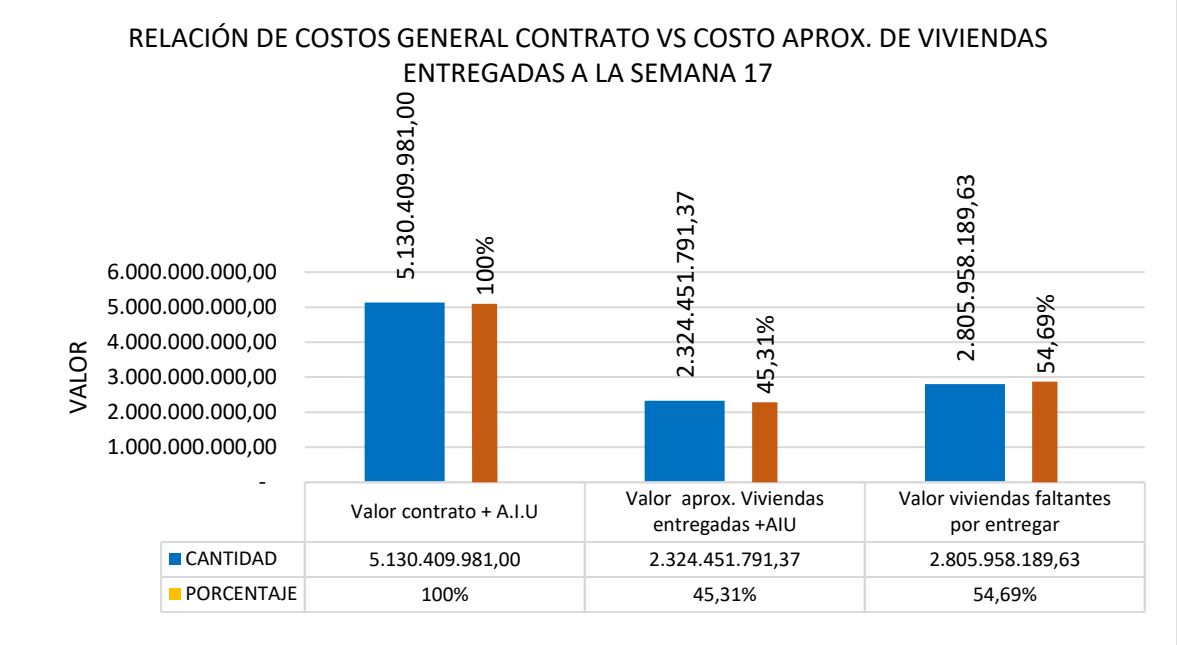


Así mismo, el contratista presenta un porcentaje aprox. en la ejecución de obra en el costo total del proyecto para la semana (17), del 45.31%.


En relación con tiempo de ejecución, el contratista tiene un periodo de 52 días para finalizar el contrato con 162 viviendas por entregar.

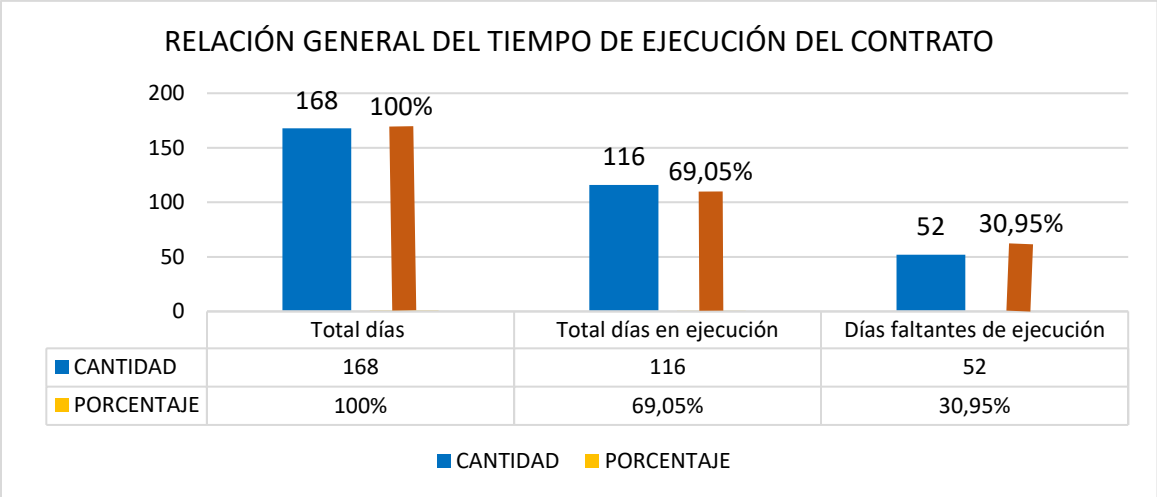

Finalmente, en este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se **encuentra <u>en cumplimiento</u>** de las viviendas a entregar, ya que para el día 29 de noviembre de 2021 entregaría 134 viviendas, y a la fecha de este informe se encuentran entregadas 148 viviendas. Por otra parte, y de acuerdo con la programación, al 4 de enero de 2022, el contratista deberá tener entregadas 149 viviendas. Lo anterior indica que en se deberán entregar en el mes de diciembre 27 viviendas para dar cumplimiento a la programación de obra con fecha 4 de enero de 2022.

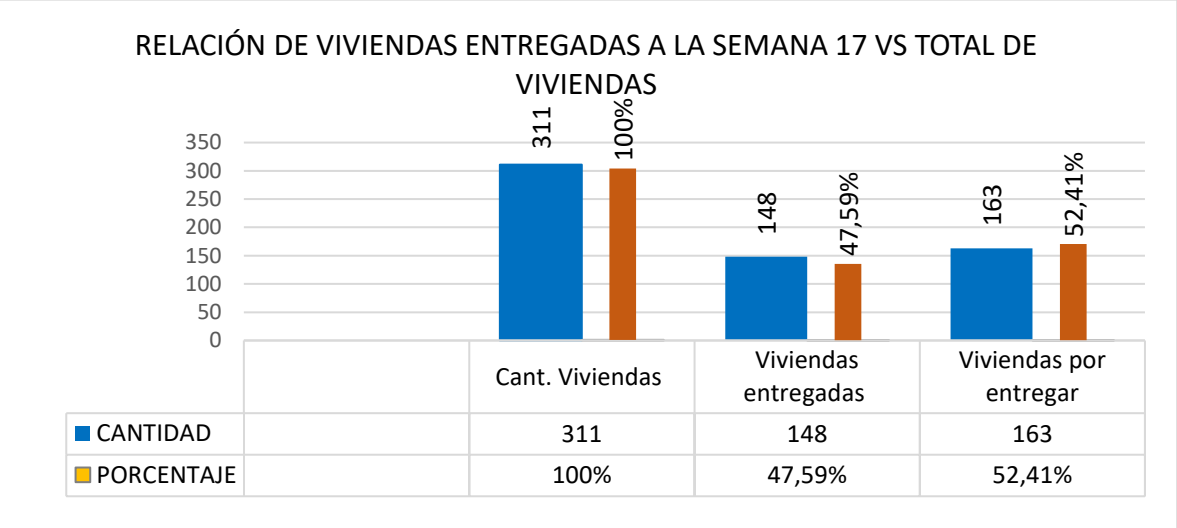

De acuerdo con la ejecución que está realizando el contratista, a continuación, se muestran los porcentajes en desarrollo de las viviendas que a la semana 17 se encuentran activas.

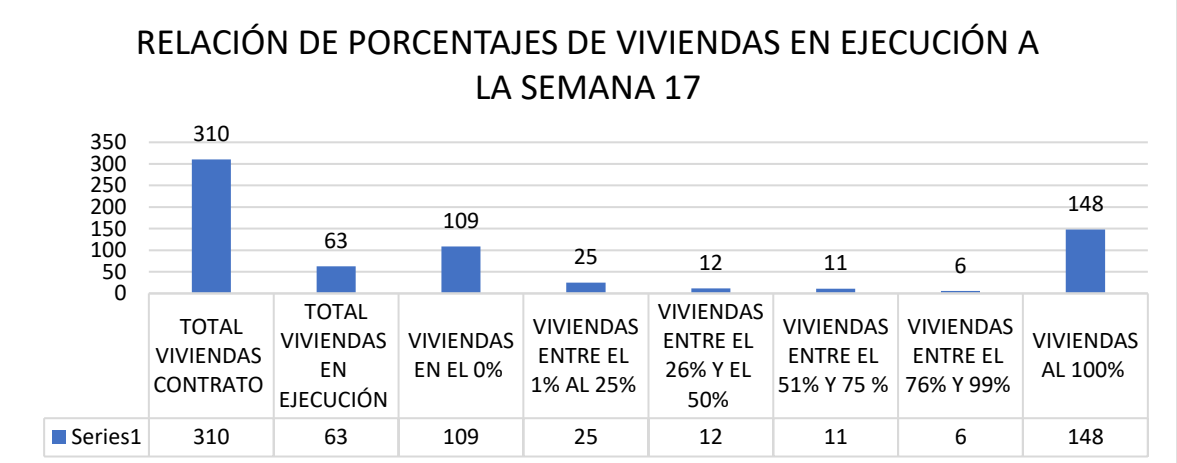

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **12-dic-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 días
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	JUAN PABLO II	25	63	25	0	0	0	25	0	100,00%	25
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	0	3	0	100,00%	3
Técnico Responsable	**Jerusalén**	POTOSI	35		23	12	0	12	3	20	16,69%	3
Subtotal			**63**	**63**	**51**	**12**	0	**12**	**31**	**20**	**72,23%**	**31**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	DICIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 17**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.899.586,0	$ 10.814.804,0	**7/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.947,0	$ 11.944.526,0	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.678.735,0	$ 11.398.939,0	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI / NO	$ 12.020.042,0	$ 11.427.635,0	**14/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI / NO	$ 11.974.102,0	$ 12.204.961,0	**10/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI / NO	$ 12.897.510,0	$ 11.186.603,0	**9/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI / NO	$ 12.894.063,0	$ 11.626.077,0	**13/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%

8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI / NO	$ 12.703.070,0	$ 10.707.871,0	9/09/2021	15/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI / NO	$ 12.973.156,0	$ 10.902.052,0	9/09/2021	27/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
46	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI / NO	$ 12.038.300,0	$ 11.864.372,0	12/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
47	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI / NO	$ 12.897.568,0	$ 11.329.166,0	28/10/2021	30/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
48	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI / NO	$ 11.514.588,0	$ 11.797.280,0	7/10/2021	3/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
49	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI / NO	$ 11.674.878,0	$ 12.002.565,2	7/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
50	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI / NO	$ 11.977.293,0	$ 11.887.610,4	6/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
51	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI / NO	$ 12.566.491,0	$ 11.489.381,0	6/10/2012	10/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
52	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI / NO	$ 12.671.905,0	$ 11.245.957,8	12/10/2021	23/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
53	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI / NO	$ 12.869.957,0	$ 11.890.753,3	11/10/2021	9/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
83	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI / NO	$ 9.687.610,0	$ 10.023.595,0	20/10/2021	10/12/2021	ENTREGADA	95,55%	100,00%
84	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI / NO	$ 12.799.710,0	$ 9.359.388,0	14/10/2021	6/12/2021	ENTREGADA	97,02%	100,00%
85	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI / NO	$ 11.618.607,0	$ 10.799.101,0	14/10/2021	8/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
86	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI / NO	$ 12.465.376,0	$ 11.769.237,4	15/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
87	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI / NO		$ 11.952.659,2	25/11/2021	6/12/2021	ENTREGADA	45,30%	100,00%
88	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI / NO	$ 12.482.428,0	$ 11.021.230,8	21/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
89	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI / NO	$ 12.973.784,0	$ 11.704.303,9	9/11/2021	3/12/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
90	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI / NO	$ 12.971.443,0	$ 12.095.771,5	20/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
54	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI / NO	$ 12.977.808,0	$ 11.953.028,0	8/10/2021	11/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
81	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI / NO	$ 10.841.382,0	$ 11.612.217,0	15/10/2021	25/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
82	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI / NO	$ 12.975.580,0	$ 11.789.319,0	15/10/2021	30/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
POTOSI											
188	MVJE_1068	DG 81 SUR 45B -59	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	SI / NO		$ 11.864.323,53	17/11/2021	6/12/2021	ENTREGADA	51,55%	100,00%
189	MVJE_251	DG 81 SUR 45B 53	LUZ AMANDA BUITRAGO	SI / NO		$ 12.023.184,60	17/11/2021	6/12/2021	ENTREGADA	40,19%	100,00%
190	MVJE_380	DG 81 SUR 45B 41	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	SI / NO		$ 12.010.552,10	17/11/2021	6/12/2021	ENTREGADA	44,82%	100,00%
191	MVJE_928	DG 81 A SUR 45 B 26	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	SI / NO		$ 11.824.619,83	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	3,00%
192	MVJE_133	KR 45B 81 15 SUR	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	SI / NO		$ 11.507.697,10	26/11/2021		EN EJECUCION	9,40%	37,00%
193	MVJE_359	KR 45B 81 09 SUR	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	SI / NO		$ 12.024.533,70	29/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	32,00%
194	MVJE_022	DG 81 SUR 45B 52	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	SI / NO		$ 11.779.705,70	22/11/2021		EN EJECUCION	18,41%	38,00%
195	MVJE_1042	DG 81 SUR 45B 46	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	SI / NO		$ 11.420.319,60	22/11/2021		EN EJECUCION	19,47%	44,00%
196	MVJE_174	DG 81 SUR 45B 34	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	SI / NO		$ 12.220.439,00	22/11/2021		EN EJECUCION	22,28%	46,00%
197	MVJE_941	DG 81 SUR 45B 28	EDGAR ELI SANCHEZ GOMEZ	SI / NO		$ 11.270.077,90	26/11/2021		EN EJECUCION	3,80%	21,00%
198	MVJE_457	DG 81 SUR 45B 16	HILDA MERY PALOMO GUARÍN	SI / NO		$ 12.059.095,20			VALIDADA	0,00%	0,00%
199	MVJE_942	DG 80A SUR 45 63	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	SI / NO		$ 11.131.692,91	29/11/2021		EN EJECUCION	4,50%	52,00%

200	MVJE_077	DG 80A SUR 45 59	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	SI NO		$ 12.058.623,60	9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	1,00%
201	MVJE_1016	DG 80A SUR 45 45	LUZ DARY GARCÍA MORALES	SI NO		$ 11.647.771,89	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	6,00%
202	MVJE_1017	DG 80 A SUR 45 39	OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.184.582,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
203	MVJE_907	DG 80 SUR 45 33	ANA ISABEL GONZALEZ	SI NO		$ 11.782.262,83	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	3,00%
204	MVJE_1045	DG 80 SUR 45 81	ALBERTO EFRAÍN CORREA HERNANDEZ	SI NO		$ 11.407.689,27			VALIDADA	0,00%	0,00%
205	MVJE_079	DG 80 SUR 45 86	JORGE HUMBERTO TELLEZ PEÑA	SI NO		$ 12.142.762,60	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	1,00%
260	MVJE_1028	CL 82B SUR 45-10	ARSENIO PARDO VELANDIA	SI NO		$ 11.970.784,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
261	MVJE_1063	CR 45 82A 09 SUR	MIGUÉL ÁNGEL GARCÍA	SI NO		$ 11.993.439,91			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
262	MVJE_916	KR 45 A 82 34 SUR	AMANDA LOZANO TAPIERO	SI NO		$ 11.873.322,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
263	MVJE_920	KR 45 82 23 SUR	BLANCA LILIA RAMIREZ	SI NO		$ 11.719.103,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
264	MVJE_1056	KR 45 82 09 SUR	BLANCA CECILIA SANABRIA	SI NO		$ 11.841.322,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
265	MVJE_992	KR 45 82 05 SUR	JORGE LUIS RODRIGUEZ NIETO	SI NO		$ 11.846.644,70			VALIDADA	0,00%	0,00%
266	MVJE_179	KR 45A 82 06 SUR	BUENAVENTURA BECERRA FUQUENE	SI NO		$ 12.035.670,20			VALIDADA	0,00%	0,00%
267	MVJE_341	KR 45 82 03 SUR MJ 1	OLGA PATRICIA RAMOS SUAREZ	SI NO		$ 11.906.305,10			VALIDADA	0,00%	0,00%
268	MVJE_1095	CL 81 SUR 45 15	ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.839.930,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
269	MVJE_346	CL 81 SUR 45 38	HECTOR BERNAL PINTO	SI NO		$ 12.080.070,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
270	MVJE_345	CL 81 SUR 45 16	DELIO ALAPE CONDE	SI NO		$ 12.200.505,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
271	MVJE_991	KR 45 81 18 SUR	BENJAMIN BALLESTROS BALLESTEROS	SI NO		$ 11.913.840,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
272	MVJE_989	CL 82 SUR 44A 77	ANA JUDITH BERMUDEZ VARGAS	SI NO		$ 11.727.893,18			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
273	MVJE_1078	CL 82A SUR 44A 74 MJ 1	OSTILIO PABON GAMEZ	SI NO		$ 11.843.190,46			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
274	MVJE_1125	CL 82C BIS 44B 04	ROSA MARIA VARGAS	SI NO		$ 11.907.198,72			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
275	MVJE_946	CL 82C BIS SUR 44A 59	SOLANGEL AMAYA	SI NO		$ 11.389.023,87			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
276	MVJE_885	CL 82 SUR 44A 43	JOSE RAMIRO LEON ARISMENDY	SI NO		$ 11.966.271,34			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores & Interventores

FECHA		**PERIODO No.**	**17**	DEL	**6/12/2021**	AL	**12/12/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

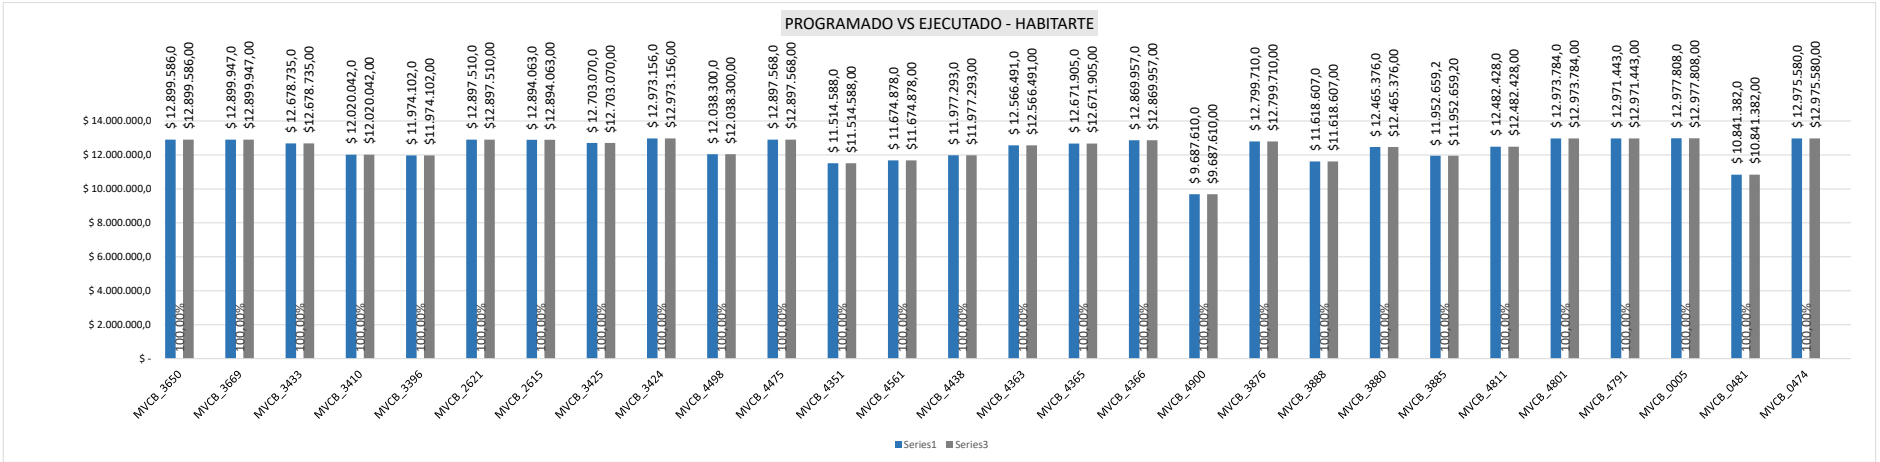

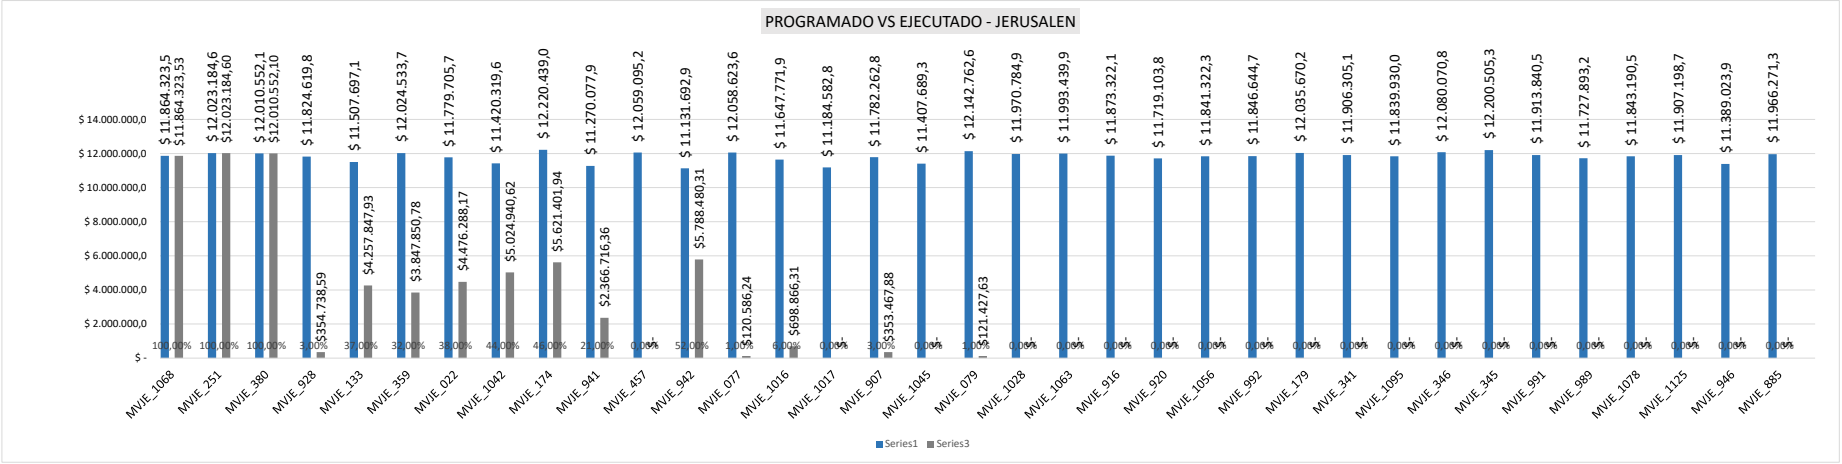

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Durante el presente período se entregó una (1) vivienda en el barrio Juan Pablo II. En el barrio Potosí, sector Jerusalén, continuó la validación y apertura de nuevas viviendas.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II

1	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
2	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
3	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
4	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
5	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
6	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
7	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
8	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
9	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
46	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
47	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
48	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
49	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
50	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA

51	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
52	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
53	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
83	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	Se terminaron las actividades de mejoramiento de cubierta proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario.** Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
84	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se terminaron las actividades de mejoramiento de cubierta proyectadas en esta vivienda. Entrega programada para la próxima semana.
85	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
86	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
87	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	Se termina instalación de teja arquitectónica. Pendiente instalación de flanches metálicos. Se avanza en instalación de estructura metálica para cielo raso en las áreas de alcobas y sala.
88	MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
89	MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
90	MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
54	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
81	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
82	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
BARRIO O TERRITORIO: JERUSALEN - POTOSI			
188	MVJE_1068	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	Se fundió mesón de cocina; se avanza en enchape de mesón y muros. Se aplica primera mano de estuco en áreas de cocina, baño y lavandería. Se aplica pintura vinilo sobre muros de patio interno.
189	MVJE_251	LUZ AMANDA BUITRAGO	Se fundieron el mesón y entrepaño de cocina. Se termina enchape de pared, se avanza en enchape de mesones. Se alistó piso y se instaló cerámica en área de comedor y cocina. Se elaboran maestras para pañete de muros de alcoba 2.
190	MVJE_380	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	Se instaló piso cerámico en la alcoba 3 y en el hall de acceso principal. Se demuele enchape antiguo y se funden mesón y entrepaño en cocina, se enchapa mesón de cocina. Se avanza en pañete de zona de escalera.
191	MVJE_928	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	Se inician actividades en la vivienda. Se acopia material de arena y cemento.
192	MVJE_133	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	Se terminan pañetes de sala comedor y alcobas. Se desmontan lavaplatos. Se enchapa pisos de sala comedor y alcobas 1 y 2. Se fundió placa de contrapiso en área de lavandería.
193	MVJE_359	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	Se pañetan muros del baño. Se fundieron mesón y entrepaño en cocina. Se levantan mochetas para lavadero y se adecúan puntos hidrosanitarios. Se terminó enchape de piso de la alcoba 2.
194	MVJE_022	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	En el área de lavandería se alistó piso y se enchapó con cerámica, y se avanza en estuco de zona superior de muros. Se avanza en aplicación de estuco en zona de hall de alcobas. Se alistó piso de la sala comedor y del hall de alcobas. Se inicia instalación de cerámica en piso de hall.
195	MVJE_1042	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	Se fundió el mesón de cocina y se enchapa. Se alistó pisos de alcobas 2 y 3. En la alcoba 2 se instala cerámica de piso y se estuca y pintan muros.
196	MVJE_174	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	Se levantan mochetas de lavadero y cocina, las cuales se pañetan. Se fundió mesón de cocina. Se enchapa pared y mesón. Se avanza en pintura vinilo en muros de alcobas y hall. Se enchapó el piso del hall de alcobas.
197	MVJE_941	EDGAR ELI SANCHEZ GOMEZ	Se instaló cielo raso pvc en alcobas 3 y 4. Se instaló estructura para cielo raso en hall de alcobas. Se fundió mesón de cocina. Se aplicó pintura vinilo en alcobas 3,4 y hall de alcobas.
198	MVJE_457	HILDA MERY PALOMO GUARÍN	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.

199	MVJE_942	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	Se estucan muros de alcobas 1 y 3. Se aplica pintura vinilo en muros de sala comedor. Se avanza en instalación de estructura para cielo raso en alcobas 1 y 3, sala comedor y cocina. Se funde mesón y se enchapan mesón y pared de cocina del piso 1.
200	MVJE_077	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	Se aperturaron actividades en la vivienda.
201	MVJE_1016	LUZ DARY GARCÍA MORALES	Se demolieron los enchapes antiguos de pared y mesón de cocina. En el baño se demolieron los enchapes antiguos.
202	MVJE_1017	OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
203	MVJE_907	ANA ISABEL GONZALEZ	Se aperturaron actividades en la vivienda.
204	MVJE_1045	ALBERTO EFRAÍN CORREA HERNANDEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Se proyecta mejoramiento de cubierta.
205	MVJE_079	JORGE HUMBERTO TELLEZ PEÑA	Se aperturaron actividades en la vivienda.
263	MVJE_920	BLANCA LILIA RAMIREZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
264	MVJE_1056	BLANCA CECILIA SANABRIA	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
265	MVJE_992	JORGE LUIS RODRIGUEZ NIETO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
266	MVJE_179	BUENAVENTURA BECERRA FUQUENE	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
267	MVJE_341	OLGA PATRICIA RAMOS SUAREZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes técnicos del contratista y la interventoría analizarán y ajustarán presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen término la finalización de las áreas proyectadas en las viviendas aperturadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	13/12/2021
Se realizarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas para efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	13/12/2021
Estructurar presupuestos, aperturar viviendas validadas y continuar con la validación de viviendas en el barrio Potosí, sector Jerusalén.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	13/12/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Con el fin que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se ajustaron los presupuestos de las viviendas que se encuentran en ejecución, sin sobrepasar los topes autorizados por la Entidad contratante.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

A la fecha se han entregado veintitrés (23) viviendas en el barrio Juan Pablo II, hay una vivienda que se terminó esta semana pero no se ha entregado formalmente. Se han entregado tres (3) en la Urbanización Compartir, para un total de 27 viviendas terminadas.

Se tienen a la fecha un total de 51 viviendas validadas. Se encuentran en ejecución diez y seis (16) viviendas: una (1) en el barrio Juan Pablo II y quince (15) en el barrio Potosí. En el barrio Potosí, hay ocho (8) viviendas validadas que aún no se han aperturado.

Predominó el tiempo seco.

Continúa el avance de las actividades proyectadas. Se estructuraron presupuestos y se proyectaron actividades de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos, cielo raso de pvc. En el presente período se aperturaron cinco (5) viviendas más en el barrio Potosí, sector Jerusalén.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	12-dic-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Astrid Gonzalez Gutierrez	Juan Pablo II	25	63	25	0	20	1	22	2	89,40%	22
		Urb. Compartir	2		2	0	2	0	2	0	100,00%	2
Técnico Responsable		Acacias	1		1	0	1	0	1	0	100,00%	1
		Potosi	31		22	9	1	9	4	18	19,68%	4
		Jerusalen	4		2	2	1	1	1	2	28,75%	1
Subtotal			**63**	**63**	**52**	**11**	25	**11**	**30**	**22**	**67,57%**	**30**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**DICIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA17**
BARRIO JUAN PABLO II												
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO	$ 12.978.974	$ 12.247.096,40	**16/11/2021**	**26/11/2021**	ENTREGADA		100,00%	100,00%
2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO	$ 12.503.233,92	$ 12.077.142,10	**14/09/2021**	**12/10/2021**	ENTREGADA		100,00%	100,00%
3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO	$ 12.940.220,00	$ 11.724.531,40	**8/09/2021**	**22/10/2021**	ENTREGADA		100,00%	100,00%
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO	$ 12.124.137,35	$ 12.238.468,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA		100,00%	100,00%
5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI / NO	$ 12.038.543,45	$ 11.377.892,80	**24/09/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA		100,00%	100,00%
6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA		0,00%	0,00%
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI / NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA		0,00%	0,00%
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI / NO	$ 11.015.175,4	$ 10.770.153,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA		100,00%	100,00%

9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI NO	$ 12.388.424,33	$	12.024.568,50	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI NO	$ 12.169.139,33	$	12.003.602,50	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI NO	$ 11.928.872,56	$	11.841.207,00	**21/09/2021**	**9/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI NO	$ 11.012.626,54	$	10.652.916,00	**21/09/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI NO	$ 12.302.471,90	$	12.076.903,30	**6/10/2021**	**2/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI NO	$ 12.413.430,16	$	12.052.125,10	**21/09/2021**	**8/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI NO	$ 12.204.062,14	$	12.150.294,90	**12/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI NO	$ 12.978.974,00	$	11.998.548,50	**13/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI NO		$	11.934.657,60	26/11/2021		EN EJECUCION	15,00%	35,00%
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI NO	$ 12.743.873	$	11.606.673,70	**14/10/2021**	**8/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI NO	$ 12.978.974,00			**29/10/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	85,00%	100,00%
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI NO	$ 12.241.965,23	$	11.592.989,00	**12/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI NO	$ 12.600.337,78	$	11.981.782,60	**28/10/2021**	**16/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI NO	$ 12.140.338,03	$	12.198.500,50	**21/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI NO	$ 11.522.480	$	11.854.190,20	**15/10/2021**	**17/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI NO	$ 12.978.974	$	12.205.262,30	**22/10/2021**	**17/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI NO	$ 12.978.974	$	11.991.555,40	**21/10/2021**	**11/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
URBANIZACION COMPARTIR												
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI NO	$12.978.974	$	12.284.986,00	**12/10/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	75,00%	100,00%
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI NO	$ 12.978.974	$	12.154.953,00	**6/10/2021**	**18/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
ACACIAS												
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI NO	$ 11.868.341			**8/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	85,00%	100,00%
POTOSI												
207	MVJE_065	Dg.79D SUR 45B 33	RASALBA TELLEZ	SI NO		$	12.210.865,00	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
208	MVJE_184	DG 80 SUR 45 56	BLANCA ROCIO CASTIBLANCO	SI NO		$	12.054.559,10			VALIDADA	0,00%	0,00%
209	MVJE_545	CL 78A SUR 45-90	LADY ESPERANZA ACOSTA	SI NO		$	12.228.327,90	9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
210	MVJE_110	TV 44B 78A 55 SUR	RIGOBERTO OSMA ARMERO	SI NO		$	12.172.503,80	23/11/2021		EN EJECUCION	35,00%	75,00%
211	MVJE_247	TV 44A 78A 93 SUR	WILLIAM HUMBERTO ARIAS	SI NO		$	12.295.067,50	**19/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	40,00%	100,00%
212	MVJE_233	CL 78A BIS SUR 44A 15	ODALINA ARDILA	SI NO		$	11.411.665,60	1/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	40,00%
213	MVJE_889	CL 80 SUR 44A 55	LUZ FANNY GARAY RAMOS	SI NO		$	11.674.504,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
214	MVJE_402	CL 80A SUR 44A 72	LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS	SI NO		$	12.279.329,00	9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
215	MVJE_892	KRA 45 80 22 SUR	RUTH EDITH LEAL CRUZ	SI NO		$	12.097.735,10	9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
216	MVJE_136	CL 80A SUR 44A 43	JAIRO CORTEZ PINZON	SI NO		$	12.265.385,20			VALIDADA	0,00%	0,00%
217	MVJE_962	CL 80B 44A 43 SUR	RAUL MUÑOZ RODRIGUEZ	SI NO		$	11.924.304,80	**17/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	40,00%	100,00%
218	MVJE_1148	CL 80B SUR 44A 57	LUIS EDUARDO JIMENEZ VERA	SI NO	$ 12.978.974,00	$	11.496.457,94	**17/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	90,00%	100,00%
219	MVJE_985	CL 80B SUR 44A 63	ANGELA SUAREZ RAMOS	SI NO		$	11.998.224,71	**17/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	85,00%	100,00%
220	MVJE_295	CL 80B SUR 44A 69	HENRY GIRALDO	SI NO		$	12.189.969,10	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
221	MVJE_1006	CL 81 SUR 44A 50	CAMPO ELIAS CUBIDES BALLEN	SI		$	11.979.120,22	29/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	25,00%

				NO							
224	MVJE_957	CL 81 SUR 44A 63	LUZ STELLA AGUILERA	SI NO		$ 11.852.958,52	23/11/2021		EN EJECUCION	15,00%	70,00%
277	MVJE_1043	CL 82 SUR 44A 44	JOSE DE JESUS PEÑA	SI NO		$ 11.822.238,37			VALIDADA	0,00%	0,00%
278	MVJE_984	CL 81A SUR 44A 49	CELMIRA BENITEZ CASTRO	SI NO		$ 11.851.859,29			VALIDADA	0,00%	0,00%
279	MVJE_959	CL 82 SUR 44A 38	GLORIA AZUCENA DIAZ PINEDA	SI NO		$ 12.035.249,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
280	MVJE_968	CL 82 SUR 44A 25	OFELIA PUERTA ARIAS	SI NO		$ 11.997.042,97			VALIDADA	0,00%	0,00%
281	MVJE_923	KR 44A 81A 17 SUR	DEICY PUERTAS ARIAS	SI NO		$ 11.702.906,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
282	MVJE_973	KR 44A 81A 03 SUR	MARGARITA CRUZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.901.509,52			VALIDADA	0,00%	0,00%
283	MVJE_950	KR 44A 81A 26 SUR	ANA LUCIA BELTRAN	SI NO		$ 11.887.004,73			VALIDADA	0,00%	0,00%
284	MVJE_953	CL 82 42 76 SUR	HERMELINDA AGUIAR DE GUTIERREZ	SI NO		$ 11.590.349,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
285	MVJE_948	CL 81A SUR 42 89	ERALDO PEÑA	SI NO		$ 11.530.769,53			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
286	MVJE_1015	KR 44A 80B 04 SUR	MARCO AURELIO GARCIA SALAZAR	SI NO		$ 11.919.926,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
287	MVJE_489	CL 79B SUR 42 81	LUIS ALBERTO CASTELLANOS	SI NO		$ 12.237.890,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
288	MVJE_440	CL 80 SUR 42-27	MARIA REINA DEL CARMEN ROMERO	SI NO		$ 12.128.732,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
289	MVJE_343	CL 80 SUR 42 45	ADOLFO SABOGAL HERNANDEZ	SI NO		$ 12.086.016,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
290	MVJE_204	CL 80B SUR 42 17	MARIA BLANCA AZUCENA SAENZ MONTAÑO	SI NO		$ 11.337.936,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
292	MVJE_441	CL 80 SUR 41 45	MARIA ALCIRA ZARATE	SI NO		$ 11.986.706,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

JERUSALEN											
206	MVJE_546	TV 45 # 77 - 36 SUR	RAMIRO GUZMAN BETANCOURT	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
222	MVJE_254	CL 81 SUR 44A 26	MARIA HILDA GUAQUETA GONZALEZ	SI NO			30/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	15,00%
223	MVJE_243	CL 81 SUR 44A 49	MARIA DE JESUS GARAVITO GARCIA	SI NO	$12.978.974		**18/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	90,00%	100,00%
291	MVJE_222	CL 80 B SUR 42 10	MARIELA RODRIGUEZ BELTRAN	SI NO		$ 12.271.051,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INPLAYCO S.A.S.

FECHA		PERIODO No.	17	DEL	6/12/2021	AL	12/12/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

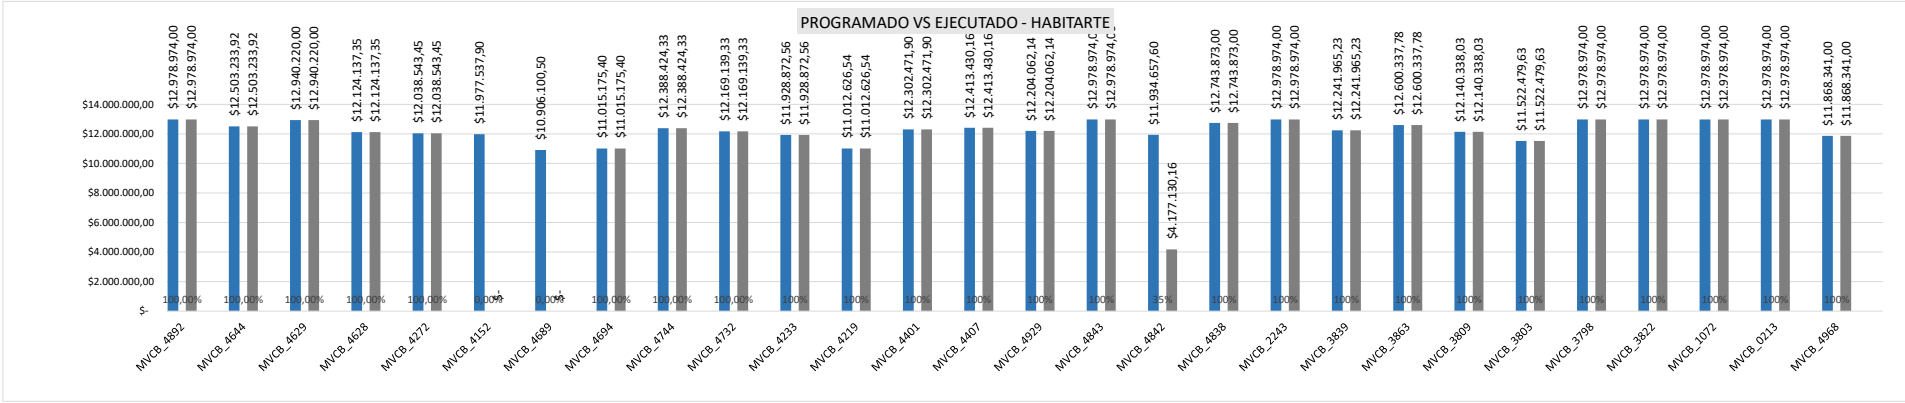

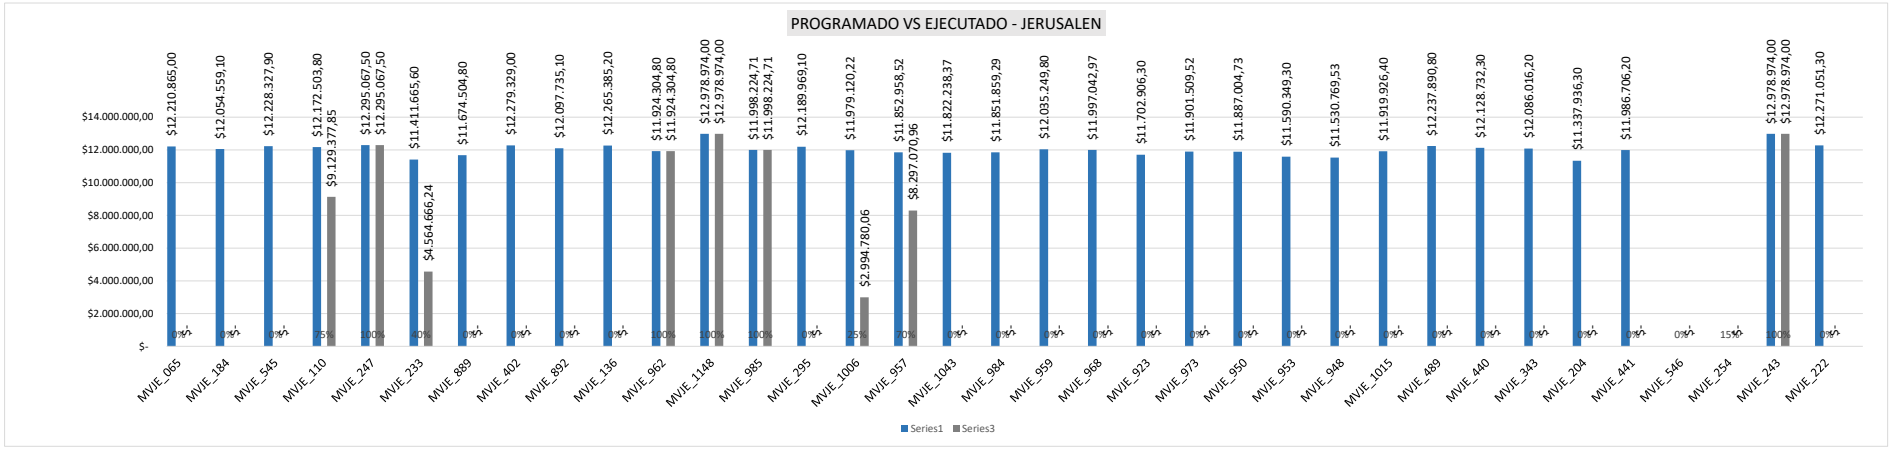

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	El día 22 de noviembre se realiza instalación de perfiles de cubierta de la zona del medio y posterior del predio. El día 24 de noviembre se termina de instalar la teja y se inicia actividad de estructura de cielo raso en la sala **El día 26 de noviembre, se realiza acta de entrega al beneficiario**
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 2 de noviembre, se realiza visita para ver si ya terminaron las observaciones realizadas para la entrega y no se han realizado. El día 4 de noviembre, se realiza visita para ver si ya terminaron las observaciones realizadas para la entrega y no se han realizado **El día 5 de noviembre, se realiza entrega del predio a beneficiaria**
3	MVCB 4628	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. **Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021**
4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. **El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.**
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. **El día 7 de octubre se realiza entrega del predio a la hija del beneficiario**
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 19 de octubre se instala puerta de baño y se realiza boquilla de mesón en cocina e instalación de lavaplatos. **El día 19 de octubre se entrega predio a la beneficiaria**.
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 19 de octubre, en espera de llegada de puerta y detalles de acabados en baño y cocina . El día 20 de octubre, en espera de llegada de puerta. El día 21 llega la puerta y se instala **El día 22 de octubre se entrega el predio a beneficiario**
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 11 de octubre se visita el predio para mirar los remates de cocina; se evidencian dos piezas de enchape de mesón cocas, acero que se ve en la parte inferior del mesón, se solicita realizar pañete en esa área y ajuste de puerta ya que esta muy forzada para cerrarla. **El día 12 de octubre se realiza entrega del predio al beneficiario**.

JUAN PABLO II - ETAPA II

11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 9 de noviembre nos presentamos en el predio pero nadie abre la puerta, se solicita al Director de interventoría los requisitos para la entrega unilateral.. El día 11 de noviembre se ha llamado reiteradamente al beneficiario pero no contesta. **El día 12 de Noviembre se realiza acta de entrega al beneficiario**
12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 7 de Diciembre, se solicita el enchape lineal del baño, boquilla en el baño, instalacion de ducha y manguera del lavamanos, cuadrar la llave del lavadero que quede enfrentada a la poceta del lavadero, detallar guardaescobas en todo el predio, detallar el enchape en la escalera, boquilla en el lineal de enhape en el muro nuevo, pintura de muros donde esuciaron las paredes con material, detallar meson de cocina. **El dia 9 de diciembre se realiza entrega del predio a beneficiaria dejando todas los requerimientos solucionados**
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	**El día 8 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	**El día 2 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 9 de noviembre se solicita al constructor arreglo de pintura de la estructura de la cubierta, mesón de cocina, arreglo de enchape del lavamanos. El día 11 de noviembre se revisan cantidades y se pide pintura de muros en la sala que fue pañetada, arreglos de mesón en cocina, en pañete , pañete y boquilla y arreglos de boquilla en zona de ropas y nivelar el platero y ajustar la puerta del baño **El día 12 de noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 16 de Noviembre se espera la puerta para ser instalada **El día 18 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Rosique	**El día 9 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
18	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	El día 9 de noviembre, se revisa piso de la alcoba de la beneficiaria y se revisa pisos de todo el predio El día 11 de noviembre se revisan actividades ejecutadas y se solicita pintura de muro en hall, arreglo de ducha y manguera de lavamanos, arreglo de pañete parte inferior del mesón arreglo de puerta del baño **El día 12 de noviembre se realiza acta de entrega del predio a nuera de la beneficiaria**
19	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 7 de Diciembre, se solicita al constructor detallar el meson donde hace falta boquilla, detallar el meson de la cocina donde falta pintura, muros de la cocina y baño donde hace falta pintura y arreglo de la puerta ya que entra forzada. **El dia 9 de diciembre se realiza entrega del predio a beneficiarios**
20	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 7 de Diciembre, se realiza alistado de piso en cocina, baño y hall ; se inicia enchape de muros en cocina y estuco de muros en cocina y hall El día 9 de Diciembre, continua el enchape de muros en cocina y se realiza pañete de muro en el baño y hall. El meson de la cocina al demoler enchape un pedazo se desplomo y el beneficiario solicita que lo dejen mas pequeño.
21	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	**El día 8 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
22	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	El día 9 de noviembre se realiza actividad de cielo raso en hall y pintura de muros El día 11 de noviembre se visita el predio para validar cantidades y verificar las actividades realizadas, se solicita detallar pintura en escaleras y hall alcobas, instalar el agua en el sanitario del segundo piso y limpiar pvc del cielo raso. **El día 12 de noviembre se realiza acta de entrega a familiar del beneficiario**
23	MVCB 3863	Fabio Rodríguez	**El día 16 de noviembre se realiza acta de entrega al beneficiario**
24	MVCB 3809	Isabel Ibáñez Álvarez	El día 2 de noviembre se termina la actividad de enchape de piso y se esta instalando cielo raso en hall y comedor. Continua la actividad de estuco de muros todo el predio. El día 4 de noviembre se terminan las actividades y en espera de la llegada de la puerta y acabados con silicona en el cielo raso **El día 5 de noviembre se realiza acta de entrega**
25	MVCB 3803	Luz Dary Sáenz Capera	El día 16 de noviembre se realiza observación de reparación de cielo raso en sala ya que presentaba catenaria y se coloco nivel, donde efectivamente reportaba un desnivel. Se ha realizado el enchape de muros en el baño y se estaba realizando enchape de mesón en cocina. **El día 17 se realiza entrega a la beneficiaria**

26	MVCB 3798	María Aliria Medina de Beltrán	El día 16 de noviembre se realiza enchape de muro de zona de ropas y mesón de cocina **El día 17 se realiza entrega a la beneficiaria**
27	MVCB 3822	Sory Inés Costes López	El día 9 de Noviembre se realiza alistado de piso alcoba 2, actividad de estuco en muros y pintura de muros. **El día 11 de noviembre se realiza acta de entrega**
28	MVCB 4968	Lucas Raúl Beltrán Prieto	**El día 10 de Diciembre, se realiza entrega del predio**
POTOSI			
29	MVJE 545	Lady Esperanza Acosta	El día 9 de Diciembre, se realiza acta de inicio del predio
30	MVJE402	Lenis Guimar Giraldo Lancheros	El día 9 de Diciembre, se realiza acta de inicio del predio
31	MVJE 233	Odalina Ardila	El día 6 de Diciembre, se ha realizado enchape de mesón cocina del primer piso , adicionalmente enchape de piso en cocina y se inicia el enchape de piso en alcoba del primer piso. El día 10 de Diciembre, se realiza enchape de piso en sala, se ha instalado guardaescoba en cocina y alcoba y pintura de muros en el predio.
32	MVJE 985	Angela Suarez Ramos	El día 6 de Diciembre se solicita tapar la luz de la puerta instalada, detallar el guardaescobas del área intervenida, instalar la ducha y llegada de la llave del mesón de la cocina El día 10 de Diciembre, no se dado solución a los requerimientos de interventoría, el Arq. Andrés Corredor informa que no van encontrado enchape de ese mismo piso y que van a realizar cambio de todo el piso.
33	MVJE 962	Raúl Muñoz Rodríguez	El día 6 de Diciembre, se ha realizado realizado instalación de cielo raso en baño, también se realizo alistado de piso en la sala y la cocina. El día 10 de Diciembre, se realiza enchape de piso en sala, se solicita el cambio de 4 piezas cocas, además se realiza enchape de muros en cocina y se funde mesón de cocina y se instala la estructura del cielo raso en sala, hall y cocina.
34	MVJE 1006	Campo Elías Cubides Ballen	El día 6 de Diciembre, se ha realizado alistado de piso en alcobas y hall y se inicia la demolición de enchape muros en cocina; se presento el problema que al demoler el enchape salió el pañete, tocal ajustar el presupuesto para esa actividad. Se solicita tener cuidado con los sifones frente al realizar cualquier demolición. En los días 7,8 y 9 de diciembre no se realizan actividades en el predio por falta de materiales El día 10 de diciembre llega al predio materiales para retomar las actividades
35	MVJE 295	Henry Giraldo	El día 6 de Diciembre, se realiza acta de inicio
36	MVJE 1148	Luis Eduardo Jiménez	**El día 6 de Diciembre, se realiza acta de entrega a la esposa del beneficiario**
37	MVJE 957	Luz Stella Aguilera	El día 6 de Diciembre, se realiza enchape de piso en alcobas, sala y comedor del segundo piso El día 9 de Diciembre, se realiza enchape de mesón cocina del segundo piso, se coloca el guardaescobas en todo el segundo piso y se realizan bocas puertas en granito. Se solicita cambio de 2 piezas cocas en el hall El día 10 de Diciembre, se lijan los muros estucados se emboquilla el piso y se pintan muros del segundo piso.
38	MVJE 962	William Humberto Arias	El día 6 de Diciembre, se realiza enchape de piso en local; se reporta a la oficina de interventoría que el piso que esta llegando, siendo de primera no esta saliendo con las micras de diferencia de amaño; sino que están con 3mm a 5mm de diferencia El día 10 de diciembre se realiza enchape piso en alcoba del primer piso y se termina el enchape de piso del local.
39	MVJE 889	Luz Fanny Garay	El día 17 de Noviembre, se realiza validación del predio
40	MVJE 110	Rigoberto Osma	El día 6 de Diciembre, se inicia la actividad de enchape piso en sala y alcoba 1
41	MVJE 892	Ruth Edith Leal	El día 9 de Diciembre, se realiza acta de inicio del predio
42	MVJE 984	Celmira Benítez Castro	El día 25 de Noviembre, se realiza validación del predio
43	MVJE 1043	José de Jesús Peña	El día 25 de Noviembre, se realiza validación del predio
44	MVJE 968	Ofelia Puerta Arias	El día 25 de Noviembre, se realiza validación del predio
45	MVJE 065	Rosalba Téllez	El día 6 de Diciembre, se realiza acta de inicio
46	MVJE136	Jairo Cortez Pinzón	El día 30 de Noviembre, se realiza validación del predio
47	MVJE 950	Ana Lucia Beltrán	El día 2 de Diciembre, se realiza validación del predio
48	MVJE 973	Margarita Cruz	El día 2 de Diciembre, se realiza validación del predio
49	MVJE 923	Deisy Puertas Arias	El día 2 de Diciembre, se realiza validación del predio
50	MVJE 184	Blanca Roció Castiblanco	El día 3 de Diciembre, se realiza validación del predio
JERUSALEN			

43	MVJE 254	María Hilda Guaqueta González	El día 6 de Diciembre, se realiza alistado de piso en cocina y pañete de muros en donde se hicieron las regatas. El día 9 de Diciembre, se realizan escalones y cambio de la mampostería del muro de entrada a la cocina
44	MVJE 243	María de Jesús Garavito	**El día 6 de Diciembre, se realiza acta de entrega del predio a la beneficiaria**

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Revisión de carpetas de corte constructora e interventoría	constructor e interventoría	9-10/12/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día lunes 6 de diciembre día soleado, No reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Martes 7 de diciembre día soleado. No reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Miércoles 8 de diciembre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Jueves 9 de Diciembre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día viernes 10 de Diciembre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**12-dic-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	6	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		37	13	16	12	16	22	38,92%	16
Técnico Responsable	Arq.Leonardo Solano											
Subtotal			**59**	**59**	**46**	**13**	0	**12**	**25**	**22**	**69,46%**	**25**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**DICIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 17**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO	$ 12.975.027,15	$ 11.211.390,00	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI / NO	$ 12.978.940,00	$ 11.927.560,50	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%

4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI NO	$ 12.616.698,00	$ 12.087.004,90	8/09/2021	11/10/20211	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI NO	$ 12.978.942,00	$ 12.289.771,00	10/09/2021	13/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI NO		$ 11.970.900,40	8/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI NO		$ 12.063.817,50	9/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI NO	$ 12.086.766,49	$ 12.059.809,40	10/09/2021	11/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI NO	$ 9.725.095,00	$ 9.602.199,70	9/09/2021	13/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
BARRIO UNIR II											
10	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		$ 11.218.588,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
11	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO	$ 10.705.308,00	$ 9.707.226,00	15/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
12	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
13	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		$ 12.538.076,00	17/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	56,08%
14	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO	$ 12.889.726,00	$ 10.814.060,70	7/10/2021	16/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
15	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 9.765.458,80	27/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
16	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 11.422.010,10	7/10/2021	4/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
17	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO	$ 12.978.942,00	$ 11.764.713,90	12/10/2021	5/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
18	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		$ 12.149.324,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
19	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO	$ 12.978.942,00	$ 11.150.820,20	7/10/2021	4/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
20	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO	$ 12.263.208,00	$ 11.271.883,80	27/10/2021	6/12/2021	ENTREGADA	45,61%	100,00%
21	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		$ 11.702.890,70			RENUNCIA	0,00%	0,00%
22	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
23	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 11.935.867,00	14/10/2021	2/12/2021	ENTREGADA	81,28%	100,00%
24	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		$ 11.768.059,40	23/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	28,49%
25	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 9.870.988,30	14/10/2021	1/12/2021	ENTREGADA	80,46%	100,00%
26	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		$ 11.097.935,00			VALIDADA	0,00%	0,00%

27	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
28	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO	$ 12.510.042,00	$ 11.692.638,60	15/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
29	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 11.828.107,30	14/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
30	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 11.317.173,00	20/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
31	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 10.711.089,20	21/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
32	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 10.959.600,90	21/10/2021	17/11/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
33	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 10.782.895,00	27/10/2021		EN EJECUCION	44,25%	51,42%
34	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
35	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00	17/11/2021	6/12/2021	ENTREGADA	25,00%	100,00%
36	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10	17/11/2021		EN EJECUCION	12,00%	25,63%
37	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
38	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80	9/11/2021		EN EJECUCION	25,00%	50,91%
39	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
40	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
41	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
42	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
43	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
44	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
45	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
46	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40	8/11/2021		EN EJECUCION	8,00%	26,01%
47	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO	$ 12.978.900,00	$ 11.042.062,90	28/10/2021	6/12/2021	ENTREGADA	89,18%	100,00%
48	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	10,00%
49	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

50	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
51	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20	10/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	2,00%
52	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50	10/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	2,00%
53	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
54	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
56	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00	3/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	15,10%
57	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00	2/12,/2021		EN EJECUCION	0,00%	13,30%
58	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
59	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60	23/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	65,14%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	17	DEL	**6/12/2021**	AL	**12/12/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

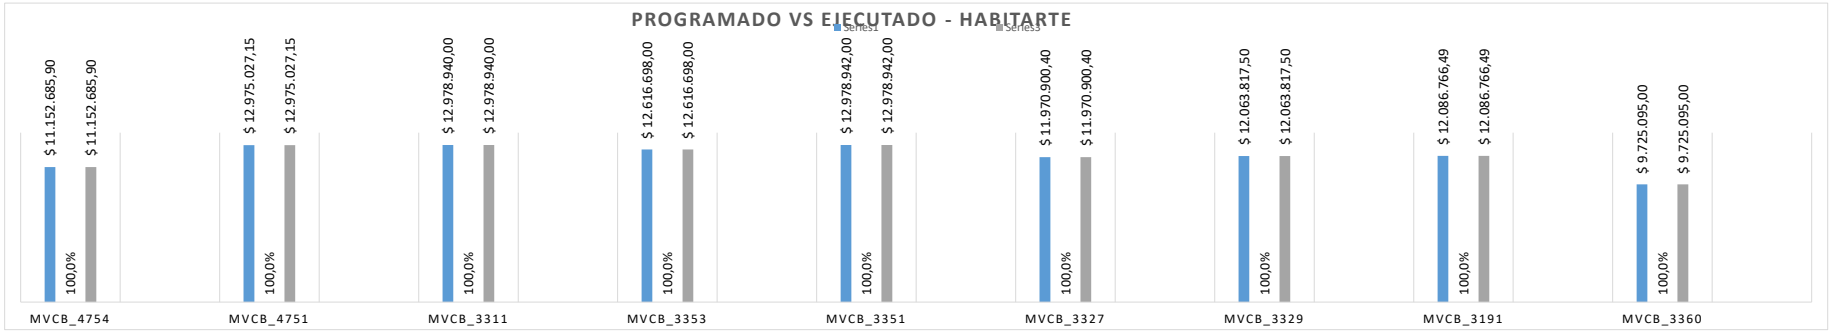

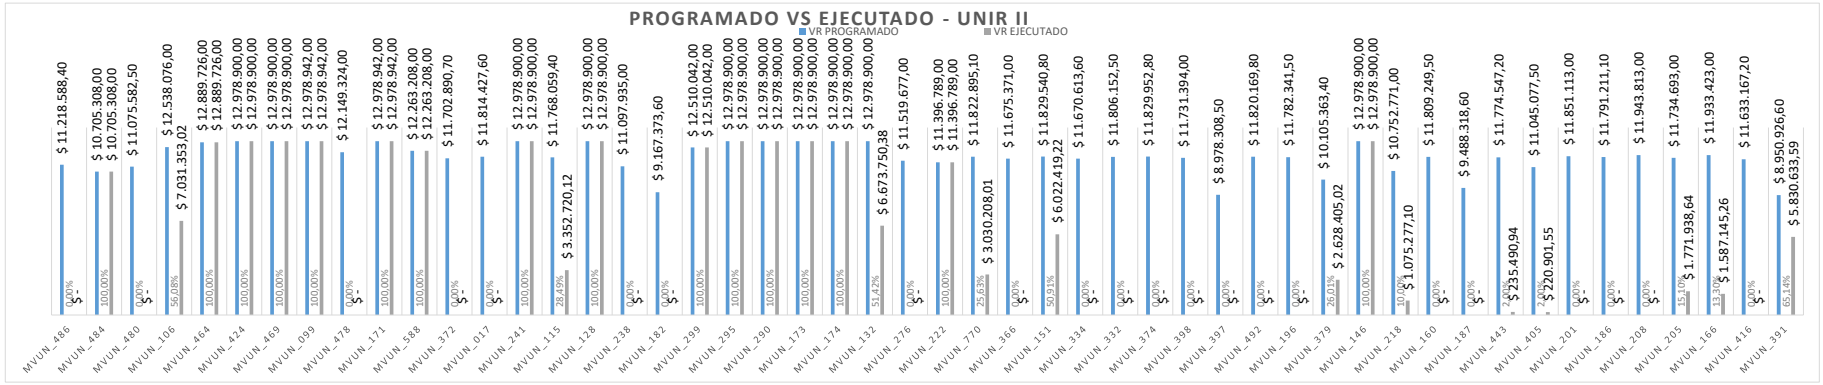

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR			
1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
BARRIO O TERRITORIO: UNIR II			
	MVUN_486	EDUARDO MELO ESPITIA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.

	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Enchape pared en ceramica rectificada para Cocina,Instalacion de Piso Ceramico.Puerta de Madera
	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_478	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Enchape pared en ceramica rectificada para baño y Cocina ,aplicacion de base de estuco plástico acrílico para interiores.
	MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	Se realiza visita Tecnica-Social para Realizar Renuncia formal al Programa de Mejoramiento de Vivienda
	MVUN_017	DORIS RAMOS TORRES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Enchape pared en ceramica rectificada para cocina formato 60 x 30 o similar.
	MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_238	ALIRIO CONTRERAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para posible ejecucion de Cubierta.
	MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
	MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.

	MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Ejecución de meson en concreto,Enchape pared en ceramica rectificada para Cocina,aplicacion de base de estuco plástico acrílico para interiores,los muros totalmente resanados y terminados con pintura tipo vinilo de alta calidad terminada mínimo 3 manos
	MVUN_276	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
	MVUN_222	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de muros totalmente resanados y terminados con pintura tipo vinilo de alta calidad terminada mínimo 3 manos
	MVUN_770	JOSE YECID LAVERDE NIETO	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm
	MVUN_366	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
	MVUN_151	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm,aplicación base de estuco plástico acrílico para interiores,Enchape pared en ceramica rectificada para Cocina y Baño,
	MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm
	MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
	MVUN_218	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de ,aplicacion de base de estuco plástico acrílico para interiores,
	MVUN_187	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la validacion y reconocimiento del inmueble,En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda.
	MVUN_443	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se efectua la apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO ,En conjunto con el contratista y la interventoría.
	MVUN_405	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se efectua la apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO ,En conjunto con el contratista y la interventoría.
	MVUN_205	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se efectua la apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO ,En conjunto con el contratista y la interventoría.
	MVUN_166	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se efectua la apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO ,En conjunto con el contratista y la interventoría.

	MVUN_391	IMELDA RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de ,aplicacion de base de estuco plástico acrílico para interiores,Enchape pared en ceramica rectificada para Baños,Enchape escalera en Ceramica,Enchape de piso en Ceramica 60 x 60 o similar.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	29/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	12-dic-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. David García Cortes	Juan Pablo II	26	64	26	0	11	2	24	0	95,69%	24
		Urbanización compartir	2		2	0	1	0	2	0	100,00%	2
Técnico Responsable		Jerusalén	13		13	0	0	5	2	6	31,54%	2
		Potosí	23		23	0	0	10	4	9	30,26%	4
Subtotal			**64**	**64**	**64**	**0**	**12**	**17**	**32**	**15**	**64,37%**	**32**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES	DICIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				FASE I			Tiempo Programación				SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 17**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO	$ 12.978.390,83	$ 12.079.596,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO	$ 12.460.609,4	$ 11.947.615,50	**8/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI / NO		$ 12.032.573,60	17/11/2021		EN EJECUCION	60,00%	88,00%
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI / NO	$ 12.636.225,99	$ 12.169.719,00	**8/09/2021**	**5/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI / NO	$ 12.978.434,15	$ 12.149.156,80	**27/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI / NO	$ 12.516.986,46	$ 11.701.628,10	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI / NO	$ 12.253.349,05	$ 11.769.775,40	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI / NO	$ 12.978.808,77	$ 11.326.716,60	**7/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%

9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI / NO	$ 11.473.441,99	$ 11.528.955,20	**7/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.792.129,40	**11/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.676.457,80	**5/10/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI / NO		$ 12.027.750,70	**11/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI / NO		$ 12.884.127,60	10/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI / NO		$ 11.678.378,50	**12/10/2021**	**17/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI / NO		$ 11.386.359,00	**30/09/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI / NO		$ 11.687.008,20	**11/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI / NO		$ 11.887.405,00	**11/10/2021**	**11/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI / NO	$ 12.978.495,17	$ 11.878.089,50	**20/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI / NO	$ 12.978.659,81	$ 11.904.933,20	**20/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI / NO	$ 1.297.826,00	$ 11.888.710,30	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI / NO		$ 12.028.047,20	**29/09/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.991.549,20	**29/09/2021**	**11/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI / NO		$ 11.196.334,10	**2/11/2021**	**17/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI / NO		$ 11.992.608,00	**29/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI / NO		$ 12.424.274,80	**6/10/2021**	**17/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI / NO		$ 11.825.187,60	**29/09/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI / NO	$ 12.978.809	$ 11.547.979,00	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI / NO		$ 10.062.877,30	**14/10/2021**	**9/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
BARRIO JERUSALÉN											
233	MVJE_572	KR 44 78 72 SUR	FABIOLA GARCIA DURAN	SI / NO			**17/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	72,00%	100,00%
235	MVJE_358	KR 43 78 SUR 48 CASA 1	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	SI / NO		$ 12.270.530,00	12/11/2021		EN EJECUCION	78,00%	95,00%
236	MVJE_604	KR 43 78 46 SUR CASA 2	VIVIANA BOHORQUEZ	SI / NO			12/11/2021		EN EJECUCION	62,00%	95,00%
238	MVJE_429	CRA 43 # 78 - 15 sur	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	SI / NO			**17/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	86,00%	100,00%
240	MVJE_574	CR 44 77 37 SUR	LUÍS ARMANDO SANABRIA	SI / NO			3/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	12,00%
294	MVJE_319	CL 80 B SUR 41 03	MANUEL FONSECA ALVAREZ	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%
300	MVJE_559	DG 79A SUR 40-50	DORIS ROCIO GUAYACAN BERNAL	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%
301	MVJE_557	DIAG 79 SUR- # 40-21	JOSE JULIAN ROJAS	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%
302	MVJE_561	DG 79 A SUR 40 08	MARIA GLORIA CASTAÑEDA	SI / NO		$ 12.192.156,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
304	MVJE_162	CRA 40 78 B 03 SUR	ELIAS OSPINA FRANCO	SI / NO			9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
306	MVJE_400	CL 79A SUR 38 10	MARIA FLORALBA DAVID ERAZO	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%
308	MVJE_453	CL 78A SUR 38 44	MERLY BELTRAN AGUDELO	SI / NO		$ 11.933.921,40	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	8,00%
310	MVJE_581	CALLE 78 SUR 39 40	JAIME DONCEL CASILIMAS	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%

BARRIO POTOSÍ												
225	MVJE_275	TV 44A 78A 34 SUR	DIANA BELEN HERNANDEZ	SI NO		$ 12.277.102,80	**9/11/2021**	**2/12/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
226	MVJE_032	TV 44 BIS 78 53 SUR	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	SI NO		$ 11.558.725,80	**9/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	84,00%	100,00%
227	MVJE_011	TV 44 BIS 79-17 SUR	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	SI NO		$ 12.038.750,50	**9/11/2021**	**3/12/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
228	MVJE_010	TV 44 BIS 79 23 SUR	YOLANDA MENESES	SI NO		$ 11.785.007,60	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	15,00%
229	MVJE_050	CL 79A SUR 42-51	HERSILIA PARRA PEÑA	SI NO		$ 11.921.067,70	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
230	MVJE_351	TV 44 BIS 78-52 SUR	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	SI NO		$ 12.270.530,00	**12/11/2021**	**1/12/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
231	MVJE_356	KR 44A 78 43 SUR	ANA ROSA SOSA	SI NO		$ 11.978.172,90	2/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	18,00%
232	MVJE_573	KR 44 -78 59 SUR	SANDRA MILENA PRECIADO	SI NO		$ 12.214.137,10	12/11/2021		EN EJECUCION	45,00%	71,00%
234	MVJE_452	CL 79 SUR 42 10	PEDRO JULIO UREÑA	SI NO		$ 11.937.194,00	17/11/2021		EN EJECUCION	16,00%	56,00%
237	MVJE_405	KR 44A 78 16 SUR MJ	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	SI NO		$ 12.090.689,00	1/12/2021		EN EJECUCION	8,00%	32,00%
239	MVJE_149	CL 78 SUR 42 05	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	SI NO		$ 11.963.665,70	3/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	10,00%
241	MVJE_624	KR 43 77 37 SUR	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA	SI NO		$ 11.806.187,60	3/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	16,00%
242	MVJE_293	KR 42 77 15 SUR	ELSA MARIA MARTINEZ	SI NO		$ 12.002.396,60	19/11/2021		EN EJECUCION	22,00%	66,00%
293	MVJE_241	CALLE 80 SUR # 42-24	RUBY STELLA JAIMES	SI NO		$ 12.014.443,80	6/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	12,00%
295	MVJE_164	CL 80B SUR 40 03	SARA RODRIGUEZ RAMOS	SI NO		$ 11.854.358,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
296	MVJE_009	CL 80B SUR 39 24	MARIA MERY VARGAS LOPEZ	SI NO		$ 12.300.608,10			VALIDADA	0,00%	0,00%
297	MVJE_360	CL 80B SUR #40-18	ARTURO FLOREZ BARAJAS	SI NO		$ 12.191.485,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
298	MVJE_434	CL 80 SUR#40-34	NOHEMI MORALES ORTIZ	SI NO		$ 12.239.982,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
299	MVJE_435	CL 80 SUR # 41-04	JUVENAL ESPINOSA MUR	SI NO		$ 12.158.802,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
303	MVJE_1139	CL 79 SUR 40 05	OSCAR ALIRIO GAITAN MOLINA	SI NO		$ 11.881.376,45			VALIDADA	0,00%	0,00%
305	MVJE_321	CALLE 79 SUR 39 40	JOSE MIGUEL MORENO ROBAYO	SI NO		$ 11.935.907,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
307	MVJE_868	CL 79 SUR 37 46	MARIA IDALINA PALOMINO MENDOZA	SI NO		$ 11.998.314,71			VALIDADA	0,00%	0,00%
309	MVJE_030	KR 40 78 06 SUR	NUBIA LUCERO NEIRA JERENA	SI NO		$ 12.075.043,30			VALIDADA	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	17	DEL	6/12/2021	AL	12/12/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	**$416.387.088,18**	8,12%	-0,35%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	**$398.333.762,28**	7,76%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

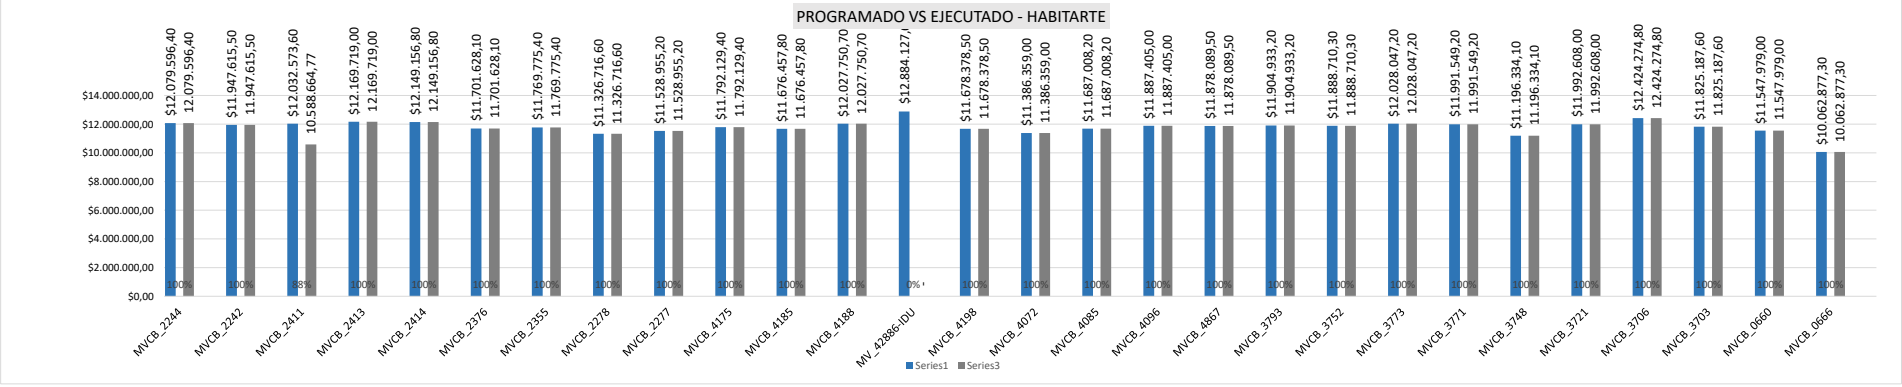

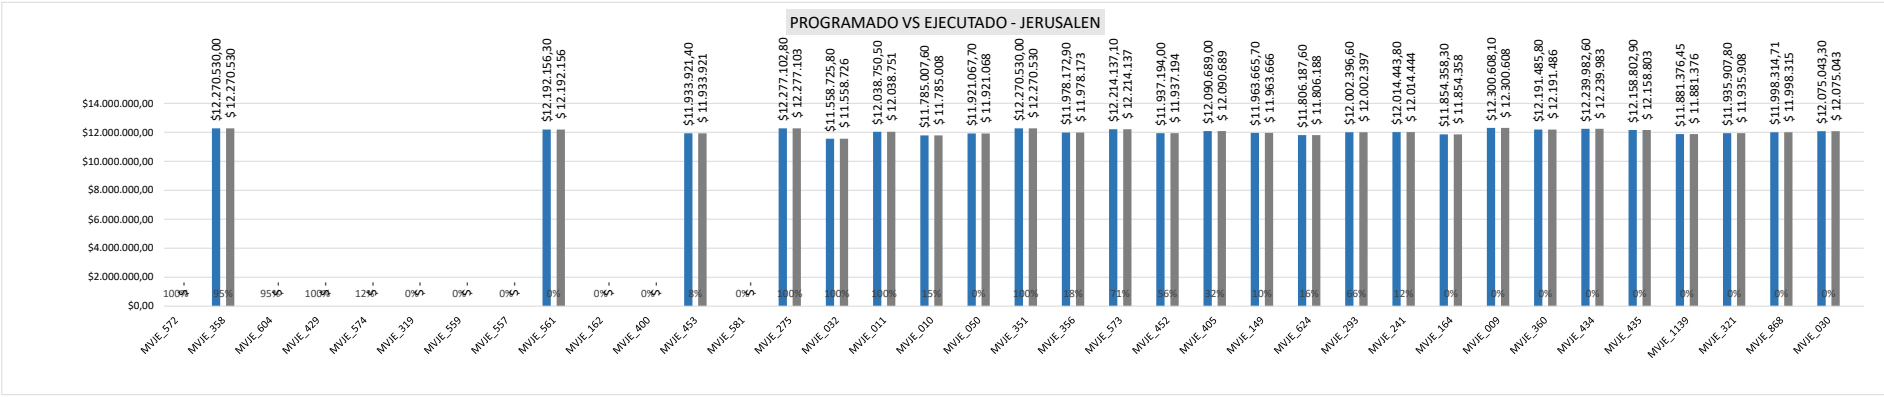

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra:Instalación de cubierta con su respectiva estructura metálica, enchapes de piso de cocina y hall, enchapes de muros y mesón de cocina. Estuco en muros de alcoba.
2	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Se realiza apertura de obra el viernes 10 de diciembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JERUSALÉN			
3	MVJE_572	FABIOLA GARCIA DURAN	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día lunes 6 de diciembre de 2021.
4	MVJE_358	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Cielo raso en todo el área. Vivienda terminada, revisada y lista para su entrega.
5	MVJE_604	VIVIANA BOHORQUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Cielo raso en todo el área. Vivienda terminada, revisada y lista para su entrega.
6	MVJE_429	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día lunes 6 de diciembre de 2021.
7	MVJE_574	LUÍS ARMANDO SANABRIA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de alcoba, cocina y baño.
8	MVJE_453	MERLY BELTRAN AGUDELO	Se realiza apertura de obra el lunes 6 de diciembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolicion de antepecho y enchapes de cocina. Demolición de enchapes de muro y piso de baño y sala.
9	MVJE_162	ELIAS OSPINA FRANCO	Se realiza apertura de obra el jueves 9 de diciembre, donde se presenta personal de obra y se hace compromiso de iniciar actividades de obra el proximo lunes 13 de diciembre.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR POTOSÍ			
10	MVJE_032	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día lunes 6 de diciembre de 2021.
11	MVJE_050	HERSILIA PARRA PEÑA	Se realiza apertura de obra el lunes 6 de diciembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades. Hasta la fecha del presente informe no se ha iniiado actividad de obra. Se hace compromiso para el siguiente lunes 13 de diciembre.
12	MVJE_452	PEDRO JULIO UREÑA	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Enchape de pisos de cocina y hall, Enchapes en baño. Se hace pre entrega de los soguientes espacios terminados: Alcoba 2, Depósito, Cocina.
13	MVJE_573	SANDRA MILENA PRECIADO	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Boquilla de enchapes de muro y piso de cocina y baño. Estuco en muros de alcobas y sala. Poyo para mueble de cocina.
14	MVJE_356	ANA ROSA SOSA	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra:Enchape de muros y piso en baño y cocina de primer piso. Fundición de mesón de cocina 1.
15	MVJE_149	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de alcoba 2. alistado de piso de alcoba 2.
16	MVJE_293	ELSA MARIA MARTINEZ	Hasta la fecha del presente informe se ha avanzado en las siguientes actividades de obra: Enchape de piso en alcoba 2 con su respectivo guardaescobas. Pañete de muros en cocina.
17	MVJE_241	RUBY STELLA JAIMES	Se realiza apertura de obra el lunes 6 de diciembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros y alistado de piso en alcoba 2.
18	MVJE_360	ARTURO FLOREZ BARAJAS	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
19	MVJE_164	SARA RODRIGUEZ RAMOS	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.

20	MVJE_435	JUVENAL ESPINOSA MUR	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
21	MVJE_434	NOHEMI MORALES ORTIZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
22	MVJE_624	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROG	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco de muros de alcobas y hall. Demolición de enchape de patio de ropas. Enchapes de muro y piso en cocina 2.
23	MVJE_321	JOSE MIGUEL MORENO ROBAYO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
24	MVJE_405	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	Hasta la fecha del presente informe se adelantan las siguientes actividades de obra: Alistado de piso en alcobas, hall y baño. pañete de muros de cocina y sala.
25	MVJE_009	MARIA MERY VARGAS LOPEZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
26	MVJE_868	MARIA IDALINA PALOMINO MENDOZA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
27	MVJE_030	NUBIA LUCERO NEIRA JERENA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
28	MVJE_010	YOLANDA MENESES	Se realiza apertura de obra el lunes 6 de diciembre, donde se presenta personal de obra y se inician actividades. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros en alcoba, alistado de piso en sala y puntos hidrosanitarios de cocina.
29	MVJE_319	MANUEL FONSECA ALVAREZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
30	MVJE_561	MARIA GLORIA CASTAÑEDA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
31	MVJE_1139	OSCAR ALIRIO GAITAN MOLINA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
32	MVJE_400	MARIA FLORALBA DAVID ERAZO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
33	MVJE_559	DORIS ROCIO GUAYACAN BERNA	Se hace visita de validación el día jueves 9 de diciembre. Se hace medición del predio y presupuesto con actividades a ejecutar.
34	MVJE_557	JOSE JULIAN ROJAS	Se hace visita de validación el día jueves 9 de diciembre. Se hace medición del predio y presupuesto con actividades a ejecutar.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Actualmente se encuentran dos (2) viviendas en ejecucuión del barrio Juan Pablo II y tquince (15) del sector Jerusalén. Se realizó visita de validación en dos (2) vivienda del sector Jerusalén.Se hizo entrega de tres (3) viviendas del sector Jerusalén a satisfacción. Hasta la fecha se han entregado treinta y dos (32) viviendas.	Residentes de interventoría y de contratista	6/12/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

x Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

Días despejados y sin lluvias, facilitando la ejecución de actividades en cubiertas.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **12-dic-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Camila Giraldo Jimenez	Marandu	7	62	7	0	5	1	5	1	72,86%	5
		Juan Pablo II	14		14	0	8	2	12	0	98,21%	12
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	5	1	5	0	95,00%	5
		Potosi	33		23	10	0	7	8	18	29,39%	8
		Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
		Jerusalen	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**62**	**62**	**50**	**12**	18	**11**	**30**	**21**	**49,24%**	**30**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	DICIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 06 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 17**
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20	29//11/2021		EN EJECUCION	0,00%	10,00%

3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.895.402,07	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI / NO	$ 12.023.740,46	$ 11.811.116,20	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI / NO	$ 12.548.436,06	$ 11.941.531,50	**8/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI / NO	$ 12.454.097,90	$ 9.757.539,80	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.884.972,10	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252N	KR 18V BIS 68A 42 SUR	ABIGAIL PARDO	SI / NO		$ 12.099.603,50	16/11/2021		EN EJECUCION	70,00%	90,00%
9	MVCB_2252	TV 18V BIS 38A 55 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI / NO		$ 12.099.603,50	16/11/2021		EN EJECUCION	75,00%	85,00%
10	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.693.068,00	**18/11/2021**	**26/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
11	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.638.243,00	**3/11/2021**	**17/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
12	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI / NO	$ 12.978.900,00	$ 11.739.701,00	**15/10/2021**	**26/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
13	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.955.384,30	**15/10/2021**	**16/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
14	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.926.494,00	**2/11/2021**	**16/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
15	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.796.968,00	**13/10/2021**	**2/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
16	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI / NO		$ 11.938.400,60	**20/10/2021**	**16/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
17	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 12.222.565,40	**15/10/2021**	**26/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
18	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI / NO	$ 12.072.506,95	$ 12.052.789,00	**21/10/2021**	**10/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
19	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI / NO	$ 12.940.140,77	$ 10.690.982,90	**13/10/2021**	**12/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
20	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.645.016,29	**11/10/2021**	**16/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
21	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI / NO	$ 12.160.207,60	$ 12.027.459,50	**24/09/2021**	**22/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
22	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.197.949,00	**4/10/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
23	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI / NO	$ 12.816.618,27	$ 12.940.470,50	**4/10/2021**	**2/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
24	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI / NO		$ 11.882.772,80	16/11/2021		EN EJECUCION	50,00%	70,00%
25	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI / NO	$ 12.900.000,00	$ 11.528.505,00	**4/10/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
26	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.926.026,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
27	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI / NO	$ 12.900.000,00	$ 11.809.681,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%

POTOSI												
28	MVJE_058	CL 82A BIS SUR 46A 37	DILMA MARIA DEL CARMEN RIVERA CELIS	SI / NO		$ 12.100.875,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
29	MVJE_1000	KR 46A 82A 35 SUR	MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA	SI / NO		$ 11.989.418,73			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
30	MVJE_326	CL 82 SUR 46A 49	LUZ MARINA SIERRA SIERRA	SI / NO		$ 11.960.780,80	9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	10,00%
31	MVJE_1087	CR 46A 82A 09 SUR	ALONSO OIDOR	SI / NO		$ 11.995.442,12	9/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	5,00%
32	MVJE_909	KR 46A 82A 22 SUR	JOSE GREGORIO BELTRAN	SI / NO		$ 11.919.403,50	3/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
33	MVJE_880	KR 46 82A 25 SUR	RAQUEL GARCIA	SI / NO		$ 11.994.568,91	7/12/2021		EN EJECUCION	0,00%	5,00%
34	MVJE_1007	CR 46 82 15 SUR	ANA LEONOR CELIS DE MARTINEZ	SI / NO		$ 11.833.705,04			VALIDADA	0,00%	0,00%
35	MVJE_244	DG 82 SUR 46 15	JAIRO BERNAL	SI / NO	$ 12.747.835,00	$ 11.871.866,90	**26/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	80,00%	100,00%
36	MVJE_224	KR 46A 82 04 SUR	ALEXANDRA MOLINA RINCON	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.936.322,20	**17/11/2021**	**7/12/2021**	ENTREGADA	80,00%	100,00%
37	MVJE_1049	CL 82 SUR 46A 24	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.924.304,70	**11/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	80,00%	100,00%
38	MVJE_066	CL 82 SUR 46A 30	ERNESTO CARDENAS	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.976.242,30	**11/11/2021**	**3/12/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
39	MVJE_1058	CRA 46A 81 B 09 SUR	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	SI / NO	$ 12.951.330,00	$ 11.966.578,10	**17/11/2021**	**6/12/2021**	ENTREGADA	70,00%	100,00%
40	MVJE_323	KR 46A 81A 10 SUR	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	SI / NO		$ 12.033.843,70	17/11/2021		EN EJECUCION	50,00%	60,00%
41	MVJE_882	CL 81 A SUR 46 A 10	DUMAR ESTIVEN SASTOQUE	SI / NO		$ 11.870.363,71	11/11/2021		EN EJECUCION	60,00%	80,00%
42	MVJE_431	CL 81A SUR 46A 24 MJ	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	SI / NO	$ 12.137.593,00	$ 11.980.238,50	**23/11/2021**	**10/12/2021**	ENTREGADA	60,00%	100,00%
43	MVJE_062	CL 81 SUR 46A 37	PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ	SI / NO		$ 12.002.483,80	23/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	10,00%
44	MVJE_264	CL 80A SUR 46A 17	ALCIRA TEATINO GARCIA	SI / NO	$ 12.580.473,00	$ 11.965.471,00	**11/11/2021**	**25/11/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
45	MVJE_180	CL 80A SUR 46A 36	DAISSY GARZON TAFUR	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 12.037.424,00	**17/11/2021**	**9/12/2021**	ENTREGADA	65,00%	100,00%
46	MVJE_1084	KR 46 82A 26 SUR	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ	SI / NO		$ 11.664.307,10			VALIDADA	0,00%	0,00%
47	MVJE_938	KR 45C 82 45 SUR	NIEVES DURAN IBATA	SI / NO		$ 11.834.538,91			VALIDADA	0,00%	0,00%
48	MVJE_081	KR 45C 82 21 SUR	ESTRELLA WILCHES	SI / NO		$ 11.992.416,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
49	MVJE_1009	DG 81 B SUR 45 B 35	FELIPE DUARTE VARGAS	SI / NO		$ 12.040.766,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
50	MVJE_901	KR 45C 82B 22 SUR	JORGE GERENA TORRALBA	SI / NO		$ 12.029.185,20			VALIDADA	0,00%	0,00%
51	MVJE_1104	KR 45C 82B 10 SUR	MARIA ALICIA LOPEZ CASTILLO	SI / NO		$ 11.629.204,37			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
52	MVJE_1067	CR 45C 82 60 SUR	UBALDINA PALACIOS CASTRO	SI / NO		$ 11.855.696,69			VALIDADA	0,00%	0,00%
53	MVJE_881	KR 45C 82 34 SUR	GLORIA LUZ BLANCO BELLO	SI / NO		$ 11.835.560,70			VALIDADA	0,00%	0,00%

54	MVJE_929	DG 81A SUR 45B 17 MJ	WILLIAM MARTINEZ CUBILLOS	SI NO		$ 11.791.873,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVJE_593	DG 81B SUR 45B 03 MJ	YESID VILLAMIL	SI NO		$ 12.037.811,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
56	MVJE_999	KR 45B 82 05 SUR	MARÍA JUDITH QUIÑONEZ ORTEGA	SI NO		$ 11.793.420,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
57	MVJE_937	KR 45B 82B 09 SUR	RAQUEL VARGAS MORALES	SI NO		$ 11.145.662,84			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
58	MVJE_1024	KR 45B 82B 10 SUR	ALVARO BAEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.764.292,15			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
59	MVJE_1035	KR 45B 82B 04 SUR	DIGNA MARIA ROJAS DE DIAZ	SI NO		$ 11.974.961,85			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
60	MVJE_1118	KR 45 A 82 51 SUR	NANCY OLIVERO	SI NO		$ 11.885.874,64			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
LAS BRISAS											
61	MVJE_767	DG 81A SUR 45B 35	MARIA GENOVEVA AMELINES OCAMPO	SI NO		$ 11.865.448,45			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
JERUSALEN											
62	MVJE_1137	CR 45B 82C 04 SUR	LUZ SILENIA PAN MALDONADO	SI NO		$ 11.936.669,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	17	DEL	6/12/2021	AL	12/12/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

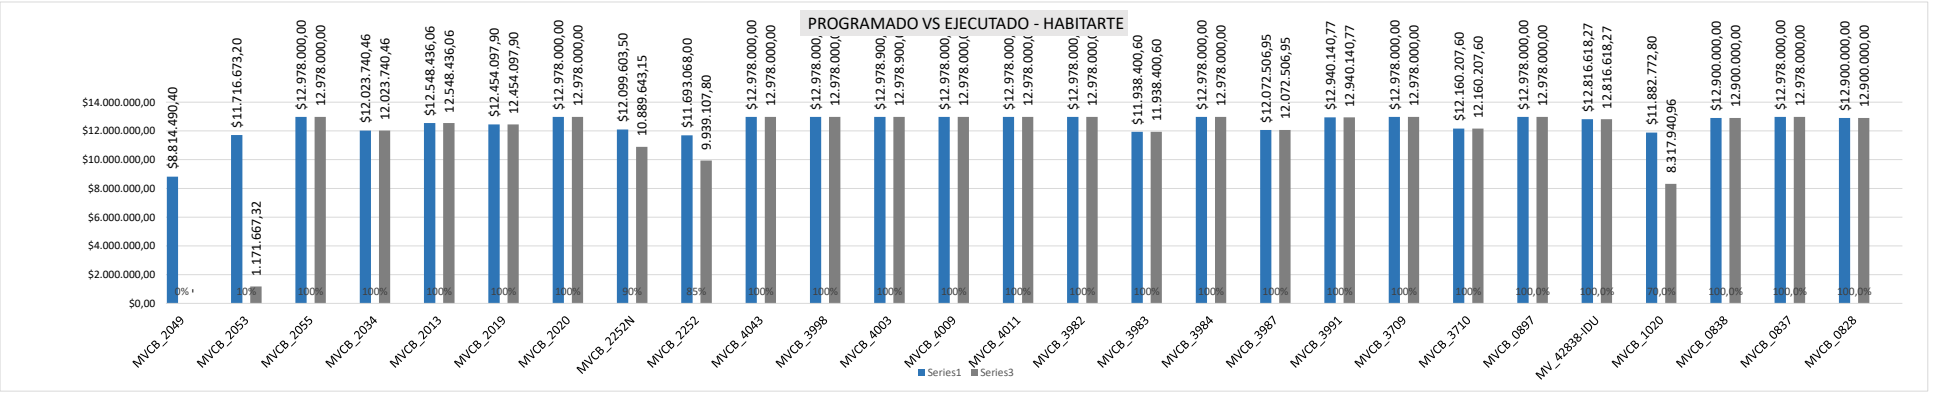

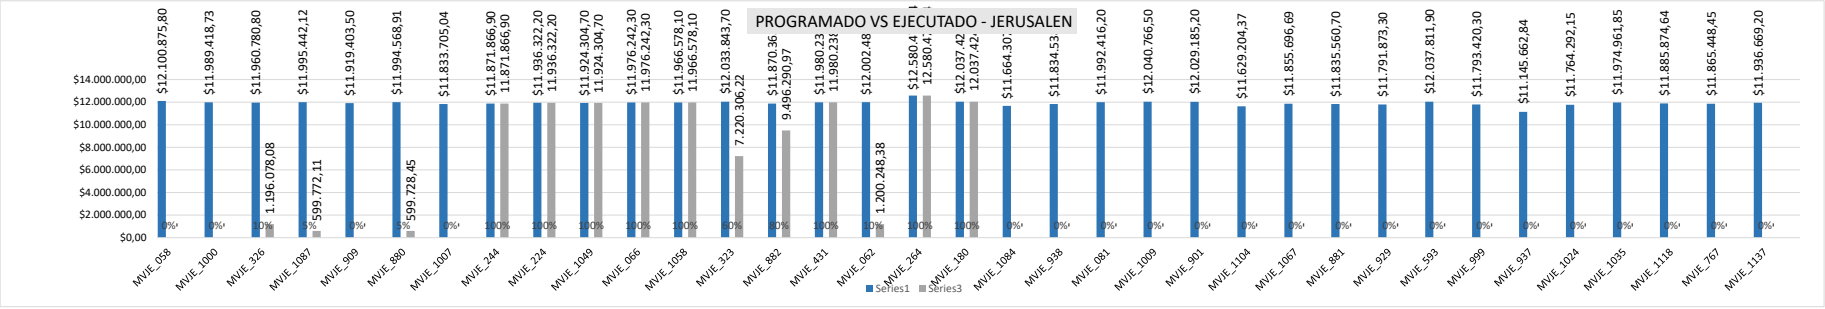

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU

1	MVCB_2053	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en aplicación de estuco en hall, cocina y habitacion 1.
2	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
3	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
4	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 13 de Octubre de 2021.
5	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
6	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II

7	MVCB_2252N	ABIGAIL PARDO	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en construccion de placa, pañete en muro exterior de cocina se inicia instalacion de enchape de pared en cocina 1.
8	MVCB_2252N	CAMPO ELIAS GIL PARDO	Se realiza visita de seguimiento tecnico en la vivienda donde se evidencia avance en pañete de hall de acceso, instalacion de echape de piso en patio y pintura de habitaciones.
9	MVCB_4043	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 26 de Noviembre de 2021.
10	MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 17 de Noviembre de 2021.
11	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 26 de Noviembre de 2021.
12	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 16 de Noviembre de 2021.
13	MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 16 de Noviembre de 2021.

14	MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 2 de Noviembre de 2021.
15	MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 16 de Noviembre de 2021.
16	MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 26 de Noviembre de 2021.
17	MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 10 de Noviembre de 2021.
18	MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 12 de Noviembre de 2021.
19	MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 16 de Noviembre de 2021.
20	MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 22 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
21	MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Octubre de 2021.
22	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Noviembre de 2021.
23	MVCB_1020	ALIX MAYORGA CAGUA	Se realiza visita de seguimiento tecnico en la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso en cocina y escaleras, se inicia actividad de estuco en hall y habitaciones.
24	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Octubre de 2021.
25	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
26	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - POTOSI			
22	MVJE_326	LUZ MARINA SIERRA SIERRA	Se realiza apertura de la vivienda el dia 9 de Diciembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria quien esta de acuerdo con las intervenciones iniciales.
23	MVJE_187	ALONSO OIDOR	Se realiza apertura de la vivienda el dia 9 de Diciembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales al beneficiario quien esta de acuerdo con las intervenciones iniciales.
25	MVJE_880	RAQUEL GARCIA	Se realiza apertura de la vivienda el dia 7 de Diciembre, en la cual se socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria quien esta de acuerdo con las intervenciones iniciales.
28	MVJE_244	JAIRO BERNAL	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 06 de Diciembre de 2021.
29	MVJE_224	ALEXANDRA MOLINA RINCON	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 07 de Diciembre de 2021.
28	MVJE_1049	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 06 de Diciembre de 2021.
30	MVJE_066	ERNESTO CARDENAS	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 03 de Diciembre de 2021.

31	MVJE_1058	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 06 de Diciembre de 2021.
31	MVJE_323	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso y pañete. El beneficiario solicita poder realizar actividad de estuco por parte de el y luego poder continuar con la actividad de pintura, por talmotivo se suspenden actividades desde el dia 10 de Diciembre y se podran retomar el dia 14 de Diciembre para continuar con la intervencion del mejoramiento de vivienda.
3	MVJE_882	DUMAR ESTIVEN SASTOQUE	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso y aplicación de pintura en habitacion hall y sala comedor.
32	MVJE_431	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 10 de Diciembre de 2021.
34	MVJE_062	PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en actividad de pañete en hall y sala.
33	MVJE_264	ALCIRA TEATINO GARCIA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Noviembre de 2021.
34	MVJE_180	DAISSY GARZON TAFUR	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 09 de Diciembre de 2021.
34	MVJE_1084	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ	Se realiza visita de validacion de la vivienda donde se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado, habitaciones y sala. Vivienda con pañete y pisos en mal estado.
34	MVJE_938	NIEVES DURAN IBATA	Se realiza visita de validacion de la vivienda donde se evidencia como prioridad intervencion en dos baños, dos cocinas y habitaciones. Vivienda con pisos en buen estado.
34	MVJE_1009	FELIPE DUARTE VARGAS	Se realiza visita de validacion de la vivienda donde se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado, habitaciones y sala. Vivienda con pisos en mal estado.
34	MVJE_901	JORGE GERENA TORRALBA	Se realiza visita de validacion de la vivienda donde se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado, habitaciones y sala. Vivienda con pañete y pisos en mal estado.
34	MVJE_1067	UBALDINA PALACIOS CASTRO	Se realiza visita de validacion de la vivienda donde se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina y zona de lavado. Vivienda pisos esmaltados.
34	MVJE_881	GLORIA LUZ BLANCO BELLO	Se realiza visita de validacion de la vivienda donde se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina y habitacion. Vivienda pisos esmaltados.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.


Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_4900 JUAN PABLO II - ENTREGA DE VIVIENDA

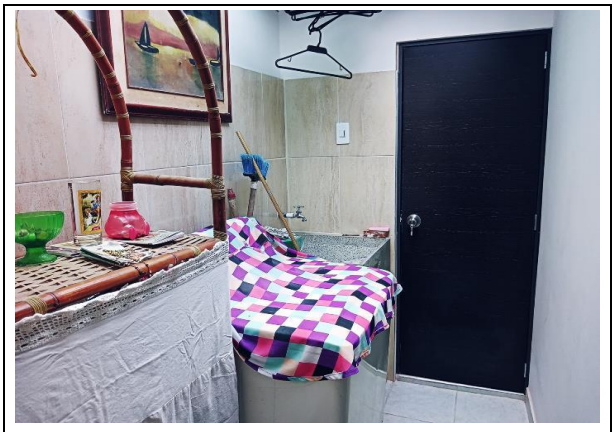

FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la zona de lavandería	




FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final del baño	




FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la alcoba 1	



FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
Vista final de la cocina	

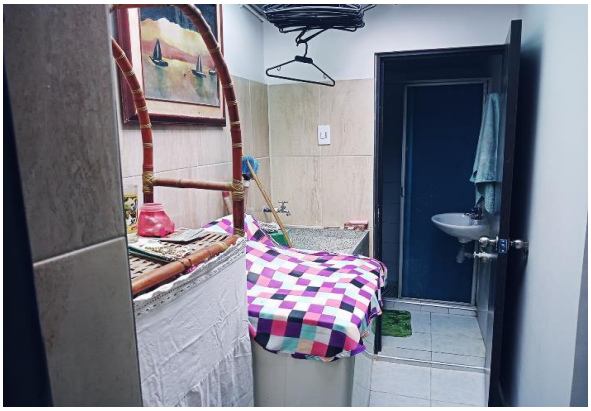


FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Otra vista del estado final de la zona de lavandería	

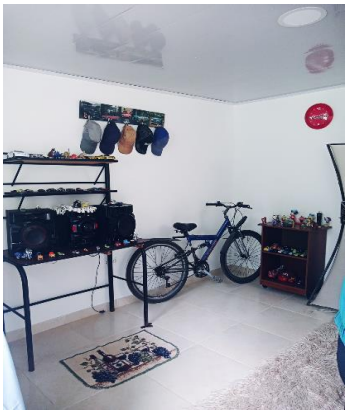


FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la sala comedor	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3885 JUAN PABLO II - AVANCE DE OBRA - CUBIERTA

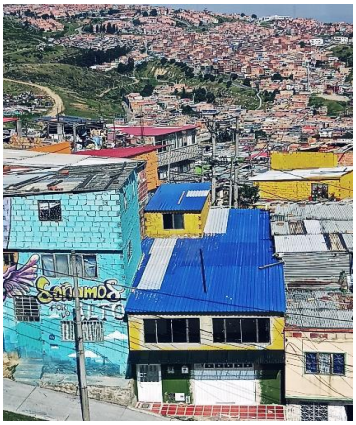

FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Panorámica del avance de obra en cambio de cubierta	

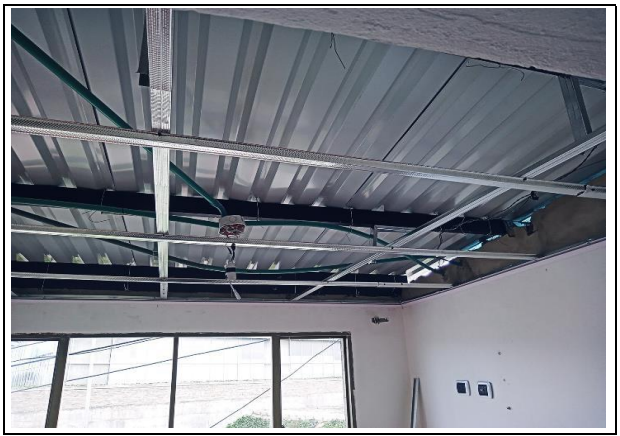

FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Estructura de cielo raso y cubierta en alcoba 1	



FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Instalación de teja arquitectónica y estructura de cielo raso en alcoba 2	



FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
Instalación de teja en cubierta de patio interno	



FECHA	viernes, 10 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Instalación de teja en sala comedor y estructura de cielo raso	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVJE_1068 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en patio interno	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en zona de lavandería	

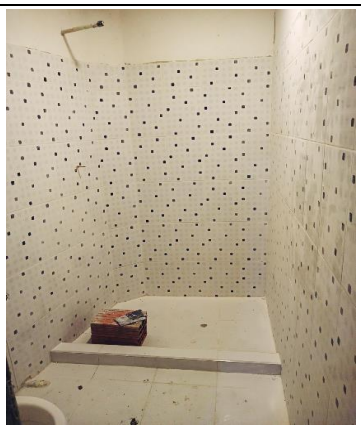


FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en baño	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Avance de obras en área de cocina	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_380 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA

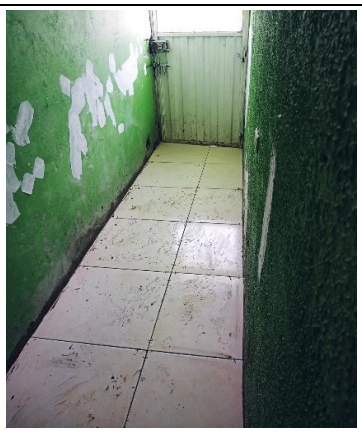

FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de hall de acceso	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en área del bano	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en alcoba 4	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Avance de obras en área de cocina	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_133 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muros e instalación de piso cerámico en la sala comedor	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete y enchape de piso en alcoba 1	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de piso en hall y alcoba 2	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Desmonte de mesón de cocina	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Fundida de placa de contrapiso en zona de lavandería	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de sala comedor	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_359 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en área de cocina	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en zona de lavandería	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Adecuación de baño y pañete de muros	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Avance de obras en alcoba 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_022 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en alcoba 3	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en zona de lavandería	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en hall de alcobas	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Pañete de muros de sala comedor	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_1042 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en alcoba 3	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en área de cocina	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en alcoba 2	

FECHA	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_174 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA




FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en área de cocina	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de piso y vinilo en hall de alcobas	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de piso y vinilo en alcoba 2	

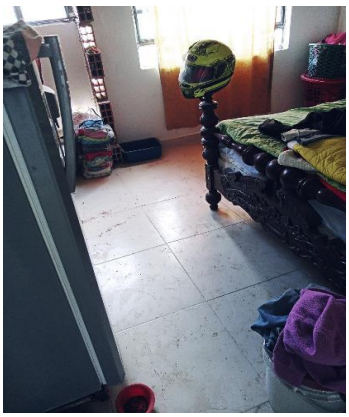


FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Enchape de piso y vinilo en alcoba 1	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_941 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA




FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en área de cocina	

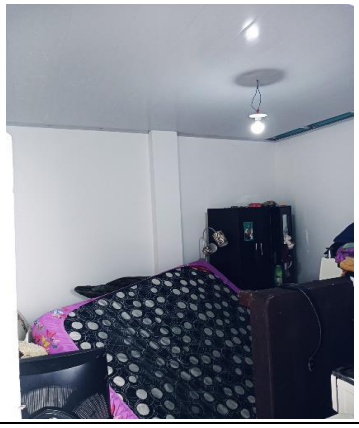

FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Pintura vinilo y cielo raso en alcoba 1	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Pintura vinilo y cielo raso pvc en alcoba 2	

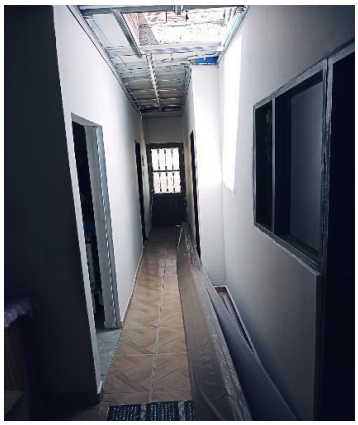

FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Pintura vinilo e instalación de estructura de cielo raso en hall de alcobas	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVJE_942 BARRIO POTOSI - SECTOR JERUSALEN - AVANCE DE OBRA



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de obras en área de cocina	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Estuco y estructura para cielo raso en alcoba 1	

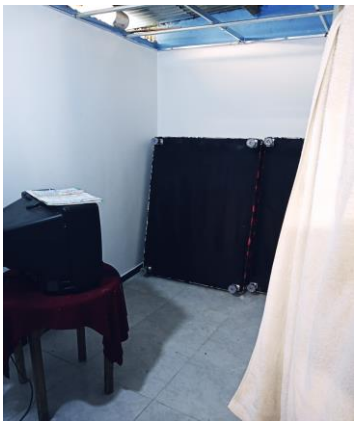

FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
DESCRIPCION	
Estuco y estructura para cielo raso en alcoba 3	



FECHA	martes, 7 de diciembre de 2021
Pintura vinilo e instalación de estructura de cielo raso en sala comedor	

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

Al presente informe no se presentan conflictos.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU, COMPARTIR, POTOSÍ Y JERUSALÉN

7/12/2021 MVJE_901 JORGE GERENA TORRALBA
7/12/2021 MVJE_1067 UBALDIN PALACIOS CASTRO
7/12/2021 MVJE_881 GLORIA LUZ BLANCO
7/12/2021 MVJE_938 NIEVES DURAN IBATA
7/12/2021 MVJE_1084 MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ
9/12/2021 MVJE_1009 FELIPE DUARTE VARGAS
09/12/2021 - MVJE_559 DORIS ROCIO GUAYACÁN BERNAL.
09/12/2021 - MVJE_557: JOSÉ JULIAN ROJAS.


06/12/2021- MVUN_218 ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO,
07/12/2021- MVUN_405 NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ,
07/12/2021- MVUN_443 JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA,
07/12/2021- MVUN_187 DAVID ESTIBEN GUEVARA ,
10/12/2021- MVUN_486 EDUARDO MELO ESPITIA,

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana NO se realizó socialización.

PQR

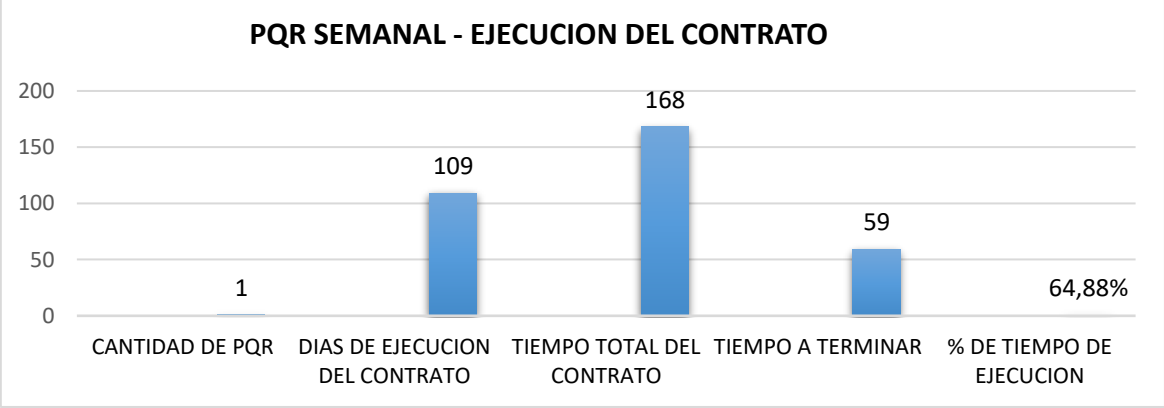

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA	12/12/2021	**PERIODO No.**	17	DEL	**6/12/2021**	AL	**11/12/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU, COMPARTIR, POTOSI Y JERUSALEN

SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE

SOCIALIZACIONES

no se presentaron en el transcurso de la semana

VALIDACIONES REALIZADAS
7/12/2021 **MVJE_901 JORGE GERENA TORRALBA** Se realiza validacion tecnica y social, se diligencia ficha de caracterizacion social
7/12/2021 **MVJE_1067 UBALDIN PALACIOS CASTRO** Se realiza validacion tecnica y social, se diligencia ficha de caracterizacion social
7/12/2021 **MVJE_881 GLORIA LUZ BLANCO** Se realiza validacion tecnica y social, se diligencia ficha de caracterizacion social
7/12/2021 **MVJE_938 NIEVES DURAN IBATA** Se realiza validacion tecnica y social, se diligencia ficha de caracterizacion social
7/12/2021 **MVJE_1084 MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ** Se realiza validacion tecnica y social, se diligencia ficha de caracterizacion social
9/12/2021 **MVJE_1009 FELIPE DUARTE VARGAS** Se realiza validacion tecnica y social, se diligencia ficha de caracterizacion social
09/12/2021 - **MVJE_559 DORIS ROCIO GUAYACÁN BERNAL.** Recibe la visita su hermana autorizada Ingrid Guayacan.
09/12/2021 - **MVJE_557: JOSÉ JULIAN ROJAS. S**e hace validación técnica y social con el beneficiario.
VALIDACIONES FALLIDAS
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE
06/12/2021 **MVJE_065_ROSALBA TELLEZ** _Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Desarrollo _ 207, la señora Rosalba no firma, coloca huella
6/12/2021 **MVJE_295_ HENRY GIRALDO .**Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Desarrollo :POTOSI JERUSALÉN DESAROLLO , 220
06/12/2021 - **MVJE_241: RUBY STELLA JAIMES.** Se realiza Apertura con su hermana autorizada NATALIA JAIMES en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.
06/12/2021 - **MVJE_453: MERLY BELTRÁN AGUDELO.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.
06/12/2021 **MVJE_907 ANA ISABEL GONZALEZ:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
06/12/2021 **MVJE_079 JORGE HUMBERTO TÉLLEZ.**Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
06/12/2021 **MVJE_928 JUAN CARLOS NAVA SALCEDO:** Recibe visita esposa autorizada**. ANA SOFÍA GARZÓN GALINDO,** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
06/12/2021 **MVJE_1016 LUZ DARY GARCIA MORALES:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.
06/12/2021 - **MVJE_010: YOLANDA MENESES.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.
06/12/2021 **MVJE_050 HERSILIA PARRA PEÑA** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
7/12/2021 **MVJE_880 RAQUEL GARCIA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales al encargado del predio
9/12/2021 **MVJE_1087 ALONSO OIDOR** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales al encargado del predio
9/12/2021 **MVJE_326 LUZ MARINA SIERRA SIERRA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales al encargado del predio
09/12/2021 **MVJE_402_LENIS GIOMAR GIRALDO LANCHEROS** _Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Desarrollo :POTOSI JERUSALÉN DESAROLLO , #214
09/12/2021 **MVJE_892_RUTH EDITH LEAL CRUZ** _Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Desarrollo :POTOSI JERUSALÉN DESAROLLO , #215
09/12/2021 **MVJE_545_ LADY ESPERANZA ACOSTA SALDOVAL** .Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Desarrollo :POTOSI JERUSALÉN DESAROLLO , #209
09/12/2021 - **MVJE_162: ELÍAS OSPINA FRANCO.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.
09/12/2021 - **MV_42886_IDU: MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
10/12/2021 **MVJE_ 077 MARÍA MAGNOLIA ARIAS:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados.

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE
no se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE
06/12/2021**MVJE_1006_CAMPO ELIAS CUBIDES BALLEN**_Se realiza seguimiento se evicencian avances en obra , sin novedad por parte del beneficiar**io.**
06/12/2021 - **MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN.** No se evidencia a los maestros realizando actividades la beneficiaria está conforme con la obra
06/12/2021 - **MVJE_356: ANA ROSA SOSA DÍAZ DE GONZÁLEZ.** Se evidencia personal en la obra y conformidad por parte de la señora Ana.
06/12/2021 - **MVJE_405: DIANA PATRICIA AVELLANEDA.** Se evidencia conformidad por parte de la beneficia y se observa que los maestros empezaron labores constructivas .
06/12/2021 - **MVJE_572: FABIOLA GARCÍA DURAN.** Se evidencian maestros ejecutando actividades la beneficiaria está conforme con las actividades
06/12/2021 - **MVJE_573: SANDRA MILENA PRECIADO.** Se evidencian a los maestros encargados; la beneficiaria no se encuentra en el predio
06/12/2021 - **MVJE_429: MARÍA MIRIAM CASTELLANOS .** Se evidencian a los maestros encargados del predio y conformidad por parte de su hijo encargado BORWMAN GONZÁLEZ
06/12/2021 - **MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ.** Se observan a los maestros encargados del predio. La vivienda esta desocupada.
06/12/2021 - **MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ.** Se evidencian a los maestros encargados; la vivienda está desocupada.
6/12/2021 **MVCB_1072 _FLORINDA CADENA NIÑO** se realiza visita de seguimiento con los técnicos y sociales de interventoría ,y contratista se evidencian avances en obra , la beneficiaria manifesta sus inquietudes frente a los acabados de las obras ejecutadas, el equipo técnico realiza aclaraciones. Desarrollo JUAN PABLO II. Número de ejecución .57
6/12/2021 **MVCB_ 2243 _HECTOR EUSTORGIO LOPEZ ,** se realiza visita de seguimiento técnico y social contratista e interventoría, se evidencian avances en acabado de obra .ejecución, Desarrollo JUAN PABLO II. Número de ejecución .94
6/12/2021 **MVJE_1058 LIGIA YINETH RODRIGUEZ S**e realiza seguimiento social y técnico evidenciando avance en las labores de enchape en primer nivel, la beneficiaria no refiere inquietudes.
6/12/2021 **MVJE_1049 JOSE LEONIDAS ZUÑIGA** Se realiza seguimiento social y técnico evidenciando avance en las labores de enchape zona de lavado y cocina, los beneficiarios refieren conformidad con los espacios y la ejecución de las labores.
6/12/2021 **MVJE_244 JAIRO BERNAL** Se realiza seguimiento social y técnico evidenciando avance en las labores de enchapes de piso y ultima mano de pintura, el beneficiarios no refiere inconformidades con las actividades realizadas.
6/12/2021 **MVJE_224 ALEXANDRA MOLINA RINCON** Se realiza seguimiento social y técnico evidenciando avance en enchapes de muros y piso, la beneficiaria refiere conformidad en las labores realizadas en el predio.
7/12/2021 **MVJE_882 DUMAR ESTIVEN SASTOQUE** Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en actividades de enchape de hall, habitación 3 y aplicación de pintura en habitaciones 2, 3 y hall se resuelven dudas a la esposa del beneficiario con respecto al presupuesto inicial en la zona de la cocina, solo se instalara enchape en piso y en la zona de lavado se instalara enchape en muro.
07/12/2021 **MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS.** Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se realiza cambio en bitácora de presupuesto ajustado en actividades solicitadas por la beneficiaria y atendiendo a las inconformidades manifestadas. Se evidencia personal de obra.
07/12/2021 **MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES.** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia terminación de obras, se está a la espera de puerta y rematar actividades solicitadas por el beneficiario. Continúa con inconformidad con la acumulación de escombro. Se informa al componente SISO.
07/12/2021 **MVJE 133 LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades de enchape en sala-comedor. No se reportan dudas y/o inconformidades.
07/12/2021 **MVJE_359 CARMEN ELISA PRADA ABELLO:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal ejecutando actividades. Beneficiaria no expresa dudas y/o inquietudes. Manifiesta conformidad con el personal y avances en obra.
07/12/2021 **MVJE_941 EDGAR ELI SANCHEZ GÓMEZ:** Autoriza hija **Andrea Sánchez Campero**. Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. No se evidencia personal de obra. Beneficiarios expresan inconformidad con el personal por intermitencia en el trabajo y actividades realizadas en habitaciones. Se le brinda orientación que frente a inconformidades no es pertinente dirigirse a los maestros y se recuerda el conducto regulará. Se atiende a solicitud.
07/12/2021 **MVJE_380 JOSE JOAQUÍN ZAMORA LEÓN.** Atiende visita hija autorizada. Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Beneficiaria expresa inconformidad con el personal y actividades. Se brinda aclaración al personal y la beneficiaria del conducto regular para evitar inconvenientes. Se atiende solicitud.
07/12/2021 **MVJE_ 1042 MARÍA LUISA HERNÁNDEZ MONTERO.** Se realiza seguimiento social por parte de interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades de obra. Se terminan actividades en habitación, para despejar áreas y continuar con el mejoramiento. Beneficiaria no expresa dudas y/o inconformidades con los avances.
07/12/2021 **MVJE_ 022 PLACIDIA HERNÁNDEZ MONTERO:** Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de interventoria. No se evidencia personal debido a calamidad doméstica. Sin embargo se evidencia avances y conformidad con las obras.
07/12/2021 **MVJE_251 LUZ AMANDA BUITRAGO:** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria. Se evidencia personal ejecutando actividades. Beneficiaria Expresa conformidad con los avances y personal.

07/12/2021 **MVJE_174 LUZ ESTELA SANCHEZ CORTES**.Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. No se evidencia beneficiaros en el hogar, no es posible encontrar bitácora. Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria para recordar recomendaciones del proyecto. De evidencia que el personal de obra ejecuta obras no contempladas, por tal razón se reporta al contratista para dar solución y continuar obras.

07/12/2021 **MVJE_1068 GERARDO ANTONIO ALFONSO**. Recibe visita esposa autorizada **FABIANNE GAONA.** Se realiza seguimiento social por parte de interventoria. Se evidencia personal ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.

7/12/2021 **MVJE_882 DUMAR ESTIVEN SASTOQUE** Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en labores de pintura en sala comedor e instalación de guarda escoba, se realiza revisión de espacios por parte de interventoríag

07/12/2021 **MVJE_942 JESÚS ANTONIO GARAVITO:** Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria no expresa dudas y/o inconformidades con las obras.

09/12/2021 **MVCB_4842_ GUILLERMO VALENCIA OYOLA ,** SE realiza visita se seguimiento técnico y social interventoría y contratista se evidencian avances en obra Desarrollo :JUan pablo II # ejecución.92

09/12/2021 **MVJE_957_LUZ STELLA AGUILERA**_Se Evidencias avances en obra , sin novedad por parte de la beneficiaria

09/12/2021 - **MVJE_149: LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA.** Se observa personal en la obra; se le recuerda a don Luis seguir el conducto regular para resolver dudas e inquietudes referirse al contratista y a la interventoria.

09/12/2021 - **MVJE_293: ELSA MARÍA MARTÍNEZ.** Se realiza visita técnico- social contratista e interventoría donde se evidencian avances de obra y maestros ejecutando actividades la beneficiaria está conforme con las actividades ejecutadas.

09/12/2021 - **MVJE_624: DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA.** Seguimiento en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos y se evidencia personal en la obra

09/12/2021 - **MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ.** Se observan a los maestros encargados del predio. La vivienda esta desocupada.

09/12/2021 - **MVJE_452: PEDRO JULIO UREÑA**. El beneficiario manifiesta conformidad por los avances constructivos. Se evidencia personal de obra en el predio.

09/12/2021 - **MVJE_573: SANDRA MILENA PRECIADO.** Se evidencian a los maestros encargados; la beneficiaria no se encuentra en el predio

09/12/2021 - **MVJE_010: YOLANDA MENESES.** Seguimiento en el cuál se evidencia personal de obra en el predio y conformidad por parte de la beneficiaria

09/12/2021 - **MVJE_356: ANA ROSA SOSA DÍAZ DE GONZÁLEZ.** Se evidencia personal en la obra y conformidad por parte de la señora Ana.

09/12/2021 - **MVJE_405: DIANA PATRICIA AVELLANEDA.** Se evidencia conformidad por parte de la beneficia y se observa que los maestros empezaron labores constructivas .

09/12/2021 - **MVJE_241: RUBY STELLA JAIMES.** Se hace Seguimientos en el cuál se evidencia personal de obra; no se encuentra la bitácora se hace contacto teléfono con la beneficiaria y se le recomienda dejarla en un sitio visible

09/12/2021 - **MVJE_453: MERLY BELTRÁN AGUDELO.** Se evidencia personal de obra en el predio, la beneficia no se encuentra en el momento; la casa está desocupada

9/12/2021 **MVJE_062 PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ** Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en actividades de pañete en sala comedor y parte de zona de hall, la esposa del beneficiario no refiere dudas con respecto a la ejecución de las labores, se responde en bitácora dudas del beneficiario con respecto al inicio de labores compromiso establecido desde visita para el día 6 de diciembre, fecha en la cual se iniciaron labores de obra.

9/12/2021 **MVJE_1058 LIGIA YINETH RODRIGUE**Z Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en actividades de enchape y pintura, la interventoría realiza revisión de los espacios, la beneficiaria manifiesta estar conforme con el avance de las labores

9/12/2021 **MVJE_323 SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO** Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en actividades de pañete completas y enchape de piso en sala comedor y habitación 2, el beneficiario solicita suspensión de actividades en el predio desde el día 10 y hasta el 12 de diciembre para llevar a cabo labores de estuco en muros, lo cual no se encuentra contemplado en las labores de mejoramiento, se informa que de llevarse a cabo esta actividad no se dará garantía a la actividad de pañete a lo cual el beneficiario presencia conformidad, se reiniciaran labores en el predio el día 13 de diciembre de 2021.

9/12/2021 **MVJE_431 MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS** Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en labores de instalación de cielo raso y pintura de muros, la interventoría revisa espacios en el predio, no se localiza a la hija de la beneficiaria encargada al interior del mismo.

10/11/2021 **MVCB_2252 CAMPO ELIAS GIL PARDO S**e realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en labores de pintura general, se realiza revisión por parte de interventoría y se solicita limpieza de guarda escobas.

10/11/2021 **MVCB_2252N ABIGAIL PARDO** Se realiza seguimiento al predio, se evidencia avance en enchape cocina 1, culminación en labores de placa y pañete en muro externo cocinas, se deja constancia de que a la fecha los beneficiarios no han realizado instalación de tejas por lo cual este pañete no tendrá garantía, debido al incumplimiento del compromiso.

10/11/2021 **MVCB_1020 ALIX MAYORGA GARCIA** Se realiza seguimiento al predio,, se evidencian labores de enchape muros zona de ropas y pañete y pintura en zona de hall y escaleras, la beneficiaria no refiere dudas ni inquietudes con respecto a las labores.

10/12/2021 **MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS:** Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. A solicitud de la beneficiaria se cambiará calibre del metal para flanches, por los tanto se suspenderá la obra hasta que el contratista cumpla con lo solicitado.

10/12/2021 **MVCB_2053 EDWIN ARMANDO VANEGAS** Se realiza seguimiento al predio social y técnico, se evidencia avance en labores de estuco en muros, pintura de estructura para cubierta, la madre del beneficiario no refiere inquietudes y es quien atiende la visita.

RENUNCIAS

SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE

No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana

PQRS
SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE
06/12/2021- **MVUN_218 ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO,** validación sin novedad
07/12/2021- **MVUN_405 NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ,** validación sin novedad
07/12/2021- **MVUN_443 JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA,** validación sin novedad
07/12/2021**- MVUN_187 DAVID ESTIBEN GUEVARA ,** validación sin novedad
10/12/2021**- MVUN_486 EDUARDO MELO ESPITIA,** validación sin novedad
VALIDACIONES FALLIDAS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
APERTURAS
06/12/2021- **MVUN_443 JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA,**Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras socialización de presupuesto a satisfacción de la familia , se realiza entrega de Kit de bioseguridad
06/12/2021- **MVUN_218 ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO,**Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras socialización de presupuesto a satisfacción de la familia , se realiza entrega de Kit de bioseguridad
10/12/2021- **MVUN_405 NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ,**Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras socialización de presupuesto a satisfacción de la familia , se realiza entrega de Kit de bioseguridad
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
06/12/2021- **MVUN_115: TERESA DE JESUS CHACON ,** se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra,la beneficiaria esta conforme con las actividades ejecutadas.
06/12/2021- **MVUN_770: JOSE YECID LAVERDE NIETO,** se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
06/12/2021**-MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, no se evidencian maestros realizando actividades de obra.
06/11/2021-**MVUN_151 SANDRA VIRGINIA CÁRDENAS CONTRERAS**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
06/12/2021- **MVUN_222 RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
10/12/2021- **MVUN_205 MARÍA DELIA GUAPO VANEGAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra.
10/12/2021**- MVUN_106 CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra.

10/12/2021**- MVUN_391 IMELDA RODRIGUEZ** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra.
10/12/2021-**MVUN_166 OLGA LICIA VEGA RODRIGUEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
PQRS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
PAC CIUDAD BOLIVAR
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, se da por cerrado el PAC Ddesde el dia 20 de noviembre no se prestara mas atencion, ya que se aperturara el PAC EN JERUSALEN; Se crea grupo de whatsaap para las viviendas que quedan aperturadas en juan pablo y compartir con el fin de dar solucion a las inquietudes que presnten los beneficiarios.
PAC UNIR
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Calle 75 #119-26, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 15 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 17 DEL 06 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Imagen

DESARROLLO UNIR II		
VALIDACIONES		
Validación. MVUN_486 EDUARDO MELO ESPITIA.Desarrollo UNIR II	**Validación. MVUN_218 ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO, Desarrollo UNIR II**	**Validación. MVUN_405 NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ.Desarrollo UNIR II**
		
Validación. MVUN_443 JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA.Desarrollo UNIR II	**Validación. MVUN_187 DAVID ESTIBEN GUEVARA.Desarrollo UNIR II**	
		

APERTURAS DE VIVIENDA UNIR		
Apertura de vivienda.MVUN_443 JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA.Desarrollo UNIR II	**Apertura de vivienda. MVUN_218 ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO. Desarrollo UNIR II**	**Apertura de vivienda.MVUN_405 NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ. Desarrollo UNIR II**
		
SEGUIMIENTOS		
Seguimiento de obra.MVUN_222 RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO. Desarrollo UNIR II	**Seguimiento de obra.MVUN_132: GRACIELA ESPITIA MORALES. Desarrollo UNIR II. Desarrollo UNIR II**	**Seguimiento de obra.MVUN_151.SANDRA VIRGINIA CÁRDENAS CONTRERAS. Desarrollo UNIR II**
		

Seguimiento de obra.MVUN_391 IMELDA RODRÍGUEZ,Desarrollo UNIR II	**Seguimiento de obra. MVUN_205 MARÍA DELIA GUAPO VANEGAS, Desarrollo UNIR II**	**Seguimiento de obra. MVUN_166 OLGA LUCÍA VEGA RODRÍGUEZ.Desarrollo UNIR II**
		
Seguimiento de obra.MVUN_770: JOSE YECID LAVERDE NIETO. Desarrollo UNIR II	**Seguimiento de obra.MVUN_106 CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ.. Desarrollo UNIR II**	**Seguimiento de obra. MVUN_115: TERESA DE JESUS CHACON. Desarrollo UNIR II**
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	22/10/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_017	DORIS RAMOS TORRES	UNIR II																				
MVUN_099	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/11/2021																
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	1/12/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021																
MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_151	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/11/2021																
MVUN_160	HERNANDO ROJAS RINCON	UNIR II																				
MVUN_171	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	4/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	UNIR II																				
MVUN_186	MARGARITA ALFONSO MORENO	UNIR II																				

MVUN_196	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	UNIR II																				
MVUN_205	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/12/2021															
MVUN_222	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/112021															
MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_332	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	UNIR II																				
MVUN_334	JULIO DIAZ TORRES	UNIR II																				
MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	UNIR II	RENUNCIA																			RENUNCIA, Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria quién asegura que renuncia al subsidio ya que vendo su predio, se realizaron los respectivos seguimientos del caso y firma de los documentos pertinentes de la renuncia.
MVUN_374	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	UNIR II																				
MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/11/2021															

MVUN_391	IMELDA RODRIGUEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/11/2021																
MVUN_397	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	UNIR II																				
MVUN_398	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	UNIR II																				
MVUN_405	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/12/2021																
MVUN_416	RICARDO CARDENAS GARCIA	UNIR II																				
MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X									
MVUN_443	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021																
MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	UNIR II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/11/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X									
MVUN_469	JUVENAL MELO PINZON	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	O4/11/2021	SI	SI	X			X									
MVUN_480	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	UNIR II																				
MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X									
MVUN_486	EDUARDO MELO ESPITIA	UNIR II																				
MVUN_492	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	UNIR II																				

MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	UNIR II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021																
MVUN_770	JOSE YECID LAVERDE NIETO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021																
MVUN_187	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	UNIR II																					
MVUN_218	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021																
MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021																
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_2411	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021																
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	5/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021	14/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_4929	PEDRO PABLO SALAMANCA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras, vivienda aperturada solo por el contratista(cubierta)	12/10/2021	12/11/2021	SI	SI	x			x									
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	8/11/2021	SI	SI	x			x									
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021	17/11/2021	SI	SI	x			x									

MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	15/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	25/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	26/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4043	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	18/11/2021	26/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021	12/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/11/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021	29/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	26/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	23/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	9/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	2/11/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2053	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/11/2021																
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	2/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2252	CAMPO ELIAS GIL PARDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/11/2021																
MVCB_2252N	ABIGAIL PARDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/11/2021																
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021	7/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021	22/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3798	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	22/10/2021	17/11/2021	SI	SI	x			x								
MVCB_3809	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3863	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4009	FLORALBA CORTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X				Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La beneficiaria manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.	MVCB_4009 FLORALBA CORTES Se hace entrega de documento respuesta en el cual se informa que el caso no cuenta con las pruebas suficientes para dar una respuesta afirmativa, la señora se niega a firmar el recibido, los allí presentes firman en constancia y se toma registro fotográfico.	12 DIAS HABILES	SI	
MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	15/102021	SI	SI	X			X								
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/10/2021	11/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	30/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	25/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19-oct	SI	SI	X			X								
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021	25/10/2021	SI	SI	x			x								
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021	29/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_1072	FLORINDA CADENA NINO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/201	9/12/2021	SI	SI	X			x								
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	8/11/2021	SI	SI	x			x								
MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	3/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	10/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021	30/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021	10/12/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	13/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X		SI									
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4968	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	ACACIAS - IV	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/11/2021	10/12/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/10/2021	12/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021	2/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	10/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	25/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	11/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021	12/11/2021	SI	SI	X			X								

MVUN_166	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	Unir II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	2/12/2021																
MVUN_201	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	Unir II																				
MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Unir II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	2/12/2021	SI	SI	X			x								
MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021	2/11/2021	SI	SI	X			X								
MV_42886-IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021																
MVCB_3803	LUZ DARY SAENZ CAPERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021	17/11/2021	SI	SI	X			x								
MVCB_3839	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	12/11/2021	SI	SI	X			x								
MVCB_1020	ALIX MAYORGA CAGUA	URBANIZACIO N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	1611/2021																
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/09/2021	12/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	URBANIZACIO N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	9/11/2021	SI	SI	X			x								
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	11/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	11/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	7/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	29/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	16/11/2021	SI	SI	X			x								
MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	2/11/2021	17/11/2021	SI	SI	x			x								
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	14/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3822	SORY INES CORTES LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	11/11/2021	SI	SI	X			x								Quien aparece como beneficiaria del mejoramiento de vivienda es la hija de la propietaria quein presenta discapacidad cognitiva -no registra firma de acuerdo a documento de identidad, se realiza documentación pertinente para quien este apoderada sea la señora Clara , se adjuntna cartas de autorización , certificación medica como constancia de discapacidad de la hija de la señora clara.
MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	25/11/2021															
MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	12/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	7/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/11/2021	3/12/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4838	YENNY ARLET AREVALO PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021	8/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4842	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	26/11/2021															
MVCB_4843	MARISOL PALACIOS ANDRADE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021	12/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4892	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/11/2021	26/11/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_010	YOLANDA MENESES	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVJE_022	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	22/11/2021															
MVJE_032	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/11/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_062	PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/11/2021															

MVJE_066	ERNESTO CARDENAS	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/11/2021	3/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_077	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/12/2021															
MVJE_079	JORGE HUMBERTO TELLEZ PEÑA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVJE_133	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	26/11/2021															
MVJE_149	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/12/2021															
MVJE_180	DAISSY GARZON TAFUR	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021	9/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_224	ALEXANDRA MOLINA RINCON	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021	7/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_275	DIANA BELEN HERNANDEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/11/2021	2/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_293	ELSA MARIA MARTINEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	19/11/2021															
MVJE_323	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVJE_356	ANA ROSA SOSA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	2/12/2021															
MVJE_359	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/11/2021															
MVJE_380	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															

MVJE_405	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	1/12/2021																
MVJE_431	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/11/2021	10/12/2021	SI	SI	X			X									
MVJE_011	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/11/2021	3/12/2021	SI	SI	X			X									
MVJE_050	HERSILIA PARRA PEÑA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021																
MVJE_065	ROSALBA TELLEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021																
MVJE_174	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	22/11/2021																
MVJE_233	ODALINA ARDILA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	1/12/2021																
MVJE_244	JAIRO BERNAL	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	26/11/2021	7/12/2021	SI	SI	X			X									
MVJE_247	WILLIAM HUMBERTO ARIAS	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	19/11/2021																
MVJE_264	ALCIRA TEATINO GARCIA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/11/2021	25/11/2021	SI	SI	X			X									
MVJE_295	HENRY GIRALDO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021																
MVJE_402	LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021																
MVJE_545	LADY ESPERANZA ACOSTA SANDOVAL	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021																

MVJE_573	SANDRA MILENA PRECIADO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/11/2021															
MVJE_251	LUZ AMANDA BUITRAGO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVJE_452	PEDRO JULIO UREÑA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVJE_358	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/11/2021															
MVJE_453	MERLY BELTRAN AGUDELO	JERUSALÉN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVCB_2243	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/10/2021	9/12/2021	SI	SI	X			x								
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	27/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	15/102021	SI	SI	X			X								

MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	12/11/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_429	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	JERUSALEN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_572	FABIOLA GARCIA DURAN	JERUSALEN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_162	ELIAS OSPINA FRANCO	JERUSALEN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021															
MVJE_243	MARIA DE JESUS GARAVITO GARCIA	JERUSALEN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	18/11/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_254	MARIA HILDA GUAQUETA GONZALEZ	JERUSALEN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/11/2021															
MVJE_574	LUÍS ARMANDO SANABRIA	JERUSALEN	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/12/2021															
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	11/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021	9/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	11/10/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	13/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	13/10/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_241	RUBY STELLA JAIMES	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVJE_110	RIGOBERTO OSMA ARMERO	POTOSÍ	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/11/2021															
MVJE_1006	CAMPO ELIAS CUBIDES BALLEN	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/11/2021															
MVJE_1007	ANA LEONOR CELIS DE MARTINEZ	POTOSÍ																				
MVJE_1016	LUZ DARY GARCÍA MORALES	POTOSÍ	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVJE_1042	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	22/11/2021															
MVJE_1049	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	POTOSÍ	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/11/2021	9/12/2021	SI	SI	x			x								
MVJE_1058	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								

MVJE_1068	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVJE_326	LUZ MARINA SIERRA SIERRA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021															
MVJE_882	DUMAR ESTIVEN SASTOQUE	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/11/2021															
MVJE_892	RUTH EDITH LEAL CRUZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021															
MVJE_907	ANA ISABEL GONZALEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVJE_909	JOSE GREGORIO BELTRAN	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/12/2021															
MVJE_928	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/12/2021															
MVJE_941	EDGAR ELI SANHEZ GOMEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	26/11/2021															
MVJE_942	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/11/2021															
MVJE_957	LUZ STELLA AGUILERA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/11/2021															
MVJE_962	RAUL MUÑOZ RODRIGUEZ	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVJE_880	RAQUEL GARCIA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/12/2021															

MVJE_985	ANGELA SUAREZ RAMOS	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021															
MVJE_1087	ALONSO OIDOR	POTOSÍ	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/12/2021															
MVJE_1148	LUIS EDUARDO JIMENEZ VERA	POTOSÍ	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	17/11/2021	6/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_351	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/11/2021	1/12/2021	SI	SI	X			X								
MVJE_624	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA	POTOSI	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/12/2021															
MVJE_604	NADIA VIVIANA BOHORQUEZ ORTIZ	POTOSÍ	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/11/2021															

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TCO	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICTUD				DESCRIPCION DEL ASUNTO Y/O SITUACION	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1		4009	03/112021		FLOR ALBA CORTES	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2029	JUAN PABLO II	CRA 18Q BISA 66A 67 SUR	3206568881			X		Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La beneficiaria manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.		Se realiza seguimiento	Se recomienda a la beneficiaria estar pendiente de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones iniciales entre las que estaban el cuidado de sus objetos personales y de valor. Se realiza seguimiento a la PQRS interpuesta; de igual manera se informa a la beneficiaria que el caso será llevado a comité.	MVCB_4009 FLORALBA CORTES Se hace entrega de documento respuesta en el cual se informa que el caso no cuenta con las pruebas suficientes para dar una respuesta afirmativa, la señora se niega a firmar el recibido, los allí presentes firman en constancia y se toma registro fotográfico.		*x*
2																					

NOTA

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 116 días después de la firma del acta de inicio por el contratista.

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 17. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras, así como de las viviendas que se encuentran en ejecución.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	6/12/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	17
HASTA	12/12/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de lo realizado
1. Acompañamiento y seguimiento a la Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Entrega de Kits durante las nuevas aperturas para beneficiario y trabajadores, charlas de Divulgación de protocolo de Bioseguridad con apoyo del personal Social. Con los seguimientos de Bioseguridad se realiza recarga de Kit de personal Operativo, que fuesen necesarias.
3. Se hace entrega de soportes de Bioseguridad del Corte 2.
4. En las visitas de seguimiento de los MV, se realizó charla de seguridad uso obligatorio de EPP (tapabocas) al personal operativo y se les refuerza Protocolo de Bioseguridad.
5. Durante las entregas de Viviendas, se deja constancia firmada de recibido sin escombro, por parte del área SST, las cuales hacen parte de los soportes de las viviendas. Así mismo se entrega la Señalética de Bioseguridad, dejando evidencia fotográfica.
6. Implementación del procedimiento para trabajo en la instalación de cubiertas. El coordinador de alturas está pendiente de la realización de trabajos; no se han presentado novedades en el desarrollo de esta actividad. No se han realizado actividades en alturas superiores a 1.50 en las cubiertas instaladas a la fecha.
7. En el plan de trabajo No se evidencian exámenes médicos e inducciones, del personal operativo porque no hubo ingresos durante la semana.

INTERVENTORIA

Se realiza seguimiento a las viviendas en los sectores del proyecto verificando que cuenten con su dotación, EPP y kit de bioseguridad completo de no ser así que se realice su reposición, de igual manera, se verifica en las nuevas aperturas. En el momento hay tres zonas en trabajo paralelo Unir, Jerusalén y Juan pablo donde se continúan con apertura, ejecución y entregas.

Se ha verificado las actividades de desmonte, revisión y mejoras de estructura e instalación de teja arquitectónica, revisando que se haga de manera correcta según el procedimiento además de revisar que tengan los EPP y dotación con las herramientas correctas para la actividad, no se han presentado eventos adversos. Se viene cumpliendo el procedimiento frente a este proceso de desmonte e instalación de cubierta y se complementará el seguimiento cuando el plan de trabajo supere el 1.5m.

Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto de los kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, se verifica que se haga la recarga del kit de bioseguridad de los trabajadores en las casas que ya se agotó y se deja evidencia del mismo.

Por parte SST de interventoría se realiza charla sobre 5 pasos para el uso de las herramientas manuales, y se continua la recarga de kit de bioseguridad al personal de interventoría.

Se verifica que, las viviendas entregadas no presenten escombros y que se realice la entrega de los afiches del correcto lavado de manos y clasificación de residuos con las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde).

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron y se reciben los soportes entregados de afiliación a seguridad social de dos personas que ingresaron, hasta la fecha permanecen 6 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y cuenta con afiliaciones al día.

Se recalca siempre en las reuniones el tema de riesgo público en especial por la época decembrina.

2. CAPACITACION contratista

Riesgo publico
Inducciones
Divulgacion protocolo de bioseguridad

2.1 CAPACITACION Interventoría

Se realiza charla sobre desordenes musculo esqueléticos para Aprender a proteger la espalda

3. Gestión Ambiental

Se verifica que en las entregas de MV se haya recogido el escombro y se haga entrega de las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde).
En la semana hubo disposicion de escombros, se recibe copia de vale
Se utiliza la escombrera Cemex para disposición de residuos, en la escombrera San Antonio solamente se ha dispuesto un viaje.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**0**		
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**12**	Escombrera Cemex	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**78**	Escombrera Cemex- san Antonio	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

• Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las Aperturas de Vivienda, se hace el seguimiento a los beneficiarios y maestros.
• En las visitas a los MV se refuerza el tema de Bioseguridad y se hacen charlas SST
• Seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros y recargas si fuese necesario.
• Se refuerza al personal operativo con la charla sobre Uso obligatorio de EPP (tapabocas).
• Actualmente se cuenta con 6 personas extranjeras activas
• En las entregas programadas se verifica, que las viviendas estén libres de escombros
• El personal que ingresa cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona.


4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**5472**	10,75	3,50	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**16320**	31,25	10,50	**2016**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**66720**	285,85	64,67	**10784**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico	
CHARLA DE SEGURIDAD	**ENTREGA DE DOTACIONES PERSONAL OPERATIVO**
	 
MVJE 624	**MVJE 453**
VERIFICACION DEL USO DE EPP	**ENTREGA DE EPP PERSONAL OPERATIVO**
	
MVJE 880	**MVJE 1049**

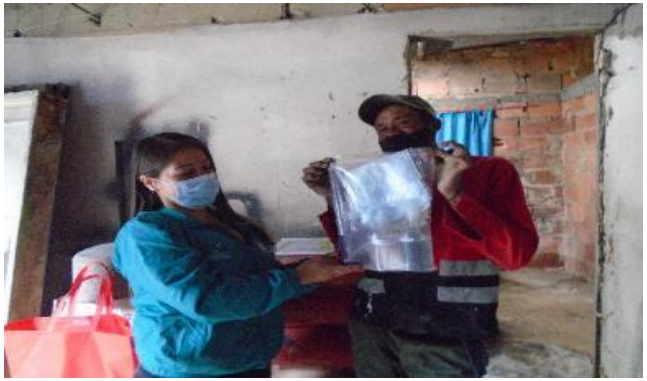PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT TRABAJADOR MVJE 149	DIVULGACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIA MVJE 359
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA	
	
DIVULGACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD MVJE 293	RECARGA KIT TRABAJADORES MVJE 326

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	114	5472	0,0	0,0		0,00	0,00	10,75	0,00	**10,75**			0	0						
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	**3,50**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
				128	**6144**	**0**	**0**	**0,0**	**3,50**	**0,00**	**10,75**	**0,00**	**14,25**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	6.144
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	18.336
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	77.504
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	14,25
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	41,75
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	350,52

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	12
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	78
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CHARLA RIESGO PUBLICO. DIVULGACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INDUCCIONES				
	MVJE 149	MVJE 604	MVJE 574	MVJE 907

Se realiza charla sobre 5 pasos para el uso de las herramientas manuales				
	CHARLA DE SEGURIDAD			

INFORME SISO - SEGURIDAD SOCIAL

SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021	0		FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		0	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		0	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		0	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	
24	WILLIAM MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		0	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		0	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		0	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		0	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		0	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		0	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		0	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		0	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		0	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		0	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		0	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		0	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		SI	
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		0	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		0	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		0	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		0	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		0	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA		SI	
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		0	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA		SI	
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		0	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA		SI	
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		0	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA		SI	

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
106	ANDRES COBA	3.734.768	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	25/10/2021	26/10/2021		0	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		SI	
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	25/10/2021	26/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	25/10/2021	26/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	25/10/2021	26/10/2021		0	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		SI	
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
115	DAVID PUENTES	804.533.177	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		0	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA		SI	
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	30/10/2021	2/11/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	30/10/2021	2/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	30/10/2021	2/11/2021		0	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA		SI	
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	30/10/2021	2/11/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	30/10/2021	2/11/2021		0	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	30/10/2021	2/11/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	30/10/2021	2/11/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	30/10/2021	2/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	30/10/2021	2/11/2021		SI	EPS SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	30/10/2021	2/11/2021		SI	PORVENIR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
144	STEVEN NOVA	10.124.483.497	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
145	RAFAEL MONTILLA	1.043.613.599	5/11/2021	8/11/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
146	DIEGO CANIZALEZ	1.013.689.088	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
147	JOSE MARTINEZ	79.920.132	5/11/2021	8/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
148	JOSE RUIZ	1.033.750.096	5/11/2021	8/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
149	MIGUEL MORALES	1.033.736.505	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
150	WILLY HERAZO	1.051.362.748	5/11/2021	8/11/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	
151	JHON DIAZ	1.002.067.469	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
152	GUILLERMO VALENCIA	12.270.044	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
153	JOSE CAÑON	1.010.199.482	5/11/2021	8/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
154	LUIS CARLOS SANCHEZ	1.104.011.487	19/11/2021	22/11/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
155	RAMON MOLANO	91.107.563	19/11/2021	22/11/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
156	ULDARICO PRIETO CARVAJAL	17.627.361	19/11/2021	22/11/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
157	WILLIAM ARIAS	80.063.977	25/11/2021	29/12/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
158	JOSE RAVELO	79.769.383	25/11/2021	29/12/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	101	0	0	0	114	44	

INFORME SISO

SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	0
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
24	WILLIAM MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	0	SI		0	SI	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	0	SI		0	SI	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	0	SI		0	SI	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	0	SI		0	SI	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	6/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	19/10/2021	0	0	SI		0	SI	0
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	12/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	25/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	4/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	21/12/2020	0	0	SI		0	SI	0
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	2/11/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	2/11/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	2/11/2021	21/10/2021	0	0	SI		0	SI	0
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	2/11/2021	29/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	2/11/2021	28/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	2/11/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	2/11/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	2/11/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	2/11/2021	20/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	2/11/2021	27/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	2/11/2021	13/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	2/11/2021	29/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
144	STEVEN NOVA	10.124.483.497	8/11/2021	24/02/2021	0	SI	SI		SI	0	0
145	RAFAEL MONTILLA	1.043.613.599	8/11/2021	6/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
146	DIEGO CANIZALEZ	1.013.689.088	8/11/2021	19/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
147	JOSE MARTINEZ	79.920.132	8/11/2021	28/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
148	JOSE RUIZ	1.033.750.096	8/11/2021	16/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
149	MIGUEL MORALES	1.033.736.505	8/11/2021	15/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
150	WILLY HERAZO	1.051.362.748	8/11/2021	2/07/2021	0	0	SI		0	SI	0
151	JHON DIAZ	1.002.067.469	8/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
152	GUILLERMO VALENCIA	12.270.044	8/11/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
153	JOSE CAÑON	1.010.199.482	8/11/2021	22/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
154	LUIS CARLOS SANCHEZ	1.104.011.487	22/11/2021	16/11/2021	0	SI	SI		SI	0	0
155	RAMON MOLANO	91.107.563	22/11/2021	10/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
156	ULDARICO PRIETO CARVAJAL	17.627.361	22/11/2021	16/11/2021	0	SI	SI		SI	0	0
157	WILLIAM ARIAS	80.063.977	29/12/2021	2/12/2021	0	SI	SI		SI	0	0
158	JOSE RAVELO	79.769.383	29/12/2021	2/12/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**101**	**158**	**0**	**114**	**44**	

INFORME SISO COVID

SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	0
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
24	WILLIAM MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	0	SI		0	SI	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	0	SI		0	SI	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	0	SI		0	SI	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	0	SI		0	SI	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	6/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	19/10/2021	0	0	SI		0	SI	0
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	12/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	25/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	4/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	21/12/2020	0	0	SI		0	SI	0
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	2/11/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	2/11/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	2/11/2021	19/10/2021	0	0	SI		0	SI	0
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	2/11/2021	21/10/2021	0	0	SI		0	SI	0
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	2/11/2021	29/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	2/11/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	2/11/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	2/11/2021	8/09/2021	0	0	SI		0	SI	0
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	2/11/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	2/11/2021	27/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	2/11/2021	13/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
144	STEVEN NOVA	10.124.483.497	8/11/2021	29/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
145	RAFAEL MONTILLA	1.043.613.599	8/11/2021	6/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
146	DIEGO CANIZALEZ	1.013.689.088	8/11/2021	19/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
147	JOSE MARTINEZ	79.920.132	8/11/2021	28/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
148	JOSE RUIZ	1.033.750.096	8/11/2021	16/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
149	MIGUEL MORALES	1.033.736.505	8/11/2021	15/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
150	WILLY HERAZO	1.051.362.748	8/11/2021	2/07/2021	0	0	SI		0	SI	0
151	JHON DIAZ	1.002.067.469	8/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
152	GUILLERMO VALENCIA	12.270.044	8/11/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
153	JOSE CAÑON	1.010.199.482	8/11/2021	22/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
154	LUIS CARLOS SANCHEZ	1.104.011.487	22/11/2021	16/11/2021	0	SI	SI		SI	0	0
155	RAMON MOLANO	91.107.563	22/11/2021	10/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
156	ULDARICO PRIETO CARVAJAL	17.627.361	22/11/2021	16/11/2021	0	SI	SI		SI	0	0
157	WILLIAM ARIAS	80.063.977	29/12/2021	2/12/2021	0	SI	SI		SI	0	0
158	JOSE RAVELO	79.769.383	29/12/2021	2/12/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**101**	**158**	**0**	**114**	**44**	

SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021					
	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
5	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
6	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
7	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
8	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
10	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021**	**PERIODO**	**MES 4**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E	E	E	E			E	E	E		E	E						
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E						
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E			E	E	E		E	E						
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Verificacion diaria de los elementos de bioseguridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E			E				E				E								
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Entrega y seguimiento de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
									E				E				E								
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS						FECHA		SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021								PERIODO			MES 4				
PLAN DE TRABAJO SG SST			AÑO 2021																					
ACTIVIDAD	RESPONSABLE		Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
			0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Inspección pulidoras	Contratista	P								P				P				P				P				P
		E								E				E				E								
Inspección botiquin	Contratista	P								P	P			P				P				P				P
		E								E	E			E				E								
Recogida de escombros	Contratista	P								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E								E		E	E	E	E	E	E	E	E	E						
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista	p						P	P	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
		E						E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E						
diligenciamiento del formato recogida de escombro(final entrega de vivivenda)	Contratista	p										p		p				p				p				p
		E										E		E				E								
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista	P							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
		E							E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E					
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista																									
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista	P					P									P										
		E					E									E										
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																										
P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	12	17	14	14	13	18	13	14	13	18	13	13	13	18	12	12	12	14
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	11	17	13	14	10	15	13	14	13	16	13	13	8	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	92,86%	100,00%	76,92%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	88,89%	100,00%	100,00%	61,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		96,55%		96,43%		80,65%		100,00%		93,55%		100,00%		25,81%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				97,96%				88,14%				96,55%				59,65%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	70,57%																							

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE DOTACIONES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
10		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	VERIFICACION DE USO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
149		



ALMACEN	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD NORMAS DE TRANSITO PERSONAL ALMACEN SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
POTOSI		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD PERSONAL OPERATIVO SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
295		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
909		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
1016		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD PERSONAL OPERATIVO SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
881		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	VERIFICACION DE USO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
241		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
880		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
909		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA USO DE DOTACION Y EPP,S COMPLETOS SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
149		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA USO DE DOTACION Y EPP,S COMPLETOS SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
241		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE REALIZA SEGUIMIENTO KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
295		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE REALIZA SEGUIMIENTO KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
358		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE REALIZA SEGUIMIENTO KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
62		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE REALIZA SEGUIMIENTO KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
293		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE USO OBLIGATORIO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
293		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE USO OBLIGATORIO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
456		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE USO OBLIGATORIO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
241		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE USO OBLIGATORIO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
251		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE USO OBLIGATORIO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
293		



MVJE	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE USO OBLIGATORIO DE EPP SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2021
456		
