

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	**0**	**reprogramacion Mebog 3 v19**	**200.67 sem.**	**lun 31/12/18**	**sáb 17/12/22**	**$ 137,367,235,164.36**
1	1	Inicio de obra	0 sem.	lun 14/01/19	lun 14/01/19	$ 0.00
2	**2**	**EJECUTADO**	**92 sem.**	**lun 31/12/18**	**sáb 14/11/20**	**$ 52,437,864,067.90**
113	**113**	**CUARENTENA COVID 19**	**0 sem.**	**vie 20/03/20**	**mar 21/04/20**	**$ 0.00**
122	**122**	**Auditorio Frente 1**	**67.67 sem.**	**lun 9/11/20**	**jue 24/02/22**	**$ 9,635,620,736.28**
190	**190**	**Atrio frente 2 y 3 (discriminado por pisos)**	**67.67 sem.**	**lun 9/11/20**	**jue 24/02/22**	**$ 29,431,254,031.64**
309	**309**	**Plataforma frente 4**	**67.5 sem.**	**lun 9/11/20**	**mié 23/02/22**	**$ 5,535,547,260.05**
367	**367**	**Exteriores**	**73 sem.**	**lun 9/11/20**	**sáb 2/04/22**	**$ 6,157,777,282.44**
388	**388**	**Hitos del flujo de fondos**	**154.83 sem.**	**lun 31/12/18**	**vie 28/01/22**	**$ 2,202,056,207.61**
395	395	Aseo general de obra	58 sem.	lun 9/11/20	mié 29/12/21	$ 378,819,000.00
396	396	Fin de obra	0 sem.	sáb 2/04/22	sáb 2/04/22	$ 0.00
397	**397**	**PROGRAMA MODIFICATORIO 11 y 12**	**31.51 sem.**	**lun 19/07/21**	**jue 24/02/22**	**$ 0.00**
482	**482**	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**71.83 sem.**	**lun 19/07/21**	**lun 5/12/22**	**$ 0.00**
483	483	INICIO TRAMITES OBTENCION SERVICIOS PUBLICOS	0 sem.	lun 19/07/21	lun 19/07/21	$ 0.00
484	**484**	**Tramites para servicios de EAAB**	**36.1 sem.**	**lun 19/07/21**	**lun 28/03/22**	**$ 0.00**
513	**513**	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**71.83 sem.**	**lun 19/07/21**	**lun 5/12/22**	**$ 0.00**
514	514	Documentación legales	8 sem.	lun 19/07/21	sáb 11/09/21	$ 0.00
515	515	Formularios y planes especificos (C	4 sem.	lun 13/09/21	sáb 9/10/21	$ 0.00
516	516	Diseños y planos técnicos (U Nacio	8 sem.	lun 19/07/21	sáb 11/09/21	$ 0.00
517	517	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 3	16 sem.	lun 11/10/21	sáb 29/01/22	$ 0.00
518	518	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	16 sem.	lun 3/01/22	mar 26/04/22	$ 0.00
519	519	revision y aprobacion retie	90 días	lun 1/08/22	sáb 12/11/22	$ 0.00
520	520	Revisión y certificación Retilap despues de toda la iluminacion y arranca certificacion retilap 2 meses depender de iluminacion	78 días	jue 1/09/22	mié 30/11/22	$ 0.00
521	521	energizacion definitiva del 1 al 5 de diciebre	4 días	jue 1/12/22	lun 5/12/22	$ 0.00
522	**522**	**Trámite domiciliarias gas VANTI**	**12 sem.**	**lun 19/07/21**	**sáb 9/10/21**	**$ 0.00**
523	523	Documentación legales	4 sem.	lun 19/07/21	sáb 14/08/21	$ 0.00
524	524	Formularios y planes especificos (C	4 sem.	lun 16/08/21	sáb 11/09/21	$ 0.00
525	525	Diseños y planos técnicos (U Nacio	4 sem.	lun 19/07/21	sáb 14/08/21	$ 0.00
526	526	Tramite ante la entidad	4 sem.	lun 13/09/21	sáb 9/10/21	$ 0.00
527	**527**	**Trámite domiciliarias fibra óptica**	**8 sem.**	**lun 19/07/21**	**sáb 11/09/21**	**$ 0.00**
528	528	Documentación legales	4 sem.	lun 19/07/21	sáb 14/08/21	$ 0.00
529	529	Formularios y planes especificos (C	4 sem.	lun 19/07/21	sáb 14/08/21	$ 0.00
530	530	Diseños y planos técnicos (U Nacio	4 sem.	lun 19/07/21	sáb 14/08/21	$ 0.00
531	531	Tramite ante la entidad	4 sem.	lun 16/08/21	sáb 11/09/21	$ 0.00
532	**532**	**ADICION Y REMATE DE PROYECTO**	**200.67 sem.**	**lun 31/12/18**	**sáb 17/12/22**	**$ 31,470,465,885.09**
1046	**1046**	**EQUIPOS Y REMATES GENERALES**	**49.67 sem.**	**lun 3/01/22**	**sáb 17/12/22**	**$ 106,488,840.35**
1051	1051	Remates concretos existentes y nuevos	150 días	vie 17/06/22	jue 8/12/22	$ 0.00
1052	1052	Remates de instalaciones	128 días	vie 22/07/22	sáb 17/12/22	$ 0.00

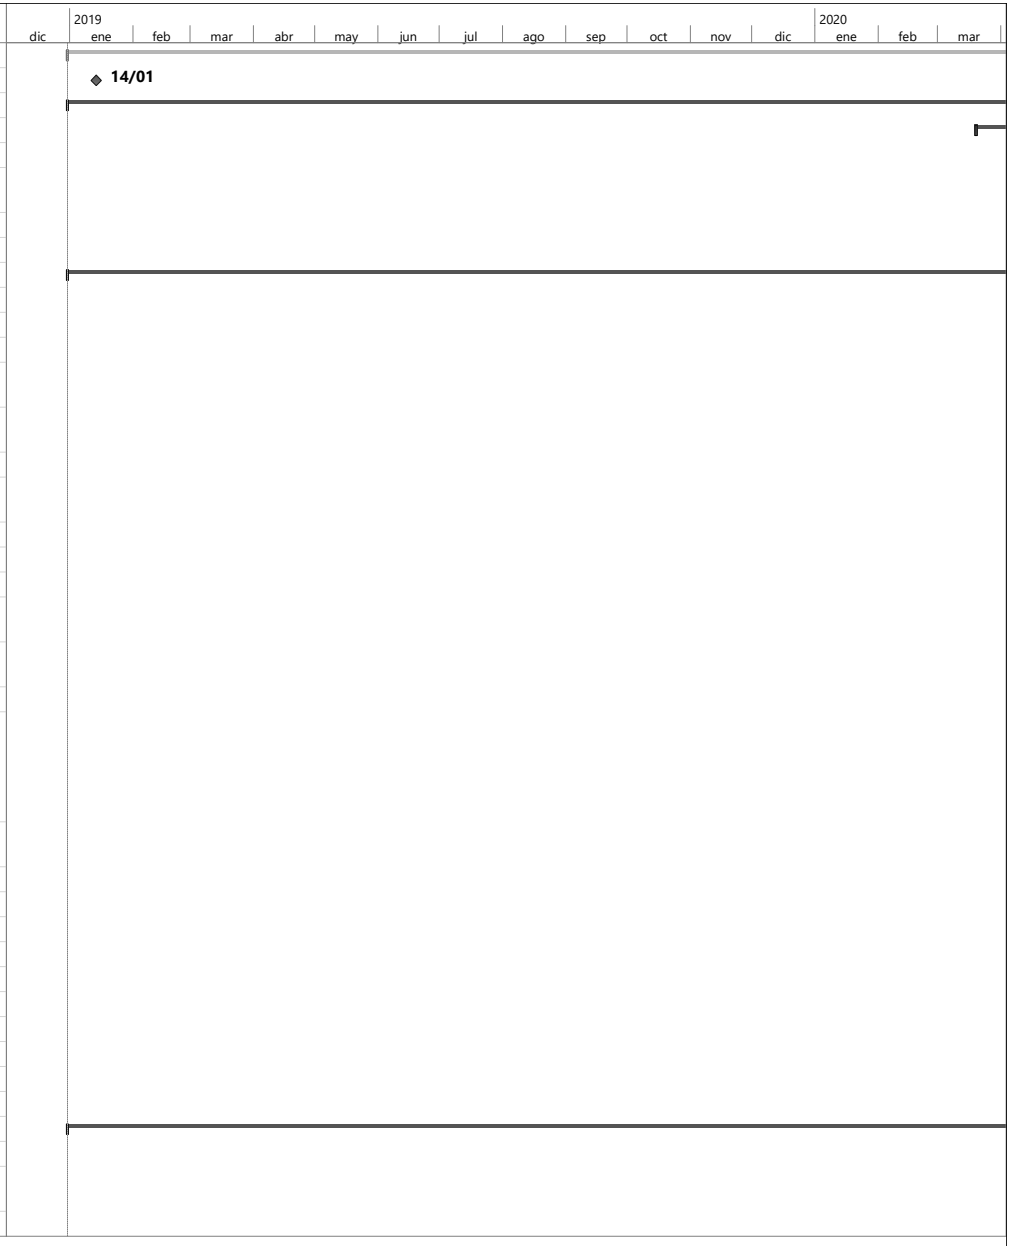

Proyecto: reprogramacion Meb
Fecha: sáb 18/12/21


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1053	1053	Remates de acabados	70 días	lun 19/09/22	jue 8/12/22	$ 0.00
1054	1054	Aseo fino para entrega de espacios	50 días	mar 18/10/22	mié 14/12/22	$ 0.00
1055	1055	Aseo y entrega	25 días	vie 21/10/22	sáb 19/11/22	$ 11,341,853.00
1056	1056	Fin de proyecto	0 días	sáb 17/12/22	sáb 17/12/22	$ 0.00




Proyecto: reprogramacion Meb
Fecha: sáb 18/12/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

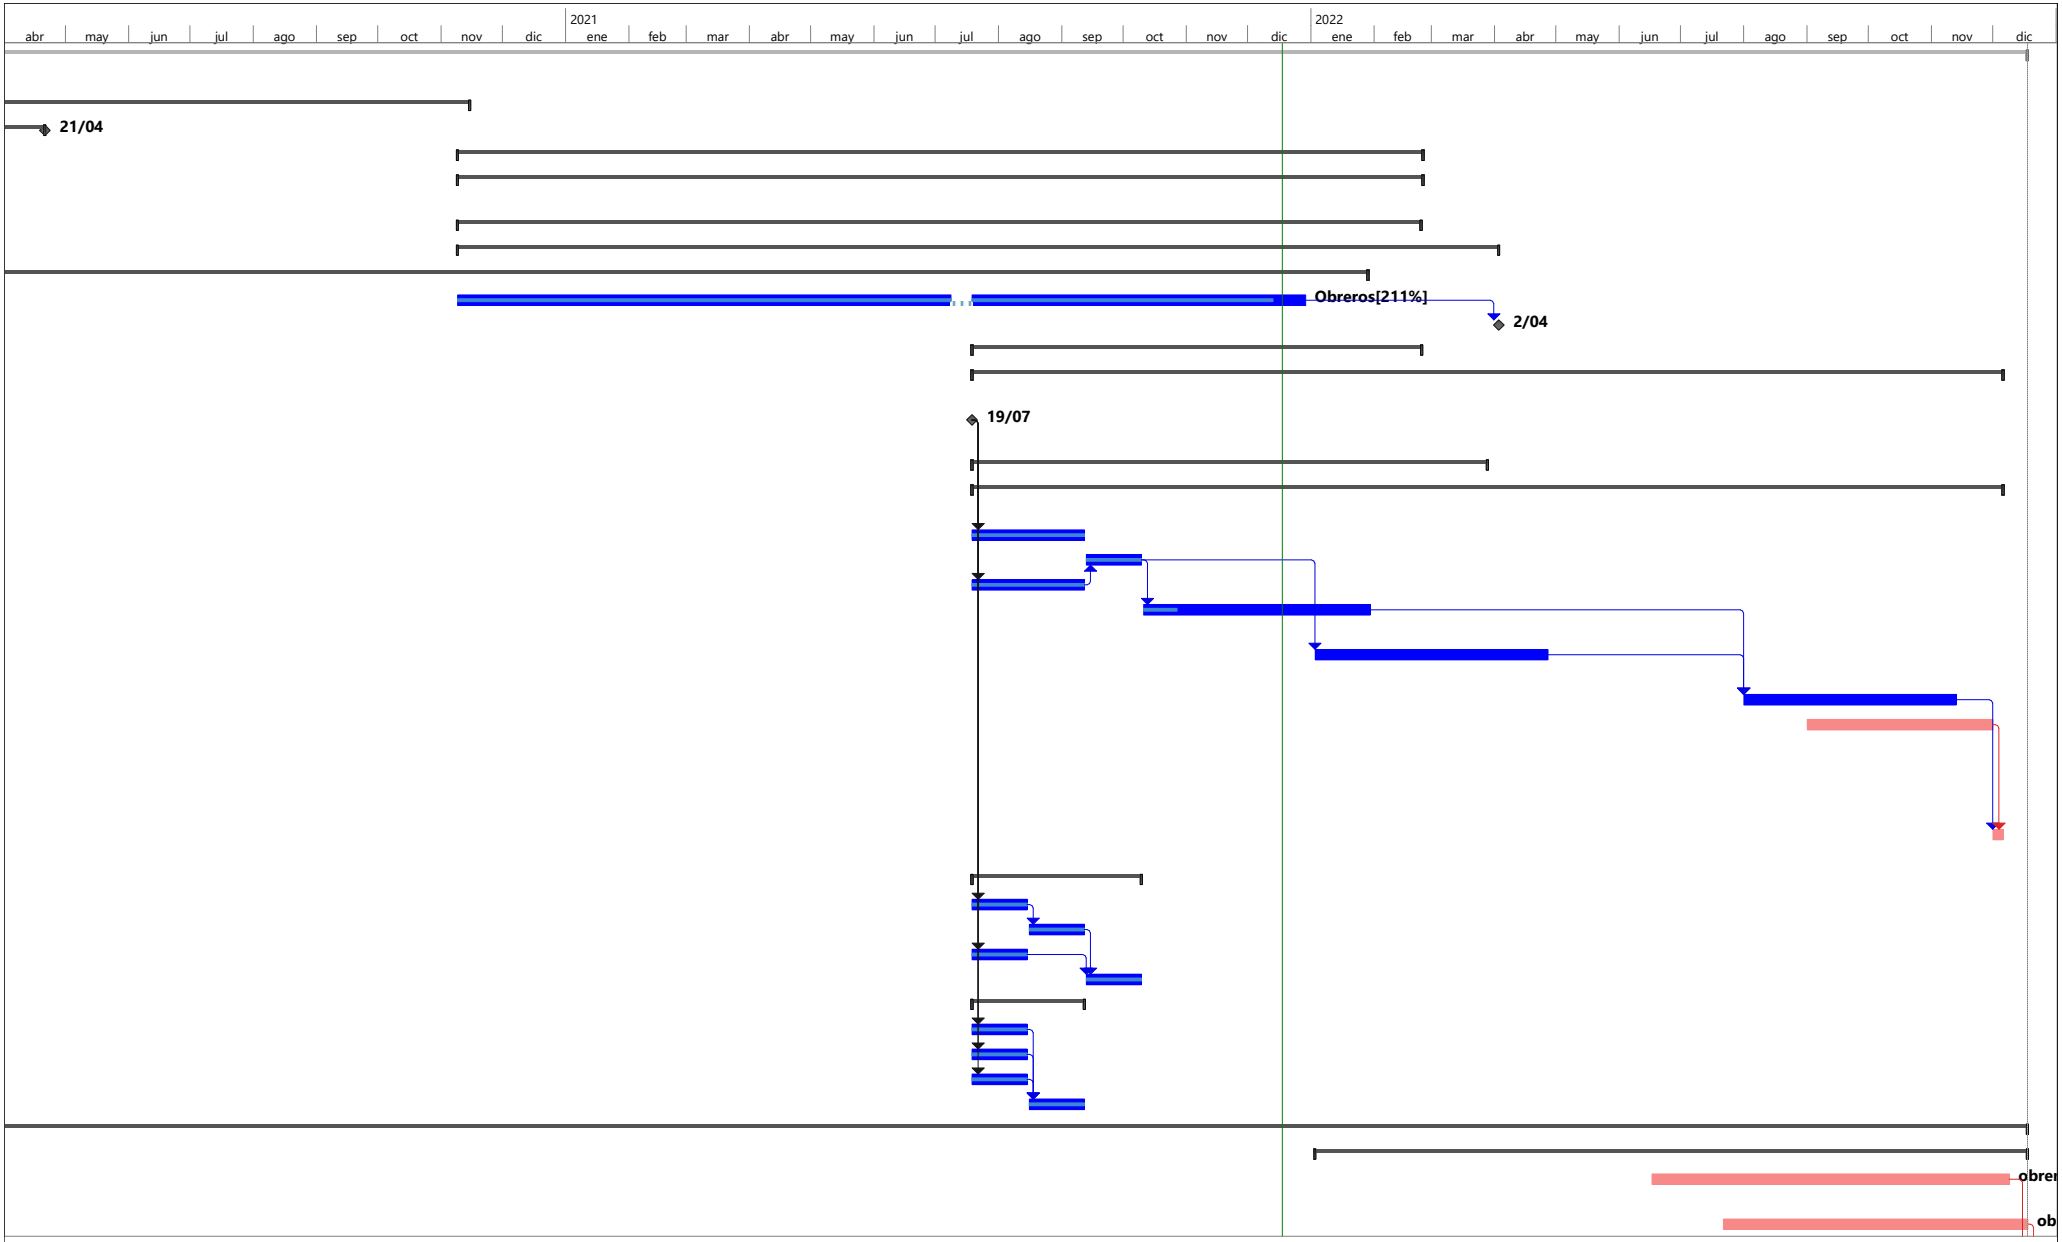

Proyecto: reprogramacion Meb
Fecha: sáb 18/12/21

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			



Proyecto: reprogramacion Meb
Fecha: sáb 18/12/21

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			
