1. Se Continua Demolición Edificio (placa piso 1).
(+Cimentación)
2. Se Continua Retiro de Escombros (7 vj. hoy).
3. Se Realizan Apoyos Sugeridos por Gestor Anteriormente
· Distancia entre Registros
· Anclado.

SST.: se realiza seguimiento al ingreso y salida de volquetas
se realiza seguimiento actividades en obra
separacion de Material
Total. 8 personas

Arq. Alex Tamayo
Res Tec Urbanizacion

1. Se Continua Dem. Edificio (placa piso 1).
(+ Cimentación) + (Tanque Almacenamiento Sur).
2. Se Continua Retiro de Escombros (8 vj. hoy).
SST.: se realiza seguimiento al ingreso y salida de volqueta,
seguimiento a la seguridad de cada actividad.
Total 8 personas.

Arq. Alex Tamayo
Res Tec
Urbanizacion.

1. Se Continua Demolición Edificio (placa piso 1)
(+ Cimentación) +
2. Se Continua Retiro De Escombros. (2 vj hoy) / El Escombro Restante se dejará para nivelar el terreno y permitir transito.
3. Se Realiza Comite No. 10, participantes:
SUBRED: Ing. Consuelo (Presencial) + Arq. Manuel Rincon (Virtual).
Interventoria: Arq. Carlos Giraldo + Arq. Gustavo Garcia + Ing. Diana Tordoño +
Contratista: Ing. Hanay Acuña + Ing. Alexander Castillo + Arq. Alex Tamayo + Arq. Thonatan Cuevas + Ing. Carolina Alvarado + Liliana Tapia + Viviana Pineda.

4-En Recorrido la Ing. Consuelo Segirió Complementar el Info de Geotecnia para cierre de Cimentación. con la Información. Correspondiente a cantidades para presupuestar.

-Clima: Se presentan lluvias durante la tarde

-SST: se realiza seguimiento a excavación y demolición de piso
seguimiento a ingreso y salida de volquetas
se realiza reubicación de punto de emergencia
Como lo es camilla extintor,
Total personas 9 personas

Ing. Alex Tamayo
Res. Tec Urbanismo

Nov. 05/21 1-Se continua con Dem. Edificio (placa piso 1) + (Cimentación).
2-Se Retiro Escombro Queso (1 vj).
-SST: se realiza seguimiento a demolición de piso.
se realiza seguimiento a ingreso y salida de volquetas
seguimiento a todo lo relacionado con la seguridad.
Total. 9 personas

Ing. Alex Tamayo
Res. Tec Urbanismo.

Diana Marín
Residente SISOMA

Nov. 04/21 1-Se continua con Dem. Edificio (placa piso 1) + (Cimentación) + (Excavaciones para Dem.).
2-Se Realizo Retiro Escombro Queso (1 vj).

-SST: se realiza seguimiento a demolición
se realiza entrega de informe semanal.
Total. 9 personal.

Ing. Alex Tamayo
Res. Tec Urbanismo

Diana Marín
Residente SISOMA

NOV 8 - 2021

Se solicita realizar análisis de trabajo en los demoliciones de cimentación existente relacionado con: profundidad, acceso de los trabajadores y para qué deben acceder, si se va a requerir entibados, entre otros. Presentar estandar/procedimiento de trabajo seguro e implementar controles. Tener en cuenta rescate por derrumbe y atrapamiento.

Atentamente,

Residente SISOMA Interventoría

08/21 1-Se Continua con Demolición Edificio (placa de Contrapiso) + (Cimentación) + (Excavación para Cimentación)
2. Se Realiza Visita Conjunta con el fin de Verificación para Tramite de Suspención de Obra.
3. Se Realiza Visita a Obra por parte de Funcionarios de la CONTRALORIA DISTRITAL + SOBRED NORTE + GERENCIA CAPS + INTERVENTORIA + CONTRATISTA.

-Clima: Se presentan Lluvias en el transcurso de la tarde.

SST.: se realiza seguimiento alademolicion de Cimentacion
se realiza protocolo de ingreso de visitantes
total 8 personas

Alex Tamayo
Resid. Urbanismo


Maria Parra
Residente Sisoma
Urbanismo

09/21 1-Se Continua con Demolición Edificio (placa de Contrapiso) + (Cimentación.) + (Excavación Cimentación).
2-Se Retira Vij. Escombro Acceso.
-clima: Se presentan lluvias en el transcurso de la tarde.

Alex Tamayo
Resid. Urbanismo

Norma


Nov/9/21 SST observacion realizada el dia 8/11/21 me permito dar alcance a la observacion solicitada. el proceso de la demolicion de cimentacion se realiza apartir de una excacion de aprox. 4 X 4 X 1,90. en donde la profundida maxima de operacion es de 1,10mts. ademas la excacacion se hace en forma de talud evitando y minimizando los volcamientos) el riesgo de volcamiento del terreno

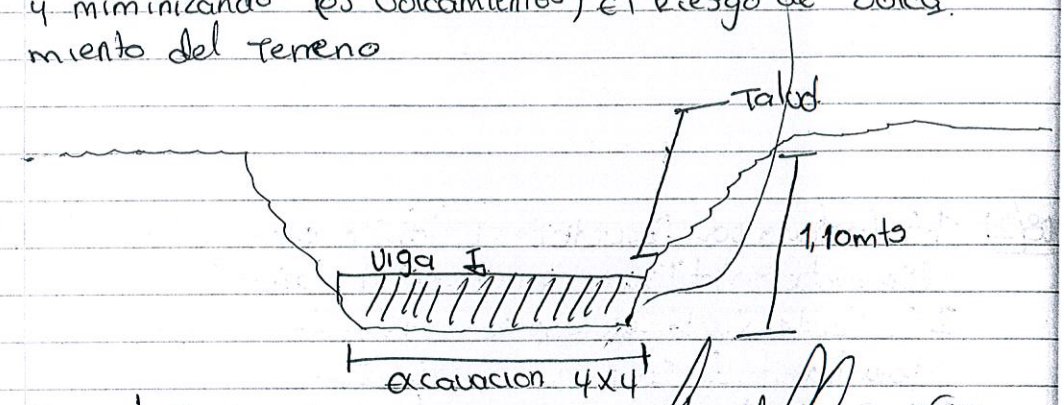

Personal 9personas

Juana Juan
Residente Ppoma
Urbanismo com.

Nov 10/21
1- Se Continua con Dem. Edificio (Placa Cimentacion H (Cimentacion) + (Excavaciones)
2- Se Retiran Kj de Escombro Cmezo.
3. Se realiza Extendida de material fino de Excavacion y Demolicion para mejoramiento suelo excavado
4. Se Realiza Visita comisiontopografica contratista con el fin de:
- Instalacion BM para nivel 0000.
- Confirmacion linderos (Muros).

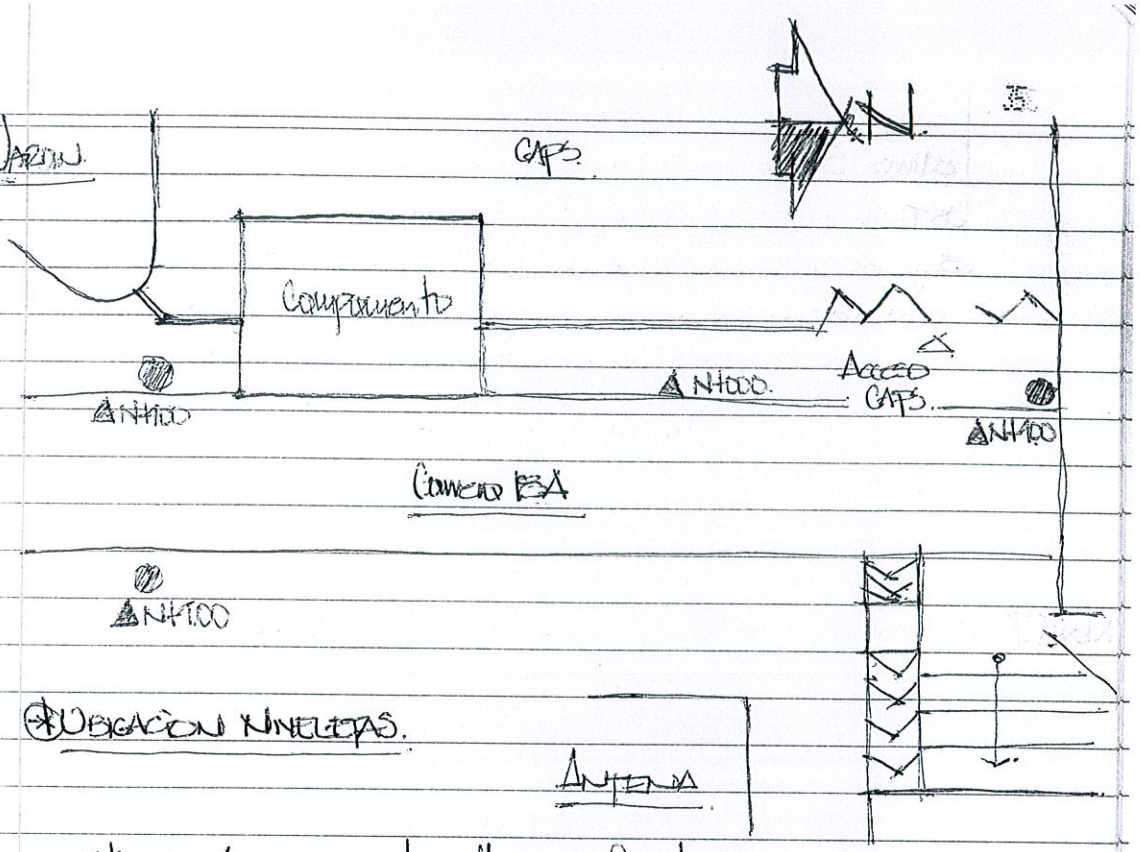

- Clima: Se presentan lluvias fuertes durante la tarde

SST se realiza seguimiento a proceso de demolicion de cimentacion
seguimiento ingreso y salida de vehiculos
Total 8 personas

N+100

Arq. Alex Tunay
Residente Obra Civil

Liliana Marin
Residente Sistema.

N-11/21 1- Se Continua Con Edificio (placa Contrapiso) + (Cimentación) + (Excavaciones).

2. Se Realiza comite de Obra Nº 12 participantes:

- SOBRED: Arq. Sandra Cervantes + Arq. Manuel Rincón.
- INTERVENTORIA: Arq. Carlos Giraldo + Arq. Gustavo Garcia + Ing. Diana Tobaro.
- CONTRATISTA: Ing. Henry Arquitecto. Alexander Castillo + Arq. Alex Tunay + Arq. Horacio Cuzcano + Liliana Marin + Viviana Pineda.

Clima: Se presentan lluvias ligeras durante la tarde.

35T: Se realiza seguimiento a protocolos de Bioseguridad
Seguimiento a demolicion.
Total 8 personas

Juana V. Marin.
Residente sisoma
Urbaniscom

Arq Alex Tovar
Resp Ec Urbanismo.

Nov-12/21 T-Se continua con Demolición Edificio (placa de contrapiso) + (cimentación) + (Excavaciones).

1° 2- Se inicia Demolición Muro Cerramiento (costado Sur).
3- Se Retiran 2 ej. Escombro Grueso.
4- Se Laminan Act. Estructura Campamento (Reparaciones).

Clima: Se presentan lluvias ligeras transcurso de la tarde

55T: se realiza seguimiento a la seguridad a excavacion y demolicion de cimentacion
Protocolo de Bioseguridad
Total 8 personas.

Juana V. Marin
Residente sisoma.
Urbaniscom

Arq Alex Tovar
Resp Ec Urbanismo.

Nov-13/21 T-Se Continua con Demolición Edificio (placa contrapiso) + (cimentación) + (Excavacion) + (Extendida Ref. Demolición).

5 SOT. se realiza seguimiento a demolicion de edificio
Protocolo de Bioseguridad
se entrega. informe semal. por via magnetica
con el oficio Capo-061

Arq Alex Tovar.
Resp Ec Urbanismo.

Total Personas

Juana V. Marin.
Residente. sisoma
Urbaniscom

04/6/21 1- Se Culmina demolición Edificio
2- Se Continua demolición muro Cerramiento + Cimentación costado Occidental.
3- Se inicia Instalación Cerramiento provisional costado Norte contra Colegio.
4. Se Retiran 3 vigas de Reforzamiento Cruzado
EST: Se realiza seguimiento a demolición
Se realiza seguimiento aseguramiento Cerramiento y se instalan señalización para la precaución y seguridad
Total 9 personas

Arq Alex Tamayo
Rector Obra

05/6/21 1- Visita personal Administrativo Colegio + Funcionarios S.D.E. + Urbanismo.
Asunto: Inspección para Verificación muro Cerramiento y Obras CAPS

- Se Comenta x parte de Urbanismo las Falencias en Cuanto a Diletantismos existentes y el Seguimiento que se está realizando, se da claridad que son Existentes.
- La Arq Tamayo Indica S.D.E. Reporte por la disposición Actual del muro de Cerramiento
Reporte: Nuevo muro está en Lic Construcción - Rta: Si para proceder
Sugiere: Construcción de muro de Cerramiento igual Cada predio con el diseño original o similares.
- Observación Lote real Aguas Potable se realizó seguimiento por parte del personal de mantenimiento del Colegio donde se encuentra el contador de predio del CAPS.

Rector Colegio Aguileo Parra

SOCAYA TORRES
GESTORA TERRITORIAL DCEE-SED

Arq Alex Tamayo
Rector Urbanismo

OBRA:

1-Se Continua Dem. Muro Cerramiento Costado Norte
2. Inst. polisombra Cerramiento provisional Colegio
3- Se Inicia Dem. Tanque Reserva.

SST: se realiza Seguimiento a demolicion de tanque.
se realiza seguimiento al encerramiento del Colegio, acompañamiento e instalacion señalizacion.
Total 8 personas.

Liana Mahecha
Residente Sisoma Urbanis com.

Arq Alex Tamayo
Res Tec Urbanisom.

Nov 18/21 1-Se Continua demolicion tanque de Reserva.
2-Se Realiza Comite Nº 13 Participantes.
SOSTED: Arq. Daniel Rincon. (Virtual).
INTERV: Arq. Carlos Giraldo + Arq. Gustavo Garcia + Ing Dario Tantaqui + Ing. Mario Lozano.
CONSTR.: Ing. Hanny Awad + Ing. Alexander Castillo + Arq. Alex Tamayo + Arq. Jonatan Guzman + Viviana Pineda + Liliana Tarin.

Observaciones Consignadas en Acta
SST: se realiza seguimiento a la demolicion del Tanque.
Total 7 personas

Liana Mahecha
Residente Sisoma Urbanis com

Arq Alex Tamayo
Res tec Urbanisom.

Nov 19/21 1-Se Continua Dem. tanque de Reserva.
2. Se continua Retiro de Escombros.
-SST
seguimiento a la demolicion del tanque.
Protocolo de ingreso y salida de volquetas
Total 4 personas

Liana Mahecha
Residente Sisoma Urbanis-com

Arq Alex Tamayo
Res tec Urbanisom.

Jv. 20/21 T-Se Continua Demolición tanque.
2. Se inicia Relleno Recebo para tratamiento de terreno.
3. Se realiza Visita tecnica por parte de OCI Asesores. SST se realiza seguimiento a actividades por personal de Abarca demoliciones
- Se entrega informe semanal por via magnetica con el oficio cap#-066
Total 7 personas

Ing. Alex Tamayo
Res Tec Urbanizam

Ing. Juana Maria
Residente Sisoma Urbanizam.

Jv. 22/21 T-Se Continua Relleno Recebo B-200 para mejoramiento terreno Excavado.
2- Se Retira Tolva Retroexcavadora (+Tranquilina).
SST. se realiza seguimiento a actividades por personal de Abarca demoliciones
se realiza seguimiento a cargue y retiro de retroexcavadora
Total 7 Personas.

Ing. Juana Maria
Residente Sisoma Urbanizam.

Clima:
Se presentan lluvias fuertes en el transcurso de la tarde.
SST.- se realiza seguimiento a las actividades relacionadas

Ing. Alex Tamayo
Res Tec Urbanizam.

Vi. 23/21 T-Se Continua Relleno Recebo para mejoramiento y Estabilización Zona Excavación tanque.
2- Se Complementa Relleno con capa Excavada.
Clima:
Se presentan lluvias fuertes durante la tarde.
SST.: se realiza seguimiento a actividades por el contratista
Total 6 personas

Ing. Alex Tamayo
Res Tec Urbanizam.

Ing. Juana Maria
Residente Sisoma Urbanizam

Nov-24/21 1-Se Realiza Excavación + Extracción + Desm. cimentación muro Cerramiento costado Occidente (Colegio) y Inicio muro Cerramiento costado Norte (Edificio).

Nota: ① Muro de Cerramiento costado Norte (Colegio) se encuentra a cuarenta de Antepecho debido a Red de Gas Natural y Red Eléctrica

② Cimentación de muro Cerramiento costado Sur se realizara posteriormente debido a evitar debilitamiento a la placa del piso del Jardín o Sea Evaluada su demolición. (Cimentación)

2-Se Realiza extendida de Material de demolición sobre el terreno con el fin de mejoramiento suelo.

Clima: Se presentan lluvias en transcurso de la tarde.

SST: Se realiza seguimiento a actividades personal Alcance demoliciones seguimiento a reubicación y acopio de materiales, se realiza señalización seguimiento a orden y Aseo General en la obra.

Arq Alex Tovaco
Residente Urbanizacion.

Diana Marin
Residente SISOMA
Urbaniscom


Nov 25/21 1-Se Retira Maquina Retroexcavadora por culminación de Actividades de Demolición.

2-Se Realiza Comité de Obra

Participantes:

- Interventoria: Arq. Carlos Giraldo + Arq. Gustavo Garcia + Ing. Diana Ibatano.
- Contratista: Ing. Harvey Arana + Ing. Alexander Castillo - Arq Alex Tovaco + Ing. Lawlina Avendaño + Arq. Jhonatan Guzman + Viviana Pineda + Liliana Marin.

Observaciones Consignadas en Acta.



Norma
