IDESAN
Siempre Santander

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	20.038.02-240		
VERSIÓN	01		
FECHA	18/05/20		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 22 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : G-015-2021 (Indique número y año)

OBJETO: A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATISTA: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Tramo No. 7 y 9 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N.P

INTERVENTOR: N.P

PLAZO INICIAL: 45 Días a partir del Acta de Inicio. (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.P (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 36.908.545,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 36.908.545,00

PLAZO ACUMULADO: 45 Días a partir del Acta de Inicio. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.P (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA CANTIDAD	VALOR	PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
1,1	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	550	$ 2.000,00	$ 1.100.000,00	-		-	205,8	-$ 411.600,00			344,20	$ 688.400,00
1,2	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	50	$ 40.000,00	$ 2.000.000,00	-		-	0,99	-$ 39.600,00	-		49,01	$ 1.960.400,00
1,3	450,10 P		450.10P	Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	32,7	$ 870.000,00	$ 28.449.000,00	-		+	3,98	$ 3.462.600,00	-		36,68	$ 31.911.600,00
1,4	330,4	330-13		Base granular para bacheo Clase A	m3	45,5	$ 90.000,00	$ 4.095.000,00	-		-	33,46	-$ 3.011.400,00	-		12,04	$ 1.083.600,00
Ajuste al peso									-								
				* SUBTOTAL OBRAS				$ 35.644.000,00					$ 0,00				$ 35.644.000,00
				* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 264.545,31					$ -				$ 264.545,31
				* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 35.908.545,31					$ 0,00				$ 35.908.545,31
				* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)				$ 1.000.000,00					$ -				$ 1.000.000,00
				* VALOR TOTAL				$ 36.908.545,00					$ 0,00				$ 36.908.545,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

> Una vez iniciado el contrato de la referencia se realizó un balance de obra más preciso y exacto a las cantidades de obra encada uno de las areas dispuestos para el cumplimiento del 100% del objeto contractual del contrato de obra No.G-15-2021.

> Debido a los espesores existentes (estructura de pavimento a reparar) de la capa asfáltica intervenida aumento el volumen de la Mezcal asfáltica MDC-19.

> Se realiza un Balance mas preciso y exacto de las cantidades de obra fisica a ejetucar.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

> A la fecha de la presente acta de modificación de cantidades no se quiere la inclusion de nuevos item's

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A
RAGDE JOANN PEREZ VELASCO
Contratista

Firma:
Nombre: IDESAN
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Contratante

Revisión:

Apoyo del Supervisor del Contrato de Obra: Nombre: Ing. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN - Apoyo Técnico Convenio No. 1113 de 2016

Original: Archivo Gestión del Contrato
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor.

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		

SECCION REDES DE DISTRIBUCION

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K 13+674 borde derecho **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,82	1,45		8,54
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO	ANCHO	AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,82	1,45	4,09	
				TOTAL	4,09	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,82	1,45	0,18	0,74
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	2,82	1,45	0,10	0,41
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,82	1,45	0,16	0,65
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+624 borde izquierdo **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	5,05	2,33		14,76
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	5,05	2,33	11,77	
				TOTAL	11,77	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,05	2,33	0,24	2,82
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,05	2,33	0,10	1,18
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,05	2,33	0,14	1,65
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: km 13 + 614 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	4,23	1,73		11,92
		ML - CM				
	correlacion					
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	4,23	1,73	7,32	
			TOTAL		7,32	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,23	1,73	0,18	1,32
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	4,23	1,73	0,10	0,73
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,23	1,73	0,08	0,59
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K13+604 borde izquierdo **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	5,4	4,4		23,8
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM	4,13	1,68		6,9
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	5,40	4,40	23,76	
			4,13	1,68	6,9384	
				TOTAL	30,70	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,40	4,40	0,10	2,38
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,13	1,68	0,10	0,69
						3,07
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,40	4,40	0,00	0,00
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	4,13	1,68	0,00	0,00
						0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,40	4,40	0,08	1,90
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,13	1,68	0,08	0,56
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				2,46
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K13+590 borde izquierdo **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	1,1	1,6		5,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	1,10	1,60	1,76	
				TOTAL	1,76	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	1,10	1,60	0,18	0,32
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	1,10	1,60	0,10	0,18
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	1,10	1,60	0,08	0,14
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+585 borde derecho **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	5,3	2,1		14,8
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	5,30	2,10	11,13	
			TOTAL		11,13	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,30	2,10	0,18	2,00
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,30	2,10	0,10	1,11
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,30	2,10	0,08	0,89
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K13+575 borde izquierdo **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	3,75	1,8		11,1
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	3,75	1,80	6,75	
				TOTAL	6,75	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	3,75	1,80	0,14	0,95
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	3,75	1,80	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	3,75	1,80	0,14	0,95
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+570 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	3,4	1,35		9,5
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	3,40	1,35	4,59	
			TOTAL		4,59	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	3,40	1,35	0,14	0,64
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	3,40	1,35	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	3,40	1,35	0,14	0,64
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+ 560 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	6,1	4,15		20,5
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	6,10	4,15	25,32	
			TOTAL		25,32	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	6,10	4,15	0,14	3,54
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	6,10	4,15	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	6,10	4,15	0,14	3,54
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K 9+ 861 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,2	8,4		21,2
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,20	8,40	18,48	
				TOTAL	18,48	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,20	8,40	0,14	2,59
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	2,20	8,40	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,20	8,40	0,14	2,59
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K9 + 839 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,7	8,1		21,6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,70	8,10	21,87	
				TOTAL	21,87	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,70	8,10	0,14	3,06
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	2,70	8,10	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,70	8,10	0,14	3,06
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21

DIRECCION: K9 + 762 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	4,2	2		12,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	4,20	2,00	8,40	
			TOTAL		8,40	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,20	2,00	0,07	0,59
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	0,00	0,00		0,00
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,20	2,00	0,07	0,59
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21

DIRECCION: K9 + 752 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2	1,5		7
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,00	1,50	3,00	
			TOTAL		3,00	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,00	1,50	0,12	0,36
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	0,00	0,00		0,00
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,00	1,50	0,12	0,36
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21
DIRECCION: K9 + 795 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	9,1	3,6		25,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM	5,4	1,7		9,18
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	9,10	3,60	32,76	
			5,4	1,7	9,18	
			TOTAL		41,94	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	9,10	3,60	0,20	6,55
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,40	1,70	0,20	1,84
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,40	1,70	0,10	0,92
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	9,10	3,60	0,10	3,28
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	9,10	3,60	0,10	3,28
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,40	1,70	0,10	0,92
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21

DIRECCION: K9 + 782 **BARRIO:** _____

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:** _____

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	4,7	3,8	0,12	17
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	4,70	3,80	17,86	
				TOTAL	17,86	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,70	3,80	0,22	3,93
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	4,70	3,80	0,10	1,79
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,70	3,80	0,12	2,14
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 19/07/21
DIRECCION: K11 + 235 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,45	3,9	0,1	12,7
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,45	3,90	9,56	
			TOTAL		9,56	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 19/07/21
DIRECCION: K11 + 250 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	1,6	1,1	0,1	5,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	1,60	1,10	1,76	
			TOTAL		1,76	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	1,60	1,10	0,10	0,18
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	1,60	1,10	0,10	0,18
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 19/07/21
DIRECCION: K11 + 215 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,45	3,9	0,1	12,7
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,45	3,90	9,56	
			TOTAL		9,56	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 21/07/21

DIRECCION: K12 + 145 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	13,8	2,7	0,1	33
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	13,80	2,70	37,26	
				TOTAL	37,26	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	13,80	2,70	0,08	2,98
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	13,80	2,70	0,08	2,98
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 21/07/21
DIRECCION: K12 + 220 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	6,7	3,5	0,1	20,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	6,70	3,50	23,45	
				TOTAL	23,45	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	6,70	3,50	0,08	1,88
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	6,70	3,50	0,08	1,88
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21

DIRECCION: K11+080 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,6	2,2	0,1	9,6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM	2,6	1,6	0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,60	2,20	5,72	
			2,6	1,6	4,16	
				TOTAL	9,88	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,60	2,20	0,10	0,57
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,60	1,60	0,10	
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,60	2,20	0,10	0,57
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,60	1,60	0,10	0,42
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21
DIRECCION: K11+070 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	3,9	1,6	0,1	11
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM			0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	3,90	1,60	6,24	
			0	0	0	
				TOTAL	6,24	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	3,90	1,60	0,10	0,62
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	0,00	0,00	0,10	
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	3,90	1,60	0,10	0,62
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	0,00	0,00	0,10	0,00
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21
DIRECCION: K11+070 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2	1	0,1	6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM			0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,00	1,00	2,00	
			0	0	0	
				TOTAL	2,00	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,00	1,00	0,05	0,10
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	0,00	0,00	0,10	
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,00	1,00	0,05	0,10
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	0,00	0,00	0,10	0,00
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21
DIRECCION: K12+020 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	1,8	1,2	0,1	6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM			0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	1,80	1,20	2,16	
			0	0	0	
			TOTAL		2,16	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	1,80	1,20	0,05	0,11
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	0,00	0,00		
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	1,80	1,20	0,05	0,11
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	0,00	0,00		0,00
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES


ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

		IMPRIMACION			DEMOLICION Y ACARREO				BASE				PAVIMENTOASFÁLTICO			
MUN	DIRECCION	LARGO	ANCHO	TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
1	K 13+674 borde derecho	2,82	1,45	4,09	1,45	2,82	0,18	0,74	2,82	1,45	0,10	0,41	2,82	1,45	0,16	0,65
2	K13+624 borde izquierdo	5,05	2,33	11,77	2,33	5,05	0,24	2,82	5,05	2,33	0,10	1,18	5,05	2,33	0,14	1,65
3	km 13 + 614	4,23	1,73	7,32	1,73	4,23	0,18	1,32	4,23	1,73	0,10	0,73	4,23	1,73	0,08	0,59
4	K13+590 borde izquierdo	5,40	4,40	23,76	4,40	5,40	0,10	2,38	5,40	4,40	0,00	0,00	5,40	4,40	0,08	1,90
		4,13	1,68	6,94	1,68	4,13	0,10	0,69	4,13	1,68	0,00	0,00	4,13	1,68	0,08	0,56
5	K13+590 borde izquierdo	1,10	1,60	1,76	1,60	1,10	0,18	0,32	1,10	1,60	0,10	0,18	1,10	1,60	0,08	0,14
6	K13+585 borde derecho	5,30	2,10	11,13	2,10	5,30	0,18	2,00	5,30	2,10	0,10	1,11	5,30	2,10	0,08	0,89
7	K13+575 borde izquierdo	3,75	3,75	14,06	3,75	3,75	0,14	1,97	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	3,75	0,14	1,97
8	K13+570	3,40	1,35	4,59	1,35	3,40	0,14	0,64	3,40	1,35	0,00	0,00	3,40	1,35	0,14	0,64
9	K13+ 560	6,10	4,15	25,32	4,15	6,10	0,14	3,54	6,10	4,15	0,00	0,00	6,10	4,15	0,14	3,54
10	K 9+ 861	2,20	8,40	18,48	8,40	2,20	0,14	2,59	2,20	8,40	0,00	0,00	2,20	8,40	0,14	2,59
11	K9 + 839	2,70	8,10	21,87	8,10	2,70	0,14	3,06	2,70	8,10	0,00	0,00	2,70	8,10	0,14	3,06
12	K9 + 785	4,6	4	18,40	4,00	4,60	0,20	3,68	4,60	4,00	0,10	1,84	4,60	4,00	0,10	1,84
		3	3,6	10,80	3,60	3,00	0,20	2,16	3,00	3,60	0,10	1,08	3,00	3,60	0,10	1,08
13	K9 + 762	4,2	2	8,40	2,00	4,20	0,07	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,20	0,07	0,59
14	K9 + 752	2	1,5	3,00	1,50	2,00	0,12	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,12	0,36
15	K9 + 795	8	3,6	28,80	3,60	8,00	0,20	5,76	3,60	8,00	0,10	2,88	3,60	8,00	0,10	2,88
		5,00	1,70	8,50	1,70	5,00	0,20	1,70	1,70	5,00	0,10	0,85	1,70	5,00	0,10	0,85
16	K9 + 782	4,7	3,8	17,86	4,70	3,80	0,22	3,93	4,70	3,80	0,10	1,79	4,70	3,80	0,12	2,14
17	K11 + 235	2,45	3,9	9,56	2,45	3,90	0,10	0,96					2,45	3,90	0,10	0,96
18	K11 + 250	1,6	1,1	1,76	1,60	1,10	0,10	0,18					1,60	1,10	0,10	0,18
19	K11 + 215	2,45	3,9	9,56	2,45	3,90	0,10	0,96					2,45	3,90	0,10	0,96
20	K12 + 145	13,8	2,7	37,26	13,80	2,70	0,08	2,98					13,80	2,70	0,08	2,98
21	K12 + 220	6,7	3,5	23,45	6,70	3,50	0,08	1,88					6,70	3,50	0,08	1,88
22	K11+080	2,6	2,2	5,72	2,60	2,20	0,10	0,57					2,60	2,20	0,10	0,57
		2,6	1,6	4,16	2,60	1,60	0,10	0,42					2,60	1,60	0,10	0,42
23	K11+070	3,9	1,6	6,24	3,90	1,60	0,10	0,62					3,90	1,60	0,10	0,62
24	K11+070	2	1	2,00	2,00	1,00	0,05	0,10					2,00	1,00	0,05	0,10
25	K12+020	1,8	1,2	2,16	1,80	1,20	0,05	0,11					1,80	1,20	0,05	0,11
				348,70				49,01				12,04				36,68



Plesupuesto ofeste

IDESAN

Siempre Santander

IDESAN

BACHEO Y PARCHEO

PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO 1

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO DE AJUSTE PARA GPP	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
1. PAVIMENTOS ASFALTICOS									
1,1	420.2	420-13			Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	550,00	$ 2.000,00	$ 1.100.000,00
1,2	465.1	465-13			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	50,00	$ 40.000,00	$ 2.000.000,00
1,3	450,10 P		450.10P		Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	32,70	$ 870.000,00	$ 28.449.000,00
1,4	330,4	330-13			Base granular para bacheo Clase A	m3	45,50	$ 90.000,00	$ 4.095.000,00
Subtotal									$ 35.644.000,00
SUBTOTAL OBRAS									$ 35.644.000,00

VALOR BASICO DEL CONTRATO			$ 35.644.000,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)			$ 264.545,31
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 35.908.545,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)		NO MODIFICAR	$ 1.000.000,00
		VALOR TOTAL	$36.908.545,00

NOTA 1: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al NOVENTA por ciento (90%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada

NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 6: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	22%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL	A.I.U.=	28%

NOMBRE DEL PROPONENTE: ___VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS __

REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):__RAGDE JOANN PEREZZ ____

FECHA:__27 DE MAYO DEL 2021

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER	CÓDIGO	20.038.02-016		
		VERSIÓN	01		
		FECHA	18/05/2020		
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	PÁGINA		DE	

	FECHA	18 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. **1,0**
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. G-15 **DE** 2021

CONTRATISTA: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – NIT: 900.034.836-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	PROFESIONAL	IDESAN
HERMES SUAREZ CABALLERO	PROFESIONAL	IDESAN
RAGDE JOANN PEREZ VELESCO	REPRESENTANTE LEGAL	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: SEGUMIENTO TECNICO SEMANAL

1. Seguimiento y Control de obra
2. Balance real de las activiades a realizar

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N.A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Seguimiento y Control de obra
2. Balance real de las activiades a realizar

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER	CÓDIGO	20.038.02-016		
		VERSIÓN	01		
		FECHA	18/05/2020		
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	PÁGINA		DE	

	FECHA	18	6	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Seguimiento y Control de obra

Durante el primer periodo de ejecución del proyecto comprendido desde 10 de junio de 2021 al 18 de junio de 2021 se realizó el corte en pavimento asfaltico de algunas areas a reparar dentro del TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08).

2. Balance real de las activiades a realizar

Una vez revisada el área destinada para realizar las activiades de bacheo y parcheo dentro del tramo 9, es necesario modificar las cantidades inicialmente contratadas para poder brindar un vía con mayor transitabilidad y seguridad.

Por lo que es necesario hacer un balance de las cantidades de obra reales a ejecutar dentro del contrato No. G -15- 2021. Lo anterior, para determinar el valor definitivo de las actividades necesarias para el cumplimiento al 100% del objeto contratado y la viabilidad financiera del mismo.

Las actividades que se determinan como mayores, son determinantes de ejecutar y su desarrollo es totalmente necesario para llevar a total término el objeto contractual. Cabe aclarar que estas actividades son resultado de la sumatoria de cada uno de los elementos intervenidos y que se encuentran detallados en las memorias de cálculo de cantidades.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
De ser necesaria se suscribirá entre las partes un Acta modificatoria sin alterar el valor del contrato inicial, donde se puedan incluir mayores y menores cantidades de obra a ejecutar con base en las memorias de cantidades que se han llevado por parte de la supervisión.	22/06/21	Contratista y Supervisor
Las actividades que se determinan como mayores e ítems no previstos, son determinantes de ejecutar y su desarrollo es totalmente necesario para llevar a total término el objeto contractual. Cabe aclarar que estas actividades son resultado de la sumatoria de cada uno de los elementos intervenidos y que se encuentran detallados en las memorias de cálculo de cantidades.	22/06/21	Contratista y Supervisor

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 7 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
HERMES SUAREZ CABALLERO	
JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	
RAGDE JOANN PEREZ VELESCO	

INFORME DE FINAL OBRA

OBJETO:

OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATISTA:

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

NIT: NIT: 900.034.836-1

JULIO 2021

SANTANDER

INTRODUCCION

El presente informe sustenta el consolidado de las actividades que se efectuaron durante el proceso de ejecución del contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN**".

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS como responsable de la ejecución del contrato celebrado con la INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN" establece acciones administrativas y operativas enfocadas en la seguridad y salud de los colaboradores al igual que protección y conservación del medio ambiente, lo cual es una prioridad durante el desarrollo de las actividades. Es de suma importancia eliminar, controlar o mitigar todos aquellos actos o condiciones inseguras que puedan afectar o repercutir negativamente en las condiciones laborales o en el entorno natural.

Para asegurar la protección ambiental y laboral del entorno donde se realiza el proyecto de Bacheo y parcheo la empresa VIACOL, se ciñe a la normatividad colombiana para atestiguar el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para generar un ambiente de trabajo seguro.

A continuación, daremos a conocer en detalle, las actividades desarrolladas para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto enmarcado en el cumplimiento normativo y el desarrollo sostenible.

1. OBJETIVO

Detallar el desarrollo de las actividades programadas para el cumplimiento de los estándares en seguridad, salud y gestión ambiental para el contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN**". En el cual se brinda la información detallada correspondiente a las actividades en seguridad, salud y gestión ambiental; comprendida entre el 10 de junio y el 24 de julio de 2021

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades previstas en contrato **N. G-015-2021** se desarrollaron en la vía Nacional RUTA 45ª - SITIO CONOCIDO COMO EL CERO – MUNICIPIO DE RIONEGRO, desde el PR 9+700 hasta el PR13+700 aproximadamente- Como lo presenta la siguiente ilustración

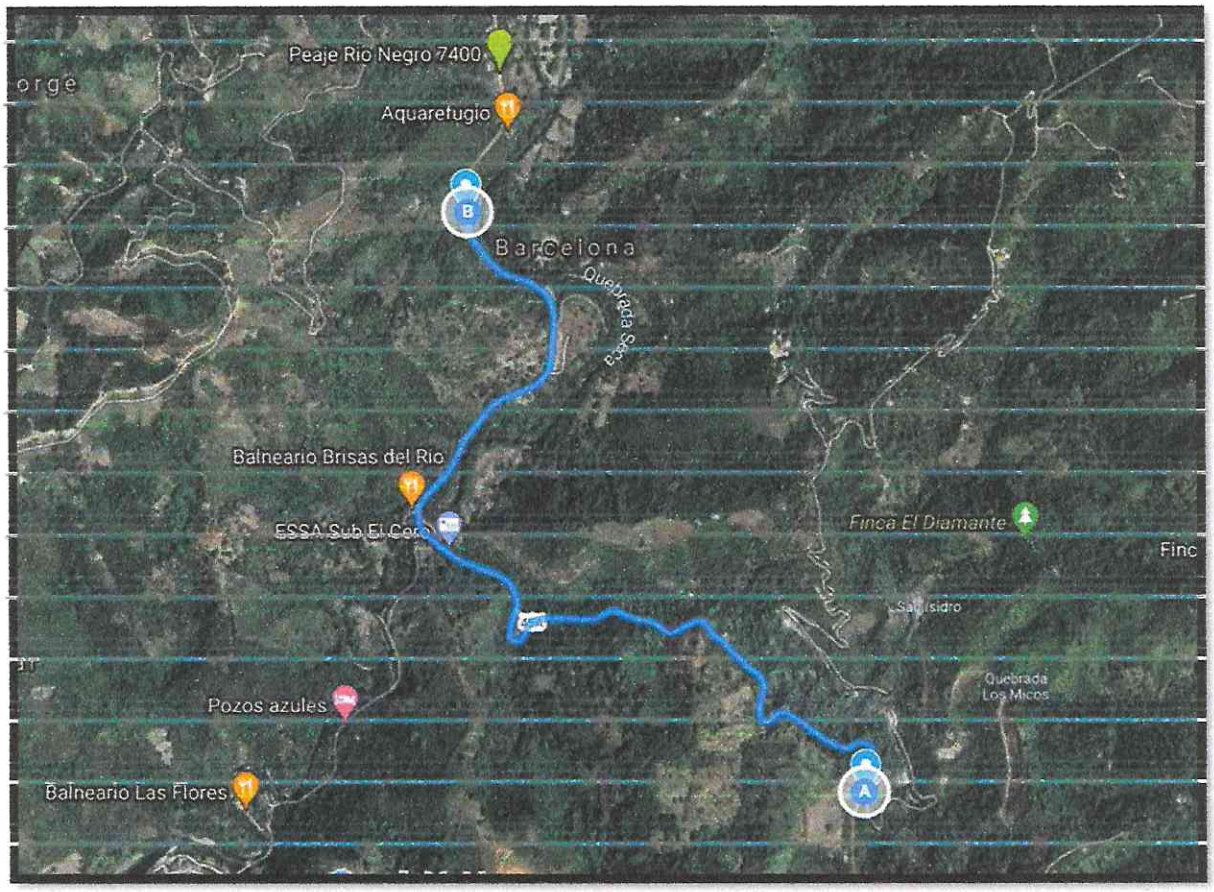
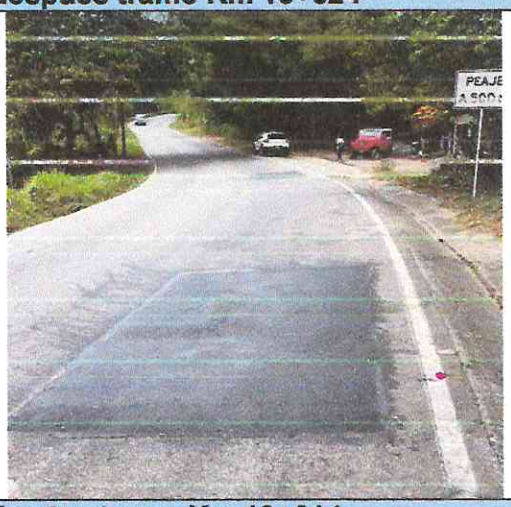


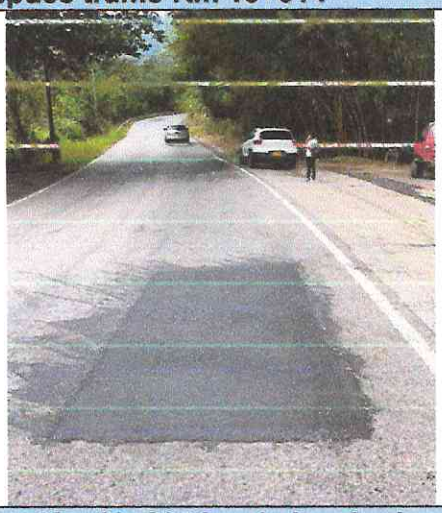
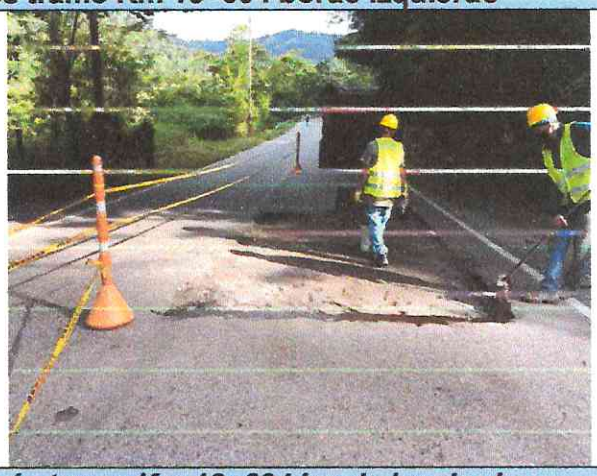
Ilustración 1. Localización del proyecto

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

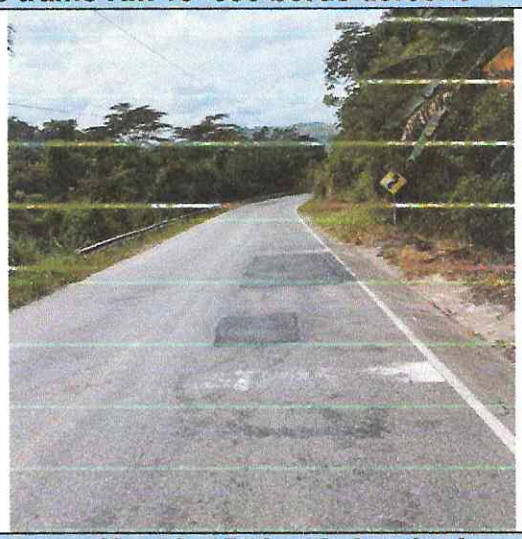
El proyecto contrato **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN".**. Se desarrollaron las siguientes actividades:

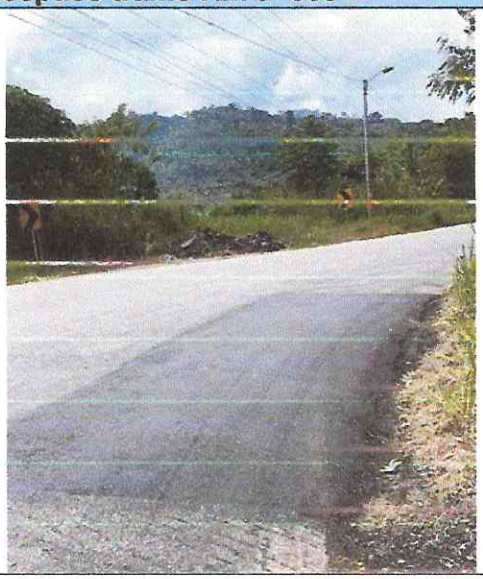
Fotografía del Antes tramo Km 13+674	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +674 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+674	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 4.09 m2	

Fotografía del Antes tramo Km 13+624	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +624 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+624	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 11.77 m2	
Fotografía del antes tramo Km 13+614	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +614 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 13+614	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 7.32 m2	
Fotografía del antes tramo Km 13+604 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +604 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+604 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 30.7 m2	

Fotografía del antes tramo Km 13+590 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +590, en el borde izquierdo que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+590 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 1.76 m2	
Fotografía del antes tramo Km 13+585 borde derecho	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +585, en el borde derecho que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	

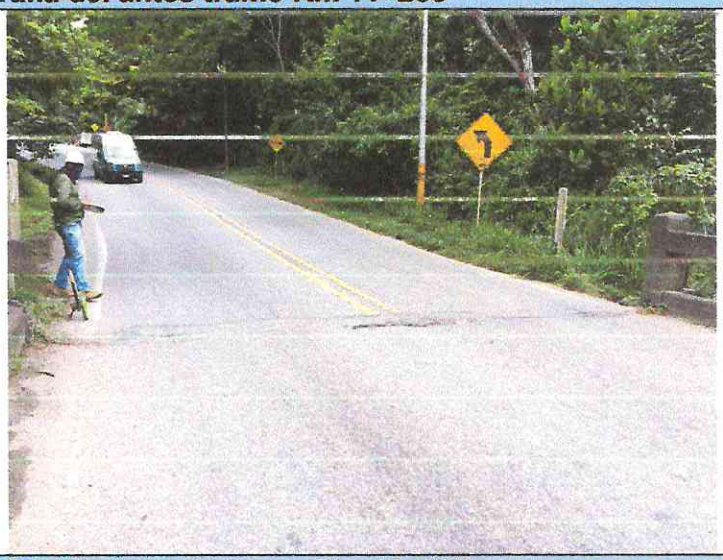
Fotografía del después tramo Km 13+585 borde derecho	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +585, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 11.13 m2	
Fotografía del después tramo Km 13+575 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +575, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 6.75 m2	
Fotografía del después tramo Km 13+570	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +570, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 4.59 m2	

Fotografía del después tramo Km 13+560	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +560, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 25.32 m2	
Fotografía del después tramo Km 9+861	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+861, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 18.48 m2	
Fotografía del después tramo Km 9+839	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 19+893, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 21.87 m2	

Fotografía del antes tramo Km 9+785	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+785, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 9+785	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+785, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 29.20 m2	
Fotografía del antes tramo Km 9+762	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+762, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 9+762	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+762, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 8.40 m2	
Fotografía del antes tramo Km 9+752	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+752, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 9+752	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+752 después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 3.0 m2	

Fotografía del antes tramo Km 9+795	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+795, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 9+795	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+795, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 41.94 m2	
Fotografía del antes tramo Km 9+782	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+782, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 9+782	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+782, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 17.86 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+235	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+235, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+235	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+235, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 9.56 m2	

Fotografía del antes tramo Km 11+250	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+250, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+250	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+250, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 4.59 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+215	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+215, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 11+215	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+215, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 9.56 m2	
Fotografía del antes tramo Km 12+145	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+145, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 12+145	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+145, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 37.26 m2	

Fotografía del antes tramo Km 12+220	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+220, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 12+220	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+220, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 23.45 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+080	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+080, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 11+080	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+080, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 9.88 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+070	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+070, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+070	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+070, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 6.24 m2	

Fotografía del antes tramo Km 12+020	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+020 antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+215	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+020, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 2.16 m2	
Instalación de señalización y controlador vial	
Con el fin de garantizar la movilidad sobre el corredor vial se hace la instalación de señalización vial (maletines y conos) y presencia de controlador vial.	

Carpado de volquetas	
Durante la ejecución del proyecto de garantiza el carpado de las volquetas a fin de evitar la propagación de material participado	
Uso de EPP	
Para el desarrollo del proyecto cada uno de los colaboradores hizo uso de sus respectivos Elementos de protección Personal y se realizo la reposición y cambio de los mismos conforma fue necesario de acuerdo al uso de estos.	

4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.** Inició el 10 de junio de 2021 y finalizo 24 de julio de 2021, periodo en el cual la empresa ejecutó las actividades dando cumplimiento a las requerimientos establecidos por IDESAN.

5. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

De la ejecución del proyecto fueron generados residuos asfalticos producto de los procesos de rotura y corte de pavimento a fin de remover las partes deterioradas y realizar la reparación del mismo, dichos residuos fueron transportados en volquetas y dispuestos en el terreno autorizado por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – IDESAN, garantizando el cumplimiento del Plan de Manejo ambiental estipulado por el Cliente y a su vez contribuyendo con la preservación del medio ambiente y evitando la contaminación de los recursos naturales.

6. CONCLUSIONES

El contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.** Se realizó cumpliendo los requerimientos establecidos por el cliente, en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, donde se tuvieron en cuenta la implementación de los controles por parte del personal operativo y el cumplimiento de la disciplina operativa.

ELABORO:

JULIAN ANDRES ROJAS NAVARRO
C.C No. 13.860.707 de Bucaramanga
INGENIERO RESIDENTE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	676488709	9408188251	E	2020/07/09	2020/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,313,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)																						$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)																						$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																						$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000
1	CC	37341675	CARDENAS XIOMARA																		230901	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
2	CC	91516529	DELGADO ROINEY	X	X																230201	2	$58,521	$9,400	EPS016	2	$58,521	$2,400	CCF39	2	$58,521	$2,400	14-11	2	$58,521	$400	2	$0	$0	SI	$14,600
3	CC	91158088	MENDEZ EDUARDO		X																25-14	23	$672,983	$107,700	EPS046	23	$672,983	$27,000	CCF39	23	$672,983	$27,000	14-11	23	$672,983	$3,600	23	$0	$0	SI	$165,300
4	CC	1098798854	MENESES YEIRA		X																230301	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
5	CC	91520802	PEREZ RAGDE																		230901	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
6	CC	1102354966	PINEDA DIEGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$781,242	$31,300	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$211,600
Total			**Afiliados(6)**																				$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	676488709	9408188251	E	2020/07/09	2020/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,313,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$858,600	$0	$0	$858,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$107,700	$0	$0	$107,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$0	$0	$281,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$9,400	$0	$0	$9,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$460,500	$0	$0	$460,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$211,100	$0	$0	$211,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$211,100	$0	$0	$211,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$215,000	$0	$0	$215,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$82,400	$0	$0	$82,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$97,400	$0	$0	$97,400
TOTAL				6	$1,313,000	$0	$0	$1,313,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	716452744	9408759111	E	2020/08/12	2020/08/19	BANCO DE BOGOTA	7	$1,018,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						$4,165,248	$666,600			$4,165,248	$166,800			$4,068,687	$162,900			$4,165,248	$21,900		$0	$0		$1,018,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						**$4,165,248**	**$666,600**			**$4,165,248**	**$166,800**			**$4,068,687**	**$162,900**			**$4,165,248**	**$21,900**		**$0**	**$0**		**$1,018,200**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						**$4,165,248**	**$666,600**			**$4,165,248**	**$166,800**			**$4,068,687**	**$162,900**			**$4,165,248**	**$21,900**		**$0**	**$0**		**$1,018,200**
1	CC	37341675	CARDENAS XIOMARA																		230901	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
2	CC	1098778433	CORREA JORGE	X																	231001	14	$409,642	$65,600	EPS002	14	$409,642	$16,400	CCF39	14	$409,642	$16,400	14-11	14	$409,642	$2,200	14	$0	$0	SI	$100,600
3	CC	91520802	PEREZ RAGDE																		230901	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
4	CC	1102354966	PINEDA DIEGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$781,242	$31,300	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$211,600
Total			**Afiliados(4)**																				$4,165,248	$666,600			$4,165,248	$166,800			$4,068,687	$162,900			$4,165,248	$21,900		$0	$0		$1,018,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	716452744	9408759111	E	2020/08/12	2020/08/19	BANCO DE BOGOTA	7	$1,018,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$666,600	$0	$0	$666,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$65,600	$0	$0	$65,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$460,500	$0	$0	$460,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$21,900	$0	$0	$21,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$21,900	$0	$0	$21,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$162,900	$0	$0	$162,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$162,900	$0	$0	$162,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$166,800	$0	$0	$166,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$16,400	$0	$0	$16,400
TOTAL				4	$1,018,200	$0	$0	$1,018,200

ACTA DE VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

De conformidad con el Decreto 1082 de 2.015, en la fecha se procede a verificar la Póliza de Garantía Única de Seguros de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales, presentada por **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS** identificado con NIT No.900.034.836-1 con Domicilio en la Carrera 51 # 27ª 48 PI 3 Bucaramanga -Santander, para amparar el Contrato No. **G-15-2021**, cuyo objeto es: **"OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN"**.

Para el efecto, se verifica la Póliza de Seguro de CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 96-44-101161593, expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, a favor del **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"**, la cual presenta el siguiente contenido:

PÓLIZA DE SEGURO			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE DD/MM/AA**	**VIGENCIA HASTA DD/MM/AA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$5.412.078.293.10	10/06/2021	25/01/2022
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$10.824.156.586.20	10/06/2021	25/07/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$16.236.234.879.30	10/06/2021	25/07/2022

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, se ajusta a lo requerido por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander "IDESAN" y en consecuencia queda verificada la Póliza de Seguros contenida en la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal a favor del IDESAN acá verificada.

En Bucaramanga, 11 de noviembre de 2021

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

Proyecto: DIEGO ALFREDO ORTIZ VEGA / CPS apoyo jurídico convenio 1113

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101161593	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2021	10	06	2021	00:00	25	07	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	NIT: 900.034.836-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 51 NRO. 51 - 70 LOS CEDROS	BUCARAMANGA, SANTANDER	3168774738

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER	NIT: 890.205.565-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 48 N 27 A 48 PI 3	BUCARAMANGA, SANTANDER	6430301

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. IP-GE-004-2021 REFERENTE A OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.

NOTA; EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO CUBRE EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2021	25/01/2022	$11,072,563.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2021	25/07/2024	$7,381,709.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2021	25/07/2022	$11,072,563.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, CON FECHA 23/07/2021

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******29,526,836.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DINORA CASTRILLON RUEDA	963262	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101161593

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: julian andres rojas navarro
Nro. de factura: 72519285
Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC
Nro. de referencia: 172.31.29.186
Nro. de referencia 2: 01
Nro. de referencia 3: 900034836
Fecha y hora de la transacción: Miércoles 13 de Octubre de 2021 02:45:07 PM
Nro. de comprobante: 0000064962
Valor pagado: $ 92,271.00
Cuenta: *******1045

Bancolombia S.A.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a servicioalcliente@bancolombia.com

Pago FIC
Proyecto Idexan
