INFORME FINAL	
NÚMERO DE CONTRATO: G-37-2021	FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 13 de octubre de 2021
CONTRATISTA:	SUPERVISOR:
NOMBRE: OBCELC S.A.S - NIT No. 804.007.343-1. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM COBOS MESA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 13'541.674 LUGAR DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Cra 11 # 41-44 local 8 int 5 García Rovira – Bucaramanga - 3177969486 - 3186388752	NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO CARGO: GERENTE RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No: 0314 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021. APOYO A SUPERVISION HERMES SUÁREZ CABALLERO

REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DE IDESAN, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE COLORADOS (PR 3+060 RUTA 45A08) Y EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08), SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CERO (PR 11+150 RUTA 45A08) Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (PR 18+000 RUTA 45A08).

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante las fechas 19 de noviembre de 2021 al 23 de diciembre 2021 son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD CODIGO 636		ROCERIA Y DESMONTE MANUAL					
PR							
INICIAL	FINAL	ANCHO PROMEDIO [m]	CANTIDAD [m2]	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 3+060	PR 18+000	4	56000	6	9.333	100%	Rocería de gran altura.

ACTIVIDAD CODIGO 340				LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG					
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 3+060	PR 18+000	1,4	1,4	14940	45A08	6	2490	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 425				LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG					
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m	VIA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 3+060	PR 18+000	1,5	1,5	14940	45A08	6	2490	100%	Cunetas colmatadas.

ACTIVIDAD CODIGO 625				LIMPIEZA DE CALZADA. (No se incluyemaquinaria)					
PR		DIMENSIONES							
INICIAL	FINAL	LONG	ANCHO	AREA	UNIDAD	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 3+060	PR 18+000	14940	7,5	112050	M2	6	18675	100%	En los recorridos rutinarios, se despejan la calzada de todo tipo de obstaculos como, rocas, ramas, etc.

ACTIVIDAD CODIGO 639					PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES				
PR		CANTIDAD							
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO und/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 3+060	PR 18+000	23	X	X	45A08	1	23	100%	Se realiza despeje de señales para su clara visualización por parte del usuario de la vía.

ACTIVIDAD CODIGO 678					LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES				
PR		CANTIDAD							
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 3+060	PR 18+000	367	x	x	45A08	2	183,5	100%	Se evidencia que muchas de estas señales están en mal estado y requieren cambio.

ACTIVIDAD CODIGO 694			VIGILANCIA					
PR		UND	CANTIDAD	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO km/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL							
PR 3+060	PR 18+000	km	15,94	45A08	2	7,97	100%	Sin novedad a resaltar.

CONCLUSIONES:

1. Se realizan actividades de mantenimiento rutinario de vía para mejorar la seguridad y el confort del usuario vial, mientras transite por esta.Entre las actividades adelantadas que se destacan están:

- Rocería y desmonte con la intención controlar la vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad.
- Poda, corte y/o retiro de árboles, despejando las señales de tránsito en la ruta.
- Limpieza de bermas y cunetas, eliminando tierra, basura u otros obstáculos encontrados.
- Limpieza manual de obras de más de 0.60 m2 de sección (de 24", 36" y box coulverts), eliminando tierra, basura, palos u otros obstáculos encontrados.


2. Durante el control de vigilancia realizado a la vía en mantenimiento no se destaca novedad importante a mencionar.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la entidad encargada, gestionar el retiro del material vegetal y escombros productos de las actividades realizadas, ya que este material mencionado constituye abono que agilizará el crecimiento de los pastos y estéticamente no da los resultados esperados.

ANEXOS



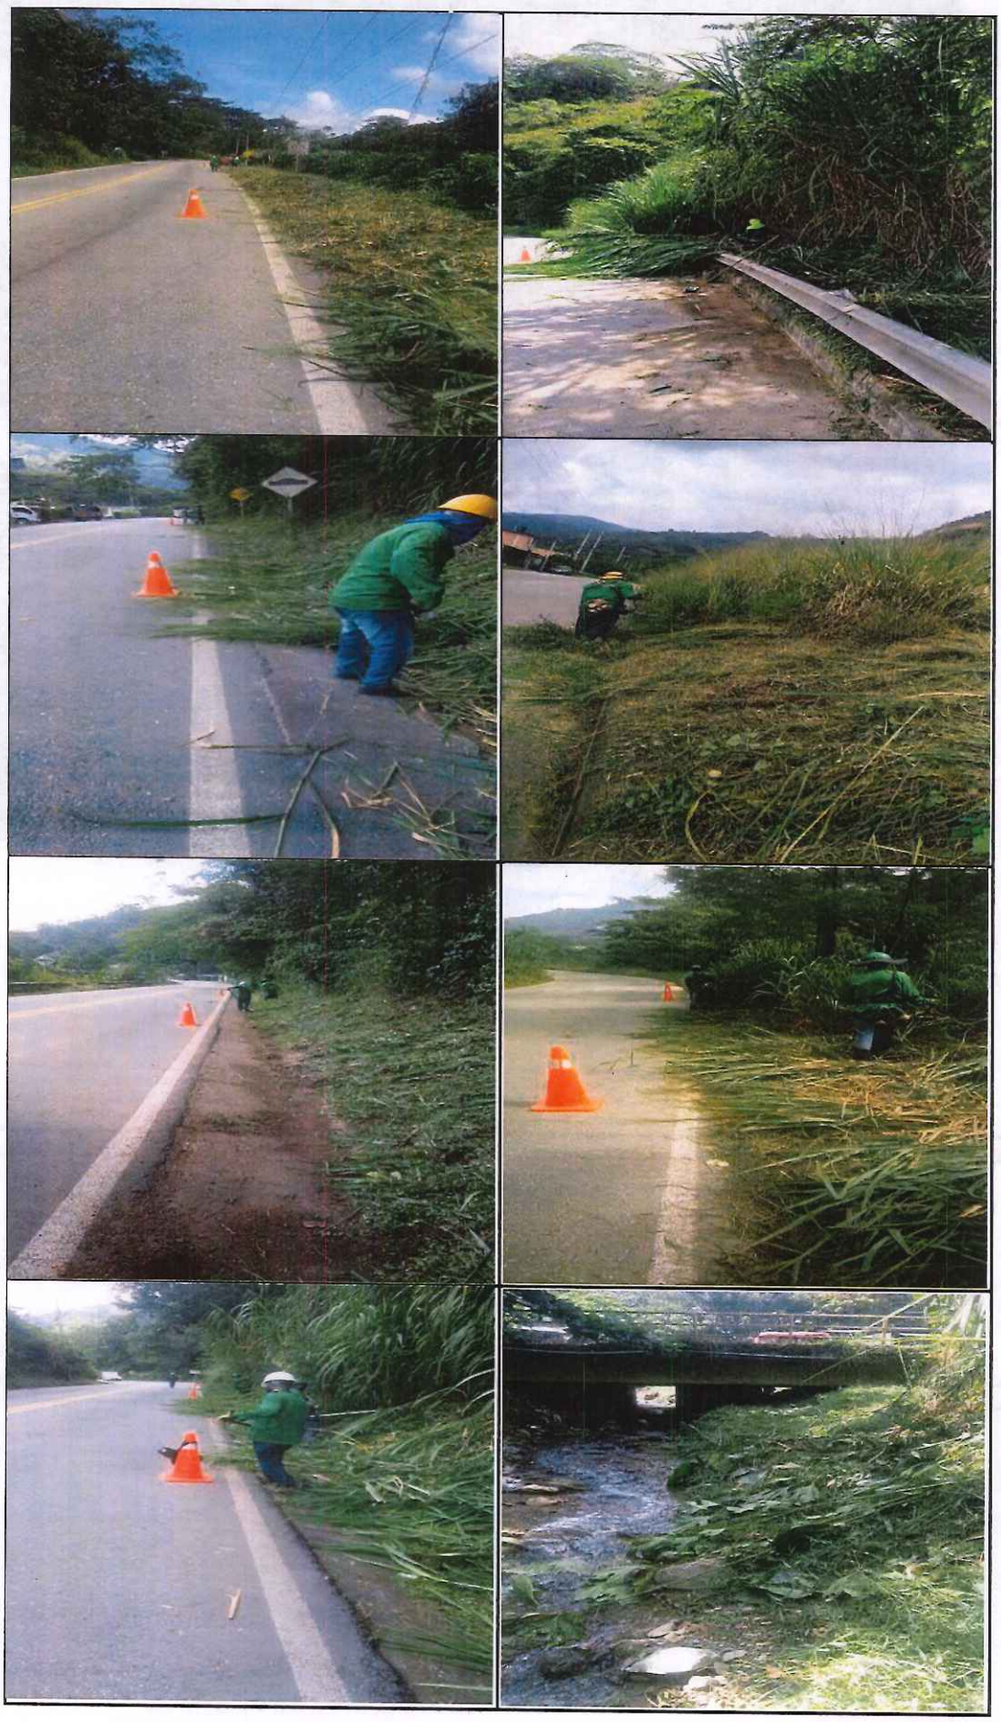



Nota : registro fotografico del PR 03 + 060 al PR 18 + 000

Se firma en Bucaramanga a los veinte tres (23) días del mes de diciembre de 2021.

ING. HERMES SUÁREZ CABALLERO
APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: WILLIAM COBOS MEZA
Contratista: OBCELC S.A.S
