
REVISIÓN

FECHA: 16/12/2021 A LAS 6 AM

El dia 26 siendo a las 12:30 am se procede a realizar la limpieza del pozo séptico, cabe resaltar que estas actividades se deben realizar a esta hora para evitar incomodidades por los olores que emanan del mismo.



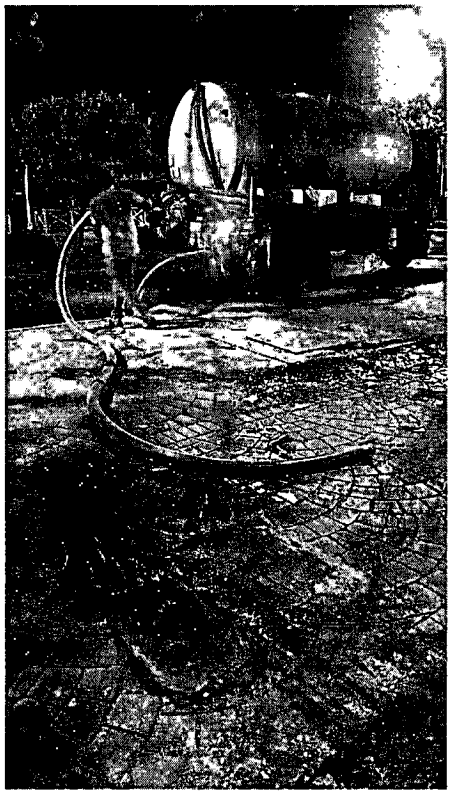

El mismo dia a las 6:00 am nuestro equipo de trabajo procedes a realizar el sondeo de la tuberia existente como lo dice el punto 7 del presente contrato, encontramos que los 35 metros de tuberia existentes se encuentra sedimentada, bien sea; con grasa, arena y demas...

La tubería existente es de 4 pulgadas, no es suficiente para atender las necesidades en volumen de descargas que debe manejar la gobernacion departamental.

SISTEMA ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTANTAL DE SAN ANDRES ISLAS

Contrato: 0046-2021

29 DICIEMBRE

INGENIERO VICENTE FERNANDEZ SANTANA
Creado por: ARQ. JORGE MENDOZA BORJA

VICENTE FERNÁNDEZ SANTANA.
Ingeniero Civil
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍAS

Conclusiones:

Es necesario realizar la deshabilitación de la tubería existente dado que por falta de mantenimiento periódico de la misma se colmató y sedimentó al punto de encontrarse en un 70% obstruida.

Una vez generada esta anulación se debe instalar tuberia nueva de mayor diametro para evitar la colmatación y soporte el gran caudal que maneja la edificación.

Se dede construir otro registro de 80 x 80 x 80 para darle mejor manejo y que el mantenimiento futuro sea mucho mas facil.

Nota:

Una vez realizada estas actividades se recomienda realizar una consultoría técnica a todo el sistema

Atentamente:

Jorge Mendoza Borja.
Residente.

Vicente Hernandez Santana.
Representante legal.
