SOPORTES ADICIONALES EJECUCIÓN

ACEPTACIÓN OFERTA

No. 179-CENACAVIACION-2021

Contratista: CONSTRUC CITY LTDA

Supervisor: CT. JUAN PABLO GONZÁLEZ GÓMEZ

BITÁCORA DE OBRA

ACEPTACIÓN OFERTA

No. 179-CENACAVIACION-2021

Contratista: CONSTRUC CITY LTDA

Supervisor: CT. JUAN PABLO GONZÁLEZ GÓMEZ

Bitacora de obra.
Adecuación Y Mantenimiento del Hangar de transportes destinado al Mantenimiento de los sistemas de combustibles de Aviación

Contratista: Construc city ltda.

Contratante: Ejercito Nacional.

Ingeniero Residente: Fernando Valencia

Supervisor: Capitan Juan Gonzalez.

24 | 08 | 2021

Inicio de obra: El dia 24 de agosto del 2021 se inicio formalmente el proyecto con un recorrido a las instalaciones donde se realizo una inspeccion visual donde se realizarian los trabajo. Se tomaron medidas con el animo de realizar un esquema y un levantamiento preliminar. Se realizo una reunion donde se tomaron puntos importantes como el palmo de Contrato y la programacion de las activi dades entre otras cosas.

Asistentes: Ingeniero Fernando Valencia
Capitan Juan Gonzalez.
Ingeniero Carlos Tellez.

Residente.

Directa Obra.

031 | 08 | 2021

Actividad: Se realiza apique en el terreno con el fin de realizar un informe de capacidad portante y perfil de terreno y ese dia se realizo un levantamiento topografico para la ubicacion de los elementos estructurales. Se realizo metodo manual para la busqueda de la subrasante. se encontro el nivel freatico a una profundidad de 95 cm sin encontrar subrante. A 110 cm aun no se encuentra y se decide dejar la excavacion, se extrae una muestra a 60 cm y es llevada al laboratorio para su analisis. Con esto se concluye el dia de hoy.

Asistentes.

Residente: Fernando Valencia


Capitan Juan Gonzalez.

Personal estudio de Suelos

24 | 09 | 2021

Actividad: limpeza de cajas de inspección, se inicio a las 7:00 am con el señor maestro luis murroquin quien destapo y limpio todas las cajas de inspección, encontrando gran cantidad de escombro y muchas de ellas con las tapas en mal estado.


Asistentes: Ing, Fernando Valencia.
Capitan Juan Gonzalez.
Luis Murroquin.

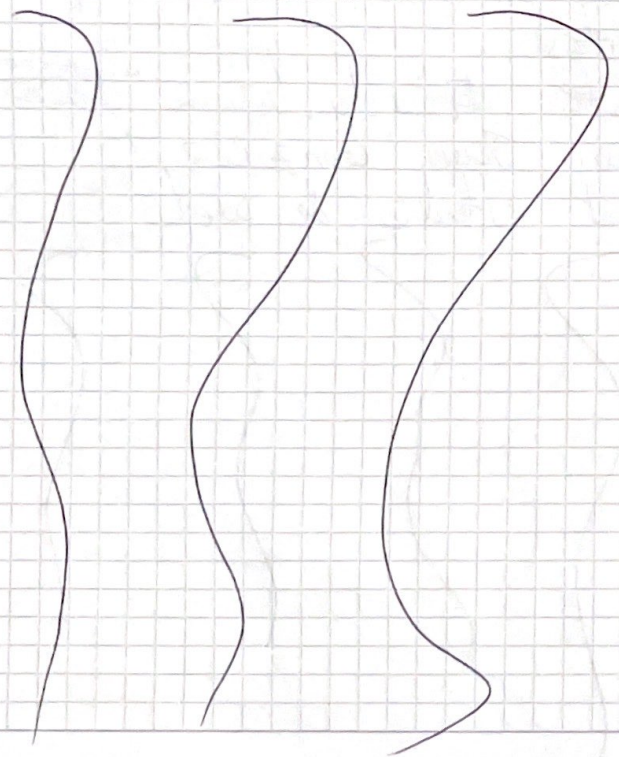

27 | 09 | 2021

Actividad: Se continua con la actividad de limpieza de cajas de inspeccion con los trabajadores de constructy. se encontraron cuatro cajas de inspeccion las cuales se dejan funcionando correctamente.

Asistentes: Ingeniero Fernando Valencia
Maestro luis Murroquin.

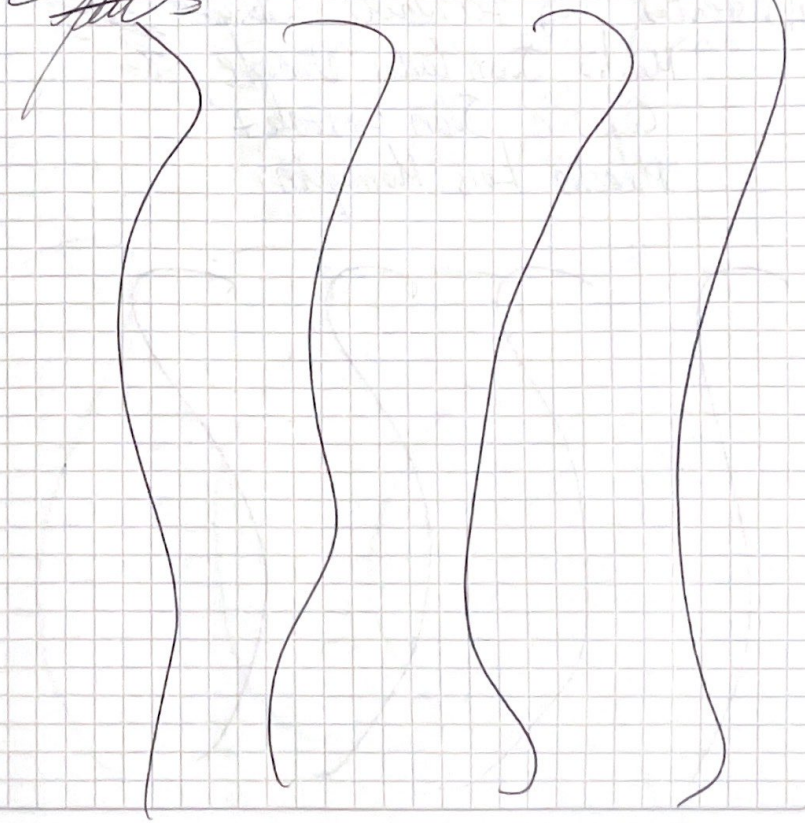

6 | 10 | 2021

Actividad: Excavación mecanica: Se inician labores de la excavacion mecanica con una pajarita se inicio en el sentido norte con supervision del maestro Juan Carlos se encuentra material de relleno y se tiene mucho cuidado con la profundidad de la excavacion entre 45 y 50 cm llegan volqueta tipo doble troque de 16 m^3 - 18 m^3 se continua todo el dia con la excavacion.

Asistentes: Ing Fernando Valencia

Maestro, Juan Carlos Dimate

Capitan Juan Gonzalez

Maestro Luis Marroquin.

7 | 10 | 2021

Actividad: Se continua con la excavación de la segunda mitad del terreno constado sur, donde se verifican los niveles, y temas corresponde a la excavacion, la maquina retira material relleno en doble troques, se verifican que todos los volquetos cumplan con el cargue y cubiertas con cargas, se ponen personal de limpieza de frentes y calles.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Maestro Juan Carlos Dimate

Capataz Juan Gonzalez

Maestro Luis Marroquin.

8 | 10 | 2021

Actividad: Se continua con la actividad de excavación, se termina con la perfilación del terreno y el retiro de los ultimos viajes de material, se verifican niveles y se empieza con la actividad de tejer el Geotextil para la instalación, se revisa que las uñas tengan y cumplan perfecto el reglamento de tema ambiental.

Asistente: Ing. Fernando Valencia

Maestro: Juan Carlos Dimate

Maestro: Luis Marroquin.

Capitan Juan Gonzalez.

Fin de Semana

11 | 10 | 2021

Actividad: instalación de Geotextil tejido Durante el dia de hoy se instalo el geotextil tejido por toda la superficie del terreno? se verifica que este bien tejido en las uniones y que cubra la totalidad de la superficie a intervenir. Siempre con la vigilancia de personal calificado.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Maestro: Juan Dimate

Maestro Luis Marroquin.

Capitan Juan Gonzalez.

12 | 10 | 2021

Actividad: Suministro de Rajon e instalación se inicio con la colocación del rajon segun las especificaciones sugeridas sobre el geotextil con el fin de soportar la base llegan volquetas y la retroexcavadora ayuda a la extencion del material.

Asistente Ing. Fernando Valencia

Maestro Juan Carlos Pimateo

Capitan Juan Gonzalez

13 | 10 | 2021

Actividad: Luego de la aplicación de rajon y las actividades predesesoras, se continua con la extension de la base B400 Cumpliendo con los espesores correspondientes; segun las recomendaciones geotecnicas se verifican que el material llegue con la humedad adecuada y que la retro y el bobcat esparsan bien este material el maestro Vergilio los niveles en compañia del ingeniero residente; el trabajo continua durante todo el dia

Asistentes: Ing. Fernando Valencia G

Maestro: Juan carlos Pimateo.

Capitan Juan Gonzalez.

Maestro: Luis Marroquin.

Personal operarios de volquetes.

14 | 10 | 2021

Actividad. Se continua con la colocación del material base B-400 en el costado Sur, llega la totalidad del material y se continua con la compactación del mismo, llega material electrico a la obra y se realiza una inspección visual por parte del personal que va a fundir los pasos, el maestro y el ingeniero continua con las labores de nivelación y revisión de la colocación de dicho material.

Asistentes. Ing. Fernando Valencia

Maestro: Juan Carlos Dimatea

Capitan Juan Gonzalez

Maestro Luis Morroquin.

15 | 10 | 2021

Actividad. Se inicio la construcción con ladrillo recocido, el corcamo que quedo ubicado en un costado del hangar, se inician los conexiones hidraulicas y electricas que tendrán lugar dentro de la placa, se inicio tambien la obra de trompa de grasas. se revisan las conexiones hidraulicas asi como los pendientes de estos.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Maestro: Juan Carlos Dimatea

Capitan Juan Gonzalez

Maestro: Luis Morroquin

16 | 10 | 2021

Actividad: Se continua con la construcción del Cercamo perimetral en ladrillo, se continua con la construcción de la rampa de ingreso, son sus respectivos tubos de agua de 4" se pañeta el interior y se dejan listos estas actividades en la parte electrica el señor tecnico recibio Leon continua con las acometidas electrica instalacion de tuberia emt y instalaciones interiores antes de la fundida de placa tendido de redes para el baño etc.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia6

Maestro Juan carlos Dimateca

Capitan, Juan Gonzalez.

Maestro Luis Marroquin.

tecnico Abselon León

17-10-2021 Domingo

18 | 10 | 2021

Actividad: Se inicio la fundida de la placa de concreto con la empresa propisos y la concretera cumpremobil. iniciamo con la colocacion de la formaleta perimetral y la colocacion del plastico inferior, previamente se habian tomado las muestras de las densidades donde el 99% el porcentaje de compactacion, durante la fundida se tomaron 6 cilindros con el cono (cono 8-9") de asentamiento, Concreto resistente a flexion MSR41 y se le adiciono fibra metalica y mineral para reforzar, un buen manejo y resistencia, la fundida termina a las 12:30 pm, alrededor de las 8 pm se realizan los cortes de juntas para dejar descansar la placa, se adiciono endurecedor y la curadora correspondiente, remates en rampas y accesos al anger.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia6

Ing. Carlos tellez.

Maestro Juan Carlos Dimateca.

Capitan Juan Gonzalez

Maestro Luis Marroquin.

19 | 10 | 2021

Actividad: Se continue con la fundida de placa en actividades como granallado y helicoptero para darle el acabado optimo a esta; todo esto se realizo durante la noche y madrugada se realizo el desmonte de esta y se continuo con trabajos electricos en la parte del angar, tambien se iniciaron actividades del pilote perimetral y de instalaciones hidraulicos, se inician tambien actividades de mamposteria y pañete.

Asistentes: Ingo. Fernando Valencia

Maestros: Juan Carlos Dimatea
Luis Marroquin
Absalon Leon
Leonardo Castañeda

Capitan Juan Gonzalez.

20 | 10 | 2021

Actividades: Se continuo con la elaboracion del sobrecimiento geodren en la excavacion perimetral donde se verificaron niveles y descoles del patio se trabajara con un geodren de 50cm y una tuberia perforada de 4" en ambos lados y el geodren tendra una profundidad de 150cm, tambien se continua con el montaje de las instalaciones electricas realizando cajas y uniones de tuberias se realizo el vaciado y fraguado del concreto y el personal de pisos continua trabajando en el tema de remates y cortes, se colocan las luminarias del hangar se iniciaron tambien los muros en bloque para el capo

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Maestros: Juan Carlos Dimatea
Luis Marroquin
Absalon Leon
Leonardo Castañeda

Ing. Carlos Tellez

Capitan Juan Gonzalez.

21 | 10 | 2021

Actividades: Se continua con las actividades de mampostería, hidraulicas y terminado actividades de cortes de placa y remates del filtro frances, se realiza un correspondiente Aseo de la obra y se definen puntos electricos e hidraulicos en el baño.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia
Ing. Carlos Tellez.

Maestros: Juan Carlos Dimoteo
Luis Marroquin
Absalon Leon
Leonardo Castañeda

Capitan: Juan Gonzalez.

22 | 10 | 2021

Actividades: Se terminan y se prueban las instalaciones electricas, hidraulicas y de mampostria como el gabete etc. Se solicita la instalacion de una llave para el lavado de los equipos se trabaja tambien reforsando la trampa de grasas y sifones. Asi como en los remates del filtro frances.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia
Ing. Carlos Tellez.

Maestros: Absalon Leon
Juan Carlos Dimoteo
Luis Marroquin
Leonardo Castañeda

Capitan: Juan Gonzalez.

23 | 10 | 2021

Actividades: Se continua con todo el tema de mamposteria y remate de obra gris. Se realiza una limpieza y Aseo general de la obra y se realiza el pragua e hidratacion del concreto.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia.
Ing. Carlos Tellez

Maestros Juan Carlos Dimateo
Luis Marroquin

Capataz Juan Gonzalez.

24-10-2021 Domingo.

25 | 10 | 2021

Actividade: Se continue con el Afinado de Piso para el baño se empeza con la conformacion de enchape y pintura exterior del baño se verifican instalaciones sanitarios, luego a lo de el enchape y los aparatos sanitarios.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia
Ing. Carlos, Tellez.

Maestros Juan carlos, Dimateo
Luis Marroquin

Capataz Juan Gonzalez.

26 | 10 | 2021

Actividades: Se continua con todo lo correspondiente al enchape y remates de baño con los remates de pintura y pisos, y la instalacion de llaves exteriores y del baño.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Maestro Juan carlos Dimateo

Luis Murroquin

Capaton Juan Gontalez.

27 | 10 | 2021

Actividades: Se inicia el enchape del baño por los muros interno, se revisa el forme y se da la aprobacion del mismo. Se continua con la pintura de baño.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Maestro Luis Murroquin

Capaton Juan Gontalez

28 | 10 | 2021

Actividades: Se continua con el enchape de muros y pisos del baño, todo el dia se realiza esta actividad.

Asistente Ing. Fernando Valencia

Ing. Carlos Tellez.

Maestro Luis Murrogun.

Capataz Juan Gonzalez.

29 | 10 | 2021

Actividad: Se instala los aguilles de Piso y los demas Aparatos Sanitarios correspondiente se termina la actividad de enchapes con la boquilla de los mismos, Se completa la pintura y los demas actividades hidraulicas.

Asistentes: Ing. Fernando Valencia

Ing. Carlos Tellez.

Maestro Luis Murrogun. No se instalan aparatos sanitarios por

Capataz Juan Gonzalez. presión del servicio


02 | 11 | 202

Actividades: remates y Aseo General de la obra, retiro de herramienta y entrega de la obra al encargado Capitan Juan Gonzalez se deja todo en correcto funcionamiento y sin ninguna novedad.

Asistentes Ing. Fernando Valencia
Ing. Carlos Tellez
Maestro Luis Marroquin
Capitan Juan Gonzalez

Nose instalan aparatos sanitarios por presión de agua

Fin de obra

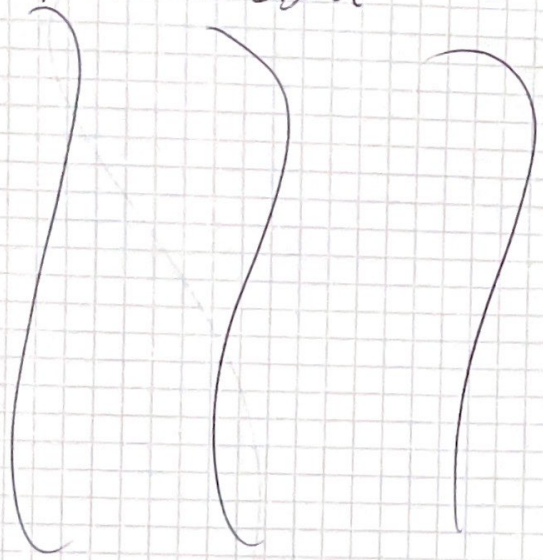


24 | 11 | 2021

Actividad: se realizan las actividades correspondientes a la instalación de Aparatos Sanitarios. y remates de la misma con esto entregamos la totalidad de los items presupuestados.

Asistentes: Ing Fernando Valencia
Maestro Luis Marroquin.
Capitan Juan Gonzalez.

Fin de obra.

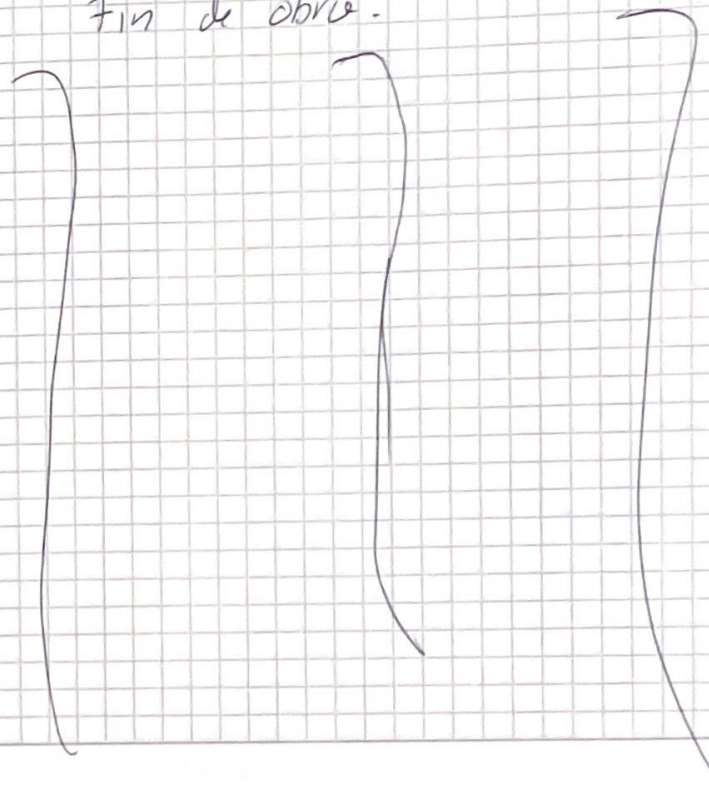

HOJAS DE VIDA APROBADAS DURANTE EJECUCIÓN

ACEPTACIÓN OFERTA

No. 179-CENACAVIACION-2021

Contratista: CONSTRUC CITY LTDA

Supervisor: CT. JUAN PABLO GONZÁLEZ GÓMEZ

ABSALON LEON RODRIGUEZ
C.C. No. 413.135 de Tibacuy (Cundinamarca)



FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Octubre 20 de 1952 Tibacuy (Cundinamarca)
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDENCIA: Carrera 97 I No. 22 G – 35 Fontibon
TELEFONOS: 415 87 45 – 311 806 41 93

PERFIL PROFESIONAL

Le aporto a mi trabajo lo mejor, honestidad, responsabilidad y cumplimiento.
Mi labor esta enfocada hacia el progreso del país, con gente competente y teniendo como base una formación integral.
El tiempo que he trabajado me ha destacado como una persona responsable en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto en el ámbito personal como para la empresa.
El buen trato y actitud positiva frente a las situaciones que nos rodean, son la base de una excelente comprensión, comunicación y entendimiento, logrando con esto obtener resultados positivos de ambas partes, hasta el punto de formar un equipo de trabajo bien estructurado.

ESTUDIOS RAELIZADOS

SECUNDARIO

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
BALSALICE - FUSAGASUGA
Séptimo de Bachillerato – 1969

INTERESES

Pertenecer a esta prestigiosa empresa, considerando que con mi experiencia laboral, logre generar un aporte importante en el cumplimiento de objetivos y generación de ideas, de acuerdo a las tareas encomendadas, y a si mismo crecer junto a ustedes personal y profesionalmente.

REFERENCIAS PERSONALES

SEGUNDISALBO PARDO
Arquitecto
8027314 – 320 347 30 80

HENRY CHAVEZ
Contador
2211523 – 428 62 93

REFERENCIAS FAMILIARES

GUSTAVO LEON
Asesor Forestar
5788944

JORGE CORTES
Estilista
293 28 67

ABSALON LEON RODRIGUEZ
C.C. No. 413.135 de Tibacuy (Cundinamarca)

Los datos aquí registrados pueden ser verificados en cualquier momento.

OTROS

SENA
ELECTRICISTA
ALCATEL DE COLOMBIA
2 Años 1976 –.1977

EXPERIENCIA LABORAL

ARQUICTURA Y TALLER
Electricista
Julio de 2005 Diciembre de 2012
Julio de 2008 - Actual
802 73 14

ARQUITECTOS Y ASOCIADOS
Electricista
Junio de 2005 a Febrero de 2006
245 62 60

SERGEMA
Electricista
Octubre de 1995 a Marzo de 2003

NSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Electricista Industrial
Enero 1 de 1994 a Septiembre 30 de 1995

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
Electricista Industrial
Febrero 23 de 1977 a Diciembre 31 de 1993

ASCENSORES CHINDLER DE COLOMBIA S.A.
Operario
Abril 14 de 1974 a Febrero 22 de 1977

ABSALON LEON RODRIGEZ

calle 18b # 100 -49 Bogotá, Colombia - Casado
Identificación: 413135 - Edad: 54 Años
Teléfono: 571-4158748 - Celular: 3118064193
absalonleon@hotmail.com

Perfil Profesional

Estudios Formales

Escuela Urbana San Juan Bosco
Básica Primaria
Graduado, 12/12/1964

Instituto Técnico Agrícola Salesiano Valsalice
Bachiller Académico
Graduado, 01/12/1969

Capacitación

electrisista
Sena 12/12/1977

telefonia
ALCATEL DE COLOMBIA 12/12/1989

Experiencia Laboral

ASCENSORES CHINDLER DE COLOMBIA SA
Operario, muelle
Fecha Inicial: 14/04/1974 - Fecha Final: 22/02/1977

Funciones:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
Electricista, industrial
Fecha Inicial: 23/02/1977 - Fecha Final: 31/12/1993

Funciones:
* Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico.
* Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros.
* Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros instrumentos y equipo de prueba eléctrica.
* Instalar y mantener equipo eléctrico y aparatos en estaciones de generación de energía.

* Instalar y mantener transformadores generadores, reguladores de voltaje y otros equipos de distribución de energía.
* Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores, ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.
* Instalar, probar, reparar y mantener motores eléctricos, generadores, baterías y sistemas de control eléctrico, hidráulico y neumático.
* Interpretar los planos y especificaciones de los códigos eléctricos para determinar la ubicación de las instalaciones del equipo eléctrico industrial.
* Mantener, reparar, instalar y probar interruptores, transformadores, tableros de distribución, reguladores y reactores.
* Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Electricista, industrial
Fecha Inicial: 01/01/1994 - Fecha Final: 30/09/1995

Funciones:
* Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico.
* Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros.
* Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros instrumentos y equipo de prueba eléctrica.
* Instalar y mantener equipo eléctrico y aparatos en estaciones de generación de energía.
* Instalar y mantener transformadores generadores, reguladores de voltaje y otros equipos de distribución de energía.
* Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores, ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.
* Instalar, probar, reparar y mantener motores eléctricos, generadores, baterías y sistemas de control eléctrico, hidráulico y neumático.
* Interpretar los planos y especificaciones de los códigos eléctricos para determinar la ubicación de las instalaciones del equipo eléctrico industrial.
* Mantener, reparar, instalar y probar interruptores, transformadores, tableros de distribución, reguladores y reactores.
* Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia.

SERGEMA
Electricista, construcción
Fecha Inicial: 10/10/1995 - Fecha Final: 03/03/2003

Funciones:
* Aislar las fallas en el sistema eléctrico, remover y reemplazar las piezas defectuosas.
* Conectar energía eléctrica a equipos de sonido, visual o de comunicación, señalización o sistemas de calefacción.
* Cumplir programas de mantenimiento preventivo.
* Empalmar y conectar los cables a los aparatos y componentes para formar los circuitos.
* Instalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación y aparatos de distribución y control eléctrico como interruptores, reguladores y tablero de interrupción automática.
* Interpretar planos y especificaciones de código eléctrico para determinar la ubicación del cableado de las instalaciones nuevas o existentes.
* Probar la continuidad de los circuitos utilizando equipo de prueba para garantizar la compatibilidad y seguridad del sistema y continuar con la instalación, cambio o reparación.
* Tender el cableado a través de los conductos, paredes y pisos.
* Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.

ARQUITECTURA Y TALLES
Electricistas Industriales
Fecha Inicial: 05/06/2003 - Fecha Final: 12/12/2004

Funciones:
* Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico.
* Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros.
* Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros instrumentos y equipo de prueba eléctrica.
* Instalar y mantener equipo eléctrico y aparatos en estaciones de generación de energía.
* Instalar y mantener transformadores generadores, reguladores de voltaje y otros equipos de distribución de energía.
* Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores,

ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.
* Instalar, probar, reparar y mantener motores eléctricos, generadores, baterías y sistemas de control eléctrico, hidráulico y neumático.
* Interpretar los planos y especificaciones de los códigos eléctricos para determinar la ubicación de las instalaciones del equipo eléctrico industrial.
* Mantener, reparar, instalar y probar interruptores, transformadores, tableros de distribución, reguladores y reactores.
* Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia.

ARQUITECTOS Y ASOCIADOS
Electricista, industrial
Fecha Inicial: 06/06/2005 - Fecha Final: 02/02/2006

Funciones:
* Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico.
* Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros.
* Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros instrumentos y equipo de prueba eléctrica.
* Instalar y mantener equipo eléctrico y aparatos en estaciones de generación de energía.
* Instalar y mantener transformadores generadores, reguladores de voltaje y otros equipos de distribución de energía.
* Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores, ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.
* Instalar, probar, reparar y mantener motores eléctricos, generadores, baterías y sistemas de control eléctrico, hidráulico y neumático.
* Interpretar los planos y especificaciones de los códigos eléctricos para determinar la ubicación de las instalaciones del equipo eléctrico industrial.
* Mantener, reparar, instalar y probar interruptores, transformadores, tableros de distribución, reguladores y reactores.
* Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia.

Imprimir Guardar

ALCATEL

TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT

This certifies that

Absalón León Rodriguez

satisfactorily completed a course of study in

BCN. 5200 R1P / R2P / R3P

Walter E
MANAGER SYSTEM DIVISION

Pedro Jurado
DIRECTOR, TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT

DATE: NOVEMBER 26-30 AND DECEMBER 3-4 / 1990

REPUBLICA DE COLOMBIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"

REGIONAL DE BOGOTA

CERTIFICA

Que **ABSALON LEON RODRIGUEZ**

Es APTO para desempeñar el oficio de

ELECTRICISTA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

Cursos recibidos y aprobados

INSTALACIONES- AUXILIAR DE MANTO- MANTO DE MOTORES
MANTO DE TRANSFORMADORES- AUXILIAR DE BOBINADOS.

Modo de Formación:

COMPLEMENTACION

Duración total 660 - horas

Gerente Regional

Sub-Gerente de Operaciones

Superintendente del Centro

Secretario

Centro de Formación ELECTRICIDAD Y ELECTRON de BOGOTA Fecha DIC. -1977 Registro No. 1694

Código B

IMPRESO CENTRO DE ARTES GRAFICAS SENA BOGOTA

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

24090

CERTIFICADO DE VIGENCIA

EL CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS "CONTE"

HACE CONSTAR

Que verificada la información existente en las bases de datos del **CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS**, a la fecha, el señor **ABSALON LEON RODRIGUEZ** con la Cédula de Ciudadanía número: 413135 portador de la Matrícula Profesional de Técnico Electricista **MTE. 413135-52333,** NO registra antecedentes disciplinarios. Por lo anterior, su Matrícula se encuentra vigente.

Así mismo, para verificar las clases otorgadas en la Matrícula Profesional de Técnico Electricista número **MTE. 413135-52333**, ingrese a la página web www.conte.org.co, en el botón “consulte su matrícula” o escanee el código QR que se encuentra al final del documento.

Para constancia se expide en Bogotá, D. C., el viernes 09 de julio de 2021, a solicitud del interesado. (Vigencia: tres (3) meses).

Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE
contactenos@conte.org.co www.conte.org.co
(57+1) 7451350
Av. Calle 40 A No. 13-09 piso 9 Edificio UGI
Bogotá D.C., COLOMBIA
Nit. 800155559-2

En uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta que

Absalon León Rodríguez

C.C. 413135

Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos y conforme a la resolución M-C071755 de 28-11-2013

Otorga

Matricula Profesional de Técnico Electricista
MTE. 413135-52333

De conformidad con la clasificación de actividades de qué trata el artículo 3º del decreto reglamentario 991 de 1991, en las siguientes clases:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas, luminarias, interruptores, tableros de distribución de circuitos, equipo de medida, protección, control, señalización, conexiones especiales y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

TE-2 TECNICO EN BOBINADOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al mantenimiento, reparación, montaje y conexión de transformadores eléctricos, motores eléctricos, generadores eléctricos y equipos de instalaciones eléctricas; así como al mando de motores eléctricos y generadores eléctricos.

TE-3 TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, relacionadas con instrumentación, accionamiento y control de máquinas, equipos y aparatos mecánicos, equipos y aparatos hidráulicos y equipos y aparatos neumáticos.

TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de transformadores eléctricos.

TE-5 TECNICO EN REDES ELECTRICAS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado a la construcción y montaje de redes eléctricas aéreas, redes eléctricas subterráneas y subestaciones eléctricas de distribución.

Dada en Bogotá, D.C., 18 DIC. 2013

WILSON OCHOA
Presidente CONTE

Rad. 66074



JUAN CARLOS DIMATE ZUÑIGA
Tecnólogo en Topografía maestro general de obra
Cedula: 80246513 de Bogotá
Dg 28 # 31-60 apto 102 in 3
Teléfonos: 9001159
Celular: 3145717854
juancarlosdimatezuniga@gmail.com
Estado civil: casado

PERFIL PROFESIONAL

Soy una persona que me caracterizo en aprender fácil, con experiencia y desempeño en manejo de personal, topógrafo, maestro general de obra, y Cualquier rama de obra civil y construcción, caracterizándome por mi iniciativa, responsabilidad dedicación, excelentes relaciones interpersonales, son actitudes que me caracterizan para ser una persona honesta y responsable.

FORMACIÓN ACADEMICA

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA
Dos años cursados de la tecnología
Año de terminación 2017

CURSOS REALIZADOS
Comunicación asertiva en equipos de trabajó
Sostenibilidad hidrológica en los suelos en las construcciones de vivienda

BACHILLER ACADÉMICO
Seis años cursados de secundaria
Año de terminación 2009

BASICA PRIMARIA
Cinco años *cursados*
Escuela distrital santa rosita las vegas

EXPERIENCIA LABORAL

TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES DYG S.A.S
Maestro general
Fecha de Inicio: 20 de septiembre del 2020
Fecha de Retiro: 15 de agosto del 2021
Retiro: terminación de proyecto
Dirección: CR 87 J # 69 A 27 sur
Cargos desempeñados: informes, interpretación de planos, manejo de personal, cimentaciones, plomería, redes hidráulicas, mampostería
Jefe inmediato: NANCY CASTRO teléfono 3203445076

PHA INGENIEROS S.A.S.
Maestro general
Fecha de Inicio: 08 de mayo del 2017
Fecha de Retiro: 02 de septiembre del 2020
Terminación de obra
Dirección: CR 13 K # 34 – 04 sur
Teléfono: 3183365225
Cargos desempeñados: replanteos, supervisión de personal, redes húmedas y secas, aplicación de concretos, asfaltos, espacio público, plomería, urbanismo
Jefe inmediato: JOSE MEJIA teléfono 3183365225

H.A CIVIL S.A.S
Maestro general de obra
Fecha de Inicio: 10 de mayo del 2015
Fecha de Retiro: 28 de marzo del 2017
Finalización de obra
Dirección: car 77 # 60 sur 45
Teléfono: 7791229
Cargos desempeñados: maestro de construcción, manejo de personal a cargo,
Jefe inmediato: ALEXANDER HUERTAS (representante legal)

H. A. T INGENIUN
Maestro general de obra
Fecha de Inicio: 5 octubre de 2013
Fecha de Retiro: 28 de abril de 2015
Finalización de obra
Dirección: Calle94b#56-57
Teléfono: 3125281559
Cargos desempeñados: maestro de construcción, manejo de personal a cargo,
Jefe inmediato: MILTON AVILA (ingeniero residente)

CONCRESCOL
Contra maestro
Fecha de Inicio: 04 de septiembre de 2011
Fecha de Retiro: 15 de agosto de 2013
Dirección: Carrera 40 No 97 40
Teléfono: 3125281559
Cargos desempeñados: interpretación de planos, manejo de personal
Jefe inmediato: MILTON AVILA (ingeniero residente)

OSVALDO GUTIERES
Encargado de obra
Fecha de Inicio: 01 de marzo de 2009
Fecha de Retiro: 27 de Julio de 2011
Dirección: Carrera 19 No 28 -15
Teléfono: 3125504989
Cargos desempeñados: oficial de obra y manejo de personal
Jefe inmediato: OSVALDO GUTIERES (contratista)

REFERENCIAS PERSONALES

DANIEL ARTURO ROJAS RODRIGUEZ
Operario
Teléfono: 3112344001
indócil

NANCY CASTRO
Administradora
Teléfono: 3203445076
Topografía y construcciones DYG S.A.S.

REFERENCIA FAMILIARES

GLORIA DIMATE
Ama de casa
Teléfono: 3113810212

HECTOR MANUEL DIMATE
Empleado:
Teléfono: 3222874676
H.A.T INGENIUN

JUAN CARLOS DIMATE ZUÑIGA
C.C.80246513 de BOGOTA

Para todos los efectos legales, certifico que toda la información dada por mi; en la presente hoja de vida son veraces

(C.S.T. art. 62 mum 1) Régimen Labara
