CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATD OBRA

Codigo. FALCO - PGJ
VERSIÓN 1

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No	000409 DE 2021
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :	728 DEL 30 DEJUNIO DEL 2021
CONTRATISTA:	OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
SUPERVISOR:	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN OE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES MESES (03) CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

2.-PARTES QUE INTERVIENEN 29 DIC 202

En Popayán a los dias del mes de diciembre del 2021, se reunieron los Señores, OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ con cedula N° 34563335 de Popayán, Contratista de obra , El Ingeniero YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Director General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C., LA Ecologa CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ en calidad de Subdirectora Defensa del Patrimonio Ambiental y el Ingeniero ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA en calidad de Supervisor, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final de Obra.

3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
INICIACION CONTRATO:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SUSPENSION Nro. 001	N/A
REINICIACION Nro. 001	N/A
OTRO SI Nro.	N/A
ACTA RECIBO N° 02 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DEL 2021
VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	15 DE DICIEMBRE DEL 2021

4.- VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 165.641.809,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO :	$ 165.636.069,00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO :	$ 5.740,00

5.- OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
	2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021 VILLA NUEVA - PIENDAMÓ				
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	447	$ 1.871,00	$ 836.337,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENDS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0.60m	m3	39,52	$ 17.263,00	$ 682.234,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	3,7	$ 45.548,00	$ 168.528,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	14	$ 28.742,00	$ 402.388,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CDNCRETOS**				
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	132,4	$ 49.955,00	$ 6.614.042,00
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	11,2	$ 57.796,00	$ 647.315,00

0004

3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	34	$ 76.652,00	$ 2.606.168,00
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	10,4	$ 130.706,00	$ 1.359.342,00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 95.257,00	$ 285.771,00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	9	$ 87.531,00	$ 787.779,00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104.863,00	$ 314.589,00
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 115.914,00	$ 231.828,00
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9.577.141,00	$ 9.577.141,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.145.865,00	$ 2.291.730,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493.826,00	$ 1.481.478,00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 848.058,00	$ 1.696.116,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 257.739,00	$ 773.217,00
4.6	Pintura para llantas existentes para juegos infantiles.	und		$ 26.750,00	
5.	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	45.4	$ 63.050,00	$ 2.862.470,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	246,12	$ 21.667,00	$ 5.332.682,00
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	49,3	$ 14.353,00	$ 707.603,00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	22	$ 17.381,00	$ 382.382,00
5.5	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	4	$ 22.032,00	$ 88.128,00
5.6	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	14	$ 55.926,00	$ 782.964,00
5.7	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	3	$ 160.456,00	$ 481.368,00
5.8	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	174	$ 20.318,00	$ 3.535.332,00
5.9	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"	ml	36,3	$ 35.250,00	$ 1.279.575,00

5.10	Arena para juegos infantiles	m3	5	$ 155.569,00	$ 777.845,00
	2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021 AMAGÁ-PIENDAMO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	426	$ 1.871,00	$ 797.046,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0.60m	m3	10,68	$ 17.263,00	$ 184.369,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	64,3	$ 45.548,00	$ 2.928.736,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	7	$ 28.742,00	$ 201.194,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**				
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	8	$ 76.652,00	$ 613.216,00
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 95.257,00	$ 381.028,00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	9	$ 87.531,00	$ 787.779,00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104.908,00	$ 314.724,00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115.959,00	$ 115.959,00
3.6	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m		$ 57.796,00	
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8.501.581,00	$ 8.501.581,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.145.865,00	$ 2.291.730,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493.826,00	$ 1.481.478,00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848.058,00	$ 848.058,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 257.739,00	$ 1.030.956,00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	103	$ 44.996,00	$ 4.634.588,00
5.	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	27,3	$ 63.050,00	$ 1.721.265,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	133,8	$ 21.667,00	$ 2.899.045,00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm	und		$ 11.750,00	

5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	5	$ 23.341,00	$ 116.705,00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita decorativa	m2	7,6	$ 55.271,00	$ 420.060,00
5.6	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	107	$ 17.698,00	$ 1.893.686,00
	2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021 AIDA LUCIA - POPAYAN				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	340	$ 1.871,00	$ 636.140,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	17.42	$ 17.263,00	$ 300.721,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	54,6	$ 45.548,00	$ 2.486.921,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	7	$ 28.742,00	$ 201.194,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**				
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	4	$ 97.366,00	$ 389.464,00
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 132.000,00	$ 396.000,00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	8	$ 87.531,00	$ 700.248,00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 104.908,00	$ 209.816,00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1,60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115.959,00	$ 115.959,00
3.6	Bancos en concreto pintados de colores	und	5	$ 127.811,00	$ 639.055,00
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9.226.877,00	$ 9.226.877,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin	und	2	$ 1.145.865,00	$ 2.291.730,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 493.826,00	$ 987.652,00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848.058,00	$ 848.058,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 256.481,71	$ 769.445,00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	91	$ 44.996,00	$ 4.094.636,00

5.	VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas. arboles, arbustos .	m3	28,2	$ 66.979,00	$ 1.888.808,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	168,5	$ 26.013,00	$ 4.383.191,00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 -40) cm	und	92	$ 14.191,00	$ 1.305.572,00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	14	$ 12.549,00	$ 175.686,00
	2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021 SAN RAFAEL - MORALES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y Replanteo	m2	471	$ 1.871,00	$ 881.241,00
2.	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0.60m	m3	91,06	$ 17.263,00	$ 1.571.969,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	26,28	$ 45.548,00	$ 1.197.001,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	49	$ 28.742,00	$ 1.408.358,00
3.	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS				
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	23	$ 96.704,00	$ 2.224.192,00
3.2	Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM	m		$ 70.497,00	
3.3	Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 216.445,00	$ 865.780,00
3.4	Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	9	$ 81.210,00	$ 730.890,00
3.5	Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 116.060,00	$ 348.180,00
3.6	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 120.774,00	$ 120.774,00
3.7	Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	4,71	$ 431.716,00	$ 2.033.382,00
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0.2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0.4m de diametro	und	6	$ 152.741,00	$ 916.446,00
3.9	Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m	und	4	$ 155.189,00	$ 620.756,00
4.	MOBILIARIO URBANO				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8.733.863,00	$ 8.733.863,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.150.796,00	$ 2.301.592,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493.826,00	$ 1.481.478,00

4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848.058,00	$ 848.058,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 266.917,00	$ 1.067.668,00
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M. (Incluye cubierta)	und	1	$ 10.757.425,00	$ 10.757.425,00
5.	**VEGETACION Y ELEMENTDS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	32	$ 67.634,00	$ 2.164.288,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	216	$ 29.524,00	$ 6.377.184,00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	181	$ 17.999,00	$ 3.257.819,00
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	8	$ 22.032,00	$ 176.256,00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	16	$ 55.926,00	$ 894.816,00
5.6	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m. Alto= 20 cm	m3	5,8	$ 165.693,00	$ 961.019,00
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	5	$ 375.326,00	$ 1.876.630,00
5.8	Arena para juegos infantiles	m3	4	$ 155.569,00	$ 622.276,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 126.488.025,00**
ADMINISTRCION		23%			$ 29.092.246,00
IMPREVISTOS		**2,0%**			$ 2.529.761,00
UTILIDAD		**5,0%**			$ 6.324.401,00
IVA 19% DE UTILIDAD		**19% de U**			$ 1.201.636,19
AJUSTE POR APROXIMACION					
AJUSTE POR APROXIMACION					
COSTO TOTAL					**$ 165.636.069,00**

6. BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ 0,00	
VALOR AMORTIZADO ACTA 01 Y FINAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ -**

7.- BALANCE DEL CONTRATO

VALOR OBRA CONTRATADA:	$ 165.641.809,00	
VALOR EJECUTADO ACTA N° 1		$ 53.821.737,00
VALOR EJECUTADO ACTA N° 2 Y FINAL		$ 111.814.332,00
VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DE CRC		$ 5.740,00
SUMAS IGUALES	**$ 165.641.809,00**	**$ 165.641.809,00**

8.- VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR: ($ 111.814.332); CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS/MCTE

9.- OBSERVACIONES

1. La firma del Supervisor en esta acta , no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra y por ende de los materiales utilizados.

10.- CERTIFICACION:

1) El Ingeniero supervisor Delegado de la CRC, certifica que las actividades ejecutadas dentro del Contrato de Obra N° 000409 del 2021 , fueron ejecutadas y recibidas a satisfacion.
2) Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a Paz y Salvo por concepto de obligaciones del Contrato N° 000409 del 2021

Para constancia se firma a los: 29 DIC 2021

Olga Lucia David H.

Ing. OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Contratista de obra

Ing. YESID GONZÁLEZ DUQUE
Director General

CLAUDIA OANEYE HOYOS RUIZ
Subdirectora defensa de Patrimonio Ambiental

Ing. ALBERTO EMIRO MOLANO P.
Supervisor SDPA-CRC

Proyectó: Milagros Hernández T.
Revisó aspecto técnico: Albero Emiro Molano Piamba
Revisó aspecto jurídico. Diego Fernando Sanchez
Aprobó. Claudia Daneye Hoyos Ruiz

180-187

Popayán,

Doctora
ANGELA PATRICIA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC

ASUNTO: Solicitud de pago acta 02 y final, terminación contrato de obra Nro. 000409 del 2021.

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito remitir acta parcial 01 y documentos complementarios del contrato mencionado en el asunto, cuyo objeto es "Contratar la ejecución de Acciones de Mejoramiento Ambiental y Paisajístico en los municipios de Piendamó (Barrio Amagá Y Vereda Villa Nueva), Morales (Vereda San Rafael) y Popayán (Barrio Aida Lucia); que comprende la ejecución de obras civiles y/o arquitectónicas, que permiten el mejoramiento del espacio público, entendido este desde su valor ambiental y sus diversos beneficios." para su respectivo proceso de revisión y autorización de pago.

Institucionalmente,

CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ
Subdirectora de Defensa de Patrimonio Ambiental

Proyectó: Arq. Milagros Hernández T.
Revisó: Ing. Alberto Emiro Molano P.

Anexos. 1 documentos anexos para pago acta parcial 01, en medio digital y físico

1. Acta de liquidación
2. Certificado de cumplimiento
3. Acta de recibo parcial 02 de obra.
4. Acta de modificación de obra Nro 2
5. Pre acta de obra (memoria de cantidades)
6. Informe de supervisión, registro fotográfico CRC
7. Planos récord
8. Bitácora de obra
9. Informe de ejecución contratista
10. Pago de seguridad social
11. Factura
12. Pagos parafiscales
13. Póliza de estabilidad de obra

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO No	000409 DE 2021
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :	728 DEL 30 DEJUNIO DEL 2021
CONTRATISTA:	OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
SUPERVISOR:	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
OBJETO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES MESES (03) CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

2.-PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los días del mes de diciembre del 2021, se reunieron los Señores, OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ con cedula N° 34563335 de Popayán, Contratista de obra , El Ingeniero YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Director General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C., LA Ecologa CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ en calidad de Subdirectora Defensa del Patrimonio Ambiental y el Ingeniero ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA en calidad de Supervisor, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final de Obra.

3.- CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
INICIACION CONTRATO:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SUSPENSION Nro. 001	N/A
REINICIACION Nro. 001	N/A
OTRO SI Nro.	N/A
ACTA RECIBO N° 02 Y FINAL	15 DE DICIEMBRE DEL 2021
VENCIMIENTO CONTRACTUAL:	15 DE DICIEMBRE DEL 2021

4.- VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 165.641.809,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO :	$ 165.636.069,00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO :	$ 5.740,00

5.- OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
	2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021 VILLA NUEVA - PIENDAMÓ				
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	447	$ 1.871,00	$ 836.337,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	39,52	$ 17.263,00	$ 682.234,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	3,7	$ 45.548,00	$ 168.528,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	14	$ 28.742,00	$ 402.388,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**				
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	132,4	$ 49.955,00	$ 6.614.042,00
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	11,2	$ 57.796,00	$ 647.315,00

3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	34	$ 76.652,00	$ 2.606.168,00
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	10,4	$ 130.706,00	$ 1.359.342,00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 95.257,00	$ 285.771,00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	9	$ 87.531,00	$ 787.779,00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104.863,00	$ 314.589,00
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 115.914,00	$ 231.828,00
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9.577.141,00	$ 9.577.141,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.145.865,00	$ 2.291.730,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493.826,00	$ 1.481.478,00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 848.058,00	$ 1.696.116,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 257.739,00	$ 773.217,00
4.6	Pintura para llantas existentes para juegos infantiles.	und		$ 26.750,00	
5.	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	45,4	$ 63.050,00	$ 2.862.470,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	246,12	$ 21.667,00	$ 5.332.682,00
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	49,3	$ 14.353,00	$ 707.603,00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	22	$ 17.381,00	$ 382.382,00
5.5	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	4	$ 22.032,00	$ 88.128,00
5.6	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	14	$ 55.926,00	$ 782.964,00
5.7	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	3	$ 160.456,00	$ 481.368,00
5.8	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	174	$ 20.318,00	$ 3.535.332,00
5.9	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"	ml	36,3	$ 35.250,00	$ 1.279.575,00

5.10	Arena para juegos infantiles	m3	5	$ 155.569,00	$ 777.845,00
	2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021 AMAGÁ-PIENDAMO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	426	$ 1.871,00	$ 797.046,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	10,68	$ 17.263,00	$ 184.369,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	64,3	$ 45.548,00	$ 2.928.736,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	7	$ 28.742,00	$ 201.194,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**				
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	8	$ 76.652,00	$ 613.216,00
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 95.257,00	$ 381.028,00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	9	$ 87.531,00	$ 787.779,00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104.908,00	$ 314.724,00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115.959,00	$ 115.959,00
3.6	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m		$ 57.796,00	
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8.501.581,00	$ 8.501.581,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.145.865,00	$ 2.291.730,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493.826,00	$ 1.481.478,00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848.058,00	$ 848.058,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 257.739,00	$ 1.030.956,00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	103	$ 44.996,00	$ 4.634.588,00
5.	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	27,3	$ 63.050,00	$ 1.721.265,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	133,8	$ 21.667,00	$ 2.899.045,00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm	und		$ 11.750,00	

5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	5	$ 23.341,00	$ 116.705,00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita decorativa	m2	7,6	$ 55.271,00	$ 420.060,00
5.6	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	107	$ 17.698,00	$ 1.893.686,00
	2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021 AIDA LUCIA - POPAYAN				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	340	$ 1.871,00	$ 636.140,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	17,42	$ 17.263,00	$ 300.721,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	54,6	$ 45.548,00	$ 2.486.921,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	7	$ 28.742,00	$ 201.194,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**				
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	4	$ 97.366,00	$ 389.464,00
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 132.000,00	$ 396.000,00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	8	$ 87.531,00	$ 700.248,00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 104.908,00	$ 209.816,00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115.959,00	$ 115.959,00
3.6	Bancos en concreto pintados de colores	und	5	$ 127.811,00	$ 639.055,00
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9.226.877,00	$ 9.226.877,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.145.865,00	$ 2.291.730,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 493.826,00	$ 987.652,00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848.058,00	$ 848.058,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 256.481,71	$ 769.445,00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	91	$ 44.996,00	$ 4.094.636,00

5.	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	28,2	$ 66.979,00	$ 1.888.808,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	168,5	$ 26.013,00	$ 4.383.191,00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 -40) cm	und	92	$ 14.191,00	$ 1.305.572,00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	14	$ 12.549,00	$ 175.686,00
	2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021 SAN RAFAEL - MORALES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y Replanteo	m2	471	$ 1.871,00	$ 881.241,00
2.	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**				
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	91,06	$ 17.263,00	$ 1.571.969,00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	26,28	$ 45.548,00	$ 1.197.001,00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	49	$ 28.742,00	$ 1.408.358,00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**				
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	23	$ 96.704,00	$ 2.224.192,00
3.2	Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM	m		$ 70.497,00	
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 216.445,00	$ 865.780,00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	9	$ 81.210,00	$ 730.890,00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 116.060,00	$ 348.180,00
3.6	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 120.774,00	$ 120.774,00
3.7	Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	4,71	$ 431.716,00	$ 2.033.382,00
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro	und	6	$ 152.741,00	$ 916.446,00
3.9	Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m	und	4	$ 155.189,00	$ 620.756,00
4.	**MOBILIARIO URBANO**				
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8.733.863,00	$ 8.733.863,00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1.150.796,00	$ 2.301.592,00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493.826,00	$ 1.481.478,00

4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848.058,00	$ 848.058,00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 266.917,00	$ 1.067.668,00
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta)	und	1	$ 10.757.425,00	$ 10.757.425,00
5.	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**				
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	32	$ 67.634,00	$ 2.164.288,00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	216	$ 29.524,00	$ 6.377.184,00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	181	$ 17.999,00	$ 3.257.819,00
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	8	$ 22.032,00	$ 176.256,00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	16	$ 55.926,00	$ 894.816,00
5.6	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	5,8	$ 165.693,00	$ 961.019,00
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	5	$ 375.326,00	$ 1.876.630,00
5.8	Arena para juegos infantiles	m3	4	$ 155.569,00	$ 622.276,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 126.488.025,00**
ADMINISTRCION		**23%**			$ 29.092.246,00
IMPREVISTOS		**2,0%**			$ 2.529.761,00
UTILIDAD		**5,0%**			$ 6.324.401,00
IVA 19% DE UTILIDAD		**19% de U**			$ 1.201.636,19
AJUSTE POR APROXIMACION					
AJUSTE POR APROXIMACION					
COSTO TOTAL					**$ 165.636.069,00**

6. BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ 0,00	
VALOR AMORTIZADO ACTA 01 Y FINAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ -**

7.- BALANCE DEL CONTRATO

VALOR OBRA CONTRATADA:	$ 165.641.809,00	
VALOR EJECUTADO ACTA N° 1		$ 53.821.737,00
VALOR EJECUTADO ACTA N° 2 Y FINAL		$ 111.814.332,00
VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DE CRC		$ 5.740,00
SUMAS IGUALES	**$ 165.641.809,00**	**$ 165.641.809,00**

8.- VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR: ($ 111.814.332); CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS/MCTE

9.- OBSERVACIONES

1. La firma del Supervisor en esta acta , no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra y por ende de los materiales utilizados.

10.- CERTIFICACION:

1) El Ingeniero supervisor Delegado de la CRC, certifica que las actividades ejecutadas dentro del Contrato de Obra N° 000409 del 2021 , fueron ejecutadas y recibidas a satisfacion.
2) Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a Paz y Salvo por concepto de obligaciones del Contrato N° 000409 del 2021

Para constancia se firma a los:

Ing. OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Contratista de obra

Ing. YESID GONZÁLEZ DUQUE
Director General

CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ
Subdirectora defensa de Patrimonio Ambiental

Ing. ALBERTO EMIRO MOLANO P.
Supervisor SDPA-CRC

Proyectó: Milagros Hernández T.
Revisó aspecto tecnico: Albero Emiro Molano Piamba
Revisó aspecto juridico: Diego Fernando Sanchez
Aprobó: Claudia Daneye Hoyos Ruiz


	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC **FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	CODIGO: FCC-PGJ Versión: 3

TIPO DE CERTIFICACIÓN				***No. DE CONTRATO***	***PERIODO DE LA CERTIFICACIÓN***	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	**x**	000409 de 2021	13/11/2021	15/12/2021
CONTRATISTA				Olga Lucia David Hernández		
No. DE IDENTIFICACIÓN				34.563.335		
OBJETO DEL CONTRATO				Contratar la ejecución de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico en los municipios de Piendamó (barrio Amagá y vereda Villa Nueva), morales (vereda San Rafael) y Popayán (barrio Aida Lucia); que comprende la ejecución de obras civiles y/o arquitectónicas, que permiten el mejoramiento del espacio público, entendido este desde su valor ambiental y sus diversos beneficios		
CDP CONTRATO				No. 728 del 30 de junio de 2021		
VALOR CONTRATO INICIAL				$165.641.809 M/CTE		
PLAZO INICIAL				03 meses		
ADICIÓN				N/A		
CDP ADICIÓN				N/A		
PRORROGA				N/A		
SUSPENSIÓN				N/A		
REINICIO				N/A		


GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 111.814.332,00
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	0
VALOR TOTAL	$ 111.814.332,00

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL, ACUMULADO**
AVANCE FÍSICO %	68%	100%
AVANCE FINANCIERO %	68%	100%

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo al valor a recibir por gastos de viaje, si los hubiere y cuota del periodo de ejecución, tal como se puede evidenciar en la planilla de seguridad social anexa al informe de actividades.


NOMBRE SUPERVISOR	**ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA**	 **FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	15/12/2021	

Elaboró: Alberto Emiro Molano Piamba

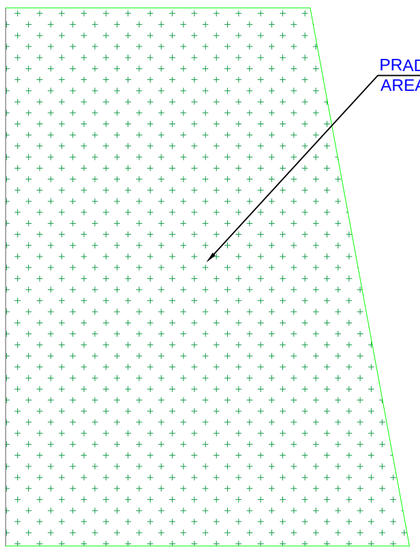

PRADO TIPO TRENZA
AREA 168.5M2

DETALLE ÁREA CON
PRADO TIPO TRENZA

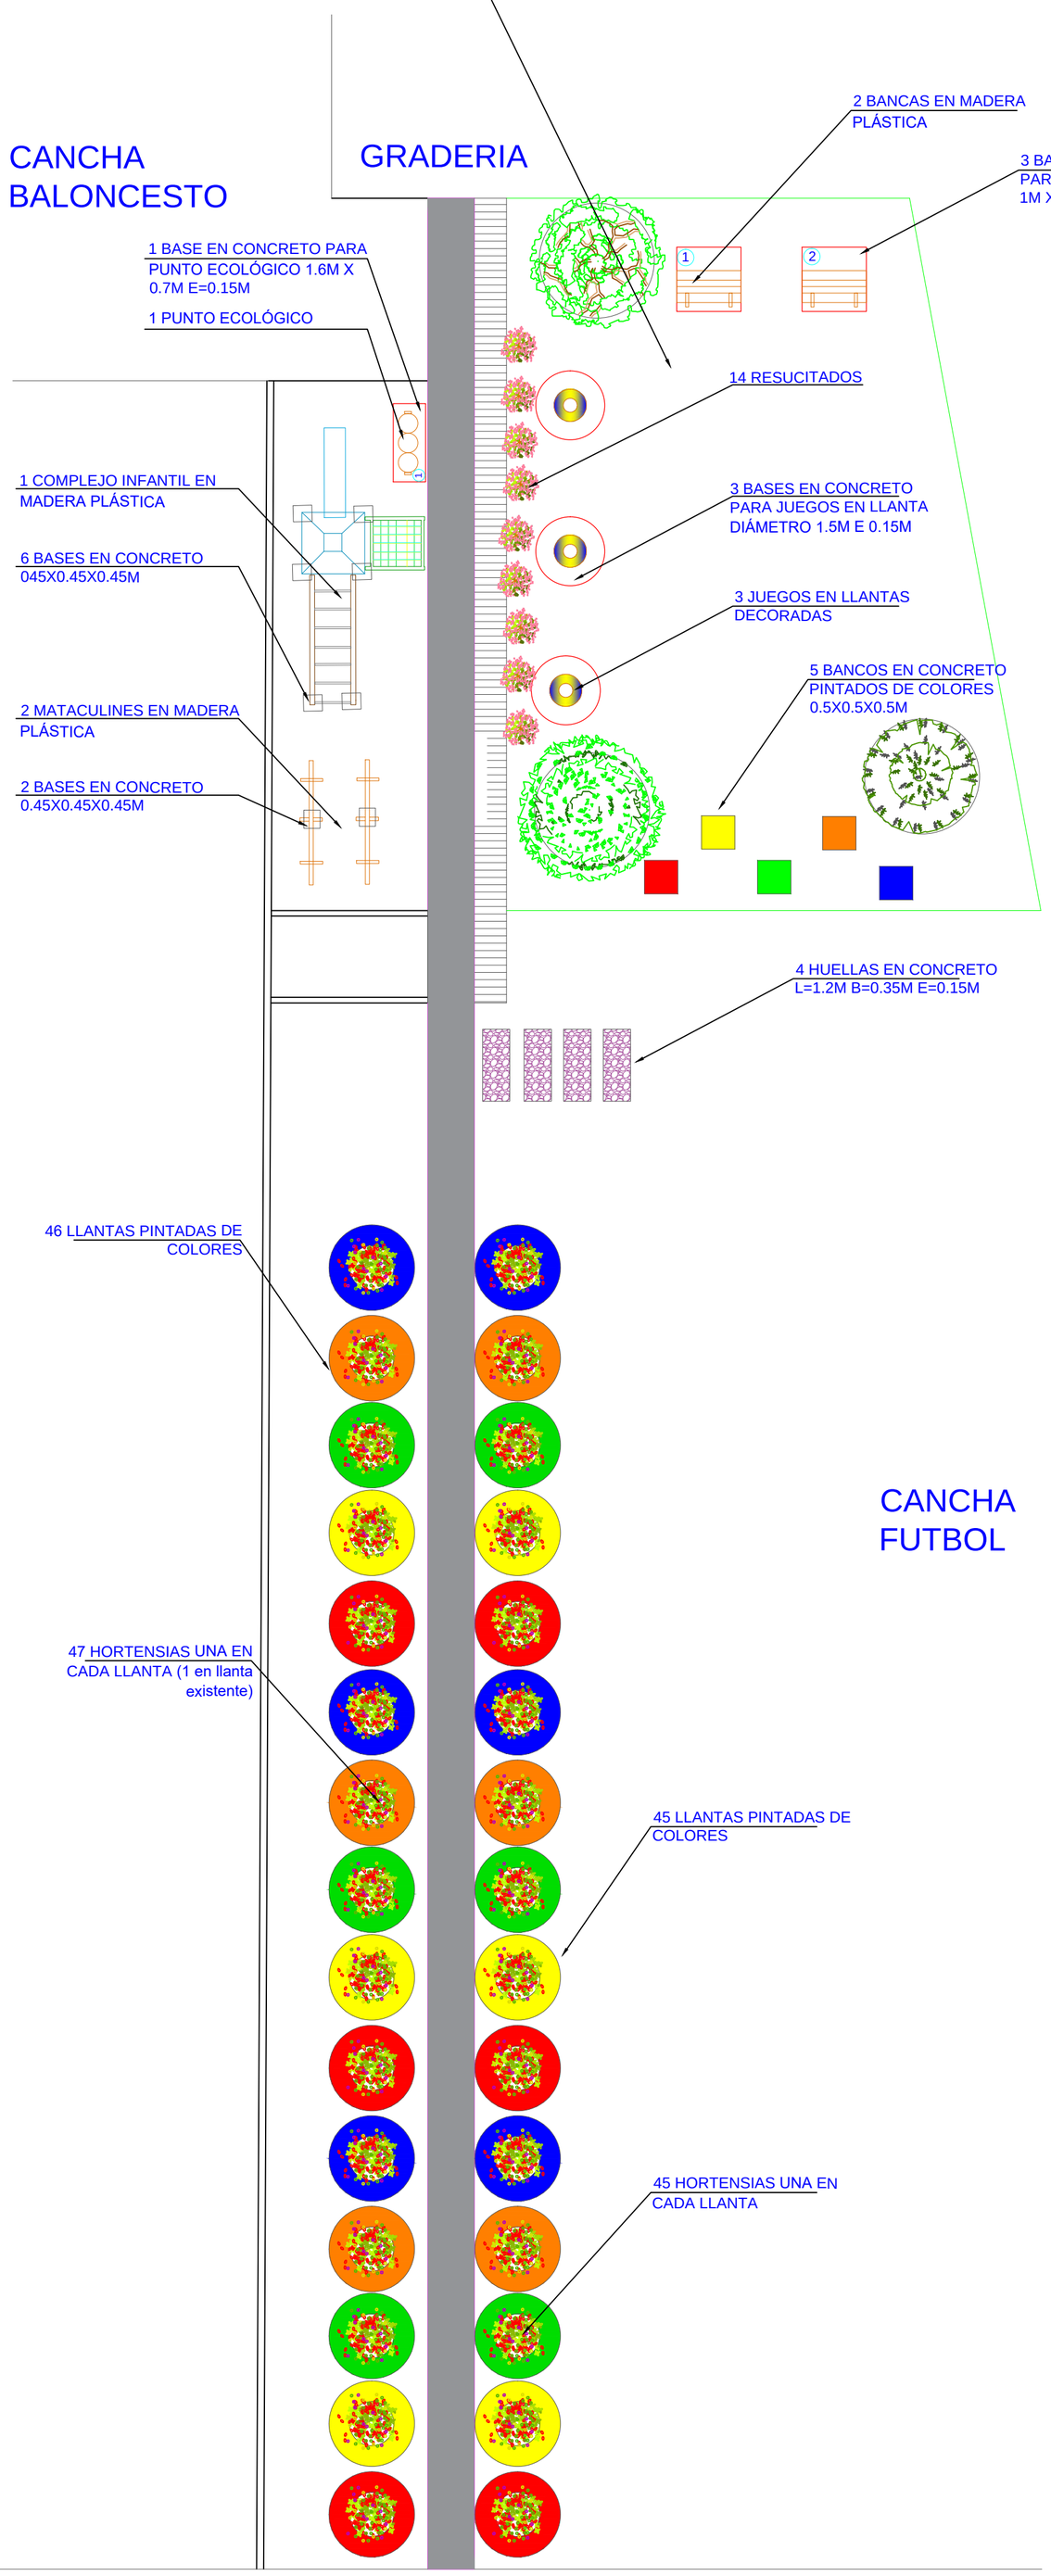

ZONA VERDE NUMERO 01-
URBANIZACIÓN AÍDA LUCIA

CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÁNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD AIDA LUCÍA

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :

15/12/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 002 Y FINAL

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN BORDILLO	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING
OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD AMAGÁ - PIENDAMÓ

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :

15/12/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 002 Y FINAL

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN BORDILLO	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	



CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING

OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD AMAGÁ - PIENDAMÓ

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :


15/12/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 002 Y FINAL

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN BORDILLO	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

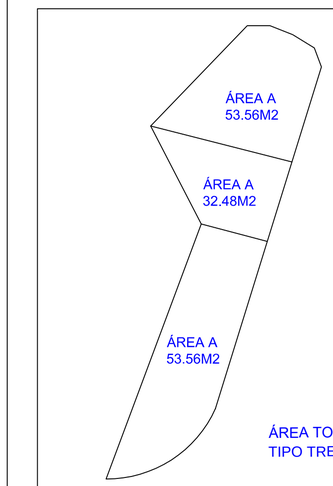

DETALLE DE ÁREAS DE PRADO



CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING
OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ

SUPERVISOR
ING
ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :
PLANO RECORD SAN RAFAEL

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO


FECHA :
15/12/2021

OBSERVACION :


CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 002 Y FINAL

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN PIEDRA	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

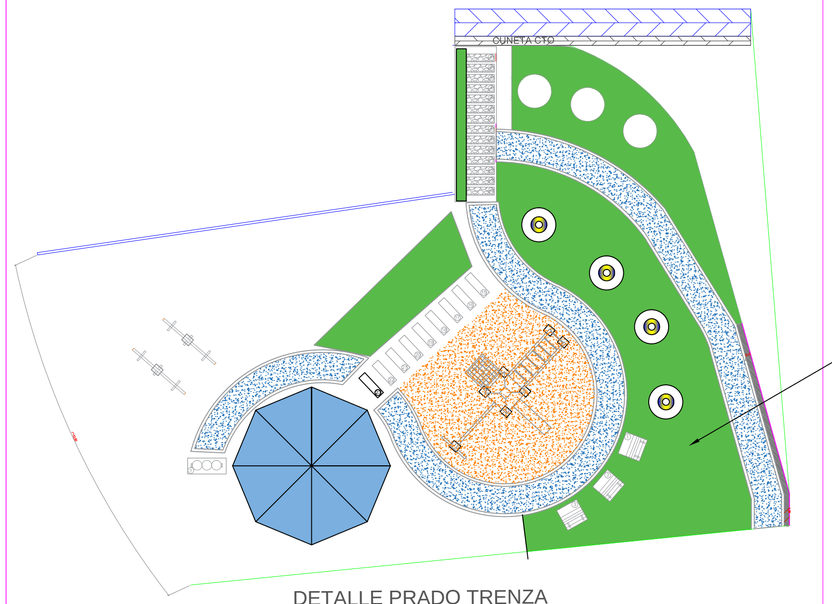

DETALLE PRADO TRENZA

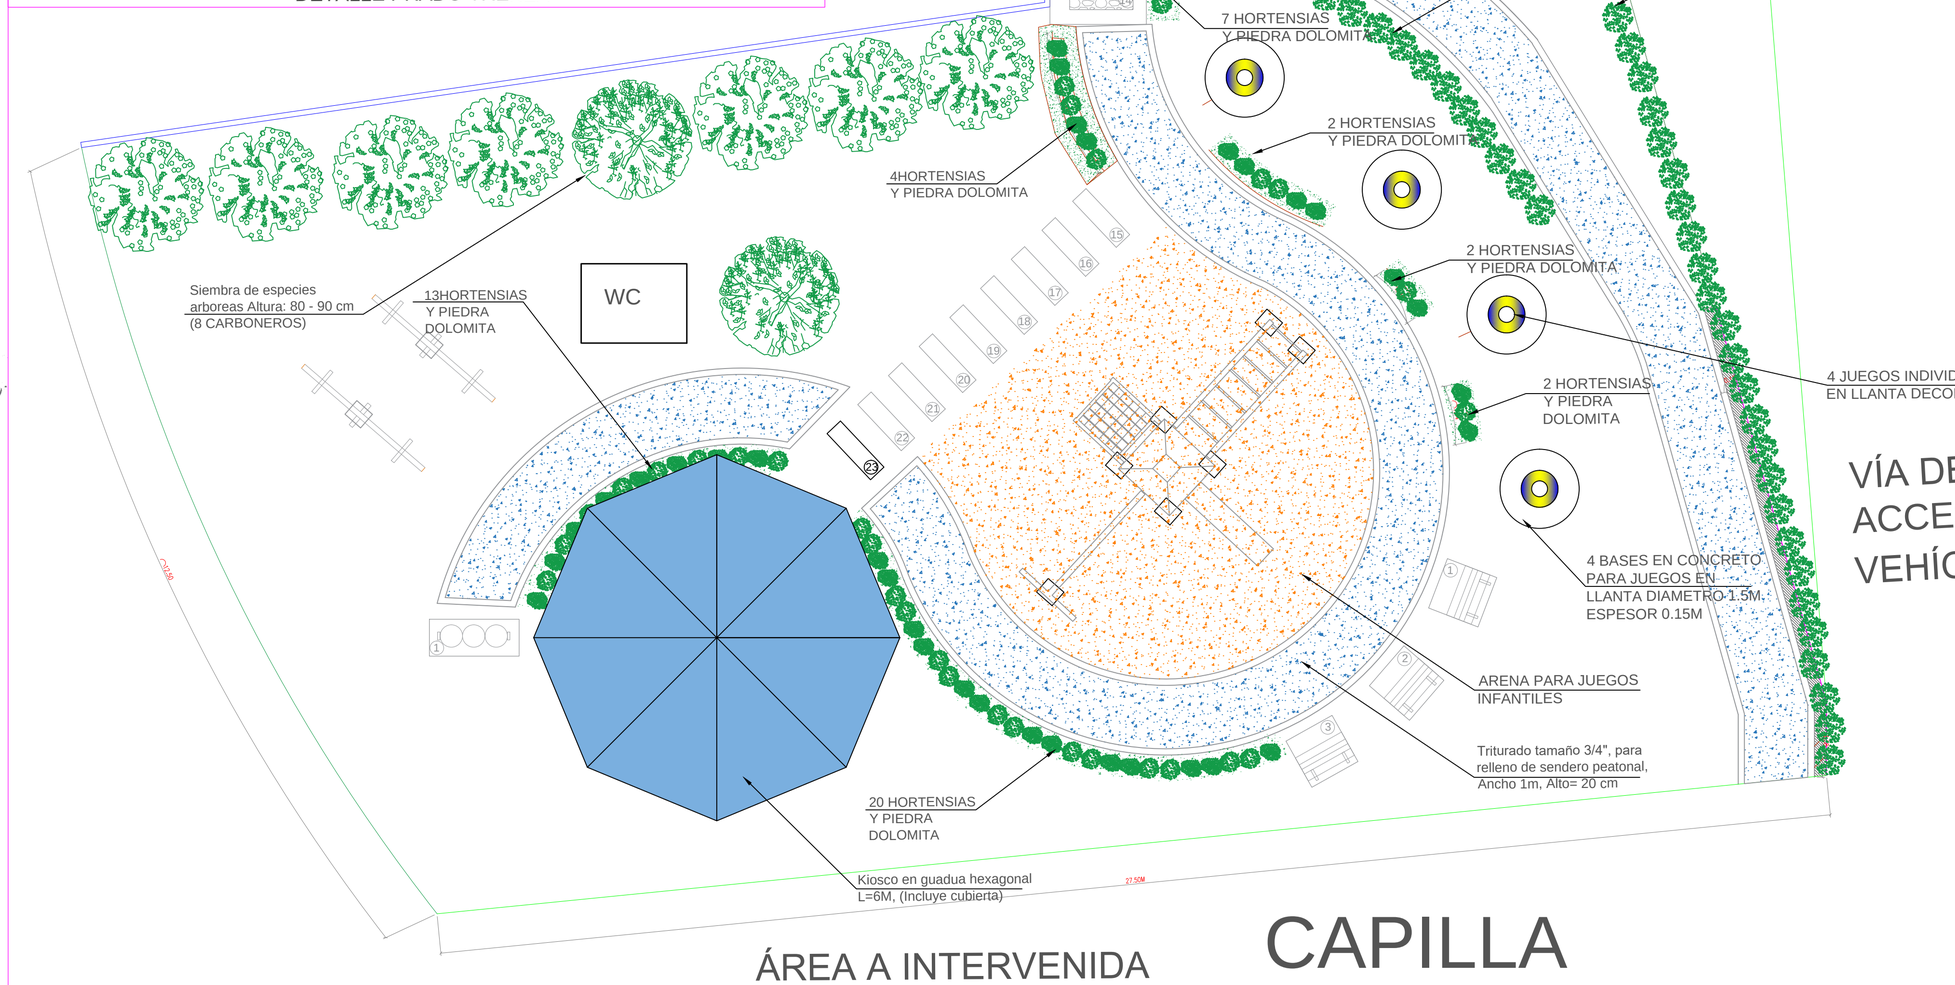

CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING

OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD VILLA NUEVA

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :


15/12/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 002 Y FINAL

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN BORDILLO	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

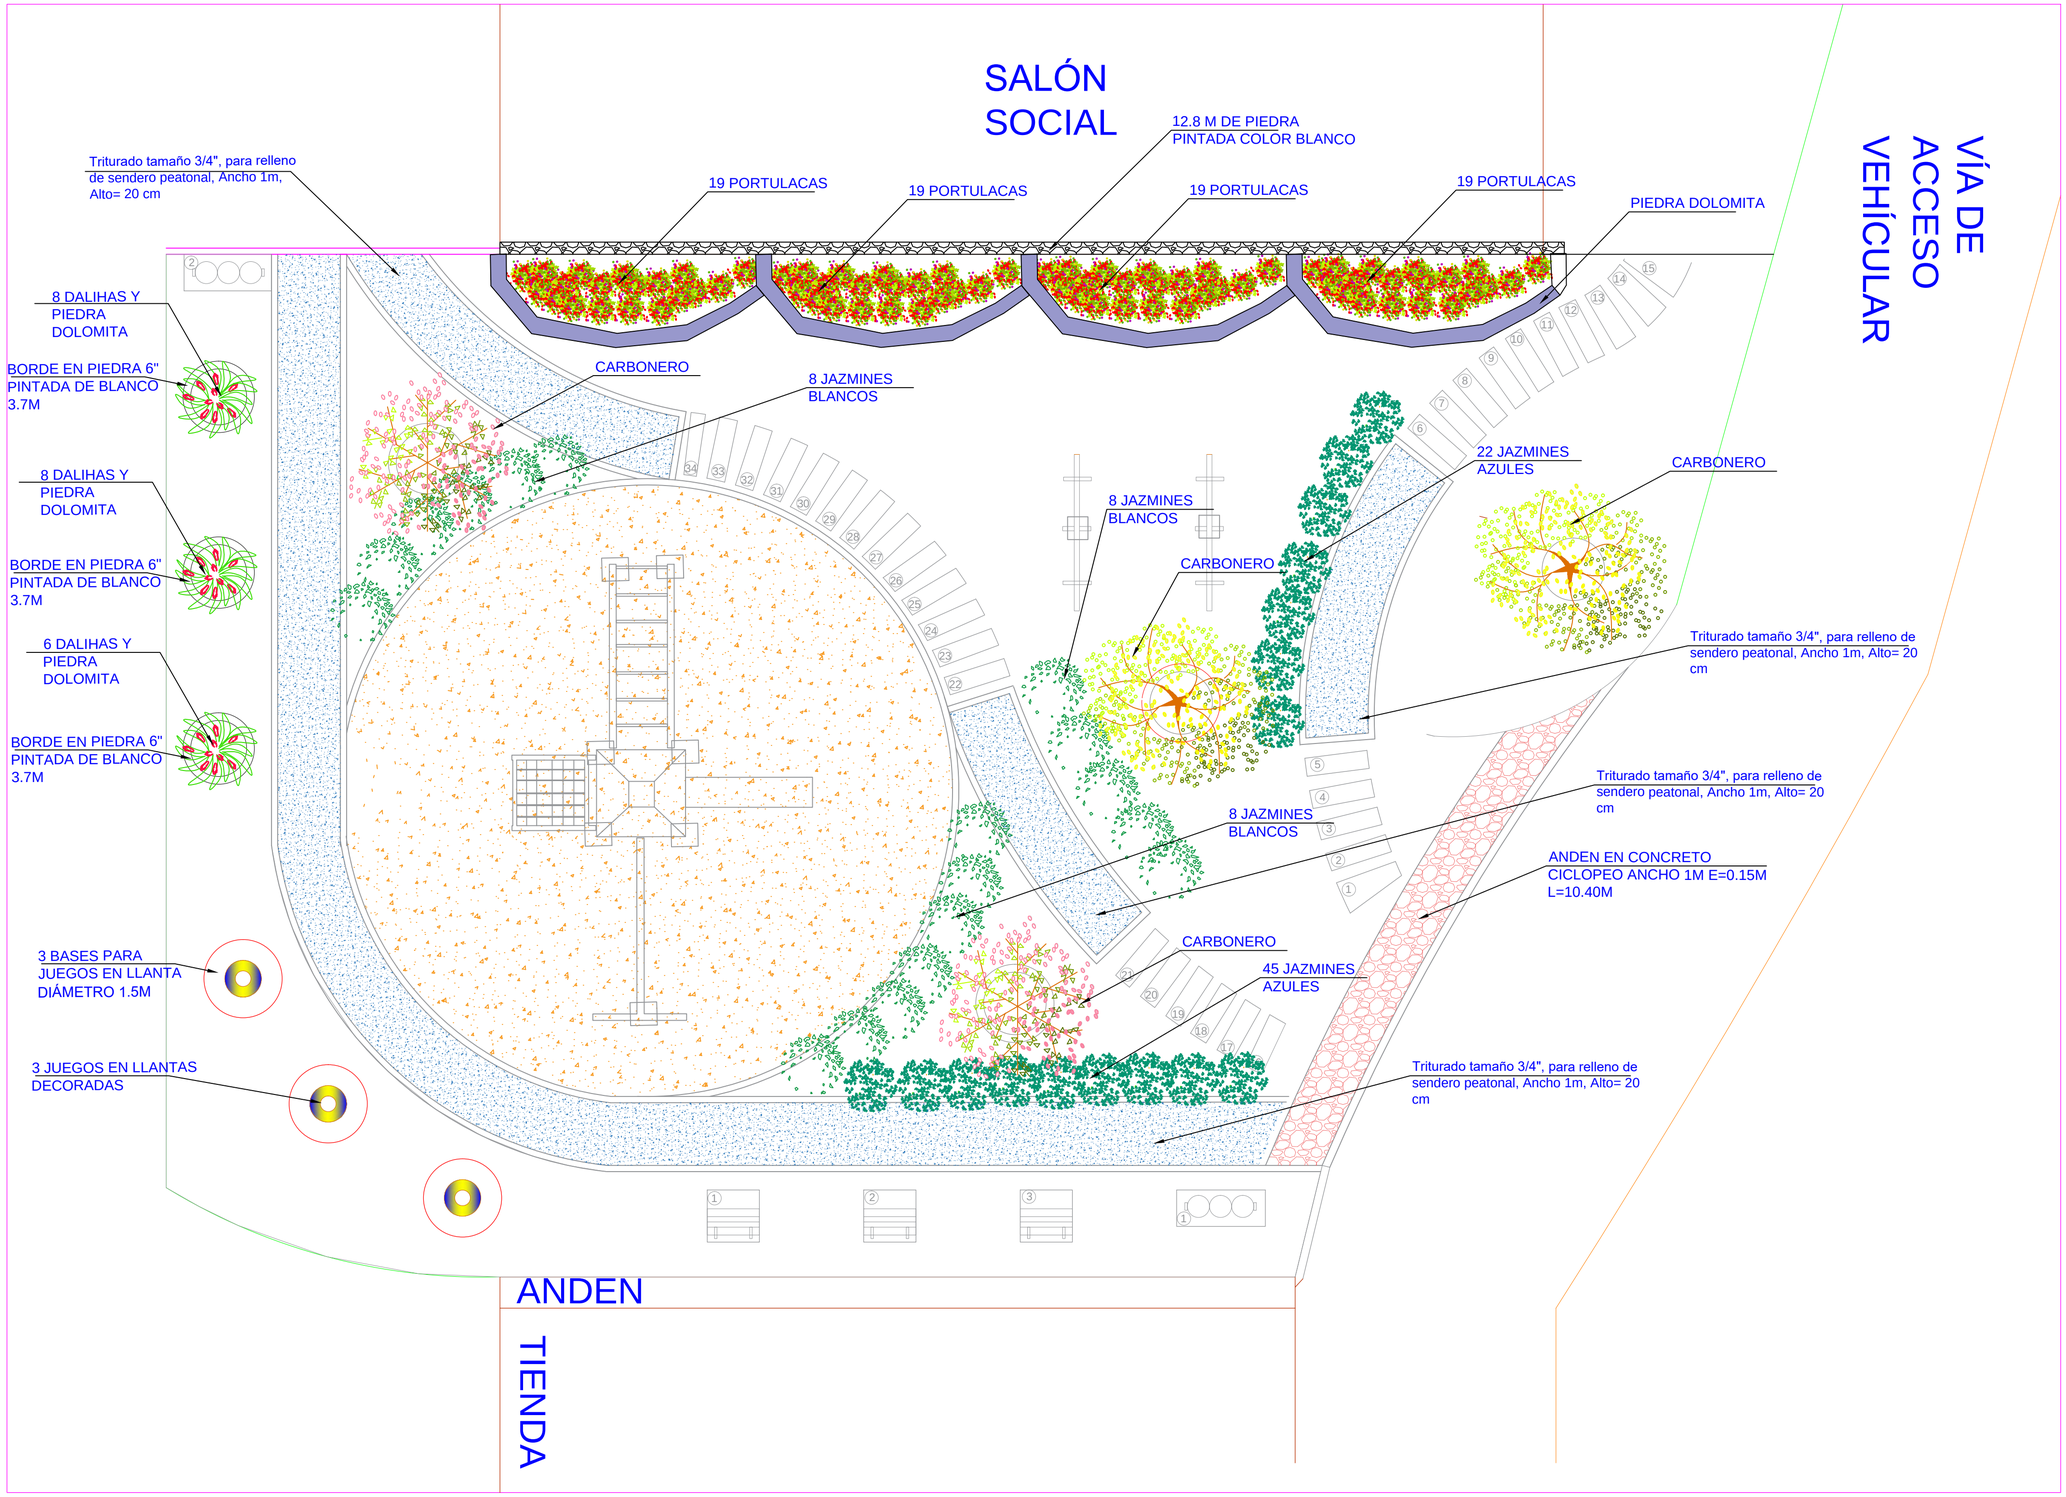

CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING

OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD VILLA NUEVA

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :


15/12/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 002 Y FINAL

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN BORDILLO	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

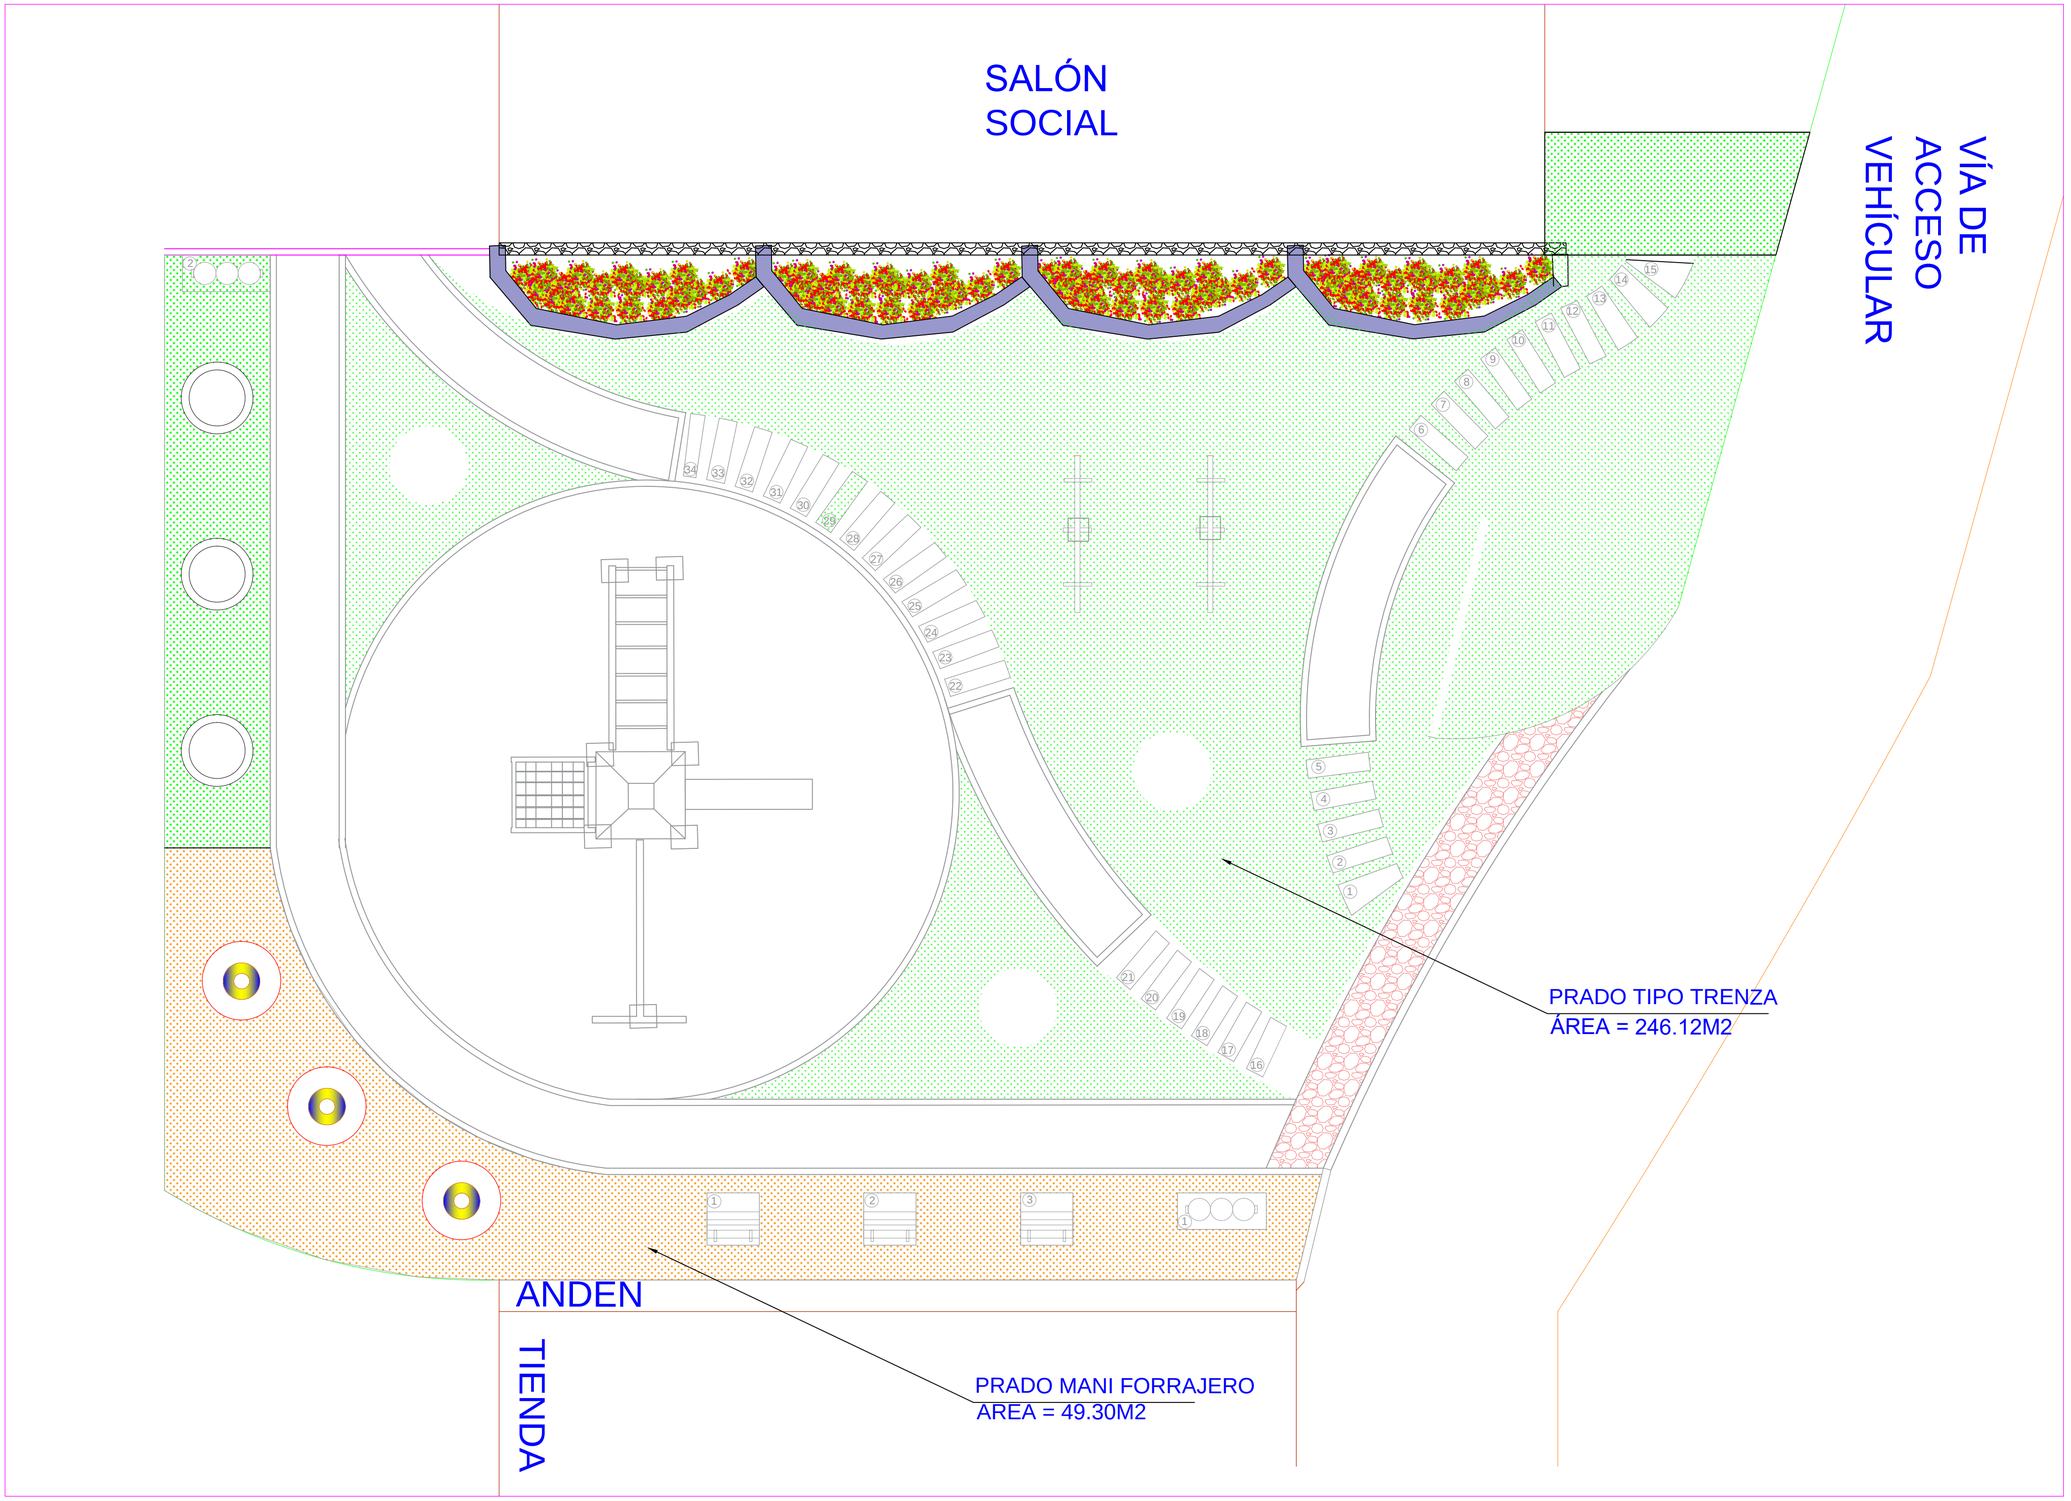

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACIÓN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809	
SUSPENISIÓN Nro					
REINICIO Nro					

ACTA No 2 Y FINAL

PARCIAL [ ]

FINAL [X]

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 02		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021												
	VILLA NUEVA												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	520	$ 1,871.00	$ 972,920.00	447.00	$ 836,337.00	447	$ 836,337.00			447.00	$ 836,337.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	78	$ 17,263.00	$ 1,346,514.00	39.52	$ 682,234.00	39.52	$ 682,234.00			39.52	$ 682,234.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	26	$ 45,548.00	$ 1,184,248.00	3.70	$ 168,528.00	3.7	$ 168,528.00			3.70	$ 168,528.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	78	$ 28,742.00	$ 2,241,876.00	14.00	$ 402,388.00			14.00	$ 402,388.00	14.00	$ 402,388.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	148.74	$ 49,955.00	$ 7,430,307.00	132.40	$ 6,614,042.00	132.4	$ 6,614,042.00			132.40	$ 6,614,042.00
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	11.2	$ 57,796.00	$ 647,315.00	11.20	$ 647,315.00	11.2	$ 647,315.00			11.20	$ 647,315.00
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	35	$ 76,652.00	$ 2,682,820.00	34.00	$ 2,606,168.00	34	$ 2,606,168.00			34.00	$ 2,606,168.00
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	11.2	$ 130,706.00	$ 1,463,907.00	10.40	$ 1,359,342.00			10.40	$ 1,359,342.00	10.40	$ 1,359,342.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 95,257.00	$ 285,771.00	3.00	$ 285,771.00			3.00	$ 285,771.00	3.00	$ 285,771.00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	38	$ 87,531.00	$ 3,326,178.00	9.00	$ 787,779.00	9	$ 787,779.00			9.00	$ 787,779.00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,863.00	$ 314,589.00	3.00	$ 314,589.00	3	$ 314,589.00			3.00	$ 314,589.00
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 115,914.00	$ 231,828.00	2.00	$ 231,828.00	2	$ 231,828.00			2.00	$ 231,828.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,577,141.00	$ 9,577,141.00	1.00	$ 9,577,141.00	1	$ 9,577,141.00			1.00	$ 9,577,141.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00	2	$ 2,291,730.00			2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00	3.00	$ 1,481,478.00	3	$ 1,481,478.00			3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 848,058.00	$ 1,696,116.00	2.00	$ 1,696,116.00	2	$ 1,696,116.00			2.00	$ 1,696,116.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 257,739.00	$ 773,217.00	3.00	$ 773,217.00			3.00	$ 773,217.00	3.00	$ 773,217.00
4.6	Pintura para llantas existentes para juegos infantiles.	und	10	$ 26,750.00	$ 267,500.00	0.00	$ -						
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	52	$ 63,050.00	$ 3,278,600.00	45.40	$ 2,862,470.00			45.40	$ 2,862,470.00	45.40	$ 2,862,470.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	201	$ 21,667.00	$ 4,355,067.00	246.12	$ 5,332,682.00			246.12	$ 5,332,682.00	246.12	$ 5,332,682.00
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	87	$ 14,353.00	$ 1,248,711.00	49.30	$ 707,603.00			49.30	$ 707,603.00	49.30	$ 707,603.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	12	$ 17,381.00	$ 208,572.00	22.00	$ 382,382.00			22.00	$ 382,382.00	22.00	$ 382,382.00
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	4	$ 22,032.00	$ 88,128.00	4.00	$ 88,128.00			4.00	$ 88,128.00	4.00	$ 88,128.00
5.7	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	13	$ 55,926.00	$ 727,038.00	14.00	$ 782,964.00			14.00	$ 782,964.00	14.00	$ 782,964.00
5.8	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	3	$ 160,456.00	$ 481,368.00	3.00	$ 481,368.00			3.00	$ 481,368.00	3.00	$ 481,368.00
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	177	$ 20,318.00	$ 3,596,286.00	174.00	$ 3,535,332.00			174.00	$ 3,535,332.00	174.00	$ 3,535,332.00
5.10	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"	ml	20	$ 35,250.00	$ 705,000.00	36.30	$ 1,279,575.00			36.30	$ 1,279,575.00	36.30	$ 1,279,575.00
5.11	Arena para juegos infantiles	m3	5	$ 155,569.00	$ 777,845.00	5.00	$ 777,845.00			5.00	$ 777,845.00	5.00	$ 777,845.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACIÓN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809	
SUSPENISIÓN Nro					
REINICIO Nro					

ACTA No 2 Y FINAL

PARCIAL [ ]

FINAL [X]

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 02		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021												
	AMAGÁ												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	600	$ 1,871.00	$ 1,122,600.00	426.00	$ 797,046.00			426.00	$ 797,046.00	426.00	$ 797,046.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	30	$ 17,263.00	$ 517,890.00	10.68	$ 184,369.00			10.68	$ 184,369.00	10.68	$ 184,369.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	20	$ 45,548.00	$ 910,960.00	64.30	$ 2,928,736.00			64.30	$ 2,928,736.00	64.30	$ 2,928,736.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	30	$ 28,742.00	$ 862,260.00	7.00	$ 201,194.00			7.00	$ 201,194.00	7.00	$ 201,194.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	8	$ 76,652.00	$ 613,216.00	8.00	$ 613,216.00			8.00	$ 613,216.00	8.00	$ 613,216.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 95,257.00	$ 381,028.00	4.00	$ 381,028.00			4.00	$ 381,028.00	4.00	$ 381,028.00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	25	$ 87,531.00	$ 2,188,275.00	9.00	$ 787,779.00			9.00	$ 787,779.00	9.00	$ 787,779.00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,908.00	$ 314,724.00	3.00	$ 314,724.00			3.00	$ 314,724.00	3.00	$ 314,724.00
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00	1.00	$ 115,959.00			1.00	$ 115,959.00	1.00	$ 115,959.00
3.9	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m		$ 57,796.00									
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,501,581.00	$ 8,501,581.00	1.00	$ 8,501,581.00			1.00	$ 8,501,581.00	1.00	$ 8,501,581.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00			2.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00	3.00	$ 1,481,478.00			3.00	$ 1,481,478.00	3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,058.00			1.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 257,739.00	$ 1,030,956.00	4.00	$ 1,030,956.00			4.00	$ 1,030,956.00	4.00	$ 1,030,956.00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und		$ 44,996.00		103.00	$ 4,634,588.00			103.00	$ 4,634,588.00	103.00	$ 4,634,588.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	20	$ 63,050.00	$ 1,261,000.00	27.30	$ 1,721,265.00			27.30	$ 1,721,265.00	27.30	$ 1,721,265.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	200	$ 21,667.00	$ 4,333,400.00	133.80	$ 2,899,045.00			133.80	$ 2,899,045.00	133.80	$ 2,899,045.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm	und	160	$ 11,750.00	$ 1,880,000.00	0.00	$ -						
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	6	$ 23,341.00	$ 140,046.00	5.00	$ 116,705.00			5.00	$ 116,705.00	5.00	$ 116,705.00
5.8	Suministro e instalacion de piedra dolomita decorativa	m2	3.2	$ 55,271.00	$ 176,867.00	7.60	$ 420,060.00			7.60	$ 420,060.00	7.60	$ 420,060.00
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	58	$ 17,698.00	$ 1,026,484.00	107.00	$ 1,893,686.00			107.00	$ 1,893,686.00	107.00	$ 1,893,686.00
	2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021												
	AIDA LUCIA												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	231	$ 1,871.00	$ 432,201.00	340.00	$ 636,140.00			340.00	$ 636,140.00	340.00	$ 636,140.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	17	$ 17,263.00	$ 293,471.00	17.42	$ 300,721.00			17.42	$ 300,721.00	17.42	$ 300,721.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	23	$ 45,548.00	$ 1,047,604.00	54.60	$ 2,486,921.00			54.60	$ 2,486,921.00	54.60	$ 2,486,921.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	17	$ 28,742.00	$ 488,614.00	7.00	$ 201,194.00			7.00	$ 201,194.00	7.00	$ 201,194.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	6	$ 97,366.00	$ 584,196.00	4.00	$ 389,464.00			4.00	$ 389,464.00	4.00	$ 389,464.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACIÒN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809	
SUSPENISIÓN Nro					
REINICIO Nro					

ACTA No 2 Y FINAL

PARCIAL [ ]

FINAL [X]

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 02		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 132,000.00	$ 396,000.00	3.00	$ 396,000.00			3.00	$ 396,000.00	3.00	$ 396,000.00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	30	$ 87,531.00	$ 2,625,930.00	8.00	$ 700,248.00			8.00	$ 700,248.00	8.00	$ 700,248.00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 104,908.00	$ 209,816.00	2.00	$ 209,816.00			2.00	$ 209,816.00	2.00	$ 209,816.00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00	1.00	$ 115,959.00			1.00	$ 115,959.00	1.00	$ 115,959.00
3.6	Bancos en concreto pintados de colores	und	5	$ 127,811.00	$ 639,055.00	5.00	$ 639,055.00			5.00	$ 639,055.00	5.00	$ 639,055.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,226,877.00	$ 9,226,877.00	1.00	$ 9,226,877.00			1.00	$ 9,226,877.00	1.00	$ 9,226,877.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00			2.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 493,826.00	$ 987,652.00	2.00	$ 987,652.00			2.00	$ 987,652.00	2.00	$ 987,652.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,058.00			1.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 256,481.71	$ 769,445.00	3.00	$ 769,445.00			3.00	$ 769,445.00	3.00	$ 769,445.00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	90	$ 44,996.00	$ 4,049,640.00	91.00	$ 4,094,636.00			91.00	$ 4,094,636.00	91.00	$ 4,094,636.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	8	$ 66,979.00	$ 535,832.00	28.20	$ 1,888,808.00			28.20	$ 1,888,808.00	28.20	$ 1,888,808.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	115.5	$ 26,013.00	$ 3,004,502.00	168.50	$ 4,383,191.00			168.50	$ 4,383,191.00	168.50	$ 4,383,191.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 - 40) cm	und	90	$ 14,191.00	$ 1,277,190.00	92.00	$ 1,305,572.00			92.00	$ 1,305,572.00	92.00	$ 1,305,572.00
5.6	Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	14	$ 12,549.00	$ 175,686.00	14.00	$ 175,686.00			14.00	$ 175,686.00	14.00	$ 175,686.00
	2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021												
	SAN RAFAEL												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	560	$ 1,871.00	$ 1,047,760.00	471.00	$ 881,241.00	471	$ 881,241.00			471.00	$ 881,241.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	84	$ 17,263.00	$ 1,450,092.00	91.06	$ 1,571,969.00	91.06	$ 1,571,969.00			91.06	$ 1,571,969.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	28	$ 45,548.00	$ 1,275,344.00	26.28	$ 1,197,001.00	26.28	$ 1,197,001.00			26.28	$ 1,197,001.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	84	$ 28,742.00	$ 2,414,328.00	49.00	$ 1,408,358.00			49.00	$ 1,408,358.00	49.00	$ 1,408,358.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	22	$ 96,704.00	$ 2,127,488.00	23.00	$ 2,224,192.00	23	$ 2,224,192.00			23.00	$ 2,224,192.00
3.2	Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM	m	9	$ 70,497.00	$ 634,473.00								
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 216,445.00	$ 865,780.00	4.00	$ 865,780.00			4.00	$ 865,780.00	4.00	$ 865,780.00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	35	$ 81,210.00	$ 2,842,350.00	9.00	$ 730,890.00	9	$ 730,890.00			9.00	$ 730,890.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 116,060.00	$ 348,180.00	3.00	$ 348,180.00	3	$ 348,180.00			3.00	$ 348,180.00
3.6	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 120,774.00	$ 120,774.00	1.00	$ 120,774.00	1	$ 120,774.00			1.00	$ 120,774.00
3.7	Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	4	$ 431,716.00	$ 1,726,864.00	4.71	$ 2,033,382.00	4.71	$ 2,033,382.00			4.71	$ 2,033,382.00
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro	und	6	$ 152,741.00	$ 916,446.00	6.00	$ 916,446.00	6	$ 916,446.00			6.00	$ 916,446.00
3.9	Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m	und	4	$ 155,189.00	$ 620,756.00	4.00	$ 620,756.00	4	$ 620,756.00			4.00	$ 620,756.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACIÓN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809	
SUSPENISIÓN Nro					
REINICIO Nro					

ACTA No 2 Y FINAL

PARCIAL [ ]

FINAL [X]

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 02		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,733,863.00	$ 8,733,863.00	1.00	$ 8,733,863.00	1	$ 8,733,863.00			1.00	$ 8,733,863.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,150,796.00	$ 2,301,592.00	2.00	$ 2,301,592.00	2	$ 2,301,592.00			2.00	$ 2,301,592.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00	3.00	$ 1,481,478.00	3	$ 1,481,478.00			3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,058.00	1	$ 848,058.00			1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 266,917.00	$ 1,067,668.00	4.00	$ 1,067,668.00			4.00	$ 1,067,668.00	4.00	$ 1,067,668.00
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta)	und	1	$ 10,757,425.00	$ 10,757,425.00	1.00	$ 10,757,425.00			1.00	$ 10,757,425.00	1.00	$ 10,757,425.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	5	$ 67,634.00	$ 338,170.00	32.00	$ 2,164,288.00			32.00	$ 2,164,288.00	32.00	$ 2,164,288.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	100	$ 29,524.00	$ 2,952,400.00	216.00	$ 6,377,184.00			216.00	$ 6,377,184.00	216.00	$ 6,377,184.00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	186	$ 17,999.00	$ 3,347,814.00	181.00	$ 3,257,819.00			181.00	$ 3,257,819.00	181.00	$ 3,257,819.00
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	14	$ 22,032.00	$ 308,448.00	8.00	$ 176,256.00			8.00	$ 176,256.00	8.00	$ 176,256.00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	16	$ 55,926.00	$ 894,816.00	16.00	$ 894,816.00			16.00	$ 894,816.00	16.00	$ 894,816.00
5.6	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	4	$ 165,693.00	$ 662,772.00	5.80	$ 961,019.00			5.80	$ 961,019.00	5.80	$ 961,019.00
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	5	$ 375,326.00	$ 1,876,630.00	5.00	$ 1,876,630.00	5	$ 1,876,630.00			5.00	$ 1,876,630.00
5.8	Arena para juegos infantiles	m3		$ 155,569.00		4.00	$ 622,276.00			4.0	$ 622,276.00	4.00	$ 622,276.00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 126,492,409.00**		**$ 126,488,025.00**		**$ 41,100,983.00**		**$ 85,387,042.00**		**$ 126,488,025.00**
	ADMINISTRACIÓN 23 %				$ 29,093,254.00		$ 29,092,246.00		$ 9,453,226.00		$ 19,639,020.00		$ 29,092,246.00
	IMPREVISTOS 2 %				$ 2,529,848.00		$ 2,529,761.00		$ 822,020.00		$ 1,707,741.00		$ 2,529,761.00
	UTILIDAD 5 %				$ 6,324,620.00		$ 6,324,401.00		$ 2,055,049.00		$ 4,269,352.00		$ 6,324,401.00
	IVA S/UTILIDAD 19%				$ 1,201,678.00		$ 1,201,636.00		$ 390,459.00		$ 811,177.00		$ 1,201,636.00
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN												
	COSTO TOTAL				**$ 165,641,809.00**		**$ 165,636,069.00**		**$ 53,821,737.00**		**$ 111,814,332.00**		**$ 165,636,069.00**

53

	ESTADO DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA NO.:	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA NO.:	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

	ESTADO DEL CONTRATO
V/R. CONTRATO PRINCIPAL	$165,641,809.00
V/R. CONTRATO ADICIONAL	$0.00
V/R. EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$53,821,737.00
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$111,814,332.00
SALDO DEL CONTRATO	$5,740.00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 111,814,332.00 SON CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS / MONEDA CORRIENTE

CONTRATISTA:

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SUPERVISOR:

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
SUPERVISOR CRC

APOYO SUPERVISION:

MILAGRO HERNANDEZ T.
CONTRATISTA SDPA-CRC

Vo. Bo.

CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ
SUBDIRECTORA DEFENSA DE PATRIMONIO

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	**PRELIMINARES**										
1.1	Localización y Replanteo	m2	ZONA CULUMPIOS	15	12.0		180			180	
			ZONA JUEGOS MADERA PLASTICA	11	3.4		37			37	
			ZONA LLANTAS PINTADAS	35	3.5		123			123	
									TOTAL	**340**	
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**										

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	EXCAVACIÓN PARA DESPEJAR AREA DE CUBOS DE CONCRETO	6.2	1.5	1.1				10.23	
			HUELLAS EN CONCRETO	1.3	0.4	0.15			3	0.23	
			BANCAS EN MADERA PLÁSTICA	1.1	1.1	0.15			2	0.36	
			BASES JUEGOS DE MADERA PLÁSTICA	0.45	0.45	0.45			8	0.73	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	BASE PUNTO ECOLOGICO	1.7	0.8	0.15			1	0.20	
			EXCAVACIÓN LLANTAS	0.6	0.6	0.15			90	4.86	
			BASES DE JUEGOS EN LLANTA	1.50	1.2	0.15			3	0.81	
									TOTAL	**17.42**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	RELLENO PRINCIPAL	12	13	0.35		54.6		54.60	 
									TOTAL	**54.60**	
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	RETIRO DE SOBRANTES					7		7.00	
									TOTAL	**7.00**	
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**										

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	ACCESO A BANCOS EN FORMA DE CUBOS	1.2	0.35	0.15			4	4	
									TOTAL	**4.00**	
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI - 21MP	und	BASES PARA JUEGO DE CONEJO, ELEFANTE Y CEBRA	DIAMETRO 1.5		0.15			3	3	
									TOTAL	**3.00**	
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	BASES JUEGOS EN MADERA PLÁSTICA	0.45	0.45	0.45			6	6	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	BASES MATACULINES	0.45	0.45	0.45			2	2	
									TOTAL	**8**	
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI - 21MP	und	BANCAS JUNTO A COLUMPIOS	1	1	0.15			2	2	
									TOTAL	**2**	
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI - 21MP	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A JUEGOS DE MADERA PLÁSTICA	1.6	0.7	0.15			1	1	
									TOTAL	**1**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.6	Bancos en concreto pintados de colores	und	CUBOS JUNTO A COLUMPIOS	0.5	0.5	0.5			5	5	
									TOTAL	**5**	
4	**MOBILIARIO URBANO**										
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	COMPLEJO PRINCIPAL EN MADERA PLÁSTICA						1	1	
									TOTAL	**1**	
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	MATACULINES JUNTO A COMPLEJO PRINCIPAL						2	2	
									TOTAL	**2**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	BANCAS JUNTO A COLUMPIOS						2	2	
									TOTAL	**2**	
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO JUEGOS EN MADERA PLÁSTICA						1	1	
									TOTAL	**1**	
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	ELEFANTE CEBRA CONEJO						3	3	
									TOTAL	**3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	CALLEJÓN INGRESO LADO IZQUIERDO						46	46	
			CALLEJÓN INGRESO LADO DERECHO						45	45	
									TOTAL	**91**	
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**										
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	ÁREA INTERVENIDA CON MEJORAMIENTO CON TIERRA AMARILLA	12	13	0.13		20.3		20.3	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	AREA DE EXCAVACIÓN PARA CUBOS	5	2.5	0.13		1.6		1.6	
			TIERRA DENTRO DE LLANTAS PINTADAS	DIAMETRO 0.65		0.20		0.07	90	6.3	
									TOTAL	**28.2**	
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	PRADO EN AREA DE RELLENO PRINCIPAL	12	13		156			156	
			AREA DE BANCOS EN FORMA DE CUBOS	5	2.5		12.5			12.5	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AIDA LUCIA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
									TOTAL	**168.5**	
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 -40) cm	und	PLANTAS SOBRE LLANTAS PINTADAS						92	92	
									TOTAL	**92**	
5.6	Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	RESUCITADOS FRENTE A JUEGOS EN LLANTA						14	14	
									TOTAL	**14**	

MANUEL ALEJANDRO LASSO L.
ING CIVIL RESIDENTE DE OBRA

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ING CIVIL- CONTRATISTA

MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION- SDPA

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)			
1	**PRELIMINARES**										
1.1	Localización y Replanteo	m2	AREA DEL PARQUE (TRIANGULO)	37	23.0		426			426	 
									TOTAL	**426**	
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**										
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	HUELLAS EN CONCRETO	1.3	0.4	0.15			8	0.62	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	BANCAS EN MADERA PLÁSTICA	1.1	1.1	0.15			3	0.54	
			BASES JUEGOS DE MADERA PLÁSTICA	0.45	0.45	0.45			9	0.82	
			BASE PUNTO ECOLOGICO	1.7	0.8	0.15			1	0.20	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	LLANTAS PINTADAS	0.6	0.6	0.2			103	7.42	
			BASES DE JUEGOS EN LLANTA	1.50	1.2	0.15			4	1.08	
									TOTAL	**10.68**	
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	RELLENO PARTE A (VER PLANO DETALLE)	20.6	2.6	0.35		18.7		18.70	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	RELLENO PARTE B (VER PLANO DETALLE)	5.6	5.8	0.45		14.6		14.60	
			RELLENO PARTE C (VER PLANO DETALLE)	8.7	5.49	0.65		31.0		31.00	
									TOTAL	**64.30**	
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	UN VIAJE DE RETIRO DE SOBRANTES					7		7.00	
									TOTAL	**7.00**	
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**										

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	HUELLAS FRENTE A JUEGOS EN LLANTA	1.2	0.35	0.15			8	8	
									TOTAL	**8.00**	
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI - 21MP	und	BASES PARA JUEGO DE CONEJO, ELEFANTE, CEBRA Y JIRAFA	DIAMETRO 1.5		0.15			4	4	
									TOTAL	**4.00**	
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI - 21MP	und	BASES JUEGOS EN MADERA PLÁSTICA	0.45	0.45	0.45			7	7	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI - 21MP	und	BASES MATACULINES	0.45	0.45	0.45			2	2	
									TOTAL	**9**	
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI - 21MP	m2	BANCAS JUNTO A PUNTO ECOLÓGICO	1	1	0.15			3	3	
									TOTAL	**3**	
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI - 21MP	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A BANCAS	1.6	0.7	0.15			1	1	
									TOTAL	**1**	
4	**MOBILIARIO URBANO**										

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	COMPLEJO PRINCIPAL EN MADERA PLÁSTICA						1	1	
									TOTAL	**1**	
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	MATACULINES JUNTO A COMPLEJO PRINCIPAL						2	2	
									TOTAL	**2**	
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	BANCAS JUNTO A PUNTO ECOLÓGICO						3	3	
									TOTAL	**3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A BANCAS						1	1	
									TOTAL	**1**	
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	ELEFANTE CEBRA CONEJO JIRAFA						4	4	
											
									TOTAL	**4**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	PERIMETRO DEL PARQUE						103	103	 
									TOTAL	**103**	
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**										
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	AREA A (PLANO DETALLE)	20.6	2.6	0.15		8.0		8	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	AREA B (PLANO DETALLE)	5.6	5.8	0.15		4.9		4.9	
			AREA C (PLANO DETALLE)	8.7	5.49	0.15		7.2		7.2	
			TIERRA DENTRO DE LLANTAS PINTADAS	DIAMETRO 0.65		0.20		0.07	103	7.20	
									TOTAL	**27.3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	AREA A (PLANO DETALLE)	20.6	2.6		53.56			53.56	
			AREA B (PLANO DETALLE)	5.6	5.8		32.48			32.48	
			AREA C (PLANO DETALLE)	8.7	5.49		47.763			47.8	
									TOTAL	**133.8**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	CARBONEROS JUNTO A MATACULINES						5	5	
									TOTAL	**5**	
5.8	Suministro e instalacion de piedra dolomita decorativa	m2	CIRCULOS FRENTE A BANCAS	CIRCULOS DIAMETRO 1.55M			1.9		4	7.6	
									TOTAL	**7.6**	
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco-portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	JAZMINES EN CIRCULOS FRENTE A BANCAS						4	4	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

AMAGÁ

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco-portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	HORTENSIAS LLANTAS PERIMETRALES						103	103	
									TOTAL	**107**	

MANUEL ALEJANDRO LASSO L.
ING CIVIL RESIDENTE DE OBRA

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ING CIVIL- CONTRATISTA

MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION- SDPA

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**										
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA					35		49	
									TOTAL	**49**	
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**										
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	JIRAFA ELEFANTE SAPO CEBRA						4	4	
									TOTAL	**4**	
4	**MOBILIARIO URBANO**										

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)			
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	JIRAFA ELEFANTE SAPO CEBRA						4	4	
									TOTAL	**4**	
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta)	und	KIOSCO AL FINAL DEL SENDERO						1	1	
									TOTAL	**1**	
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**										
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	PARQUE SAN RAFAEL	18	12	0.15	32.4			32	
									TOTAL	**32**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	PARQUE SAN RAFAEL	18	12		216			216	
									TOTAL	**216**	
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	JAZMINES AZULES						99	99	
			JAZMINES BLANCOS						39	39	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	HORTENSIAS						43	43	
									TOTAL	**181**	
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	JUNTO A CERCA DE CDI						8	8	
									TOTAL	**8**	
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	SENDERO A KIOSCO	35.7	0.28		10			10	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	SENDERO A CAPILLA	22.3	0.28		6			6	
									TOTAL	16	
5.6	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	SENDERO A KIOSCO	35.7	1	0.1		3.57		3.6	
			SENDERO A CAPILLA	22.3	1	0.1		2.23		2.2	
									TOTAL	**5.8**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.8	Arena para juegos infantiles	m3	INTERIOR CIRCULO DE JUEGOS EN MADERA PLASTICA	6	6	0.11		4.0		4	
									TOTAL	**4**	

MANUEL ALEJANDRO LASSO L.
ING CIVIL RESIDENTE DE OBRA

OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
ING CIVIL- CONTRATISTA

MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION- SDPA

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**										
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA					14		14	
									TOTAL	**14.00**	
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**										
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	ANDEN EXTERIOR PARQUE	10.4	1	0.15				10.4	
									TOTAL	**10.40**	
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI - 21MP	und	BASES JUNTO A SENDERO	1.5	0.15				3	3	
									TOTAL	**3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4	**MOBILIARIO URBANO**										
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	SAPO						1	1	
			CONEJO						1	1	
			JIRAFA						1	1	
									TOTAL	**3**	
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**										

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3		21	18	0.12		45.4		45.4	
									TOTAL	**45.4**	
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	AREA DE PRADO (DESCONTANDO CIRCUO DE JUEGOS Y SENDEROS)	18.5	13.3036		246.12			246.12	
									TOTAL	**246.12**	
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	ZONA DE BANCAS	12	2.1		25.2			25.2	
			ZONA DE JUEGOS DE LLANTA	7.6	3.175		24.1			24.1	
									TOTAL	**49.3**	

	PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021										
	OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS									
	VILLA NUEVA										
			DIMENSIONES								
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	DALIHAS JUNTO A SENDERO						22	22	
									TOTAL	**22**	
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	CARBONEROS JUNTO A JUEGOS Y JUNTO A SENDERO						4	4	
									TOTAL	**4**	
5.7	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2		50.02	0.28		14.0056			14	
									TOTAL	**14**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.8	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	SENDERO PRINCIPAL	33.0	1	0.06		2.0		2	
			SENDERO JUNTO A PUNTO ECOLOGICO	6.6	1	0.06		0.4		0.4	
			SENDERO FRENTE A JUEGOS	5.7	1	0.06		0.3		0.3	
			SENDERO JUNTO A ANDEN	4.4	1	0.06		0.3		0.3	
									TOTAL	**3.0**	
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco-portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	ESPECIES JUNTO A SENDEROS Y JUNTO A JUEGOS DE MADERA PLÁSTICA						174	174	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco-portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	ESPECIES JUNTO A SENDEROS Y JUNTO A JUEGOS DE MADERA PLÁSTICA						174	174	
									TOTAL	**174.0**	
5.10	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores - tamaño promedio 6"	ml	PIEDRA CONFINAMIENTO DALIHAS Y PORTULACAS	36.3						36.3	 
									TOTAL	**36.3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5.11	Arena para juegos infantiles	m3	CIRCULO INTERNO DE JUEGOS EN MADERA PLÁSTICA	7.1	7.1	0.1		5.0		5.0	
									TOTAL	**5.0**	

MANUEL ALEJANDRO LASSO L.
ING CIVIL RESIDENTE DE OBRA

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ING CIVIL- CONTRATISTA

MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION- SDPA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021												
	VILLA NUEVA												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	520	$ 1,871.00	$ 972,920.00	-	-73.00	-$ 136,583.00				447.00	$ 836,337.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	78	$ 17,263.00	$ 1,346,514.00	-	-38.48	-$ 664,280.00				39.52	$ 682,234.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	26	$ 45,548.00	$ 1,184,248.00	-	-22.00	-$ 1,002,056.00	-	-0.30	-$ 13,664.00	3.70	$ 168,528.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	78	$ 28,742.00	$ 2,241,876.00	-	-78.00	-$ 2,241,876.00	+	14.00	$ 402,388.00	14.00	$ 402,388.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	148.74	$ 49,955.00	$ 7,430,307.00	-	-16.34	-$ 816,264.70				132.40	$ 6,614,042.00
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	11.2	$ 57,796.00	$ 647,315.00							11.20	$ 647,315.00
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	35	$ 76,652.00	$ 2,682,820.00	-	-1.00	-$ 76,652.00				34.00	$ 2,606,168.00
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	11.2	$ 130,706.00	$ 1,463,907.00				-	-0.80	-$ 104,565.00	10.40	$ 1,359,342.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 95,257.00	$ 285,771.00							3.00	$ 285,771.00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	38	$ 87,531.00	$ 3,326,178.00	-	-29.00	-$ 2,538,399.00				9.00	$ 787,779.00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,863.00	$ 314,589.00							3.00	$ 314,589.00
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 115,914.00	$ 231,828.00							2.00	$ 231,828.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,577,141.00	$ 9,577,141.00							1.00	$ 9,577,141.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00							2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00							3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 848,058.00	$ 1,696,116.00							2.00	$ 1,696,116.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 257,739.00	$ 773,217.00							3.00	$ 773,217.00
4.6	Pintura para llantas existentes para juegos infantiles.	und	10	$ 26,750.00	$ 267,500.00				-	-10.00	-$ 267,500.00	0.00	$ -
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	52	$ 63,050.00	$ 3,278,600.00	+	4.00	$ 252,200.00	-	-10.60	-$ 668,330.00	45.40	$ 2,862,470.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	201	$ 21,667.00	$ 4,355,067.00	+	19.00	$ 411,673.00	+	26.12	$ 565,942.00	246.12	$ 5,332,682.00
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	87	$ 14,353.00	$ 1,248,711.00				-	-37.70	-$ 541,108.00	49.30	$ 707,603.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	12	$ 17,381.00	$ 208,572.00				+	10.00	$ 173,810.00	22.00	$ 382,382.00
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	4	$ 22,032.00	$ 88,128.00							4.00	$ 88,128.00
5.7	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	13	$ 55,926.00	$ 727,038.00				+	1.00	$ 55,926.00	14.00	$ 782,964.00
5.8	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	3	$ 160,456.00	$ 481,368.00							3.00	$ 481,368.00
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	177	$ 20,318.00	$ 3,596,286.00				-	-3.00	-$ 60,954.00	174.00	$ 3,535,332.00
5.10	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"	ml	20	$ 35,250.00	$ 705,000.00				+	16.30	$ 574,575.00	36.30	$ 1,279,575.00
5.11	Arena para juegos infantiles	m3	5	$ 155,569.00	$ 777,845.00							5.00	$ 777,845.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021												
	AMAGÁ												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	600	$ 1,871.00	$ 1,122,600.00				-	-174.00	-$ 325,554.00	426.00	$ 797,046.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	30	$ 17,263.00	$ 517,890.00				-	-19.32	-$ 333,521.00	10.68	$ 184,369.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	20	$ 45,548.00	$ 910,960.00	+	10.00	$ 455,480.00	+	34.30	$ 1,562,296.00	64.30	$ 2,928,736.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	30	$ 28,742.00	$ 862,260.00				-	-23.00	-$ 661,066.00	7.00	$ 201,194.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	8	$ 76,652.00	$ 613,216.00							8.00	$ 613,216.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 95,257.00	$ 381,028.00							4.00	$ 381,028.00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	25	$ 87,531.00	$ 2,188,275.00				-	-16.00	-$ 1,400,496.00	9.00	$ 787,779.00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,908.00	$ 314,724.00							3.00	$ 314,724.00
3.8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00							1.00	$ 115,959.00
3.9	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m		$ 57,796.00			50.26	$ 2,904,827.00	-	-50.26	-$ 2,904,827.00	0.00	$ -
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,501,581.00	$ 8,501,581.00							1.00	$ 8,501,581.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00							2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00							3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00							1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 257,739.00	$ 1,030,956.00							4.00	$ 1,030,956.00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und		$ 44,996.00						103.00	$ 4,634,588.00	103.00	$ 4,634,588.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	20	$ 63,050.00	$ 1,261,000.00	+	20.00	$ 1,261,000.00	-	-12.70	-$ 800,735.00	27.30	$ 1,721,265.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	200	$ 21,667.00	$ 4,333,400.00	+	50.00	$ 1,083,350.00	-	-116.20	-$ 2,517,705.00	133.80	$ 2,899,045.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm	und	160	$ 11,750.00	$ 1,880,000.00				-	-160.00	-$ 1,880,000.00	0.00	$ -
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	6	$ 23,341.00	$ 140,046.00				-	-1.00	-$ 23,341.00	5.00	$ 116,705.00
5.8	Suministro e instalacion de piedra dolomita decorativa	m2	3.2	$ 55,271.00	$ 176,867.00				+	4.40	$ 243,192.00	7.60	$ 420,060.00
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	58	$ 17,698.00	$ 1,026,484.00				+	49.00	$ 867,202.00	107.00	$ 1,893,686.00
	2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021												
	AIDA LUCIA												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	231	$ 1,871.00	$ 432,201.00				+	109.00	$ 203,939.00	340.00	$ 636,140.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	17	$ 17,263.00	$ 293,471.00				+	0.42	$ 7,250.00	17.42	$ 300,721.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	23	$ 45,548.00	$ 1,047,604.00	+	5.00	$ 227,740.00	+	26.60	$ 1,211,577.00	54.60	$ 2,486,921.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	17	$ 28,742.00	$ 488,614.00				-	-10.00	-$ 287,420.00	7.00	$ 201,194.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	6	$ 97,366.00	$ 584,196.00				-	-2.00	-$ 194,732.00	4.00	$ 389,464.00
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 132,000.00	$ 396,000.00							3.00	$ 396,000.00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	30	$ 87,531.00	$ 2,625,930.00					-22.00	-$ 1,925,682.00	8.00	$ 700,248.00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 104,908.00	$ 209,816.00							2.00	$ 209,816.00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00							1.00	$ 115,959.00
3.6	Bancos en concreto pintados de colores	und	5	$ 127,811.00	$ 639,055.00							5.00	$ 639,055.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,226,877.00	$ 9,226,877.00							1.00	$ 9,226,877.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00							2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 493,826.00	$ 987,652.00							2.00	$ 987,652.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00							1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 256,481.71	$ 769,445.00							3.00	$ 769,445.00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	90	$ 44,996.00	$ 4,049,640.00				+	1.00	$ 44,996.00	91.00	$ 4,094,636.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	8	$ 66,979.00	$ 535,832.00	+	13.00	$ 870,727.00	+	7.20	$ 482,249.00	28.20	$ 1,888,808.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	115.5	$ 26,013.00	$ 3,004,502.00	+	35.00	$ 910,455.00	+	18.00	$ 468,234.00	168.50	$ 4,383,191.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 - 40) cm	und	90	$ 14,191.00	$ 1,277,190.00				+	2.00	$ 28,382.00	92.00	$ 1,305,572.00
5.6	Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	14	$ 12,549.00	$ 175,686.00							14.00	$ 175,686.00
	2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021												
	SAN RAFAEL												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	560	$ 1,871.00	$ 1,047,760.00	-	-89.00	-$ 166,519.00				471.00	$ 881,241.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	84	$ 17,263.00	$ 1,450,092.00	+	7.06	$ 121,877.00				91.06	$ 1,571,969.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	28	$ 45,548.00	$ 1,275,344.00	-	-1.72	-$ 78,343.00				26.28	$ 1,197,001.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	84	$ 28,742.00	$ 2,414,328.00	-	-84.00	-$ 2,414,328.00	+	49.00	$ 1,408,358.00	49.00	$ 1,408,358.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	22	$ 96,704.00	$ 2,127,488.00	+	1.00	$ 96,704.00				23.00	$ 2,224,192.00
3.2	Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM	m	9	$ 70,497.00	$ 634,473.00	-	-9.00	-$ 634,473.00				0.00	
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 216,445.00	$ 865,780.00							4.00	$ 865,780.00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	35	$ 81,210.00	$ 2,842,350.00	-	-26.00	-$ 2,111,460.00				9.00	$ 730,890.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 116,060.00	$ 348,180.00							3.00	$ 348,180.00
3.6	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 120,774.00	$ 120,774.00							1.00	$ 120,774.00
3.7	Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	4	$ 431,716.00	$ 1,726,864.00	+	0.71	$ 306,518.00				4.71	$ 2,033,382.00
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro	und	6	$ 152,741.00	$ 916,446.00							6.00	$ 916,446.00
3.9	Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m	und	4	$ 155,189.00	$ 620,756.00							4.00	$ 620,756.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.2	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,733,863.00	$ 8,733,863.00							1.00	$ 8,733,863.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,150,796.00	$ 2,301,592.00							2.00	$ 2,301,592.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00							3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00							1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 266,917.00	$ 1,067,668.00							4.00	$ 1,067,668.00
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta)	und	1	$ 10,757,425.00	$ 10,757,425.00							1.00	$ 10,757,425.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	5	$ 67,634.00	$ 338,170.00	+	37.00	$ 2,502,458.00	-	-10.00	-$ 676,340.00	32.00	$ 2,164,288.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	100	$ 29,524.00	$ 2,952,400.00	+	50.00	$ 1,476,200.00	+	66.00	$ 1,948,584.00	216.00	$ 6,377,184.00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	186	$ 17,999.00	$ 3,347,814.00				-	-5.00	-$ 89,995.00	181.00	$ 3,257,819.00
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	14	$ 22,032.00	$ 308,448.00				-	-6.00	-$ 132,192.00	8.00	$ 176,256.00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	16	$ 55,926.00	$ 894,816.00							16.00	$ 894,816.00
5.6	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	4	$ 165,693.00	$ 662,772.00				+	1.80	$ 298,247.00	5.80	$ 961,019.00
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	5	$ 375,326.00	$ 1,876,630.00							5.00	$ 1,876,630.00
5.8	Arena para juegos infantiles	m3	0	$ 155,569.00	$ -				+	4.00	$ 622,276.00	4.00	$ 622,276.00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 126,492,409.00**			**$ (19.00)**			**$ (4,365.00)**		**$ 126,488,025.00**
	ADMINISTRACIÓN 23 %				$ 29,093,254.00			$ (4.00)			$ (1,004.00)		$ 29,092,246.00
	IMPREVISTOS 2 %				$ 2,529,848.00			$ -			$ (87.00)		$ 2,529,761.00
	UTILIDAD 5 %				$ 6,324,620.00			$ (1.00)			$ (218.00)		$ 6,324,401.00
	IVA S/UTILIDAD 19%				$ 1,201,678.00			$ -			$ (41.00)		$ 1,201,636.00
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN										-1		
	COSTO TOTAL				**$ 165,641,809.00**			**$ (24.00)**			**$ (5,716.00)**		**$ 165,636,069.00**

CONTRATISTA:

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SUPERVISOR:

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
SUPERVISOR CRC

APOYO SUPERVISION:

MILAGROS FERNANDEZ T.
CONTRATISTA SDPA-CRC

Vo. Bo.

CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ
SUBDIRECTORA DEFENSA DE PATRIMONIO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFICALES

Yo, FANNY JANNETH CHILITO PEREZ, ciudadana colombiana identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.277.588 de Popayán y Tarjeta de Contadora Publica No.175807-T, en mi calidad de Contadora de la Ingeniera OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ con NIT 34.563.335 - 1

HAGO CONSTAR:


Bajo la gravedad del juramento que el personal aplicado al contrato de Obra No. 409 de 2021, se encuentra vinculado y paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social en salud pensiones y riesgos profesionales, y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo a las empresas promotoras de salud-ESP, Fondo de Pensiones, Administradoras de riesgos laborarles-ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA., conforme a las exoneraciones establecidas en el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, el texto es el siguiente:

> *Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud…*
> *Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso…*

Los aportes correspondientes se han hecho de acuerdo con las normas sobre plazos para su pago y las deducciones correspondientes (Decreto 1406 de 1999 y Ley 21 de 1982), a la fecha y hora de esta certificación.

Para constancia se firma en la Ciudad de Popayán, a los 20 días del mes diciembre de 2021.

Cordialmente,



FANNY JANNETH CHILITO PEREZ
C.C 25.277.588 de Popayán
Contadora Pública T.P No. 175807-T

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa contratista DAVID HERNANDEZ OLGA LUCIA, identificada con Nit. 34563335, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Agosto del 2021 a Octubre del 2021.

VALOR NOMINA: $ 13.165.000 VALOR 4%: $ 526.600

Por concepto: CONTRATO DE OBRA N° 409 DE 2021, SUSCRITO CON LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.

El documento es válido para liquidación del presente Contrato

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES."

Se expide en Popayán, a los 21 días del mes de Diciembre de 2021

JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES

VIGILADO SuperSubsidio



OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

NIT 34563335-1
Nombre Comercial: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7112
Dirección: CR 12 34 N 204 BL 3 AP 502 CONJ LA RIVERA
Teléfono: 8364079
Correo: odavidh@yahoo.es
Ciudad: POPAYÁN



CUFE:687d6a6a8c8639a92f05457787c1f96563d67b3528ab47cc40780b05cf7816aff99f32c511d8ac597a00d3eec98d4210

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 370
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764018746889 de 2021-09-29 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 367 hasta 500
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2021-12-20 18:33:32
Fecha Vencimiento: 2022-01-12
Fecha Dian: 2021-12-20 18:33:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
NIT 891501885-4
Nombre Comercial: CRC
Dirección: CARRERA 7 No 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Teléfono: 8333232
Correo: dterritorialcentro@crc.gov.co
Ciudad: POPAYÁN

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Ref	Descripción	Valor	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	CTO 409-2021	Contrato	85,387,042.0	1.0	85,387,042.00	0.00	85,387,042.00
2	ADM-CRC-409-2021	Administración 23.00%	19,639,019.66	1.0	19,639,020.00	0.00	19,639,020.00
3	IMP-CRC-409-2021	Imprevistos 2.00%	1,707,740.84	1.0	1,707,741.00	0.00	1,707,741.00
4	UT-CRC-409-2021	Utilidades 5.00%	4,269,352.1	1.0	4,269,352.00	19.00	5,080,529.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
ACTA PARCIAL No 02 Y FINAL
CONTRATO DE OBRA 409-2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	111,003,155.00
SUBTOTAL	111,003,155.00
IVA	811,177.00

TOTAL EN LETRAS CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	111,814,332.00



OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

NIT 34563335-1
Nombre Comercial: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7112
Dirección: CR 12 34 N 204 BL 3 AP 502 CONJ LA RIVERA
Teléfono: 8364079
Correo: odavidh@yahoo.es
Ciudad: POPAYÁN



CUFE:687d6a6a8c8639a92f05457787c1f96563d67b3528ab47cc40780b05cf7816aff99f32c511d8ac597a00d3eec98d4210

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 370
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764018746889 de 2021-09-29 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 367 hasta 500
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2021-12-20 18:33:32
Fecha Vencimiento: 2022-01-12
Fecha Dian: 2021-12-20 18:33:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
NIT 891501885-4
Nombre Comercial: CRC
Dirección: CARRERA 7 No 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Teléfono: 8333232
Correo: dterritorialcentro@crc.gov.co
Ciudad: POPAYÁN

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

AIU (Administración Imprevistos, Utilidades)

Descripción	Porcentaje	Concepto
Contrato	0.00%	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
Administración	23.00%	Contrato de Servicios AIU por concepto de: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
Imprevistos	2.00%	IMPREVISTOS CTO 409-2021: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
Utilidades	5.00%	UTILIDAD CTO 409-2021: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS



OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

NIT 34563335-1
Nombre Comercial: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7112
Dirección: CR 12 34 N 204 BL 3 AP 502 CONJ LA RIVERA
Teléfono: 8364079
Correo: odavidh@yahoo.es
Ciudad: POPAYÁN



CUFE:687d6a6a8c8639a92f05457787c1f96563d67b3528ab47cc40780b05cf7816aff99f32c511d8ac597a00d3eec98d4210

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 370
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764018746889 de 2021-09-29 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 367 hasta 500
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2021-12-20 18:33:32
Fecha Vencimiento: 2022-01-12
Fecha Dian: 2021-12-20 18:33:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
NIT 891501885-4
Nombre Comercial: CRC
Dirección: CARRERA 7 No 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Teléfono: 8333232
Correo: dterritorialcentro@crc.gov.co
Ciudad: POPAYÁN

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.12.21 10:16:07 -05:00

Código de Seguridad: qFOYf9ox9kW+3agd0omGAA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100008057	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100074668	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2021	24:00 Horas Del	15/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DAVID HERNANDEZ, OLGA LUCIA	No. DOC. IDENTIDAD	34.563.335
DIRECCIÓN	CALLE 28 CN NO. 6C 11	TELÉFONO	3017237404
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.	No. DOC. IDENTIDAD	891.501.885-4
DIRECCIÓN	CRA 7 N. 1 N 28 ED. EDGAR NEGRET	TELÉFONO	8333232
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.	No. DOC. IDENTIDAD	891.501.885-4
DIRECCIÓN	CRA 7 N. 1 N 28 ED. EDGAR NEGRET	TELÉFONO	8333232

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA No 2 Y FINAL DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 409; QUE SE REFIERE A: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS.
.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/09/2021	24:00 Horas Del 08/06/2022	33.128.361,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/09/2021	24:00 Horas Del 08/12/2024	8.282.090,45	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 07/09/2021	24:00 Horas Del 08/06/2022	33.128.361,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/12/2021	24:00 Horas Del 15/12/2026	49.692.542,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 124.231.356,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/12/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Olga Lucía David Hernández
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: qFOYf9ox9kW+3agd0omGAA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100008057	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100074668	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2021	24:00 Horas Del	15/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DAVID HERNANDEZ, OLGA LUCIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	34.563.335
DIRECCIÓN	CALLE 28 CN NO. 6C 11	**TELÉFONO**	3017237404
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.501.885-4
DIRECCIÓN	CRA 7 N. 1 N 28 ED. EDGAR NEGRET	**TELÉFONO**	8333232
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.501.885-4
DIRECCIÓN	CRA 7 N. 1 N 28 ED. EDGAR NEGRET	**TELÉFONO**	8333232

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA No 2 Y FINAL DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 409; QUE SE REFIERE A: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS.
.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/09/2021	24:00 Horas Del 08/06/2022	33.128.361,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/09/2021	24:00 Horas Del 08/12/2024	8.282.090,45	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 07/09/2021	24:00 Horas Del 08/06/2022	33.128.361,80	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/12/2021	24:00 Horas Del 15/12/2026	49.692.542,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 124.231.356,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/12/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Patricia Munar Martinez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Olga Lucía David Hernández
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100008057	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	100074668	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2021	24:00 Horas Del	15/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ASEGURADO, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE A LA COMPAÑIA ASEGURADORA MUNDIAL S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100008057** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **DAVID HERNANDEZ, OLGA LUCIA** Asegurado o Beneficiario: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C. / CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.** , expedida por la Compañía en **21/12/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **21** días del mes **DICIEMBRE** del año **2021**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	**CODIGO: FITSI-PDPA** **VERSION: 2**

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 000409 DEL 2021.

FECHA DE INFORME	Dia	**15**	Mes	**DICIEMBRE**	Año	**2021**
SUPERVISOR	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA					
NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO N° 000409 DEL 2021					
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO	MUNICIPIO DE MORALES (Vereda San Rafael) MUNICIPIO DE PIENDAMÓ (Vereda Villa Nueva, Barrio Amagá) MUNICIPIO DE POPAYÁN (Urb. Aida Lucia)					
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS					
VALOR DEL CONTRATO	**$165.641.809 M/CTE**					
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES MESES					
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	15 DE DICIEMBRE DEL 2020					
COMITÉ DE VEEDURICA CIUDADANA	SE CONFORMO EL COMITÉ DE VEEDURIA					
SUSPENSIÓN	No 1	N/A	Fecha	N/A	Nuevo Vencimiento y /o Cuantia	N/A
	No 2		Fecha		Nuevo Vencimiento y /o Cuantia	
	No 3		Fecha		Nuevo Vencimiento y /o Cuantia	
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	Valor en %	**%**	Indicador Proyectado.	01 OBRA EN CONSTRUCCION	Indicador ejecutado	**100%**
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO	LAS OBRAS QUE SE ADELANTARON EN EL ACTA PARCIAL 01 SE CENTRA SOBRE LAS LABORES DE AVANCE DE LA JECUCION DEL CONTRATO EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES Y PIENDAMO DE LA SIGUIENTE MANERA: ITEMS EJECUTADOS HASTA LA FECHA EN EL MUNICIPIO DE MORALES- VEREDA SAN RAFAEL: LOCALIZACION Y RELANTEO, EXCAVACIONES, RELLENOS, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA PINTADA PARA SENDERO PEATONAL , CONSTRUCCION DE LOSA Y BASES EN CONCRETO PARA KIOSCO, CONSTRUCCION DE BASES EN CONCRETO PARA MOBILIARIO URBANO, ELABORACION DE BANCOS EN CONCRETO, Y SUMINISTRO E INTALACION DE MOBILIARIO URBANO COMO BANCAS, PUNTOS ECOLOGICOS, JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA. TEMS EJECUTADOS HASTA LA FECHA EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO VEREDA VILLA NUEVA: LOCALIZACION Y RELANTEO, EXCAVACIONES, RELLENOS, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO,BORDILLOS EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO DE SENDERO, BASES EN CONCRETO PARA INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN MADERA PLASCTICA COMO: BANCAS, PUNTOS					
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	Valor en %	**100,00%**	Valor en $	**$ 165.636.069,00**		

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	**CODIGO: FITSI-PDPA**
		VERSION: 2

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 000409 DEL 2021.

FECHA DE INFORME	Dia	**15**	Mes	**DICIEMBRE**	Año	**2021**
OBSERVACIONES	Lo reportado como avance fisico y financiero corresponde al 100 % del aporte CRC para la ejecucion del Contrato, según lo acordado contractualmente					
NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE ATIENDE LA VISITA DE PARTE DEL EJECUTOR	ING- OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ. CONTRATISTA ING- MANUEL ALEJANDRO LASSO- RESIDENTE DE OBRA					
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	LA OBRA SE EJECUTÓ CON NORMALIDAD, TODOS LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS A LA COMUNIDAD DE CADA COMITÉ DE VEEDURIA EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS Y SITIOS DE TRABAJO, RECIBIDAS A SATISFACCION POR LOS MISMOS.					
ESTADO	El Proyecto se ejecuó en condiciones normales acorde con el cronograma proyectado (no presentó ningun inconveniente).					
ANEXO	-					

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Supervisor Designado
Contrato de obra N° 000409 de 2021.

Proyectó: Arq. Milagros Hernandez T.
Revisó: Ing. Alberto Molano P.

CONVENCIONES DEL ESTADO METODO DE VERNIEER	
COLOR	SIGNIFICADO DEL ESTADO
x	El Proyecto se ejecutó en condiciones normales acorde con el plazo pactado (no presentó ningun inconveniente).
	El proyecto presenta retrazos no considerables que se pueden subsanar facilmente.
	El Proyecto tiene probelmas de ejecucion y presenta retrazos considerables que no permiten ejecutarlo en los tiempos proyectados.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

RECORD FOTOGRAFICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 000409 DEL 2021. VEREDA VILLA NUEVA

Foto 1 Condiciones sitio antes de intervenir



Foto 2 Zona de interes ambiental intervenida 100%



Foto 3 Condiciones sitio antes de intervenir



Foto 4 Instalacion y adecuacion de elementos en concreto



Foto 5 Dotacion de mobiliario urbano-recreativo



Foto 6 Dotacion de elemetos naturales



FECHA DE INFORME	SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR
15 DICIEMBRE DE 2020	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA	

Proyectó: Arq. Milagros Hernández T.
Revisó: Ing. Alberto Molano P.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

RECORD FOTOGRAFICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 000409 DEL 2021. VEREDA SAN RAFAEL

Foto 1 Condiciones sitio antes de intervenir



Foto 2 Zona de interes ambiental recuperada



Foto 3 Adecuación de senderos en piedra



Foto 4 Dotacion elemetos de paisajismo



Foto 5 Suministro de mobiliario urbano - kiosco



Foto 6 Dotacion de mobiliario urbano- juegos



FECHA DE INFORME	SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR
15 DICIEMBRE DE 2020	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA	

Proyectó: Milagros Hernandez

Revisó: Ing. Alberto Molano P.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

RECORD FOTOGRAFICO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 000409 DEL 2021. AMAGA-PIENDAMO

Foto 1 Condiciones sitio antes de intervenir



Foto 2 Zona de interes ambiental en recuperado



Foto 3 Condiciones sitio antes de intervenir



Foto 4 Dotacion de mobiliario urbano- juegos



Foto 5 Instalacion y adecuacion de elementos en concreto



Foto 6 Dotacion de elementos naturales



FECHA DE INFORME	SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR
15 DICIEMBRE DE 2020	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA	

Proyectó: Milagros Hernandez
Revisó: Ing. Alberto Molano P.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

RECORD FOTOGRAFICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 000409 DEL 2021. AIDA LUCIA-POPAYAN

Foto 1 Condiciones sitio antes de intervenir



Foto 2 Zona de interes ambiental en recuperación



Foto 3 Adecuación de senderos en piedra



Foto 4 Dotacion de mobiliario urbano- juegos



Foto 5 Suministro de mobiliario urbano en madera plastica



Foto 6 Elaboracion estructuras en concreto



FECHA DE INFORME	SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR
15 DICIEMBRE DE 2020	ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA	

Proyectó: Milagros Hernandez
Revisó: Ing. Alberto Molano P.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

1 INRORMACIÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
CONTRATISTA	OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATO No	409 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS.
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2021
SUSPENSIONES	N/A

2 DESARROLLO DEL CONTRATO

El contrato consistió en la ejecución de 4 parques localizados de la siguiente forma: 2 de ellos en el Municipio de Piendamó, uno en el barrio Amagá y otro en la Vereda Villa Nueva, un tercer parque en el Municipio de Morales, en la vereda San Rafael y un cuarto parque en el barrio Aida Lucía en el Municipio de Popayán.

Las obras consistieron en: adecuaciones del terreno para tener superficies adecuadas para la construcción de las obras, construcción de obras de concreto tipo sardineles y bordillos para el

confinamiento de materiales granulares, construcción de bases en concreto para empotrar y dar estabilidad a los distintos elementos del mobiliario contratado. Finalmente se instaló tierra negra y prado para cubrir la mayoría de los espacios de los parques y se sembró plantas como Hortensias, carboneros, jazmines, dalias entro otros, con el fin de embellecer el parque de acuerdo con la temática paisajística del contrato. Es importante mencionar que todo el mobiliario instalado en los distintos parques es proveniente de material reciclado, tal como los juegos en madera plástica, bancas y puntos ecológicos, como los juegos elaborados en llanta. También se aprovechó llantas que ya cumplieron su uso como material decorativo que fue pintado y sobre el que se sembró vegetación.

3 AVANCE DEL CONTRATO

3.1 EFECUCIÓN FINANCIERA

Financieramente se tiene una ejecución del 100% del valor del contrato de acuerdo con el acta de modificación No 02

3.2 EJECUCIÓN FÍSICA

Físicamente se tiene una ejecución del 100% de las actividades.

4 PERSONAL EN OBRA

El personal presente en la obra por cada frente desde el inicio de la ejecución de trabajos es el siguiente:

1 ingeniero Residente

1 Maestro de obra

1 Oficial

3 Ayudantes (contratados en cada sector)

5 ITEMS EJECUTADOS

6 FRENTE DE OBRA SAN RAFAEL

6.1 CAPÍTULO DE PRELIMINARES

Dentro de este capítulo se encuentran los siguientes ítems:

- Localización y replanteo

Se realizó la localización de la totalidad de los elementos para poder llevar a cabo la construcción e instalación de cada uno de ellos

6.2 CAPITULO DE EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS

Dentro de este capítulo se ejecutaron los siguientes ítems:

- Excavación a mano en material común prof hasta 0,60m
- Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de préstamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno
- Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado

Se realizó la excavación principal en este frente, para poder dar el nivel adecuado a las superficies a construir y se realizaron los rellenos correspondientes en cada caso.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

6.3 CAPITULO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma
- Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP
- Bases en concreto para instalación de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP
- Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP

- Bases en concreto simple para instalación de puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP
- Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM
- Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diámetro
- Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50m x 0.5m

Se construyeron todas las estructuras de en concreto con el fin de dar estabilidad a todo el mobiliario contratado, además se construyó la losa de soporte para la estructura en guadua del kiosco.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

6.1 CAPITULO DE MOBILIARIO URBANO

Este capítulo contempla los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica burrito balancín.
- Suministro e instalación de bancas con espaldar en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de puntos ecológicos en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones técnicas
- Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta)

Para este capítulo se solicitó la elaboración de los productos en madera plástica de acuerdo con las especificaciones entregadas por la CRC y posterior a ello se realizó su debida instalación sobre bases de concreto mencionadas en el capítulo anterior. De igual forma se construyó el kiosco en guadua de acuerdo con las dimensiones y planos entregados por CRC.

El mobiliario instalado y correspondiente al complejo infantil en madera plástica para este frente es el siguiente:

SAN RAFAEL - MORALES			DESCRIPCIÓN JUEGOS
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.	und	1	TORRE CON PLATAFORMA
			RESBALADOR
			PASAMANOS
			ARAÑA
			CULUMPIOS

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

6.2 CAPITULO DE VEGETACIÓN Y ELEMENTOS NATURALES

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, árboles, arbustos.
- Suministro e instalación de prado gateadora o trenza
- Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm
- Suministro y siembra de especies arbóreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)
- Suministro e instalación de piedra dolomita para adecuación de jardinera.
- Suministro e instalación de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm
- Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmación de sendero

Una vez terminadas las actividades de excavaciones, rellenos y estructuras en concreto, se pudo dar inicio a la instalación de los elementos de vegetación, para que estos no fueran dañados durante la ejecución de los demás trabajos. También se realizó el riego del material tipo triturado a lo largo del sendero que va hacia el kiosco y también en el que se dirige a la capilla.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

Con la ejecución de este capítulo se dio fin a las obras requeridas dentro de este frente de obra, teniendo un 100% de ejecución.

6.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN RAFAEL













OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079





OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

7 FRENTE DE OBRA VILLA NUEVA

7.1 CAPÍTULO DE PRELIMINARES

Dentro de este capítulo se encuentran los siguientes ítems:

- Localización y replanteo

Se realizó la localización de la totalidad de los elementos para poder llevar a cabo la construcción e instalación de cada uno de ellos

7.2 CAPITULO DE EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS

Dentro de este capítulo se ejecutaron los siguientes ítems:

- Excavación a mano en material común prof hasta 0,60m
- Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de préstamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno
- Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado

Se realizó la excavación y nivelación de toda el área para poder dar una superficie adecuada a la hora de construir y se realizó los rellenos correspondientes en cada caso.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

7.3 CAPITULO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes
- Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm
- Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma
- Anden peatonal en concreto ciclópeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.

- Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP
- Bases en concreto para instalación de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP
- Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP
- Bases en concreto simple para instalación de puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP

Se construyeron todas las estructuras de en concreto con el fin de dar estabilidad a todo el mobiliario contratado, además se construyó todos los bordillos en concreto para poder confinar el material tipo triturado en el caso del sendero y el material tipo arena en el caso del área de juegos en madera plástica.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

7.4 CAPITULO DE MOBILIARIO URBANO

Este capítulo contempla los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástico según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica burrito balancín.
- Suministro e instalación de bancas con espaldar en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de puntos ecológicos en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones técnicas

Para este capítulo se solicitó la elaboración de los productos en madera plástica de acuerdo con las especificaciones entregadas por la CRC y posterior a ello se realizó su debida instalación sobre bases de concreto mencionadas en el capítulo anterior.

El mobiliario instalado y correspondiente al complejo infantil en madera plástica para este frente es el siguiente:

VILLA NUEVA PIENDAMÓ			DESCRIPCIÓN JUEGOS
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.	und	1	TORRE CON TECHO
			PASAMANOS
			ARAÑA
			CULUMPIOS
			RESBALADERO

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

7.5 CAPITULO DE VEGETACIÓN Y ELEMENTOS NATURALES

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, árboles, arbustos.
- Suministro e instalación de prado gateadora o trenza
- Suministro e instalación de prado maní forrajero 6 und por m2
- Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 - 50)cm
- Suministro y siembra de especies arbóreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)
- Suministro e instalación de piedra dolomita para adecuación de jardinera.
- Suministro e instalación de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm
- Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmín azul del cabo o celestina, Jazmín blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm
- Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"
- Arena para juegos infantiles

Una vez terminadas las actividades de excavaciones, rellenos y estructuras en concreto, se pudo dar inicio a la instalación de los elementos de vegetación, para que estos no fueran dañados

durante la ejecución de los demás trabajos. También se realizó el riego del material tipo triturado sobre todo el sendero principal y también el riego de la arena sobre el área de los juegos infantiles en madera plástica.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

Con la ejecución de este capítulo se dio fin a las obras requeridas dentro de este frente de obra, teniendo un 100% de ejecución.

7.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO VILLA NUEVA
















OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079





OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

8 FRENTE DE OBRA BARRIO AMAGÁ - PIENDAMÓ

8.1 CAPÍTULO DE PRELIMINARES

Dentro de este capítulo se encuentran los siguientes ítems:

- Localización y replanteo

Se realizó la localización de la totalidad de los elementos para poder llevar a cabo la construcción e instalación de cada uno de ellos

8.2 CAPITULO DE EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS

Dentro de este capítulo se ejecutaron los siguientes ítems:

- Excavación a mano en material común prof hasta 0,60m
- Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de préstamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno
- Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado

Se realizó el relleno principal en este frente para poder dar continuidad al parque existente y que todos los elementos a construir e instalar tuvieran una superficie adecuada. Posterior a esto se realizó la excavación de cada uno de los elementos de concreto y de las llantas que contendrían las plantas para que estas queden empotradas en el suelo.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

8.3 CAPITULO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma
- Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP
- Bases en concreto para instalación de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI - 21MP

- Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP
- Bases en concreto simple para instalación de puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP
- Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm

Se construyó todas las estructuras de en concreto con el fin de dar estabilidad a todo el mobiliario contratado

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

8.4 CAPITULO DE MOBILIARIO URBANO

Este capítulo contempla los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica burrito balancín.
- Suministro e instalación de bancas con espaldar en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de puntos ecológicos en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones técnicas
- Suministro e instalación de llantas pintadas para matera.

Para este capítulo se solicitó la elaboración de los productos en madera plástica de acuerdo con las especificaciones entregadas por la CRC y posterior a ello se realizó su debida instalación sobre bases de concreto mencionadas en el capítulo anterior.

Se instaló llantas pintadas de distintos colores en todo el perímetro del parque, para posteriormente rellenarlas de tierra e instalar la vegetación en ellas.

El mobiliario instalado y correspondiente al complejo infantil en madera plástica para este frente es el siguiente:

AMAGA - PIENDAMO			DESCRIPCIÓN JUEGOS
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.	und	1	Torre con techo
			PASAMANOS
			CULUMPIOS

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

8.5 CAPITULO DE VEGETACIÓN Y ELEMENTOS NATURALES

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, árboles, arbustos.
- Suministro e instalación de prado gateadora o trenza
- Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm
- Suministro y siembra de especies arbóreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)
- Suministro e instalación de piedra dolomita decorativa
- Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmín azul del cabo o celestina, Jazmín blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm

Una vez terminadas las actividades de excavaciones, rellenos y estructuras en concreto, se pudo dar inicio a la instalación de los elementos de vegetación, para que estos no fueran dañados durante la ejecución de los demás trabajos. También se realizó el relleno del material tipo tierra negra dentro de todas las llantas instaladas en el perímetro del parque y la correspondiente instalación de vegetación en ellas.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

Con la ejecución de este capítulo se dio fin a las obras requeridas dentro de este frente de obra, teniendo un 100% de ejecución.

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO AMAGÁ - PIENDAMÓ













OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079







OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

9 FRENTE DE OBRA BARRIO AIDA LUCÍA - POPAYÁN

9.1 CAPÍTULO DE PRELIMINARES

Dentro de este capítulo se encuentran los siguientes ítems:

- Localización y replanteo

Se realizó la localización de la totalidad de los elementos para poder llevar a cabo la construcción e instalación de cada uno de ellos

9.2 CAPITULO DE EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS

Dentro de este capítulo se ejecutaron los siguientes ítems:

- Excavación a mano en material común prof hasta 0,60m
- Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de préstamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno
- Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado

Se realizó el relleno principal en la zona de los columpios existentes para poder dar una superficie adecuada a la construcción de las bases de los juegos en llanta y para mejorar el estado irregular actual. También se realizó una excavación considerable para poder lograr un espacio adecuado para la construcción de los bancos de concreto

Posterior a esto se realizó la excavación de cada uno de los elementos de concreto y de las llantas que contendrían las plantas para que estas queden empotradas en el suelo.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

9.3 CAPITULO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma
- Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP

- Bases en concreto para instalación de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI - 21MP
- Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP
- Bases en concreto simple para instalación de puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP
- Bancos en concreto pintados de colores

Se construyó todas las estructuras de en concreto con el fin de dar estabilidad a todo el mobiliario contratado

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades.

9.4 CAPITULO DE MOBILIARIO URBANO

Este capítulo contempla los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica burrito balancín.
- Suministro e instalación de bancas con espaldar en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de puntos ecológicos en madera plástica según especificaciones técnicas.
- Suministro e instalación de juegos individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones técnicas
- Suministro e instalación de llantas pintadas para matera.

Para este capítulo se solicitó la elaboración de los productos en madera plástica de acuerdo con las especificaciones entregadas por la CRC y posterior a ello se realizó su debida instalación sobre bases de concreto mencionadas en el capítulo anterior.

Se instaló llantas pintadas de distintos colores a lo largo y a cada lado del corredor de ingreso al parque, para posteriormente rellenarlas de tierra e instalar la vegetación en ellas.

El mobiliario instalado y correspondiente al complejo infantil en madera plástica para este frente es el siguiente:

AIDA LUCÍA - POPAYÁN			DESCRIPCIÓN JUEGOS
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.	und	1	Torre con techo
			PASAMANOS
			ARAÑA
			RESBALADOR

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

9.5 CAPITULO DE VEGETACIÓN Y ELEMENTOS NATURALES

Este capítulo contempla la ejecución de los siguientes ítems:

- Suministro e instalación de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, árboles, arbustos .
- Suministro e instalación de prado gateadora o trenza
- Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 -40) cm
- Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm

Una vez terminadas las actividades de excavaciones, rellenos y estructuras en concreto, se pudo dar inicio a la instalación de los elementos de vegetación, para que estos no fueran dañados durante la ejecución de los demás trabajos. También se realizó el relleno del material tipo tierra negra dentro de todas las llantas instaladas en el corredor de acceso al parque y la correspondiente instalación de vegetación en ellas.

Dentro de este capítulo se ejecutó el 100% de las actividades

Con la ejecución de este capítulo se dio fin a las obras requeridas dentro de este frente de obra, teniendo un 100% de ejecución.

9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO













OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079









OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato fue ejecutada al 100% en todos los frentes de obra como se evidencia en el presente informe, de la misma manera cada obra fue entregada al comité de veeduría que se conformó en cada sitio al inicio del contrato, realizando mediciones en compañía de la supervisión CRC del contrato
- A partir de la fecha y en adelante el compromiso de mantenimiento y/o adecuaciones futuras será responsabilidad del municipio y comunidad de cada sector.

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085255035		LASSO LUCERO MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NORTE 9 76	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1232814246	9427342815	I	2021/12/09	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$282,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0
1	CC	1085255035	LASSO MANUEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF14	30	$908,526	$18,200	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085255035		LASSO LUCERO MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NORTE 9 76	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1232814246	9427342815	I	2021/12/09	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$282,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$282,000	$0	$0	$282,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34563335	1	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	Calle 28CN 6 C 11	POPAYAN-CAUCA	8204366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1249532662	9428442681	E	2021/12/09	2021/12/17	BANCOLOMBIA	8	$1,874,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (10 Afiliados)																							$6,087,125	$974,300			$6,087,125	$244,000			$5,789,671	$232,100			$6,087,125	$424,300		$0	$0		$1,874,700
Centro de Trabajo: CINCO (10 Afiliados)																							$6,087,125	$974,300			$6,087,125	$244,000			$5,789,671	$232,100			$6,087,125	$424,300		$0	$0		$1,874,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																							$6,087,125	$974,300			$6,087,125	$244,000			$5,789,671	$232,100			$6,087,125	$424,300		$0	$0		$1,874,700
1	CC	34554514	CIFUENTES SANDRA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
2	CC	17141865	DAVID BERNARDO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
3	CC	10751882	FLOR ALEJANDRO		X																25-14	15	$454,263	$72,700	ESSC62	15	$454,263	$18,200	CCF14	15	$454,263	$18,200	14-23	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0	Si	$140,800
4	CC	1059604852	MUELAS DAVID		X																230301	15	$454,263	$72,700	EPSIC3	15	$454,263	$18,200	CCF14	15	$454,263	$18,200	14-23	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0	Si	$140,800
5	CC	7560061	ORDOÑEZ JOHNN	X																	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC62	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$276,400
6	CC	4741880	PILLIMUE EMILIANO		X																25-14	10	$302,842	$48,500	ESSC62	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$302,842	$12,200	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$94,000
7	CC	4616736	PITO JESUS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$276,400
8	CC	10751700	RIVERA JOSE		X																231001	10	$302,842	$48,500	EPSIC3	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$302,842	$12,200	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$94,000
9	CC	1061799095	ROBLEDO DANIEL		X																230301	15	$454,263	$72,700	ESSC18	15	$454,263	$18,200	CCF14	15	$454,263	$18,200	14-23	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0	Si	$140,800
10	CC	76324273	ROBLEDO RODRIGO	X																	230301	16	$484,548	$77,600	EPS005	16	$484,548	$19,400	CCF14	16	$441,662	$17,700	14-23	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0	Si	$148,500
Total	**Afiliados(10)**																						$6,087,125	$974,300			$6,087,125	$244,000			$5,789,671	$232,100			$6,087,125	$424,300		$0	$0		$1,874,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34563335	1	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	Calle 28CN 6 C 11	POPAYAN-CAUCA	8204366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1249532662	9428442681	E	2021/12/09	2021/12/17	BANCOLOMBIA	8	$1,874,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$974,300	$0	$0	$974,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,500	$0	$0	$48,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$412,000	$0	$0	$412,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$513,800	$0	$0	$513,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$424,300	$0	$0	$424,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$424,300	$0	$0	$424,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$232,100	$0	$0	$232,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	$232,100	$0	$0	$232,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$244,000	$0	$0	$244,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$30,400	$0	$0	$30,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$66,800	$0	$0	$66,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$18,200	$0	$0	$18,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$55,800	$0	$0	$55,800
TOTAL				**10**	**$1,874,700**	**$0**	**$0**	**$1,874,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34563335		DAVID HERNANDEZ OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 #34N-204 T3 APTO 502	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1249537314	9428442781	I	2021/12/09	2021/12/17	BANCOLOMBIA	8	$1,544,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,041,526	$857,300			$5,041,526	$630,200			$5,041,526	$30,300			$5,041,526	$26,400		$0	$0		$1,544,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$5,041,526	$857,300			$5,041,526	$630,200			$5,041,526	$30,300			$5,041,526	$26,400		$0	$0		$1,544,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$5,041,526	$857,300			$5,041,526	$630,200			$5,041,526	$30,300			$5,041,526	$26,400		$0	$0		$1,544,200
1	CC	34563335 DAVID OLGA									X									25-14	30	$5,041,526	$857,300	EPS037	30	$5,041,526	$630,200	CCF14	30	$5,041,526	$30,300	14-23	30	$5,041,526	$26,400	30	$0	$0	No	$1,544,200
Total		**Afiliados(1)**																				$5,041,526	$857,300			$5,041,526	$630,200			$5,041,526	$30,300			$5,041,526	$26,400		$0	$0		$1,544,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34563335		DAVID HERNANDEZ OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 #34N-204 T3 APTO 502	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1249537314	9428442781	I	2021/12/09	2021/12/17	BANCOLOMBIA	8	$1,544,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$857,300	$0	$0	$857,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$857,300	$0	$0	$857,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,400	$0	$0	$26,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,400	$0	$0	$26,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,300	$0	$0	$30,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$30,300	$0	$0	$30,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$630,200	$0	$0	$630,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$630,200	$0	$0	$630,200
TOTAL				**1**	**$1,544,200**	**$0**	**$0**	**$1,544,200**

CODIGO: FRP-PGA

VERSION: 2

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

CIUDAD: POPAYÁN **FECHA DE EVALUACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ**

SERVICIO Y/O PRODUCTO QUE SUMINISTRA: **CONTRATAR LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS**

PONDERACION	CRITERIO DE EVALUACION	EXCELENTE (5 pts) BUENO (4 pts) ACEPTABLE (3 pts)	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
35%	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5	35%	
35%	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5	35%	
30%	Cumplimiento de Aspectos Administrativos	5	30%	
		CALIFICACION DEL PROVEEDOR	100%	

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 000409 DEL (Año) 2021

BITÁCORA DE OBRA BARRIO AIDA LUCÍA – POPAYÁN - CAUCA

Jueves 18 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Llega al sito todo el mobiliario en madera plástica y herramienta. Se inicia con la localización y replanteo de acuerdo con los planos de diseño del parque. Finalizando la tarde llega al sitio el material para relleno tipo tierra amarilla.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 19 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Llegan al sitio viajes de tierra amarilla y se inicia con los trabajos de relleno y compactación en la zona de los columpios

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 20 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan más viajes de tierra amarilla al sitio y se continua con los trabajos de relleno y compactación. Finalizando la mañana llueve

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 22 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de relleno y compactación de la tierra amarilla.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 23 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Al sitio llega parte de las llantas a instalarse en el perímetro del parque y se inician los trabajos de excavación para instalación de las mismas. Se inicia el armado de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 24 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de excavación para llantas. Se continua el armado de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 25 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de excavación para llantas y se realiza fundición de las bases en concreto para los juegos en madera plástica.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 26 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan al sitio las llantas faltantes y se continua con la excavación para las mismas. Se realiza el formaleteo para las bases en concreto para bancas y para punto ecológico. Se continua con el ensamble de los juegos en madera plástica.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 27 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza la fundición de las bases para bancas y punto ecológico, dejando empotrado dicho mobiliario dentro del concreto. Se continua con el ensamble de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 29 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan al sitio los juegos en llantas decoradas y se realiza el formaleteo de las bases en concreto para instalación de los mismos también de los cubos en concreto. Se termina el armado de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 30 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza la fundición de las bases en concreto para juegos en llanta y de 3 de los cubos que se pintarán de colores.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 1 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza el desformaleteo de las bases en concreto para los juegos en llanta y también de las bases de bancas y punto ecológico. Se realiza formaleteo para fundición de huellas en concreto y de los 2 cubos faltantes. Se realiza la fundición de las huellas y de los cubos..

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 2 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se inicia con los trabajos de pintura de las llantas del callejón de acceso al parque. En horas de la tarde llega al sitio el material tipo tierra negra.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 3 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se inicia el riego de la tierra negra sobre toda el área en la que se dispondrá el prado tipo trenza y también se rellena cada una de las llantas pintadas para sobre ellas sembrar las plantas correspondientes. En horas de la tarde llega al sitio el prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 4 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se termina de realizar la instalación de la tierra negra y se procede a la instalación del prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 6 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de instalación del prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 7 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan al sitio las plantas que serán sembradas dentro de las llantas y se inicia dicho proceso. Se termina la instalación del prado tipo trenza

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 9 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con el sembrado de plantas.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 10 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se termina el sembrado de las plantas faltantes frente a los juegos en llanta y se realiza el retiro de materiales sobrantes y herramienta

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

V.Bo OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista de obra

BITÁCORA DE OBRA BARRIO AMAGÁ – PIENDAMÓ - CAUCA

Jueves 18 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Llega al sito todo el mobiliario en madera plástica y material granular. Se inicia con la localización y replanteo de acuerdo con los planos de diseño del parque. Finalizando la mañana llega al sitio el material para relleno tipo tierra amarilla y se inician los trabajos de riego y compactación.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 19 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Llegan más viajes de tierra amarilla al sitio y se continua con los trabajos de relleno y compactación.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 20 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan más viajes de tierra amarilla al sitio y se continua con los trabajos de relleno y compactación. Finalizando la mañana llueve

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 22 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de relleno y compactación de la tierra amarilla.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 23 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Al sitio llega parte de las llantas a instalarse en el perímetro del parque y se inician los trabajos de excavación para instalación de las mismas.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 24 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de excavación para llantas y se inicia el armado de los juegos en madera plástica.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 25 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de excavación para llantas y se realiza fundición de las bases en concreto para los juegos en madera plástica.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 26 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan al sitio las llantas faltantes y se continua con la excavación para las mismas. Se realiza el formaleteo para las bases en concreto para bancas y para punto ecológico y también para huellas en concreto. Se continua con el ensamble de los juegos en madera plástica.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 27 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza la fundición de las huellas en concreto, bases para bancas y punto ecológico, dejando empotrado dicho mobiliario dentro del concreto. Se continua con el ensamble de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 29 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan al sitio los juegos en llantas decoradas y se realiza el formaleteo de las bases en concreto para instalación de los mismos. Se continua con el armado de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 30 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza la fundición de las bases en concreto para juegos en llanta. Se termina el armado de los juegos en madera plástica

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 1 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza el desformaleteo de las bases en concreto para los juegos en llanta y también de las bases de bancas y punto ecológico. Se procede a iniciar con la pintura de las llantas perimetrales.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 2 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de pintura de las llantas perimetrales. En horas de la tarde llega al sitio el material tipo tierra negra.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 3 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se inicia el riego de la tierra negra sobre toda el área en la que se dispondrá el prado tipo trenza y también se rellena cada una de las llantas pintadas para sobre ellas sembrar las plantas correspondientes. En horas de la tarde llega al sitio el prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 4 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se termina de realizar la instalación de la tierra negra y se procede a la instalación del prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 6 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continua con los trabajos de instalación del prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 7 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llega al sitio parcialmente las plantas que serán sembradas dentro de las llantas y se inicia dicho proceso.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 9 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Llegan al sitio las plantas faltantes para llantas y se continua con la siembra de estas.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 10 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se termina el sembrado de las plantas faltantes y se instala la piedra dolomita decorativa

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 11 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza el retiro de los materiales sobrantes.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

V.Bo OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista de obra

BITÁCORA DE OBRA SAN RAFAEL – MORALES - CAUCA

Jueves 4 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se realiza encoframiento para bases de juegos en llanta. En horas de la tarde llegan al sitio los juegos en llanta. Se inician trabajos de corte de guadua para kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 5 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se realiza la fundición y empotramiento de los juegos en llanta dentro del concreto. Se continua trabajos de corte de guadua para kiosco

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 8 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se realiza el desencofrado de las bases para juegos en llanta. Se continua trabajos de corte de guadua para kiosco

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 9 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua trabajos de corte de guadua para kiosco

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miercoles 10 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua trabajos de corte de guadua para kiosco

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 11 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua trabajos de corte de guadua para kiosco

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 12 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua trabajos de corte de guadua para kiosco

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 15 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se inician trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 16 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua con los trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 17 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua con los trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 18 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua con los trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 19 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua con los trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 22 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se inicia el montaje del techo para el kiosco en guadua.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 23 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua con los trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 24 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se continua con los trabajos de montaje de la estructura en guadua para el kiosco y en horas de la tarde se finaliza esta actividad.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 25 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día nublado. Se con la instalación de la guadua y el techo terminada, se inicia el proceso de inmunización de la estructura.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 26 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes, 1 técnico en guadua

Día soleado. Se realiza el proceso de barnizado de la estructura en guadua y se da por terminada la construcción del kiosco.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 29 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes

Día soleado. Al sitio llega la tierra negra para su instalación y se inicia el riego de la misma en la zona donde se instalará el prado

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 30 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes

Día nublado. Se continua con el riego de la tierra negra y en horas de la tarde se finaliza esta actividad. En horas de la tarde llega al sitio el prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 1 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza el proceso de instalación del prado tipo trenza en toda el área sobre la que se dispuso la tierra negra. Este día llegan al sitio todas las plantas a instalar. En horas de la tarde llueve.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 2 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza la instalación de todas las plantas del parque, organizada de acuerdo con los planos de diseño.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 3 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Al sitio llega el material granular tipo triturado para instalar en el sendero que conduce a la capilla y al kiosco en guadua. También llega al sitio la arena que será instalada en la zona de los juegos en madera plástica. Durante el día se logra realizar la instalación del triturado en los dos senderos.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 4 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se realiza la instalación de la arena dentro del circulo en el que se encuentran los juegos en madera plástica. También se realiza la instalación de la piedra dolomita para decoración de las plantas.


Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 6 de Diciembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza el retiro de los materiales sobrantes.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.



MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra



V.Bo OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Contratista de obra

BITÁCORA DE OBRA VILLA NUEVA – PIENDAMÓ - CAUCA

Jueves 4 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza desencofrado del sardinel fundido el día anterior y se prepara el terreno para el encoframiento del andén a fundir. En horas de la tarde se deja listo el encofrado para ser fundido al día siguiente.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 5 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza fundición del andén que se dejó listo desde el día anterior y se realiza encoframiento de las bases para los juegos en llanta. En horas de la tarde llegan los 3 juegos en llanta para ser instalados en las bases de concreto

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 8 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se realiza desencofrado del andén fundido el día anterior y se realiza la fundición de las bases para los juegos en llanta empotrando dentro de estas los juegos mencionados.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 9 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Llega al sitio la tierra negra para instalar en las áreas que están destinadas a llevar prado y se inicia el riego de dicho material.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 10 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se continua con el riego de la tierra negra y en horas de la tarde se termina este trabajo. Al sitio llega el prado tipo trenza que será instalado en el área del parque de acuerdo con el diseño arquitectónico.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 11 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se inicia la colocación del prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 12 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se continua con el trabajo de instalación del prado tipo trenza.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 13 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se continua con la instalación del prado tipo trenza y finalizando la mañana se termina dicha actividad.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 15 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se inician los trabajos de sembrado de maní forrajero y en horas de la tarde se termina dicha actividad.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 16 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Al sitio llegan todas las plantas a ser instaladas de acuerdo con el diseño arquitectónico y se inicia la instalación de las mismas.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 17 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se continua con la instalación de todas las plantas

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Jueves 18 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. En horas de la mañana se termina la instalación de las plantas. En horas de la tarde llega al sitio el material granular tipo triturado para el sendero peatonal y también la arena para ser instalada en el circulo dentro del que se encuentran los juegos en madera plástica.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Viernes 19 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se realiza el riego del triturado sobre el sendero peatonal en toda la jornada

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Sábado 20 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se realiza el riego de arena sobre la zona de los juegos en madera plástica. La actividad no se termina en la jornada.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Lunes 22 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se continua con el riego de arena y finalizando la mañana se termina dicha actividad. En horas de la tarde llega al sitio la piedra para confinamiento de plantas y se inicia su instalación.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Martes 23 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se termina la instalación de la piedra y se realiza el trabajo de pintado de la misma. También se realiza la instalación de la piedra dolomita decorativa.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

Miércoles 24 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza el retiro de los materiales sobrantes.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

V.Bo OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Contratista de obra
