28/10/2021

N° DE PROCESO Y CONTRATO: SAMC-006-2021 / CONTRATO DE OBRA No. 1477 DE 2021

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	SI	NO	N.A.
INFORME DE OBRA (Adjuntar soportes de ejecución de acuerdo a las actividades establecidas en el contrato, relación del personal de obra, informes de laboratorio, certificados de calidad de materiales, entre otros)	X		
SOPORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla asistida con soporte de pago)	X		
INFORME IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST (Adjuntar soportes del cumplimiento del SG-SST, entrega de dotación y elementos de protección personal)	X		
INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			X
DOCUMENTOS DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR			
INFORME DE INTERVENTORÍA O INFORME DE SUPERVISIÓN (1010-F-GCT-69 / 1010-F-GCT-22)	X		
BITACORA DE OBRA ORIGINAL	X		
ACTA APROBACIÓN CAMBIO DE PERSONAL			X
INFORME DE SUPERVISOR/INTERVENTOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO (1010-F-GCT-130) SI APLICA			X
Numero de folios, foliado en lápiz en la esquina superior derecha			

Observaciones:

_____

_____

_____

Profesional que revisa:

Nombre _____

Firma _____

Secretaría u oficina: _____

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

INFORME DE OBRA

Carrera 64 No. 48-84
Barranquilla, Colombia

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

INFORME MENSUAL N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 1477 DE 2021

"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"

PERIODO DEL INFORME:

26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 25 DE OCTUBRE DE 2021

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

CONTRATISTA OBRA

Carrera 64 No. 48-84

Barranquilla, Colombia

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 3
2.1 ANTECEDENTES 3
2.2 ALCANCE DEL PROYECTO 4
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN 4
3 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
4 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 6
5 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS 7
5.1 GESTION PREDIAL 7
5.2 PERMISOS AMBIENTALES 7
5.3 SEÑALIZACIÓN 7
6 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA 8
6.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA 8
6.2 AVANCE FÍSICO DE OBRA 9
6.3 ANALISIS EJECUTADO VS PROGRAMADO 13
7 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 14
8 INFORME FINANCIERO 16
8.1 VALOR DEL CONTRATO 16
8.2 REGISTRO PRESUPUESTAL 16
8.3 FORMA DE PAGO 16
8.4 AVANCE FINANCIERO 16
9 ESTADO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO 17
9.1 CONTROL DE PÓLIZAS 17
9.2 ACTAS GENERADAS 19
9.3 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES 19
9.4 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO 19
10 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES PRESENTADAS 19
11 CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES 20

1 INTRODUCCIÓN

El municipio de Villavicencio tiene como objetivo diseñar e implementar instrumentos y mecanismos efectivos de organización, gestión y control de la ocupación del suelo, invirtiendo en la rehabilitación del espacio público, infraestructura vial, la protección del corredor ecológico del municipio, la construcción de vivienda y la oferta de servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Está comprometido con toda la población en el cumplimiento de los derechos colectivos a la movilidad, a su prestación eficiente y oportuna, en atención al principio de la prevalencia del interés público, mediante el cual, se le reconoce a la administración una prerrogativa especial respecto al objeto del contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades variables de la comunidad, asegurando los preceptos de cobertura, cumplimiento de estándares básicos de calidad y seguridad vial, mejoras en la eficiencia del servicio y orientación de recursos hacia la atención preventiva primaria, haciendo énfasis en las áreas de mayor necesidad de intervención.

2 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 ANTECEDENTES

El municipio de Villavicencio cuenta con una malla vial urbana de 886 kilómetros a lo largo de las ocho comunas, de las cuales se encuentran pavimentados 782.56 kilómetros, con un 63,75% en buen estado, un 36,25% en mal estado y 103,71 kilómetros sin pavimentar.

Se tiene en cuenta que se ha evidenciado un rezago significativo acumulado en el mejoramiento de la pavimentación de vías como resultado de la insuficiencia de los recursos para la construcción y mantenimiento, lo cual ha generado un deterioro continuo e implica entre otras cosas, altos costos de operación vehicular. Adicionalmente, debido a la concentración poblacional de las ciudades, el tiempo constituye un factor preponderante en la cuantificación de los desplazamientos que atañen a la productividad y competitividad de la sociedad.

De esta manera, se requiere la ejecución de proyectos que permitan la rehabilitación y el mejoramiento de las vías urbanas en concreto asfaltico, que conforme con la Normatividad 450 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se establecen como actividades fundamentales el corte y demolición del pavimento en mal estado, excavaciones, retiro de escombros, conformación y compactación de la base granular y finalmente la instalación de la carpeta asfáltica.

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra No. 1477 de 2021, suscrito el día 11 de agosto de 2021, comprende el **"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO",** con la finalidad de mejorar la infraestructura vial de 531.275 habitantes de forma directa.

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN


Las obras que se localizan en el área urbana de la ciudad de Villavicencio - Meta, más exactamente en la MALLA VIAL QUE COMPRENDE SUS OCHO COMUNAS.

Límites del municipio de Villavicencio - Meta:

NORTE:	Municipios de Restrepo y calvario
SUR:	Municipio de Puerto López
ORIENTE:	Municipios de San Carlos de Guaroa y Acacias
OCCIDENTE:	Departamento de Cundinamarca – Municipio de Acacias
Extensión total:	1328 Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 467 M.S.N.M

Temperatura media: 27 °C.

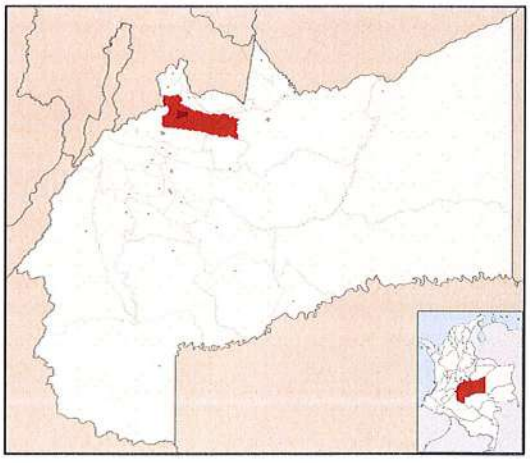



3 CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA


3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA SAMC-006-2021	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
INTERVENTOR:	N/A	
SUPERVISIÓN:	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDÊNAS	
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"	
CONTRATO NO:	1477 DE 2021	
CONTRATISTA DE LA OBRA:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA C.C 84.034.968 DE RIOHACHA	
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 493.444.800,00	
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES CALENDARIO	
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 DE OCTUBRE DE 2021	
FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1	21 DE OCTUBRE DE 2021	
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1	$ 493.444.800,00	
FECHA ACTA DE PRORROGA No. 1	22 DE OCTUBRE DE 2021	
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	VEINTIUN (21) DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021	
VALOR EJECUTADO PRESENTE MES	$ 90.492.975,00	18,34%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 345.935.575,00	70,11%
VALOR PROGRAMADO PRSENTE MES	$ 210.616.683,00	42,68%
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	$ 361.057.171,00	73,17%

4 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

En el desarrollo del Proyecto se propone una estructura de dirección, la cual se puede apreciar a continuación:

CARGO	NOMBRE
Supervisor	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS
Interventor	N/A
Contratista	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
Director de obra	MIGUEL ÁNGEL GALARZA GARCIA
Residente de obra	NESTOR JULIO PARDO FUENTES
Especialista en geotecnia vial y pavimentos	JESUS DAVID DIAZ CORTES
Técnico HSEQ	DAYANA CUBIDES PÉREZ
Técnico inspector de obra	CARLOS ALBERTO LEON CUELLAR

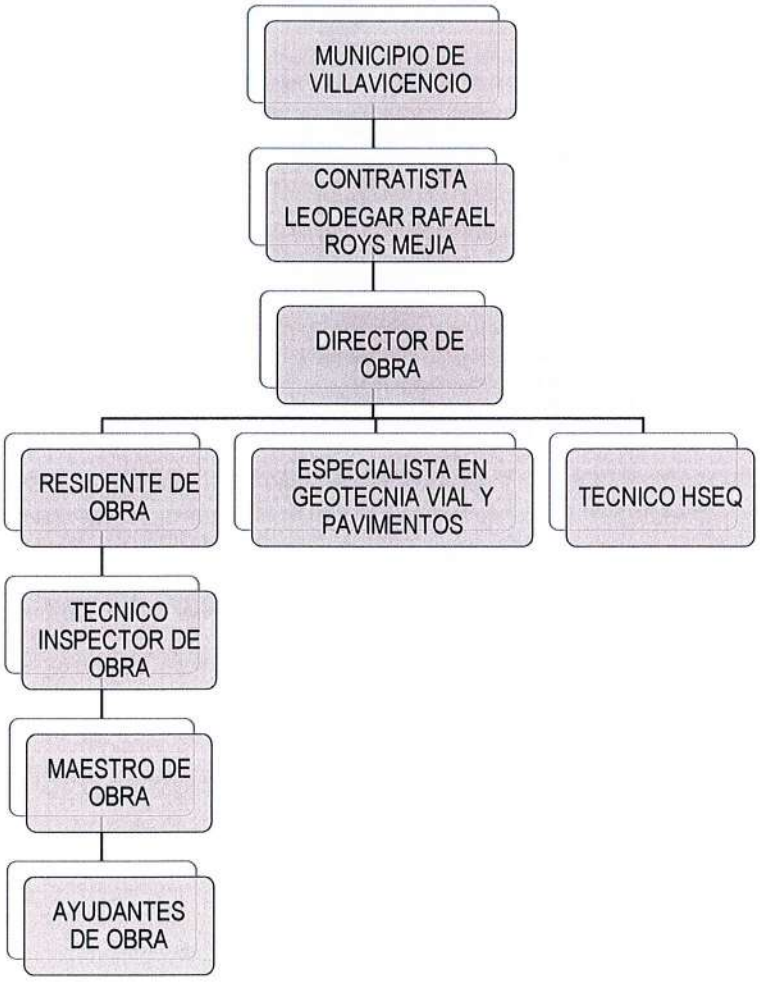

5 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

5.1 GESTION PREDIAL

Para el desarrollo de las actividades del proyecto no se requiere del trámite de gestión predial.

5.2 PERMISOS AMBIENTALES

Se estima que los impactos ambientales del proyecto son eventuales y menores, limitados principalmente a: al manejo de escombros, el ruido que generarían las obras, el polvo que se levantaría a consecuencia de los trabajos, el manejo del tráfico por la entrada y salida de volquetas entre otros. No se permite el ingreso de otro tipo de vehículos dentro del área de intervención.

5.3 SEÑALIZACIÓN

La señalización al igual que la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y comunicación de obra se dispone en conformidad con el manual de señalización - dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras en cada uno de los frentes de trabajo, sin representar inconvenientes en la ejecución del proyecto.









6 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

6.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA

A continuación, se presentan los porcentajes y valores correspondientes a la programación de obra aprobada mediante el Acta de Prorroga No. 1 de fecha del 22 de octubre de 2021. A corte del presente informe (semana No. 42), se presenta un avance programado acumulado del 73,17%.

PERIODO	PORCENTAJE PROGRAMACIÓN	VALOR DE PROGRAMACION MENSUAL	PORCENTAJE PROGRAMACIÓN ACUMULADO	VALOR DE PROGRAMACION ACUMULADA
Semana 34	4,88%	$ 24.070.478	4,88%	$ 24.070.478
Semana 35	8,54%	$ 42.123.337	13,41%	$ 66.193.815
Semana 36	8,54%	$ 42.123.337	21,95%	$ 108.317.151
Semana 37	8,54%	$ 42.123.337	30,49%	$ 150.440.488
Semana 38	8,54%	$ 42.123.337	39,02%	$ 192.563.824
Semana 39	8,54%	$ 42.123.337	47,56%	$ 234.687.161
Semana 40	8,54%	$ 42.123.337	56,10%	$ 276.810.498
Semana 41	8,54%	$ 42.123.337	64,63%	$ 318.933.834
Semana 42	8,54%	$ 42.123.337	73,17%	$ 361.057.171
Semana 43	8,54%	$ 42.123.337	81,71%	$ 403.180.507
Semana 44	8,54%	$ 42.123.337	90,24%	$ 445.303.844
Semana 45	8,54%	$ 42.123.337	98,78%	$ 487.427.180
Semana 46	1,22%	$ 6.017.620	100,00%	$ 493.444.800

6.2 AVANCE FÍSICO DE OBRA

Para el presente informe mensual, se presenta un avance ejecutado del 70,11%, equivalente a TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 345.935.575,00), el cual es el resultado de las actividades que se reportan a continuación:

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 1		EJECUTADO MES 26/09/2021 - 25/10/2021		EJECUTADO ACUMULADO 26/08/2021 - 25/10/2021	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1, DEMOLICIONES											
1.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	296,42	$ 5.000,00	$ 1.482.100,00	4.418,43	$ 22.092.150,00	1.701,66	$ 8.508.300,00	1.903,84	$ 9.519.200,00
1.2	DEMOLICIÓN PAVIM ASFALT. Compresor inc reti 5 km	M3	267,36	$ 70.000,00	$ 18.715.200,00	386,45	$ 27.051.500,00	66,99	$ 4.689.300,00	276,56	$ 19.359.200,00
2, EXCAVACIONES											
2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Inc. Retiro 5 kms	M3	545	$ 55.000,00	$ 29.975.000,00	215,40	$ 11.847.208,62	38,97	$ 2.143.350,00	147,78	$ 8.127.900,00
3, RELLENOS											
3.1	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2", Inc. Transp 5 km	M3	132,5	$ 90.000,00	$ 11.925.000,00	215,40	$ 19.386.341,38	38,97	$ 3.507.300,00	147,78	$ 13.300.200,00
4, PAVIMENTOS											
4.1	BACHEO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (5 kms)	M3	504,5	$ 855.000,00	$431.347.500,00	483,12	$ 413.067.600,00	83,80	$ 71.644.725,00	345,77	$ 295.629.075,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$493.444.800,00		$ 493.444.800,00		$ 90.492.975,00		$ 345.935.575,00
VALOR TOTAL CONTRATO					$493.444.800,00		$ 493.444.800,00		$ 90.492.975,00		$ 345.935.575,00

ITEM	ACTIVIDAD	EJECUTADO MES		
	I. DEMOLICIONES	UNIDAD	CANTIDAD	%
1.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	1.701,66	38,51%





OBSERVACIONES: Se realizó el corte sobre pavimento flexible en el sector de Ciudad Porfía, en el sector del barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Fundadores de la ciudad de Villavicencio – Meta.

La presente actividad tiene un avance mensual del 38,51%, equivalente a OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 8.508.300,00).

ITEM	ACTIVIDAD	EJECUTADO MES		
	I. DEMOLICIONES	UNIDAD	CANTIDAD	%
1.2	DEMOLICIÓN PAVIM ASFALT. Compresor inc reti 5 km	M3	66,99	17,33%





OBSERVACIONES: Se realizó la demolición del pavimento flexible en el sector del barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Fundadores de la ciudad de Villavicencio – Meta.

La presente actividad tiene un avance mensual del 17,33%, equivalente a CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.689.300,00).

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

ITEM	ACTIVIDAD	EJECUTADO MES		
	III. RELLENOS	UNIDAD	CANTIDAD	%
2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Inc. Retiro 5 kms	M3	38,97	18,09%





OBSERVACIONES: Se realizó excavación de material en conglomerado, en el sector del barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Fundadores de la ciudad de Villavicencio – Meta.

La presente actividad tiene un avance mensual del 18,09%, equivalente a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 2.143.350,00).

ITEM	ACTIVIDAD	EJECUTADO MES		
	II. EXCAVACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	%
3.1	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2", Inc. Transp 5 km	M3	38,97	18,09%





OBSERVACIONES: Se realizó la conformación de la capa de base tritura, previamente a la instalación de la carpeta asfáltica de bacheo, en el sector del barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Fundadores de la ciudad de Villavicencio – Meta

La presente actividad tiene un avance mensual del 18,09%, equivalente a TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 3.507.300,00).

ITEM	ACTIVIDAD	EJECUTADO MES		
	IV. PAVIMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	%
4.1	BACHEO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (5 kms)	M3	83,80	17,34%








OBSERVACIONES: Se realizó el reemplazo de pavimento flexible deteriorado, mediante la instalación de la mezcla asfáltica de bacheo, uniformemente con el rastrillo o afinador, y a una temperatura adecuada para garantizar mejor adherencia y cohesión de las partículas del material. Las obras se efectuaron en el sector del barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Fundadores de la ciudad de Villavicencio – Meta.

La presente actividad tiene avance mensual del 17,34%, equivalente a SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 71.644.725,00).

6.3 ANALISIS EJECUTADO VS PROGRAMADO

CURVA DE AVANCE

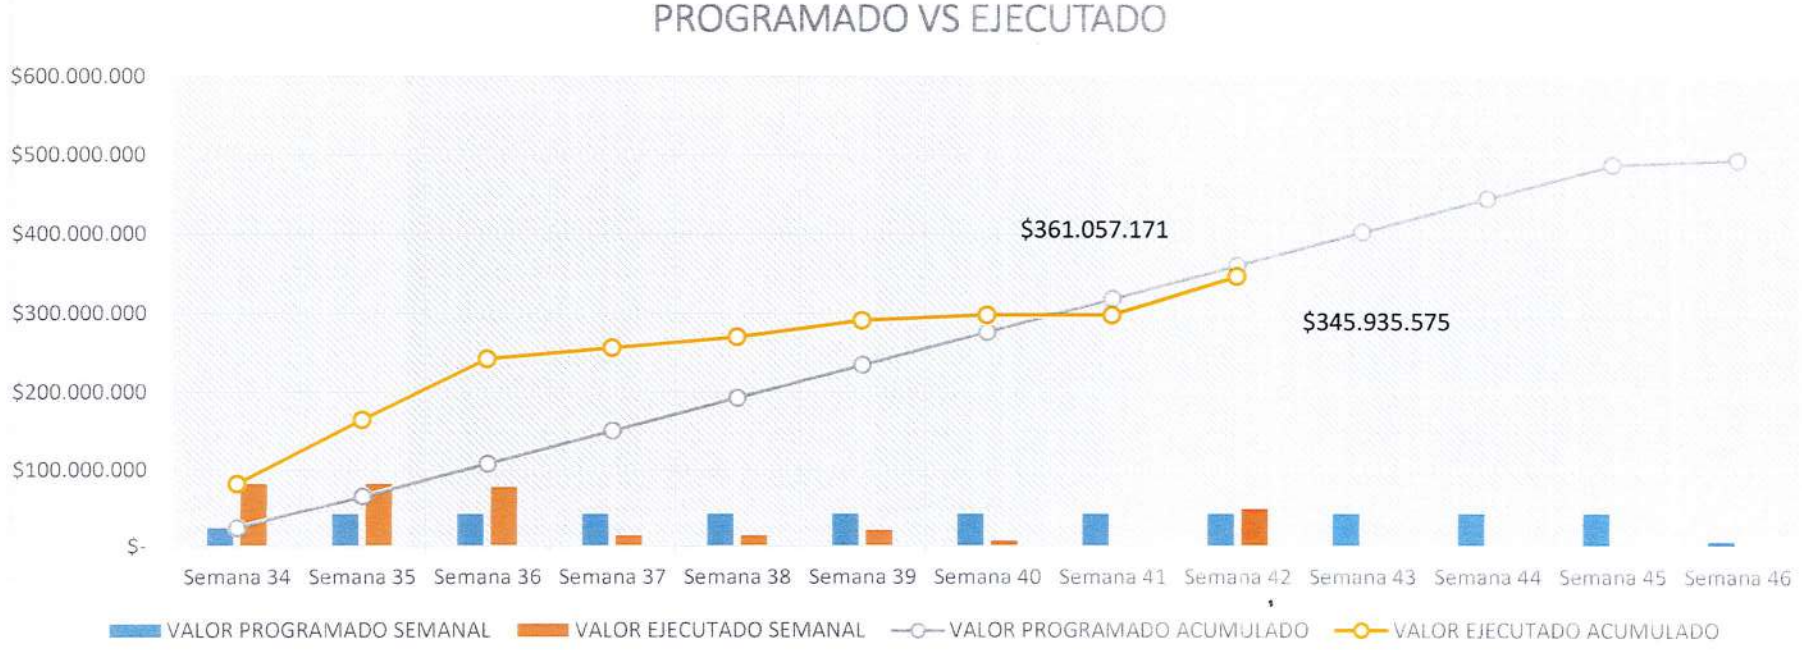

A la fecha de corte se tiene un porcentaje de programación acumulado del 73,17%, mientras que la ejecución de las actividades refleja un 70,11%, por lo tanto, se obtiene un atraso de obra del 3,06%. Esto se debe principalmente a que debido a las condiciones de alta precipitación que se han presentado durante las ultimas semanas, no se ha podido avanzar con un rendimiento de obra optimo, y por lo cual fue necesario realizar la solicitud de prorroga No. 1 del contrato, a fin de efectuar la ejecución de las actividades de obra restantes.

7 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa al presente documento copia de la planilla integrada al sistema integral de seguridad social del personal que está laborando en obra, dentro de la misma planilla se incorporan las obligaciones parafiscales para de esta forma dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, así como a la normatividad laboral aplicable.

PROFESIONALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No TARJETA PROFESIONAL
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	25202-119286 CND
NESTOR JULIO PARDO FUENTES	RESIDENTE DE OBRA	25202-100856 CND
JESUS DAVID DIAZ CORTES	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	15202-185752 BYC
DAYANA CUBIDES PÉREZ	TECNICO HSEQ	LIC. 4809 DE 2018
CARLOS ALBERTO LEON CUELLAR	TECNICO INSPECTOR DE OBRA	N/A

A continuación se relaciona el personal de obra que se encuentra laborando en la ejecución del Contrato de obra Nº 1477 de 2021 en el presente periodo:

Nº	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC TRABAJADOR	CARGO	ARL	EPS	PENSION
1	MIGUEL ANGEL	GALARZA	GARCIA	80.037.669	DIRECTOR DE OBRA	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	NESTOR JULIO	PARDO	FUENTES	17.344.169	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	PROTECCION
3	JESUS DAVID	DIAZ	CORTES	7.179.331	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	SURA	SANITAS	PROTECCION
4	DAYANA	CUBIDES	PEREZ	1.121.933.871	TECNICO HSEQ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
5	CARLOS ALBERTO	LEON	CUELLAR	1.120.502.102	TECNICO INSPECTOR DE OBRA	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION
6	ANTONIO DE JESUS	QUEVEDO	ROZO	3.022.935	CONDUCTOR	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

Nº	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC TRABAJADOR	CARGO	ARL	EPS	PENSION
7	EDWIN ALBERTO	HENAO	ROJAS	91.531.055	OFICIAL DE OBRA	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION
8	LUIS CARLOS	RAMIREZ	PAEZ	1.022.359.079	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
9	EDUAR HERMIDES	OVIEDO	MADRIGAL	1.030.540.484	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION
10	ESTID	MUÑOZ	GARCIA	1.070.326.340	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
11	GILDARDO	ARTUDUAGA	GARCIA	1.117.488.565	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
12	JOSE ALEXANDER	ANZOLA	DIAZ	1.119.946.622	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
13	RAFAEL ELIAS	MARTINEZ	ARTUNDUAGA	1.120.026.565	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
14	JAWIN ELVIRO	RIVEROS	FALLA	1.121.880.457	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR
15	JHON SEBASTIAN	SAAVEDRA	CHILATRA	1.121.913.326	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
16	JOAN SEBASTIAN	SANCHEZ	HERNANDEZ	1.121.934.081	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
17	BAUDILIO	FERNANDEZ	RUIZ	17.548.590	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
18	FELICIANO	BENITEZ	-	74.862.320	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION
19	HERIBERTO	PULIDO	CORONADO	79.583.316	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION

8 INFORME FINANCIERO

8.1 VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($493.444.800), incluido IVA, impuestos nacionales, departamentales, municipales y demás erogaciones, si a ello hubiere lugar.

8.2 REGISTRO PRESUPUESTAL


VIGENCIA	IMPUTACIÓN	PROYECTO	CDP	RP	VALOR
2021	MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META	No. 2020-050001-0140	No. 1762	No. 3552	$ 493.444.800,00
TOTALES					$ 493.444.800,00

8.3 FORMA DE PAGO

El municipio de Villavicencio Meta pagará al contratista de obra mediante actas de pago parciales, el primer pago será mínimo del 20% del valor del contrato y máximo del 80%. El valor correspondiente restante del 20% será para la liquidación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad. Se deberán presentar para cada pago informes mensuales a la supervisión del contrato que contenga una relación detallada del estado del proyecto, indicando cantidades, especificaciones, programación física y financiera y ensayos de calidad a los materiales, entre otros.

8.4 AVANCE FINANCIERO

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES							-

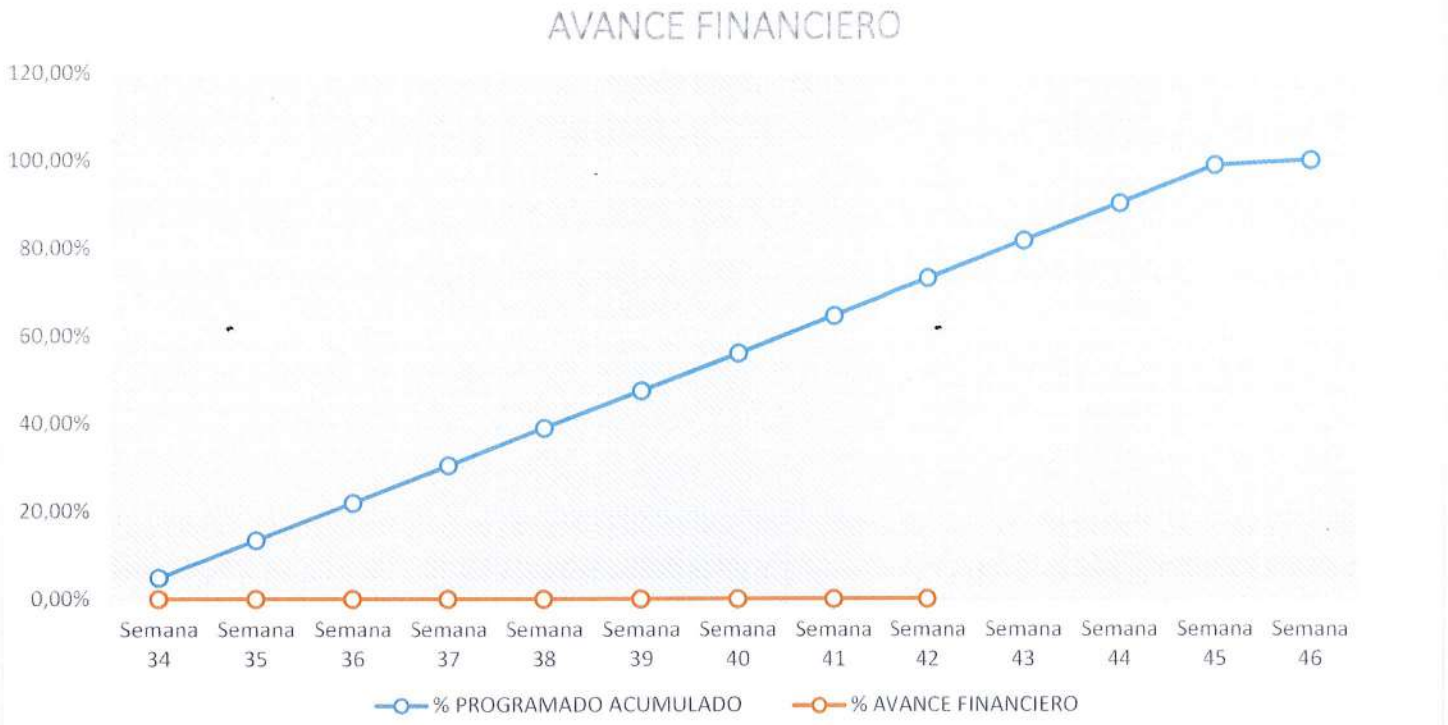

9 ESTADO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO

9.1 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas con firma de contrato de obra:

Póliza de Cumplimiento	11-44-101172277		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	11-40-101042734		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición.	12 DE AGOSTO DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**$ ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del Contrato	11/08/2021	11/02/2022	$ 98.688.960,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	11/08/2021	11/10/2024	$ 24.672.240,00
Estabilidad y Calidad De Obra	11/10/2021	11/10/2022	$ 49.344.480,00
Responsabilidad Civil	11/08/2021	11/10/2021	$ 181.705.200,00

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra con acta de inicio de fecha del 26 de agosto de 2021:

Póliza de Cumplimiento	11-44-101172277		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	11-40-101042734		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición.	6 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**$ ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del Contrato	26/08/2021	25/02/2022	$ 98.688.960,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	26/08/2021	25/10/2024	$ 24.672.240,00
Estabilidad y Calidad De Obra	26/10/2021	25/10/2022	$ 49.344.480,00
Responsabilidad Civil	26/08/2021	25/10/2021	$ 181.705.200,00

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra, de acuerdo con acta de prorroga No. 1 del 22 de octubre de 2021:

Póliza de Cumplimiento	11-44-101172277		
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	11-40-101042734		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición.	27 DE OCTUBRE DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**$ ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del Contrato	26/08/2021	15/03/2022	$ 98.688.960,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	26/08/2021	15/11/2024	$ 24.672.240,00
Estabilidad y Calidad De Obra	26/10/2021	26/10/2022	$ 49.344.480,00
Responsabilidad Civil	26/08/2021	15/11/2021	$ 181.705.200,00

9.2 ACTAS GENERADAS

En el presente del periodo se generaron las siguientes actas.

ACTA	FECHA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/08/2021
ACTA DE INICIO	26/08/2021
ACTA MODIFICATORIA No. 1	21/10/2021
ACTA DE PRORROGA No. 1 -	22/10/2021 -

9.3 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES

ACTA	FECHA
-	-

9.4 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO

No.	FECHA	ASUNTO	QUIEN ENVIA	DESTINO	RECIBE	FECHA ENTREGA
C.E-1477-2021-001	13/08/2022	Entrega de documentación inicial	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Alcaldía Municipal Villavicencio	Alcaldía Municipal Villavicencio	13/08/2021
C.E-1477-2021-002	13/08/2021	Entrega de pólizas Contrato de Obra	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Alcaldía Municipal Villavicencio	Alcaldía Municipal Villavicencio	13/08/2021

10 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES PRESENTADAS

Durante la ejecución del contrato de obra se han evidenciado precipitaciones, las cuales, afectan directamente el sobre el rendimiento de las cuadrillas de bacheo. De acuerdo con lo anterior, el día 22 de octubre del año 2021 se radicó ante la Alcaldía de Villavicencio la solicitud de aprobación de prorroga No. 1 del contrato, por un término de 21 días, a fin de terminar la ejecución de las actividades de obra, aprobadas según modificatoria No. 1.

11 CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Para el presente informe mensual, se incluyeron las actividades de obra ejecutadas del periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2021, durante el cual, se logra un avance de obra del 70,11%, respecto a un avance de programación acumulado del 73,17%.

Las obras se efectuaron en el sector del barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Fundadores de la ciudad de Villavicencio – Meta, en donde se realizaron labores de demolición de pavimento flexible, excavación manual, instalación de la base triturada 1 1/2" y finalmente, instalación de la carpeta asfáltica MDC- 19.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021.

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA
Director de obra

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

SOPORTES PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84034968		ROYS MEJIA LEODEGAR RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 64 48 - 84	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3184900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1172163156	9425974955	I	2021/10/15	2021/10/20	BANCO DE BOGOTA	5	$1,327,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,500,000	$765,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,500,000	$765,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$4,500,000	$765,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 84034968	ROYS LEODEGAR	231001	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,500,000	$765,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2021/10/20 09:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84034968		ROYS MEJIA LEODEGAR RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 64 48 - 84	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3184900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1172163156	9425974955	I	2021/10/15	2021/10/20	BANCO DE BOGOTA	5	$1,327,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$765,000	$0	$0	$765,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$765,000	$0	$0	$765,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$562,500	$0	$0	$562,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$562,500	$0	$0	$562,500
TOTAL				1	$1,327,500	$0	$0	$1,327,500

2021/10/20 09:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80037669		GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Conjunto Buganviles Casa J7	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	9427089116	9427089116	I	2021/10/15	2021/11/18	BANCO BOGOTA	33	$322,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300
1	CC	80037669	GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$63,300	No	0	$0	$0	$322,300
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80037669		GALARZA GARCIA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Conjunto Buganviles Casa J7	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	9427089116	9427089116	I	2021/10/15	2021/11/18	BANCO BOGOTA	33	$322,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$0	$0	$63,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$63,300	$0	$0	$63,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$322,300	$0	$0	$322,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	9425653439	9425653439	I	2021/10/08	2021/10/08	BANCO BOGOTA	0	$322,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300
1	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$322,300
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$63,300		$0	$0		$322,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	9425653439	9425653439	I	2021/10/08	2021/10/08	BANCO BOGOTA	0	$322,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,300	$0	$0	$63,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$63,300	$0	$0	$63,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$322,300**	**$0**	**$0**	**$322,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 84034968	6	ROYS MEJIA LEODEGAR RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMBARRANQUILLA	CR 64 # 48-84	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3184900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	9425212521	9425212521	E	2021/10/15	2021/11/05	BANCO BOGOTA	20	$2,089,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BACHEO VILLAVICENCIO (13 Afiliados)																							$4,692,003	$751,400			$4,692,003	$587,100			$4,692,003	$188,500			$4,692,003	$327,400		$4,692,003	$235,300		$2,089,700
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)																							$2,913,334	$466,300			$2,913,334	$364,300			$2,913,334	$116,700			$2,913,334	$203,100		$2,913,334	$145,900		$1,296,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$2,913,334	$466,300			$2,913,334	$364,300			$2,913,334	$116,700			$2,913,334	$203,100		$2,913,334	$145,900		$1,296,300
1	CC	1120502102	LEON CUELLAR CARLOS ALBERTO		X																230201	30	$920,000	$147,200	EPS037	30	$920,000	$115,000	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-23	30	$920,000	$64,100	30	$920,000	$46,000	No	$409,100
2	CC	17344169	PARDO FUENTES NESTOR JULIO		X																230201	30	$920,000	$147,200	EPS005	30	$920,000	$115,000	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-23	30	$920,000	$64,100	30	$920,000	$46,000	No	$409,100
3	CC	3022935	QUEVEDO ROZO ANTONIO DE JESUS		X																230301	30	$920,000	$147,200	EPS005	30	$920,000	$115,000	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-23	30	$920,000	$64,100	30	$920,000	$46,000	No	$409,100
4	CC	1005484940	QUIROGA GELVEZ MICHEL ALEXIS		X																230301	4	$122,667	$19,700	EPS017	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
5	CC	1122655364	RODRIGUEZ AGUDELO HENRY ESTEBAN		X																230201	1	$30,667	$5,000	EPS002	1	$30,667	$3,900	CCF34	1	$30,667	$1,300	14-23	1	$30,667	$2,200	1	$30,667	$1,700	No	$14,100
Centro de Trabajo: PERSONAL MAESTRO (8 Afiliados)																							$1,778,669	$285,100			$1,778,669	$222,800			$1,778,669	$71,800			$1,778,669	$124,300		$1,778,669	$89,400		$793,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																							$1,778,669	$285,100			$1,778,669	$222,800			$1,778,669	$71,800			$1,778,669	$124,300		$1,778,669	$89,400		$793,400
6	CC	91531055	HENAO ROJAS EDWIN ALBERTO		X																230201	30	$920,000	$147,200	EPS005	30	$920,000	$115,000	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-23	30	$920,000	$64,100	30	$920,000	$46,000	No	$409,100
7	CC	1121147783	LOPEZ PEREZ JEFFERSSON ANDREY		X																230301	4	$122,667	$19,700	EPSC34	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
8	CC	86063701	MOLINA ORTEGA REINALDO		X																230201	4	$122,667	$19,700	CCFC55	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
9	CC	6611499	NAVEO CARRASQUEL JESUS JACINTO		X																230301	4	$122,667	$19,700	EPS041	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
10	CC	1006689192	ROZO PARRA RAUL ANDRES		X																230301	4	$122,667	$19,700	EPSC34	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
11	CC	86081761	VILLA RINCON JOHN JAMES		X																231001	4	$122,667	$19,700	CCFC55	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
12	CC	86063371	VILLA RINCON JUAN ERACLIO		X																230301	4	$122,667	$19,700	EPS041	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
13	CC	79645338	VIVAS CASTRO CARLOS MANUEL		X																230301	4	$122,667	$19,700	EPS002	4	$122,667	$15,400	CCF34	4	$122,667	$5,000	14-23	4	$122,667	$8,600	4	$122,667	$6,200	No	$54,900
Total			**Afiliados(13)**																				$4,692,003	$751,400			$4,692,003	$587,100			$4,692,003	$188,500			$4,692,003	$327,400		$4,692,003	$235,300		$2,089,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 84034968	6	ROYS MEJIA LEODEGAR RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMBARRANQUILLA	CR 64 # 48-84	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3184900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	9425212521	9425212521	E	2021/10/15	2021/11/05	BANCO BOGOTA	20	$2,089,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$751,400	$0	$0	$751,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$19,700	$0	$0	$19,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$265,400	$0	$0	$265,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$466,300	$0	$0	$466,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$327,400	$0	$0	$327,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$327,400	$0	$0	$327,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$188,500	$0	$0	$188,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$188,500	$0	$0	$188,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$587,100	$0	$0	$587,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$30,800	$0	$0	$30,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$30,800	$0	$0	$30,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$15,400	$0	$0	$15,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$115,000	$0	$0	$115,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$30,800	$0	$0	$30,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$19,300	$0	$0	$19,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$345,000	$0	$0	$345,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$141,000	$0	$0	$141,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$141,000	$0	$0	$141,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$94,300	$0	$0	$94,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$94,300	$0	$0	$94,300
TOTAL				13	$2,089,700	$0	$0	$2,089,700

2021/11/05 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900589912	5	SUMMA INGENERIA Y CONSULTORIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRASNVERSAL 28 41 - 94 BARRIO LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	9425010927	9425010927	E	2021/10/05	2021/10/12	BANCO BOGOTA	6	$1,166,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$3,956,000	$633,000			$3,956,000	$158,300			$3,956,000	$158,300			$3,956,000	$216,500		$0	$0		$1,166,100
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)																						$920,000	$147,200			$920,000	$36,800			$920,000	$36,800			$920,000	$4,900		$0	$0		$225,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$920,000	$147,200			$920,000	$36,800			$920,000	$36,800			$920,000	$4,900		$0	$0		$225,700
1	CC	1121913536	TABARES VASQUEZ VIVIAN SAMARA																		230301	30	$920,000	$147,200	CCFC55	30	$920,000	$36,800	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-11	30	$920,000	$4,900	30	$0	$0	Si	$225,700
Centro de Trabajo: 05 (4 Afiliados)																						$3,036,000	$485,800			$3,036,000	$121,500			$3,036,000	$121,500			$3,036,000	$211,600		$0	$0		$940,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$3,036,000	$485,800			$3,036,000	$121,500			$3,036,000	$121,500			$3,036,000	$211,600		$0	$0		$940,400
2	CC	1121933871	CUBIDES PEREZ DAYANA																		230301	30	$920,000	$147,200	EPS002	30	$920,000	$36,800	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-11	30	$920,000	$64,100	30	$0	$0	Si	$284,900
3	CC	1121930486	GUERRERO ACOSTA JUAN SEBASTIAN																		230201	30	$920,000	$147,200	EPS044	30	$920,000	$36,800	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-11	30	$920,000	$64,100	30	$0	$0	Si	$284,900
4	CC	4188488	HERNANDEZ DIAZ DANIEL JOAQUIN																		25-14	30	$920,000	$147,200	EPS017	30	$920,000	$36,800	CCF34	30	$920,000	$36,800	14-11	30	$920,000	$64,100	30	$0	$0	Si	$284,900
5	CC	7061451	ZARATE RIVAS JOSE TIBERIO	X	X																230301	9	$276,000	$44,200	EPS037	9	$276,000	$11,100	CCF34	9	$276,000	$11,100	14-11	9	$276,000	$19,300	9	$0	$0	Si	$85,700
Total			**Afiliados(5)**																				$3,956,000	$633,000			$3,956,000	$158,300			$3,956,000	$158,300			$3,956,000	$216,500		$0	$0		$1,166,100

2021/11/22 10:13 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900589912	5	SUMMA INGENERIA Y CONSULTORIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRASNVERSAL 28 41 - 94 BARRIO LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	9425010927	9425010927	E	2021/10/05	2021/10/12	BANCO BOGOTA	6	$1,166,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$633,000	$0	$0	$633,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$147,200	$0	$0	$147,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$338,600	$0	$0	$338,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$147,200	$0	$0	$147,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$216,500	$0	$0	$216,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$216,500	$0	$0	$216,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$158,300	$0	$0	$158,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$158,300	$0	$0	$158,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$158,300	$0	$0	$158,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$36,800	$0	$0	$36,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,800	$0	$0	$36,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,800	$0	$0	$36,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,100	$0	$0	$11,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$36,800	$0	$0	$36,800
TOTAL				5	$1,166,100	$0	$0	$1,166,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023291-7	TRITURADOS Y TRITURADOS SAS		Av Cra 45 No 103 34 Oficina 503	6012623	info@trituradosytriturados.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CUADRILLA ASFAL	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-10	2021-09	E	25/10/2021	54032086	$2.528.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022359079	RAMIREZ PAEZ LUIS CARLOS	1	0			S	X							X									230301	380.625	60.900	0	0	0	0	EPS017	380.625	15.300	14-4	380.625	5	26.500	CCF34	380.625	15.300	0	0	0	0	0
2	CC	1030540484	OVIEDO MADRIGAL EDUAR HERMIDES	1	0			S		X															230201	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS017	605.684	24.300	14-4	605.684	5	42.200	CCF34	605.684	24.300	0	0	0	0	0
3	CC	1070326340	MUÑOZ GARCIA ESTID	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF34	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1117488565	ARTUNDUAGA CANO GILDARDO	1	0			S	X	X															230301	60.569	9.700	0	0	0	0	EPS017	60.569	2.500	14-4	60.569	5	4.300	CCF34	60.569	2.500	0	0	0	0	0
5	CC	1119946622	ANZOLA DIAZ JOSE ALEXANDER	1	0			S	X							X									231001	243.333	39.000	0	0	0	0	EPS002	243.333	9.800	14-4	243.333	5	17.000	CCF34	243.333	9.800	0	0	0	0	0
6	CC	1120026565	MARTINEZ ARTUNDUAGA RAFAEL ELIAS	1	0			S		X															230301	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS017	605.684	24.300	14-4	605.684	5	42.200	CCF34	605.684	24.300	0	0	0	0	0
7	CC	1121880457	RIVEROS FALLA JAWIN ELVIRO	1	0			S	X							X									230301	422.917	67.700	0	0	0	0	EPS041	422.917	17.000	14-4	422.917	5	29.500	CCF34	422.917	17.000	0	0	0	0	0
8	CC	1121913326	SAAVEDRA CHILATRA JHON SEBASTIAN	1	0			S	X	X															230301	110.000	17.600	0	0	0	0	EPS002	110.000	4.400	14-4	110.000	5	7.700	CCF34	110.000	4.400	0	0	0	0	0
9	CC	1121934081	SANCHEZ HERNANDEZ JOAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	1.063.334	170.200	0	0	0	0	EPS005	1.063.334	42.600	14-4	1.063.334	5	74.100	CCF34	1.063.334	42.600	0	0	0	0	0
10	CC	17548590	FERNANDEZ RUIZ BAUDILIO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF34	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
11	CC	74862320	BENITEZ FELICIANO	1	0			S	X																230201	360.000	57.600	0	0	0	0	EPS002	360.000	14.400	14-4	360.000	5	25.100	CCF34	360.000	14.400	0	0	0	0	0
12	CC	79583316	PULIDO CORONADO HERIBERTO	1	0			S	X																230201	906.667	145.100	0	0	0	0	EPS002	906.667	36.300	14-4	906.667	5	63.200	CCF34	906.667	36.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830023291-7	TRITURADOS Y TRITURADOS SAS	Av Cra 45 No 103 34 Oficina 503	6012623	info@trituradosytriturados.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CUADRILLA ASFAL	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-10	2021-09	E	25/10/2021	54032086	$2.528.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	200.900	0		0		0	0	0	0	200.900	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	42.600	0		0		0	0	0	0	42.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.400	0		0		0	0	0	0	66.400	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	17.000	0		0		0	0	0	0	17.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	299.700	0	0	0	0	0	0		299.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	967.100	0	0	0	0	0	0		967.100	8
231001	Colfondos	800227940-6	39.000	0	0	0	0	0	0		39.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	568.500				568.500	0	0	568.500			5.685	568.500	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	326.900	0	0	326.900	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	326.900	326.900
Pensión	3	1.305.800	1.305.800
Riesgos Laborales	1	568.500	568.500
CCF	1	326.900	326.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.528.100	2.528.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Carrera 64 No. 48-84
Barranquilla, Colombia

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 2

CONTRATO DE OBRA No. 1477 DE 2021

"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"

PERIODO DEL INFORME:

26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2021

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

CONTRATISTA OBRA

Carrera 64 No. 48-84

Barranquilla, Colombia

CONTENIDO

1 DATOS DE LA OBRA 3
2 INTRODUCCIÓN 4
3 OBJETIVO 4
4 ALCANCE 4
5 ORGANIGRAMA 5
6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
7 RELACION DE PERSONAL 7
8 SEÑALIZACIÓN 9
9 INFORME DE SEGUIMIENTO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
9.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS 10
9.1.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 10
9.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 10
9.3 INSPECCIONES 11
9.3.1 INSPECCIÓN DE EPP 11
9.3.2 INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO 12
9.3.3 INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 12
9.3.4 INSPECCIÓN DE VOLQUETAS 13
10. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 14
11. CONCLUSIONES 16

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

1 DATOS DE LA OBRA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA SAMC-006-2021
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META
INTERVENTOR: -	N/A -
SUPERVISIÓN:	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"
CONTRATO No.	1477 DE 2021
CONTRATISTA DE LA OBRA:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 493.444.800,00
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 DE OCTUBRE DE 2021

2 INTRODUCCIÓN

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA, comprometido con la protección de la vida y la salud de sus empleados, contratistas y visitantes, ha venido desarrollando en el mes de febrero una serie de actividades en seguridad y salud en el trabajo, expuestas en el presente informe, teniendo en cuenta que esta es una herramienta fundamental en la prevención de riesgos derivados en la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"**, mejorando las condiciones de trabajo, como el bienestar físico, mental y social de los empleados.

3 OBJETIVO


Notificar sobre las actividades realizadas en seguridad y salud en el trabajo del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO".**

4 ALCANCE

Ejecutar actividades de seguridad y salud en el trabajo con el fin de obtener un control preventivo de aquellos factores de riesgo existente en el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"** y así mismo minimizar accidentes y enfermedades laborales.

5 ORGANIGRAMA

CARGO	NOMBRE
Supervisor	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS
Contratista	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
Director de obra	MIGUEL ÁNGEL GALARZA GARCIA
Residente de obra	NESTOR JULIO PARDO FUENTES
Especialista en geotecnia vial y pavimentos	JESUS DAVID DÍAZ CORTES
Técnico HSEQ	DAYANA CUBIDES PÉREZ
Técnico inspector de obra	CARLOS ALBERTO LEON CUELLAR

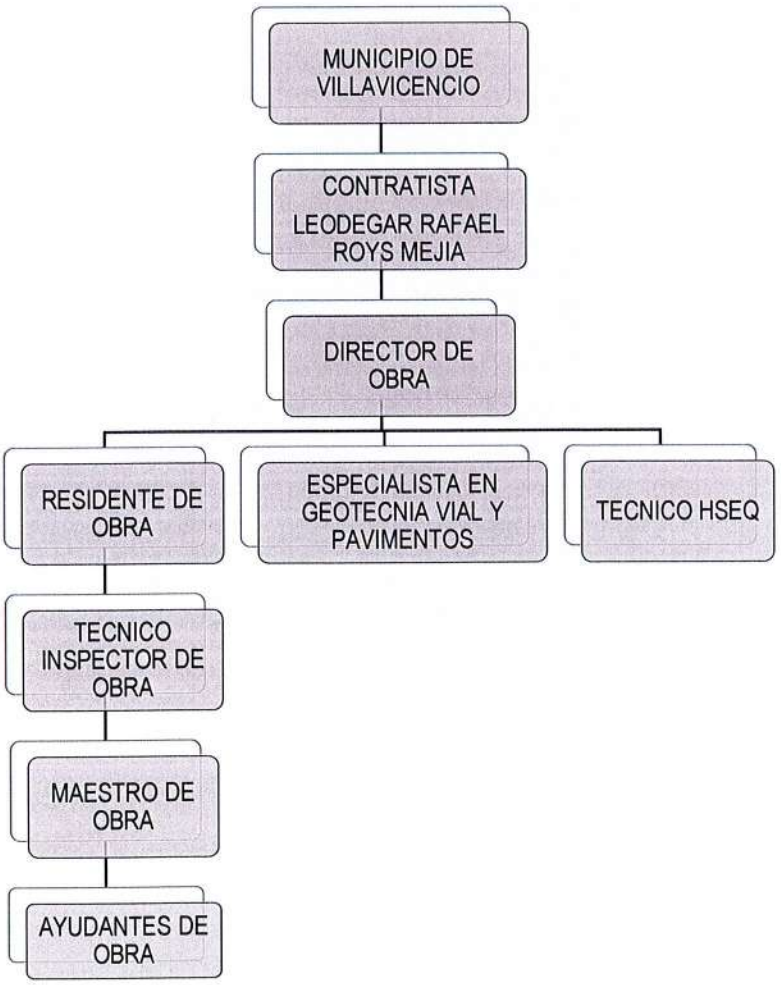


6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras que se localizan en el área urbana de la ciudad de Villavicencio – Meta, más exactamente en la MALLA VIAL QUE COMPRENDE SUS OCHO COMUNAS.

Límites del municipio de Villavicencio – Meta:

NORTE:	Municipios de Restrepo y calvario
SUR:	Municipio de Puerto López
ORIENTE:	Municipios de San Carlos de Guaroa y Acacias
OCCIDENTE:	Departamento de Cundinamarca – Municipio de Acacias

Extensión total: 1328 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 467 M.S.N.M
Temperatura media: 27 ºC.

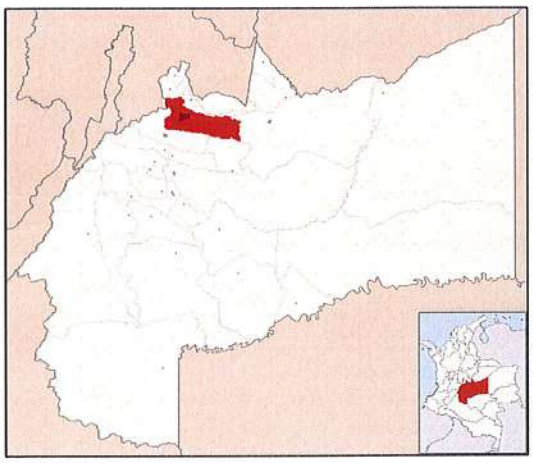



7 RELACION DE PERSONAL

Se anexa al presente documento copia de la planilla integrada al sistema integral de seguridad social del personal que está laborando en obra, dentro de la misma planilla se incorporan las obligaciones parafiscales para de esta forma dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, así como a la normatividad laboral aplicable.

PROFESIONALES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No TARJETA PROFESIONAL
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	25202-119286 CND
NESTOR JULIO PARDO FUENTES	RESIDENTE DE OBRA	25202-100856 CND
JESUS DAVID DIAZ CORTES	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	15202-185752 BYC
DAYANA CUBIDES PÉREZ	TECNICO HSEQ	LIC. 4809 DE 2018
CARLOS ALBERTO LEON CUELLAR	TECNICO INSPECTOR DE OBRA	N/A

A continuación se relaciona el personal de obra que se encuentra laborando en la ejecución del Contrato de obra Nº 1477 de 2021 en el presente periodo:

Nº	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC TRABAJADOR	CARGO	ARL	EPS	PENSION
1	MIGUEL ANGEL	GALARZA	GARCIA	80.037.669	DIRECTOR DE OBRA	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	NESTOR JULIO	PARDO	FUENTES	17.344.169	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	PROTECCION
3	JESUS DAVID	DIAZ	CORTES	7.179.331	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	SURA	SANITAS	PROTECCION
4	DAYANA	CUBIDES	PEREZ	1.121.933.871	TECNICO HSEQ	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
5	CARLOS ALBERTO	LEON	CUELLAR	1.120.502.102	TECNICO INSPECTOR DE OBRA	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION
6	ANTONIO DE JESUS	QUEVEDO	ROZO	3.022.935	CONDUCTOR	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR
7	EDWIN ALBERTO	HENAO	ROJAS	91.531.055	OFICIAL DE OBRA	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

Nº	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC TRABAJADOR	CARGO	ARL	EPS	PENSION
8	LUIS CARLOS	RAMIREZ	PAEZ	1.022.359.079	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
9	EDUAR HERMIDES	OVIEDO	MADRIGAL	1.030.540.484	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION
10	ESTID	MUÑOZ	GARCIA	1.070.326.340	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
11	GILDARDO	ARTUDUAGA	GARCIA	1.117.488.565	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
12	JOSE ALEXANDER	ANZOLA	DIAZ	1.119.946.622	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
13	RAFAEL ELIAS	MARTINEZ	ARTUNDUAGA	1.120.026.565	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
14	JAWIN ELVIRO	RIVEROS	FALLA	1.121.880.457	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR
15	JHON SEBASTIAN	SAAVEDRA	CHILATRA	1.121.913.326	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
16	JOAN SEBASTIAN	SANCHEZ	HERNANDEZ	1.121.934.081	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
17	BAUDILIO	FERNANDEZ	RUIZ	17.548.590	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
18	FELICIANO	BENITEZ	-	74.862.320	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION
19	HERIBERTO	PULIDO	CORONADO	79.583.316	CUADRILLA ASFALTO	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION

8 SEÑALIZACIÓN

La señalización al igual que la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y comunicación de obra se dispone en conformidad con el manual de señalización - dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras en cada uno de los frentes de trabajo, sin representar inconvenientes en la ejecución del proyecto.













9 INFORME DE SEGUIMIENTO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados. La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.

9.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS

9.1.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

EXAMENES DE INGRESO Durante el periodo del presente informe mensual se realizaron los exámenes médicos al personal que ingreso, con el objetivo de conocer las condiciones de salud del trabajador antes de su contratación.

EXAMEN DE EGRESO En el periodo del presente informe mensual se entregaron las órdenes de examen de egreso para comprobar el estado de salud de los trabajadores a los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos al momento de la desvinculación laboral.

9.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Al ingresar todo el personal a laborar a la obra se le suministra los elementos de protección personal y reemplazándolo cada vez que se encontrara deteriorados.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ESTADO	ESPECIFICACIONES
Casco de seguridad	OK	Norma 389 / ANSI z-89.1
Gafas de seguridad	OK	Gafas de seguridad UVEX PROSPEC REF 1985 con lente correctivo en policarbonato
Protector respiratorio desechable	OK	NTC 2561 (tipo b) respirador desechable, protección para material particulado
Guantes de vaqueta	OK	Guante de vaqueta tipo ingeniero sencillos
Botas de seguridad	OK	Botas para uso industrial con puntera

9.3 INSPECCIONES

Se detallan las siguientes inspecciones realizadas en la obra:


ÍTEMS	INSPECCIONES	FRECUENCIA	RESPONSABLE
1	Elementos de protección personal	Semanal	Profesional SST de obra
2	Orden y aseo	Semanal	Profesional SST de obra
3	Maquinaria	Semanal	Profesional SST de obra
4	Volquetas	Diaria	Profesional SST de obra

9.3.1 INSPECCIÓN DE EPP

PERIODO DE INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
26/09/2021 al 25/10/2021	Bueno	Se verifica que el personal cuente con todos los elementos de protección personal y su dotación correspondiente.









9.3.2 INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

PERIODO DE INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
26/09/2021 al 25/10/2021	Bueno	Se inspecciona orden y aseo en la obra normalmente a diario para poder prevenir cualquier tipo de riesgo, manteniendo el lugar de trabajo limpio, generando conciencia a los trabajadores que el orden y el aseo sea un compromiso.





9.3.3 INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

PERIODO DE INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
26/09/2021 al 25/10/2021	Bueno	Se inspección la máquina y equipo los cuales se encuentran en buen estado.

RETROEXCAVADORA



CORTADORA





VIBRO COMPACTADOR





MARTILLO DEMOLEDOR



9.3.4 INSPECCIÓN DE VOLQUETAS

PERIODO DE INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
26/09/2021 al 25/10/2021	Bueno	Se inspecciona las volquetas las cuales se encuentran en buen estado.







10. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA promueve los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo, elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el empleador o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre).

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificar las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de inspección periódicas.

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

T.P. No. 08202 – 58328 ATL

INGENIERO CIVIL

ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN OBRA

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA, Contrato N° 1477 de 2021, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO" se realizan las siguientes medidas preventivas ante el COVID-19 en obra:

MEDIDAS A TOMAR Y ADOPTAR EN OBRA	CUMPLE	
	SI	NO
¿Se realizó la socialización del protocolo de bioseguridad para la implementación de medidas prevención y mitigación del Covid-19?	X	
¿Se realiza la diligencia de los formatos anexos al protocolo de bioseguridad para la implementación de medidas prevención y mitigación ante el Covid-19, aprobado al contrato de obra?	X	
¿Se hizo la toma de temperatura con infrarroja previo al inicio de actividades en obra?	X	
¿Se hizo la desinfección con solución compuesta por hipoclorito o amoniaco cuaternario previo al inicio de actividades en obra?	X	
¿Se realiza el lavado de manos cada 3 hora?	X	
¿Se está realizando la hidratación al personal cada 2 horas?	X	
¿Se realizó la desinfección de herramientas?	X	
¿Se entregaron los elementos de protección personal EPP?	X	
¿hay máximo 10 personas en cada frente de trabajo?	X	
¿Se realizaron las charlas sobre el COVID-19 a todo el personal?	X	
¿Hay lavamanos en la obra?	X	
¿Hay jabón líquido para lavado de manos, gel antibacterial y toallas desechables en los puntos de lavado de manos?	X	
¿Se están tomando las medidas necesarias para la manipulación de insumos y productos (llega de materiales)?	X	
¿Se está cumpliendo con el respectivo manejo de los residuos sólidos?	X	
¿Se está implementando la medida de llevar el almuerzo en obra?	X	
¿Se realiza limpieza y desinfección antes y después para hacer uso de los espacios de almacenamiento?	X	
¿Se hace la implementación del protocolo para los visitantes?	X	
¿Todo el personal de obra cuenta con la respectiva afiliación ARL?	X	

11. CONCLUSIONES

El riesgo siempre va existir en el ámbito laboral para esto se ejecutan actividades en las cuales se concientice al personal ayudando a la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud. Logrando mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores disminuyendo los accidentes de trabajo en el proyecto de **"MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO"** . Con el fin de mostrar el máximo compromiso por parte de la dirección y todos los trabajadores en el presente periodo de la ejecución del contrato.

Elaboró:

DAYANA CUBIDES PÉREZ
PROFESIONAL SST

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Carrera 64 No. 48-84
Barranquilla, Colombia

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR
DIRECCIÓN OPERATIVA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores, limitados básicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarían las obras, el polvo que se levantaría a consecuencia de los trabajos, el manejo del tráfico por la entrada y salida de volquetas entre otros.

Para ello se deberá tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la ley 99 de 1993, y la resolución 541 del ministerio del medio ambiente por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamientos y disposición final de escombros, materiales, concreto y agregados sueltos de construcción, entre otras, así como las demás normas que amplíen, aclaren o modifiquen la materia. El contratista deberá tener en cuenta, entre otras, los siguientes:

1. Aislar el acceso al público.
2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.
3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del medio ambiente y demás normas de orden nacional o distrital vigentes.
4. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociados a las mismas.
5. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.
6. Minimizar la producción de polvo tanto por la ejecución de la obra como por el traslado de materiales y escombros.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, no será necesaria la implementación de un plan de manejo ambiental (PMA).

Atentamente.,

ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Directora Técnica Operativa

C.C: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°:: N/A	N/A	No Aplica
Reviso: N/A	N/A	No Aplica
Elaboró: Juan Fernando Hernández Medina.	Profesional de apoyo área operativa	

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

INFORME DE INTERVENTORÍA O INFORME DE SUPERVISIÓN (1010-F-GCT-69 / 1010-F-GCT-22)

Carrera 64 No. 48-84
Barranquilla, Colombia

Villavicencio, 28 de octubre de 2021

Doctor(a):
FRANKLIN ALBERTO MARÍN GARZÓN
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N° 1477 DE 2021, N° DEL PROCESO EN SECOP SAMC-006-2021
Informe mensual - periodo del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2021

1. **OBJETIVO**: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1477 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021 (SAMC-006-2021)		
PUBLICADO EN	SECOP I ____ Ó SECOP II __X__.		
CLASE DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	84.034968 DE RIOHACHA – LA GUAJIRA		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD DE BACHEO.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($493.444.800,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2021		
FECHA DE INICIO:	26 DE AGOSTO DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 DE OCTUBRE DE 2021		
MODIFICACIONES:			
FECHA MODIFICATORIA No. 1	21 DE OCTUBRE DE 2021		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N.A.	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$493.444.800,00		
PRORROGAS	VEINTIUN (21) DIAS	FECHA:	22/10/2021
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	DOS (2) MESES		
SUSPENSIONES	N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	15 DE NOVIEMBRE DE 2021		
INFORMACIÓN DE AVANCE MENSUAL			
VALOR EJECUTADO PRESENTE MES	$ 90.492.975,00		18,34%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 345.935.575,00		70,11%
VALOR PROGRAMADO PRSENTE MES	$ 210.616.683,00		42,68%
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	$ 361.057.171,00		73,17%

3. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 12 de agosto de 2021 expedido por el abogado FRANKLIN ALBERTO MAÍN GARZÓN - JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **INFORME MENSUAL No. 2** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado acumulado del 70,11%.

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 1		EJECUTADO MES 26/09/2021 - 25/10/2021		EJECUTADO ACUMULADO 26/08/2021 - 25/10/2021	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1, DEMOLICIONES											
1.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	296,42	$ 5.000,00	$ 1.482.100,00	4.418,43	$ 22.092.150,00	1.701,66	$ 8.508.300,00	1.903,84	$ 9.519.200,00
1.2	DEMOLICIÓN PAVIM ASFALT. Compresor inc reti 5 km	M3	267,36	$ 70.000,00	$ 18.715.200,00	386,45	$ 27.051.500,00	66,99	$ 4.689.300,00	276,56	$ 19.359.200,00
2, EXCAVACIONES											
2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Inc. Retiro 5 kms	M3	545	$ 55.000,00	$ 29.975.000,00	215,40	$ 11.847.208,62	38,97	$ 2.143.350,00	147,78	$ 8.127.900,00
3, RELLENOS											
3.1	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2", Inc. Transp 5 km	M3	132,5	$ 90.000,00	$ 11.925.000,00	215,40	$ 19.386.341,38	38,97	$ 3.507.300,00	147,78	$ 13.300.200,00
4, PAVIMENTOS											
4.1	BACHEO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (5 kms)	M3	504,5	$ 855.000,00	$431.347.500,00	483,12	$ 413.067.600,00	83,80	$ 71.644.725,00	345,77	$ 295.629.075,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$493.444.800,00**		**$ 493.444.800,00**		**$ 90.492.975,00**		**$ 345.935.575,00**
VALOR TOTAL CONTRATO					**$493.444.800,00**		**$ 493.444.800,00**		**$ 90.492.975,00**		**$ 345.935.575,00**

4. BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA – MODIFICATORIA No. 1.

A continuación, se evidencian las cantidades actualizadas a partir del balance de mayores y menos cantidades de obra, aprobado mediante Acta Modificatoria el día 21 de octubre de 2021. Solo se incluyeron las actividades inicialmente contratadas, asimilismo, no se presenta variación del valor del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	**DEMOLICIONES**										
1.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	296,42	$ 5.000,00	$ 1.482.100,00	4122,01	$ 20.610.050,00	0,00	$ 0,00	4.418,43	$ 22.092.150,00
1.2	DEMOLICIÓN PAVIM ASFALT. Compresor inc reti 5 km	M3	267,36	$ 70.000,00	$ 18.715.200,00	119,09	$ 8.336.300,00	0,00	$ 0,00	386,45	$ 27.051.500,00
2	**EXCAVACIONES**										
2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Inc. Retiro 5 kms	M3	545	$ 55.000,00	$ 29.975.000,00	0,00	$ 0,00	329,60	$ 18.127.791,38	215,40	$ 11.847.208,62
3	**RELLENOS**										
3.1	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2", Inc. Transp 5 km	M3	132,5	$ 90.000,00	$ 11.925.000,00	82,90	$ 7.461.341,38	0,00	$ 0,00	215,40	$ 19.386.341,38
4	**PAVIMENTOS**										
4.1	BACHEO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (5 kms)	M3	504,5	$ 855.000,00	$ 431.347.500,00	0,00	$ 0,00	21,38	$ 18.279.900,00	483,12	$ 413.067.600,00
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO					**$ 493.444.800,00**		**$ 36.407.691,38**		**$ 36.407.691,38**		**$ 493.444.800,00**

5. PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta las afectaciones que se han presentado en los últimos días en la ciudad de Villavicencio Meta por las condiciones de alta precipitación que afectan directamente sobre el rendimiento de ejecución de las obra al estar ubicadas en campo abierto, el contratista de obra solicitó una prórroga por el termino de veintiún (21) días con la finalidad de efectuar las actividades de obra restantes y poder cumplir con el objeto contractual y las condiciones actualizadas del contrato mediante la modificatoria No. 1 del día veintiuno (21) de octubre de 2021.

De esta manera, la fecha actualizada de terminación del contrato de obra No. 1477 de 2021 se proyecta para el día lunes quince (15) de noviembre de 2021.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE SEPTIEMBRE 2021

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA

CARGO	CONTRATISTA
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 4.500.000
SALUD	$ 562.500
PENSIÓN	$ 765.000
ARL	$ 0
N° DE PLANILLA	**9425974955**
FECHA DE PAGO	**20/10/2021**

NESTOR JULIO PARDO FUENTES

CARGO	RESIDENTE DE OBRA
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 920.000
SALUD	$ 115.000
PENSIÓN	$ 147.200
ARL	$ 36.800
N° DE PLANILLA	**9425212521**
FECHA DE PAGO	**05/11/2021**

DAYANA CUBIDES PEREZ

CARGO	TECNICO HSEQ
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 920.000
SALUD	$ 36.800
PENSIÓN	$ 147.200
ARL	$ 64.100
N° DE PLANILLA	**9425010927**
FECHA DE PAGO	**12/10/2021**

ANTONIO DE JESUS QUEVEDO ROZO

CARGO	CONDUCTOR
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 920.000
SALUD	$ 115.000
PENSIÓN	$ 147.200
ARL	$ 36.800
N° DE PLANILLA	**9425212521**
FECHA DE PAGO	**05/11/2021**

MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

CARGO	DIRECTOR DE OBRA
% DE DEDICACIÓN	50%
IBC (Ingreso Base de Cotizaciõñ)	$ 908.526
SALUD	$ 113.600
PENSIÓN	$ 145.400
ARL	$ 63.300
N° DE PLANILLA	**9427089116**
FECHA DE PAGO	**18/11/2021**

JESUS DAVID DIAZ CORTES

CARGO	ING. ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
% DE DEDICACIÓN	40%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 113.600
PENSIÓN	$ 145.400
ARL	$ 63.300
N° DE PLANILLA	**9425653439**
FECHA DE PAGO	**08/10/2021**

CARLOS ALBERTO LEON CUELLAR

CARGO	TECNICO INSPECTOR DE OBRA
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 920.000
SALUD	$ 115.000
PENSIÓN	$ 147.200
ARL	$ 36.800
N° DE PLANILLA	**9425212521**
FECHA DE PAGO	**05/11/2021**

EDWIN ALBERTO HENAO ROJAS

CARGO	OFICIAL DE OBRA
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 920.000
SALUD	$ 115.000
PENSIÓN	$ 147.200
ARL	$ 36.800
N° DE PLANILLA	**9425212521**
FECHA DE PAGO	**05/11/2021**

LUIS CARLOS RAMIREZ PAEZ

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 15.300
PENSIÓN	$ 60.900
ARL	$ 26.500
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

EDUAR HERMIDES OVEIDO MADRIGAL

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 24.300
PENSIÓN	$ 97.000
ARL	$ 42.200
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

ESTID MUÑOZ GARCIA

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.800.000
SALUD	$ 72.000
PENSIÓN	$ 288.000
ARL	$ 125.300
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

GILDARDO ARTUNDUAGA CANO

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 2.500
PENSIÓN	$ 9.700
ARL	$ 4.300
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

JOSE ALEXANDER ANZOLA DIAZ

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 9.800
PENSIÓN	$ 39.000
ARL	$ 17.000
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

RAFAEL ELIAS MERTINEZ ARTUNDUAGA

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 24.300
PENSIÓN	$ 97.000
ARL	$ 42.200
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

JAWIN ELVIRO RIVEROS FALLA

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 17.000
PENSIÓN	$ 67.700
ARL	$ 29.500
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

JHON SEBASTIAN SAAVEDRA CHILATRA

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 4.400
PENSIÓN	$ 17.600
ARL	$ 7.700
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

JOAN SEBASTIAN SANCHEZ HERNANDEZ

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de	$ 1.600.000

BAUDILIO FERNANDEZ RUIZ

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de	$ 1.600.000

Cotización)	
SALUD	$ 42.600
PENSIÓN	$ 170.200
ARL	$ 74.100
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

Cotización)	
SALUD	$ 64.000
PENSIÓN	$ 256.000
ARL	$ 111.400
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

FELICIANO BENITEZ

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 14.400
PENSIÓN	$ 57.600
ARL	$ 25.100
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

HERIBERTO PULIDO CORONADO

CARGO	CUADRILLA DE ASFALTO
% DE DEDICACIÓN	100%
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 908.526
SALUD	$ 36.300
PENSIÓN	$ 145.100
ARL	$ 63.200
N° DE PLANILLA	**54032086**
FECHA DE PAGO	**25/10/2021**

7. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: El contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual).

8. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 493.444.800,00	26/08/2021 al 15/11/2021	100,00%
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 493.444.800,00	26/08/2021 al 15/11/2021	100,00%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0,00	-	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 493.444.800,00	-	100,00%

9. **CONCLUSIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO** comprendido entre el **26 de septiembre de 2021 y el 25 de octubre de 2021,** el contratista **LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA** cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral.

   El día 21 de octubre de 2021 se suscribió el Acta Modificatoria No. 1 del contrato de obra en donde se estableció el balance de mayores y menores cantidades. Teniendo en cuenta lo anterior, además de las altas precipitaciones que afectaron sobre el rendimiento de ejecución de la obra, el día 22 de octubre de 2021 se suscribió el Acta de Prorroga No. 1 por un término de veintiún (21) días, fijando de esta manera la nueva fecha de terminación para el día 15 de noviembre de 2021.

El contratista de obra presenta a la fecha una ejecución de avance mensual del 18,34% y una ejecución de avance acumulado del 70,11%, equivalente al valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 345.935.575,00), teniendo en cuenta el desarrollo de las obras en el barrio Ciudad Porfía y barrio Catumare de la comuna No. 8, en el barrio El Emporio de la comuna No. 1 y en el sector de Los Fundadores de la ciudad de Villavicencio.

ING. JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS
SUPERVISOR
CELULAR: 312 305 3715

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
T.P. No. 08202 – 58328 ATL
INGENIERO CIVIL
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ARQUITECTÓNICAS

BITACORA DE OBRA ORIGINAL

Carrera 64 No. 48-84
Barranquilla, Colombia

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
29	09	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy se realizó la reposición de pavimento asfaltico en el sector de Los Fundadores.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Cortadora de Piso
Sub-base Granular 1 1/2
Mezcla densa en Caliente Tipo MCD-19.

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	X	Operador	X
Residente de Obra	X	Cuadrilla de asfalto	X
Supervisor	X	Ayudante	X
Maestro general	X		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
28	04	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se continuaron actividades de reparación de vias mediante Bacheo en el Sector de los Fundadores.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Cortadora de piso
Subbase Granular 1 1/2
Mezcla densa en Caliente MDC-19
Herramienta Menor

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
29	09	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se continuaron las actividades de reposición de vias mediante bacheo en el sector de los Fundadores

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor
Base Granular 1 1/2
Mezcla densa en Caliente MCD-19
Cortadora de piso

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
30	09	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy Se continua con las actividades de reposición de Vias mediante Bacheo en el sector de los Fundadores

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor
Cortadora de Piso
Base Granular 1 1/2
Mezcla densa en Caliente MCD-19

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
01	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy Finalizaron las actividades de reposición de vias mediante bacheo en el Sector de los Fundadores. Area total de 40,23 M2.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor
Mezcla densa en caliente MCD-19
Cortadora de piso
Base Granular MCD-19

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
02	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy se realizó el reconocimiento de áreas a intervenir del Barrio El Emporio.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
03	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

No se realizaron actividades de obra el 3er dia domingo

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra		Operador	
Residente de Obra		Cuadrilla de asfalto	
Supervisor		Ayudante	
Maestro general			

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
04	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El día de hoy iniciaron actividades de Corte de pavimento Flexible en el Sector del Empedro Calle 41 A # 28 frente a la Cuadrilla Urbana No. 2.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta menor
Cortadora de piso.

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
05	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se ejecutaron actividades de Corte de pavimento Flexible en las instalaciones del INVIAS - Transversal 28 # 41.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor
Cortadora de piso.

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS		
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
06	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

No se llevaron a cabo actividades de obra por las condiciones de alta precipitación.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
07	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se llevaron a cabo actividades de Corte de pavimento Flexible en el barrio Emporio Calle 41A # 21.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor.
Cortadora de piso

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
08	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

No se llevaron actividades de obra por las malas condiciones climaticas de alta precipitación.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
09	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se realiza el corte sobre pavimento flexible en el barrio Emporio Calle 41A # 26 e Intersección Calle 41 x Transversal 27. y emporio x Calle 40 A

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor
Cortadora de piso.

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS		
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
10	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

No se efectuaron actividades de obra por ser día domingo.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra		Operador	
Residente de Obra		Cuadrilla de asfalto	
Supervisor		Ayudante	
Maestro general			

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
11	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se realiza Mejoramiento de la base en el barrio Emporio calle 41A # 28.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Base Granular 1 1/2
Herramienta Menor.

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
12	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO	X	LLUVIA	
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El día de hoy se lleva a cabo la demolición, excavación y mejoramiento de la base en las vías del seccional INVIAS Barrio Emporio Transv. 28.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Retroexcavadora
Herramienta Menor
Base Granular 1 1/2.

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS		
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
13	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

No se llevaron a Cabo actividades de obra el día de hoy por las Condiciones de alta precipitación

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
14	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy no se pudieron efectuar labores de obra por las condiciones de fuertes lluvias en el sector de intervención.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS		
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
15	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy no se llevaron a cabo actividades de obra por las fuertes lluvias en el sector del EMPORIO.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS		
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
16	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se realizó la demolición, retiro, excavación y relleno con Base de las áreas a intervenir en el Emporio calle 41A # 21

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Herramienta Menor
Retroexcavadora
Base Granular 1 1/2,

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS		
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
17	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy no se efectuaron actividades de obra al ser dia domingo.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
FIRMAS	MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
	JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
18	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy no se efectuaron actividades de obra al ser día festivo.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra		Operador	
Residente de Obra		Cuadrilla de asfalto	
Supervisor		Ayudante	
Maestro general			

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
19	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCION DE OBRAS EJECUTADAS

Hoy se continuaron actividades de Corte de pavimento en el barrio emporio. Sin embargo, se suspender labores en la tarde por fuertes lluvias.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Cortadora de piso
Herramienta Menor

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
20	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy no se efectuaron actividades de obra al ser presentadas Fuertes lluvias en el sector del Emporio que imposibilitan la ejecución de las labores.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
21	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El día de hoy se efectuaron las labores de demolición, Retiro de Material, excavación y relleno con Base Granular en las áreas a intervenir de la calle 41A x 26, Intersección Calle 41 x transversal 27 y Calle 40A del Barrio el Emporio.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

Se suscribe el acta Modificatoria No. 1, teniendo en cuenta el balance de mayores y menores cantidades de obra contractuales

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
22	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy no se efectuaron actividades de obra, debido a las condiciones de alta precipitación en el Barrio el emporio.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

Teniendo en cuenta las altas precipitaciones en las ultimas semanas y su afectación en el Rendimiento de obra, asi como la suscripción de las actividades aprobadas por modificatoria No.1, quedando nueva fecha de terminación el dia 13 de noviembre de 2021

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
23	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El día de hoy se llevaron las actividades de Mejoramiento de vías Mediante Bacheo en Mezcla densa en Caliente en el Barrio el Emporio. de la Comuna No. 1 en la Calle 41A # 28, Seccional INVIAS, Calle 41A#27, Intersección Calle 41 #27 y Calle 40A.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
24	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	
		NUBLADO	X	OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El día de hoy no se llevaron actividades de obra por ser domingo

2. OBSERVACIONES INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra		Operador	
Residente de Obra		Cuadrilla de asfalto	
Supervisor		Ayudante	
Maestro general			

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

LIBRO DE OBRA

"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".

FECHA		
DD	MM	AAAA
25	10	2021

CONTRATO Nº	CONTRATISTA	ESTADO DEL TIEMPO			
1477 DE 2021	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA CC. 84.034.968	SOLEADO		LLUVIA	X
		NUBLADO		OTRO	

1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

El dia de hoy no se ejecutaron actividades de obra por fuertes lluvias.

2. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y/O COMUNIDAD:

3. MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

4. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA

Director de Obra	1	Operador	1
Residente de Obra	1	Cuadrilla de asfalto	1
Supervisor	1	Ayudante	
Maestro general	1		

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA	DIRECTOR DE OBRA	
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	SUPERVISOR	

Folio Nº
