ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORME DE INTERVENTORÍA-ACTA FINAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CERTIFICACIÓN PORCENTUAL Y FINANCIERO DE LA OBRA

La Jagua de Ibírico, 13 de diciembre de 2021.

Doctor
OSMAN RAFAEL MARTINEZ MURCIA
Secretario de Tránsito y transporte Municipal
Alcaldía la Jagua de Ibirico.

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

CERTIFICACIÓN PORCENTUAL Y FINANCIERO DE LA OBRA


Esta interventoría aprueba un avance acumulado de la obra del 100,00 %, del proyecto **OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR,** a la fecha de la presente certificación el contratista realizó las actividades de instalación de equipos de red y de CCTV, cumpliendo así con la totalidad de las obligaciones de ejecución contratadas. El contratista realiza pruebas de funcionamiento y operación de todos los sistemas involucrados.

A continuación se anexa cuadro de porcentaje programado y ejecutado para la obra.

COMPARACIÓNDE COSTOS ACUMULADOS EN % INCLUYE AIU E IVA				
periodo en ejecución	**programado financiero**	**% programado**	**ejecutado financiero**	**% ejecutado**
sep 14 a sep 21	277.425.461	28,78%	336.557.936	34,91%
sep 22 a sep 28	476.458.502	49,43%	424.268.625	44,01%
sep 29 a oct 6	544.930.439	56,53%	516.542.288	53,58%
oct 6 a oct 13	568.337.397	58,96%	540.151.731	56,03%
oct 14 a oct 20	589.661.626	61,17%	598.183.306	62,05%
oct 21 a oct 27	611.869.521	63,47%	618.777.494	64,19%
oct 28 a nov 3	622.726.330	64,60%	633.410.585	65,71%
nov 4 a nov 10	646.399.024	67,06%	942.290.179	97,75%
nov 11 a nov 19	724.320.185	75,14%	946.694.229	98,21%
nov 20 a nov 26	733.975.284	76,14%	954.190.487	98,98%
nov 27 a dic 4	875.160.012	90,79%	963.979.251	100,00%
dic 5 a dic 13	963.979.251	100,00%	963.979.251	100,00%


EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

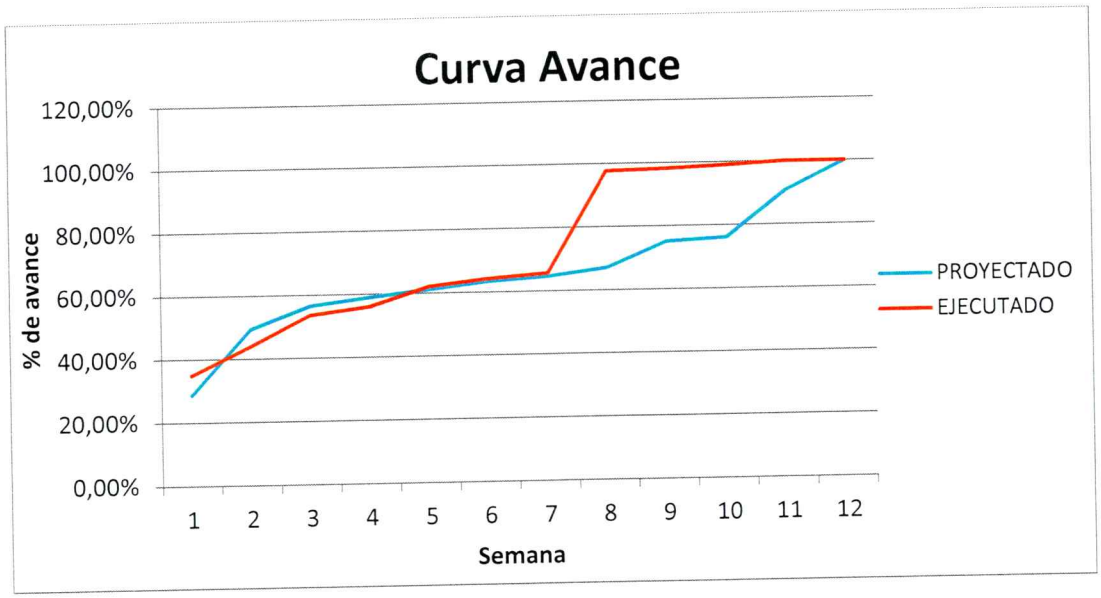

Gráficamente se observa que el contratista ha ejecutado el 100% de las actividades contratadas.

AVANCE FIANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ACTA FINAL

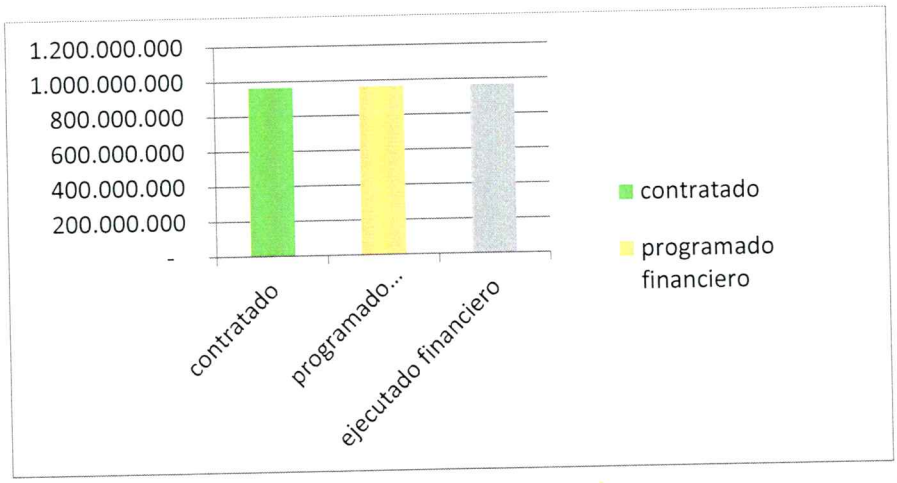

Dado en La Jagua de Ibirico, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
Interventor
Representante legal CONSORCO INTER CIS

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL
