CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA FINAL

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTORIA	Consorcio Inter CIS			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

DICIEMBRE 13 de 2021

		CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	OBRA												
1	**SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO**												
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA DOBLE PARA VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADA. TROQUEL	UND	92,0	181.552,0	16.702.784,0	92,0	16.702.784,0		-	92,0	16.702.784,0	92,0	16.702.784,0
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DIMENSIONES 2.1M DE ALTO CON EXTRACTOR, PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA Y REGLETA	UND	2,0	3.868.702,0	7.737.404,0	2,0	7.737.404,0		-	2,0	7.737.404,0	2,0	7.737.404,0
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6 A	UND	10,0	1.643.062,0	16.430.620,0	10,0	16.430.620,0		-	10,0	16.430.620,0	10,0	16.430.620,0
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU	UND	8,0	374.522,0	2.996.176,0	8,0	2.996.176,0		-	8,0	2.996.176,0	8,0	2.996.176,0
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A	ML	8.280,26	6.891,0	57.059.271,7	8.280,3	57.059.271,7		-	8.280,3	57.059.271,7	8.280,3	57.059.271,7
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 3M. WA	UND	150,0	61.512,0	9.226.800,0	150,0	9.226.800,0		-	150,0	9.226.800,0	150,0	9.226.800,0
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 2M.	UND	184,0	62.332,0	11.469.088,0	184,0	11.469.088,0		-	184,0	11.469.088,0	184,0	11.469.088,0
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA METALICA	ML	30,0	112.462,0	3.373.860,0	30,0	3.373.860,0		-	30,0	3.373.860,0	30,0	3.373.860,0
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CM / TUBO EMT 2""	UND	256,0	52.887,0	13.539.072,0	256,0	13.539.072,0		-	256,0	13.539.072,0	256,0	13.539.072,0
1.10	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA ENERGÍA REGULADA TIPO LEVINTON EN ALAMBRE DE COBRE EN 2NO 10 + 1NO 12T-	UND	34,0	156.416,0	5.318.144,0	34,0	5.318.144,0		-	34,0	5.318.144,0	34,0	5.318.144,0
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	130,0	28.247,0	3.672.110,0	130,0	3.672.110,0		-	130,0	3.672.110,0	130,0	3.672.110,0
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	90,0	35.623,0	3.206.070,0	90,0	3.206.070,0		-	90,0	3.206.070,0	90,0	3.206.070,0
1,13	SUMINISTRO BACKBONE FIBRA ÓPTICA -	UND	1,0	6.699.078,0	6.699.078,0	1,0	6.699.078,0		-	1,0	6.699.078,0	1,0	6.699.078,0
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 2" -	UND	120,0	43.997,0	5.279.640,0	120,0	5.279.640,0		-	120,0	5.279.640,0	120,0	5.279.640,0
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					-	-			-		-	

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA FINAL

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTORIA	Consorcio Inter CIS			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

DICIEMBRE 13 de 2021

	CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION D COFRE CON TRANSFERENCIA MANUAL TETRAPOLAR, TOTALIZADOR DE I/O	UND	2,0	3.516.416,0	7.032.832,0	2,0	7.032.832,0		-	2,0	7.032.832,0	2,0	7.032.832,0
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION D ACOMETIDA ELÉCTRICA 5X#8 -	ML	12,0	93.439,0	1.121.268,0	12,0	1.121.268,0		-	12,0	1.121.268,0	12,0	1.121.268,0
3.00	**INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD**					-	-			-		-	
3.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L3 24 PTS	UN	4,0	1.441.588,0	5.766.352,0	4,0	5.766.352,0	4,0	5.766.352,0		-	4,0	5.766.352,0
3.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT	UN	7,0	360.397,0	2.522.779,0	7,0	2.522.779,0	7,0	2.522.779,0	-	-	7,0	2.522.779,0
3,03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L2 24 POE 1 GB -	UN	2,0	432.476,0	864.952,0	2,0	864.952,0	2,0	864.952,0	-	-	2,0	864.952,0
4	**INSTALACIÓN DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA**					-	-			-		-	
4.01	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR	UN	2,0	680.404,0	1.360.808,0	2,0	1.360.808,0	1,0	680.404,0	1,0	680.404,0	2,0	1.360.808,0
5	**INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**					-	-			-		-	
5.01	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA	UN	2,0	170.101,0	340.202,0	2,0	340.202,0	1,0	170.101,0	1,0	170.101,0	2,0	340.202,0
5.02	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5,0	680.404,0	3.402.020,0	5,0	3.402.020,0		-	5,0	3.402.020,0	5,0	3.402.020,0
5.03	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3,0	408.242,0	1.224.726,0	3,0	1.224.726,0		-	3,0	1.224.726,0	3,0	1.224.726,0
5.04	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4,0	340.202,0	1.360.808,0	4,0	1.360.808,0		-	4,0	1.360.808,0	4,0	1.360.808,0
6.00	**INSTALACIÓN DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL**					-	-			-		-	
6,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA -	UN	1,0	9.370.322,0	9.370.322,0	1,0	9.370.322,0		-	1,0	9.370.322,0	1,0	9.370.322,0

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA FINAL

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - **Aseguradora solidaria**				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTORIA	Consorcio Inter CIS			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

DICIEMBRE 13 de 2021

	CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO**					-	-			-		-	
7.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DETECCIÓN SEDES SEC. TRANSITO Y TERMINAL DE TRANSPORTES - VER ANEXO TECNICO	UN	1,0	9.372.928,0	9.372.928,0	1,0	9.372.928,0		-	1,0	9.372.928,0	1,0	9.372.928,0
8.00	**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO**					-	-			-		-	
8.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE NVR32CH - VER ANEXO TECNICO	UN	2,0	340.202,0	680.404,0	2,0	680.404,0	2,0	680.404,0	-	-	2,0	680.404,0
8.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CAMARA IP DOMO - VER ANEXO TECNICO	UN	25,0	34.020,0	850.500,0	25,0	850.500,0	25,0	850.500,0	-	-	25,0	850.500,0
8.03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CÁMARA IP BALA - VER ANEXO TECNICO	UN	18,0	34.020,0	612.360,0	18,0	612.360,0	18,0	612.360,0	-	-	18,0	612.360,0
8.04	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE MONITOR 42" - VER ANEXO TECNICO	UN	3,0	34.020,0	102.060,0	3,0	102.060,0	3,0	102.060,0	-	-	3,0	102.060,0
8.05	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE PC AIO I5 3,6 GHZ - VER ANEXO TECNICO	UN	2,0	68.040,0	136.080,0	2,0	136.080,0	2,0	136.080,0	-	-	2,0	136.080,0
9.00	**ACABADOS**					-	-			-		-	
9,01	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	UN	30,8	22.811,0	702.578,8	30,8	702.578,8		-	30,8	702.578,8	30,8	702.578,8
9,02	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS A TRES MANOS	UN	115,5	5.541,0	639.985,5	115,5	639.985,5		-	115,5	639.985,5	115,5	639.985,5
10.00	**CARPINTERIA**					-	-			-		-	
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	250,4	289.235,0	72.412.874,6	250,4	72.412.874,6		-	250,4	72.412.874,6	250,4	72.412.874,6
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALMUNIO Y VIDRIO	UN	14,0	153.747,0	2.152.458,0	14,0	2.152.458,0		-	14,0	2.152.458,0	14,0	2.152.458,0
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO DE LOS VIDRIOS DISEÑO MODERNO X 1,50 PLATEADA CON ADHESIVO	M2	80,0	17.898,0	1.431.840,0	80,0	1.431.840,0	80,0	1.431.840,0	-	-	80,0	1.431.840,0
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	60,0	3.351,0	201.060,0	60,0	201.060,0		-	60,0	201.060,0	60,0	201.060,0
11.00	**OBRAS VARIAS**					-	-			-		-	
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 3/4"	ML	80,0	13.830,0	1.106.400,0	80,0	1.106.400,0		-	80,0	1.106.400,0	80,0	1.106.400,0
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1/2"	ML	35,0	12.785,0	447.475,0	35,0	447.475,0		-	35,0	447.475,0	35,0	447.475,0
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÜE AIRES	ML	50,0	7.725,0	386.250,0	50,0	386.250,0		-	50,0	386.250,0	50,0	386.250,0

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA FINAL

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - **Aseguradora solidaria**				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTORIA	Consorcio Inter CIS			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

DICIEMBRE 13 de 2021

		CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A 220 PARA AIRE ACONDICIONADOS	UND	12,0	351.279,0	4.215.348,0	12,0	4.215.348,0		-	12,0	4.215.348,0	12,0	4.215.348,0
11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/R NCAUCHETADOS PARA CONTROL Y MANDO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	ML	410,0	10.166,0	4.168.060,0	410,0	4.168.060,0		-	410,0	4.168.060,0	410,0	4.168.060,0
11,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	140,0	21.866,0	3.061.240,0	140,0	3.061.240,0		-	140,0	3.061.240,0	140,0	3.061.240,0
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/2 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	115,0	25.084,0	2.884.660,0	115,0	2.884.660,0		-	115,0	2.884.660,0	115,0	2.884.660,0
11,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 3/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	112,0	35.789,0	4.008.368,0	112,0	4.008.368,0		-	112,0	4.008.368,0	112,0	4.008.368,0
11,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 5/8 PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	165,0	39.640,0	6.540.600,0	165,0	6.540.600,0		-	165,0	6.540.600,0	165,0	6.540.600,0
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFIFRERANTE R410	KG	30,0	48.234,0	1.447.020,0	30,0	1.447.020,0		-	30,0	1.447.020,0	30,0	1.447.020,0
	COSTO DIRECTO				**314.637.736,6**		**314.637.736,6**		**13.817.832,0**	-	**300.819.904,6**	-	**314.637.736,6**
	AIU 30%				**94.391.321,0**		**94.391.321,0**		**4.145.349,6**	-	**90.245.971,4**	-	**94.391.321,0**
	TOTAL OBRA				**409.029.057,5**		**409.029.057,5**		**17.963.181,6**	-	**391.065.875,9**	-	**409.029.057,5**
										-		-	
										-		-	
	SUMINISTRO									-		-	
SUM 3	**SUMINISTRO DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD**									-		-	
UM 3 - 1,0	SUMINISTRO DE SWITCH L3 24 PTS	UN	4,0	15.140.000,0	60.560.000,0	4,0	60.560.000,0		-	4,0	60.560.000,0	4,0	60.560.000,0
UM 3 - 1,0	SUMINISTRO DE ACCESS POINT	UN	7,0	2.519.950,0	17.639.650,0	7,0	17.639.650,0		-	7,0	17.639.650,0	7,0	17.639.650,0
UM 3 - 1,0	SUMINISTRO DE SWITCH L2 24 POE 1 GB	UN	2,0	7.627.000,0	15.254.000,0	2,0	15.254.000,0		-	2,0	15.254.000,0	2,0	15.254.000,0
SUM 4	**SUMINISTRO DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA**					-			-	-		-	
UM 4 - 1,0	SUMINISTRO DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR	UN	2,0	19.380.000,0	38.760.000,0	2,0	38.760.000,0		-	2,0	38.760.000,0	2,0	38.760.000,0

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA FINAL

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - Aseguradora solidaria				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTORIA	Consorcio Inter CIS			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	29 07 2021	01 03 2022
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

DICIEMBRE 13 de 2021

		CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUM 5	**SUMINISTRO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**					-	-		-	-	-	-	-
UM 5 - 1,0	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA	UN	2,0	3.131.000,0	6.262.000,0	2,0	6.262.000,0	1,0	3.131.000,0	1,0	3.131.000,0	2,0	6.262.000,0
UM 5 - 1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO INVERTER	UN	5,0	9.364.013,0	46.820.065,0	5,0	46.820.065,0		-	5,0	46.820.065,0	5,0	46.820.065,0
UM 5 - 1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, INVERTER	UN	3,0	7.800.230,0	23.400.690,0	3,0	23.400.690,0		-	3,0	23.400.690,0	3,0	23.400.690,0
UM 5 - 1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, INVERTER	UN	4,0	7.272.000,0	29.088.000,0	4,0	29.088.000,0		-	4,0	29.088.000,0	4,0	29.088.000,0
SUM 6 - 1,01	**SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL**					-			-	-		-	
UM 6 - 1,0	SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA	UN	1,0	57.345.000,0	57.345.000,0	1,0	57.345.000,0		-	1,0	57.345.000,0	1,0	57.345.000,0
SUM 7 - 1,01	**SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO**					-			-	-		-	
UM 7 - 1,0	SUMINISTRO DE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES	UN	1,0	121.279.270,0	121.279.270,0	1,0	121.279.270,0		-	1,0	121.279.270,0	1,0	121.279.270,0
SUM 8 - 1,01	**SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO**					-			-	-		-	
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE NVR32CH -	UN	2,0	4.832.345,0	9.664.690,0	2,0	9.664.690,0		-	2,0	9.664.690,0	2,0	9.664.690,0
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE CAMARA IP DOMO	UN	25,0	332.795,0	8.319.875,0	25,0	8.319.875,0		-	25,0	8.319.875,0	25,0	8.319.875,0
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE CÁMARA IP BALA	UN	18,0	333.250,0	5.998.500,0	18,0	5.998.500,0		-	18,0	5.998.500,0	18,0	5.998.500,0
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE MONITOR 42"	UN	3,0	6.060.000,0	18.180.000,0	3,0	18.180.000,0		-	3,0	18.180.000,0	3,0	18.180.000,0
UM 8 - 1,0	SUMINISTRO DE PC AIO I5 3,2 GHZ	UN	2,0	3.886.480,0	7.772.960,0	2,0	7.772.960,0		-	2,0	7.772.960,0	2,0	7.772.960,0
	COSTO SUMINISTRO				**$ 466.344.700**		**$ 466.344.700**		**$ 3.131.000**		**$ 463.213.700**		**$ 466.344.700**
	IVA				**$ 88.605.493**		**$ 88.605.493**		**$ 594.890**		**$ 88.010.603**		**$ 88.605.493**
	TOTAL SUMINISTRO				**$ 554.950.193**		**$ 554.950.193**		**$ 3.725.890**		**$ 551.224.303**		**$ 554.950.193,0**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

ACTA FINAL

No. DE CONTRATO	No. 244-2021	OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA - **Aseguradora solidaria**				
CONTRATISTA	IS&C SAS			Amparo	Numero	Monto	Inicio	Terminación
NIT	824001126-3			CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	326 47 994000006606	$96,397,925.10	29/07/2021	1/03/2022
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA GARCIA CURE	TERMINACION FINAL	13/12/2021	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALESLABORALES	326 47 994000006606	48,198,962.55	29/07/2021	29/10/2024
INTERVENTORIA	Consorcio Inter CIS			ESTABILIDAD DE LA OBRA	326 47 994000006606	96,397,925.10	30/11/2021	5 AÑOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO	SUSPENSION 001		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	326 74 994000002841	181,705,200.00	**29 07 2021**	**01 03 2022**
FECHA DE INICIO	14/09/2021							
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2021	REINICIO 001						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 963.979.251	SUPERVISOR	OSMAN RAFAEL MARYINEZ MURCIA					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	3 MESES							

DICIEMBRE 13 de 2021

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TOTAL OBRA + SUMINISTRO				$ 963.979.251		$ 963.979.251		$ 21.689.072		$ 942.290.178,93		$ 963.979.251
							PORCENTAJES DE EJECUCION			VALORES EJECUTADOS			
							PRESENTA ACTA:	2,25%		PRESENTE ACTA:		$ 21.689.072	
							TOTAL EJECUTADO:	100,00%		TOTAL ACUMULADO (EJECUTADO):		$ 963.979.251	
							POR EJECUTAR:	0,00%		SALDO POR EJECUTAR:		$ -	
										AMORTIZACIÓN ANTICIPO		N/A	
										SALDO ACTA ANTERIOR		$ 75.451.950	
										TOTAL A PAGAR		$ 97.141.022	

JESUS MARIA GARCIA CURE
CONTRATISTA

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA
INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	ANEXO -INFORME DE EJCUCION No: 003	Versión	Código	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO
	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	03	FMI043	

OBRA

CONTRATO No. SUN 244-2021

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : INGENIERÍA SOFTWARE & COMPUTADORES SAS
REP. LEGAL : JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).
PERÍODO EJECUCION: DEL 14 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 13 DE 2021

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 239-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSIRCIO INTER CIS
REP. LEGAL : MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO $ 67.485.843,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						CANTIDADES				VALORES				% DE EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALOR POR EJECUTAR	
1	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO				-			-		-	-	-	-	-
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA DOBLE PARA VOZ Y	UND	92,00	181.552,00	16.702.784	92,00		92,00	-	16.702.784,00	-	16.702.784,00	-	-
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DIMENSIONES 2.1M DE ALTO CON EXTRACTOR, PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA Y REGLETA	UND	2	3.868.702	7.737.404	2,00		2,00	-	7.737.404,00	-	7.737.404,00	-	100%
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6 A incluye SOFTWARE ADMINISTRADOR CABLEADO	UND	10	1.643.062	16.430.620	10,00		10,00	-	16.430.620,00	-	16.430.620,00	-	100%
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU	UND	8	374.522	2.996.176	8,00		8,00	-	2.996.176,00	-	2.996.176,00	-	100%
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A	ML	8280,26	6.891	57.059.272	8.280,26		8.280,26	-	57.059.271,66	-	57.059.271,66	-	100%
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 3M. WA	UND	150	61.512	9.226.800	150,00		150,00	-	9.226.800,00	-	9.226.800,00	-	100%
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 2M.	UND	184	62.332	11.469.088	184,00		184,00	-	11.469.088,00	-	11.469.088,00	-	100%
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA METALICA	ML	30	112.462	3.373.860	30,00		30,00	-	3.373.860,00	-	3.373.860,00	-	100%
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CM / TUBO EMT 2""	UND	256	52.887	13.539.072	256,00		256,00	-	13.539.072,00	-	13.539.072,00	-	100%
1.10	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA ENERGÍA REGULADA TIPO LEVINTON EN ALAMBRE DE COBRE EN 2NO 10 + 1NO 12T-	UND	34	156.416	5.318.144	34,00		34,00	-	5.318.144,00	-	5.318.144,00	-	100%
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	130	28.247	3.672.110	130,00		130,00	-	3.672.110,00	-	3.672.110,00	-	100%
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	90	35.623	3.206.070	90,00		90,00	-	3.206.070,00	-	3.206.070,00	-	100%
1,13	SUMINISTRO BACKBONE FIBRA ÓPTICA -	UND	1	6.699.078	6.699.078	1,00		1,00	-	6.699.078,00	-	6.699.078,00	-	100%
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 2" -	UND	120	43.997	5.279.640	120,00		120,00	-	5.279.640,00	-	5.279.640,00	-	100%
2	INSTALACIONES ELECTRICAS				-	-		-	-	-	-	-	-	
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION D COFRE CON TRANSFERENCIA MANUAL TETRAPOLAR, TOTALIZADOR DE I/O	UND	2	3.516.416	7.032.832	2,00		2,00	-	7.032.832,00	-	7.032.832,00	-	100%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION D ACOMETIDA ELÉCTRICA 5X#8 -	ML	12	93.439	1.121.268	12,00		12,00	-	1.121.268,00	-	1.121.268,00	-	100%
3.00	INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD				-	-		-	-	-	-	-	-	
3.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L3 24 PTS	UN	4	1.441.588	5.766.352	-	4,0	4,00	-	-	5.766.352,00	5.766.352,00	-	100%
3.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT	UN	7	360.397	2.522.779	-	7,0	7,00	-	-	2.522.779,00	2.522.779,00	-	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	ANEXO -INFORME DE EJCUCION No: 003	Versión	Código	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO
	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	03	FMI043	

OBRA

CONTRATO No. SUN 244-2021

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : INGENIERÍA SOFTWARE & COMPUTADORES SAS
REP. LEGAL : JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES

VALOR CONTRATADO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).
PERÍODO EJECUCION: DEL 14 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 13 DE 2021

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 239-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSIRCIO INTER CIS
REP. LEGAL : MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO $ 67.485.843,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						CANTIDADES				VALORES				% DE EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALOR POR EJECUTAR	
3,03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L2 24 POE 1 GB -	UN	2	432.476	864.952	-	2,0	2,00	-	-	864.952,00	864.952,00	-	100%
4	INSTALACIÓN DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA				-	-		-	-	-	-	-	-	
4,01	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR	UN	2	680.404	1.360.808	1,00	1,0	2,00	-	680.404,00	680.404,00	1.360.808,00	-	100%
5	INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				-	-		-	-	-	-	-	-	
5.01	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA	UN	2	170.101	340.202	1,00	1,0	2,00	-	170.101,00	170.101,00	340.202,00	-	100%
5.02	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5	680.404	3.402.020	5,00		5,00	-	3.402.020,00	-	3.402.020,00	-	100%
5.03	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3	408.242	1.224.726	3,00		3,00	-	1.224.726,00	-	1.224.726,00	-	100%
5.04	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4	340.202	1.360.808	4,00		4,00	-	1.360.808,00	-	1.360.808,00	-	100%
6.00	INSTALACIÓN DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL				-	-		-	-	-	-	-	-	
6,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA - VER ANEXO TECNICO	UN	1	9.370.322	9.370.322	1,00		1,00	-	9.370.322,00	-	9.370.322,00	-	100%
7	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO				-	-		-	-	-	-	-	-	
7.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DETECCIÓN SEDES SEC. TRANSITO Y TERMINAL DE TRANSPORTES - VER ANEXO TECNICO	UN	1	9.372.928	9.372.928	1,00		1,00	-	9.372.928,00	-	9.372.928,00	-	100%
8.00	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO				-	-		-	-	-	-	-	-	
8.01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE NVR32CH - VER ANEXO TECNICO	UN	2	340.202	680.404	-	2,0	2,00	-	-	680.404,00	680.404,00	-	100%
8.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CAMARA IP DOMO - VER ANEXO TECNICO	UN	25	34.020	850.500	-	25,0	25,00	-	-	850.500,00	850.500,00	-	100%
8.03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CÁMARA IP BALA - VER ANEXO TECNICO	UN	18	34.020	612.360	-	18,0	18,00	-	-	612.360,00	612.360,00	-	100%
8.04	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE MONITOR 42" - VER ANEXO TECNICO	UN	3	34.020	102.060	-	3,0	3,00	-	-	102.060,00	102.060,00	-	100%
8.05	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE PC AIO I5 3,6 GHZ - VER ANEXO TECNICO	UN	2	68.040	136.080	-	2,0	2,00	-	-	136.080,00	136.080,00	-	100%
9.00	ACABADOS				-	-		-	-	-	-	-	-	
9,01	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	UN	30,8	22.811	702.579	30,80		30,80	-	702.578,80	-	702.578,80	-	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	ANEXO -INFORME DE EJCUCION No: 003	Versión	Código	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO
	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	03	FMI043	

OBRA

CONTRATO No. SUN 244-2021

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : INGENIERÍA SOFTWARE & COMPUTADORES SAS
REP. LEGAL : JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).
PERÍODO EJECUCION: DEL 14 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 13 DE 2021

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 239-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSIRCIO INTER CIS
REP. LEGAL : MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO $ 67.485.843,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						CANTIDADES				VALORES				% DE EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALOR POR EJECUTAR	
9,02	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS A TRES MANOS	UN	115,5	5.541	639.986	115,50		115,50	-	639.985,50	-	639.985,50	-	100%
10,00	CARPINTERIA				-	-		-	-	-	-	-	-	
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	250,36	289.235	72.412.875	250,36		250,36	-	72.412.874,60	-	72.412.874,60	-	100%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALMUNIO Y VIDRIO	UN	14	153.747	2.152.458	14,00		14,00	-	2.152.458,00	-	2.152.458,00	-	100%
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO DE LOS VIDRIOS DISEÑO MODERNO X 1,50 PLATEADA CON ADHESIVO	M2	80	17.898	1.431.840	-	80,0	80,00	-	-	1.431.840,00	1.431.840,00	-	100%
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	60	3.351	201.060	60,00		60,00	-	201.060,00	-	201.060,00	-	100%
11,00	OBRAS VARIAS				-	-		-	-	-	-	-	-	
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 3/4"	ML	80	13.830	1.106.400	80,00		80,00	-	1.106.400,00	-	1.106.400,00	-	100%
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1/2"	ML	35	12.785	447.475	35,00		35,00	-	447.475,00	-	447.475,00	-	100%
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÜE AIRES	ML	50	7.725	386.250	50,00		50,00	-	386.250,00	-	386.250,00	-	100%
11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A 220 PARA AIRE ACONDICIONADOS	UND	12	351.279	4.215.348	12,00		12,00	-	4.215.348,00	-	4.215.348,00	-	100%
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/R NCAUCHETADOS PARA CONTROL Y MANDO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	ML	410	10.166	4.168.060	410,00		410,00	-	4.168.060,00	-	4.168.060,00	-	100%
11,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	140	21.866	3.061.240	140,00		140,00	-	3.061.240,00	-	3.061.240,00	-	100%
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/2 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	115	25.084	2.884.660	115,00		115,00	-	2.884.660,00	-	2.884.660,00	-	100%
11,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 3/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	112	35.789	4.008.368	112,00		112,00	-	4.008.368,00	-	4.008.368,00	-	100%
11,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 5/8 PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	165	39.640	6.540.600	165,00		165,00	-	6.540.600,00	-	6.540.600,00	-	100%
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFIFRERANTE R410	KG	30	48.234	1.447.020	30,00		30,00	-	1.447.020,00	-	1.447.020,00	-	100%
	COSTO DIRECTO				314.637.736,6	-		-	-	300.819.904,6	13.817.832,0	314.637.736,56	-	100%
	AIU 30%				94.391.321,0	-		-	-	90.245.971,4	4.145.349,6	94.391.320,97	-	100%
	TOTAL OBRA				409.029.057,5	-		-	-	391.065.875,9	17.963.181,6	409.029.057,53	-	100%
					-	-		-	-	-	-	-	-	

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	ANEXO -INFORME DE EJCUCION No: 003	Versión	Código	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO
	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	03	FMI043	

OBRA

CONTRATO No. SUM 244-2021

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : INGENIERÍA SOFTWARE & COMPUTADORES SAS
REP. LEGAL : JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).
PERÍODO EJECUCION: DEL 14 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 13 DE 2021

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 239-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSIRCIO INTER CIS
REP. LEGAL : MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO $ 67.485.843,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						CANTIDADES				VALORES				% DE EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALOR POR EJECUTAR	
					-	-		-	-	-	-	-	-	
SUMINISTRO					-	-		-	-	-	-	-	-	
SUM 3	SUMINISTRO DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD				-	-		-	-	-	-	-	-	
UM 3 -1,0	SUMINISTRO DE SWITCH L3 24 PTS	UN	4	15.140.000	60.560.000	4,00		4,00	-	60.560.000,00	-	60.560.000,00	-	100%
UM 3 -1,0	SUMINISTRO DE ACCESS POINT	UN	7	2.519.950	17.639.650	7,00		7,00	-	17.639.650,00	-	17.639.650,00	-	100%
UM 3 -1,0	SUMINISTRO DE SWITCH L2 24 POE 1 GB	UN	2	7.627.000	15.254.000	2,00		2,00	-	15.254.000,00	-	15.254.000,00	-	100%
SUM 4	SUMINISTRO DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA				-	-		-	-	-	-	-	-	
UM 4 -1,0	SUMINISTRO DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR	UN	2	19.380.000	38.760.000	2,00		2,00	-	38.760.000,00	-	38.760.000,00	-	100%
SUM 5	SUMINISTRO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				-	-		-	-	-	-	-	-	
UM 5 -1,0	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA	UN	2	3.131.000	6.262.000	1,00	1,0	2,00	-	3.131.000,00	3.131.000,00	6.262.000,00	-	100%
UM 5 -1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO INVERTER	UN	5	9.364.013	46.820.065	5,00		5,00	-	46.820.065,00	-	46.820.065,00	-	100%
UM 5 -1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, INVERTER	UN	3	7.800.230	23.400.690	3,00		3,00	-	23.400.690,00	-	23.400.690,00	-	100%
UM 5 -1,0	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, INVERTER	UN	4	7.272.000	29.088.000	4,00		4,00	-	29.088.000,00	-	29.088.000,00	-	100%
SUM 6 -1,01	SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL				-	-		-	-	-	-	-	-	
UM 6 -1,0	SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA	UN	1	57.345.000	57.345.000	1,00		1,00	-	57.345.000,00	-	57.345.000,00	-	100%
SUM 7 -1,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO				-	-		-	-	-	-	-	-	
UM 7 -1,0	SUMINISTRO DE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES	UN	1	121.279.270	121.279.270	1,00		1,00	-	121.279.270,00	-	121.279.270,00	-	100%
SUM 8 -1,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO				-	-		-	-	-	-	-	-	
UM 8 -1,0	SUMINISTRO DE NVR32CH -	UN	2	4.832.345	9.664.690	2,00		2,00	-	9.664.690,00	-	9.664.690,00	-	100%
UM 8 -1,0	SUMINISTRO DE CAMARA IP DOMO	UN	25	332.795	8.319.875	25,00		25,00	-	8.319.875,00	-	8.319.875,00	-	100%
UM 8 -1,0	SUMINISTRO DE CÁMARA IP BALA	UN	18	333.250	5.998.500	18,00		18,00	-	5.998.500,00	-	5.998.500,00	-	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO	ANEXO -INFORME DE EJCUCION No: 003	Versión	Código	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO
	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	03	FMI043	

OBRA

CONTRATO No. SUM 244-2021

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : INGENIERÍA SOFTWARE & COMPUTADORES SAS
REP. LEGAL : JESÚS MARÍA GARCÍA CURE
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).
PERÍODO EJECUCION: DEL 14 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 13 DE 2021

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 239-2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA : CONSIRCIO INTER CIS
REP. LEGAL : MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES
VALOR CONTRATADO $ 67.485.843,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						CANTIDADES				VALORES				% DE EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALOR POR EJECUTAR	
UM 8 -1,0	SUMINISTRO DE MONITOR 42"	UN	3	6.060.000	18.180.000	3,00		3,00	-	18.180.000,00	-	18.180.000,00	-	100%
UM 8 -1,0	SUMINISTRO DE PC AIO I5 3,2 GHZ	UN	2	3.886.480	7.772.960	2,00		2,00	-	7.772.960,00	-	7.772.960,00	-	100%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 466.344.700						$ 3.131.000	$ 466.344.700	$ -	
	IVA 19%				$ 88.605.493						$ 594.890	$ 88.605.493	$ -	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 554.950.193						$ 3.725.890	$ 554.950.193	$ -	
VALOR TOTAL OBRA MÁS SUMINISTRO					$ 963.979.251						$ 21.689.072	$ 963.979.251	$ -	
1	INTERVENTORIA	MES	1,00		-					-	-	-		

Responsable del informe mensual

INTERVENTOR:

Firma:

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
RESIDENTE/REP. LEGAL DE INTERVENTORIA

REVISADO:


OSMAN RAFAEL MARTÍNEZ MURCIA
SUPERVISOR


MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATO Nº 224-2021

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-

ACTIVIDAD:SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 5X#8	CONTRATISTA IS&C SAS	INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CIS
ITEM 2,01 / UNIDAD ML / CANT. CONTRACTUAL 12	CANT. EJECUTADA: 12	CANT. ACUMULADA: 12

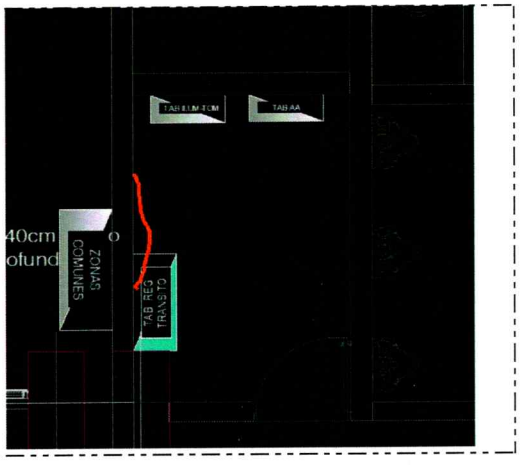

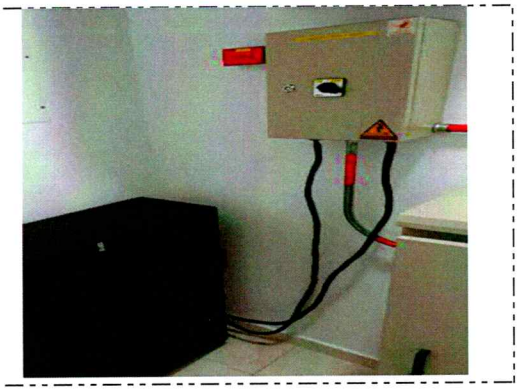

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
SECRETARIA DE TRANSITO			6		6
BOMBEROS			6		6

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIO:

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	12,0
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	12,0

APROBÓ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Fuente:

Proyectó: NELSÓN GUTIERREZ
Residente

Revisó: NELSÓN GUTIERREZ
Director interventoría
