1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
VALOR DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
PLAZO DEL CONTRATO	Veintidós (22) Meses
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR (Conformado KHB INGENIERIA S.A.S. ..... 45% TORAL CONSTRUCCIONES S.A.S. ..... 25% MAZ INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S..... 15 % IDC CONSULTORIAS S.A.S..... 15% Rep. Legal: ROCIO MARÍA ACOSTA ARGOTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12/05/2021
FECHA DE INICIO	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11/05/2023

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	8121	VALOR	$ 95.292.076.215,90	FECHA	12 DE MARZO DE 2021
N°	8521	VALOR	$ 44.207.808.221,10	FECHA	17 DE MARZO DE 2021
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	3238	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	3237	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8 - 1.3.9.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	9221	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	9121	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021

3. PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	VALOR	N° DE LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
Pro-universidad	$138.817.668.949,	$694.088.000	32021012775	06/07/2021

En atención a la autorización de descuento directo acogido por el contratista A CONSTRUIR S.A con relación a lo estipulado en la ordenanza No. 226 del 26 de febrero de 2021 para el pago de los impuestos de PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO-DESARROLLO FRONTERIZO, PRO-CULTURA Y PRO-ADULTO MAYOR.

4. GARANTÍAS CONTRACTUALES (INICIALES)

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
COLPATRIA	4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/05/2021 AL 12/07/2023
COLPATRIA	4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2026
COLPATRIA	4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	12/03/2023 AL 12/03/2028
COLPATRIA	4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	12/03/2023 AL 12/03/2026
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2023
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA				0050 DEL 6 DE JULIO DE 2021

4.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES (ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO)

COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2023	2021040002
COLPATRIA	4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 AL 11/09/2023	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	11/05/2023 AL 11/05/2028	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2023	2021040002-ACT01
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			0050 DEL 6 DE JULIO DE 2021		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2021040002-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.7447494 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021		

Estado de las garantías: vigentes

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
Acta de inicio	12/07/2021	Dar inicio al contrato	11/05/2023
Acta Modificatoria No 1	16/11/2021	Incluir actividades no previstas y balance de mayores y menores cantidades de obra	11/05/2023

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

NÚMERO DEL INFORME	FECHA DEL INFORME	PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL INFORME	ANEXOS RECIBIDOS
1	1/09/2021	12/07/2021 – 30/08/2021	1

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

EN EL PRESENTE PERIODO SE TRAMITA EL ACTA PARCIAL DE OBRA NO 2, LA CUAL SE TRAMITA EL PAGO, A CONTINUACIÓN SE RELACIONA EL RESUMEN DE LOS PAGOS REALIZADOS A LA FECHA.

Concepto	Valor Acta	Porcentaje Facturado	Fecha del Acta	Periodo del Acta	
				Desde	Hasta
Acta Parcial No 1	989.095.946,99	0.71%	30/08/2021	12/07/2021	30/08/2021
Acta Parcial No 2	1.084.213.519,92	0.78%	10/11/2021	01/09/2021	10/11/2021
Acta Parcial No 3					
Totales	**2.073.309.467,28**	**1.49%**			
Valor inicial	**138.817.668.949,11**				
Saldos	**136.744.359.481,8**	**98.51%**			

9. CONTROL DE PLAZOS

PLAZO INICIAL: 22 MESES
FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021
TIEMPO EJECUTADO: 49 DÍAS (1 MES Y 19 DIAS)
TIEMPO FALTANTE: (20 MESES Y 11 DÍAS)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11 DE MAYO DE 2023

10. ANTECEDENTES

EL presente informe reporta la ejecución del contrato de obra 2021040002 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR en el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2021 al 30 de agosto de 2021.

El proyecto que dio origen a los contratos de obra e interventoría cuentan con código BPIN: 2021002200022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Los procesos contractuales que dieron origen a los contratos de obra e interventoría fueron los siguientes: LOP-SIN-0002-2021 y CMA-SIN-0004-2021

La interventora está a cargo de la UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR según contrato de interventoría No. 2021 05 0007.

El proyecto consiste en la construcción del centro de eventos histórico y cultural de la música vallenata el cual constará de amplios y diversos espacios donde la comunidad valduparense podrá disfrutar, recordar e informarse sobre los máximos exponentes de la música vallenata. También tendrá espacios para bancos, restaurantes, entre otros, lo cual generará un gran desarrollo para la ciudad de Valledupar.

11. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En este periodo que consta desde la fecha de inicio de ejecución de los contratos de obra e interventoría se ejecutaron las siguientes actividades:

Se continuo con el corte, figurado y armado de acero de las vigas de cimentación, columnas, muros de contención y riostras de la parte de sótano para así poder avanzar con la fundida de las mismas.









Se continuo con la actividad de relleno de vigas de cimentación. Se procedió a seguir con la actividad para poder continuar con la programación estipulada.










Se inicio con las actividades de filtro perimetral donde se está instalando una tubería en la parte externa del muro de contención, instalando un geodren y una subbase granular la cual posterior se compacta para su debido proceso.



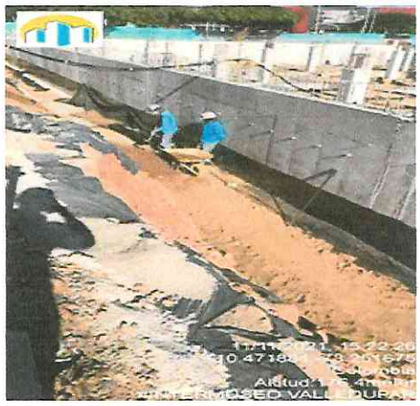





Se continuo con las actividades sobre las zapatas núcleos la cuales son los pilares principales de la estructura, se realizo el armado de acero de las diversas zapatas núcleos, con sus vigas de cimentación internas y dejando el acero de los muros

cortina que van en ellas. Se realizo la fundida de concreto de las mismas para avanzar con la obra.










Se continuo con la fundición de concreto de vigas de cimentación, columnas, muros de contención y viguetas.





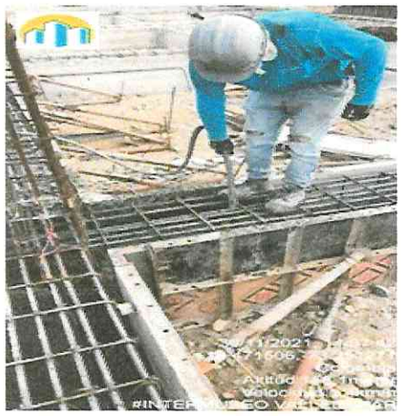



Con respecto a las medidas ambientales ejercidas por la supervisión se encuentran:

1. Conformación del grupo socio ambiental.
2. Capacitaciones al personal en obra.
3. Cumplimiento de los requisitos legales, normativas establecidas por Corpocesar.
4. Manejo de materiales de construcción.
5. Señalización de obras y sitios temporales.
6. Manejo y disposición final de RCD y lodos.
7. Manejo y disposición final de residuos convencionales y especiales.
8. Señalización y control de tráfico.
9. Manejo de aguas superficiales y subterráneas.
10. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.
11. Control de contaminación atmosférica y ruidos.
12. Manejo de cobertura vegetal.
13. Manejo de almacenes, campamentos y acopios temporales.





Para la verificación del cumplimiento del plan de SST – 19 y de seguridad y salud en el trabajo se implementan las siguientes medidas:


1. Se realizo entregas de EPP (elementos de protección personal).
2. Se realizaron los cronogramas de actividades.
3. Se realizaron inducciones al personal nuevo.
4. Se ejecutaron los protocolos de bioseguridad.
5. Se realizaron las inspecciones preoperacionales.
6. Se realizaron afiliaciones a ARL, AFP y EPS.
7. Programa de vigilancia.
8. Señalización y acceso viales.

Para el desarrollo del componente social del proyecto se cuenta con el equipo formado por los profesionales del área social del contratista de obra, interventoría y de la secretaria de infraestructura, el cual ha implementado las siguientes acciones:

1. Se realizo atención a la comunidad en temas pertinentes.
2. Se realizaron capacitaciones en obra.
3. Realización de volanteo al personal de obra.
4. Se realizo la recepción social a la veeduría especializada.
5. Se atendió a la veeduría de comerciantes y grupo COAC.
6. Se realizo la revisión de buzón de hojas de vida, buzón de sugerencias interno y externo.
7. Se realizo la mesa de trabajo con supervisión de la secretaria de infraestructura.
8. Se realizo mesa de trabajo con cámara de comercio para la programación de capacitaciones para los comerciantes del área de influencia del proyecto.





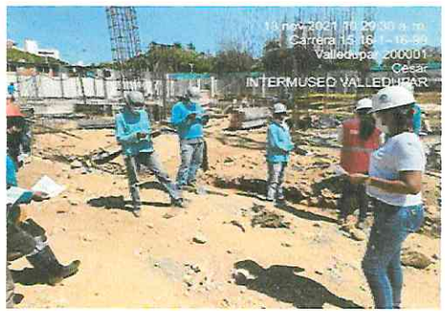



12. DIFICULTADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se ha encontrado dificultad en los siguientes aspectos:

- Se le ha solicitado al contratista el aumento de la mano de obra, ya que se ha evidenciado la disminución en el número de personas que ingresan a la obra-

13. ACTIVIDADES PARA REALIZAR PROXIMO PERIODO

Para el siguiente periodo de la construcción del centro de eventos histórico y cultural de la música vallenata se tiene programado continuar con las actividades de cimentación tantas vigas, viguetas, columnas, relleno interno y externo, entre otras actividades. Se tiene programado iniciar con las actividades de la losa de entrepiso su armado de acero e iniciar con la fundida del primer tramo de losa. Se procederá a iniciar con el proceso de enchaquetamiento de zapatas y columnas como se estipulo por el diseñador estructural de la obra.

14. CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, OBSERVACIONES E INFORMACION A REPORTAR A LA ENTIDAD

El proyecto se encuentra en ejecución normal.

El porcentaje de avance en este mes de ejecución es de un **10,52%**

Ejecutado en este periodo: **$ 14.599.689.967,99**

Saldo por ejecutar: **$ 124.217.978.981,01**

JORGE E. OLIVEROS GALINDO
Profesional Especializado

ANDRES ALMARALES MELO
Profesional Especializado

MARIA J. RAMOS NAVARRO
Componente ambiental

TATIANA SUAREZ
componente SST

SADINA SOTO BONILLA
Componente social
