MUNICIPIO DE NEIVA
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN 02

Nombre del Contratista: **LIBARDO CONDE LASSO** **Cedula: 4.884.664**	**VALOR INICIAL:** $353.386.558,75 **ADICIONAL No.1:** $ **VALOR TOTAL:** $ 353.386.558,75
Certificado de Disponibilidad No. 2106 , 2151 y 2795 de 2018 **Registro Presupuestal Nro. 3763 del 17/08/2018** **Forma de Pago:** acta(s) de recibo parcial. recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor.	**Periodo de Ejecución:** Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Objeto:
CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA

FECHA DEL ACTA DE INICIO:
FECHA DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO: Diecisiete (17) de Agosto de 2018
FECHA DE ACTA DE INICIO: Diez (10) De Septiembre de 2018
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1: Trece (13) de Septiembre de 2018
FECHA ACTA DE REINICIO 1 : Dos (2) de Octubre de 2018

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: Veintiocho (28) de Agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Veintisiete (27) de Noviembre de 2018
PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN: 335119
Registro Banco de Proyectos: 2016410010050

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En desarrollo del objeto contratado y revisado el segundo informe de actividades del período comprendido del 30 de octubre al 16 de Noviembre de 2018, el contratista Libardo Conde Lasso, desarrolló las actividades que se derivan del contrato de obra No. 1061 de 2018 del cual soy Supervisor y con el Apoyo Técnico y Administrativo del Ing. Jairo Rodríguez Bocanegra se presentan los siguientes avances de acuerdo a la obligaciones junto con las acciones y soportes correspondientes se desarrollaron las siguientes actividades:


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- Se han terminado las obras de los Barrios San Carlos, Villa Urbe y del Barrio Vicente Araújo.
- Obras ejecutadas en el Barrio Bonilla:

✓ Excavaciones para el ciclópeo, zapatas, y viga.
✓ Instalación de concreto ciclópeo.
✓ Construcción de zapatas y colocación de tubos estructurales de 3".
✓ Construcción viga de amarre.
✓ Se está dando inicio a la Instalación de vallas de protección al igual que se construye las columnetas, pega de ladrillo a la vista y alfajías.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS: OBRA TERMINADA

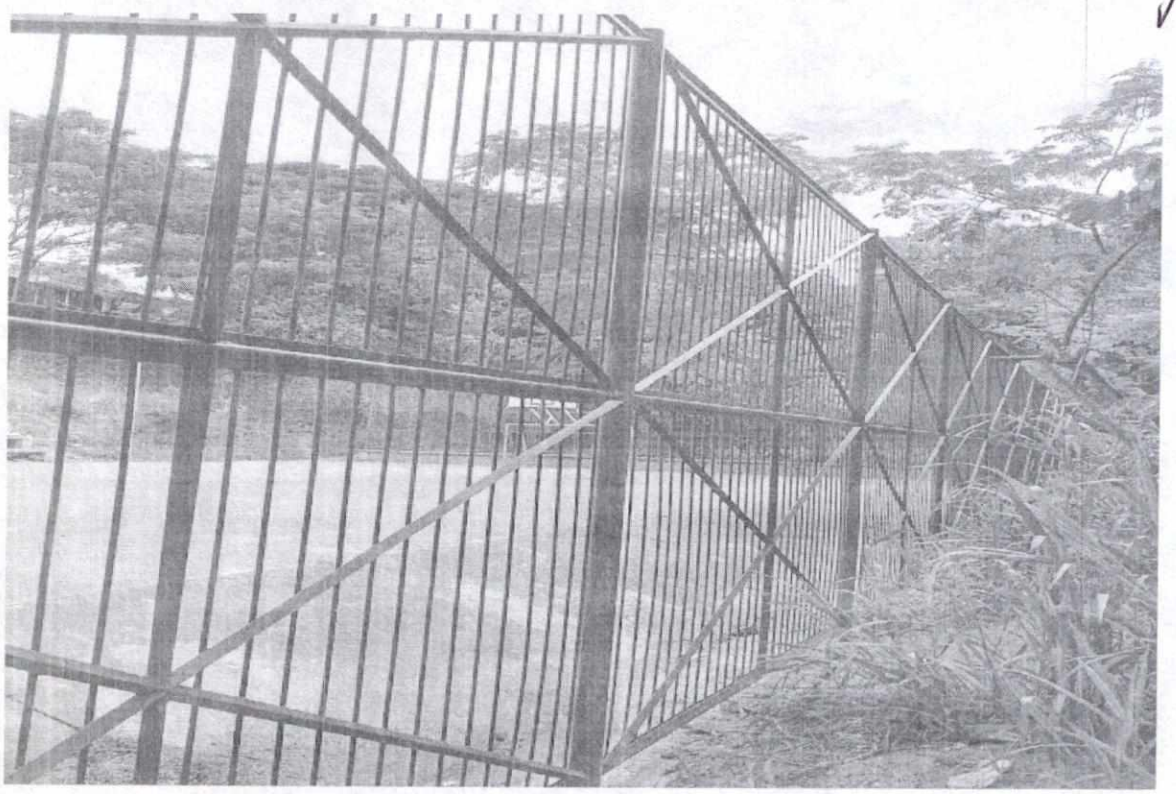


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VILLA URBEOBRA: OBRA TERMINADA

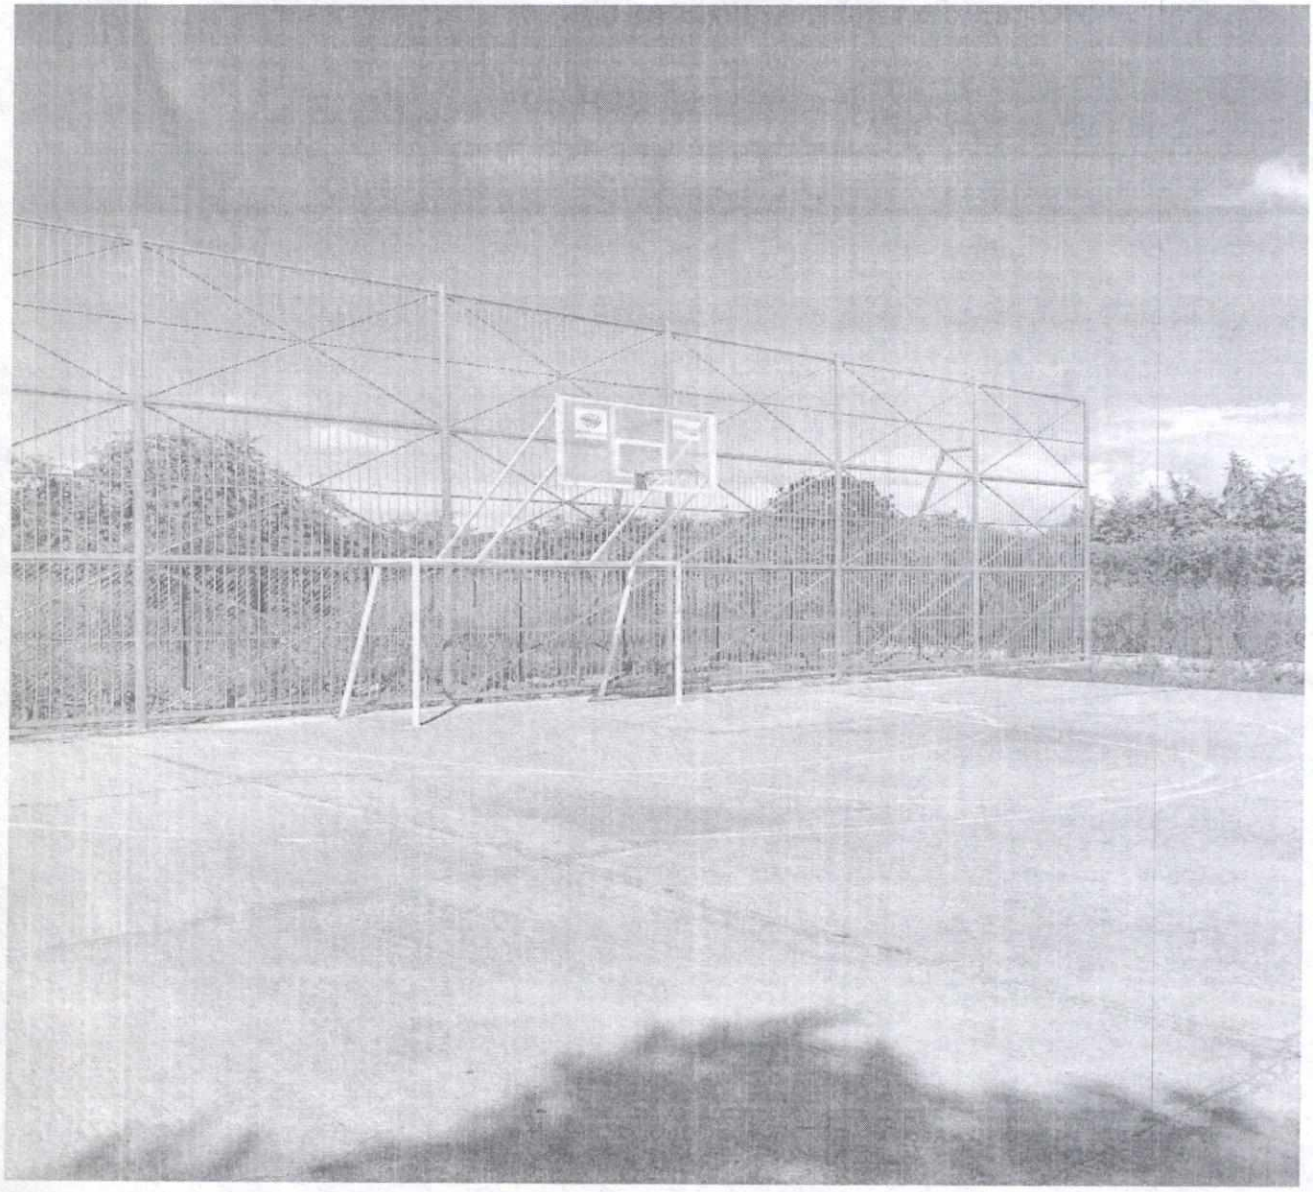

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VICENTE ARAÚJO: OBRA TERMINADA

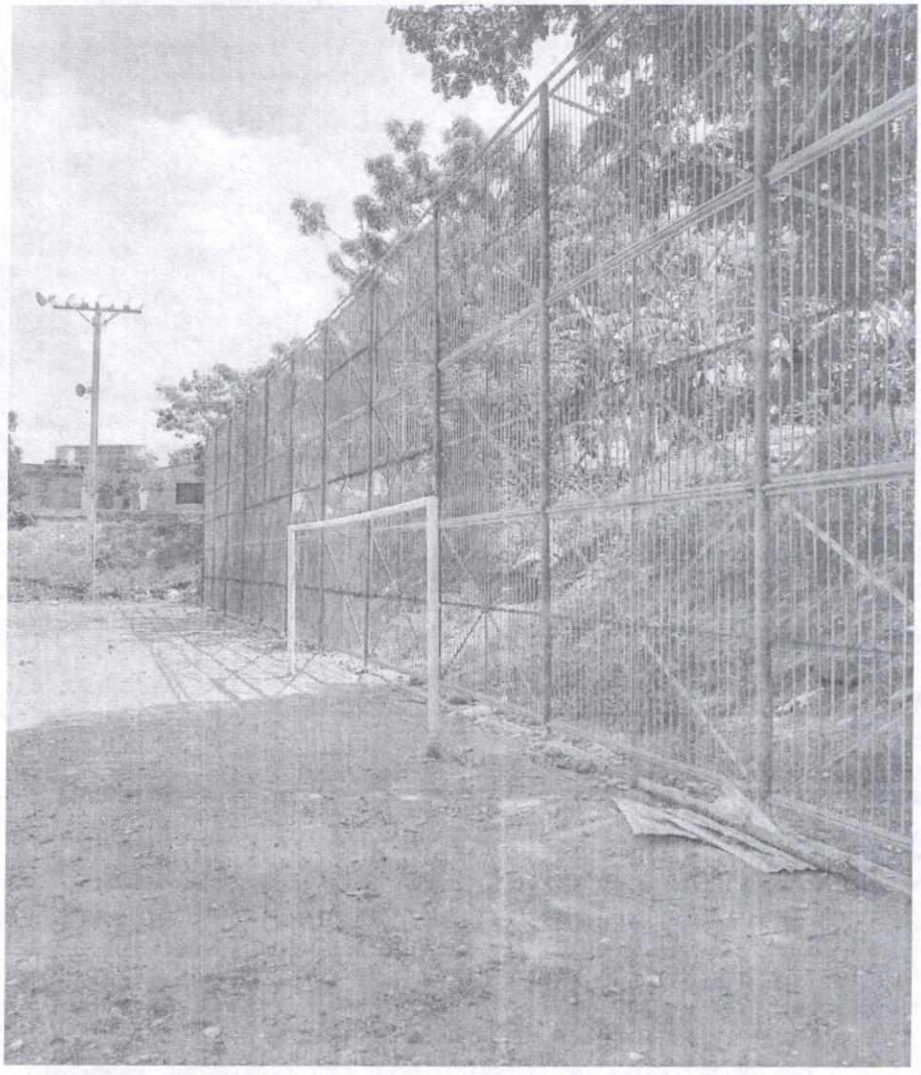

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
POLIDEPORTIVO BARRIO BONILLA, CONSTRUCCIÓN VALLA

Demolición de muros y Bases, construcción de zapatas, ciclópeo, columnetas, muros, alfajías y vallas de protección.











La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

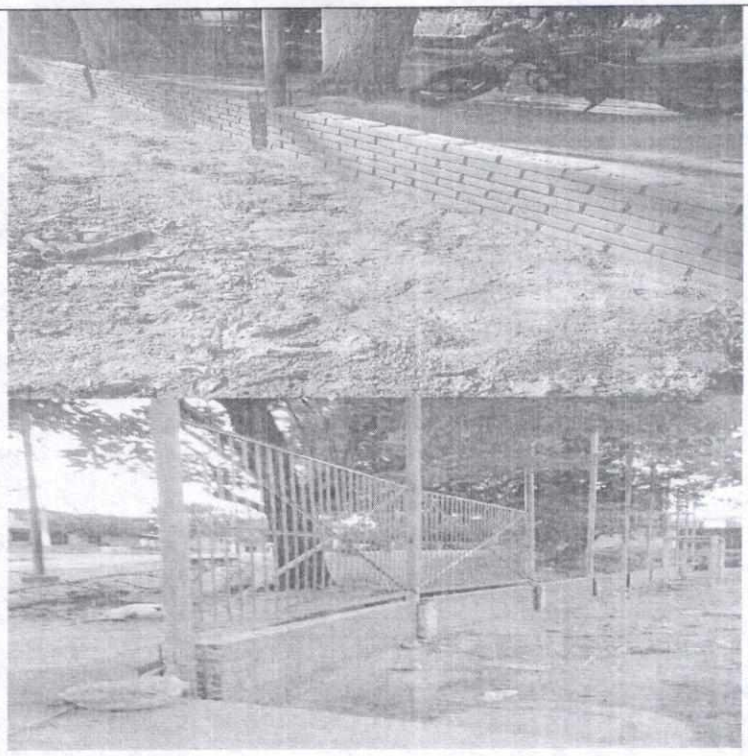

Construcción muro en ladrillo a la vista



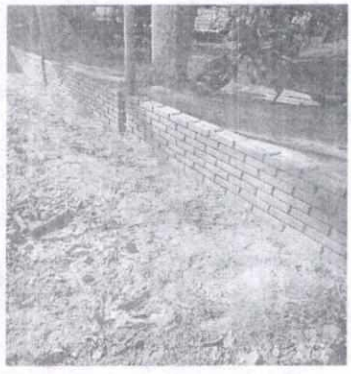

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACTAS		
TIPO DE ACTA	**No**	**FECHA**
ACTA DE INICIO	1	10 De Septiembre de 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	2	13 De Septiembre de 2018
ACTA DE REINICIO 1	3	2 de octubre de 2018
ACTA PARCIAL No. 1	4	30 de Octubre de 2018
ACTA PARCIAL No. 2	5	16 de Noviembre de 2018

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento de la cláusula Sexta**; FORMA DE PAGO, El** Municipio de Neiva se obliga a cancelar al contratista Libardo Conde Lasso las actividades desarrolladas del segundo informe del período comprendido del 30 de Octubre al 16 de Noviembre de 2018 y correspondiente al pago por valor de $138.731.388,75 con un avance acumulado del 89.07%.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de Egreso No. 319227	21/11/2018	$176.032.526,25	$176.032.526,25	$177.354.032,50
En trámite	En trámite	$138.731.388,75	$314.763.915,00	$ 38.622.643,75
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$353.386.558,75	$0	$353.386.558,75	$314.763.915,00	$ 38.622.643,75

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- ✓ En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS del contrato, se verifica que la Póliza de cumplimiento No 2953404 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual **N° 689616** fueron aprobadas el día 28 de Agosto de 2018 por la administración municipal.
- ✓ Cláusula **Décima Novena** - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contratación con Recibo **de Tesorería Municipal N° 2018902000002156.**

Publicación gaceta.....$0,oo
Estampilla Bienestar adulto mayor.....$7.068.000,oo
Estampilla Pro Deporte.....$5.306.000,oo
Estampilla Pro Usco.....$1.762.000,oo
Estampilla Procultura.....$1.767.000,oo
Contrato Adicional.....$0,oo
TOTAL PAGO.....$15.903.000,oo

- ✓ En cumplimiento de la **Cláusula Decima primera** - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de Noviembre de 2018 según planillas discriminadas así:

Planilla No. 8658002293- Octubre 2018 (Contratista)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Octubre /2018	$106.300
PENSIÓN	Octubre /2018	$136.000
RIESGOS PROFESIONALES	Octubre /2018	$4.500
	TOTAL	$246.800

Planilla No. Planilla No. 8657250811- Noviembre 2018 (Contratista)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$106.300
PENSIÓN	Noviembre /2018	$136.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$4.500
	TOTAL	$246.800

Planilla No. 8656654535 Noviembre 2018 (Director de obra)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$97.700
PENSIÓN	Noviembre /2018	$125.000

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$4.100
	TOTAL	$226.800

Planilla No. 13804158 - Noviembre 2018 (Residente de obra)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$97.700
PENSIÓN	Noviembre /2018	$125.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$4.100
	TOTAL	$226.800

Planilla No. 8486464132 - Noviembre 2018 (HSQ)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$31.300
PENSIÓN	Noviembre /2018	$125.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$54.400
	TOTAL	$210.700

Planilla No. 8656693661 - Noviembre 2018 (Trabajadores)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$125.200
PENSIÓN	Noviembre /2018	$500.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$76.400
	TOTAL	$701.600

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior la suscrita Supervisora y Apoyo Técnico Administrativo y Financiero a la Supervisión del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1061 de 2018** certifica que el contrato en mención se está ejecutando satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el período comprendido del 30 de Octubre al 16 de Noviembre de 2018 por lo que se recibe a satisfacción y se autoriza el pago del Acta Parcial No. 2 al contrato por valor de $**138.731.388,75.**

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2106 , 2151 y 2795 de 2018	**3763 del 17/08/2018**	0206, 0210, 0101	**$138.731.388,75**
Valor a Pagar.			**$138.731.388,75**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del Acta parcial No. 2 del Contrato No. 1061 de 2018.

Informe presentado en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2018.

Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA
Apoyo Técnico Administrativo
y Financiero a la Supervisión

Dra. LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ
Directora Deportes y recreación
Supervisora

Vo. Bo. Jorge Horacio Guzmán Hermida
Abogado Contratista SDR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
