

INFORME MENSUAL GENERAL 2021

OCTUBRE

UT SERCOMADI

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

REPORTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL OCTUBRE

Durante el mes de octubre de 2021, la gestión ambiental del proyecto se centró en la planeación y aseguramiento de proveedores y gestores ambientales para la etapa de perforación del Pozo ANH Pailitas 1-X, y actividades de control y seguimiento a las actividades de obra civil y movilización, Monitoreo de calidad de aire correspondiente a la etapa de movilización a través de dos estaciones en la vía Guamal-Astrea hasta el sitio denominado kilómetro 14 donde se encuentra ubicada la plataforma Pailitas 1-X.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Actividades de Gestión
Aseguramiento de Proveedores	Se realiza proceso contractual con la empresa Geoambiental para tratamiento y disposición de cortes de perforación	Se continua con la revisión de proveedores y gestores externos para la etapa de perforación		2
Seguimiento Monitoreos	Se realiza monitoreo de calidad del aire para etapa de movilización en dos (2) estaciones sobre la vía de acceso con el laboratorio MCS	Se realiza programación de los monitoreos de agua previo a perforación para el 5 de noviembre con el laboratorio MCS	Se realiza programación de monitoreo de calidad del aire para perforación y ruido	3
Seguimiento Fichas de manejo	Se revisa estado de operatividad de barreras sedimentadoras construidas para controlar el aporte de sedimentos de la locación y se realiza mantenimiento de las mismas	Conformación y terraceo acopio de material de descapote y excavación conforme a Programa de manejo de las actividades constructivas	Adecuación de cunetas perimetrales e internas y perimetrales para el manejo de aguas (actividad de obra civil)	3
Seguimiento a la gestión de Proveedores y Gestores Ambientales	Se realiza el mantenimiento de Unidades Sanitarias Portátiles y a la recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos por parte del gestor autorizado Geoaseo SAS ESP.	Se cuenta con los manifiestos de transporte de las cantidades gestionadas de residuos sólidos y líquidos por el gestor autorizado Geoaseo SAS ESP, así como el respectivo certificado de disposición		2

BALANCES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO

A continuación, se referencia el cumplimiento a la gestión ambiental de las fichas de manejo ambiental establecidas en el PGA conforme al avance de las etapas del Proyecto

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CUMPLIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES)			
PROGRAMA / SUBPROGRAMA	**FICHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN**	**PROCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Programa de manejo de las actividades constructivas	PGA-1 Movilización de Vehículos, Maquinaria y Equipos Pesados	Se realiza la inspección de vehículosy maquinarias previo al inicio de labores para revisar el estado técnico-mecánico	**100%**
		Inducción y capacitación a los conductores y operadores que entran a trabajar en manejo adecuado de vehículos, maquinaria y manejo defensivo	**100%**
	PGA-2 Adecuación del Sitio de Perforación	Los materiales sobrantes de las actividades de descapote y excavación, se acopian temporalmente en un lugar definido	**100%**
		Las áreas en donde se acopiaron los suelos orgánicos y suelos inertes de manera diferenciada y estan aislados de actividad que pueda disgregar o dispersar	**100%**
		El material excavado y acopiado se ubicó en sitios lejanos a corrientes superficiales o donde pueda interferir con algún drenaje natural	**100%**
ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO)			
PROGRAMA / SUBPROGRAMA	**FICHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN**	**PROCENTAJE DE EJECUCIÓN OBRA**
Programa de manejo del suelo	PGA-3 Remoción de la Cobertura Vegetal y el Descapote	El descapote se acopió, evitando su mezcla con suelos estériles u otros elementos contaminantes.	**100%**
		La profundidad del descapote se hizo de acuerdo al espesor de la capa orgánica del suelo veinte (20) centímetros	**100%**
		Para evitar el desplome del material removido y arrestre de sedimentos, se innstalaron barreras o trinchos de contención, los cuales se les realiza mantenimiento periodico	**100%**
	PGA-5 Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	El almacenamiento de combustibles y aceites usados se hace de manera confinada en dique e impermeabilizado para evitar la contaminación del suelo	**100%**
		Los aceites y/o lubricantes estan almacenados bajo cubierta en recipientes adecuados y etiquetados	**100%**
	PGA-6 Residuos Sólidos Domésticos, Industriales y Especiales	Se almacenan y segregan los residuos temporalmente conforme al código de colores establecido	**100%**
		Se realiza la recolección, transporte y disposición final de residuos a través de gestor ambiental externo autorizado Geoaseo SAS ESP	**100%**
	PGA-7 Residuos Líquidos Domésticos e Industriales	Se cuenta con la instalación de unidades sanitarias portátiles alquiladas a compañía que cuenten con los respectivos permisos ambientales Geoaseo SAS ESP	**100%**
		La empresa que suministra el servicio realiza periódicamente acciones de mantenimiento a las unidades sanitarias portátiles para garantizar su adecuado funcionamiento	**100%**

BALANCE GENERAL AMBIENTAL

A continuación, se presenta el balance de la gestión ambiental del mes de octubre de 2021:

Residuos sólidos y líquidos: Durante el mes se realizaron cinco (5) mantenimientos a las 2 unidades sanitarias portátiles instalados en la plataforma de los cuales se generó un total de 246,17 Litros transportados y dispuestos por el gestor externo autorizado Geoaseo E.S.P., de igual manera se realizó el manejo y disposición de residuos sólidos para un total de 244,4 kilogramos como se discrimina a continuación:

Fecha	Tipo	Kilogramos
02-oct-21	aprovechables	3,3
02-oct-21	contaminados	187,3
02-oct-21	no aprovechables	20,8
06-oct-21	contaminados	12
06-oct-21	aprovechables	4
06-oct-21	no aprovechables	6
30-oct-21	no aprovechables	11

Se realizó la compra de material de cantera de 1.523 m3 de la cantera El Botillero autorizada para la conformación de la plataforma, implementando las medidas de manejo ambiental para el transporte establecidas en la Ficha de Manejo del PGA.

Se realizaron ocho (8) inducciones ambientales específicas del proyecto a personal nuevo para un total de 22 personas en el mes y tres (3) charlas ambientales de sensibilización al personal (65 personas) sobre el cumplimiento de las medidas de manejo del PGA.

Durante el mes se realizó la implementación de las medidas de manejo ambiental del PGA aplicable para las obras civiles y movilización (PGA-1, PGA-2, PGA-5, PGA-6, PGA-7, PGA-14).

Se participó en las reuniones gerenciales y operativas convocadas durante el mes.

El día 2 de octubre se realizó el inicio del monitoreo de calidad del aire para la etapa de movilización en dos (2) estaciones sobre la vía de acceso Guamal-Astrea, el cual fue suspendido el día 12 de octubre y reiniciado el 27 de octubre por parte del laboratorio MCS.

Se realizó la programación y revisión de proveedores y gestores externos para la etapa de perforación, entre los cuales se definió Geoambiental como gestor externo para el tratamiento y la disposición final de los cortes de perforación, agua residual industrial y dewatering.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presenta un registro fotográfico que evidencia la gestión ambiental adelantada durante el mes de octubre de 2021



Mantenimiento barreras sedimentadoras Plataforma Pailitas 1-X



Monitoreo de calidad de aire etapa de movilización



Recolección de residuos sólidos y líquidos con Gestor Externo Autorizado Geoaso, mantenimiento de baños portátiles



Mantenimiento unidades portátiles sanitarias

.



Conformación y terraceo material de descapote y excavación



Material de Cantera El Botillero



Inducciones ambientales a personal que ingresa al proyecto



Charlas ambientales de sensibilización a personal del proyecto

REPORTE GESTION ADMINISTRATIVA OCTUBRE

En resumen, se realizaron las siguientes actividades durante el mes de octubre:

- Reporte diario.
- Reporte de nómina.
- Se recibe, audita y envía virtualmente cuentas de cobros.
- Se cita al personal operativo de obra civil para que firme sus terminaciones de contratos y exámenes de egreso.
- Organización y logística para la reunión del día 15 de octubre, motivo dialogo para el levantamiento del bloqueo. Esta reunión se realiza en el Centro de Integración Ciudadana con el acompañamiento de la iglesia, inspectora de trabajo, representante cámara de comercio, represéntate legal y recurso humano de UT Sercomadi, Gerente y social de Enterritorio, interventoría, policía municipal, presidente del área de influencia, alcalde, personero, comunidad, etc.
- Participación y logística mesa de trabajo tema bienes y servicio y laboral.
- Atención al personal operativo despajar dudas sobre su situación laboral, se citan para que firmen el bono que se les da por los días de suspensión laboral.
- Visita a la cantera y se dialoga con el proveedor para continuar con los servicios.
- Participación y logística mesa de trabajo tema bienes y servicio y laboral.
- Reactivación de las labores del personal operaciones civiles.
- Contratación personal perforación (Supervisor HSEQ y Operaciones, cuñero, aceitero, aparejador, soldado, ayudante de soldador, campamentero y ayudante campamento).
- Logística y realización actividad para los niños de la zona de influencia (km 14, San juan de Dios, los andes y Sabana de Marañón) por el día del niño.
- Compras locales.
- Se envía documentación por correo certificado a la base de Zipaquirá.
- Se realiza reintegros y se envía los soportes a la base.
- Solicitud de dinero.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA















REPORTE DE LA GESTIÓN HSEQ

Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades.


HSEQ

Se realizan Charlas de HSEQ.

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES			
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**CANTIDAD**
1	Atención manejo y prevención de accidentes Ofídicos	1/10/2021	29
2	Reportar todo accidente, incidente o cuasi accidente.	1/10/2021	29
3	Tipo y uso de extintores	2/10/2021	26
4	Izaje de cargas, cuidado de atrapamiento de manos y pies	3/10/2021	16
5	Funciones de las Brigadas de Emergencia.	4/10/2021	29
6	Brigadas de Evacuación y Rescate Brigada de Primeros Auxilios Brigada de Contra Incendios Brigada Ambiental.	6/10/2021	29
7	Higiene postural en actividades cotidianas	12/10/2021	7
8	Trabajo en equipo	13/10/2021	7
9	Uso adecuado del casco de seguridad	14/10/2021	7
10	Huella Hídrica	15/10/2021	5
11	Cultura Vial, compromiso de todos	16/10/2021	3
12	Dengue sintomatología	17/10/2021	5
13	Metodología de las 5S	18/10/2021	3
14	Bienestar emocional	19/10/2021	4
15	Efectos del tabaco en la salud	20/10/2021	5
16	Selección de Protección Visual	21/10/2021	5
17	Generalidades del SIG	22/10/2021	4
18	Uso de Extintores	23/10/2021	4
19	Charla Virtual las 5 C del trabajo en equipo	24/10/2021	
20	Reinducción al personal	25/10/2021	7
21	Charla Virtual - La Unión Hace la fuerza	25/10/2021	12
22	Charla de Seguridad, Salud en el Trabajo conductores de Volquetas, Uso de EPP, Velocidad al ingreso de Plataforma.	26/10/2021	4

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES			
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**CANTIDAD**
23	Divulgación de AR Construcción de cunetas de Agua, Divulgación de AR Construcción de Cunetas de Aguas Aceitosas. Retroalimentación de actividades Criticas Peligros, Riesgos y Controles.	26/10/2021	19
24	Políticas de HSEQ UT Sercomadi, Velocidad permitida al conducir, Atención temas Sociales mesa de Concertación	27/10/2021	3
25	Agotamiento por calor	27/10/2021	28
26	Seguridad Vial - Peligros en Movilización de equipos	28/10/2021	4
27	Políticas de Convivencia y respeto en el lugar de trabajo, Operaciones Simultaneas.	28/10/2021	31
28	Inducción y Reinducción al personal	28/10/2021	8
29	Inducción especifica del Proyecto.	28/10/2021	7
30	Inducción especifica del Proyecto.	29/10/2021	2
31	Riesgo eléctrico	29/10/2021	2
32	Parada de Seguridad - Atención por daño eléctrico	29/10/2021	25
33	Identificación de Riesgos de las actividades a realizar, Izaje de cargas, movimiento de material, Mixer.	29/10/2021	23
34	Línea de Peligro	30/10/2021	7
35	Actividades simultaneas, Peligros - Riesgos y Controles durante las actividades, Uso adecuado de los baños Portátiles.	30/10/2021	41
36	Responsabilidad ambiental	31/10/2021	6
37	Parada de Seguridad - Movilización de Equipos y Materiales	31/10/2021	27
38	Prevención de Covid - Uso apropiado de EPP - Atención actividades simultaneas, Izaje de Cargas, Ingreso de Equipos, Labores de Obras Civiles.	31/10/2021	27

Grafica de Relación de Charlas e Inducciones del mes de octubre.

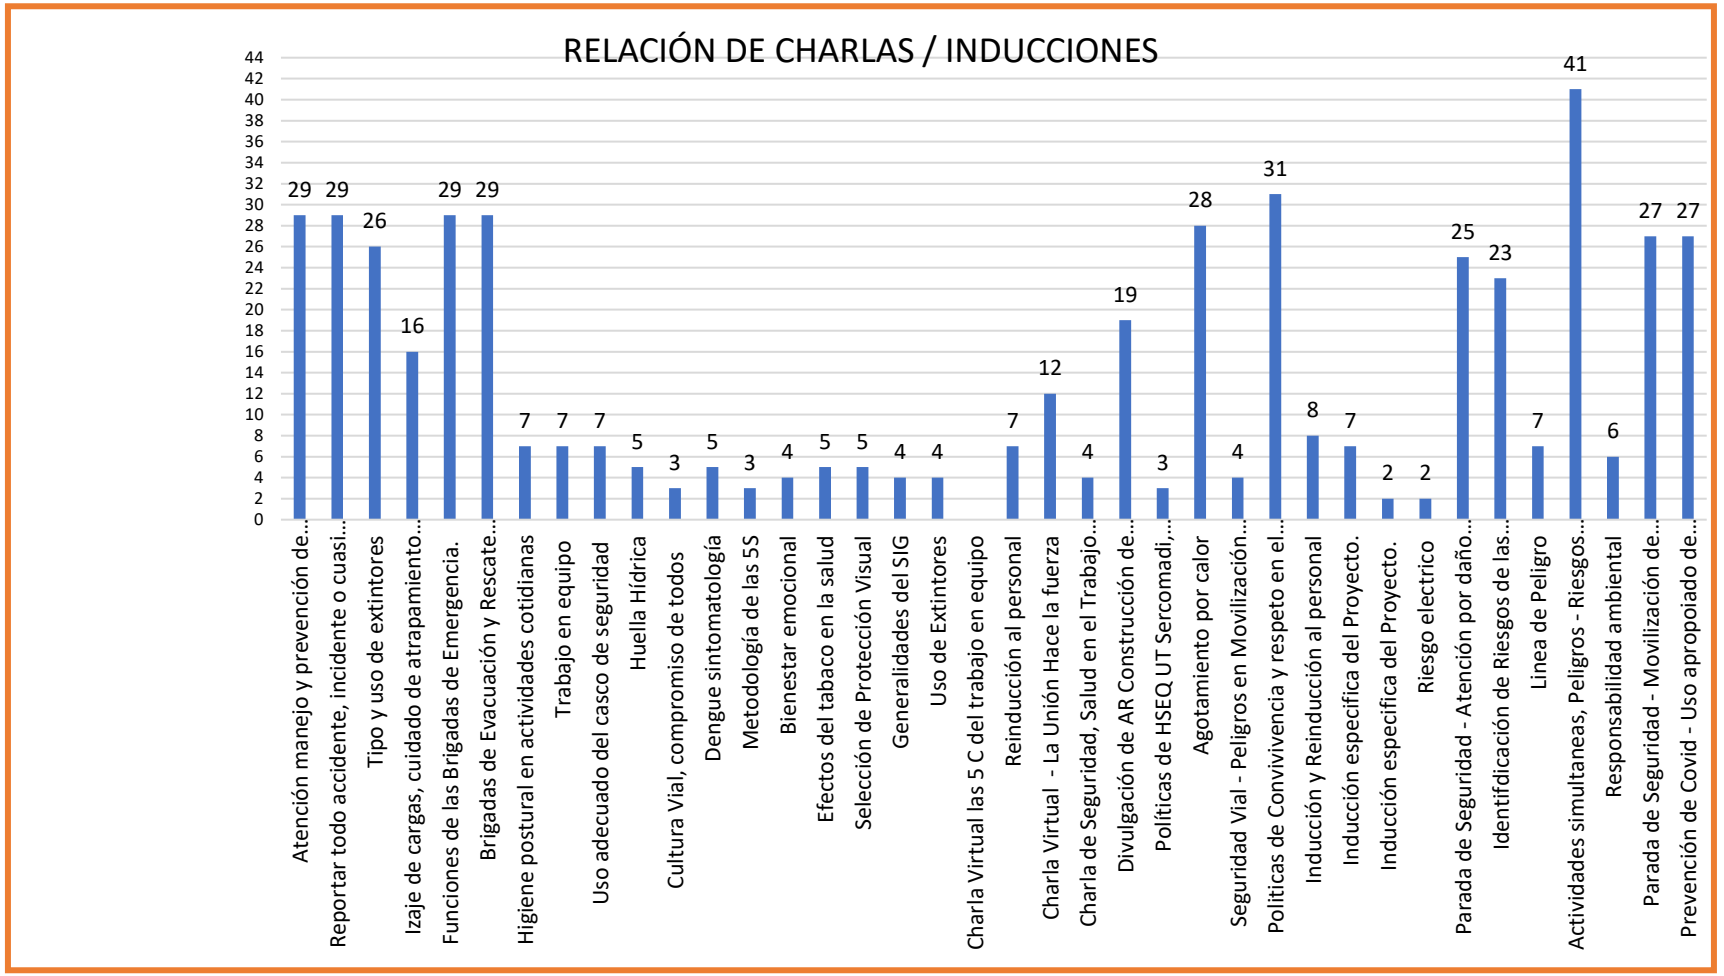

Inspecciones y Preoperacionales.

Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes Inspecciones y preoperacionales contando con el apoyo y acompañamiento de la Interventoría. Inspección para Camioneta, Motoniveladora, Volquetas, Bulldozer. Retroexcavadora e Inspección a Tracto Camión.

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
1	CAMIONETA	TOYOTA	MARIO SANCHEZ	27/09/2021 - 03/10/2021
2	CAMIONETA	TOYOTA	YUSETH RANGEL	27/09/2021 - 03/10/2021
3	RETROEXCAVADORA	ZAXI	LORENZO BAZA	27/09/2021 - 03/10/2021
4	RETROEXCAVADORA	KOMATZU	HENRY LUIS ORJUELA	27/09/2021 - 03/10/2021
5	RETROEXCAVADORA		PEDRO ORTÍZ	27/09/2021 - 03/10/2021
6	RETROEXCAVADORA / PAJARITA		HENRY LUIS ORJUELA	27/09/2021 - 03/10/2021
7	VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL-RAND	HAIDER RAMOS	27/09/2021 - 03/10/2021
8	VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL-RAND	JAIRO MARTINEZ	27/09/2021 - 03/10/2021
9	BULDOZER	KOMATSU	LUIS EDUARDO BUITRAGO	27/09/2021 - 03/10/2021
10	BULDOZER			27/09/2021 - 03/10/2021
11	BULDOZER			27/09/2021 - 03/10/2021
12	MOTONIVELADORA	CATERPILA	RAFAEL VILLEGAS	27/09/2021 - 03/10/2021
13	MOTONIVELADORA	CATERPILA	LIBARDO RANGEL	27/09/2021 - 03/10/2021
14	CARRO TANQUE	XVD 453	X	27/09/2021 - 03/10/2021

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
15	TRACTOMULA	SWN 732	OMAR FLOREZ	04/10/2021 - 10/10/2021
16	TRACTOMULA	SJQ 605	OSCAR LOPEZ	04/10/2021 - 10/10/2021
17	TRACTOMULA	SJQ 609	OSCAR LOPEZ	04/10/2021 - 10/10/2021
18	TRACTOMULA	VDZ 195	RODRIGO BELTRAN	04/10/2021 - 10/10/2021
19	TRACTOMULA	SVT 159	YOHN JIMENEZ	04/10/2021 - 10/10/2021
20	TRACTOMULA	WLW 811	JAIRO ERAZO	04/10/2021 - 10/10/2021
21	TRACTOMULA	WFL 525	JAIRO TORRES	04/10/2021 - 10/10/2021
22	TRACTOMULA	ZGC 725	MICHELL CARRILLO	04/10/2021 - 10/10/2021
23	MOTONIVELADORA	CATERPILA	RAFAEL VILLEGAS	04/10/2021 - 10/10/2021
24	MOTONIVELADORA	CATERPILA	LIBARDO RANGEL	04/10/2021 - 10/10/2021
25	CAMIONETA	TOYOTA	YUSETH RANGEL	04/10/2021 - 10/10/2021
26	CAMIONETA	TOYOTA	MARIO SANCHEZ	04/10/2021 - 10/10/2021
27	VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL-RAND	HAIDER RAMOS	04/10/2021 - 10/10/2021
28	BULDOZER	KOMATSU	LUIS EDUARDO BUITRAGO	04/10/2021 - 10/10/2021
29	BULDOZER	INGERSOLL-RAND	REYNALDO MONTOYA	04/10/2021 - 10/10/2021
30	RETROEXCAVADORA / PAJARITA	KOMATZU	HENRY CARO	04/10/2021 - 10/10/2021
31	VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL-RAND	JAIRO MARTINEZ	04/10/2021 - 10/10/2021
32	RETROEXCAVADORA	HITACHI	PEDRO ORTÍZ	04/10/2021 - 10/10/2021
33	RETROEXCAVADORA	ZAXI	LORENZO BAZA	04/10/2021 - 10/10/2021
34	RETROEXCAVADORA	KOMATZU	HENRY LUIS ORJUELA	04/10/2021 - 10/10/2021

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
35	RETROEXCAVADORA	HITACHI	PEDRO ORTÍZ	25/10/2021 - 31/10/2021
36	RETROEXCAVADORA	ZAXI	LORENZO BAZA	25/10/2021 - 31/10/2021
37	BULDOZER	INGERSOLL-RAND	REYNALDO MONTOYA	25/10/2021 - 31/10/2021
38	MOTONIVELADORA	CATERPILA	RAFAEL VILLEGAS	25/10/2021 - 31/10/2021
39	CAMIONETA	TOYOTA	MARIO SANCHEZ	25/10/2021 - 31/10/2021
40	CAMIONETA	HINO-JBG	ALDAIR OSPINO	25/10/2021 - 31/10/2021
41	TRACTO CAMION	FREIGHTLINER	OSCAR LOPEZ	25/10/2021 - 31/10/2021
42	TRACTO CAMION	FREIGHTLINER	MICHAEL CARRILLO	25/10/2021 - 31/10/2021
43	TRACTO CAMION	MACK	JAIRO TORRES	25/10/2021 - 31/10/2021
44	TRACTO CAMION	CHEVROLET BRIGADIER	JAIRO OSORIO	25/10/2021 - 31/10/2021
45	RETROEXCAVADORA / PAJARITA	KOMATZU	HENRY CARO	25/10/2021 - 31/10/2021
46	TRACTO CAMION	ZGC 725	MICHAEL CARRILLO	25/10/2021 - 31/10/2021
47	TRACTO CAMION	SWN 732	OMAR FLOREZ	25/10/2021 - 31/10/2021
48	TRACTO CAMION	WFL 525	JAIRO TORRES	25/10/2021 - 31/10/2021
49	TRACTO CAMION	MCC 915	JAIRO OSORIO	25/10/2021 - 31/10/2021
50	TRACTO CAMION	SJO 605	OSCAR LOPEZ	25/10/2021 - 31/10/2021
51	TRACTO CAMION	GYL 052	WILLIAM ACOSTA	25/10/2021 - 31/10/2021
52	TRACTO CAMION	IRG 285	WILSON CARRILLO	25/10/2021 - 31/10/2021
53	TRACTO CAMION	THQ 814	CARLOS VANEGAS	25/10/2021 - 31/10/2021

Tabla: Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de octubre.

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE MES DE OCTUBRE																															
ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CANT
TOTAL PERSONAL PROYECTO	47	60	30	55	51	60	53	21	14	10	17	13	13	15	13	13	11	10	12	11	16	14	13	14	21	35	42	48	51	55	47	885
H/H DE EXPOSICIÓN	376	480	240	440	408	480	424	168	112	80	136	104	104	120	104	104	88	80	96	88	128	112	104	112	168	280	336	384	408	440	376	7080
H/H DE EXPOSICIÓN SIN LTI	376	480	240	440	408	480	424	168	112	80	136	104	104	120	104	104	88	80	96	88	128	112	104	112	168	280	336	384	408	440	376	7080
KM. RECORRIDOS	679	402	150	283	467	638	400	90	424	200	60	159	154	582	114	62	681	30	97	100	134	138	636	730	87	350	325	250	290	267	269	9248
ANÁLISIS DE RIESGO	8	8	3	3	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	7	7	7	7	7	80

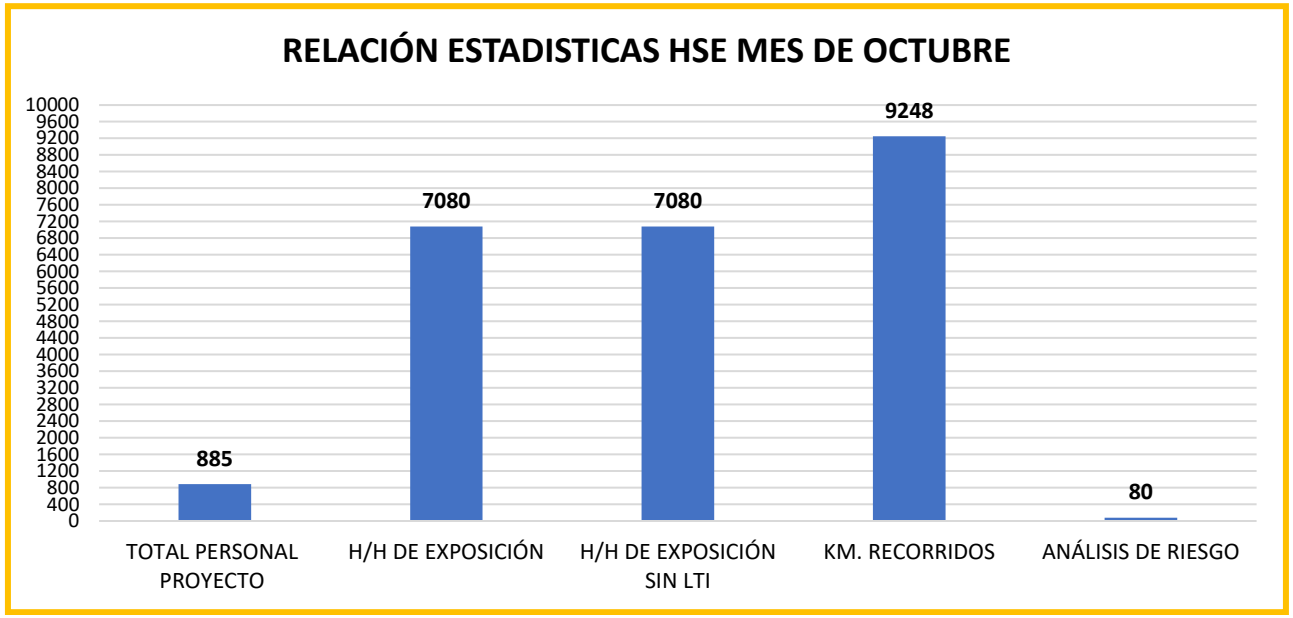


Tabla: Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de octubre.

DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF	PERSONAL CALIFICADO	PERSONAL NO CALIFICADO	VEHÍCULOS	ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTA
	Mes	Mes	Mes	Mes		Mes
Director del Proyecto	1	0	0	0	Conductores	1
Ingeniero de Operaciones	2	0	0	1	Estudio Ambiental	1
Gestión Ambiental (Campo)	2	1	0	1	Obras Civiles	1
Gestión Social (Campo)	3	0	0	0	Perforación	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	2	0	0	1	Vigilancia	0
Interventoría	4	0	1	1	Casino	0
Conductores	0	5	0	0	Otros	0
Obras Civiles	1	13	18	1	Otros	0
Perforación	0	10	0	0	Otros	0
Administrativos	1	1	0	0	Otros	0
Médico	2	0	0	0	Otros	0
Visitas / Otros (Campo)	3	0	0	0	Otros	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	48	30	18	4	TOTAL	3
TOTAL	52	30	19	5	TOTAL, PERSONAL PROYECTO	104

Grafica Estadística HS mes de octubre.


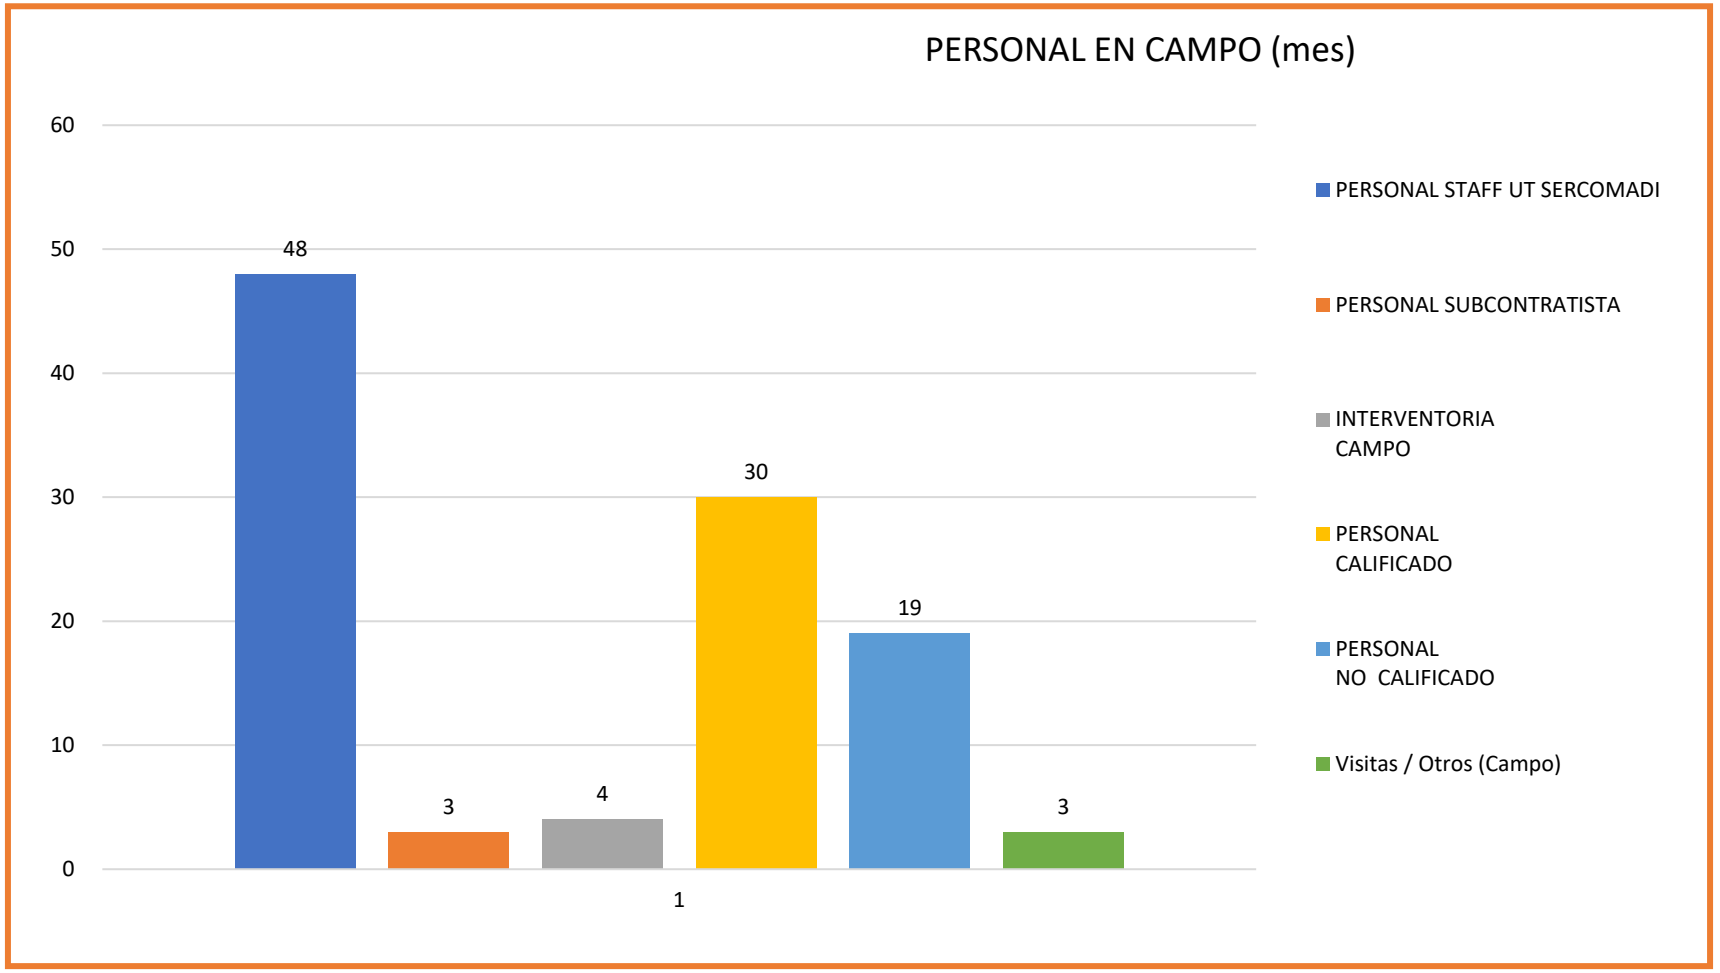


Tabla de Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de octubre.

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE MES DE OCTUBRE																																
ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CANT
CHARLAS HSE	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	32
BRIEFING HSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUCCIÓN GENERAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
INDUCCIÓN ESPECIFICA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	6
INSPECCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	4	0	6	7	32
REUNIONES Operativa (UT-INT)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
REUNIONES Gerencial (UT-ENT-INT)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
PERMISOS TRABAJO	8	8	3	3	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	7	7	7	7	7	80

Grafica de estadística HS mes de octubre.

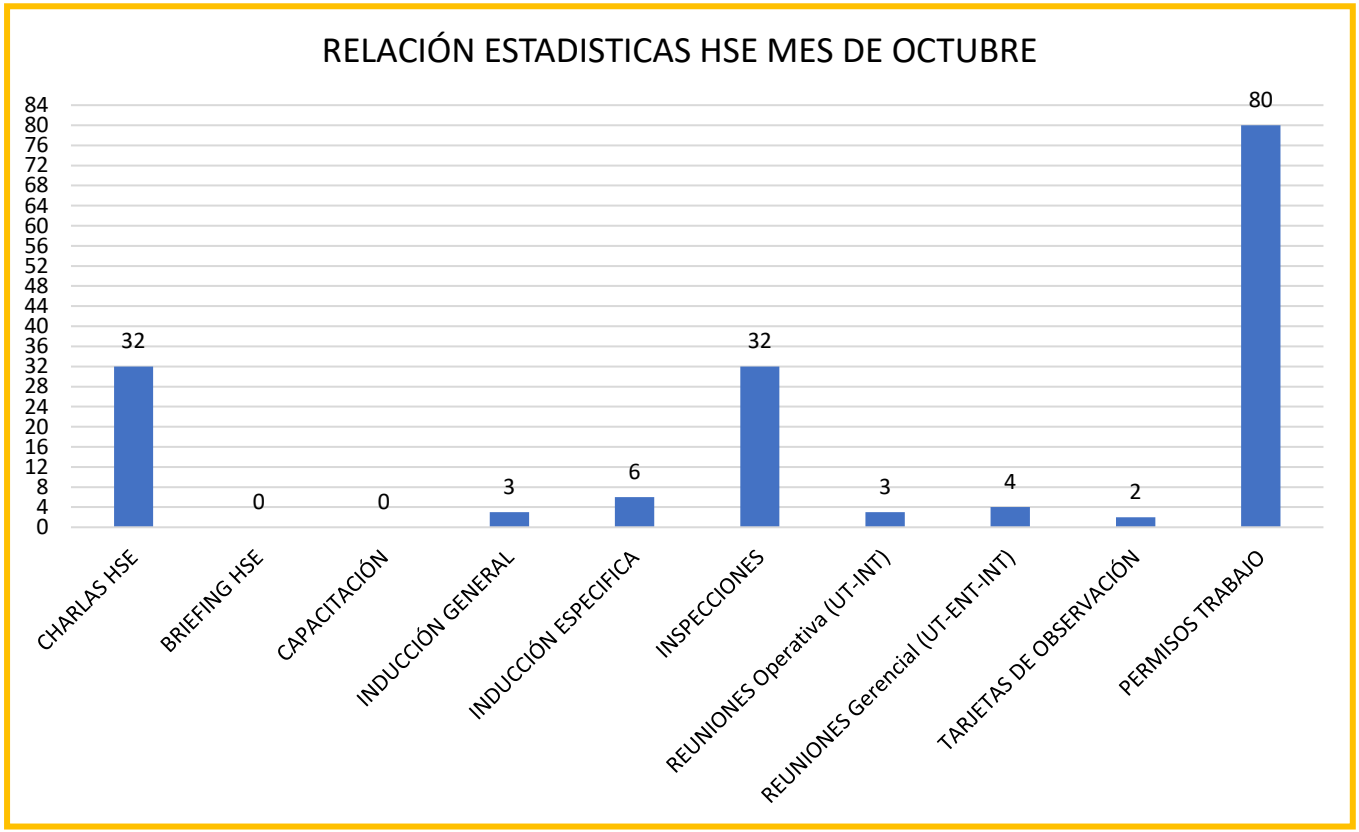

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

Se realizaron las siguientes actividades:

Medico:

- Actividad de valoración médica a todo el personal en cuanto a prevención de Pandemia COVID 19
- Recomienda el uso apropiado de los EPP (Tapabocas, uso de elementos personales) referentes a prevención de Covid 19.
- Se realiza el Auto reporte de Condiciones de salud. Realiza un sondeo del estado de ánimo y salud del personal para identificar anomalías antes de iniciar labores.
- Se realiza apoyo al personal con hidratación y prevención de Golpe de calor.

Seguridad y salud en el trabajo:

- Se realizaron Charlas de Cinco minutos a todo el personal, con el propósito de generar conciencia en el autocuidado, se inculcaron normas de cuidado de cada uno de los miembros del cuerpo, antes del inicio de cada una de las labores se verificaban los Peligros, los Riesgos y sus respectivos controles. Durante el mes de octubre se desarrollaron 32 charlas de Seguridad, Se realizaron 3 Inducciones Generales y 6 Inducciones Específicas para cada uno de los cargos a cumplir. Se participo de 4 reuniones Operativas con Interventoría y UT Sercomadi. Se participo de 4 reuniones con EnTerritotio e Interventoría. Con el Propósito de identificar el estado de cada equipo se realizaron 32 Inspecciones a maquinaria y equipos.

- Se realizaron charlas a todo el personal.

- Atención, Manejo y Prevención de Accidentes Ofídicos, Reportar todo accidente, incidente o casi accidente. Recomendaciones al personal en cada una de sus respectivas labores, Personal Operador de Maquinaria y Obreros.

- Uso de extintor y tipos. Izaje de cargas cuidado de atrapamiento de manos y pies.

- Brigadas de Emergencia y contingencia. Funciones de las Brigadas de emergencia.

- Apoyo y Seguimiento a las actividades de movilización de cargas.

- Divulgación de AR Construcción de cunetas para manejo de aguas Lluvias, Divulgación de AR Construcción de Cunetas para aguas aceitosas, AR Repaleo de material de Descapote, AR Mantenimiento de vía Pública, AR Adecuación de Plataforma.

- Charla al personal Agotamiento por Calor. Velocidades permitidas de conducción, Atención temas SOCIAL mesa de concertación.

- Políticas de Convivencia y Respeto en el lugar de trabajo, Atención Operaciones Simultaneas. Para Movilización Tema Seguridad vial.

- Parada de seguridad, se realiza un Análisis de Causa Raíz. Realizamos charla de seguridad con el grupo de arme y desarme del equipo, Énfasis en la identificación de riesgos de la actividad, donde se hace referencia a nada de correr, no hay nada tan importante como para poner en riesgo su seguridad, la del medio ambiente o la integridad de los equipos.

- Actividades Simultaneas Peligros, Riesgos y Controles durante cada una de las actividades. Línea de Peligro. Se realiza énfasis a todo el personal en la importancia de estar pendiente de lo que se está realizando.

- Parada de Seguridad por movilización de equipos y maquinaria, Cuidado y protección de las actividades simultaneas yo me cuido y tú te cuidas. Prevención COVID 19, Uso apropiado de EPP Y Conciencia Ambiental.

SEGUIMIENTOS

- Seguimiento a las actividades de movimiento de material y acopio temporal de descapote, con dos Operadores de Retroexcavadora y dos Buldócer. Repaleo de material de descapote, excavación para construcción de canales perimetrales para aguas lluvias.

- Actividad de excavación manual para construcción de cunetas de manejo de aguas aceitosas, y fundición de placa taladro, apoyo con mixer y manual con Trompo.

- Apoyo con personal auxiliar vial, en la actividad de mantenimiento de vía, acopio de material subbase, extendido con motoniveladora y compactado con Vibro, sobre el kilómetro 12.

- Apoyo con personal auxiliar vial al ingreso de plataforma, acopio de material subbase y su respectivo extendido con motoniveladora.

- Se realiza Análisis de Riesgo para las actividades a realizar Movilización de Maquinaria y Equipos, así como el Análisis de Riesgo para el SIMOPS, a la espera de aprobación por parte de la Interventoría HS.

- Se realizo inducción General y específica a personal Auxiliar de señalización vial a ingresar para las actividades de movilización de equipos

- Apoyo en la ejecución de la actividad instalación de tubería para manejo de aguas lluvias y darle una mayor transitabilidad a las volquetas y a vehículos de carga que posteriormente ingresaran a la plataforma

- Apoyo en la actividad de excavación de canales, fundido en concreto de losa de los cárcamos para el manejo de aguas y aceitosas en la plataforma.

- Actividad de excavación con pajarita en las canales perimetrales para manejo de aguas lluvias, se realiza apoyo en atención y cuidado a la ejecución de las actividades.

- Se realiza apoyo en la reunión con el personal obrero realizando directrices de Bioseguridad, entrega de tapabocas y adición de alcohol.

- Se realizo apoyo, acompañamiento y seguimiento con 4 auxiliares viales, 2 escoltas, 1 perdiguero en la movilización de cargas por el municipio De Guamal.

- Se realiza la gestión de firma y aprobación de AR de Repaleo de Material por parte de Interventoría. SIMOPS “Operaciones Simultaneas”, AR Arme y desarme de Equipo.

- Se apoyo en la recolección de información pertinente para la entrega del Dossier de Obras Civiles.

- Como actividad conjunta entre los Coordinadores HS se comparte con el director del proyecto, status del avance de los temas HS en el Dossier de Obras Civiles, se carga el avance correspondiente en la carpeta del Drive disponible para la consolidación de la información.

- Con el apoyo de la Ing. Nerica se realiza la recopilación de todos los reportes diarios generados desde el inicio del proyecto para consolidación y generación de estadísticas HS correspondientes al Dossier de Obras Civiles.

- Continúa la verificación de datos estadísticos HS desde el mes de Junio – Octubre y organización de soportes para consolidación de la información requerida para el Dossier de Obras civiles.

- Culminación de digitalización, verificación de soportes, indicadores HS del Dossier Civil, se envía notificación del cumplimiento de esta solicitud al director HSEQ.

- Verificación de instructivos para posterior implementación aplicables a las actividades del casino de Serinco Drilling.

- Se realiza seguimiento con el Ing. Luis Delgado sobre los elementos que serán enviados y hacen parte del equipo para las actividades que involucran alturas, se recuerda que todos estos elementos deben de contar con las certificaciones correspondientes para evitar afectaciones en el desarrollo de las actividades.

- Coordinador Legal de la compañía informa que se da la finalización del bloqueo de parte del personal de la comunidad en el Km 14.

- Se socializa el avance de la gestión ambiental del proyecto Pailitas 1-X en la reunión Gerencial Enterritorio-Interventoría-UT SERCOMADI

- Se analizan los sistemas de tratamiento de la empresa Gestora Geoambiental, para determinar cuál de ellas puede generar valores agregados al Proyecto en cuanto a reincorporación de aguas tratadas a los procesos

- Se analizan estrategias para el reinicio de monitoreo de calidad de aire en la etapa de movilización y perforación

- Se comparte charla HSE, plataforma: Efectos del tabaco en la salud.

- Continúa la verificación y ajuste de los formatos de inspección planteados para el seguimiento de las actividades que serán desarrollaras por el casino.

- Con el apoyo del equipo de campo se realizan las siguientes actividades operativas: Retiro del área del vibro compactador subcontratado, ingreso de dos cargas a la locación motor Caterpillar D399 y caseta de campamento, se realiza la inspección visual para seguimiento de condiciones de una de las retroexcavadoras que requiere mantenimiento.

- Se genera respuesta al correo del aseguramiento de trabajos en alturas realizado por la interventoría, manifestando que estos requerimientos serán exigidos al personal que aplique tanto de empresas contratistas como el personal Serinco.

- Se comparte charla HSE, plataforma: Generalidades del SIG.

- Interventoría HSE recuerda el aseguramiento y verificación de los cursos en alturas según apliquen al personal, previo al inicio de las actividades con la finalidad de evitar retrasos por su vencimiento o no validación. HS y talento humano estarán verificando los soportes correspondientes a la medida que se vaya definiendo el personal a contratar.

- Participación de reunión interna personal staff Unión Temporal Sercomadi con el propósito de informar los compromisos adquiridos con las comunidades y la reactivación del proyecto

- Se realiza reinducción al personal que reingresa a las distintas actividades con el propósito de dar a conocer el estado y compromisos del proyecto con las comunidades, de igual forma también se realizaron observaciones al personal en cuanto a la seguridad y salud en el Trabajo. Esta reinducción se realizó a 2 Operadores de Grúa, 1 Coordinador de Transporte, 2 Auxiliares Viales, 1 Perdiguero, 1 Auxiliar de Administración, 1 Mecánico.

- Se realiza una (1) Inspección pre operacional a camioneta y una (1) Inspección Pre operacional a Camión semirremolque o cama alta.

- Se realiza apoyo y acompañamiento a la actividad de movilización de maquinaria y equipos ingreso de carga hasta zona de parqueo en el municipio de Guamal.

- Se está realizando el Análisis de Riesgo y Procedimiento para la actividad de obras Civiles Instalación del Skimmer e Instalación del desarenador.

- Se realiza acompañamiento y apoyo por medio de los Permisos de Trabajo a las diferentes actividades tales como: Mantenimiento de vía de Acceso Pública, Construcción de cunetas para manejo de aguas Lluvias, Construcción de Cunetas para aguas lluvias, Repaleo de material de Descapote, Adecuación de Plataforma.

- Verificación y atención a prevención de accidentes mantenimiento de vía de acceso plataforma, extendido de material pétreo y adecuación de plataforma. Se realiza Charla HSE a 4 Conductores de volqueta.

- Inducción especifica personal MCS Consultorías Ambientales encargadas de los estudios de Aire.

- Inspecciones preoperacionales a vehículos de movilización tipo Tracto Camión, Grúa Telescópica y sus respectivos accesorios.

- Instalación de señalización preventiva e informativa al ingreso de la Plataforma.

- Inducción especifica personal a ingresar labor de Movilización, Cargue, descargue y arme de equipos.

- Se realizo una tarjeta de actos y condiciones inseguras por subir y bajar de tracto camión en movimiento.

- Se presento un evento durante la movilización de carga sobre dimensionada, daño en cuerdas de energía 110 voltios, el cual fue reparado de inmediato.

- Se realizaron (6) seis Inspecciones preoperacionales a Tracto Camión y Buseta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN HSEQ

	
Charla 5 minutos, Izaje de cargas cuidado atrapamiento de manos y pies.	Apoyo actividad de movilización
	
Charla 5 minutos funciones de las Brigadas de emergencia	Ingreso de Cargas apoyo con personal señalizador vial.
	
Seguimiento de retiro de Bulldozer fuera de servicio de la locación.	Acompañamiento escolta durante movilización de maquinaria



Socializaciones



Reuniones HSE



Apoyo auxiliar vial movilización



Inspección y/o preoperacional a Tracto Camión



Inspección de Equipo Grúa Telescópica



Orden y Aseo en Locación



Inspección a Maquinaria



Charla con Conductores de Volquetas



Implementación de Reglas básicas de Auxiliares Viales.



Charla Personal Conductores de Tracto Camiones





Apoyo y seguimiento actividad de Izaje de carga	Inspección Preoperacional a Buseta
	
Socialización	Inspección en obra civil

REPORTE DE LA GESTIÓN SOCIAL OCTUBRE

Durante el mes de octubre en cumplimiento del plan de Gestión Social, se realizaron las siguientes actividades de los programas referenciados:

PROGRAMA DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA.

- 5/10/2021: Se radicó oficio CONVOCANDO A LA REUNION DE ATENCION DE INQUIETUDES a las comunidades del AID-AII y las autoridades municipales (Despacho del alcalde, secretaria de Gobierno, Personería, Inspección de Policía y secretaria de Planeación, Veeduría Ciudadana, proveedores específicamente, los restaurantes del área urbana del municipio). JUNTAS DE ACCION COMUNAL a directivos y dignatarios de las veredas y/o corregimiento Los Andes, San José de Paraco, vereda San Juan de Dios y vereda Sabana de Marañón. También se radico en la inspección de policía con copia al señor ALCALDE oficio de restricción del orden público acudiendo con la autoridad que compete Policía Nacional entre otros.

- 6/10/2021: Reunión de atención de inquietudes relacionadas con el Proyecto Pozo Estratigráfico ANH PAILITAS- 1X con la comunidad del Municipio de Guamal, Veeduría Ciudadana, proveedores locales, miembros de las comunidades de las áreas de influencia y autoridades locales (alcalde, personero e inspectora de la Policía Nacional).

- 07/10/2021: Reunión km 14 vereda SAN JUAN DE DIOS, con la presencia de las comunidades del AID y las autoridades del municipio ALCALDIA, PERSONERIA y la veeduría en acompañamiento a la UT SERCOMADI también estuvo la interventoría social de BELLICORP. Se concreto el lavado de ropa con una tabla de precios concertada con las tres comunidades asistentes, este tema de lavandería lo manejara las JUNTAS DE ACCION COMUNAL y ellas internamente seleccionaran las mujeres que prestaran este servicio y la rotación del mismo personal para apoyar ampliamente la participación femenina.

- 08/10/2021: Con el acompañamiento de la interventoría social se realizó un conversatorio con las personas del km 14 ubicado al ingreso de la locación, los cuales continúan el bloqueo con el acompañamiento del veedor Sr. Alex Yépez, y un número aproximado de 30 personas adultas. En este conversatorio se logró hacer un borrador de las peticiones de este grupo de integrantes de la comunidad del km 14.

- Participación laboral Mano de obra No calificada y calificada (hombres, mujeres y comunidad LGTBI)

- Participación en el tema de alojamiento, alimentación, camarería y no casino una contraprestación.

- Adecuación de la vía que incluye desde el K 0, hasta el cementerio en el corregimiento de Los Andes o KM 17, limpieza de las alcantarillas, revisar el estado actual de algunas de ellas ya que se encuentran en mal estado y colmatadas, revisar las especificaciones técnicas de las mismas, es decir el peso que pueden soportar, para asegurar que durante la movilización del taladro no sufrirían afectación alguna.

- Contratación de Personal en entrenamiento (cañero y aceitero)

- Reunión con cinco (5) representantes del km 14, Sercomadi, Veeduría e Interventoría, en un lugar neutral, como el Banco o Mompox.

- 09/10/2021: Monitoreo de la vía de hecho "bloqueo" en el km 14, se atiende en la oficina y se actualizan las bases de datos y demás soportes del departamento social.

- Entrega copia del pliego de peticiones del KM 14 Vereda San Juan de Dios. Alcaldía Municipal, Personería Municipal, Inspección de Policía. Presidentes de Junta de acción comunal (Vereda San Juan de Dios, Corregimiento San José de Paraco.

- Entrega convocatoria mesa de trabajo bienes y servicios y participación laboral presidentes de Junta de acción comunal (Vereda San Juan de Dios, Corregimiento San José de Paraco.

- Entrega convocatoria mesa de trabajo bienes y servicios y participación laboral, que se realizara el día 20-10-2021, a presidentes de Junta de acción comunal (Corregimiento los Andes, Autoridades Municipales, Proveedores locales (servicio de transporte, restaurantes, otros), Comité de veeduría ciudadana, asociación de trabajadores.

- Entrega de oficios copia actas mesas de concertación temas de participación laboral y contratación de bienes y servicios. UTS-S -182-21, Junta de acción Comunal de Los Andes, San José de Paraco y San Juan de Dios-KM 14.

- Entrega oficio tabla salarial- UTS-S -195-21 (Alcaldía Municipal, Personería Municipal, Inspección de Policía, secretaria de Gobierno, Planeación Municipal). UTS-S -196-21 KM 14 Vereda San Juan de Dios, Corregimiento San José de Paraco, Corregimiento los Andes y vereda Sabanas de Marañón se les entrego vía WhatsApp y el día 26-10-2021, firmaran el físico. UTS-S -197-21 presidente Comité veeduría ciudadana, UTS-S -198-21- Saúl Pedrozo líder comunitario, UTS-S -199-21 - Wendy Vega, secretaria JAC San Juan de Dios. UTS-S -200-21 Gustavo Guerra - Asociación de trabajadores técnicos y tecnólogos de Guamal- Magdalena.

- Entrega de oficios copia actas mesas de concertación temas de participación laboral y contratación de bienes y servicios. UTS-S -183-21, (Alcaldía Municipal, Personería Municipal, Inspección de Policía, secretaria de Gobierno, Planeación Municipal). UTS-S -184-21 presidente Comité veeduría ciudadana. UTS-S -185-21- Saul Pedrozo líder comunitario, UTS-S -187-21 Gustavo Guerra - Asociación de trabajadores técnicos y tecnólogos de Guamal- Magdalena.

- Entrega oficio Definición estrategia conjunta de intervención vía pública Guamal - Astrea KM 0 a KM 14. - UTS-S -208-21, (Alcaldía Municipal, Personería Municipal, Inspección de Policía, secretaria de Gobierno, Planeación Municipal).

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

- Realización mesa de trabajo laboral, “PARTICIPACION Y CONTRATACION DEL AID-AII- MONC-MOC. Según la trazabilidad de varias reuniones de acercamiento CON AID -AII se llega al siguiente acuerdo de participación y distribución de la contratación de mano de obra no formada local o MONC.

  -60% Vereda San Juan de Dios-KM 14
  -10% Corregimiento los Andes
  -10% Corregimiento San José de Paraco
  -10% Vereda Sabanas de Marañón
  -10% Casco urbano Guamal

- El 24 de octubre se realiza la divulgación de publicación a vacantes de perforación y acompañamiento a registro para postulación de cargos, el cierre de vacantes se finalizó el jueves 28 de octubre.

- El 24 de octubre se inicia con la reactivación del personal para la fase de obra civil, fecha de inicio de labores lunes 25 de octubre. Los cargos nuevamente a contratar fueron los siguientes: Asistente Administrativa, Topógrafo, Cadenero, Auxiliar de Obra, Operador Motoniveladora, Operador Pajarita y retroexcavadora, Oficial de Obra, Ayudante de Obra, Auxiliares viales, Médico.

- El 25 de octubre, se entrega oficio publicación Vacantes Etapa de Perforación. Programa de generación de empleo- Proyecto ANH-Pailitas-1-X - UTS-S -188-21 KM 14 Vereda San Juan de Dios, Corregimiento San José de Paraco, Corregimiento los Andes y vereda Sabanas de Marañón se les entrego vía WhatsApp y el día 26-10-2021, firmaran el físico. UTS-S -189-21 (Alcaldía Municipal, Personería Municipal, Inspección de Policía, secretaria de Gobierno, Planeación Municipal). UTS-S -190-21 presidente Comité veeduría ciudadana, UTS-S -191-21- Saul Pedrozo líder comunitario, UTS-S -192-21 - Wendy Vega, secretaria JAC San Juan de Dios. UTS-S -193-21 Gustavo Guerra - Asociación de trabajadores técnicos y tecnólogos de Guamal- Magdalena.

- El 27 de octubre, el área social de UT SERCOMADI, realiza acompañamiento, inscripción y postulación a las vacantes de perforación en el AID. - Vereda San Juan de Dios - KM 14, Corregimiento San José de Paraco.

- El 30 de octubre, se entrega oficio ampliación Vacantes Etapa de Perforación. Programa de generación de empleo- Proyecto ANH-Pailitas-1-X - UTS-S -209-21 KM 14 Vereda San Juan de Dios, Corregimiento San José de Paraco, Corregimiento los Andes, UTS-S -213-21, secretaria JAC, San Juan de Dios.

- El 30 de octubre se entrega oficio publicación Vacantes Etapa de Perforación (casino). Programa de generación de empleo- Proyecto ANH-Pailitas-1-X - UTS-S -203-21 KM 14 Vereda San Juan de Dios, Corregimiento San José de Paraco, Corregimiento los Andes, UTS-S -206-21, secretaria JAC San Juan de Dios.

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO	
	
Entrega oficios tabla salarial, convocatoria, Publicación Vacantes Etapa de Perforación	Entrega oficios tabla salarial, convocatoria, Publicación Vacantes Etapa de Perforación. Inscripción y postulación vacantes fase perforación - San Juan de Dios-KM 14

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

- El 25 de octubre se realizó reinducción auxiliar administrativa y operarios maquinaria para etapa de obra civil.
- El 27 de octubre se realizó reinducciones auxiliares viales.
- El 28 de octubre Se realizó inducción componente social a los siguientes cargos: 2 cuñeros, 1 aceitero. (Alistamiento de actividades previas a la etapa de perforación).

PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	
	
Reinducción personal	Inducción área social a personal de alistamiento de actividades previas en la etapa de perforación

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y MANEJO DE ALERTAS EN VÍA DE HECHOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A COMUNIDADES DE INTERÉS ISQR:

- El 24 de octubre, se da Respuesta Solicitud por parte de la comunidad de la vereda Sabana de Marañón “supervisión del acueducto que tuvo un desplome de la bomba de agua, afirmando la comunidad por ciertas vibraciones por paso de equipos.” UTS-S-194-21.

- El 24 de octubre, se realizó el pagó al señor Juan Carlos Ospino, el cual manifestó estar de acuerdo con lo cancelado (transferencia bancaria BANCOLOMBIA), el señor Ospino prestó sus servicios hasta el día domingo 24/10/2021.

- El 25 de octubre, Se realizó cierre al traslado de ISQR del Derecho de Petición radicado en la Presidencia de la ANH, referencia: Inconformidad generalizada de la UT Sercomadi y de quien está a cargo, empresa Serinco Drilling por parte del presidente de la Veeduría Ciudadana (Rafael Alvarado). - UTS-S -198-21 - 25-10-2021.

- El 27 de octubre se recibe solicitud por parte de la Alcaldía Municipal de Guamal, apoyo limpieza del botadero de basura. se traslada la solicitud al área ambiental de la UT SERCOMADI.

- El 30 de octubre se recibe solicitud ampliación postulaciones vacantes de perforación, por parte de algunos integrantes de la comunidad de San juan de Dios-KM 14.

PROGRAMA DE ISQR	
	
Reunión con las comunidades y autoridades del municipio de Guamal en la "Casa de la cultura", con el objetivo de atender petición en cuanto al servicio de Alimentación, lavandería y proveedores de restaurantes.	Reunión de atención a las comunidades del AID-AII y autoridades en el salón comunal de la vereda SAN JUAN DE DIOS.

PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL

- En reunión del 6 y 7/10/2021 se atendieron las solicitudes con respecto al tema de contratación de alimentación (mesa caliente), lavandería y participación de proveedores locales sin llegar a un acuerdo entre las comunidades del área rural y urbana con acompañamiento de los entes de control y autoridad municipal. Se amplía esta información en el programa de coordinación, participación, y concurrencia.

- Según la trazabilidad de varias reuniones de acercamiento CON AID -AII se llega al siguiente acuerdo de participación y distribución de la contratación de bienes y servicios.

- La UT Sercomadi explica que se manejara un promedio de 90 comidas al día, para el casco urbano de Guamal.

- Los propietarios solicitan todos los requerimientos y menús, gramajes para poder organizar una respuesta responsable y presentar a la empresa.

    1. Restaurante donde Mario
    2. Restaurante k´nela
    3. Restaurante Debut
    4. Restaurante historia de Guamal
    5. Restaurante el Arca – Doreni Palma Bandera

- Los asistentes a la reunión y representantes de la Junta de Acción Comunal, Comité Veeduría Ciudadana aprueban la distribución del servicio de alimentación se realice entre los 4 restaurantes que quedaron en lista, no quiere decir que no se pueda presentar otro restaurante siempre y cuando cumpla con los requisitos.

- La UT SERCOMADI propone que se realice la rotación de los restaurantes por mes.

- UT SERCOMADI, entrega los requerimientos el día 25-10-2021
  Proponentes de empresas de Transporte
  1. Consorcio servicios de transporte especiales Guamal - JOSE RANGEL
  2. Cootrasurmag YONNIS PEDROZO PEREZ
  3. Transporte K'TOTO ADRIAN YEPES
  4. Cootransnorte
  5. Jorge Cadena

PROGRAMA DINAMIZACION DE LA ECONOMIA LOCAL	
	
MESA DE PARTICIPACION TEMA “PARTICIPACION Y CONTRATACION DEL AID-AII- MONC-MOC.	MESA DE PARTICIPACION TEMA “PARTICIPACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

MONITOREO DE ENTORNO

- Ante el evento de bloqueo en el km 14, por parte de la comunidad de la vereda SAN JUAN DE DIOS, se ha mantenido constante diálogo con las partes, atendiendo en oficina a las personas que se acercan a manifestar de qué lado están como comunidad y como personas, se han reporta los sucesos que hacen parte de esta vía de hecho ante las autoridades, comunidad y grupos; teniendo un panorama de los actores que están detrás del bloqueo y los que si colocan la cara como el señor Alex Yepes que hace parte de la veeduría pero también participa en propiedad como comunidad de las peticiones en el sitio del bloqueo; también se mantenido información fluida con las autoridades del municipio Alcaldía, personería, inspección de policía y veeduría ciudadana.

- ATENCION DE LA VIA DE HECHO BLOQUEO (MATRIZ DE IMPACTOS IDENTIFICADOS)

- Del 04 al 19 de octubre del 2021 transcurrieron 16 días de bloqueo, la gestión social del proyecto se centró en apoyar y ejecutar las estrategias propuestas por la UT SERCOMADI, para resolver la situación de bloqueo ubicado en el punto de ingreso a la plataforma pozo estratigráfico ANH PAILITAS 1X, km 14 vereda San Juan de Dios, situación presentada

  Las estrategias implementadas fueron:

  Divulgación por redes sociales emisora GUAMALERA ON LINE, perifoneo realizado por el señor Miguel Arrieta el documento Mitos y Realidades con el objetivo de desmitificar algunos imaginarios en la comunidad versus la realidad de la operación de la UT SERCOMADI que está ejecutando el proyecto ANH PAILITAS 1X.

  Información permanente con las autoridades del municipio de Guamal como la alcaldía municipal, entes de control Personería y Veeduría, también a líderes

sociales Carlos Guerra, Saúl Pedrozo Alfaro, Jhon Ramos, Gustavo Guerra, y la iglesia a través del párroco del municipio.

- Reunión convocada con las autoridades nacionales, regionales y municipales y las comunidades del AID-AII con el cliente ENTERRITORIO para atender las solicitudes e inquietudes de la comunidad, esta reunión se realizó el viernes 16 de octubre del presente año, realizada en el CENTRO DE INFORMACION CIUDADANA - CIC-con la asistencia en promedio de 90 personas.

- Reunión convocada por los líderes sociales, y como garante la iglesia, personería, veeduría y presidentes de las JAC del AID-AII en el punto del bloqueo km14 vereda. Con la asistencia en promedio de 70 personas las cuales estuvieron liderando, la presentación de las peticiones radicad por la veeduría ciudadana el día 15/10/2021, una vez trabajados los temas de manera pública y concertada con la empresa las personas que se encontraban en el bloqueo no participaron ni quisieron dar ningún nombre para ser incluidos en el listado de personas disponibles a laborar con la empresa SERCOMADI. Se terminó la reunión sin el levantamiento del bloqueo por parte de las personas que están realizando esta vía ilegal.

- Actualización bitácora incidente social km 14 vía Guamal – Astrea

  Conversatorio con presidente de JAC del Corregimiento de los Andes, Camilo Moreno y un miembro del KM14 (Robinson Castillo), manifestando que las comunidades apoyan la continuidad del proyecto y plantean que se tenga el acompañamiento de la fuerza pública y ellos nos respaldarían como comunidad.
  El Señor Bianor Villegas Acosta, residente en el Km 14 hace entrega del pliego de peticiones. por
  parte del área de Gestión Social se revisa el documento, el cual viene en desorden y se procede a organizarlo y así foliar de la siguiente manera:

  No. De Folios: 14
  No. De Putos: 21

  Solicitud del señor Rodolfo Ruizdiaz, en calidad de fiscal de la veeduría con el fin de solicitar copia del pliego de peticiones entregado por la comunidad del KM 14 San Juan de Dios.
  La Coordinación Social, hace entrega de la copia del pliego de peticiones entregado el 18-10-21 al fiscal de la veeduría ciudadana. Algunas personas de la comunidad del Km 14 llamaron a preguntar si la empresa estaba reunida en Mompox con las personas del bloqueo y manifestaron que no todas las firmas que aparecen en el pliego son reales.
  El área jurídica de la empresa UT SERCOMADI, informa sobre el levantamiento del bloqueo en el KM 14 de la comunidad de la vereda SAN JUAN DE DIOS, el día 19-10-2021.

ALARMA O EVENTOS

- Continúa la alarma del mantenimiento de la vía, la presencia de actos externos e internos con intereses marcados para mal informar la comunidad y hacer ver que la empresa no está cumpliendo, la aplicación de la ley para permitir el desarrollo del proyecto como un interés general del Estado Colombiano para aplicar la ley en el municipio, permitiendo el restablecimiento del orden público, la contratación de bienes y servicios con el debido proceso según lineamientos de la empresa SERCOMADI ante el emergente de proveedores sin experiencia y sin estándares de ley para cumplir los servicios requeridos ante la magnitud del proyecto ANH PAILITAS 1X.

- Se mantiene la alerta por intervención de puntos críticos de la vía Guamal- Astrea hasta KM 14. Se tiene contemplado continuar con plan de mantenimiento constante a la vía, interviniendo tramos no mayores a 500 mts., para poder garantizar que el material que se aplique se pueda sellar, y no sea lavado por las fuertes lluvias que se presentan a diario en la zona. Equipo mínimo disponible (Motoniveladora, Vibro compactador y Retro cargador)

INVERSION SOCIAL

- 4/10/21: Fue entregada la matriz de inversión social con los ajustes requeridos por la interventoría social, para su revisión, la reunión programada para la aprobación de los proyectos fue suspendida por el evento del bloqueo en el km 14 comunidad San Juan de Dios.

OTRAS ACTIVIDADES

- Actualización de la Matriz de ISQR Actualización de la Bitácora (línea de tiempo)

- Reunión sede educativa SAN JUAN DE DIOS con la comunidad educativa y la secretaria de educación acompaño la interventoría social. Objetivo de Priorizar el arreglo de la escuela con recursos propios de la UT SERCOMADI, como inversión social corporativa; asistieron a la reunión la secretaria de desarrollo social, salud, educación, recreación, cultura y deportes en representación de la alcaldía municipal, la rectora encargada de la Institución educativa María Auxiliadora del corregimiento de los Andes, la docente Elvira Gullozo, el presidente de la asociación de padres de familia del corregimiento señor Rodolfo Ruidiaz ,e integrantes de la asociación de padres de familia de la sede educativa Km 14. Se realizó recorrido físico de la sede encontrando las instalaciones en regulares condiciones; la docente y los demás padres de familia presente priorizaron:

    - Arreglo del salón de clases (cielo raso, cableado eléctrico, ventanales y puerto de ingreso, pisos y pintura en general)
    - Arreglo unidad sanitaria.
    - Estos arreglos deben hacerse conforme a la normatividad vigente por el Min. Educación teniendo en cuenta las normas de bioseguridad.
- Reunión con la secretaria de Desarrollo social, educación, salud deportes y cultura Dra. Wendy Johana Blanquiset Arias, quien ratifico la información del ingreso a la

presencialidad de los alumnos de la sede educativa SAN JUAN DE DIOS a partir del 25 de octubre del presente año.

- Seguimiento priorización adecuaciones Sede Educativa San Juan de Dios, que pertenece a la Institución educativa María Auxiliadora del corregimiento de los Andes con recursos propios de la UT SERCOMADI, como inversión social corporativa. Se informó a la comunidad que el rubro para la inversión es de $10.000.000 de pesos, la comunidad realizará una reunión para analizar si ellos mismos aportan la mano de obra y la empresa los materiales.

- Actualización de matriz de riesgos sociales.

- Acompañamiento al ingeniero de operaciones para escuchar y despejar inquietudes al grupo de la policía Elite, que tiene jurisdicción en Guamal y Municipio aledaños, los cuales se presentaron para cerciorarse cómo va el proyecto Pailitas 1X.

- Actualización de matriz de ISQR.

- Reunión Staff objetivo contexto social, entrega actas mesas de trabajo contratación de Bienes y Servicios.

- Reunión con Interventoría social, revisión ISQR, y los puntos de las mesas de trabajo.

OTRAS ACTIVIDADES	
	
Reunión con interventoría social	Reunión del personal staff contexto social y entrega de actas de las 2 mesas de trabajo Contratación y bienes y servicios

REPORTE DE LA GESTIÓN TÉCNICA

Durante este periodo se realizaron las siguientes activades desde el área de gestión técnica:

- Se reinicio movilización de cargas de campamento y equipo de Base La Gómez a Pozo en Guamal Magdalena.
- Se realizo la Gestión de los contratos con las compañías de la fase de perforación.
- Se hicieron preparativos para la visita técnica de parte de la UT Sercomadi a las herramientas de corazonamiento por parte de la empresa CyCO
- Se realizaron ajustes a el contrato de servicio de alquiler de taladro entre UT Sercomadi y Serinco Drilling S.A.
- Se recopiló información de reportes diarios y semanales consolidados, reportes civiles diarios y semanales, reporte de movilización diario, los cuales fueron subidos al SECOP II
- Se verificó logística para fase perforación.
- Se realizó revisión de cargas en base, plataforma y obras civiles.
- Se está realizando reporte de inspección y mantenimiento de tubería drill pipe 5¨ en base de Bogotá.
- Se realiza Reunión de la UT en base lubeka para acordar temas acerca de plan para finalización de fase obra civil, plan de movilización de cargas a pozo y organización de personal en campo.
- Se socializa el Cargue de bulldozer de la compañía y traslado (autorizado por interventoría) a la base la Gómez de Serinco drilling.
- Se realizo reunión con Ing Juan Guillermo Prada para reevaluar el mejor plan para reinicio de operaciones.
- Revisión de costos de cada uno de los servicios de las terceras compañías para fase de perforación.
- Negociaciones con nueva compañía para el servicio de cementación.
- Se están realizando planos sobre el orden de las cargas de terceras compañas en pozo.

REPORTE DE MOVILIZACIÓN OCTUBRE

POZO ANH-PAILITAS-1-X

CARGAS TOTALES	71

EQUIPO SERINCO D10									
FECHA	**DIA PROG**	**CANTIDAD DE CARGAS PROG**	**% PROG**	**% ACUMULADO PROG**	**CARGA MOVILIZADA**	**CANTIDAD DE CARGAS REAL**	**% REAL**	**CARGA ACUMULADA**	**% ACUMULADO REAL**
2-Oct-21	1	7	10%	10%	CASETA #21, CASETA #2, CASETA #4, CASETA INTERVENTORIA, ENFERMERÍA, Caseta jefe De Equipo, CASETA #15	7	10%	7	10%
21-Oct-21	2	2	3%	13%	CASETA MESA CALIENTE, MOTOR BOMBA - CAJA DE ENFRIAMIENTO	2	3%	9	13%
27-Oct-21	3	4	6%	18%	CASETA # 12A - 12, BODEGA DE BEBIDAS, TANQUE DE AGUA Y CUADRADO, MOOD BOARD / estructura para anclaje unidad	4	6%	13	18%
28-Oct-21	4	2	3%	21%	MOTOR 35-16, CAJA, TANQUE DE LODOS - TIJERA EQUIPO DE PERFORACIÓN	2	3%	15	21%
29-Oct-21	5	2	3%	24%	BOMBA OILWELL - LLAVE HIDRÁULICA SHAKER, BODEGE DE MANGUERAS, TALLER MECÁNICO	2	3%	17	24%
30-Oct-21	6	4	6%	30%	Motor caterpilar 399, unidad de succión, Bomba de lodos PZ9, Tanque de succión #1, Tanque de succión #2	4	6%	21	30%
31-Oct-21	7	16	23%	52%	Top drive, CASETA #17, CASETA #5, CASETA ASISTENTE COMPANY, CASETA # 10, CASETA # 03, CASETA # 11, CASETA INTERVENTORÍA, CASETA # 07, CASETA #16, MECÁNICO - ELÉCTRICO, CASETA # 19, CASETA HSE, CASETA # 9, CASETA COMEDOR, CASETA COMPANY MAN, TANQUE PTAP, 10 PARRILLA CABLE, CASETA BAÑOS PÚBLICOS, 1 RED FOX DE 190Lbs, 1 CASETA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BOMBAS, LAVANDERÍA Y PLANTA ESTADIO, Tanque de succión #3	10	14%	31	44%

A corte de 31 de octubre se movilizaron 31 cargas del Guamal y base la Gómez hacia el pozo con un porcentaje del 44% de progreso sobre el total de 71 cargas.

REPORTE DE OBRA CIVIL DE OCTUBRE

Durante esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción cuentas para agua aceitosa
- Suministro e instalación del skimmer metálico
- Suministro e instalación de rejillas metálicas sobre estructuras (cunetas para aguas aceitosas, desarenador, skimmer, contrapozo)
- Excavación para las cunetas de aguas lluvias
- Instalación de geomembrana para recubrir la excavación para cunetas de aguas lluvias
- Construcción de 4 muertos de anclaje en concreto de 3000 PSI
- Repaleo del material de descapote del costado suroriental hacia el costado norte de la servidumbre.
- Confirmación del material de descapote e inerte
- Suministro de material de cantera para el área de campamentos
- Suministros, nivelación y compactación de materia de cantera para la locación
- Cereo de la plataforma con material de subbase

Grafica de estadísticas información global

INICIO DE OBRA: 13/08/2021		FINAL DE OBRA: 27/9/2021		REPORTE MENSUAL No 3	PERIODO: 25/10/21 - 15/11/21		EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PALITAS 2021
INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	100%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	100%	100%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECUACIÓN VIA DE ACCESO	10%	100%	100%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	100%	100%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	100%		

Tabla con control de personal en obra y control de equipo utilizado en obra, además de horas perdidas por lluvia

CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	176	Motoniveladora Caterpillar 120 G	1	16	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	176	Motoniveladora Caterpillar 160	1	112	TARDE	
Administrador	1	176	Bulldozer Caterpillar D5C	1	32	TOTAL	
Topógrafo	1		Retroexcavadora Hitachi 130D	1	48	ACUMULADO	246,5
Cadenero	1		Retroexcavadora Hitachi 160D	1	32	OBSERVACIONES	
Maestro de obra	1		Vibrocompactador Ingersoll Rand	1	124	La cantidad de horas acumuladas, corresponde al registro de la precipitaciones presentadas en la zona, y el bloqueo ilegal por parte de algunos integrantes de la comunidad del km 14.	
Oficial	1	152	Retrocargador Komatsu	1	60		
Ayudante	9	1152	Vibrocompactador Vibromac	1			
Controlador vial	4	432	Camioneta 4X4	1	288		
Operador de maquinaria	4	624	Canibeja	1	104		
Conductor	1	336					
Mecánico	1	168					
Auxiliar de ingeniería	1	168					
TOTAL HH		3560	TOTAL HH		816		

Tablas de cantidades de obra en cada sección

CANTIDADES DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	7		7
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	8		9,5
3	SUMINISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	1200		2467
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		141141
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	375		375
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,3		0,3
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	383		383
8	SUMINISTRO DE PIEDRA EXPLOTADA	M3	197		197
9	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	31940		31940

	CONSTRUCCION LOCACION				
10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10000		10000
11	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	9050		9050
13	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL	M2	4960		4960
14	SUMINISTRO MATERIAL DE SUBBASE	M3	7033		7033
15	SUMINISTRO MATERIAL PIEDRA EXPLOTADA	M3	144		144
16	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	461496		461496
17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		1
18	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		9
19	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	11,2		11,2
20	ACERO DE REFUERZO	KG	1930		1930
21	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		1
22	SUMINISTRO E INSTALACION SKIMMER METALICO	UND	1		1
23	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		90
24	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERRA RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		400
25	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	300		300
26	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		42

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA CIVIL

	
Vaciado de concreto cunetas aceitosas	Instalación rejillas metálicas
	
Instalación skimmer	Instalación desarenador
	
Construcción pasacunetas	Cunetas aguas lluvias
	
Muertos de anclaje	Mantenimiento vía publica
