

REPORTE MENSUAL NOVIEMBRE 2021

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

REPORTE DE GESTIÓN SOCIAL

Durante el mes de noviembre en cumplimiento del plan de Gestión Social, se realizaron las siguientes actividades de los programas referenciados.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA.

Durante el mes de noviembre la UT SERCOMADI dio cumplimiento a las actividades programadas y compromisos contractuales establecidos y otros acordados con las comunidades de interés, como se menciona a continuación:

Reunión con Autoridad Municipal, Personero e Inspectora de Policía, para tratar el tema pertinente al mantenimiento de la vía. No siendo posible concretar, debido a una aparente inconformidad por parte de la autoridad con respecto al oficio remitido por UT SERCOMADI en el que reclaman a la autoridad su descontento e Imposición de la Queja por falta de apoyo durante las acciones de hecho realizadas por la comunidad y del cual cursan copia a las autoridades del nivel Regional y Nacional. Alcalde municipal, recordó nuevamente la solicitud realizada con el préstamo de un buldócer para el mantenimiento del botadero a cielo abierto; quedando este tema pendiente por responder.

La UT SERCOMADI radicó oficio UTS-S-218-21, a las autoridades; alcaldía, inspección de policía y personería solicitando al restablecimiento del orden público, ante el bloqueo del acceso a la plataforma del Pozo Pailitas 1-X, por hechos del 5 de noviembre.

La UT SERCOMADI publicó en la emisora local Guamalera OnLine (Facebook) Informativo No.001, denominado “QUE HABLE EL PROYECTO ANH PAILITAS-1X”, dirigido a la opinión pública informando sobre la acción de hecho (bloqueo al ingreso de la plataforma Pozo Pailitas 1-X) del 5 de noviembre entre las 7:00 y 8:45 am; en este comunicado UT SERCOMADI resalta el cumplimiento de los compromisos en el tema laboral, así como de los acuerdos establecidos en los pliegos de petición, al tiempo que hace algunas denuncias.

La UT SERCOMADI radica comunicado UTS-S-218-21 y UTS-S-219-21 ante la alcaldía municipal con copia a la Inspectora de Policía, secretaria de Gobierno y Personería con el fin de informar el evento y solicitar la restitución del orden público.

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO:

UT Sercomadi, acompañó a las comunidades del área de influencia directa e indirecta, en la ampliación e inscripción y postulación para las vacantes de perforación y casino. La misma actividad se apoya desde las oficinas por parte de los profesionales del área social.

UT Sercomadi divulgó las vacantes para para la fase de perforación, casino, campamento, auxiliares viales y vigilancia. Realizó el alistamiento de personal etapa de perforación y contrató el mismo, de acuerdo con los compromisos contractuales. Radicó oficios ofertando vacantes. Remiten copia a presidentes JAC, autoridades locales, veeduría ciudadana, asociación de calificados de Guamal y secretaria de la JAC km14. Información divulgada en la emisora Guamalera Online por Facebook.

La UT SERCOMADI preseleccionó y contrató el personal no calificado etapa de Perforación (16 obreros y 4 recoge muestras). El proceso incluyó la revisión de los listados remitidos

por CAJAMAG y su distribución en territorio se realizó de acuerdo con los porcentajes establecidos en mesas de trabajo: 60% vereda San Juan de Dios y 40% las otras comunidades, quedando de la siguiente manera: 10 Obreros San Juan de Dios, 2 Obreros San José de Paraco, 2 Obreros los Andes, 1 obrero Sabana de Marañón y 1 Obrero Cabecera Municipal. Para el cargo de Recoger- muestras se distribuye así: 3 de la vereda San Juan de Dios y 1 Corregimiento Los Andes.

Acompañamiento desde Gestión Social al área administrativa en la entrega de comunicado al señor Bianor Villegas Acosta, trabajador de obra civil, (esposo de la señora Beatriz Chamorro) quien se ausentó de su puesto de trabajo desde el pasado 8 de noviembre sin justa causa. Sin embargo, el área administrativa en presencia del presidente de la veeduría al proyecto, (Rafael Alvarado), interventoría social, y área social de UT SERCOMADI, le informó que, si desea regresar a continuar laborando, debía presentar un documento justificando su ausencia, así mismo, que, si no deseaba regresar, presentara el respectivo documento.

La UT SERCOMADI reporta ingreso de jefe de Equipo de Perforación.

Personal contratado etapa de perforación

ETAPA PERFORACIÓN	
Cantidad	**Cargo**
Local	
16	Obreros de patio
3	Recoge muestras
1	Eléctrico
3	Cuñeros Training (1 Guamal, 1 Andes y 1 km 2)
1	Auxiliar HSE
1	Auxiliar Enfermería
Personal Externo	
1	Company Man
2	Geólogos
2	Cuñeros
1	Encuellador
1	Supervisor operación
1	Mecánico

1	Eléctrico
1	Top Drive
1	Asistente de Operaciones
1	Coordinador Social
PERSONAL CASINO LOCAL	
1	Campamentero
1	Bodeguero
1	Chef
1	Panadero-Lonchero
2	Auxiliar de Cocina
2	Camareras
2	Meseras
2	Stewart
3	lavanderas

UT Sercomadi realizo entrega convocatoria laboral y publicación de la misma para el cargo de vigilancia y seguridad en el área de influencia del proyecto Corregimiento de los Andes, San José de Paraco y Km 14, vereda Sabanas de Marañón. UT Sercomadi, informa también la contratación realizada por la empresa Securyti, realizó contratación de 3 Guardas de Seguridad (2 km 14 y 1 Guamal).

UT SERCOMADI hace entrega de comunicado a las JAC de los corregimientos de San José de Paraco, Los Andes y veredas San Juan de Dios (KM14) Y Sabanas de Marañón (se publica vacante en la tienda La Central), convocando personal para Casino (1 cocinero) y Operador de Pajarita y Retroexcavadora. Además, se radicó en alcaldía municipal de Guamal.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO:

- El 03 de noviembre se realizó inducción al componente social a los siguientes cargos: 3 cuñeros, 2 encuelladores.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A COMUNIDADES DE INTERÉS ISQR:

Atención a Inquietudes, Solicitudes, Quejas y Reclamos

CONSOLIDADO ISQR A NOVIEMBRE DE 2021				
TIPO	RECIBIDAS	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL
Derecho Petición	1	0	1	1
Queja	11	0	11	11
Solicitud	25	1	24	25
TOTAL	**37**	**1**	**36**	**37**

ISQR No.21. Solicitud Alcaldía Municipal de Guamal, apoyo limpieza del botadero a cielo abierto.
Se traslada la solicitud al área Ambiental de la UT SERCOMADI. **Estado: cerrada**. Fecha de Cierre: 23/11/2021.

ISQR No. 23. Solicitud. Oportunidad laboral oficina de interventoría en Aseo y Oficios Varios. Fecha de Recibido: 02/11/2021. **Estado: Cerrada**. Fecha Cierre: 18 /11/2021.

ISQR No.24 Solicitud ampliación postulación vacantes perforación y casino, por parte de la Personería Municipal. Fecha de recibida 03-11-2021**.** **Estado: Cerrada.** Fecha de cierre: 05/11/2021.

ISQR No. 25: Personero Municipal a través de correo reenvía a UT SERCOMADI queja presentada por el señor Alex Yépez Vega, quien manifiesta lo siguiente "Respeto hacia la comunidad del KM14, ya que están ocurriendo hechos como el de la mano de obra no formada donde se firmó un convenio de 24 paleteras o auxiliares viales y en consideración la Inspectora de Policía minimiza esta gran oportunidad calificando 8 puntos para este oficio que realmente amerita 24 o más personas". Fecha de recibido: 02/11/2021. **Estado: Cerrada**. Fecha de cierre: 06/11/2021. UT SERCOMADI remite mediante correo electrónico al Personero municipal, respuesta a dicha solicitud.

ISQR No.26. Solicitud participación bienes y servicios (lavado de ropa), contratación mano de obra AID-AII, contratación en el cargo de Aseo oficina. Fecha de Recibido: 03/11/2021 **Estado: Cerrada** Fecha de Cierre: 27/11/2021. UTS-S- 236-21**.**

ISQR No. 27: Inconformidad en la contratación de la mano de Obra Calificada del Primer Anillo en la etapa de perforación en el Proyecto de Perforación de Pozo Estratigráfico ANH-Pailitas 1X. Representante Legal Asociación de Trabajadores de Guamal. Fecha de recibido: 4/11/2021**. Estado: Cerrada.** Fecha de cierre: 24/11/2021.

ISQR No.28: Se recibe Solicitud para apoyo de donación de material de relleno y préstamo de maquinaria para realizar un trabajo de campo en la Institución Educativa Nuestra Señora Del Carmen del Municipio de Guamal. Fecha de recibido: 05/11/2021. **Estado: Cerrada.**

ISQR No. 29: Se recibe solicitud apoyo económico para el primer festival cultural, gastronómico y artístico Gay en el Municipio de Guamal, evento que se estará realizando el 13 de noviembre 2021. Fecha de recibido: 6/11/2021. **Estado: Cerrada.** Fecha de Cierre: 11/11/2021.

ISQR No. 30: se recibe Solicitud por parte de la JAC del Barrio San Martin "Ayuda en efectivo para las actividades católicas, culturales y deportivas – Fiestas Patronales de San Martin". Fecha de recibido: 10/11/21. **Estado: Cerrada.** Fecha de Cierre: 11/11/2021.

ISQR No. 31. UT SERCOMADI recibe queja enviada vía correo electrónico por el señor JOSE RANGEL gerente empresa GUAMAL EXPRESS SAS, por presencia en el área de un vehículo de operación nacional de Chía. Fecha de recibido: 12 /11/2021. **Estado: cerrada**. Fecha de cierre: 13/11/2021.

ISQR No. 32. Interventoría Social recibe queja del señor José Rangel, en su calidad de gerente de la empresa de transportes Guamal Express, manifestando su inconformidad porque aparentemente se le están vulnerado sus derechos como empresario de la región. Fecha de recibido:14/11/2021. **Estado: Cerrada**. Fecha de cierre: 25/11/2021.

ISQR No. 33. Se recibe solicitud por parte de la Gestora Social Judith Alcendra Gulloso, "Apoyo para regalos en Navidad para Niños de Guamal". Fecha recibida: 16/11/2021. **Estado: Cerrada.** Fecha de cierre: 29/11/2021.

ISQR No. 34. Interventoría Social recibe queja del señor Dulys Alvear vecino del pozo en el KM12, aproximadamente, quien solicitó revisar el acceso a su predio toda vez que, en gran parte de su finca, después de realizado el mantenimiento a la vía, quedaron algunas cunetas las cuales no tienen salida y permanecen llenas de agua lo que impide el acceso con normalidad a su vivienda. Fecha recibida: 16/11/2021. **Estado: Cerrada**. Fecha de Cierre: 24/11/2021.

ISQR No. 35. Traslado por interventoría, Para informar sobre la inconformidad manifestada por el señor José Rangel, proveedor servicio de transporte quien se comunicó con el área social interventoría de manera molesta, reportando que siguen ingresando en horas de la mañana como en la tarde carro tanques con agua a la locación y salen bien temprano hacia la finca donde acopiaban las cargas durante el bloqueo. Según él, se queja porque no le han dado participación. Fecha de recibido: 17/11/2021. **Estado: Cerrada**. Fecha de Cierre: 25/11/2021.

ISQR.No.36. Solicitud por parte de la señora DORENI PALMA, quien solicita ampliar un plazo de 7 días hábiles en la entrega de la documentación requerida para la construcción del tanque elevado, con el tiempo establecido no ha sido posible la consecución de la documentación". Fecha de recibido: 20/11/2021. **Estado Cerrada**. Fecha de Cierre: 21/11/2021.

ISQR No. 37. Solicitud-Abogado Gustavo Granados Monroy apoderado de los señores Gustavo Guerra Borja presidente de la asociación ASOTECG y José Gregorio Rangel Herrera relacionada, donde solicitan reunión urgente con miembros de la comunidad laboral y prestadores de bienes y servicios, para lo cual requieren la presencia del área social, jurídica y administrativa de la UT SERCOMADI y representante de la ANH, Institucionalidad, gremios y fuerzas vivas, entre otros. Fecha de recibido:27/11/2021. **Estado: Abierta.**

PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL:

En cumplimiento de compromisos de acta, el área administrativa informa que se recibieron de las hermanas Vega y del grupo de promotoras de los bloqueos las siguientes propuestas económicas:

Servicio de Seguridad y Vigilancia, empresa externa la cual excede los valores regionales; la propuesta se encuentra en revisión por parte del área jurídica de UT SERCOMADI.

Ferretería, Auri Estela Vega, presenta una carta personal informando que tiene una ferretería, enlista diez productos para la suministrar, sin sus precios.

Hidratación: La señora Beatriz, vecina del predio del pozo, presentó oferta para suministro de hidratación, no presenta portafolio.

Servicio de Transportes: solamente se ha recibido una propuesta con la documentación en regla, del señor José Rangel, Consorcio servicios de transporte especial. Los empresarios que participaron de las mesas de trabajo: CoooNorte –William Gutiérrez –El Banco, Jorge Cadena, Trasurmag de Yonnis Pedrozo Pérez y Transporte K´TOTO – Adrián Yepes, no presentaron sus propuestas/portafolios de servicios.

Servicio de alimentación: se recibió una única oferta del Restaurante Donde Mario. Los demás restaurantes que participaron de la mesa de trabajo, no presentaron su propuesta: Restaurante K-Nela, Restaurante Debut y Restaurante El Arca (Representante, Diana Vega).

Administradora UT SERCOMADI manifiesta que no se recibió ninguna propuesta para servicio de hospedaje.

ALARMA O EVENTOS:

En seguimiento a los acuerdos para el levantamiento del bloqueo del 2 de septiembre y del 18 de octubre respecto al mantenimiento de la vía pública Guamal - Astrea (km 14), la UT SERCOMADI finalizó el primer mantenimiento a puntos críticos de la vía, realizando actividades como: conformación, nivelación, compactación de material y cuneteo de la banca. Para su recibo y verificación se realizó un recorrido desde el KM1, Cabecera municipal de Guamal, hasta el KM 14, vía Astrea, sitio de ubicación de la locación, con el acompañamiento del secretario de Planeación, Presidente del Comité Veedor y los líderes de JAC de Km14 y Km17 y San José de Paraco, junto con el área social e ingeniero civil de la UT SERCOMADI. Durante el recorrido se revisó el estado en el cual quedó la vía después

de realizado el mantenimiento a puntos críticos. No obstante, durante el recorrido se escucharon las siguientes inquietudes: Falta de riego durante la movilización. Exceso de velocidad de las volquetas, cama altas y camas bajas que salen vacías desde locación, situación que quedó en manos de UT SERCOMADI.

Nuevamente las señoras Auri Estela Vega, Dorenis Palma, Anabí Jiménez Rivera y el señor Óscar Guzmán de la vereda San Juan de Dios, KM14, bloquearon el ingreso a la Plataforma del pozo ANH-Pailitas 1-X, el día 5 de noviembre, desde las 7 de la mañana impidiendo el ingreso de los trabajadores de obra civil. Sin embargo, Sobre las 8:45 am hacen presencia en el sitio dos representantes de la SIJIN logrando desbloquear el acceso a Plataforma y por lo tanto el ingreso de los trabajadores.

Los días 7,8 y 9 de noviembre las mismas personas mencionadas en el párrafo anterior, bloquearon nuevamente el ingreso a la plataforma. Después de varios acercamientos por parte de los profesionales de UT SERCOMADI, finalmente, el 9 de noviembre se hace nuevo acercamiento con las hermanas Vega en otro intento de persuadir a su pequeño grupo para que desistieran del bloqueo al acceso de la Plataforma. Este evento fue acompañado por las autoridades de policía del Banco Magdalena, Ejército Nacional, alcalde, Inspectora de Policía, secretario de Gobierno y Personero del municipio de Guamal, director de Operaciones de UT SERCOMADI y su equipo de trabajo (Civil, Social, HSE, Seguridad Física, Administrativo) y los trabajadores. Se resalta la presencia de un numeroso grupo de pobladores del KM14 y Corregimientos del AID vecinos. El Personero inicia el acercamiento indagando sobre las razones del bloqueo encontrándose como respuesta aparente incumplimiento al Acta de acuerdos de Mompox, solicita copia del mismo, lo lee en público y UT SERCOMADI genera la respuesta respectiva a cada punto. Una vez finalizada esta actividad el Personero invita a elaborar un documento legible y a estampar la firma del grupo de manifestantes, así como de todos los demás participantes. Las hermanas vega se negaron manifestando que la firma de ese documento debería ser en Cabecera municipal de Guamal, causando la molestia y rechazo de los asistentes como de autoridades. Por lo tanto, en sitio se elabora un acta a mano alzada, se leen nuevamente los compromisos y nuevamente las hermanas vega y sus pocos acompañantes se niegan a su firma, así como a cumplir el compromiso inicial de desbloquear el acceso a plataforma después de firmado el documento. Ante la persistencia de la situación, el Personero municipal hace el último intento de invitar pacíficamente a los manifestantes a retirarse del acceso a la plataforma llamándolos a la cordura para evitar procesos policivos; al no ser escuchado decide nuevamente darse por vencido y se retira para que la autoridad militar realizara lo pertinente. Sobre las 4:01 pm inicia el desalojo de los manifestantes de manera pacífica por parte de la Policía Nacional quien inicia con el retiro de las barricadas generándose una situación de agresiones verbales hacia las autoridades; evento finalizando con la captura de la señora Auri Estela Vega y el hijo de la señora Beatriz Chamorro quien con actitud violenta y agresiva puso resistencia para su retiro de la puerta de ingreso generándose su captura. Sobre las 4:40 p.m. ingresan los trabajadores a la Locación, así como los equipos y vehículos que se encontraban sobre la vía.

INVERSION SOCIAL

Con el fin de continuar con los proyectos de emprendimiento productivo de género, se hizo acercamiento con el Coordinador del Centro Empresarial Agropecuario (antigua UMATA) señor Juan Lara, a fin de solicitar su apoyo/colaboración con la materialización de los

mismos. Al respecto manifestó que no contaba con personal de apoyo en su institución, sin embargo, sugirió contactar con empresas privadas, suministrando contacto de algunos profesionales.

La secretaria de la JAC de los Andes entregó copia de cotización del proyecto de Inversión Social mejoramiento y adecuación de parques para el Corregimiento, por valor de $129.996,558.

El presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Juan de Dios km14, señor Nelcido Cortés se acercó a la oficina de la UT SERCOMADI para informar sobre reunión con alcalde municipal, surgiendo la idea de activar un tanque elevado que fue construido hace unos años atrás y el cual no está habilitado. La propuesta no fue aprobada por la comunidad. Se realizó una segunda reunión para definir con la comunidad el proyecto de inversión social. Nuevamente se informa que, para materializar el primer proyecto priorizado, tanque de almacenamiento de agua, deben cumplirse unos requisitos: propiedad del terreno donde está el pozo actualmente, especificaciones técnicas del pozo para el tema de posible cambio de la electro bomba, los permisos de concesión de agua de la Corporación Autónoma-CORPAMAG, escrituras del terreno donde quedaría el tanque y demás documentación legal. Dado lo anterior, se informó nuevamente que, la optimización del acueducto no era viable. Se revisa la segunda opción priorizada por parte de la comunidad, que consiste en la entrega de una electro bomba sumergible estilo lapicero, paneles solares para cambiar el sistema de energía del acueducto, tanque de almacenamiento de agua para cada una de las viviendas y tubería para las viviendas que no cuentan actualmente con conexión al sistema de acueducto.

UT SERCOMADI durante reunión con la comunidad de la vereda Sabanas de Marañón a fin de informar sobre la imposibilidad de realizar el proyecto de inversión social priorizado, debido a temas legales y jurídicos especialmente en el aspecto predial; según indicaciones de reunión realizada de la que participaron ENTerritorio, UT SERCOMADI e Interventoría con el área jurídica. Durante la reunión con la comunidad de Sabanas de Marañón se recuerda el monto de inversión ($50.000. 000.oo), se analizaron las alternativas priorizadas: mejoramiento del sistema de acueducto, con panel solar, concluyéndose que el pozo de agua presenta problemas técnicos y de legalización de predios. La segunda alternativa mejoramiento del salón comunal, encontrándose que el predio en el cual se encuentra construido actualmente, no es de propiedad de la JAC; dotación de la iglesia, la cual se considera excluyente y finalmente, el alumbrado público, competencia del estado. Ante la no viabilidad de las alternativas priorizadas, se revisa conjuntamente la necesidad sentida (suministro de agua) y los problemas de salud por falta de la misma y/o su inadecuado consumo, revisándose/acordándose la dotación de cada vivienda con un tanque para almacenamiento de agua y un filtro de agua. Adicionalmente, para servicio de la comunidad ante los constantes cortes de energía eléctrica, solicitaron una planta eléctrica y una electrobomba. Se resalta que en ese momento se delega el comité encargado de hacer seguimiento al proyecto de inversión y de cotizar los elementos solicitados; quienes entregarán por lo menos dos cotizaciones.

Con respecto al programa de emprendimiento productivo de género, el Corregimiento de San José de Paraco, quien ya finalizó con el SENA la etapa de teoría del proyecto cerdos de cría. Se les solicitó presentar proyecto con cotización.

UT SERCOMADI realizó reunión con el grupo de mujeres de la vereda San Juan de Dios KM14, con el fin de definir el proyecto de emprendimiento productivo. Dicha reunión fue

dirigida por un médico veterinario de la Asociación Para el Desarrollo Agropecuario y el Medio Ambiente (AGROATE), referido por el profesional de la antigua UMATA quien apoyó con información pertinente para la posible materialización de la iniciativa. Asistieron 30 mujeres, aunque se leyó un listado de 40 mujeres aproximadamente.

Se realizó reunión con el grupo de mujeres del Corregimiento de Los Andes, interesadas en el proyecto productivo de modistería y belleza básica. Así las cosas, realizan el conversatorio con las interesadas en el tema de modistería, resaltándose que son 25 de ellas. Durante la reunión, la instructora de modistería informó sobre los contenidos de su curso los cuales constan de 12 módulos con una duración de mes y medio. La instructora manifestó que una vez reiniciara el SENA el próximo año, se comprometía a gestionar un curso de costura para ellas, con el fin de lograr la certificación.

Acompañamiento durante reuniones de seguimiento con la vereda Sabanas de Marañón para materialización del proyecto de emprendimiento de género (cría de cerdos).

Se realizó reunión virtual de seguimiento y avance de los proyectos de emprendimiento productivo y los Plan de Inversión Social, con Supervisión Social de ENTerritorio, Equipo social UT Sercomadi e Interventoría, con la finalidad de verificar el avance en los respectivos procesos. Se acuerda: 1. Realizar nueva reunión con la vereda Sabana de Marañón para re definir el proyecto de inversión social. 2. Realizar cotizaciones de los proyectos. 3. Iniciar el diligenciamiento de las fichas del Plan de Inversión Social; fichas de emprendimiento de género; actualizar matriz de proyecto de inversión social, matriz de emprendimiento y de cotizaciones.

Con la asistencia de Interventoría Social, el equipo social de la UT elabora las fichas de Inversión social por vereda, avance en la Matriz de PIS y de Emprendimiento Género Mujer Rural Proyectos Productivos, continuando con la retroalimentación de la información Matrices, actualizando la Matriz PIS y Proyectos de Emprendimiento de Género, y revisión de cotizaciones.

SEGUIMIENTO AL ACTA DE ACUERDOS DE MOMPOX

Seguimiento a compromisos de Acta de acuerdos de Mompox: La UT SERCOMADI radicó oficio UTS-S-225-21 Pailitas 1-X, dirigido a las Junta de Acción Comunal-JAC del KM14, San José de Paraco, Los Andes, Sabanas de Marañón, además se radico ante las autoridades del municipio alcalde, Personero municipal y Veeduría Ciudadana. En respuesta a los siguientes puntos del Pliego de Peticiones: **1**. La comunidad solicita que de ser necesario un terreno donde almacenar la química ellos lo tienen. **2**. La empresa se compromete a hacer llegar a la comunidad en un comunicado el manejo que se le va a dar a la inversión social y los porcentajes… **3**. Ingeniero Ambiental, se abre la posibilidad de hacer la pasantía en Bogotá. **4.** Dentro de los compromisos el señor Alex Yepes manifiesta que ayudará a conseguir apoyo de CAJAMAG para registrar las hojas de vida. **5.** La comunidad solicita el servicio de alimentación, lavandería y hospedaje para el personal que vivirá en el pueblo. La comunidad se compromete a hacer llegar los documentos legales del restaurante que lo asumirá. **6.** La empresa se compromete a entregar a la comunidad de la vereda km 14 el suministro de agua potable, transporte de residuos líquidos, la camioneta y la ambulancia, de esta última será previo acuerdo comercial en costos. Los carrotanques serán doble troques. **7.** La comunidad solicita participación en la hidratación y hielo, y se les hará parte para la convocatoria. **8**. La UT revisará la hoja de vida de 2

ingenieros civiles que hay en la comunidad. **9.** El Sindicato propone que se establezcan mesas de diálogo y seguimiento para el desarrollo de los compromisos. **10.** La comunidad solicita unos viajes de material para adecuar un quiosco para tener una tienda.

En cumplimiento de uno de los compromisos del acta de acuerdos con comunidad de KM14, Interventoría social y área social de UT SERCOMADI junto con asesores de CAJAMAG (Coordinador de Centro de Empleo, un Gestor Empresarial, Psicóloga de Intermediación Laboral y un Auditor), se desplazaron durante dos jornadas hacia el KM 14, para apoyar con el Registro y Postulación de los interesados a las vacantes ofertadas para auxiliar vial y casino (mesera, auxiliar de cocina, lava loza y camarera).

En cumplimiento a compromisos de Acta de Mompox, UT SERCOMADI realizó la celebración día de los niños de las comunidades del área de influencia directa del proyecto Pozo ANH-Pailitas-1-X. Veredas San Juan de Dios km 14 y Vereda Sabanas de Marañón y Corregimientos Los Andes y San José de Paraco.

En cumplimiento a compromiso de ACTA de Mompox, UT SERCOMADI hizo entrega materiales de construcción para la adecuación de la Institución Educativa San Juan de Dios km 14 San Juan de Dios km 14.

En cumplimiento a compromiso de Acta de Mompox, UT SERCOMADI desarrollo la Brigada de Salud Oral en horas de la mañana en la caseta del km 14 con los niños del Corregimiento de San José de Paraco, los Andes y veredas San Juan de Dios), concurriendo un promedio aproximado de 100 personas incluye niños, con un horario de 08 a.m. a 12 días. En horas de la tarde 02 p.m. a 5 p.m. se realizó la actividad en la vereda Sabanas de Marañón contando con una asistencia de 69 personas aproximadamente incluyendo niños.

REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN SOCIAL

			
Foto No. 3	Fecha: 02/11/2021 Lugar: Oficina de Interventoría Actividad: Reunión seguimiento al proyecto Observación: Revisión actividades pendientes	Foto No. 4	Fecha: 02 /11/2021 Lugar: Despacho alcalde Actividad: Reunión Seguimiento Vía Observación: Información sobre disponibilidad trabajos vía

			
Foto No.5	Fecha:02/11/2021 Lugar: Oficina de Interventoría Actividad: Información Observación: Radicación oficio Veeduría Ciudadana	Foto No.6	Fecha:02/11/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Atención comunidad Observación: Información sobre contratación de Benes y Servicios

			
Foto No. 7	Fecha: 03/11/2021 Lugar: Oficina de UT Sercomadi Actividad: Reunión Inducción de personal Observación: Divulgación Plan de Gestión Social y Divulgación de DD HH	Foto No. 8	Fecha: 03 /11/2021 Lugar: Oficina de UT Sercomadi Actividad: Conversatorio con PJAC vereda km14 Nelcido Cortés Observación: Información sobre reunión con la comunidad tema del proyecto de Inversión Social vereda

			
Foto No. 9	Fecha: 04/11/2021 Lugar: Oficina de Interventoría Actividad: Reunión seguimiento Observación: Revisión de actividades	Foto No. 10	Fecha: 04 /11/2021 Lugar: Restaurante de K´nela Actividad: Conversatorio Observación: Revisión de Propuesta

			
Foto No. 9	Fecha: 04/11/2021 Lugar: Oficina de UT Sercomadi Actividad: Atención comunidad Observación: Entrega de convocatoria a Asociación de representantes de Guamal	Foto No. 10	Fecha: 05/11/2021 Lugar: Casa secretaria JAC San José de Paraco Actividad: Conversatorio Observación: Tema emprendimiento productivo de género

			
Foto No.14	Fecha: 0511/2021 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Emprendimiento productivo de género Observación: Recorrido por huerta casera	Foto No.15	Fecha: 0511/2021 Lugar: Sabanas de Marañón KM8 Actividad: Mantenimiento tramo de vía Observación: Panorámica de vía

			
Foto No. 16	Fecha: 0511/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Bloqueo tres personas de la vereda Observación: Bloqueo ingreso a Plataforma	Foto No. 17	Fecha: 0511/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Acceso a plataforma desbloqueada. Observación: Comunidad reunida en horas de la tarde al costado izquierdo de ingreso a plataforma


			
Foto No. 18	Fecha: 06/11/2021 Lugar: Guamal -Magdalena Actividad: Comunicado No.001 Observación: Publicación en emisora local Guamalera OnLine	Foto No. 19	Fecha: 06/11/2021 Lugar: Cruce hacia Urquijo, KM9 A KM10. Actividad: Reconformación y cuneteo de la banca de la vía Observación: Cumplimiento contrato y acuerdos

			
Foto No.20	Fecha: 06/11/2021 Lugar: Plataforma Pailitas 1-X Actividad: Personal laborando Observación: Acompañamiento del Ejército Nacional	Foto No.21	Fecha: 06/11/2021 Lugar: Guamal-Magdalena Actividad: Publicación en redes Observación: Inconformidad de un ciudadano en contra de Alex Yépez, vicepresidente del Comité Veedor

			
Foto No. 22	Fecha: 07/11/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Trabajadores fuera de locación. Observación: Bloqueo al acceso de la plataforma	Foto No.23	Fecha: 07/11/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Trabajadores fuera de locación. Observación: Bloqueo al acceso de la plataforma

		
Foto No. 24	Fecha: 08/11/2021 Lugar: Parque Central-Guamal Actividad: Comunidad organizándose para expresarse a favor del proyecto Observación: Líderes e KM14, San José de Paraco, Los Andes, Sabanas de Marañón y Guamal	Foto No.25	Fecha: 08/11/2021 Lugar: Publicación en Facebook Actividad: Alex Yépez denunciando al presidente de la JAC de Km14 Observación: En respuesta a comunicado de la JAC de KM14 refiriendo que Alex Yépez es no grato en KM14

			
Foto No. 26	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Intento de desbloqueo	Foto No.27	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Panorámica

			
Foto No. 28	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Presencia Policía Nacional	Foto No.29	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Presencia del Ejército Nacional

			
Foto No. 30	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Presencia Policía Nacional	Foto No.31	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Presencia del Ejército Nacional

			
Foto No. 32	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Inspectora de Policía firmando el Acta	Foto No.33	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Personero y secretario de Gobierno en último intento de persuadir a los manifestantes a retirarse del acceso a plataforma

			
Foto No. 34	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Inicio desalojo de personal y barricadas	Foto No.35	Fecha: 09/11/2021 Lugar: KM14 Actividad: Acción de hecho por parte de la familia Vega Arnache Observación: Ingreso de trabajadores de UT SERCOMADI a Locación

			
Foto No. 36	Fecha: 10/11/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Atención a comunidad Observación: Solicitud de información de vacantes	Foto No. 37	Fecha: 10/11/2021 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Emprendimiento productivo Observación: Capacitación SENA

			
Foto No. 38	Fecha: 11/11/2021 Lugar: KM 14, CE San Juan de Dios Actividad: Segunda jornada de Registro e inscripción Observación: Postulación a vacantes de Auxiliar Vial y Casino (mesera, auxiliar de cocina, stewar, Camarera)	Foto No.39	Fecha: 11/11/2021 Lugar: KM 14, CE San Juan de Dios Actividad: Segunda jornada de Registro e inscripción Observación: Postulación a vacantes de Auxiliar Vial y Casino (mesera, auxiliar de cocina, stewar, Camarera)

			
Foto No. 40	Fecha: 11/11/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Contacto con Odontólogo Observación: Coordinar jornada de salud oral en KM14	Foto No.41	Fecha: 11/11/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Atención a la comunidad Observación: Información sobre oferta laboral

			
Foto No. 42	Fecha: 12/11/2021 Lugar: Centro Empresarial Agropecuario (antes UMATA) Actividad: Conversatorio tema capacitación emprendimiento de género Observación:	Foto No.43	Fecha: 12/11/2021 Lugar: Oficina UT SERCOMADI Actividad: Atención a comunidad Observación: Solicitud de información sobre el tema laboral

			
Foto No. 44	Fecha: 12/11/2021 Lugar: Vía Guamal-Astrea KM 2-3-4 Actividad: Mantenimiento tramos críticos Observación: Mantenimiento según contrato (durante el proyecto)	Foto No.45	Fecha: 12/11/2021 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Conversatorio comunidad e instructor del SENA Observación: Finaliza etapa de teoría/capacitación proyecto de género
			
Foto No. 46	Fecha: 13/11/2021 Lugar: KM 14 Actividad: Mantenimiento puntual de vía Observación: conformación, nivelación, compactación de material y cuneteo de la banca de la vía	Foto No.47	Fecha: 13/11/2021 Lugar: Locación Pozo Estratigráfico Actividad: Recorrido a la vía con autoridad y líderes de comunidad Observación: Revisión estado final de la vía (mantenimiento durante la operación)

			
Foto No. 48	Fecha: 14/11/2021 Lugar: KM 14, vereda San Juan de Dios Actividad: Reunión informativa Emprendimiento de género Observación: Definición proyecto	Foto No.49	Fecha: 15/11/2021 Lugar: KM 14, vereda San Juan de Dios Actividad: Reunión de definición PIS Observación: Panorámica comunidad

			
Foto No.50	Fecha: 16/11/2021 Lugar: KM 17, Corregimiento Los Andes. Actividad: Reunión para coordinar capacitación emprendimiento productivo (modistería) Observación: Parte del grupo de mujeres interesado	Foto No.51	Fecha: 16/11/2021 Lugar: Oficina de UT SERCOMADI Actividad: Solicitud participación laboral Observación: Wendy Vega, Doreny Palma informando que una candidata seleccionada para RM no es del KM14.

			
Foto No. 52	Fecha: 17/11/2021 Lugar: Corregimiento San José de Paraco. Actividad: Reunión de Seguimiento del proyecto de emprendimiento de Mujeres Observación: Grupo de mujeres que participan en el proyecto	Foto No.53	Fecha: 17/11/2021 Lugar: KM 14, Actividad: Entrega convocatoria vigilante Observación: Postulación al cargo por CAJAMAG

			
Foto No. 54	Fecha: 17/11/2021 Lugar: KM 14 Actividad: Socialización empresa Vigilancia y Seguridad AMCOVIT Ltda. Observación: Requisitos del cargo	Foto No.55	Fecha: 17/11/2021 Lugar: vereda Sabanas de Marañón Actividad: Reunión Información Observación: Socialización de la convocatoria cargo vigilancia y seguimiento proyectos de emprendimiento, Inversión Social

 			
Foto No. 56	Fecha: 17/11/2021 Lugar: km 14 Actividad: Entrega de Materiales a la vereda km 14 Observación: Materiales adecuación Centro educativo San Juan de Dios	Foto No. 57	Fecha: 17/11/2021 Lugar: Vía Guamal-Astrea Actividad: seguimiento ISQR Observación: entrada vivienda Dulys Alvear

			
Foto No. 58	Fecha: 18/11/2021 Lugar: Corregimiento de los Andes. Actividad: Reunión de Emprendimiento de Mujeres Observación: Grupo de Modistería	Foto No. 59	Fecha: 18/11/2021 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Reunión de Seguimiento del proyecto de emprendimiento de Mujeres Observación: Grupo de Peluquería y Belleza

			
Foto No. 60	Fecha: 18/11/2021 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Recepción cotización del ing. Civil contratista proyecto adecuación parque Observación: Proyecto de Inversión Socia de los Andes	Foto No. 61	Fecha: 19/11/2021 Lugar: Oficina de la UT Sercomadi Actividad: visita presidente junta comunal de Sabanas de Marañón Observación: Inversión social

 		 	
Foto No. 62	Fecha: 19/11/2021 Lugar: Sede educativa Km14 María Auxiliadora de San Juan de Dios Actividad: Entrega total de materiales para adecuación de la institución educativa.	Foto No. 63	Fecha: 19/11/2021 Lugar: Sede educativa Km14 María Auxiliadora de San Juan de Dios Actividad: Entrega total de materiales para adecuación de la institución educativa.

			
Foto No. 64	Fecha: 20/11/2021 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Reunión seguimiento Observación: Proyecto de Inversión social	Foto No. 65	Fecha: 20/11/2021 Lugar: Caseta vereda San Juan de Dios km 14 Actividad: Presentación empresa de seguridad los Andes Observación: Socialización empresa e información postulaciones 22 y 23 de noviembre

			
Foto No.66	Fecha: 21/11/2021 Lugar: Vereda Sabanas de Marañón Actividad: Visita comunidad Marañón Observación: Atención solicitud de la comunidad tema de la Bomba del pozo que se desplomo por la vibración del paso de la maquinaria.	Foto No.67	Fecha: 22/11/2021 Lugar: Oficina de la UT Sercomadi Actividad: Revisión de acuerdos Observación: Revisión tema Laboral

			
Foto No.68	Fecha: 22/11/2021 Lugar: Oficina de la UT Sercomadi Actividad: Inversión Social Observación: Documentación requerida proyectos	Foto No.69	Fecha: 22/11/2021 Lugar: Km 14 Actividad: Entrega código vacantes seguridad y vigilancia Observación: Convocatoria laboral

			
Foto No. 70	Fecha: 23/11/2021 Lugar: Vereda Sabanas de Marañón Actividad: presentación de la firma AGROATEC (Asociación para el desarrollo Agropecuario y el Medio Ambiente Observación: Proyecto de Emprendimiento de Género	Foto No.71	Fecha: 23/11/2021 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Apertura curso de Peluquería y Belleza Básica Observación: Proyecto de Emprendimiento de Género

 		AHORA  ANTES 	
Foto No.72	Fecha: 24/11/2021 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Apertura curso de Modistería Básica Observación: Proyecto de Emprendimiento de Género	Foto No.73	Fecha: 24/11/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios km 14 Actividad: Cierre Queja Sr. Duby Alvear Observación: Programa de Atención ISQR

		 	
Foto No.74	Fecha: 24/11/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios km 14 Actividad: Cierre Queja Sr. Duby Alvear Observación: Programa de Atención ISQR	Foto No.75	Fecha: 25/11/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios km 14 Actividad: Reunión de seguimiento proyecto productivo Observación: Pollos de Engorde

			
Foto No. 76	Fecha: 26/11/2021 Lugar: Oficina de la UT Sercomadi Actividad: Atención PJAC vereda San Juan de Dios km14 Observación: Proyecto de Inversión Social	Foto No.77	Fecha: 26/11/2021 Lugar: Oficina de la UT Sercomadi Actividad: Revisión información entregada instructora de Modistería Observación: Proyecto de Emprendimiento de Mujeres
			
Foto No. 78	Fecha: 27/11/2021 Lugar: vereda San Juan de Dios Actividad: Brigada de Salud Oral con los niños de las veredas AID Observación: Cumplimiento a uno de los acuerdos del pasado 18 de octubre Mesas de Trabajo en Mompox	Foto No. 79	Fecha: 27/11/2021 Lugar: vereda Sabanas de Marañón Actividad: Brigada de Salud Oral con los niños de las veredas Observación: Cumplimiento a uno de los acuerdos del pasado 18 de octubre Mesas de Trabajo en Mompox

		 	
Foto No.80	Fecha: 2971172021 Lugar: Virtual Actividad: Reunión seguimiento Inversión social, con interventoría y equipo social UT SERCOMADI	Foto No. 81	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Vereda Sabanas de Marañón. Tienda La Central Actividad: Publicación Vacante Objetivo: Informar sobre la oferta laboral

			
Foto No. 82	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Radicación convocatoria a la secretaria de la JAC Objetivo: Divulgación de vacantes	Foto No.83	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Vereda San Juan de Dios KM14 Actividad: Radicación convocatoria Al presidente de la JAC Objetivo: Divulgación de vacantes

			
Foto No. 84	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Corregimiento Los Andes Actividad: Capacitación en belleza Objetivo: cumplimiento/seguimiento a emprendimiento productivo de género	Foto No.85	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Corregimiento Los Andes Actividad: Capacitación en belleza Objetivo: cumplimiento/seguimiento a emprendimiento productivo de género. Instructora enseñando.

			
Foto No. 86	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Vereda Sabanas de Marañón Actividad: Revisión propuestas de inversión social Objetivo: Redefinir proyecto de inversión social	Foto No. 87	Fecha: 30/11/2021 Lugar: Vereda Sabanas de Marañón Actividad: Revisión propuestas de inversión social Objetivo: Redefinir proyecto de inversión social

INFORME MENSUAL HS

Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades.

- **HSEQ**

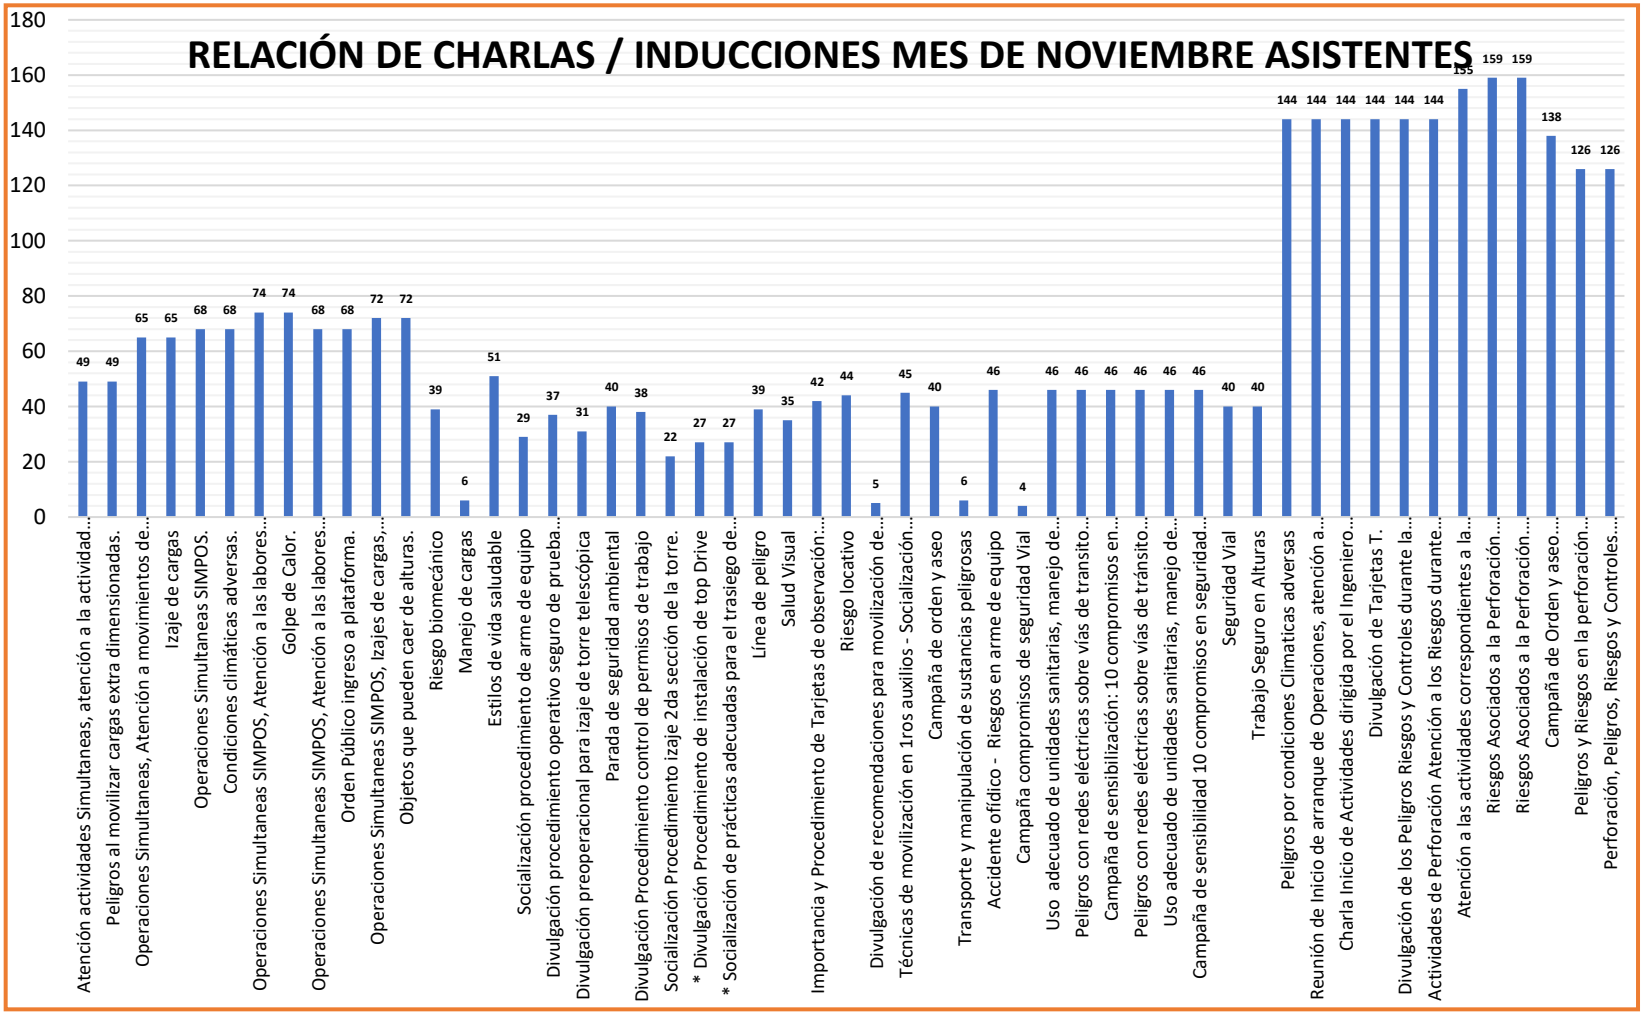
1. Se realizan Charlas de HSEQ.

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES MES DE NOVIEMBRE				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
1	Atención actividades Simultaneas, atención a la actividad que estoy desarrollando.	1/11/2021	0:15:00	49
2	Peligros al movilizar cargas extra dimensionadas.	1/11/2021	0:15:00	49
3	Operaciones Simultaneas, Atención a movimientos de cargas, Obras Civiles y sus riesgos, Movimientos de material y descapote.	2/11/2021	0:15:00	65
4	Izaje de cargas	2/11/2021	0:15:00	65
5	Operaciones Simultaneas SIMPOS.	3/11/2021	0:15:00	68
6	Condiciones climáticas adversas.	3/11/2021	0:15:00	68
7	Operaciones Simultaneas SIMPOS, Atención a las labores a desarrollar Civil y Operación de arme de Equipo.	4/11/2021	0:15:00	74
8	Golpe de Calor.	4/11/2021	0:15:00	74
9	Operaciones Simultaneas SIMPOS, Atención a las labores a desarrollar perfilado de cunetas para manejo de aguas lluvias, mantenimiento de vía pública. Movimiento de equipos con Izajes incluidos.	5/11/2021	0:15:00	68
10	Orden Público ingreso a plataforma.	5/11/2021	0:15:00	68
11	Operaciones Simultaneas SIMPOS, Izajes de cargas, movimiento de cargas en tracto camión, canales de aguas lluvias, repaleo.	6/11/2021	0:15:00	72
12	Objetos que pueden caer de alturas.	6/11/2021	0:15:00	72
13	Riesgo biomecánico	7/11/2021	0:15:00	39
14	Manejo de cargas	8/11/2021	0:15:00	6
15	Estilos de vida saludable	9/11/2021	0:20:00	51
16	Socialización procedimiento de arme de equipo	10/11/2021	0:15:00	29
17	Divulgación procedimiento operativo seguro de prueba de anclajes en la locación	11/11/2021	0:15:00	37
18	Divulgación preoperacional para izaje de torre telescópica	11/11/2021	0:15:00	31
19	Parada de seguridad ambiental	11/11/2021	0:30:00	40

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES MES DE NOVIEMBRE				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
20	Divulgación Procedimiento control de permisos de trabajo	12/11/2021	0:20:00	38
21	Socialización Procedimiento izaje 2da sección de la torre.	12/11/2021	0:15:00	22
22	* Divulgación Procedimiento de instalación de top Drive	13/11/2021	0:20:00	27
23	* Socialización de prácticas adecuadas para el trasiego de combustible	13/11/2021	0:20:00	27
24	Línea de peligro	14/11/2021	0:15:00	39
25	Salud Visual	15/11/2021	0:15:00	35
26	Importancia y Procedimiento de Tarjetas de observación: actos y condiciones inseguras, incidentes y ambiental.	16/11/2021	0:20:00	42
27	Riesgo locativo	17/11/2021	0:15:00	44
28	Divulgación de recomendaciones para movilización de cargas de terceras compañías	18/11/2021	0:15:00	5
29	Técnicas de movilización en 1ros auxilios - Socialización restricción de transporte de combustible en camionetas de la operación	18/11/2021	0:25:00	45
30	Campaña de orden y aseo	19/11/2021	0:15:00	40
31	Transporte y manipulación de sustancias peligrosas	19/11/2021	0:15:00	6
32	Accidente ofídico - Riesgos en arme de equipo	20/11/2021	0:15:00	46
33	Campaña compromisos de seguridad Vial	20/11/2021	0:20:00	4
34	Uso adecuado de unidades sanitarias, manejo de residuos sólidos, protección recurso hídrico.	21/11/2021	0:15:00	46
35	Peligros con redes eléctricas sobre vías de tránsito vehicular.	21/11/2021	0:15:00	46
36	Campaña de sensibilización: 10 compromisos en seguridad vial	21/11/2021	0:15:00	46
37	Peligros con redes eléctricas sobre vías de tránsito vehicular. con el personal conductor.	22/11/2021	0:15:00	46
38	Uso adecuado de unidades sanitarias, manejo de Residuos Sólidos, Protección de Recursos Hídricos.	22/11/2021	0:15:00	46
39	Campaña de sensibilidad 10 compromisos en seguridad vial.	22/11/2021	0:15:00	46
40	Seguridad Vial	22/11/2021	0:15:00	40

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES MES DE NOVIEMBRE				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
41	Trabajo Seguro en Alturas	22/11/2021	0:15:00	40
42	Peligros por condiciones Climáticas adversas	23/11/2021	0:15:00	144
43	Reunión de Inicio de arranque de Operaciones, atención a las labores a desarrollar.	24/11/2021	0:15:00	144
44	Charla Inicio de Actividades dirigida por el Ingeniero director del Proyecto Luis Castillo.	24/11/2021	0:15:00	144
45	Divulgación de Tarjetas T.	24/11/2021	0:15:00	144
46	Divulgación de los Peligros Riesgos y Controles durante la actividad de Perforación.	24/11/2021	0:15:00	144
47	Actividades de Perforación Atención a los Riesgos durante las distintas Actividades.	24/11/2021	0:15:00	144
48	Atención a las actividades correspondientes a la Perforación. Ojo Atrapamiento. Uso apropiado de los EPP. Pre Turno 6:00 AM - 14:000 pm - 10:000 pm	25/11/2021	0:15:00	155
49	Riesgos Asociados a la Perforación. Planificar el Trabajo antes de ejecutarlo Atrapamiento por equipos de Rotación o en movimiento. Uso obligatorio de EPP. Pre Turno 6:00 AM - 14:000 pm - 10:000 pm	26/11/2021	0:15:00	159
50	Riesgos Asociados a la Perforación. Etapa de Cementación, Revestimiento y Corte, Corrida de Casing. Prevención y cuidado con los Ojos, Use sus EPP Prevención de falla y daño en los Equipos. Pre Turno 6:00 AM - 14:000 pm - 10:000 pm	27/11/2021	0:15:00	159
51	Campaña de Orden y aseo. Hojas de seguridad. Medidas de prevención de Covid 19 lavado de manos.	28/11/2021	0:15:00	138
52	Peligros y Riesgos en la perforación Uso de herramientas o equipos con partes en movimiento Operaciones con sustancias peligrosas. Operación de maquinaria en superficie (Grúas, Tractores, etc.).	29/11/2021	0:15:00	126
53	Perforación, Peligros, Riesgos y Controles. Perforación, Peligros, Riesgos y Controles. Salud publica Variante ONICROM) Covid 19. Trabajo en Equipo.	30/11/2021	0:15:00	126

Relación de Charlas e Inducciones del mes de noviembre.



Inspecciones y Preoperacionales.

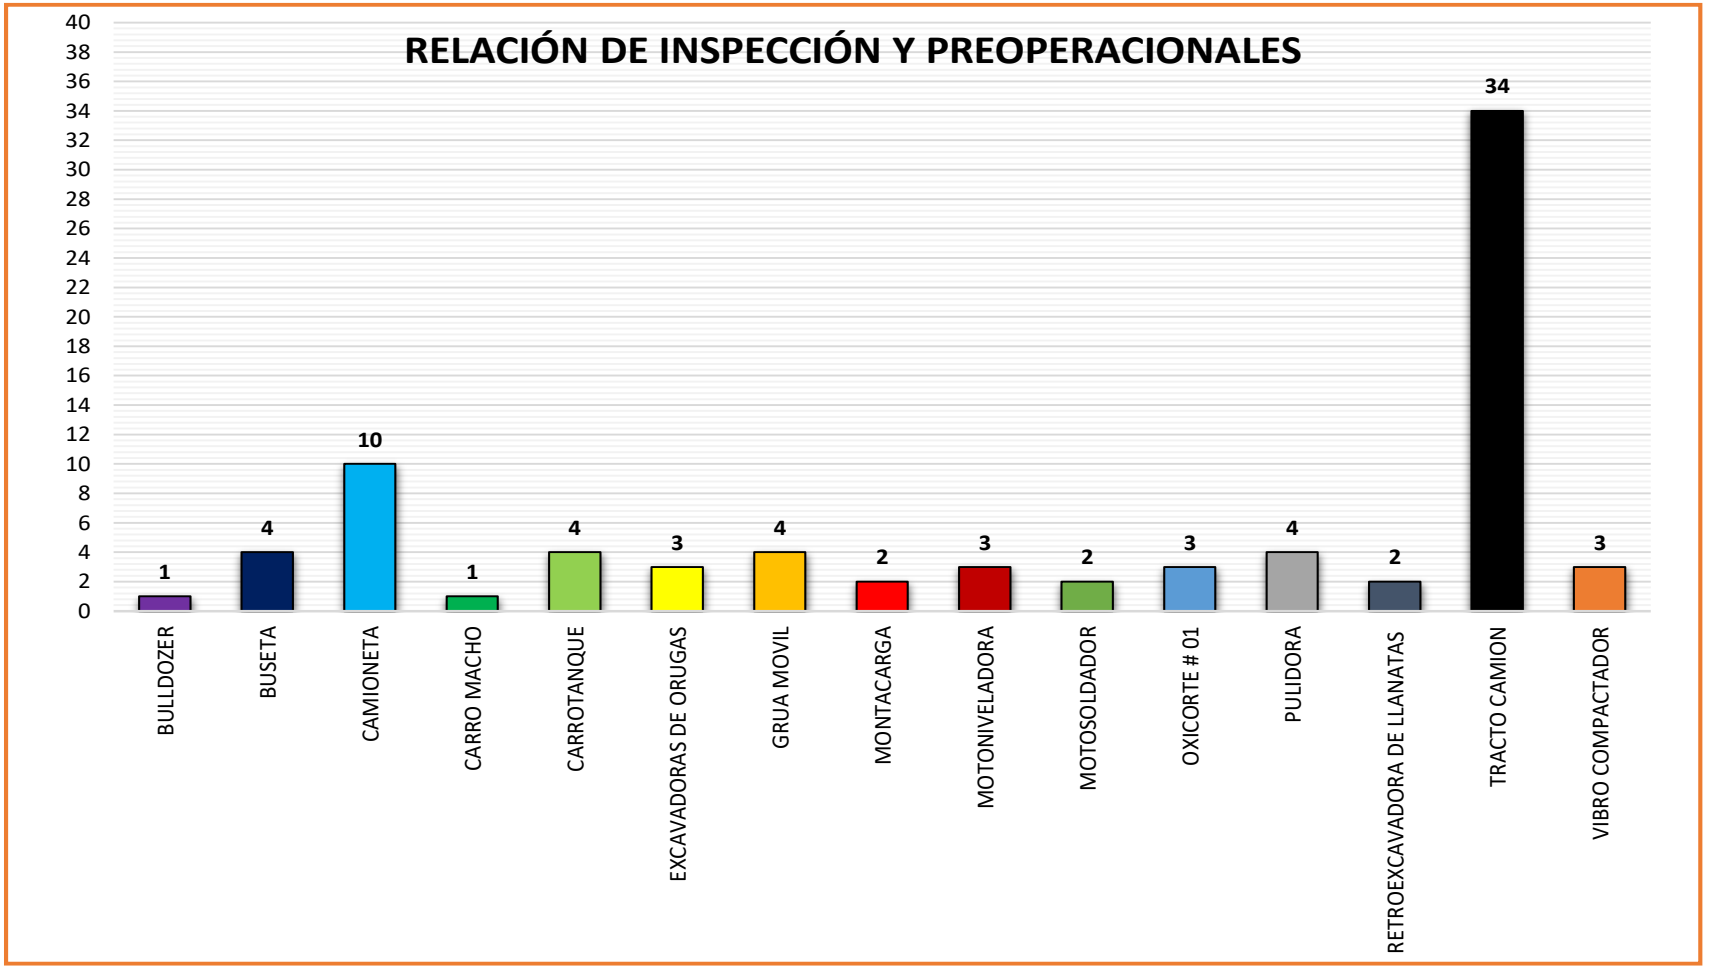
Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes Inspecciones y preoperacionales contando con el apoyo y acompañamiento de la Interventoría. Inspección para Camioneta, Motoniveladora, Volquetas y Bulldozer. Retroexcavadora e Inspección a Tracto Camión.

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
1	BUSETA	TOYOTA - TTO 428	MARIO SANCHEZ	01/11/2021 - 07/11/2021
2	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	ALDAIR OSPINO	01/11/2021 - 07/11/2021
3	CAMIONETA	RENAULT ALASKAN - DTW 312	RODRIGO SANCHEZ	01/11/2021 - 07/11/2021
4	CAMIONETA	RENAULT ALASKAN - FDK 162	EDINSON ALARCON	01/11/2021 - 07/11/2021
5	CAMIONETA	TOYOYA- HILUX	JUSETH RANGEL	01/11/2021 - 07/11/2021
6	EXCAVADORAS DE ORUGAS	CATERPILLAR	JOSE ANTONIO BARAJAS	01/11/2021 - 07/11/2021
7	EXCAVADORAS DE ORUGAS	HITACHI	LORENZO BAZA	01/11/2021 - 07/11/2021
8	EXCAVADORAS DE ORUGAS	HITACHI	PEDRO JAVIER ORTIZ	01/11/2021 - 07/11/2021
9	BULLDOZER	CATERPILLAR	REYNALDO MONTOYA	01/11/2021 - 07/11/2021
10	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	RAFAEL VILLEGAS	01/11/2021 - 07/11/2021
11	RETROEXCAVADORA DE LLANATAS	KOMATZU	HENRY CARO OSPINO	01/11/2021 - 07/11/2021
12	VIBRO COMPACTADOR	CARTEPILLAR	HENRY CARO OSPINO	01/11/2021 - 07/11/2021
13	TRACTO CAMION	MCC 915	JAIRO OSORIO	01/11/2021 - 07/11/2021
14	TRACTO CAMION	GYL-018	JOSE ARIAS	01/11/2021 - 07/11/2021
15	TRACTO CAMION	76C725	MICHAEL CARRILLO	01/11/2021 - 07/11/2021
16	TRACTO CAMION	CLUN 732	OMAR FLOREZ	01/11/2021 - 07/11/2021
17	TRACTO CAMION	SWO 733	DARIO PEÑA	01/11/2021 - 07/11/2021
18	TRACTO CAMION	THQ 814	CARLOS VANEGAS	01/11/2021 - 07/11/2021
19	TRACTO CAMION	SJQ-605	OSCAR LOPEZ	01/11/2021 - 07/11/2021
20	TRACTO CAMION	SVT-159	JHON JIMENEZ	01/11/2021 - 07/11/2021
21	TRACTO CAMION	TRG-285	WILSON CARRILLO	01/11/2021 - 07/11/2021
22	MOTOSOLDADOR	MILLER	JOSE TORRES	01/11/2021 - 07/11/2021
23	OXICORTE # 01	VICTOR	JOSE TORRES	01/11/2021 - 07/11/2021

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
24	PULIDORA	DONG CHENG 12010214762	JUAN D. TORRIJOS	01/11/2021 - 07/11/2021
25	PULIDORA	DONG CHENG 12102173759	JUAN D. TORRIJOS	01/11/2021 - 07/11/2021
26	GRUA MOVIL	VKK - 724	ANDERSON RAMIREZ	01/11/2021 - 07/11/2021
27	MONTACARGA	CATERPILLAR	X	3/11/2021
28	MOTOSOLDADOR	MILLER	JOSE TORRES	08/11/2021 - 14/11/2021
29	GRUA MOVIL	VKK - 724	ANDERSON RAMIREZ	08/11/2021 - 14/11/2021
30	GRUA MOVIL	WCU 462	HENRY ALVARADO	08/11/2021 - 14/11/2021
31	CAMIONETA	RENAULT ALASKAN - DTW 312	RODRIGO SANCHEZ	08/11/2021 - 14/11/2021
32	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	ALDAIR OSPINO	08/11/2021 - 14/11/2021
33	OXICORTE # 01	VICTOR	JOSE TORRES	08/11/2021 - 14/11/2021
34	PULIDORA	DONG CHENG 12102173759	JUAN D. TORRIJOS	08/11/2021 - 14/11/2021
35	CAMIONETA	TOYOTA - TTO 428	MARIO SANCHEZ	08/11/2021 - 14/11/2021
36	CAMIONETA	TOYOTA - SZA 238	YUSETH RANGEL	08/11/2021 - 14/11/2021
37	TRACTO CAMION	SVT-159	JHON JIMENEZ	08/11/2021 - 14/11/2021
38	TRACTO CAMION	VDZ-195	RODRIGO BULTON	08/11/2021 - 14/11/2021
39	TRACTO CAMION	SWO-073	DAIRO PEÑA	08/11/2021 - 14/11/2021
40	TRACTO CAMION	MCC 915	JAIRO OSORIO	08/11/2021 - 14/11/2021
41	TRACTO CAMION	GYL 018	JOSE DÍAZ	08/11/2021 - 14/11/2021
42	TRACTO CAMION	GYL 032	MICHAEL CARRILLO	08/11/2021 - 14/11/2021
43	TRACTO CAMION	TRG-285	WILSON CARRILLO	08/11/2021 - 14/11/2021
44	TRACTO CAMION	SNK 199	DANIEL VELAZQUEZ	08/11/2021 - 14/11/2021
45	TRACTO CAMION	STQ 605	OSCAR LOPEZ	08/11/2021 - 14/11/2021
46	TRACTO CAMION	WLW 825	JAIRO ERAZO	08/11/2021 - 14/11/2021
47	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	RAFAEL VILLEGAS	10/11/2021 - 14/11/2021

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
48	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	CATERPILLAR	JOSE ANTONIO BARAJAS	08/11/2021 - 14/11/2021
49	VIBRO COMPACTADOR	CATERPILLAR	HENRY CARO OSPINO	15/11/2021 - 21/11/2021
50	MONTACARGA	CARTEPILLAR	CARLOS ARTURO ROLON	15/11/2021 - 21/11/2021
51	GRUA MOVIL	FSQ 929	HENRY ALVARADO	08/11/2021 - 14/11/2021
52	CARRO MACHO	INTERNATINAS	HENRY ALVAREZ	08/11/2021 - 14/11/2021
53	TRACTO CAMION	SOI 244	GABRIEL LONDOÑO	14/11/2021 - 21/11/2021
54	TRACTO CAMION	-	DISLAO LOPEZ	14/11/2021 - 21/11/2021
55	VIBRO COMPACTADOR	-	HENRY CARO OSPINO	15/11/2021 - 21/11/2021
56	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	RAFAEL VILLEGAS	15/11/2021 - 21/11/2021
57	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	ALDAIR OSPINO	15/11/2021 - 21/11/2021
58	PULIDORA	DONG CHENG 12102173759	JUAN D. TORRIJOS	15/11/2021 - 21/11/2021
59	OXICORTE # 01	VICTOR	JOSE TORRES	15/11/2021 - 21/11/2021
60	CAMIONETA	RENAULT - JTS 158	YUSETH RANGEL	15/11/2021 - 21/11/2021
61	TRACTO CAMION	SSW 973	RAFAEL CALVO	15/11/2021 - 21/11/2021
62	TRACTO CAMION	SXS - 434	RODOLFO PEREZ	15/11/2021 - 21/11/2021
63	TRACTO CAMION	SKO 457	JULIAN AGUDELO	15/11/2021 - 21/11/2021
64	TRACTO CAMION	SRM 519	JILIO FLOREZ	15/11/2021 - 21/11/2021
65	TRACTO CAMION	SWM 909	JULIAN CRUZ	15/11/2021 - 21/11/2021
66	TRACTO CAMION	GZZ 670	YEFERSON AGILA	15/11/2021 - 21/11/2021
67	TRACTO CAMION	SXS 323	FELIX MORALES	15/11/2021 - 21/11/2021
68	TRACTO CAMION	SVF 596	JULIO LOPEZ	15/11/2021 - 21/11/2021
69	TRACTO CAMION	SWO 073	DAIRO PEÑA	15/11/2021 - 21/11/2021
70	TRACTO CAMION	SWN 732	OMAR FLOREZ	15/11/2021 - 21/11/2021
71	TRACTO CAMION	VDZ 195	RODRIGO BELTRAN	15/11/2021 - 21/11/2021
72	TRACTO CAMION	SWM 084	JHON PINSON	15/11/2021 - 21/11/2021
73	TRACTO CAMION	TRG-285	WILLIAM ACOSTA	15/11/2021 - 21/11/2021
74	CARROTANQUE	SUD 954	DAIRO ARCHINIEGAS	15/11/2021 - 21/11/2021
75	CARROTANQUE	SRO 636	MAURICIO Q.	15/11/2021 - 21/11/2021
76	CARROTANQUE	TRG 285	WILSON CARRILLO	15/11/2021 - 21/11/2021
77	CARROTANQUE	GYL 018	-	15/11/2021 - 21/11/2021
78	CAMIONETA	TOYOTA - SZA 238	MARIO SANCHEZ	15/11/2021 - 21/11/2021
79	CAMIONETA	CHEVROLET DIMAX	X	19/11/2021
80	CAMIONETA	TOYOTA	MARIO SANCHEZ	22/11/2021 - 28/11/2021

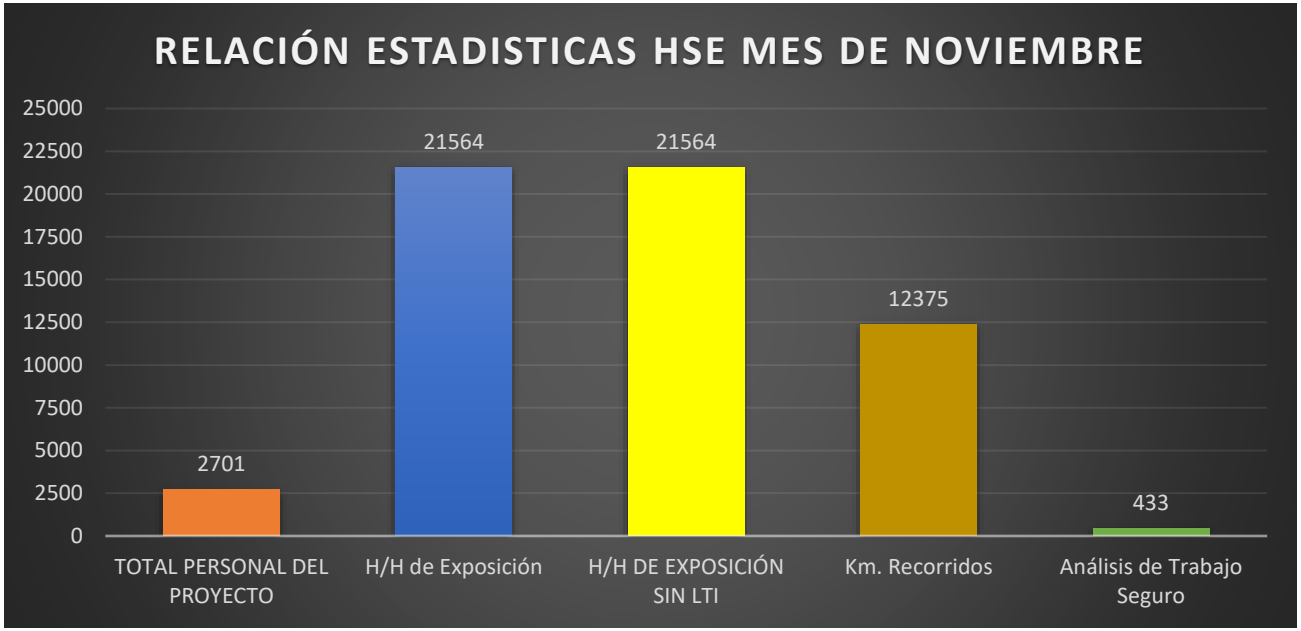
Relación de Inspecciones y preoperacionales correspondiente al mes de noviembre.



Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de octubre.

ITEM	RELACIÓN ESTADISTICAS HSE MES DE NOVIEMBRE																														
TOTAL, PERSONAL DEL PROYECTO	51	68	71	77	71	76	59	61	70	64	66	71	66	62	65	66	66	79	82	76	78	118	133	144	155	159	161	138	126	122
H/H de Exposición	392	520	544	592	544	576	472	488	560	512	528	568	628	496	520	528	528	632	656	608	624	944	1064	1152	1240	1272	1288	1104	1008	976
H/H DE EXPOSICIÓN SIN LTI	392	520	544	592	544	576	472	488	560	512	528	568	628	496	520	528	528	632	656	608	624	944	1064	1152	1240	1272	1288	1104	1008	976
Km. Recorridos	278	283	304	533	258	591	280	133	273	299	325	298	317	334	349	408	1269	649	781	567	275	384	407	352	260	323	323	305	897	320
Análisis de Trabajo Seguro	8	8	8	4	4	4	10	10	6	2	10	11	12	14	15	14	15	19	19	20	16	22	20	22	27	25	25	25	21	17

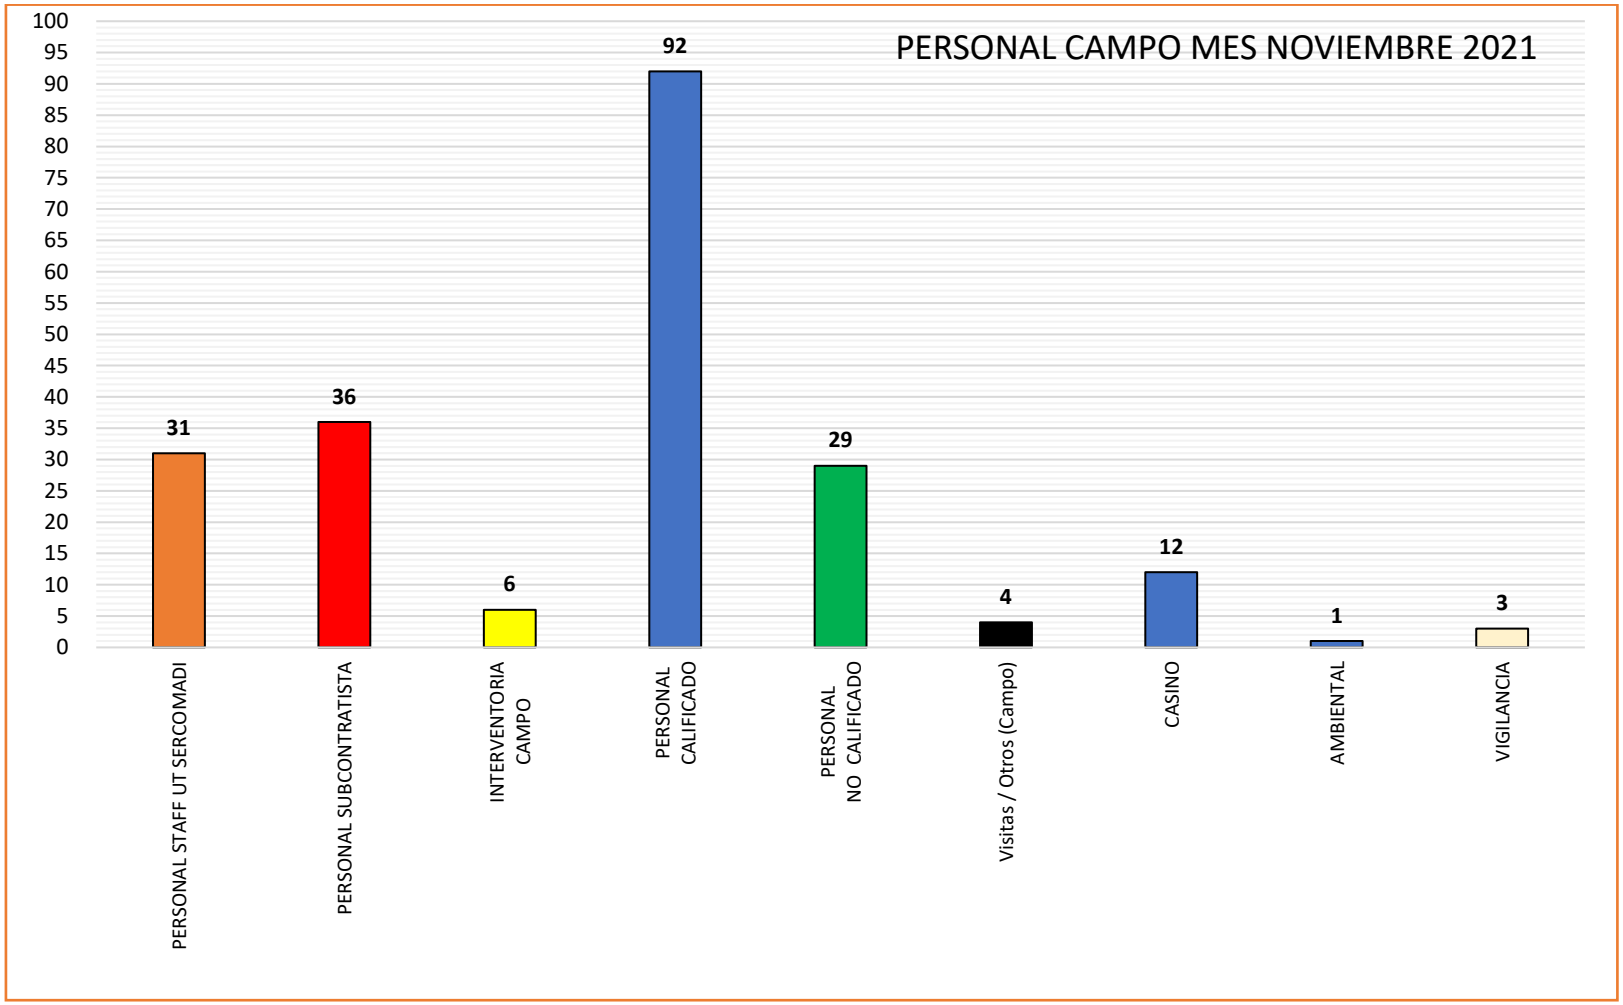
Estadística HS mes de noviembre.



Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de noviembre.

DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF	PERSONAL CALIFICADO	PERSONAL NO CALIFICADO	VEHÍCULOS	ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTA
	Mes	Mes	Mes	Mes		Mes
Director del Proyecto	1	0	0	0	Conductores	7
Ingeniero de Operaciones	2	0	0	1	Estudio Ambiental	1
Gestión Ambiental (Campo)	2	1	0	1	Vigilancia	3
Gestión Social (Campo)	3	0	0	1	Casino	12
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	6	0	0	2	Halliburton (Brocas)	1
Interventoría	6	0	0	1	Weatherford (Direccional)	4
Conductores	0	10	0	0	Baker (Control Sólidos)	8
Obras Civiles	1	12	17	0	Exlog (Unidad Geológica)	6
Perforación	5	45	0	4	Halliburton (Lodos)	2
Administrativos	2	1	0	0	Comunicaciones	0
Médico	2	1	0	0	CPVEN (Cementación)	7
Visitas / Otros (Campo)	4	0	0	0	Halliburton (Registros))	4
	0	0	0	0	C&CO (Coring)	0
	0	0	0	0	TRyRS	4
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**28**	**92**	**29**	**10**	**TOTAL**	**59**
TOTAL	**34**	**92**	**29**	**9**	**TOTAL PERSONAL PROYECTO**	**214**

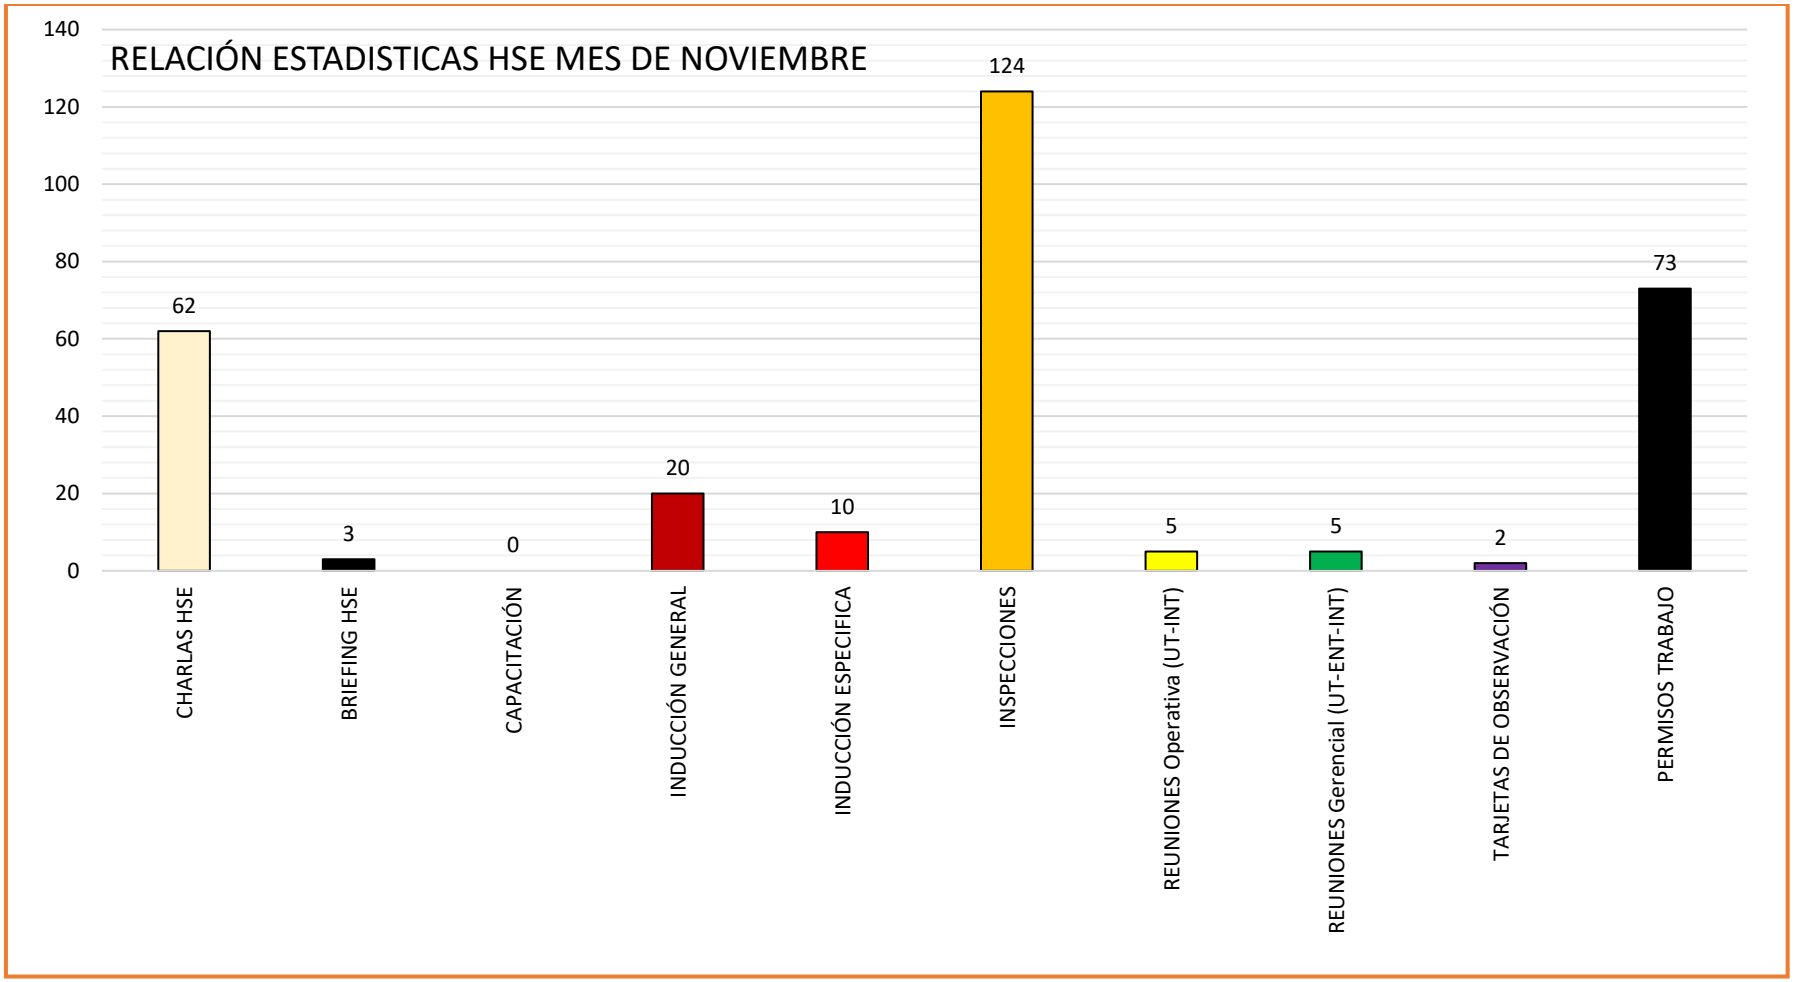
Estadística HS mes de noviembre.



Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de noviembre.

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE MES DE OCTUBRE																															
ITEM	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**CANT**
CHARLAS HSE	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	5	3	3	3	3	4	3	**62**
BRIEFING HSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**3**
CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INDUCCIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0	0	3	3	0	0	0	**20**
INDUCCIÓN ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	**10**
INSPECCIONES	15	13	7	7	7	6	6	4	5	6	2	4	2	2	6	4	0	6	6	3	5	6	0	0	0	1	1	0	0	0	**124**
REUNIONES Operativa (UT-INT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	**5**
REUNIONES Gerencial (UT-ENT-INT)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**
PERMISOS TRABAJO	8	8	3	3	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	7	7	7	7	**73**

Estadística HS mes de noviembre



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

Durante el mes de noviembre nuestro departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo realizo las siguientes actividades.

Medico:

Se realizaron 2 pruebas de Alcoholemia, Las pruebas realizadas fueron de alcoholimetría-alcohol en aliento, Alcoholemia es alcohol en la sangre, Todas las pruebas realizadas tuvieron resultado NEGATIVO.

Actividades de valoración médica a todo el personal en cuanto a prevención de la enfermedad COVID 19, Recomienda el uso apropiado de los EPP (Tapabocas o mascarilla, gafas de seguridad) y lavado continuo de las manos, así como limpieza con alcohol o gel antibacterial.

Todo el personal debe realizar el diligenciamiento del formato autoreporte de Condiciones de salud. Teniendo un sondeo del estado de ánimo y salud del personal para identificar anomalías antes de iniciar labores.

Se realizaron las fichas de salud “Fichas médicas”, con el propósito de hacer seguimiento al estado de salud del personal.

Se creo charla sobre salud visual, se realizó calistenia a todo el personal a laborar.

Se realizó la divulgación sobre técnicas de movilización en 1ros auxilios.

Se hizo inspección a vehículo de materia prima para el casino, se Instaló puntos desinfección oficinas.

Se hace participe en el recorrido de observación por parte de miembros de EnTerritorio visita gerencial, se realiza protocolo de visitantes y de Bioseguridad con el apoyo del equipo HSE y medico de campo.

Se realiza informe de consolidación de hallazgos del status inicial del campamento y minicamp, se comparte el reporte con el personal correspondiente para su gestión de cierre.

Se realiza charla sobre accidente ofídico, Inspección a la Ambulancia, se realiza Divulgación Salud publica Variante onicrom) Covid 19, seguimiento higiene de manos ingreso a comedor, se verifica puntos de hidratación, entrega de Medevac compañía aliadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizaron Charlas de Cinco minutos a todo el personal, con el propósito de generar conciencia en el autocuidado, se inculcaron normas de cuidado de cada uno de los miembros del cuerpo, antes del inicio de cada una de las labores se verificaban los Peligros, los Riesgos y sus respectivos controles.
Durante el mes de noviembre se desarrollaron 62 charlas de Seguridad, Se realizaron 3 Breafing de seguridad a visitantes, Inducciones Generales 20, e Inducciones Específicas 10 para cada uno de los cargos a cumplir. Se participo de 5 reuniones Operativas con Interventoría y UT Sercomadi. Se participo de 5 reuniones con EnTerritotio e Interventoría. Con el Propósito de identificar el estado de cada equipo se realizaron 124 Inspecciones a maquinaria y equipos.

Se realizaron charlas a todo el personal, las charlas de 5 minutos fueron realizadas antes de iniciar la jornada laboral en donde se busca informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud. Se tocaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las áreas de trabajo, y así mismo sepan cómo reaccionar y qué medidas tomar ante estos eventos.

Los temas de las charlas de 5 minutos fueron:

- Atención actividades Simultaneas atención a la actividad que estoy desarrollando.
- Peligros al movilizar cargas extra dimensionadas.
- Operaciones Simultaneas, Atención a movimientos de cargas, Obras Civiles y sus riesgos, Movimientos de material y descapote.
- Izaje de cargas.
- Operaciones Simultaneas SIMPOS, Condiciones climáticas adversas.
- Preoperacional para Pinar Torre.
- Operaciones Simultaneas SIMPOS, Atención a las labores a desarrollar Civil y Operación de arme de Equipo.
- Golpe de Calor.
- Operaciones Simultaneas SIMPOS, Atención a las labores a desarrollar perfilado de cunetas para manejo de aguas lluvias, mantenimiento de vía pública.
- Movimiento de equipos con izajes incluidos.
- Orden Público ingreso a plataforma.
- Operaciones Simultaneas SIMPOS, Izajes de cargas, movimiento de cargas en tracto camión, canales de aguas lluvias, repaleo.
- Charla con conductores Objetos que pueden caer de alturas.
- Riesgos Biomecánicos.
- Manejo de cargas.
- Estilos de vida saludable.
- Ing. De Operaciones sobre la divulgación del procedimiento de arme de equipo.
- Se realiza charla relacionada con la Divulgación del procedimiento operativo seguro de prueba de anclajes en la locación, divulgación del procedimiento para izaje de torre telescópica y parada de seguridad ambiental.
- Divulgación del procedimiento de control de permisos de trabajo, se explica el tiempo de validez de un PDT.
- Se realiza charla preoperacional sobre el Procedimiento de izaje de 2da sección de la torre con todo el personal, se identifican los riesgos y controles asociados a la actividad.
- Línea de peligro.
- Peligros y Riesgos en la perforación.
- Uso de herramientas o equipos con partes en movimiento.
- Operaciones con sustancias peligrosas.
- Operación de maquinaria en superficie (Grúas, Tractores, etc).
- Charla pre inicio de actividades inicio de Fragüe.
- Importancia y Procedimiento Tarjetas de observación: actos y condiciones inseguras, incidentes y ambiental.
- Riesgo locativo con el personal Civil y de perforación.
- Campaña de Orden y aseo.
- Hojas de seguridad.
- Medidas de prevención de Covid 19 lavado de manos.
- Transporte y manipulación de sustancias peligro.
- Identificación de riesgos en el arme del equipo.
- Uso adecuado de unidades sanitarias, manejo de residuos sólidos, protección recurso hídrico dirigida por la coordinadora Ambiental.
- Peligros con redes eléctricas sobre vías de tránsito vehicular. con el personal conductor.
- Trabajos en alturas.
- inspecciones de tractocamiones que ingresan a la locación con cargas de las terceras compañías y con el personal conductor se socializa charla sobre seguridad vial.
- Peligros por condiciones climáticas adversas.

- Se realizan 3 Breafing de seguridad a 6 personas visitantes de Geoambiental, EnTerritorio. SIJIN y POLICIA NACIOMAL.

SEGUIMIENTOS

Seguimiento, acompañamiento y apoyo a cada una de las actividades a desarrollar según el Permiso de Trabajo y Análisis de Riesgo de las actividades. Nivelación y compactación de material, Movimiento de cargas, ingreso a locación e Izaje de cargas. Instalación de Skimmer Metálico, perfilado de cunetas para manejo de aguas lluvias. Seguimiento a los PDT con el supervisor de operaciones, se socializa la importancia y aseguramiento en la apertura de este soporte previo al inicio de las actividades. Se realiza recorrido por las áreas de la locación con el apoyo del Supervisor HSE Ing. Luis Delgado.

Se realizan recomendaciones en el uso adecuado de los EPP en actividades de oxicorte que son corregidas de manera inmediata por el colaborador, adicionalmente se realiza seguimiento a las inspecciones de los equipos y permiso de trabajo. Inspecciones de cargador y equipos blandos de altura. Aseguramiento de actividades operativas como prueba de puntos de anclaje y levantamiento de torre. Seguimiento de los PDT del cargue y descargue de herramientas, tubería y de trabajos en alturas. Levantamiento de la segunda sección de la torre, arme del equipo, izaje de cargas, actividades de soldadura, cargue y descargue de herramienta y tubería. Se verifican planes de izaje y certificados de los elementos de izaje. Instalación de Top drive en la torre, cargue y descargue de herramienta, arme de equipo y campamento. Inspecciones por inicio de semana al tractocamión, carrotanque, oxicorte, pulidora, camionetas, motosoldador. Seguimiento y soporte en la elaboración de PDT y AR.

Se participa de 10 reunión operativas y Gerenciales entre representantes de la Interventoría y Sercomadi HSE, seguimiento del avance de cierre de los aspectos pendientes que deben de ser concluidos antes de iniciar con la perforación.

Ejecución de la PPT de la gestión para la reunión gerencial de seguimiento con corte del 14 al 20 de noviembre.

Como actividad de seguimiento al aseguramiento de trabajos en alturas en tks de almacenamiento de combustible, se realiza inventario y status de las líneas de vida horizontales de los tks, se plantean acciones de mejora que serán evaluados por el director de Obra.

Inicio de perforación, seguimiento y aseguramiento de terceras compañías. Seguimiento al funcionamiento de detector de tormentas para el equipo de perforación. Apoyo al descargue de Cal, se implementa Permiso de trabajo y Análisis de Riesgo. verifica el cumplimiento de las normas HSE acompañamiento en arme de mesa rotaria. Acompañamiento durante la operación de pinado de torre. Acompañamiento y aseguramiento de las actividades de movilización de cargas por el casco urbano.

Jornada de conciliación con personal de la comunidad que presenta bloqueo en el punto de ingreso a la locación, se evidencia dialogo entre las partes interesadas, comunidad, personal de la UT y las autoridades locales, finalmente ante la persistencia en la continuidad del bloqueo, la fuerza pública interviene y se da la apertura e ingreso del personal de la UT a la locación.

Apoyo en elaboración de AR y apertura de PT personal de Baker.

Se apoyo con Auxiliares viales y perdiguero para la movilización de cargas y equipos según correspondía la logística durante la movilización y paso por el Municipio de Guamal, de la misma manera se prestó apoyo al ingreso de la locación con señalizadores viales ininterrumpidamente con el único propósito evitar accidentes y traumatismo durante el ingreso de equipos y maquinaria.

Se realiza acompañamiento y apoyo a cada una de las labores a desarrollar según el Permiso de Trabajo y Análisis de Riesgo de las actividades. Conformación material de descapote costado norte de la servidumbre. Instalación skimmer metálico, Adecuación área para campamentos (cajeo, retiro de material saturado, aplicación de material granular), Conformación, nivelación y compactación material de cantera (acopiado), costado suroriental de la locación, Perfilado cunetas de aguas lluvias.

Aseguramiento de las actividades del área civil de adecuación de cunetas de aguas lluvias, conformación de terreno, mantenimiento de la vía pública en KM 3+700 se realiza aseguramiento de la actividad con el apoyo de 2 auxiliares viales.

Se realiza socialización de identificación de riesgos y controles previos y durante la movilización al personal conductor, se realiza el aseguramiento de la movilización de cargas, apoyo de escoltas en parte delantera y trasera de los vehículos durante el desplazamiento vehicular, disponibilidad de perdiguero y 3 auxiliares para control del flujo vehicular durante el paso de las cargas en puntos críticos del casco urbano, ingresan 4 cargas a la locación sin novedad.

Señalización de los puntos de anclaje de la torre. Aseguramiento de las actividades del área civil de adecuación de cunetas de aguas lluvias, conformación de terreno, mantenimiento de la vía pública en KM 2+800, 2+300, 1+500 se realiza aseguramiento de la actividad con el apoyo de 2 auxiliares viales.

Campañas de orden y aseo continuas con el apoyo del personal.

Acompañamiento durante visita de Gerente de ENTerritorio a la locación ANH-Pailitas-1-X, se realiza recorrido por áreas de la locación con el apoyo del jefe del equipo.

Se apoya con el personal para la demarcación de zona peatonal.

Entrega de residuos sólidos y líquidos (entrega de baños portátiles y operamos con los baños públicos del campamento) Residuos sólidos No aprovechables, Aprovechables, Residuos líquidos. Apoyo para los soportes de Permiso de Trabajo y Análisis de Riesgo. Señalización de senderos.

Se continúa implementando las labores de inspección, pues esta actividad tiene una gran importancia en cuanto al tema de Seguridad. Esta actividad nos permite la identificación y análisis de aquellas situaciones y actos anómalas que pueden alterar el normal funcionamiento de la actividad de la organización.

Se realizaron 105 inspecciones preoperacionales a Transporte, Tracto Camión, Camioneta, Retroexcavadora, Vibro compactador, Pajarita, Buseta, Pulidora, Motosoldador, Oxicorte.

Junto con la Interventoría HSE, Supervisor HSE y Coord. HS de Sercomadi se realiza la inspección de grúa telescópica y carro macho.

Ejecución de inspecciones de extintores para su posterior ubicación en la plataforma. Inspección de lava ojos ubicados estratégicamente sobre tanque de lodos (2) dos y cerca de equipo de soldadura (1) una (Total tres - 3)

Se realiza verificación de estado de Monta carga, se evidencia los soportes de Inspección de equipo, así como su buen funcionamiento.

Se realizaron jornadas de Orden y Aseo. Se realizo Simulacro de Conato de Incendio. Rotulación de depósitos temporales de ACPM, Verificación documental vehículo de suministro de oxígeno y acetileno. Se realiza la adecuación de dique para tambores de aceite motor e hidráulico. Se instala señalización y delimitación en punto de ingreso al área operativa con la finalidad de evitar eventualidades vehiculares por paso cercano a las cunetas perimetrales. Se realiza socialización de prácticas adecuadas para el trasiego de combustible.

Se realizan ejercicios de fortalecimiento muscular. Se evidencia condición insegura por paso de cables eléctricos dentro de cuneta de aguas lluvias entre el generador y Tk de combustible, se ubica plataforma pasa cable y se corrige la desviación. Se realiza la instalación de una mangaveleta en la plataforma del equipo. Se realiza aseguramiento de las actividades operativas de arme de equipo y campamento, tensionado de vientos del trabajadero, revisión de motores, adecuación de dique de contención para tanque de ACPM, revisión de los motores de las bombas de lodos, instalación de portón de acceso a la plataforma.

3. **REGISTRO FOTOGRÁFICO GESTIÓN HS**

	
Charla diaria: Actividades Simultaneas Peligros, Riesgos y Controles durante cada una de las actividades	Apoyo y seguimiento actividad de Izaje de carga
	
Ingreso de Cargas plataforma	Inspección Preoperacional de maquinaria.
	
Inspección Preoperacional de Vehículo	Charla con Conductores

	
Seguimiento Tema Covid 19, entrega de EPP	Simulacro conato de incendio
	
Inducción Especifica	Charla preoperacional para pinar torre
	
Izaje de cargas.	Reunión informativa con el personal en la plataforma Ejercito Nacional, Policía Nacional, PI, Gerente recursos Humanos, Jurídico, director de Proyecto.



Acompañamiento escolta y aseguramiento de las actividades de movilización de cargas



Ejecución de inspecciones de tractocamiones



Inspecciones de rutina con la Interventoría HSE. Verificación de permisos de trabajo



Ejecución de actividades de orden y aseo general en la locación



Socialización de actividad de levantamiento de torre, asignación de tareas, identificación de riesgos y controles



Protocolo de visitantes a Supervisora Ambiental de Enterritorio



Atención visita de Supervisora ambiental de Enterritorio, verificación de planes de izaje de grúa.



Gestión de cierre de hallazgos, adecuación de rejillas faltantes



Ejecución de Inducción Corporativa







Charla medica en técnicas de movilización 1ros auxilios



Charlas conductores movilizaciones: Peligros redes eléctricas sobre vías tránsito vehicular, conductores











Ubicación de equipos para la atención de emergencias







Ejecución de inducciones HSE Corporativa, personal directo y de 3ras compañías



Protocolo de visitantes a Gerente de Enterritorio



Atención visita Gerencial de Enterritorio.







Ejecución de inspecciones de vehículos y maquinaria



Se realiza verificación de Kits de contingencias con la Interventoría HSE



Aseguramiento de actividades de izaje de cargas de 3ras compañías



Aseguramiento de las actividades de movilización de cargas, acompañamiento de perdiguero.



Seguimiento de Izaje de cargas de casetas 3ras compañías



Ejecución de inducciones HSE Corporativa, personal directo y de 3ras compañías



Ejecución de inducciones HSE Corporativa, personal directo y de 3ras compañías





Ejecución de inducciones HSE Corporativa, personal directo y de 3ras compañías





Charlas Pre Turno, personal Patiero, Personal Calificado y Personal Empresas





Charlas Pre Turno, personal Patiero, Personal Calificado y Personal Empresas



Limpieza de Canales Perimetrales para manejo de aguas Lluvias.



Mejoramiento Instalación de sendero Peatonal y sus respectiva señalización.

	
Protocolo de visitantes a Gerente de EnTerritorio	Recorrido Gerencial observación y mejora de la plataforma.
	
Inducción al personal Guarda de seguridad	Instalación de lavamanos antes del Ingreso al Casino.
	
Inspección de Equipos y Maquinaría	Inspección de Equipos y Maquinaría

REPORTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el mes de noviembre de 2021, la gestión ambiental del proyecto se centró en la planeación y aseguramiento de proveedores y gestores ambientales para la etapa de perforación del Pozo ANH Pailitas 1-X, el control y seguimiento ambiental a las actividades de obra civil, movilización, arme de equipo e inicio de perforación, Monitoreo de calidad de aire correspondiente a la etapa de movilización y de perforación.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Actividades de Gestión
Aseguramiento de Proveedores	Se realiza proceso contractual con la empresa Geoambiental para transporte, tratamiento y disposición de cortes de perforación y aguas residuales industriales.	Se establece continuar con Geoaseo E.S.P. para la gestión y manejo de los residuos sólidos y líquidos a generar por el proyecto para la etapa de perforación.	Se revisa documentación de Asociación Paz Verde de El Banco para manejo de residuos sólidos y líquidos, no se cuenta con la documentación completa que cumpla por lo que no se contempla como gestor externo para el proyecto hasta el momento	3
Seguimiento Monitoreos	Se culmina monitoreo de calidad del aire para etapa de movilización en dos (2) estaciones sobre la vía de acceso con el laboratorio MCS Se realiza monitoreo de aguas previo a perforación en cuatro (4) puntos	Se inicia monitoreo de calidad del aire para la etapa de perforación el 24 de noviembre con el laboratorio MCS	Se realiza monitoreo de ruido ambiental (día hábil y no hábil) y emisión de ruido en el inicio de la etapa de perforación el 26 de noviembre	4
Seguimiento Fichas de manejo	Se revisa estado de operatividad de barreras sedimentadoras construidas para controlar el aporte de sedimentos de la locación, se realiza mantenimiento periódico de las mismas e instalación de complemento en área de campamento y costado suroriental de la plataforma.	Adecuación del área de campamento y plataforma para inicio etapa de perforación	Implementación de la totalidad de las fichas de manejo ambiental para la etapa de perforación	3
Seguimiento a la gestión	Se realiza el mantenimiento de Unidades Sanitarias Portátiles y retiro de las mismas con el inicio de	Se cuenta con los manifiestos de transporte de las cantidades gestionadas de residuos sólidos y	Se realiza el aseguramiento de transporte y recolección de cortes de	

de Proveedores y Gestores Ambientales	las actividades de perforación. Se realiza la recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos por parte del gestor autorizado Geoaseo SAS ESP. Se realiza el aseguramiento de la compra de agua para uso doméstico e industrial con el proveedor autorizado Watersol/Geoma y se cuentan con los respectivos manifiestos de transporte.	líquidos por el gestor autorizado Geoaseo SAS ESP.	perforación con gestor autorizado Geoambiental, se cuentan con los manifiestos de transporte respectivos	5

BALANCES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO

A continuación, se referencia el cumplimiento a la gestión ambiental de las fichas de manejo ambiental establecidas en el PGA conforme al avance de las etapas del Proyecto.

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES
Programa de manejo de las actividades constructivas	Movilización de Vehículos, Maquinaria y Equipos Pesados	PGA-1	100%	Se realiza inspección de vehículos y equipos que ingresan a la operación previo al inicio de labores para verificar el estado técnico-mecánico de los mismos
	Adecuación del sitio de perforación	PGA-2	100%	Se instaló barrera sedimentadora en el área del campamento Se realizó la adecuación de las cunetas perimetrales y área de campamento
Programa de manejo del suelo	Remoción de la Cobertura Vegetal y el Descapote	PGA-3	100%	Se complementó la instalación de la barrera sedimentadora en el costado suroriental de la plataforma.
	Fauna Silvestre	PGA-4	100%	Se realizan charlas a personal del proyecto sobre la protección de la fauna local y la prohibición de caza y pesca
	Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	PGA-5	100%	Se realizó adecuación de los diques de combustible para dar cumplimiento a la normatividad. Se realizó la adecuación de áreas de almacenamiento de química Los recipientes y áreas que almacenan combustibles, aceites y productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados.
	Manejo residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales	PGA-6	100%	Se realizó la recolección, transporte, y disposición de residuos sólidos con el gestor externo Geoaseo E.S.P.

				Se cuenta con un área adecuada y señalizada debidamente para el acopio temporal de residuos sólidos, clasificada por el código de colores nacional. Se realizaron charlas de sensibilización a personal del proyecto sobre separación en la fuente de residuos sólidos acorde al código de colores establecido.
	Resíduos Líquidos Domésticos e Industriales	PGA-7	100%	Se realizó la adecuación de las PTAR del campamento y minicamp, se inicia proceso de optimización y mejoramiento de PTAR del campamento para mejorar condiciones de parámetros de salida para entrega de aguas a proceso de osmosis inversa interno y poder realizar reutilización de estas aguas en el proyecto. Se realizó la recolección, transporte y disposición de aguas residuales domésticas con el gestor externo Geoaseo E.S.P. Se realizó mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles instaladas
	Materiales Radiactivos	PGA-8	100%	No Aplica
	Lodos de Perforación	PGA-9	100%	Se realizó la adecuación del área de lodos en la plataforma Se viene realizando el retiro de los cortes de perforación y disposición de los mismos con el gestor externo Geoambiental.
	Desmantelamiento y Abandono	PGA-10	0%	No Aplica
	Revegetalización de Áreas Intervenidas.	PGA-11	0%	No Aplica
Programa de manejo del recurso hídrico	Manejo de aguas superficiales	PGA-12	100%	Se realizaron charlas de sensibilización al personal del proyecto de la protección del recurso hídrico del área Se realizó monitoreo previo a perforación a jagüey aledaño a la plataforma propiedad del señor José Ospino

	Manejo de aguas subterráneas	PGA-13	100%	Se realizaron monitoreos de agua subterránea previo a perforación a tres (3) pozos profundos localizados a 260 m, 600m y 1600 m.
Programa de manejo del recurso aire	Manejo de fuentes de emisiones y ruido	PGA-14	100%	Se culminó monitoreo de calidad del aire etapa de movilización Se inició monitoreo de calidad del aire etapa de perforación Se realizó monitoreo de ruido ambiental y emisión de ruido inicio de etapa de perforación

BALANCE GENERAL AMBIENTAL

A continuación, se presenta el balance de la gestión ambiental del mes de noviembre de 2021:

Residuos sólidos y líquidos: Durante el mes de noviembre se realizó la gestión y manejo de estos residuos con Geoaseo E.S.P. de la siguiente manera:

- Residuos sólidos: Durante el mes de noviembre se realizó la recolección de un total de 1.074,5 kg de residuos sólidos, discriminados como se muestra en la siguiente tabla, contando con los respectivos manifiestos de transporte/actas de entrega de los mismos

FECHA	TIPO	CANTIDAD (Kg)
03-nov-21	Aprovechables	4
03-nov-21	No Aprovechables	7,5
06-nov-21	No Aprovechables	13
06-nov-21	Contaminados	9
06-nov-21	Aprovechables	6
17-nov-21	Aprovechables	25
17-nov-21	No Aprovechables	114
20-nov-21	No Aprovechables	56
24-nov-21	No Aprovechables	805
24-nov-21	Aprovechables	35

- Residuos Líquidos: Durante el mes de noviembre se realizó la recolección de un total de 340,8 litros de aguas residuales producto del mantenimiento de las unidades portátiles sanitarias (10 mantenimientos a las dos unidades), las cuales el 24 de noviembre fueron retiradas de la plataforma. A partir de esto se han generado 92 m^3 de agua residual doméstica por el campamento y minicamp instalados. En la siguiente tabla se discrimina la relación de los volúmenes generados, de los cuales se cuenta con los respectivos manifiestos de transporte/actas de entrega.

Residuos Líquidos domésticos	Litros	m3	Mantenimientos USP	Disposición final
03-nov-21	24		2	Geoaseo E.S.P.
06-nov-21	28		2	Geoaseo E.S.P.
17-nov-21	174,8		2	Geoaseo E.S.P.
20-nov-21	52		2	Geoaseo E.S.P.
24-nov-21	62		2	Geoaseo E.S.P.
25-nov-21		22		Geoaseo E.S.P.
28-nov-21		35		Geoaseo E.S.P.
29-nov-21		35		Geoaseo E.S.P.

La disposición de estas aguas residuales es realizada con Geoaseo E.S.P.

- Cortes de Perforación: Desde el inicio de la etapa de perforación, en el mes de noviembre se ha realizado la recolección de un total de 294 Bbls durante el mes de noviembre con el gestor externo autorizado Geoambiental, de este proceso se cuenta con los manifiestos de transporte respectivos. A continuación, se discrimina la relación de estos volúmenes.

Cortes de Perforación	Bbls
26/11/2021	68
27/11/2021	74
27/11/2021	17
29/11/2021	135

- Se realizó la compra de material de cantera de 490 m^3 de la cantera El Botillero autorizada para la finalización de las obras civiles, mantenimiento de vía pública y adecuación de senderos peatonales en la plataforma, implementando las medidas de manejo ambiental para el transporte establecidas en la Ficha de Manejo del PGA.
- Se realizó la compra de agua de 905,2 m^3 para uso doméstico e industrial con el proveedor Watersol quien cuenta con el respectivo convenio con Geoma Consultoría que cuenta con concesión de aguas mediante Resolución No. 0093 del 27 de febrero de 2019.

- Monitoreos Ambientales:

  - El día 2 de octubre se realizó el inicio del monitoreo de calidad del aire para la etapa de movilización en dos (2) estaciones sobre la vía de acceso Guamal-Astrea, el cual fue suspendido el día 12 de octubre y reiniciado el 27 de octubre por parte del laboratorio MCS, y fue finalizado el día 19 de noviembre.
  - Se realizó monitoreo de calidad de aguas subterránea a 3 pozos profundos, dos de ellos correspondientes a los acueductos veredales de San Juan de Dios y San José de Paraco y el jagüey aledaño a la plataforma propiedad del señor José María Ospino, esto correspondiente a la actividad del PGA previa a la perforación.
  - El día 24 de noviembre se realizó el inicio del monitoreo de calidad del aire para la etapa de perforación en dos (2) estaciones aledañas a la plataforma.
  - Entre los días 26 de noviembre y 28 de noviembre se realizó el monitoreo de emisiones de ruido y ruido ambiental correspondiente al inicio de perforación.

- Se realizaron seis (6) inducciones ambientales específicas del proyecto a personal nuevo para un total de 37 personas en el mes y cuatro (4) charlas ambientales de sensibilización al personal (128 personas) sobre el cumplimiento de las medidas de manejo del PGA

- Durante el mes se realizó la implementación de las medidas de manejo ambiental del PGA aplicable para las obras civiles, movilización, arme del equipo y perforación (PGA-1, PGA-2, PGA-5, PGA-6, PGA-7, PGA-14).

- Se participó en las reuniones gerenciales y operativas convocadas durante el mes.

- Se realizó la programación y revisión de proveedores y gestores externos para la etapa de perforación, entre los cuales se definió Geoambiental como gestor externo para el transporte, tratamiento y la disposición final de los cortes de perforación y agua residual industrial, Geoaseo E.S.P. para la recolección y disposición de aguas residuales domésticas y residuos sólidos, Watersol para la compra de agua para uso doméstico e industrial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presenta un registro fotográfico que evidencia la gestión ambiental adelantada durante el mes de noviembre de 2021.



Mantenimiento barreras sedimentadoras Plataforma Pailitas 1-X



Monitoreo de calidad de aire etapa de movilización



Recolección de residuos sólidos con Gestor Externo Autorizado Geoaso



Monitoreo de aguas previo a perforación



Monitoreo de calidad de aire etapa de perforación



Monitoreo de ruido ambiental etapa de perforación



Monitoreo de emisión de ruido etapa de perforación

Reolección de aguas residuales domésticas



Conformación y terraceo material de descapote y excavación



Manejo de Cortes de Perforación con Gestor Externo Geoambiental



Inducciones ambientales a personal que ingresa al proyecto



Charlas ambientales de sensibilización a personal del proyecto



Instalación barrera sedimentadora en sectores faltantes



Mantenimiento y reparación cunetas perimetrales



Adecuación diques de combustible



Recorridos con Interventorría HSE

REPORTE DE MOVILIZACIÓN TERCERAS COMPAÑIAS

TERCERAS COMPAÑIAS								Total, cargas	28
FECHA LLEGADA A POZO	DIA PROG	CANTIDAD DE CARGAS PROG	% PROG	% ACUMULADO PROG	CARGA MOVILIZADA	CANTIDAD DE CARGAS REAL	% REAL	CARGA ACUMULADA	% ACUMULADO REAL
16-nov-21	0	0	0%	0%	Se inicia movilización de transporte para cargue de las primeras compañías	0	0%	0	0%
17-nov-21	1	2	7%	7%	(2) Fluidos de Perforación	2	7%	2	7%
18-Nov-21	2	4	14%	21%	(1) Mudlogging, (3) Control de solidos	4	14%	6	21%
19-Nov-21	3	4	14%	36%	(2) Control de solidos (2) Fluidos de Perforación	4	14%	10	36%
20-Nov-21	4	8	29%	64%	(2) Fluidos de Perforación, (4) Control de sólidos, (1) Herramientas de Fondo, (1) Brocas de Perforación	3	11%	13	46%
21-Nov-21	5	1	4%	68%	(1) Fluidos de Perforación	6	21%	19	68%
22-Nov-21	6	4	14%	82%	(1) Corrida Revestimiento, (3) Cementación	3	11%	22	79%
23-Nov-21	7	5	18%	100%	(3) Cementación, (2) Registros Eléctricos	4	14%	26	93%
24-Nov-21	8	0	0%	100%	(2) Viajes de química	2	7%	28	100%

REPORTE OPERACIONAL DE PERFORACIÓN

Antes de iniciar operación, se realizaron actividades de arme de BHA #1, preparación de lodo de 8.9 ppg, preparación de píldora viscosa de contingencia y ejecución de prueba de circulación a tanques

Se inicia perforación del pozo ANH Pailitas 1X el día 24 de noviembre de 2021 a las 14:00 horas.

24 noviembre 2021

- Se armo BHA #1 así:
  Broca ticónica de 17-1/2"OD con boquillas de 3x20/32" y un Center Jet de 20/32" para un TFA de 1.16 Inch2.
  1 Bit Sub de 7-5/8" Reg. Box x 6- 5/8" Reg. Box X 3,60 ft.
  1 Drill Collar de 8" x 6-5/8" Reg Box-Pin x 30.54 ft
  1 X-O 6-5/8" Reg Pin x 4-1/2" IF Box x 3,74 ft
  1 Heavy Weight Como Caiman de 5" 4-1/2" if pin x 4-1/2 if box

- Se prepararon 400 bbl de lodo de 8,6 ppg y 120 bbl de píldora viscosa de contingencia de 10.9 ppg

- Se bajó sarta y continuó perforando fase de 17-1/2” con BHA No.1 convencional en Formación Tubará desde 104 ft hasta 223 ft (avance: 119 ft), ROP prom: 20 ft/hr, ROP ef: 54.58 ft/hr con los siguientes parámetros: Q: 158 gpm, SPP: 180 psi, RPM: 80-90, SPM 60, TQ: 1- 5 klbf-ft, WOB: 3-5 klb

- Ultima litología @ 223 ft: 70% Arena, 30% Arcillolita.

- Repasó una vez la sección perforada.

25 de noviembre 2021

- NPT por reparación de Top Drive y taponamiento de Flow line (10hrs)

- Continuó perforando fase de 17-1/2” con BHA No.1 convencional en Formación Tubará desde 423,30 ft hasta 460 ft (avance: 36,7 ft) y los siguientes parámetros: ROP prom: 18.35 ft/hr, ROP ef: 9.87 ft/hr, Q: 500 gpm, SPP: 430 psi, RPM: 70, SPM 102, TQ: 0.6 klbf-ft, WOB: 2-10 klb

26 noviembre 2021

- NPT por taponamiento de filtros bomba de lodos (10 horas, 30 min), y mtto top drive.

- NPT por corrección de fuga de aceite hidráulico cambiando el motor hidráulico en Top Drive Tesco XH1700.

- Continuó perforando fase de 17-1/2” con BHA No.1 convencional en Formación Tubará desde 549 ft hasta 606.5 ft (avance: 57.5 ft) A LAS 4:30PM, ROP prom: 28.5 ft/hr, ROP ef: 34.34 ft/hr con los siguientes parámetros: Q: 515 gpm, SPP: 550-620 psi, RPM: 70 – 80, TQ: 3.2 – 6.7 klbf-ft, WOB: 3-14 klb
  Nota:

  Litología @ 606 ft: 10% Limolita, 90% arcillolita.

  Repasó una vez la sección perforada.

- SACÓ BHA No. 1 convencional desde 606,5 ft A LAS 10PM hasta superficie ft así: (2) juntas DC 6 1/2" + Cross Over + STB 17 3/8" + (1) junta DC 8’’ + Bit Sub (Float Valve) + Bit 17 1/2" TRC 1*20/32"+3*20/32", TFA: 1.16).
  Nota: Las (2) juntas DC 6 1/2" fueron quebradas.
  Calificación de la broca: 1-1-CT-A-E-I-WT-TD.

27 noviembre 2021

- Se tomaron los siguientes registros eléctricos: Gamma Ray, Caliper 6 brazos, Resistividad laterolog, Neutrón, Spontaneus potencial (RWCH, GR, DSN, ICT, ACRT, SP) desde 603 ft fondo encontrado hasta superficie
  Nota: Se presentaron los siguientes intervalos apretados 48 ft – 59 ft, 175 ft – 197 ft, y 362 ft - 376 ft.

- A 371 ft se encontró el diámetro del hueco a 5 1/2".

- REGISTROS ELECTRICOS

- NPT POR MTTO TOP DRIVE (13,5HRS)

28 noviembre 2021

- Continuó revisión del Top Drive.
- Realizó pruebas de rotación y torque del top drive, observó fallas en los sellos de la culata.
- Realizó Rig Down de motor hidráulico de top drive a la mesa de operaciones, cambió sellos al motor nuevo e instala nuevamente en la unidad de potencia del top drive.
- Realizó limpieza de service loop, procede al desacople.
- Realizó cambio de los sellos del motor del top drive, unidad hidráulica, cargo líneas del sistema service loop.
- Calibró rotación y torque del top drive
- Armó y bajó BHA No. 2 convencional desde superficie hasta 606.5 ft así: Broca Tricónica (Jets:3*20/32" +1*20/32") + Bit Sub + 1 Sencillo DC de 8” + 3 juntas DC de 6 ½” + 11 juntas HWDP de 5” + 4 juntas DP de 5”
- A 606,5 ft bombeó 50 bbls de píldora viscosa de 8.9 ppg y 150 seg/qt. Circuló hasta obtener retornos limpios con Q: 300 - 520 gpm, SPP: 350-650 psi, RPM: 50, TQ: 1 - 3 klbs.ft.
- Caving de la píldora; antes: 0.63 bph, durante: 1.72 bph, después: 0.41 bph. Morfología: 60% Blocoso, 30% grumos, 10% angular, Tamaño:2-13 mm.

- TR&RS - Inició corrida de revestimiento de 13 3/8” de la siguiente manera: Zapato flotador liso + 1 Junta (CSG 13 3/8” N80 BTC) 54,5 lb/ft + Collar flotador + XO + 1 junta (CSG 13 3/8” P110 FJ) 72 lb/ft desde superficie hasta 80 ft. (en total serán 16 juntas)

29 noviembre 2021

- Se continuó bajando revestimiento de 13-3/8” de la siguiente manera: Zapato flotador liso + 1 Junta (CSG 13 3/8” N80 BTC) 54,5 lb/ft + Collar flotador + XO + 2 juntas (CSG 13 3/8” P110 FJ) 72 lb/ft (Jta # 3) desde 80 hasta 126 ft.
- Circuló reciprocando revestimiento con los siguientes parámetros con Q:260 gpm, SPP:140 psi, RPM:19, TQ:0,8-2,4 klbs.ft.
- Tomó pesos subiendo: 60 klbs, rotando: 60 klbs, bajando: 60 klbs.
- Caving:0.15 bph - Morfología:80% grumos, 20% retrabajados, 3-7 mm.
- Realizó cementación del revestimiento de 13 3/8’’, así:
  - Liberó Bottom Plug
  - Bombeó 20 Bbl de Clav-1 @ 5bpm
  - Bombeó 118 Bbl de lechada TAIL SLURRY 15.6 ppg @ 5 bpm
  - Liberó Top Plug
  - Bombeó y desplazó 63 Bbl de lodo Spud Mud 8.9 ppg @ 5 bpm. a 200 psi
  - Bombeó 20 Bbl de agua fresca 8.4 ppg @ 2 bpm a 200 psi (Total desplazado 83 Bbl). retornó aproximadamente 19 Bbl de cemento de 15.6 lpg

30 noviembre 2021

- Se armó ensamble en forma ascendente para control de pozo de la siguiente manera:

  Instaló Sección A casing head FIP 13-5/8" x 5.000psi x Rin gasket BX-160 con salida 2" lp + gate valve 2-1/6" x 5000 psi y bull plug con salida NPT de 1/2"

  - Instaló Spacer Spool 13-5/8" x 5.000 psi x Rin gasket BX-160 X 13-5/8" x 5.000 psi x Rin gasket BX-160 con dos salidas de brida ciega 4" lp x 5000 psi
  - Instaló Double Studded Adapter Flange (DSAF) 13-5/8" x 5000 psi x Rin gasket BX-160 @ 13-5/8" x 10000 psi x Rin gasket BX-159
  - Instaló Drilling Spool 13-5/8" x 10.000 psi x Rin gasket BX-159 con 2 salidas de la siguiente manera:
  - salida #1: Válvula hidráulica control remoto (HCR) 4-1/16" x 10.000 psi x Rin gasket R-39 + Gate valve 3-1/8" x 10.000 psi x R-35
  - salida #2: Línea de matado (Jill line) 2-1/16" x 10.000 psi x R-24 + Check valve 2-1/16" x 5000 psi x R-24

- Instaló preventora doble ram shaffer 13-5/8’’ x 10000 psi x Rin gasket BX-159 - SDA 26-090

- Instaló Presentar anular esférico hydrill 13-5/8’’ x 10000 psi x Rin gasket BX-159 - SDA 26-047

1 diciembre 2021

- Realizó pruebas al conjunto de preventora y choque manifold así: - Hydrill Anular contra Test Plug y las válvulas 2-3-4 del choque manifold a 370 psi y 5000 psi, por 10 minutos, bien.
- Pipe Rams contra Test Plug y las válvulas 2-3-4 del choque manifold 300 y 5000 psi, por 10 minutos bien.
- Retiró junta de DP 5" y probó Blind Rams contra Test Plug y las válvulas 2-3-4 del choque manifold a 300 y 5000 psi, por 10 minutos bien.
- Válvula hidráulica a control remoto (HCR) y manual a 5000 psi por 10 minutos, bien
- Válvula hidráulica y manual de la línea de matado Kill line a 5000 psi por 10 minutos.
- Válvulas #1 hasta la #8 del choque manifold con 300 y 5000 psi por 10 minutos, bien Se continuó realizando mantenimiento correctivo a Top Drive.

2 diciembre 2021

- Continuó mantenimiento correctivo y prueba de funcionamiento para generar máximo torque en el Top Drive.
- Calibró profundidad de equipo direccional y continuó bajando BHA No. 3 direccional desde 214 hasta 543 ft así: Broca PDC 12 ¼'', Tipo: GT56MO5, Serial: 13228587, (Jets: 4x13/32" + 3x12/32" TFA: 0.8498 in2) + 8" Mud Motor Hyperline 250 QLE 6750-Camisa 11 3/4" + Estabilizador 11 3/4" + Short NMDC + HEL BAP + NMDC + X-Over + (3) juntas DC 6 ½" + (12) juntas de HWDP 5", donde tocó tope de cemento (TOC) a 543 ft.
- Perforó Cemento con BHA No. 3 direccional desde 543 hasta 548 ft con: WOB: 2 - 6 Klb-ft, Q: 345 gpm, SPP: 380 - 520 psi, 110 RPM, TQ: 4-5 Klb.

3 diciembre 2021

- Continuó con Drill Out desde 548 ft hasta 611 ft con los siguientes parámetros: Q:365 gpm, SPP: 450 - 630 psi, RPM:126 (mesa: 50 RPM y motor 76 RPM), TQ:4700 lb/ft, WOB: 2-5 Klb, En superficie el porcentaje de las muestras son 60% de formación Tubará (90% arcillolita y 10% limolita) y 40% de cemento. Se cambió fluido por lodo polímero semidisperso 9.0 ppg.
- Desplazó Agua - Lodo - Cemento por Lodo Polímero semidisperso de 9.0 ppg, con Q:200-240 gpm, SPP:100-150 psi.
- Continuó armando BHA No. 3 direccional desde 510 ft hasta 611 ft, así: Broca PDC 12 ¼'', Tipo: GT56MO5, Serial: 13228587, (Jets: 4x13/32" + 3x12/32" TFA: 0.8498 in2) + 8" Mud Motor Hyperline 250 QLE 6750-Camisa 11 3/4" + Estabilizador 11 3/4" + Short NMDC + HEL BAP + NMDC + X-Over + (3) juntas DC 6 ½" + (11) juntas de HWDP 5" + Drilling Jar 6 ½'' + (2) Juntas HWDP 5'' + (25) juntas DP 5"
- Perforó fase 12 ¼'' con BHA No. 3 direccional desde 611 ft hasta 1395 ft. WOB: 3 - 15 Klb-ft, Q: 500 - 630 gpm, SPP: 600 - 1100 psi, 168 RPM (RPM mesa: 64-80 RPM motor 106), TQ: 2-5.5 Klb. Avance: 779 ft, ROP prom: 56 ft/hr. Se realizó toma de survey en cada parada.MD: 1319 ft; TVD:1318,98 ft; Inclinación: 0,69°; azimut: 179.38°; DLS:0.38.

4 diciembre 2021

- Continuó fase 12 ¼'' con BHA No. 3 direccional en Formación Porquero, desde 1460 ft hasta 1808 ft. WOB: 3 - 10 Klb-ft, Q: 550 - 600 gpm, SPP: 720 - 1100 psi, 157 RPM (RPM mesa: 64 y RPM motor 93), TQ: 2-4.5 Klb. Avance: 348 ft, ROP prom: 33.14 ft/hr, ROP Efe: 58.74.
- Se realiza toma de survey; MD:1697 ft; TVD; 1696,96; INCLI 0,96°; DLS;096° Tope de la Formación Porquero a 1460 ft. Ultima litología registrada: 30% Arcillolita, 30% Arenisca, 20% Limolita, 20% Arena.
- Se continúa perforando fase 12 ¼'' con BHA No. 3 direccional en Formación Porquero, desde 1808 ft hasta 2267 ft. WOB: 2 - 8 Klbs, Q: 596 - 620 gpm, SPP: 820 - 1300 psi, 173 RPM (RPM mesa: 65 y motor 108), TQ: 4 Klb/ft, Avance: 459 ft, ROP prom: 39.91 ft/hr, ROP Efe: 59.30 ft/hr. Se realiza toma de survey cada parada, Ultima Litología: 2240 ft - 2260 ft: 70% Arcillolita, 20% Limolita, 10% Arenisca

Tally BHA #1

COMPONENTES BHA No.1 CONVENCIONAL

COMPONENTE BHA Nº:	1
FECHA:	24 de noviembre de 2021
COMPAÑÍA:	SERCOMADI
ENSIDAD DEL LODO (Lb/Gal	8,6

LOCACIÓN:	ANH - PAILITAS 1X
FASE	17 1/2"
BROCA Nº:	1
FACTOR DE BOYANZA	0,8687



DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	DUEÑO	SERIAL	O.D.	I.D.	F.N.	LONG efectiva	LONG PARCIA	LONG ACUM	TORQUE	PESO (LB)	PESO ACUMULADO	PESO BOYADO
			SDA56074	6 5/8	3 1/4"	1,60'	29,71		**637,82**		2031	8.470	**7.358**
			SDA56075	6 9/16	3 1/4	1,59'	29,62		**608,11**		2025	12.435	10.802
			SDA56076	6 5/8	3 1/4"	1,37'	28,89		**578,49**		1975	10.410	9.043
			SDA56077	6 5/8	3 1/4"	1,33'	29,21		**549,60**		1997	8.435	7.328
			SDA56093	6 5/8	3 1/4"	1,48'	29,32		**520,39**		2004	6.439	5.593
			SDA56094	6 5/8	4 1/4"	1,48'	29,46		**491,07**		2014	6.068	5.271
(13) JUNTAS HWDP 5 1/2" SPIRAL	XT 54 PinxBox	SERINCO	SDA56095	6 5/8	5 1/4"	1,48'	29,31	385,19	**461,61**	28.000	2044	4.619	4.013

TALLY BHA No. 2 CONVENCIONAL

BHA No.	**2**			**PROF. ENTRADA**	**606,5**	**POZO**	**Pailitas 1X**		**LONG. KELLY**
BROCA No.	**1R**			**DIAM.**	**17 1/2"**	**RIG**	**Serinco D10**		
TIPO				**JETS**	**3X18 + 1x20**	**BHA LONG**	**514,10**		
SERIAL No.	**5198717**			**TFA**	**1,053**	**FECHA:**	**28-Nov-21**		
ITEM	**HERRAMIENTA**	**LONG.**	**SN**	**OD**	**ID**	**Stand #**	**TOTAL**	**T.D. DOWN**	**KELLY DOWN**
1	**TRC BIT**	2,00		8 1/2	-		2,00		
1	**BIT SUB**	3,60		6 4/9	2 3/4		5,60	3,60	5,60
1	**8" DC**	30,54		6 1/2	2 3/4	1	36,14	34,14	36,14
	XOVER	3,74		8	6 1/2		39,88	37,88	39,88
1	**6 1/2" DC**	30,39	SDA56070	3	2, 813	1	70,27	68,27	70,27
2	**6 1/2" DC**	29,63	SDA56057	3	2, 813		99,90	97,90	99,90
3	**6 1/2" DC**	29,01	SDA56067	3	2, 813	2	128,91	126,91	128,91
1	**5" HWDP**	29,71	SDA56074	5	2 12/16	1	158,62	156,62	158,62
2	**5" HWDP**	29,62	SDA56075	5	2 12/16		188,24	186,24	188,24
3	**5" HWDP**	28,89	SDA56076	5	2 12/16	2	217,13	215,13	217,13
4	**5" HWDP**	29,21	SDA56077	5	2 12/16		246,34	244,34	246,34
5	**5" HWDP**	29,32	SDA56093	5	2 12/16	3	275,66	273,66	275,66
6	**5" HWDP**	29,46	SDA56094	5	2 12/16		305,12	303,12	305,12
7	**5" HWDP**	29,91	SDA56095	5	2 12/16	4	335,03	333,03	335,03
8	**5" HWDP**	29,90	SDA56096	5	2 12/16		364,93	362,93	364,93
9	**5" HWDP**	29,11	SDA56098	5	2 12/16	5	394,04	392,04	394,04
10	**5" HWDP**	29,67	SDA56099	5	2 12/16		423,71	421,71	423,71
11	**5" HWDP**	30,03	SDA56081	5	2 12/16	6	453,74	451,74	453,74
12	**5" HWDP**	30,01	SDA56082	5	3 12/16		483,75	481,75	483,75
13	**5" HWDP**	30,35	SDA56106	5	4 12/16		514,10	512,10	514,10
1	**5" DP**	31,53		5	4 1/2	1	545,63	543,63	545,63
2	**5" DP**	31,49		5	4 1/2		577,12	575,12	577,12
3	**5" DP**	31,39		5	4 1/2	2	608,51	606,51	608,51
4	**5" DP**	31,46		5	4 1/2		639,97	637,97	639,97

Tally casing 13 3/8¨

PAILITAS 1X

Tally Casing #1	CASING DE 13-3/8" P-110, 72#/ft, ROSCA CHINA	30/11/21

Total Depth 13-3/8"Sec:	606,00	ft	Mud Weight:	8,8 ppg	
Casing Setting Depth:	601,00	ft	Bougance factor:	0,8656	
Shoe Track	39,08	ft	Hook Load Weight:	50,0 Klbs	
Rat Hole	5,00	ft	RTE:	30,0 ft	
TRONCO	-3,37	ft			

Casing 13 3/8-in:	P-110
Inside Dia. (ID)	12,347 in
Drift	12,191 in
Capacity:	0,148 Bbls/ft
Displacement:	0,026 Bbls/ft
Collapse P:	2.890 PSI
Estallido	7400 PSI

Item	Descript	Grade	Peso #	Entra Sarta/None	in Hole	Length (ft)	Running Depth (ft)	On Slips Depth (ft)	Hook Load Weigth	Cumm. Displac Bbls	Capacity: Bbls	Depth Ubication (ft) Base	Depth Ubication (ft) Top	Centralización Circulación
ZAPATO	CPVEN			S		2,00	2,00		50,00	0,05	0,30	601,00	599,00	ZAPATO CPVEN
1	13 3/8	P110	72,0	S	1	39,08	41,08	44,45	52,44	1,06	6,08	599,00	559,92	
COLLAR	CP VEN			S		1,80	42,88	46,25	52,55	1,10	6,35	559,92	558,12	COLLAR CPVEN
X OVER	13 3/8	N-80	72,0	S	2	3,60	46,48	49,85	52,77	1,19	6,88	558,12	554,52	
2	13 3/8	N-80	72,0	S	3	37,76	84,24	87,61	55,13	2,16	12,48	554,52	516,76	
3	13 3/8	N-80	72,0	S	4	37,88	122,12	125,49	57,49	3,14	18,09	516,76	478,88	
4	13 3/8	N-80	72,0	S	5	36,01	158,13	161,50	59,73	4,06	23,42	478,88	442,87	
5	13 3/8	N-80	72,0	S	6	37,07	195,20	198,57	62,04	5,01	28,91	442,87	405,80	
6	13 3/8	N-80	72,0	S	7	37,40	232,60	235,97	64,37	5,97	34,45	405,80	368,40	
7	13 3/8	N-80	72,0	S	8	36,56	269,16	272,53	66,65	6,91	39,86	368,40	331,84	
8	13 3/8	N-80	72,0	S	9	38,29	307,45	310,82	69,04	7,90	45,53	331,84	293,55	
9	13 3/8	N-80	72,0	S	10	37,60	345,05	348,42	71,38	8,86	51,10	293,55	255,95	
10	13 3/8	N-80	72,0	S	11	37,61	382,66	386,03	73,73	9,83	56,67	255,95	218,34	
11	13 3/8	N-80	72,0	S	12	37,11	419,77	423,14	76,04	10,78	62,17	218,34	181,23	
12	13 3/8	N-80	72,0	S	13	37,70	457,47	460,84	78,39	11,75	67,75	181,23	143,53	
13	13 3/8	N-80	72,0	S	14	37,47	494,94	498,31	80,72	12,71	73,30	143,53	106,06	
14	13 3/8	N-80	72,0	S	15	36,20	531,14	534,51	82,98	13,64	78,66	106,06	69,86	
15	13 3/8	N-80	72,0	S	16	37,08	568,22	571,59	85,29	14,60	84,15	69,86	32,78	
16	13 3/8	N-80	72,0	S	17	36,15	604,37	607,74	87,54	15,52	89,50	32,78	-3,37	
17	13 3/8	N-80	72,0	N		36,70	604,37	607,74	87,54	15,52	89,50	-3,37	-3,37	
18	13 3/8	N-80	72,0	N		35,93		607,74	87,54	15,52	89,50	-3,37	-3,37	

Número de juntas que entran al pozo	16	Centralizadores:	15		RTE: 30,00
Pup Joints	0	Desplazamiento Cem.	83,15 Bbls	Teórico	
Número de juntas que sobran:	3				

RESISTENCIA AL COLAPSO: 2370 psi
PRESIÓN DE ESTALLIDO: 5120 psi

EXLOG
EXCELLENCE LOGGING

TALLY BHA No. 3 DIRECCIONAL

BHA No.	3		PROF. ENTRADA		606,5	POZO	ANH-PAILITAS-1X	
BROCA No.	2			DIAM.	12 1/4"	RIG	SERINCO DRILLING D10	
TIPO	GT56MO5			JETS	4*13 + 3*12	BHA LONG	611,01	
SERIAL No.	13228587			TFA	0,8498	FECHA:	7-Dec-21	
ITEM	HERRAMIENTA	LONG.	SN	OD	ID	Stand #	TOTAL	T.D. DOWN
1	BROCA PDC 12 1/4"	1,50	13228587	12 1/4	-		1,50	
2	8" Mud Motor Hyperline 250 QLE 6750-Camisa 11 3/4"	33,68	800-2968	8 1/8"	-		35,18	33,18
3	ESTABILIZADOR 11 3/4"	7,66	TDL-11-75-2-19	7 3/4"	2 5/8		42,84	40,84
4	Short NMDC	9,60	DCNM800-423	7 1/8"	3 1/4"		52,44	50,44
5	HEL BAP	26,53	J5010441PDSSQI8.25	8"	2 3/4		78,97	76,97
6	NMDC	24,27	DCNM800-15373	8 3/4"	2 13/16		103,24	101,24
7	X-Over	2,61	WDDS027348	6 5/8"	4 1/2"		105,85	103,85
1	6 1/2" DC	29,64		6 9/16"	2 3/4		135,49	133,49
2	6 1/2" DC	28,73		6 9/16"	3	1	164,22	162,22
3	6 1/2" DC	28,97		6 9/16"	3		193,19	191,19
1	5 " HWDP	29,71	SDA56074	6 5/8"	2 12/16	1	222,90	220,90
2	5 " HWDP	29,62	SDA56075	6 5/8"	2 12/16		252,52	250,52
3	5 " HWDP	28,89	SDA56076	6 5/8"	2 12/16	2	281,41	279,41
4	5 " HWDP	29,21	SDA56077	6 5/8"	2 12/16		310,62	308,62
5	5 " HWDP	29,32	SDA56093	6 5/8"	2 12/16	3	339,94	337,94
6	5 " HWDP	29,46	SDA56094	6 5/8"	2 12/16		369,40	367,40
7	5 " HWDP	29,91	SDA56095	6 5/8"	2 12/16	4	399,31	397,31
8	5 " HWDP	29,90	SDA56096	6 5/8"	2 12/16		429,21	427,21
9	5 " HWDP	29,11	SDA56098	6 5/8"	2 12/16	5	458,32	456,32
10	5 " HWDP	29,67	SDA56099	6 5/8"	2 12/16		487,99	485,99
11	5 " HWDP	30,03	SDA56081	6 5/8"	2 12/16	6	518,02	516,02
-	Drilling Jar	32,63	TPFC650-239	5 1/2"	2 12/16	-	550,65	548,65

POZO: ANH-PAILITAS 1-X – REPORTE DE HORAS								
FASE	DIA	FECHA	TIEMPO PLANEADO	TIEMPO NO PLANEADO OPERATIVO	COMENTARIOS	TIEMPO NO PRODUCTIVO	COMENTARIOS	TOTAL TIEMPOS POR DIA OPERATIVO
17 1/2	1	24-nov-2021	14,00	0,00				14,00

17 1/2	2	25-nov-2021	24,00	0,00		11,50	(0,50)hr Se Observó fuga de aceite en el motor hidráulico del Top Drive. Se saca por seguridad dos paradas de Drill Collars 6 1/2" desde 404 ft hasta 280 ft. (0,50) hr conecto línea y estableció circulación con Q:160 gpm hasta retornos en superficie. (7,50) Reparó fuga de aceite en el motor hidráulico del Top Drive. (0,50) Conectó y bajó las dos paradas de Drill Collars de 6 1/2" desde 280 ft hasta 403 ft. (2,50) Se observó taponamiento del Flow line y salida a los Shakers, se realizó limpieza con éxito.	12,50
17 1/2	3	26-nov-2021	24,00	0,00		12,50	(0,50) Observó caída de presión. Realizó limpieza de filtros en bombas de lodos. (10,00) Corrigió fuga de aceite hidráulico cambiando el motor hidráulico en Top Drive Tesco XH1700. Nota: - Sacó dos sencillos de HWDP 5'' No. 9 y 8 – Por seguridad - Se mantiene circulando el pozo a Q: 295 gpm con retornos en superficie - Durante la reparación se realizó simulacro de evacuación general. (2,00) Al sacar sencillo # 4 de DC 6 ½" de la parada # 2, se observó sobre-torque y no se pudo destorquear con llaves de potencia y neumáticas; se mete la parada en el hueco cabrón y se corta con soldadura la unión de las juntas # 4 y # 3, tomando todas las medidas de seguridad, haciendo monitoreo de gases y con equipo contra incendios en el sitio. La maniobra de corte se realiza exitosamente.	11,50

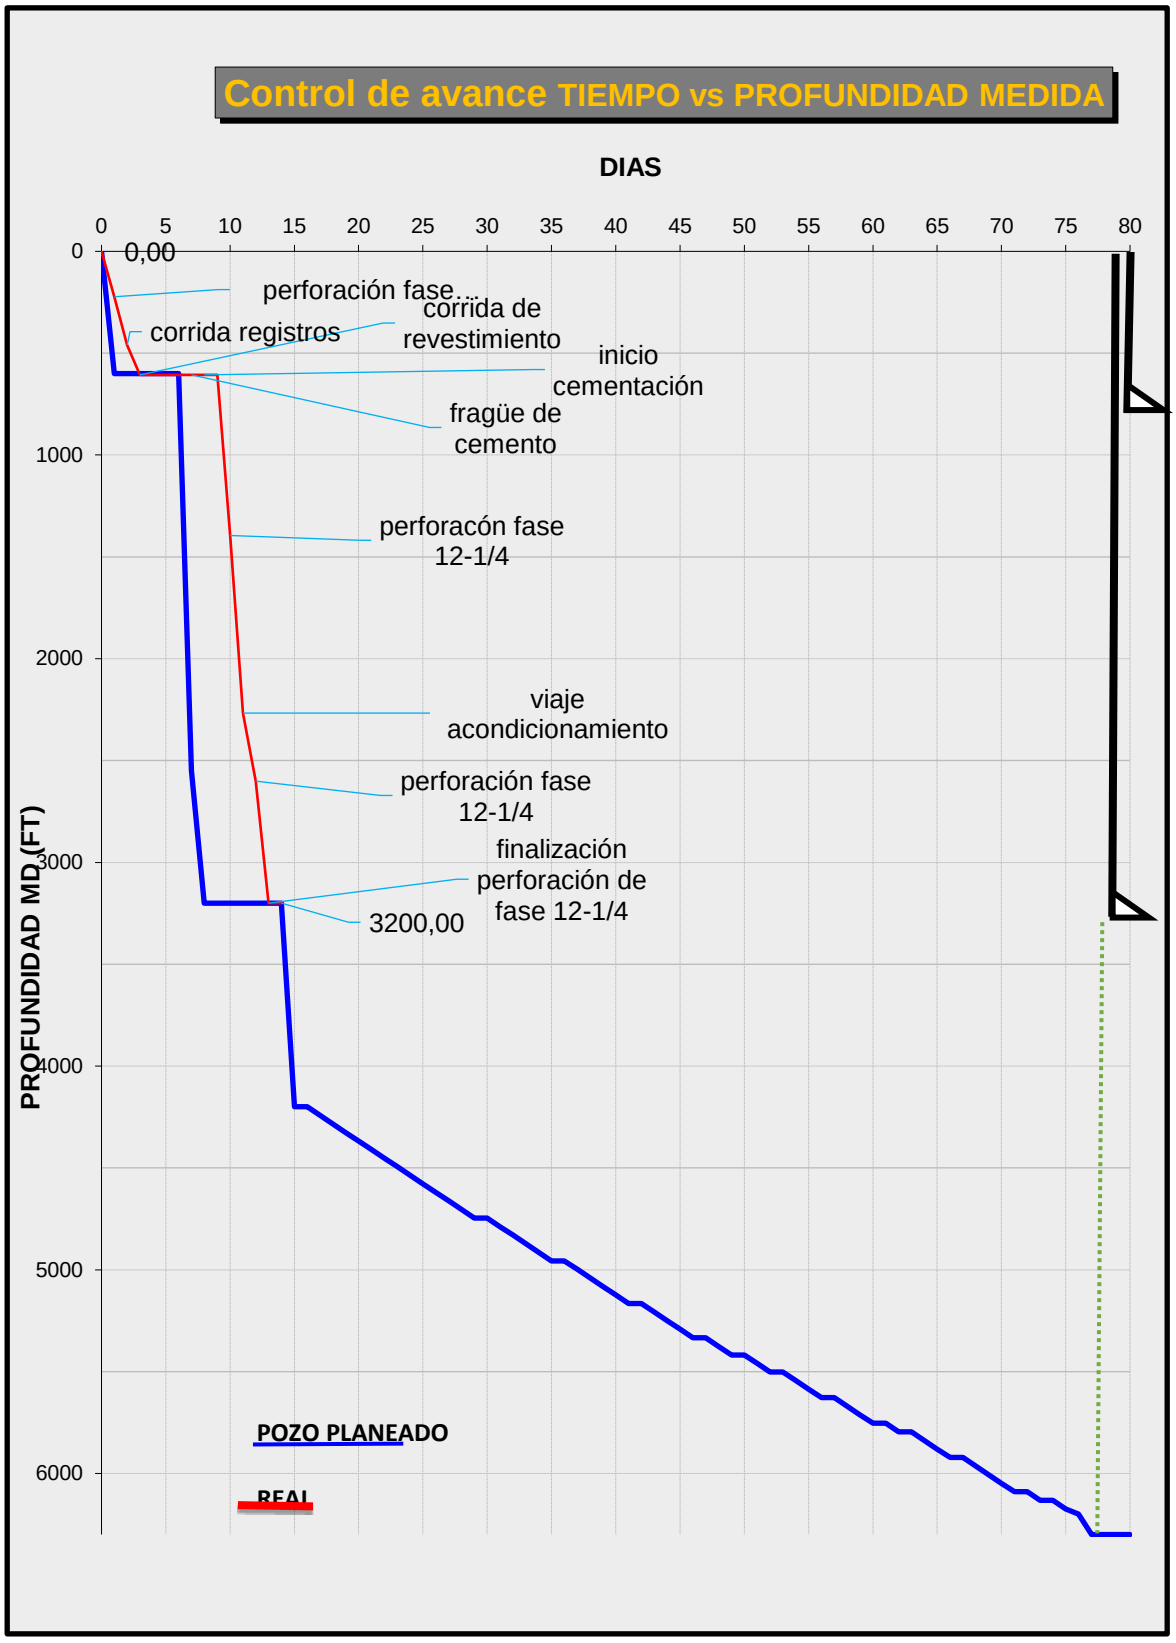
17 1/2	4	27-nov-2021	24,00	0,00		13,50	(3,50) Se realiza cambio del motor hidráulico del Top Drive. (6,00) Se presenta de nuevo fuga en el sistema hidráulico del motor del Top (0,50) Drive y se procede a retirarlo para inspección. TRS - Realizó Rig Down de equipos de corrida y manejo de revestimiento de 13 3/8''. (3,50) Continuó la revisión del funcionamiento del Top Drive.	10,50

17 1/2	5	28-nov-2021	24,00	0,50	(0,50) Realizó charla preoperacional y de seguridad con la cuadrilla. Socializó los riesgos asociados al manejo de sustancias químicas durante las operaciones de perforación y workover.	21,50	(6,00) Continuó revisión del Top Drive. (7,00) Continuó revisión del Top Drive. - Realizó pruebas de rotación y torque del top drive, observó fallas en los sellos de la culata. - Realizó Rig Down de motor hidráulico de top drive a la mesa de operaciones, cambió sellos al motor nuevo e instala nuevamente en la unidad de potencia del top drive. - Realizó limpieza de service loop, procede al desacople. - Realizó cambio de los sellos del motor del top drive, unidad hidráulica, cargo líneas del sistema service loop. - Calibró rotación y torque del top drive, ok. (1,00) Armó y bajó BHA No. 2 convencional desde superficie hasta 606.5 ft así: Broca Tricónica (Jets:3*20/32" +1*20/32") + Bit Sub + 1 Sencillo DC de 8” + 3 juntas DC de 6 ½” + 11 juntas HWDP de 5” + 4 juntas DP de 5” (2,00) A 606,5 ft bombeó 50 bls de píldora viscosa de 8.9 ppg y 150 seg/qt. Circuló hasta obtener retornos limpios con Q: 300 - 520 gpm, SPP: 350-650 psi, RPM: 50, TQ: 1 - 3 klbs.ft. Caving de la pildora; antes: 0.63 bph, durante: 1.72 bph, después: 0.41 bph. Morfología: 60% Blocoso, 30% grumos, 10% angular, Tamaño:2-13 mm. (3,00) Sacó BHA No. 2 convencional desde 606.5 ft hasta superficie así: 4 juntas DP de 5” + 11 juntas HWDP de 5”’ + 3 juntas DC de 6 ½”+ 1 Sencillo DC de 8” + Bit Sub + Broca Tricónica (Jets:3*20/32" +1*20/32"). (0,50) Alistó y limpió mesa para corrida y manejo de revestimiento de 13-3/8”. (0,50) Personal TR&RS realizó reunión preoperacional y de seguridad para realizar rig up de herramientas de manejo y corrida de revestimiento de 13-3/8”, socializó con el personal involucrado los riesgos y peligros asociados. (1,50) TR&RS - Realizó Rig up de equipos de corrida y manejo de revestimiento de 13-3/8”. - CDS drilling sistem, service loop, spider, consola.	2,00

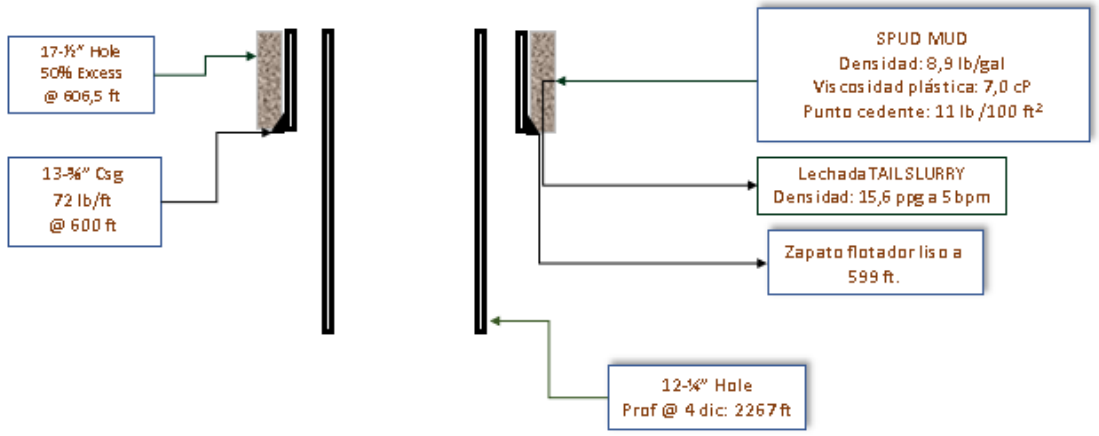
17 1/2	6	29-nov-2021	24,00	0,00		2,00	(0,50) Configuró llave aguantadora y ajustó elevador para continuar bajando revestimiento. (1,00) Subió a la mesa Jta # 4 de CSG 13-3/8". Se intentó torquear con el Top Drive y mecánicamente, sin éxito. (0,50) Rig Up de llave hidráulica EKEL - 20 para instalación de revestimiento.	22,00
12 1/4	7	30-nov-2021	24,00	0,00		2,00	(2,00) Se cambió motor rinner del top drive	22,00

12 1/4	8	1-dic-2021	24,00	18,00	(18,00) Realizó pruebas al conjunto de preventoras y choke manifold así: - Hydrill Anular contra Test Plug y las válvulas 2-3-4 del choke manifold a 370 psi y 5000 psi, por 10 minutos, bien. - Pipe Rams contra Test Plug y las válvulas 2-3-4 del choke manifold 300 y 5000 psi, por 10 minutos bien. - Retiró junta de DP 5" y probó Blind Rams contra Test Plug y las válvulas 2-3-4 del choke manifold a 300 y 5000 psi, por 10 minutos bien. - Válvula hidráulica a control remoto (HCR) y manual a 5000 psi por 10 minutos, bien - Válvula hidráulica y manual de la línea de matado kill line a 5000 psi por 10 minutos, bien - Válvulas #1 hasta la #8 del choke manifold con 300 y 5000 psi por 10 minutos, bien.	0,00		6,00
12 1/4	9	2-dic-2021	24,00	6,00	(6,00) Probó Válvulas # 9, 10, 11, 12 ,13 y 14 del choke manifold con 300 y 5000 psi por 10 minutos, bien. - Continuó mantenimiento del Top Drive	7,50	(7,50) Continuó mantenimiento correctivo y prueba de funcionamiento para generar máximo torque en el Top Drive	10,50

12 1/4	10	3-dic-2021	24,00	2,00	(6,00) Continuó con Drill Out desde 548 ft hasta 611 ft con los siguientes parámetros: Q:365 gpm, SPP: 450 - 630 psi, RPM:126 (mesa: 50 RPM y motor 76 RPM), TQ:4700 lb/ft, WOB: 2-5 klb, En superficie el porcentaje de las muestras son 60% de formación Tubará (90% arcillolita y 10% limolita) y 40% de cemento	0,00		22,00
12 1/4	11	4-dic-2021	24,00			1,50	Falla en el sistema de energía del taladro	22,50


Control de avance TIEMPO vs PROFUNDIDAD MEDIDA
DIAS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
PROFUNDIDAD MD (FT)
0,00
perforación fase...
corrida de revestimiento
corrida registros
inicio cementación
fragüe de cemento
perforacón fase 12-1/4
viaje acondicionamiento
perforación fase 12-1/4
finalización perforación de fase 12-1/4
3200,00
POZO PLANEADO
REAL

ESTADO MECÁNICO POZO ANH PAILITAS-1X (semana 28 – 4 diciembre)



PARAMETROS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN SECCION 17 1/2

FLUIDOS DE PERFORACIÓN								
ITEM	VALOR	UNIDAD	ITEM	VALOR	UNIDAD	ITEM	VALOR	UNIDAD
TIPO	SPUD MUD		GELES	2,0/4	10s/10m/30m	CLORUROS	60	mg/lt
DENSIDAD	8,6	Lbs / gal	M.B.T	8,0	Lbs/Bbl Eq.	CALCIOS	40	mg/lt
VISCOSIDAD EMBUDO	34,0	seg	% SOLIDOS	3	%	SALINIDAD	N.A	mg/lt
VISCOSIDAD PLASTICA	7,0	(cP)	FILTRADO API	N.A	cu cm / 30 min	OWR	N.A	% / %
PUNTO CEDENTE	10,0	Lbs/100 ft2	FILTRADO HPHT	N.A	cu cm / 30 min	LIME	0,01	Lbs / Bbl
			ALCALINIDAD	0,05	mg/lt	EE	N.A	mV

PARAMETROS DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN SECCION 12 1/4

FLUIDOS DE PERFORACIÓN								
ITEM	VALOR	UNIDAD	ITEM	VALOR	UNIDAD	ITEM	VALOR	UNIDAD
TIPO	POLIMERO SEMIDISPERSO		GELES	7 - 9 - 11	10s/10m/30m	CLORUROS	1900	mg/lt
DENSIDAD	9,3	Lbs / gal	M.B.T	12,5	Lbs/Bbl Eq.	CALCIOS	160	mg/lt
VISCOSIDAD EMBUDO	40,0	seg	% SOLIDOS	7	%	SALINIDAD	N.A	mg/lt
VISCOSIDAD PLASTICA	10,0	(cP)	FILTRADO API	7	cu cm / 30 min	OWR	N.A	% / %
PUNTO CEDENTE	12,0	Lbs/100 ft2	FILTRADO HPHT	N.A	cu cm / 30 min	LIME	0,32	Lbs / Bbl
			ALCALINIDAD	1,7	mg/lt	EE	N.A	mV

REPORTE DE GEOLOGIA

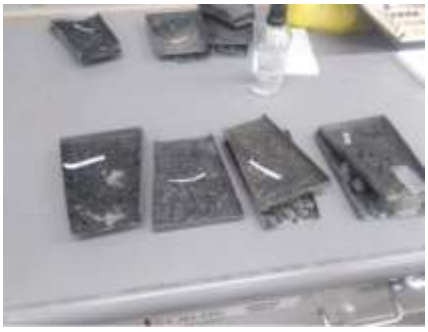
- 22 al 27 de noviembre:

El día 22 se realizó el viaje desde Bogotá hasta la locación, por vía aérea y terrestre. En horas de la tarde este día, los geólogos estuvieron en las oficinas de la UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI, en Guamal (Magdalena), donde se les entregaron sus elementos de protección personal, y se leyó y firmó el contrato laboral de trabajo. El 23 se hizo inspección de cabina y equipos de la compañía de mudlogging; se revisaron formatos de trabajo, plantillas de informes, y se hizo una lectura y análisis de la información técnica disponible, esto es, Anexo Técnico del pozo ANH-Pailitas 1-X y el DWOP. El 24 se inició perforación del pozo. Los geólogos de pozo se dividieron la jornada laboral en dos turnos de trabajo, pues su labor implica 24 de horas de dedicación. Los geólogos de pozo analizaron muestras de zanja bajo la lupa binocular y el fluoroscopio, cada 20 pies, además de los chequeos entre esta frecuencia de muestreo, se tomaron fotos de las muestras, se supervisó la labor del personal de la unidad de mudlogging, se revisó y se dio visto bueno a los informes, se revisó la recolección y almacenaje de muestras, y se atendieron los requerimientos de la interventoría. El 24 de noviembre se alcanzaron los 223 ft MD de profundidad. El 25 se continuó perforación del pozo; Los geólogos de pozo analizaron muestras de zanja bajo la lupa binocular y el fluoroscopio, cada 20 pies, además de los chequeos entre esta frecuencia de muestreo, se tomaron fotos de las muestras, se supervisó la labor del personal de la unidad de mudlogging, se revisó y se dio visto bueno a los informes, se revisó la recolección y almacenaje de muestras, y se atendieron los requerimientos de la interventoría. Se alcanzaron los 460 ft MD de profundidad. El 26 se continuó perforación del pozo. Los geólogos de pozo analizaron muestras de zanja bajo la lupa binocular y el fluoroscopio, cada 20 pies, además de los chequeos entre esta frecuencia de muestreo, se tomaron fotos de las muestras, se supervisó la labor del personal de la unidad de mudlogging, se revisó y se dio visto bueno a los informes, se revisó la recolección y almacenaje de muestras, y se atendieron los requerimientos de la interventoría. Se alcanzaron los 606 ft MD de profundidad. En 27 de noviembre, en la madrugada, se realizó la labor de toma de registros en hueco abierto, sección de 17 ½”. El geólogo de pozo estuvo presente durante el armado de las herramientas, supervisó la calibración de las mismas, revisó que se tuvieran las herramientas de backup. Supervisó la labor toma de registros, incluida la sección repetida, y chequeó que el cabezote de registros cumpliera con los estándares y presentación de la información requerida. Además, se verificó que los archivos entregados por la unidad de registros (LAS, DLIS, PDF, LIS, TIFF) cumplieran con los parámetros básicos de calidad exigidos.

- 28 de noviembre al 4 de diciembre

El día 28 de noviembre se realizó supervisión a la unidad de mudlogging, repasando el estado de la información recopilada a la fecha, esto es: descripción de muestras, elaboración del FEL. Se revisó nuevamente el estado de las muestras recolectadas, y se atendieron los requerimientos de la interventoría. El día 29 de noviembre se llevó a cabo el análisis y clasificación de la información disponible, y se procedió a dar inicio al informe de descripción de muestras, así como al informe del pozo (parcial). El día 30 de noviembre se continuó con la revisión de la información y elaboración del informe del pozo (parcial). Se realizó además el cambio de turno de los geólogos de pozo (el geólogo de la noche pasa al turno de día, y viceversa). El día 1 de diciembre se continuó con la revisión de la información y elaboración del informe del pozo (parcial). Se analizó la información disponible de pozos cercanos, procediendo a realizar ejercicios de correlación con dichos pozos. El día 2 de diciembre se atendieron requerimientos por parte del director de proyecto, en lo referente a los cambios en las cantidades y en los recipientes de almacenamiento de muestras secas y húmedas. Se realizaron las averiguaciones respectivas con la coordinación de la compañía de mudlogging, atendiendo además las inquietudes que la interventoría tuvo sobre el referido tema. El 3 de diciembre se continuó perforación del pozo. Los geólogos de pozo analizaron muestras de zanja bajo la lupa binocular y el fluoroscopio, cada 20 pies, además de los chequeos entre esta frecuencia de muestreo, se tomaron fotos de las muestras, se supervisó la labor del personal de la unidad de mudlogging, se revisó y se dio visto bueno a los informes, se revisó la recolección y almacenaje de muestras, y se atendieron los requerimientos de la interventoría. Se alcanzaron los 1395 ft MD de profundidad. El 4 de diciembre se continuó perforación del pozo. Los geólogos de pozo analizaron muestras de zanja bajo la lupa binocular y el fluoroscopio, cada 20 pies, además de los chequeos entre esta frecuencia de muestreo, se tomaron fotos de las muestras, se supervisó la labor del personal de la unidad de mudlogging, se revisó y se dio visto bueno a los informes, se revisó la recolección y almacenaje de muestras, y se atendieron los requerimientos de la interventoría. Se alcanzaron los 2267 ft MD de profundidad. Además de lo anterior, durante toda la fase de perforación se han venido revisando los reportes de la unidad direccional (Weatherford), quienes llevan el control direccional del pozo.

REGISTRO FOTOGRAFICO GEOLOGIA

	
Reunión preoperacional, previa a la segunda corrida de registros eléctricos por parte de Halliburton	Con la interventora y el ingeniero de registros, revisando procedimientos de seguridad
	
Muestras de zanja, que se están analizando en lupa binocular	Geólogo de pozo, analizando muestras de zanja, en lupa binocular, en la unidad de mudlogging
	
Geólogos de pozo, Raúl Martínez y Alejandro Parra, revisando la calibración y funcionamiento de las herramientas de registros, de Halliburton	

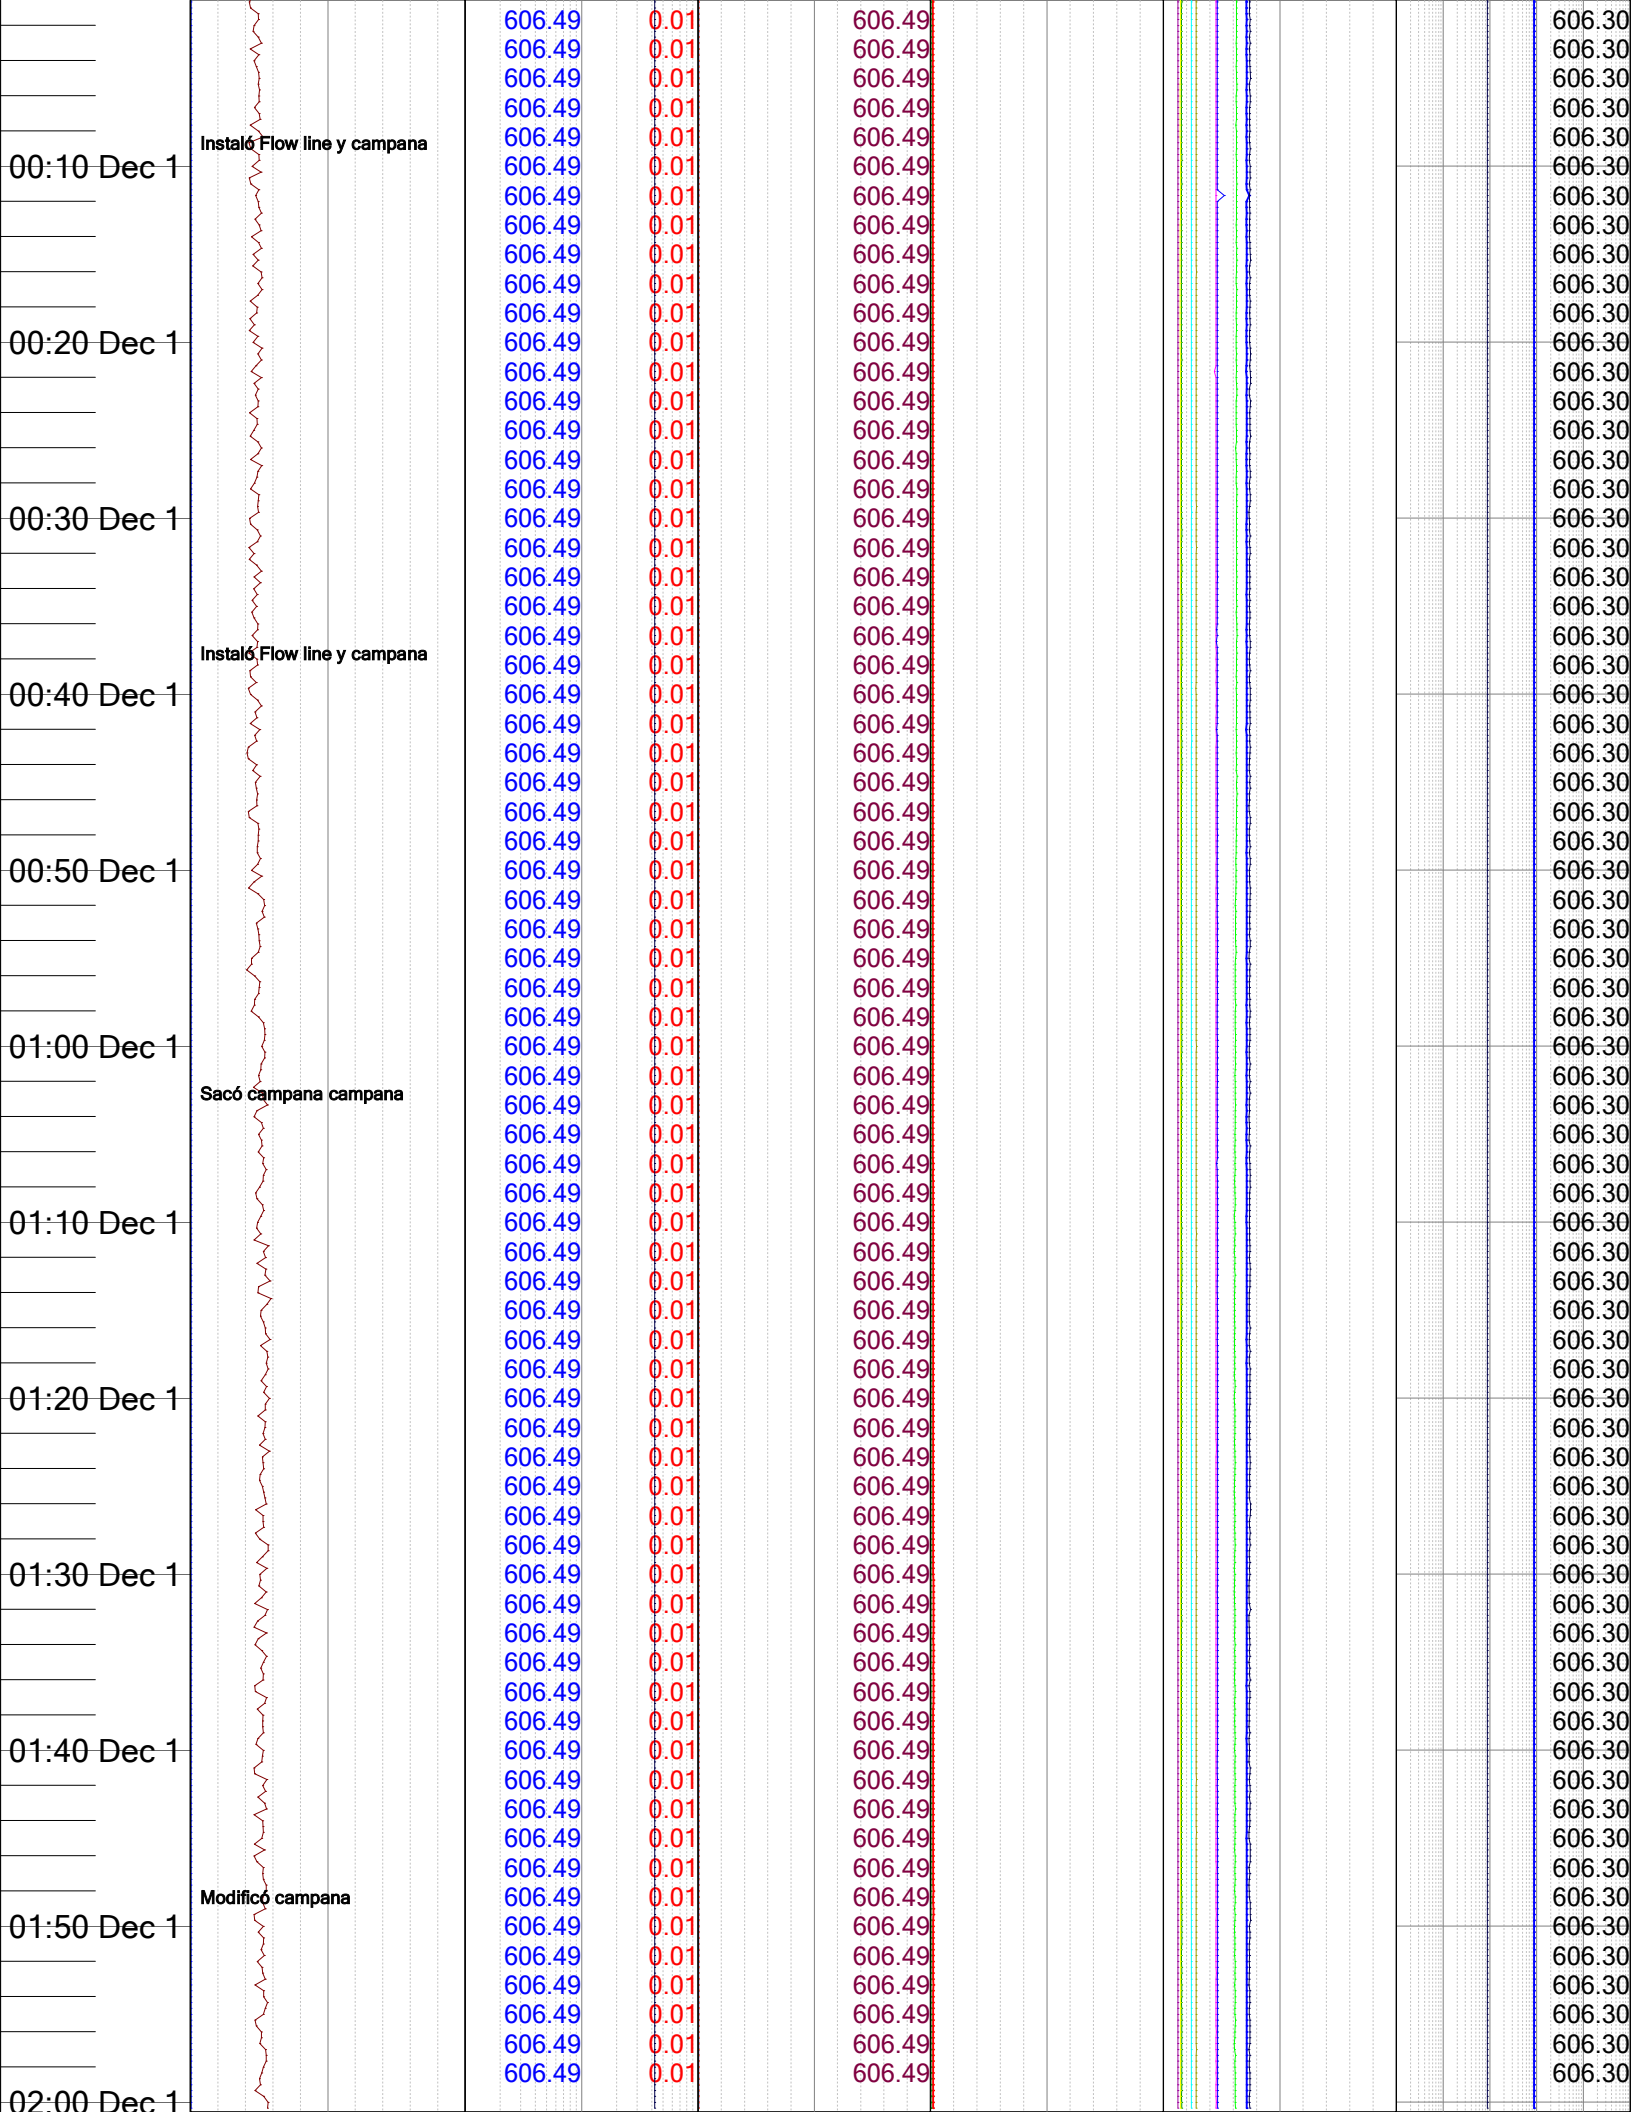
INCIDENT desde el 1° DICIEMBRE 2021
al 2 de Diciembre, pruebas BOP's,
POZO: ANH-PAILITAS-1-X

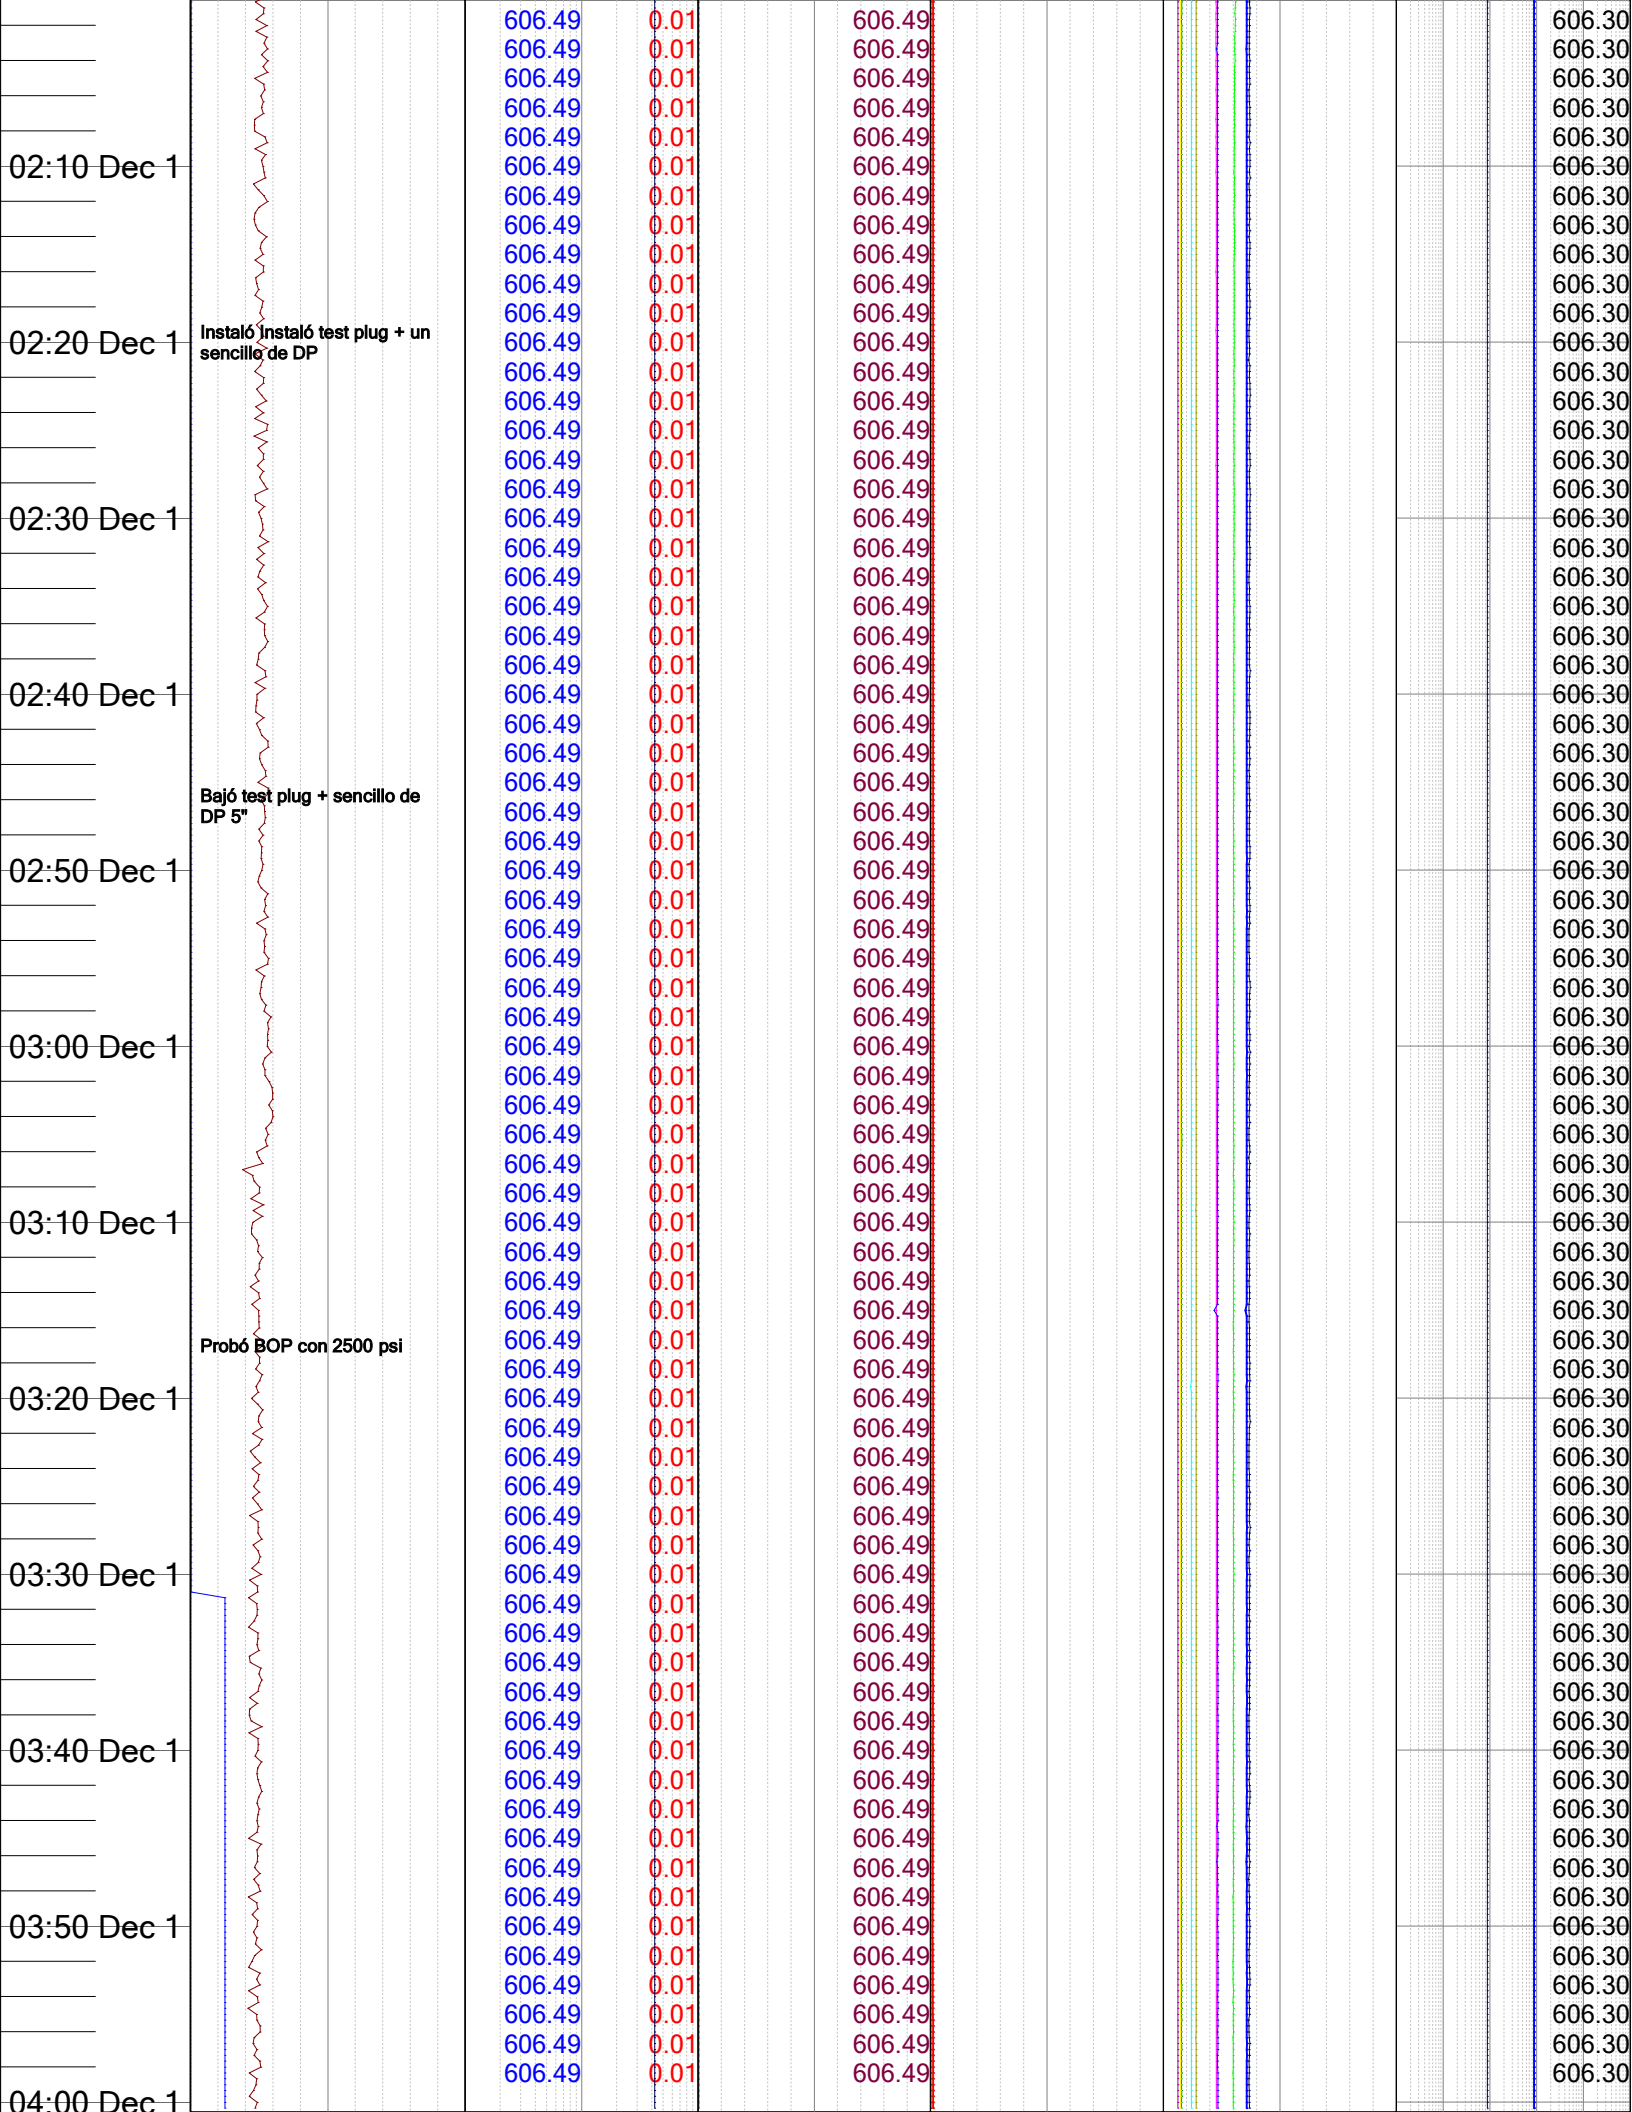
PERSONNEL

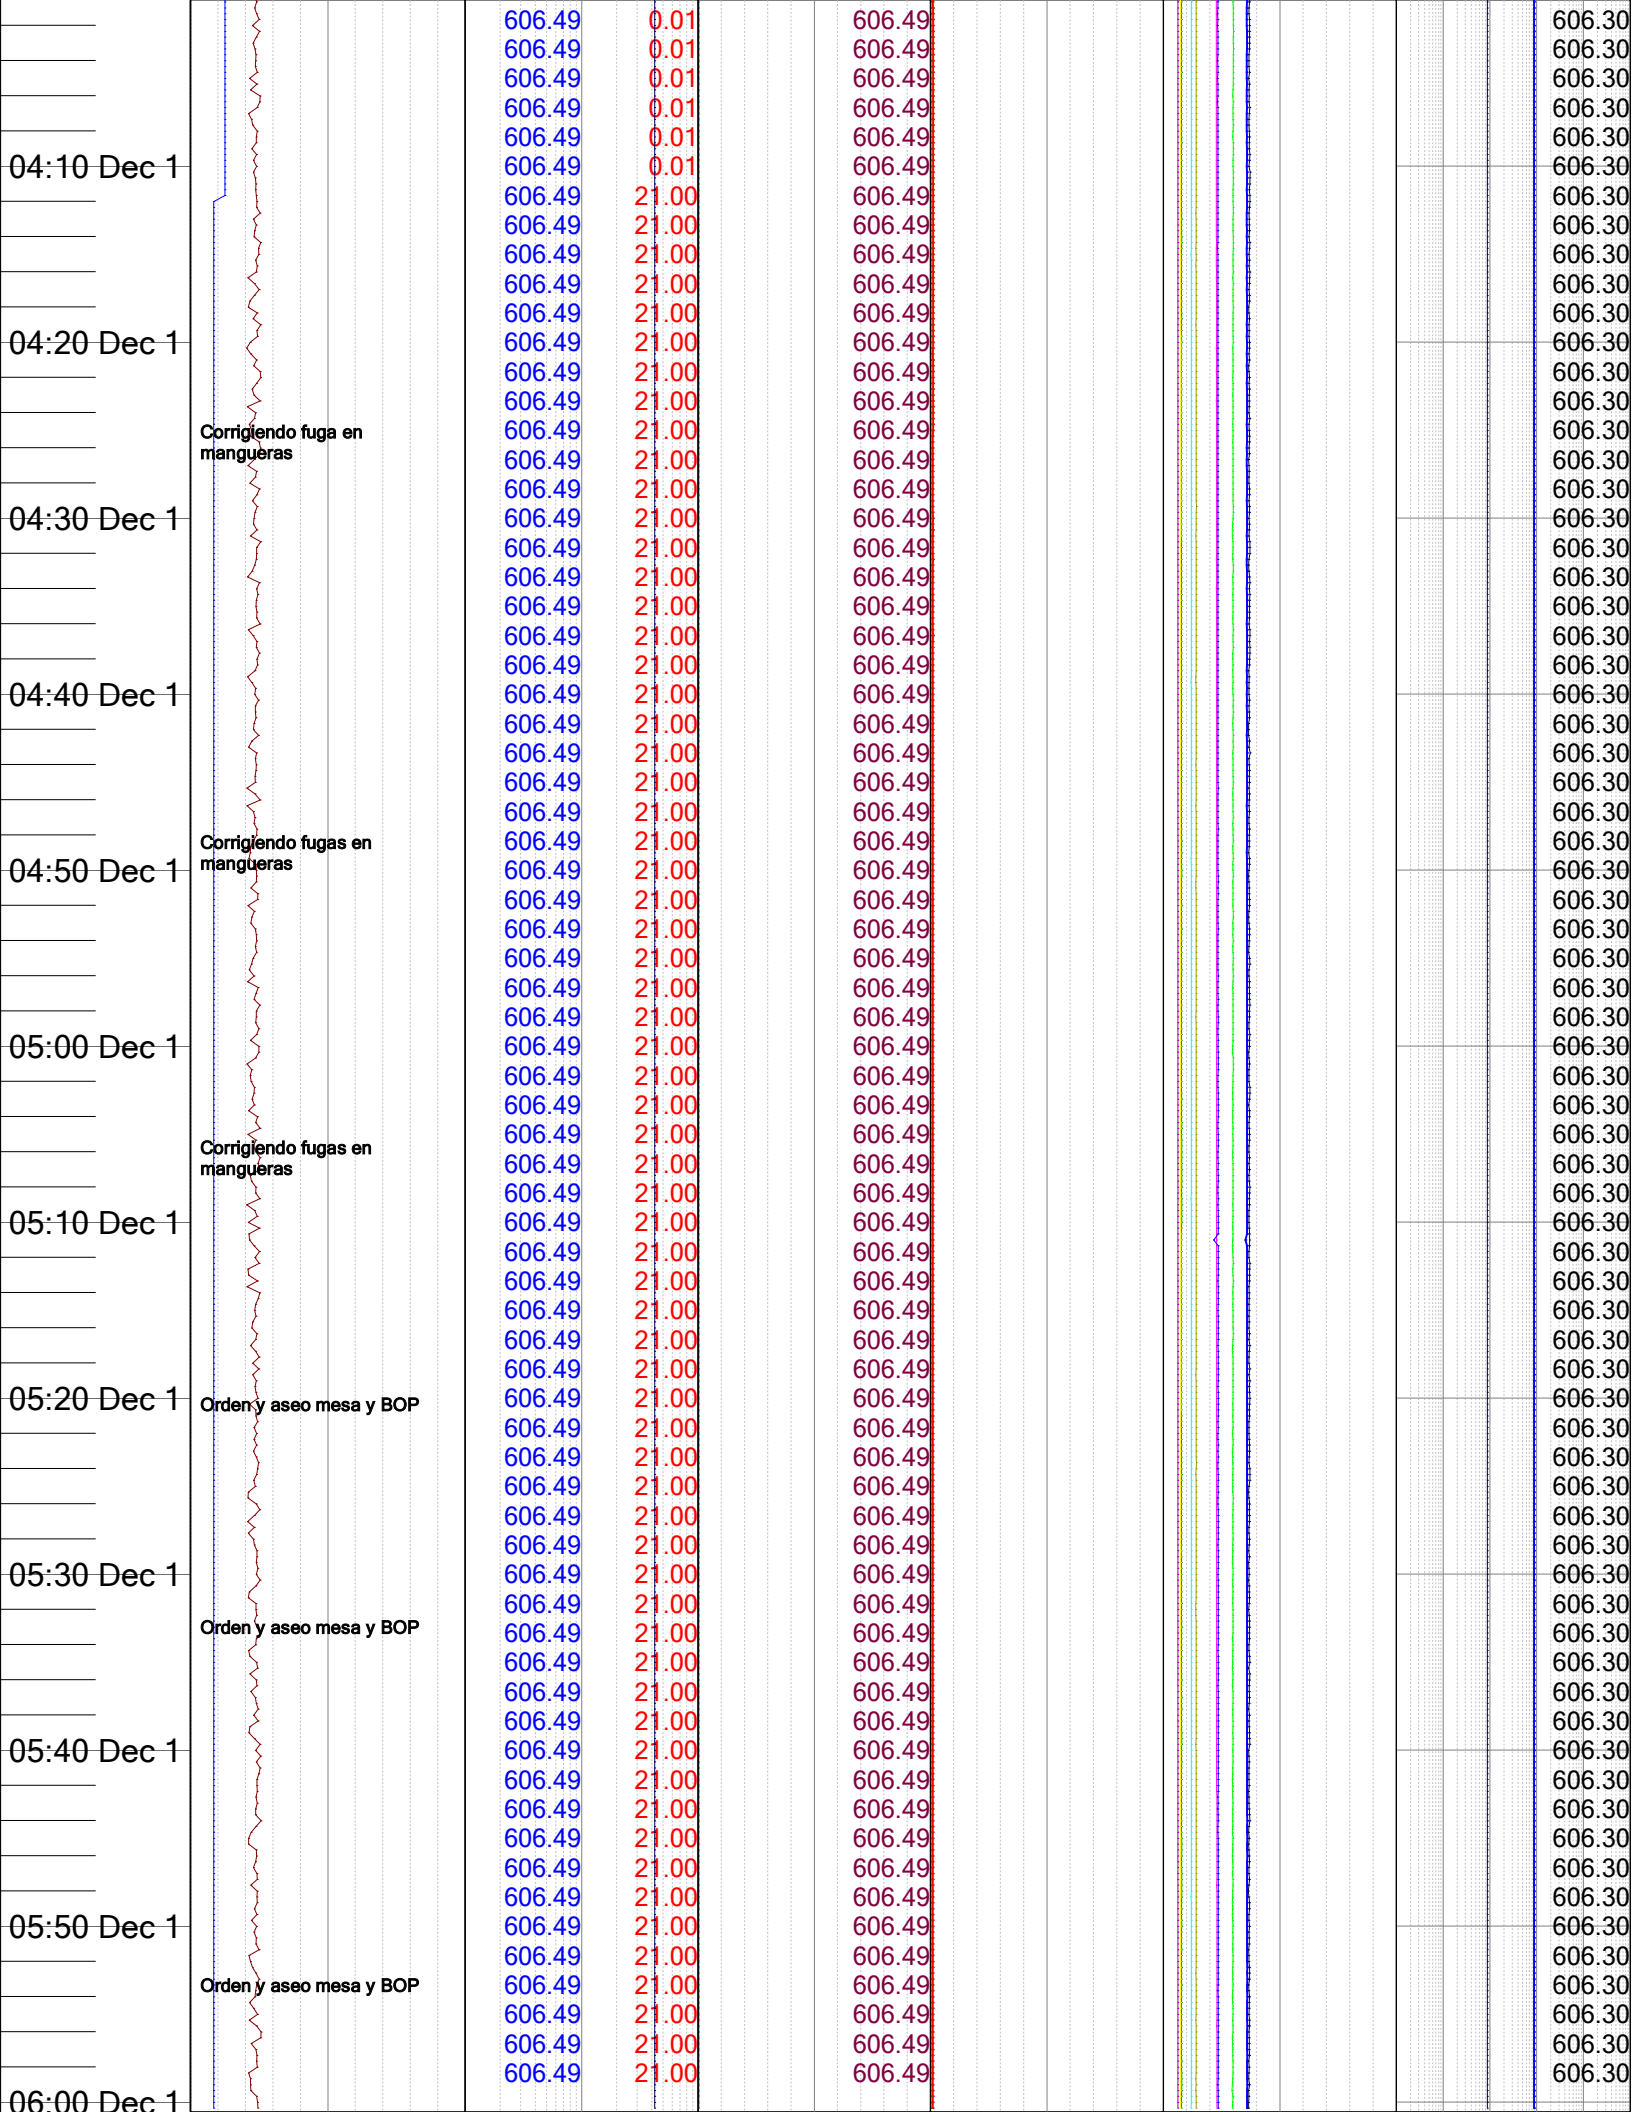
DATA ENGINEERS
LUIS HERNANDEZ / RAMON SANCHEZ / JORGE FUENTES

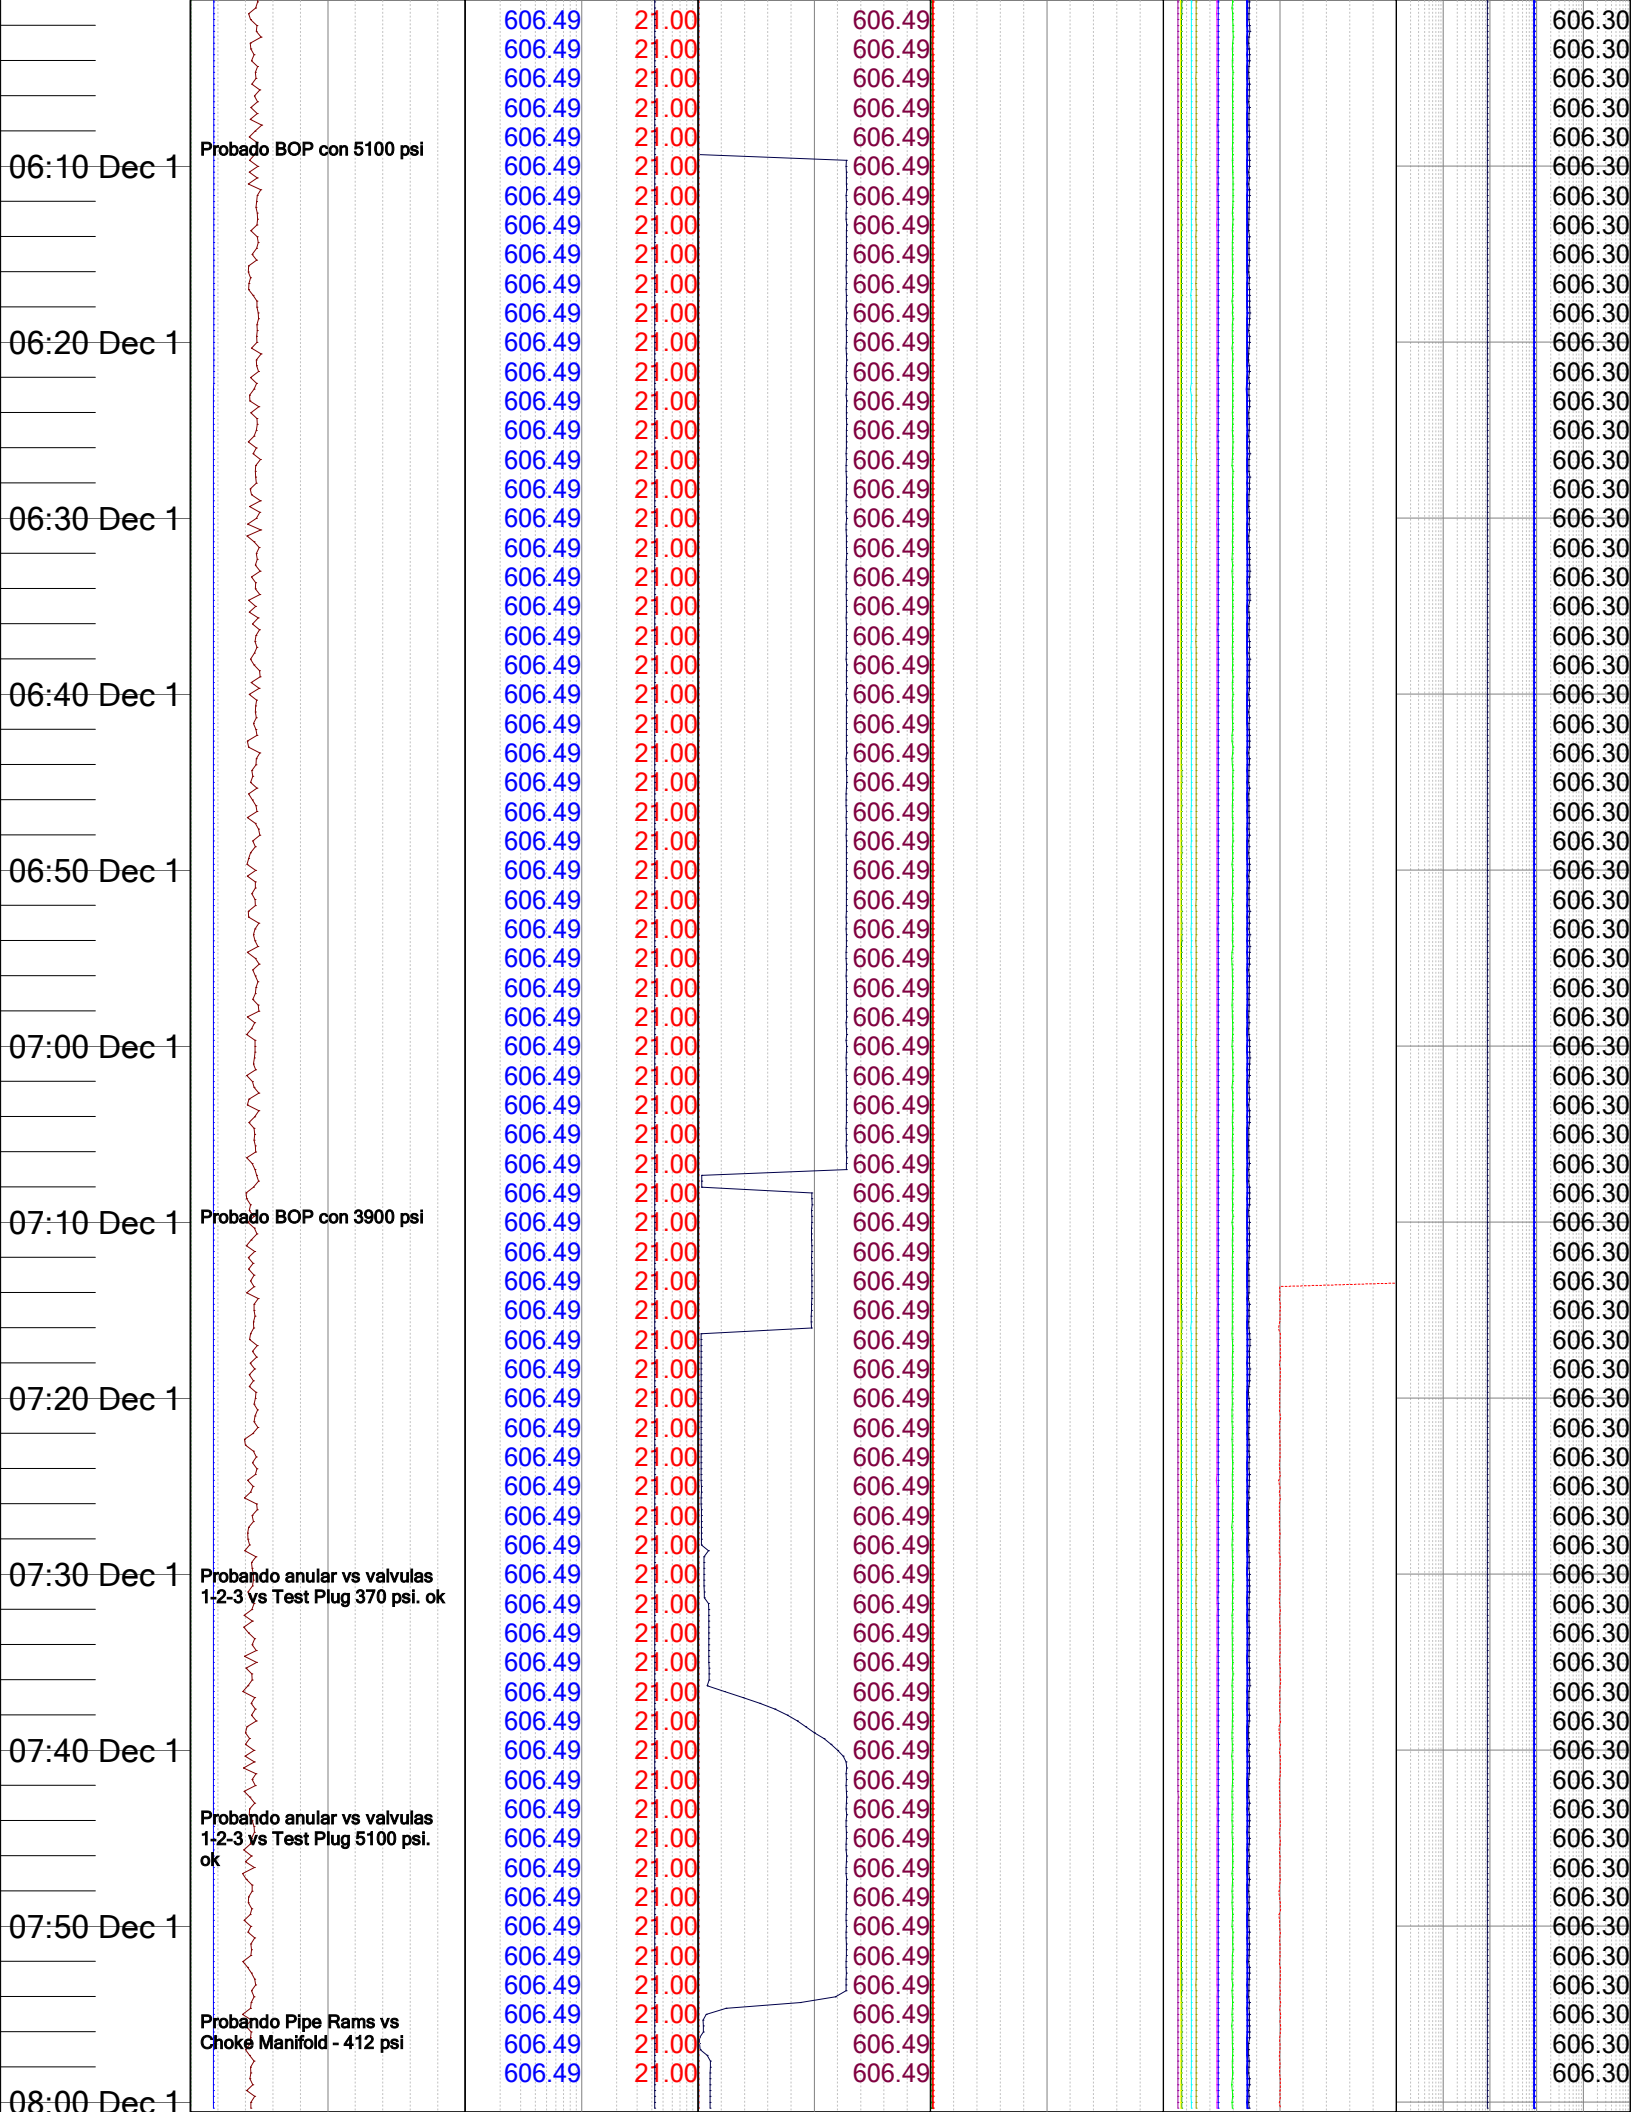
GEOLOGIST
GILBERTO TELLEZ / CARLOS HERNANDEZ / CAMILO CARDOZO

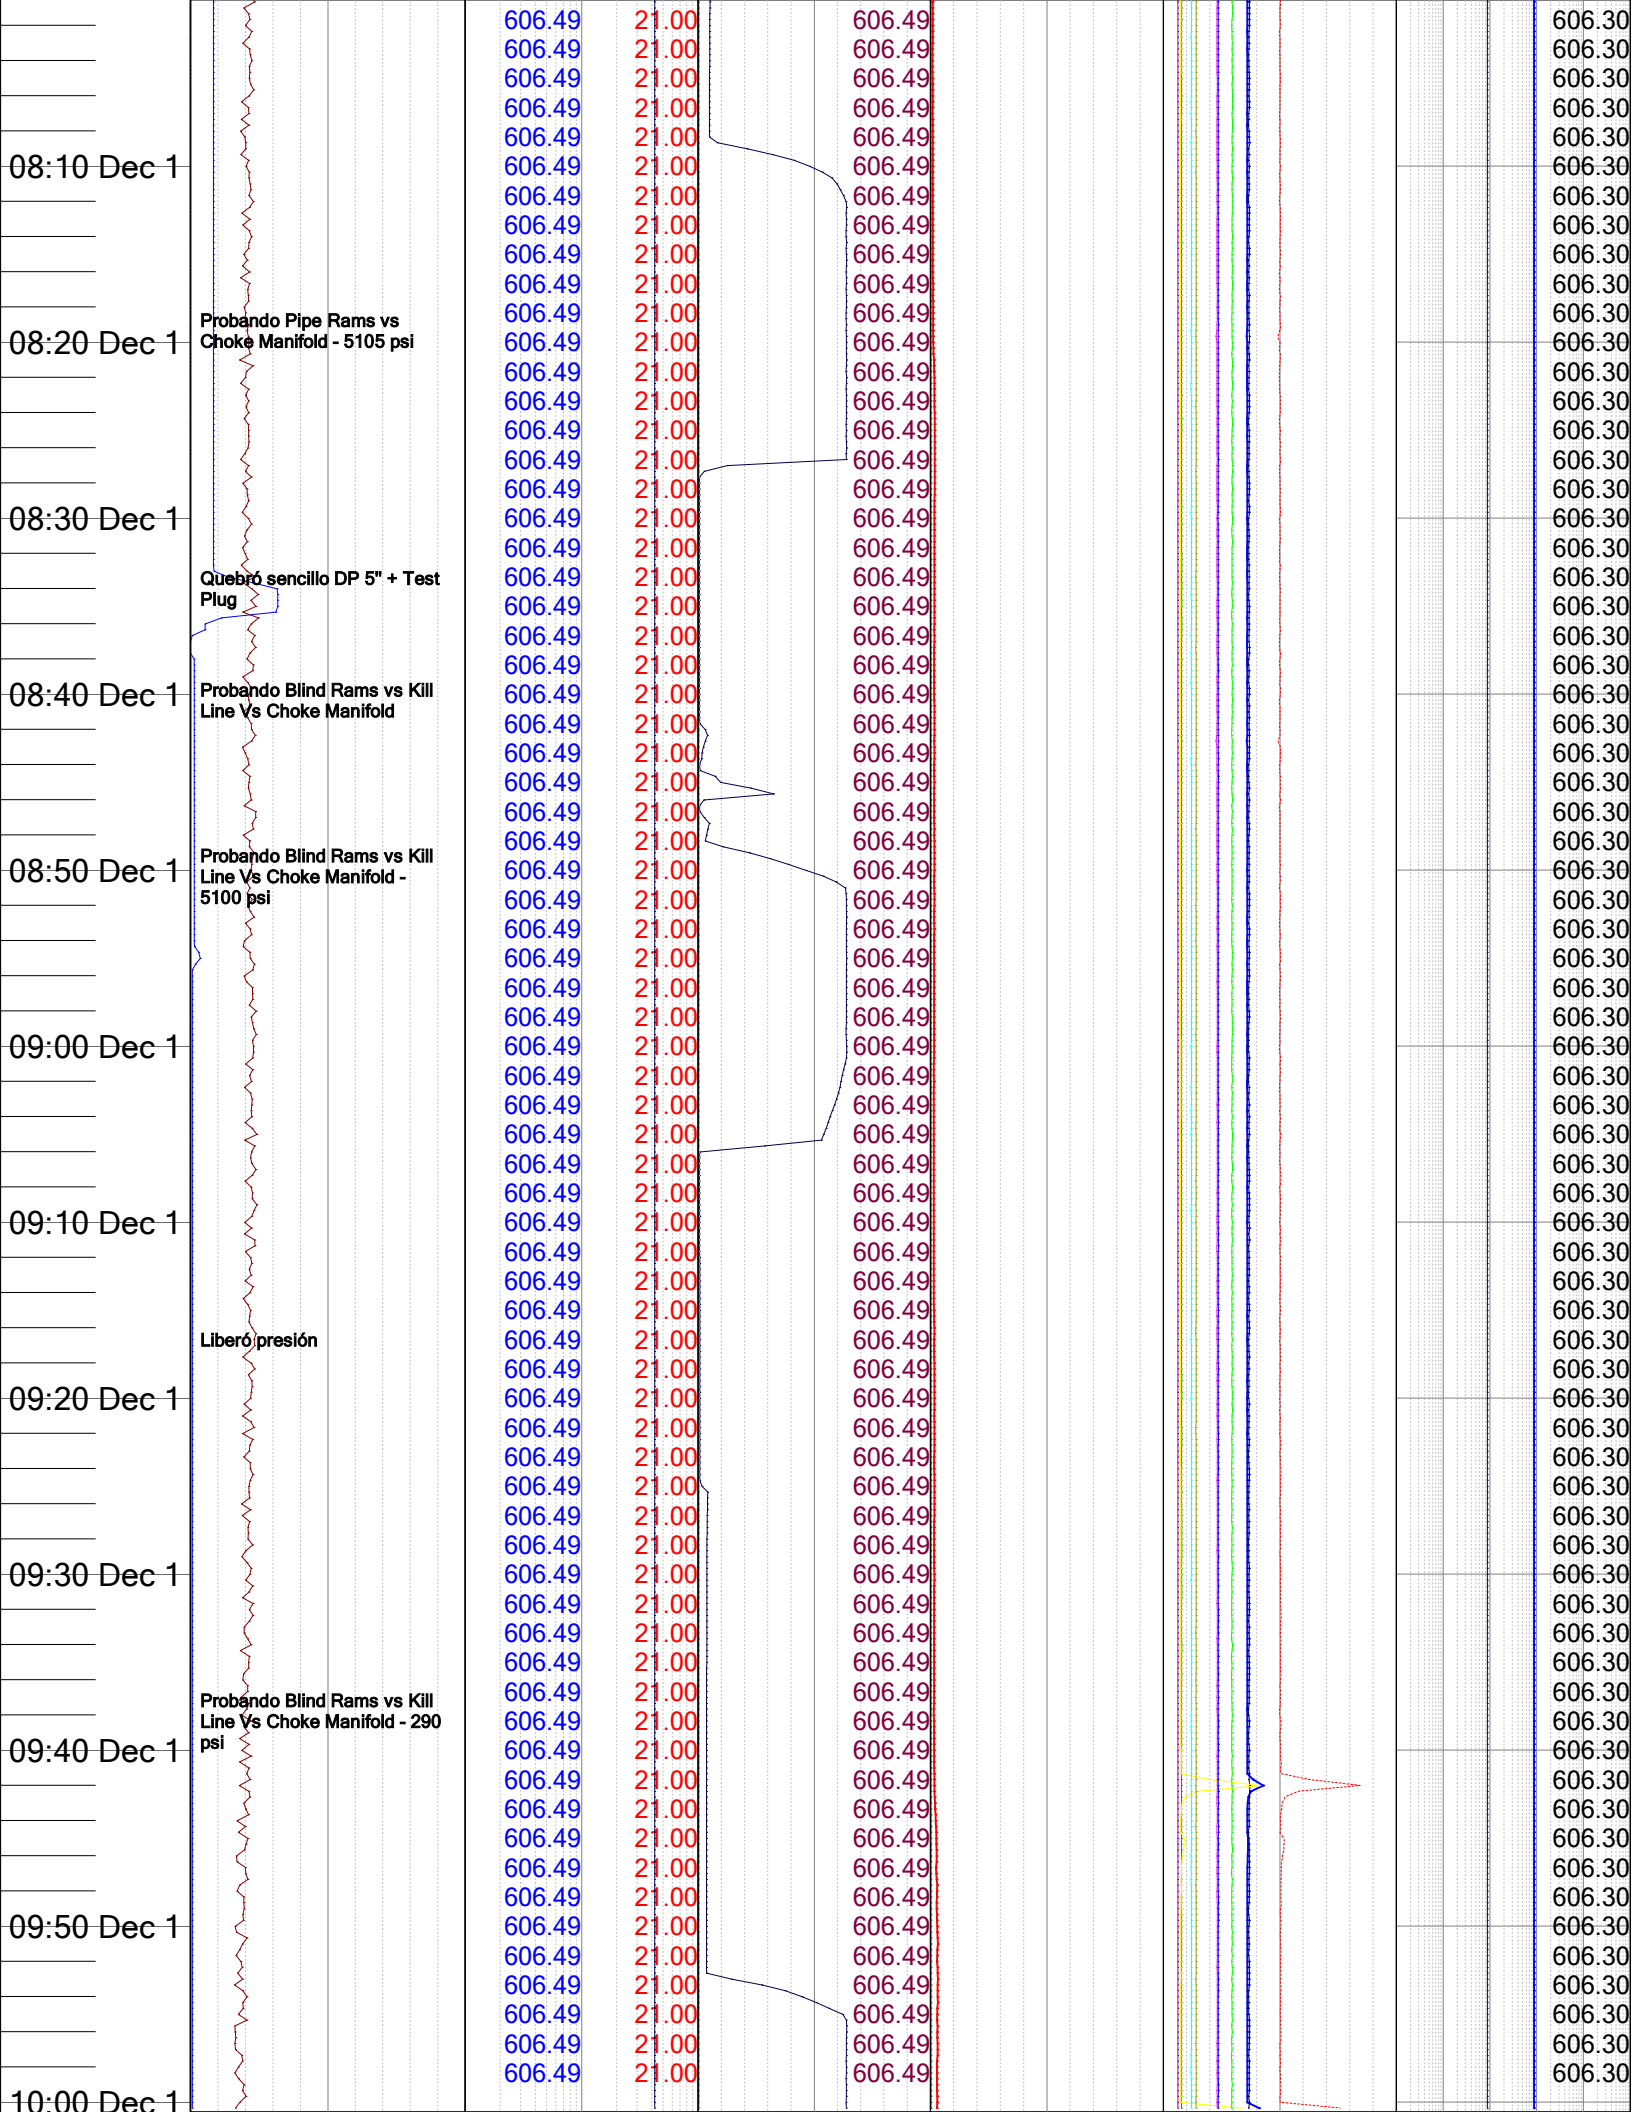
Time	Hook Position	Bit Depth	Casing Pressure	Standpipe Pressu	Active PVT	Total Hydrocarbo
	0 ft 120	0.0000010 ft 0.0001	0 psi 8000	0 psi 5000	0 bbls 1000	1 ppm 100000
	Hookload	**ROP Interval**	**Torque Hydraulic**	**Flow In**	**Active PVT G/L**	**CO2 Out**
	0 Klb 100	0.1 ft/hr 10	0 psi 1000	0 gal/min 1000	-100 bbls 100	1 ppm 100000
	WOB	**ROP Span**	**RPM**	**SPM 1**	**Comment7**	**Lag Depth**
	0 Klb 10	1 ft/hr 100	0 200	0 min 130	0 5000	0.01 ft 1000
	Time Comment	**Hole Depth**	**Table RPM**	**SPM 2**	**Intermedio 1**	**Total Chromat Ga**
	0 5000	0.01 ft 1	0 200	0 min 130	0 bbls 150	0.001 % 100
			TVD	**SPM 3**	**Trip Tank 1**	
			0 ft 1000	0 min 130	0 bbls 150	
					Intermedio 2	
					0 bbls 200	
					Pildora 1	
					0 bbls 200	
					Reserva 1	
					0 bbls 250	
					Reserva 2	
					0 bbls 250	
					Retorno 1	
					0 bbls 400	
					Retorno 2	
					0 bbls 400	
					Succion 1	
					0 bbls 400	
					Succion 2	
					0 bbls 400	

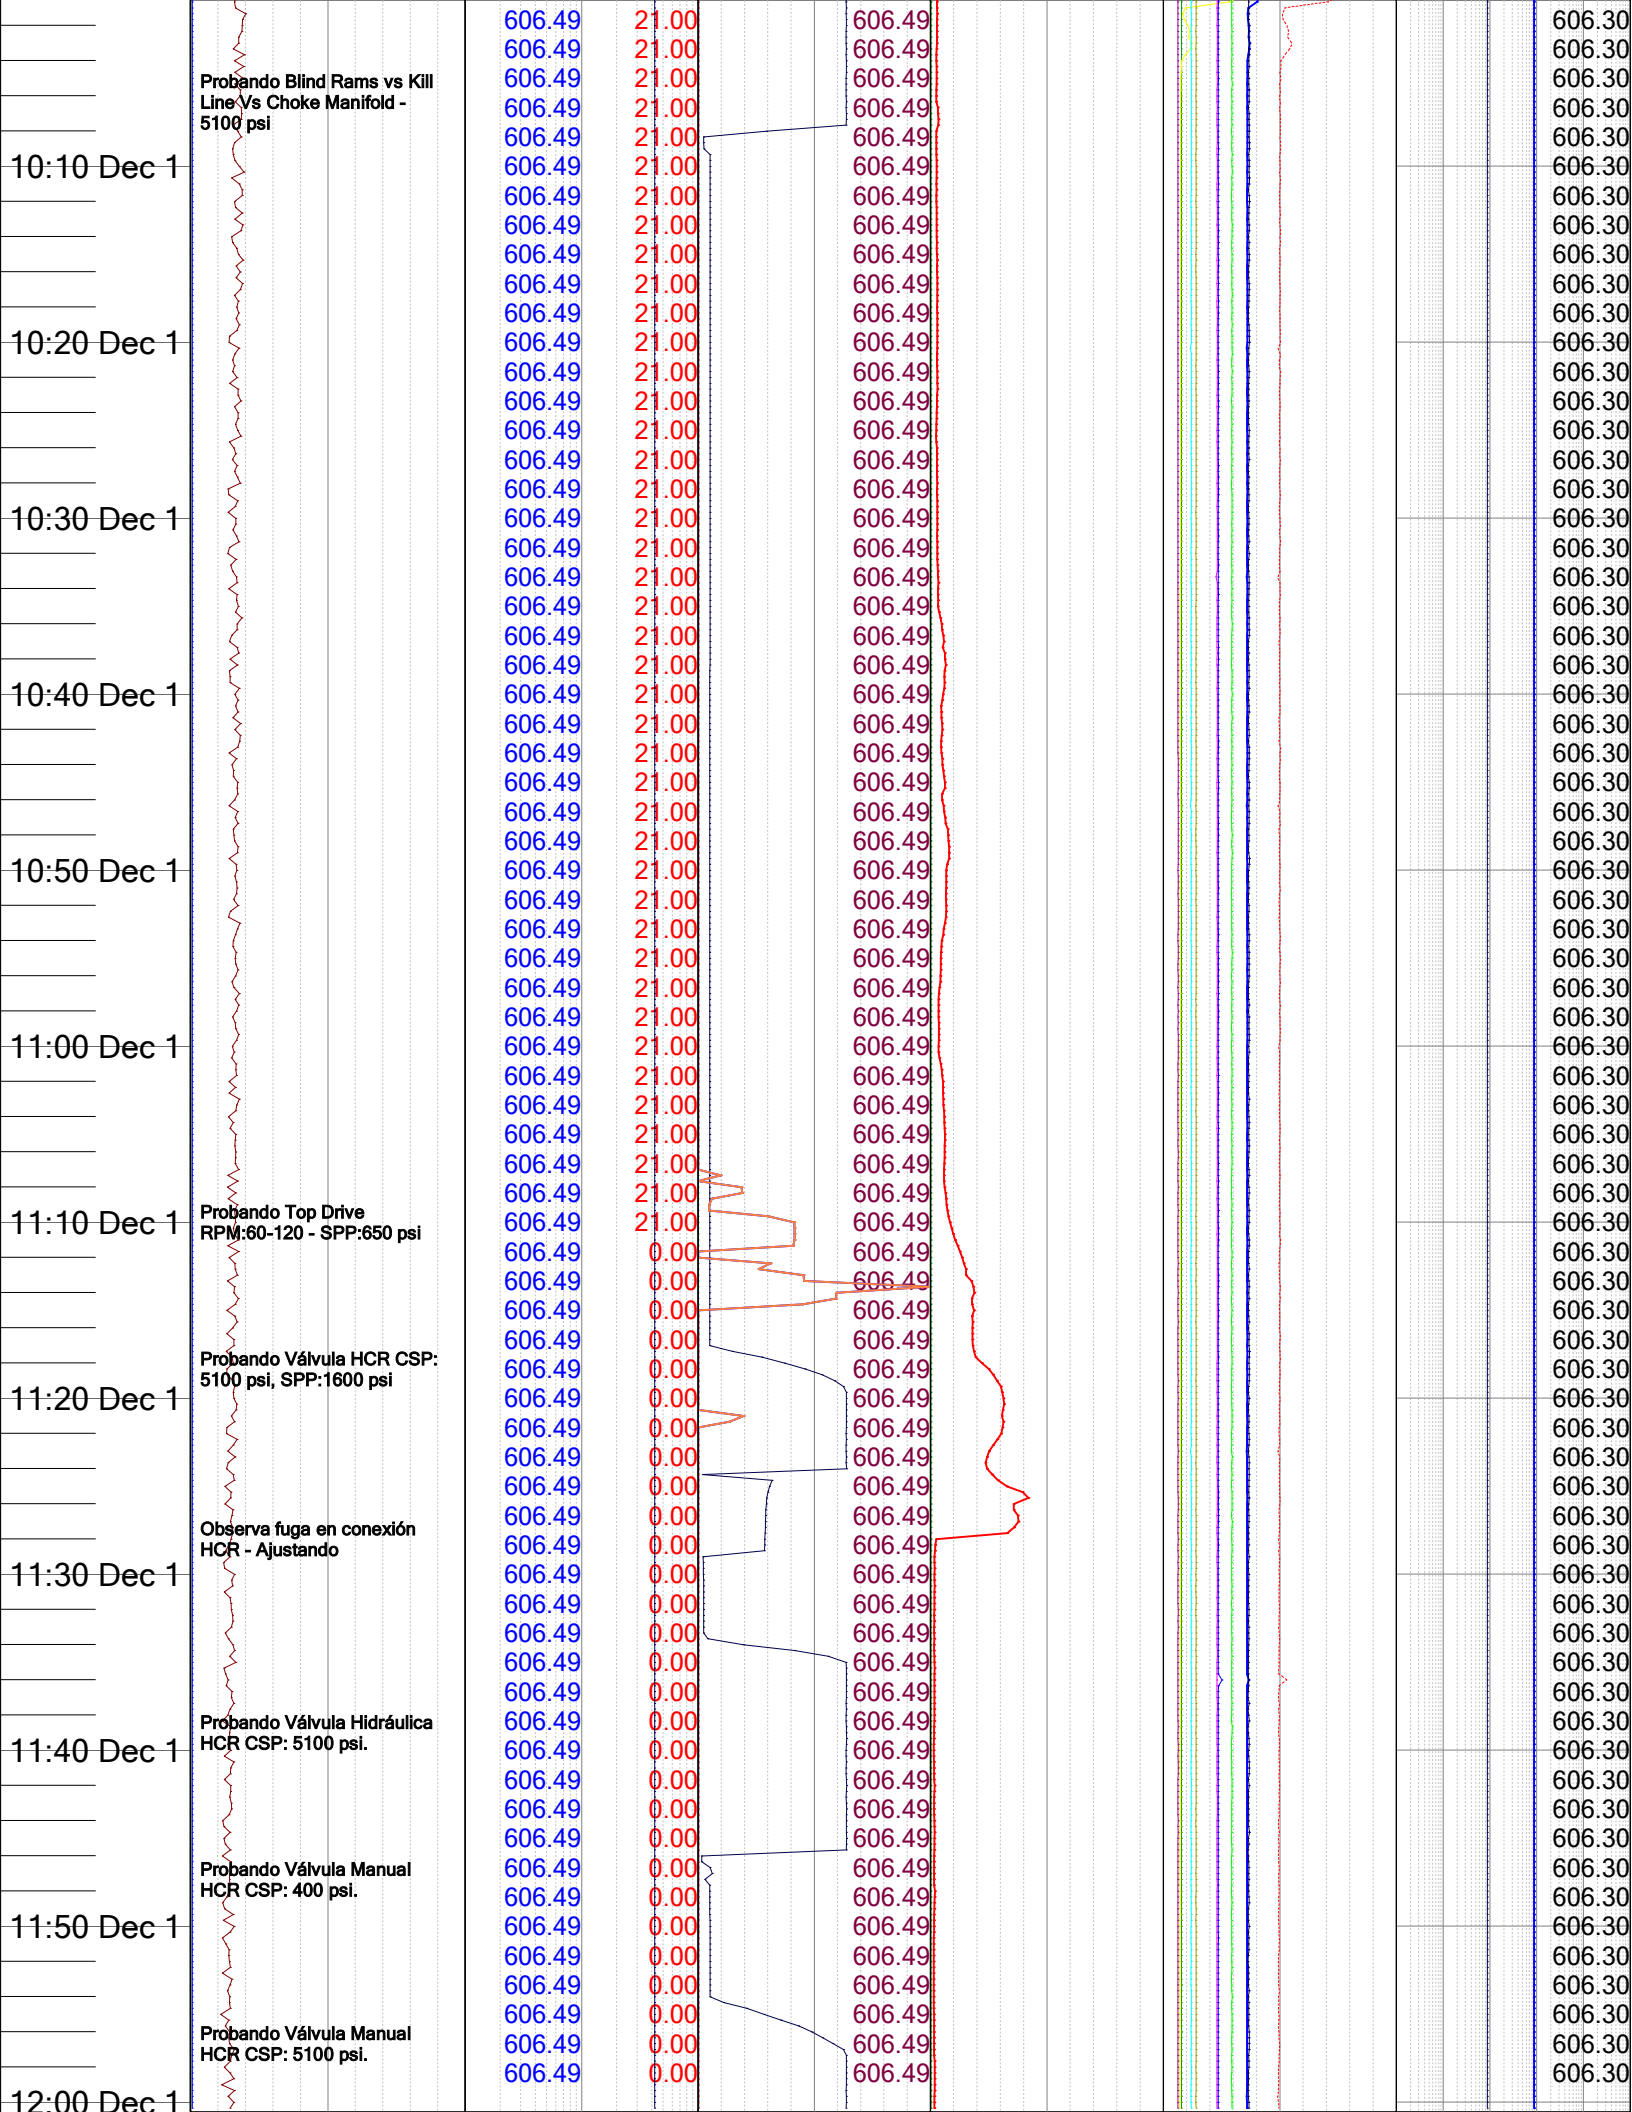

00:10 Dec 1
00:20 Dec 1
00:30 Dec 1
00:40 Dec 1
00:50 Dec 1
01:00 Dec 1
01:10 Dec 1
01:20 Dec 1
01:30 Dec 1
01:40 Dec 1
01:50 Dec 1
02:00 Dec 1
Instaló Flow line y campana
Instaló Flow line y campana
Sacó campana campana
Modificó campana
606.49
0.01
606.30

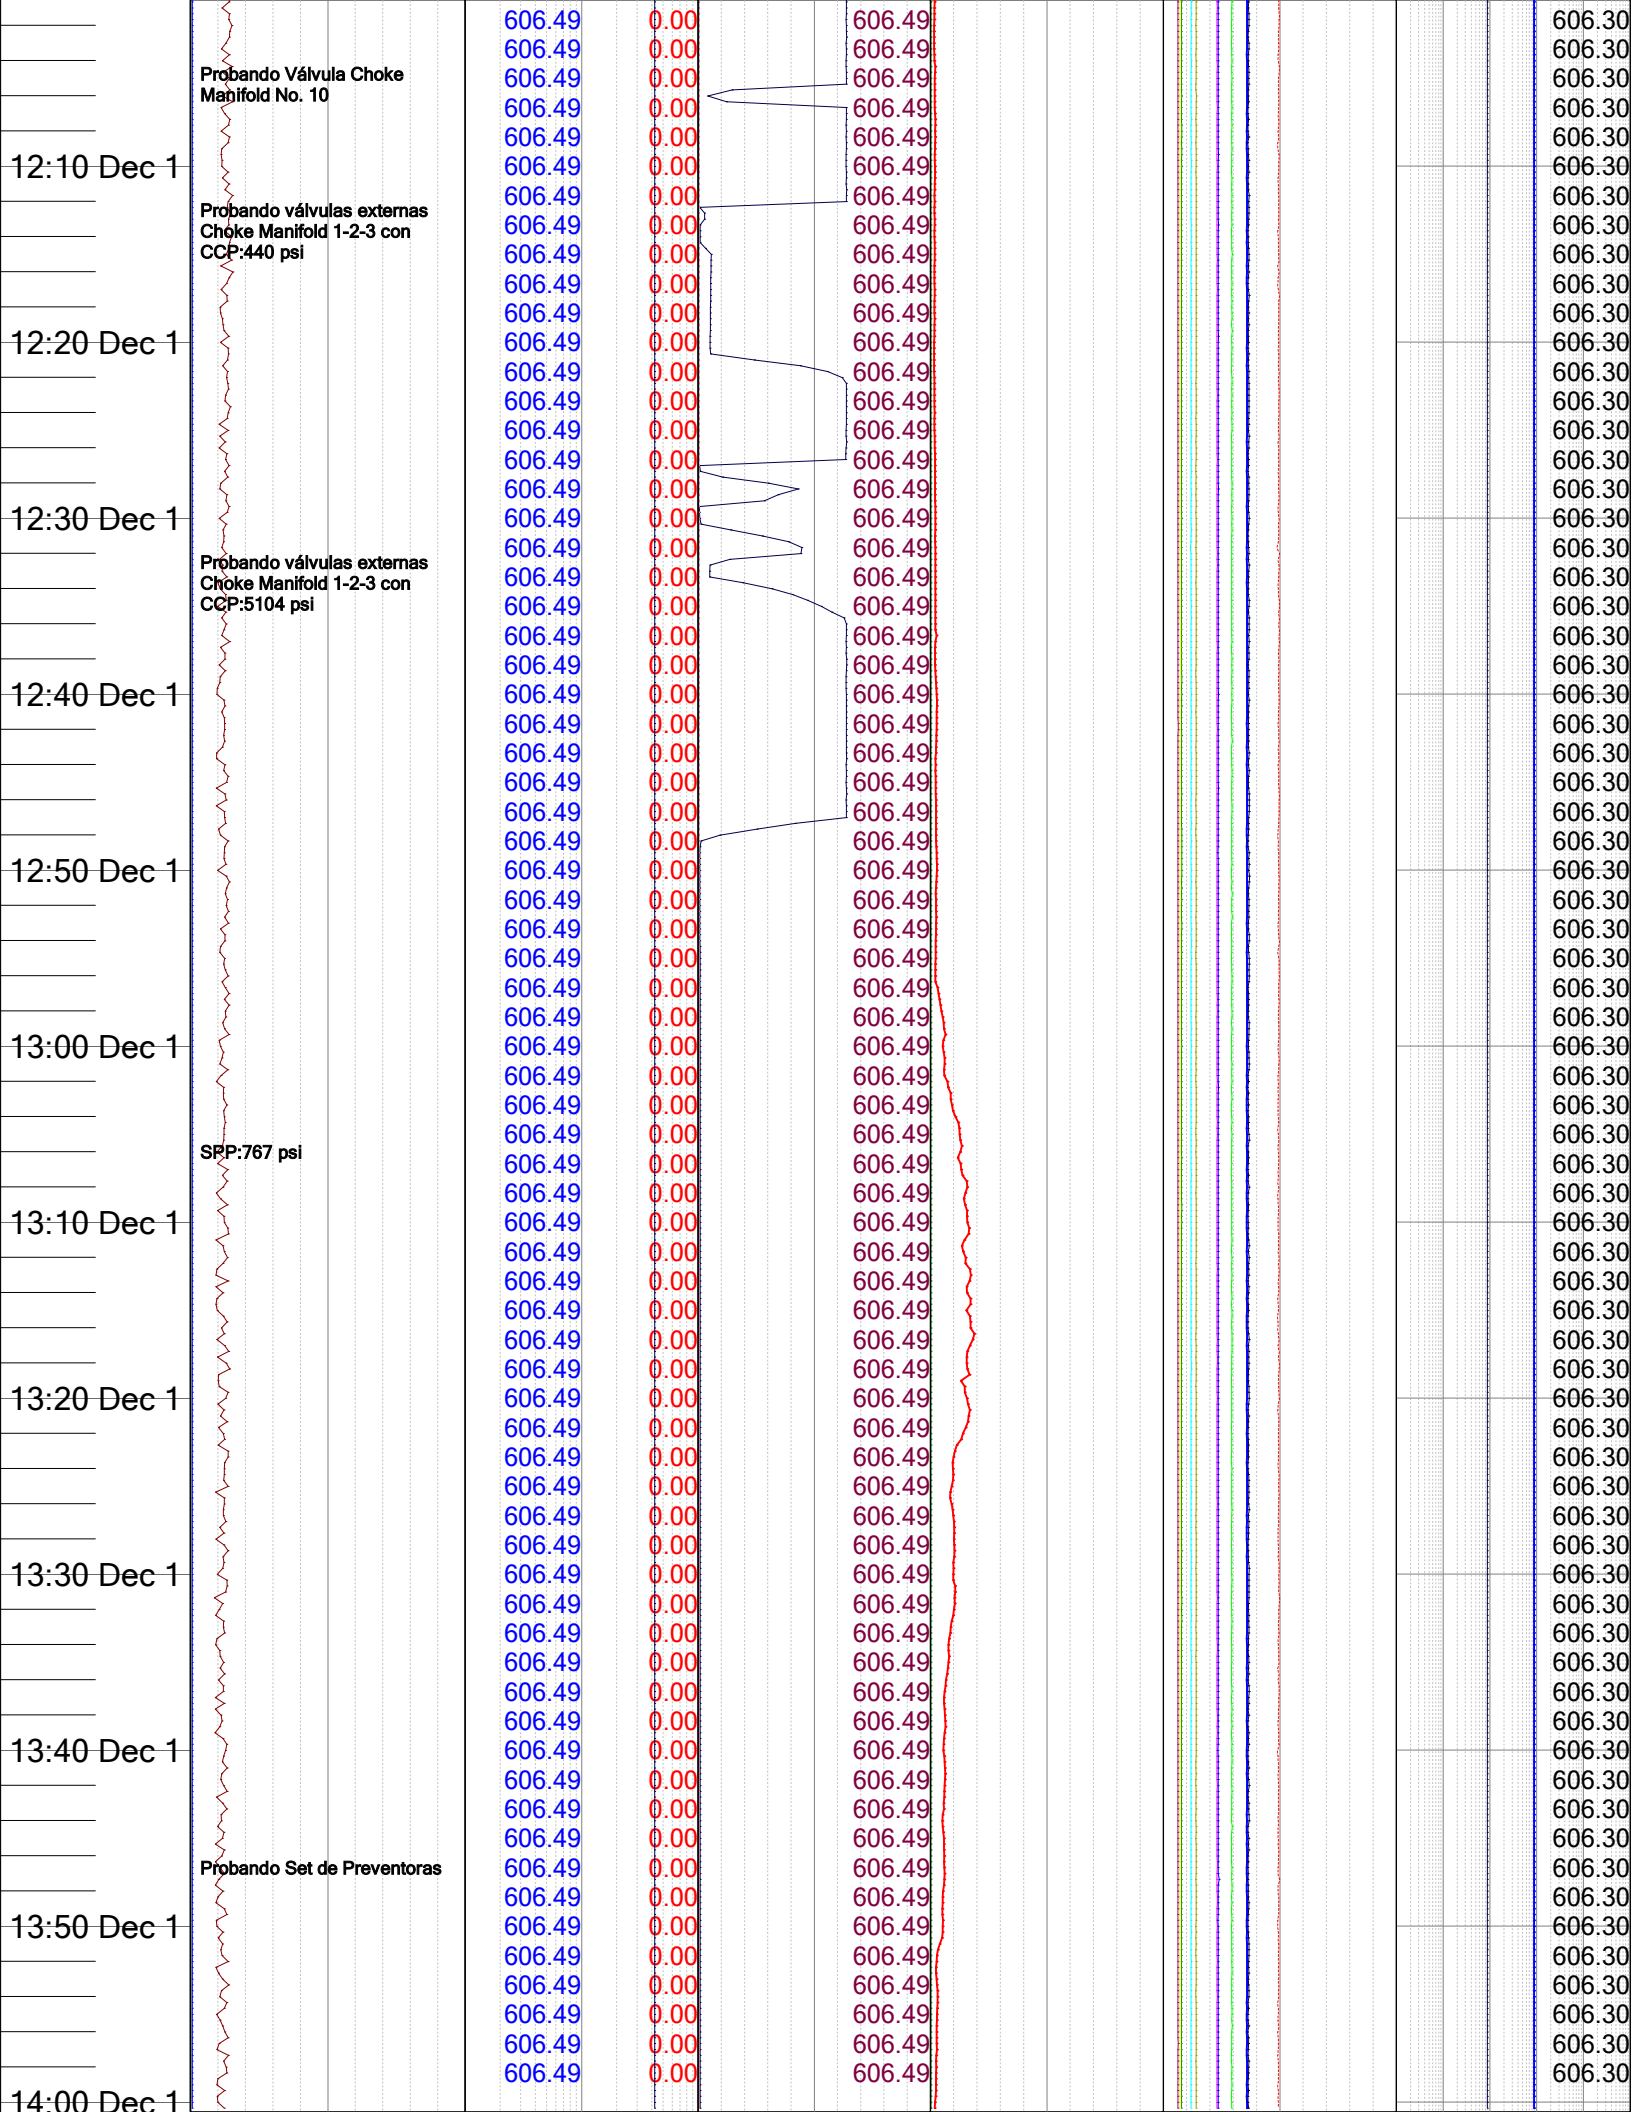

02:10 Dec 1
02:20 Dec 1
Instaló instaló test plug + un sencillo de DP
02:30 Dec 1
02:40 Dec 1
Bajó test plug + sencillo de DP 5"
02:50 Dec 1
03:00 Dec 1
03:10 Dec 1
Probó BOP con 2500 psi
03:20 Dec 1
03:30 Dec 1
03:40 Dec 1
03:50 Dec 1
04:00 Dec 1
606.49
0.01
606.30

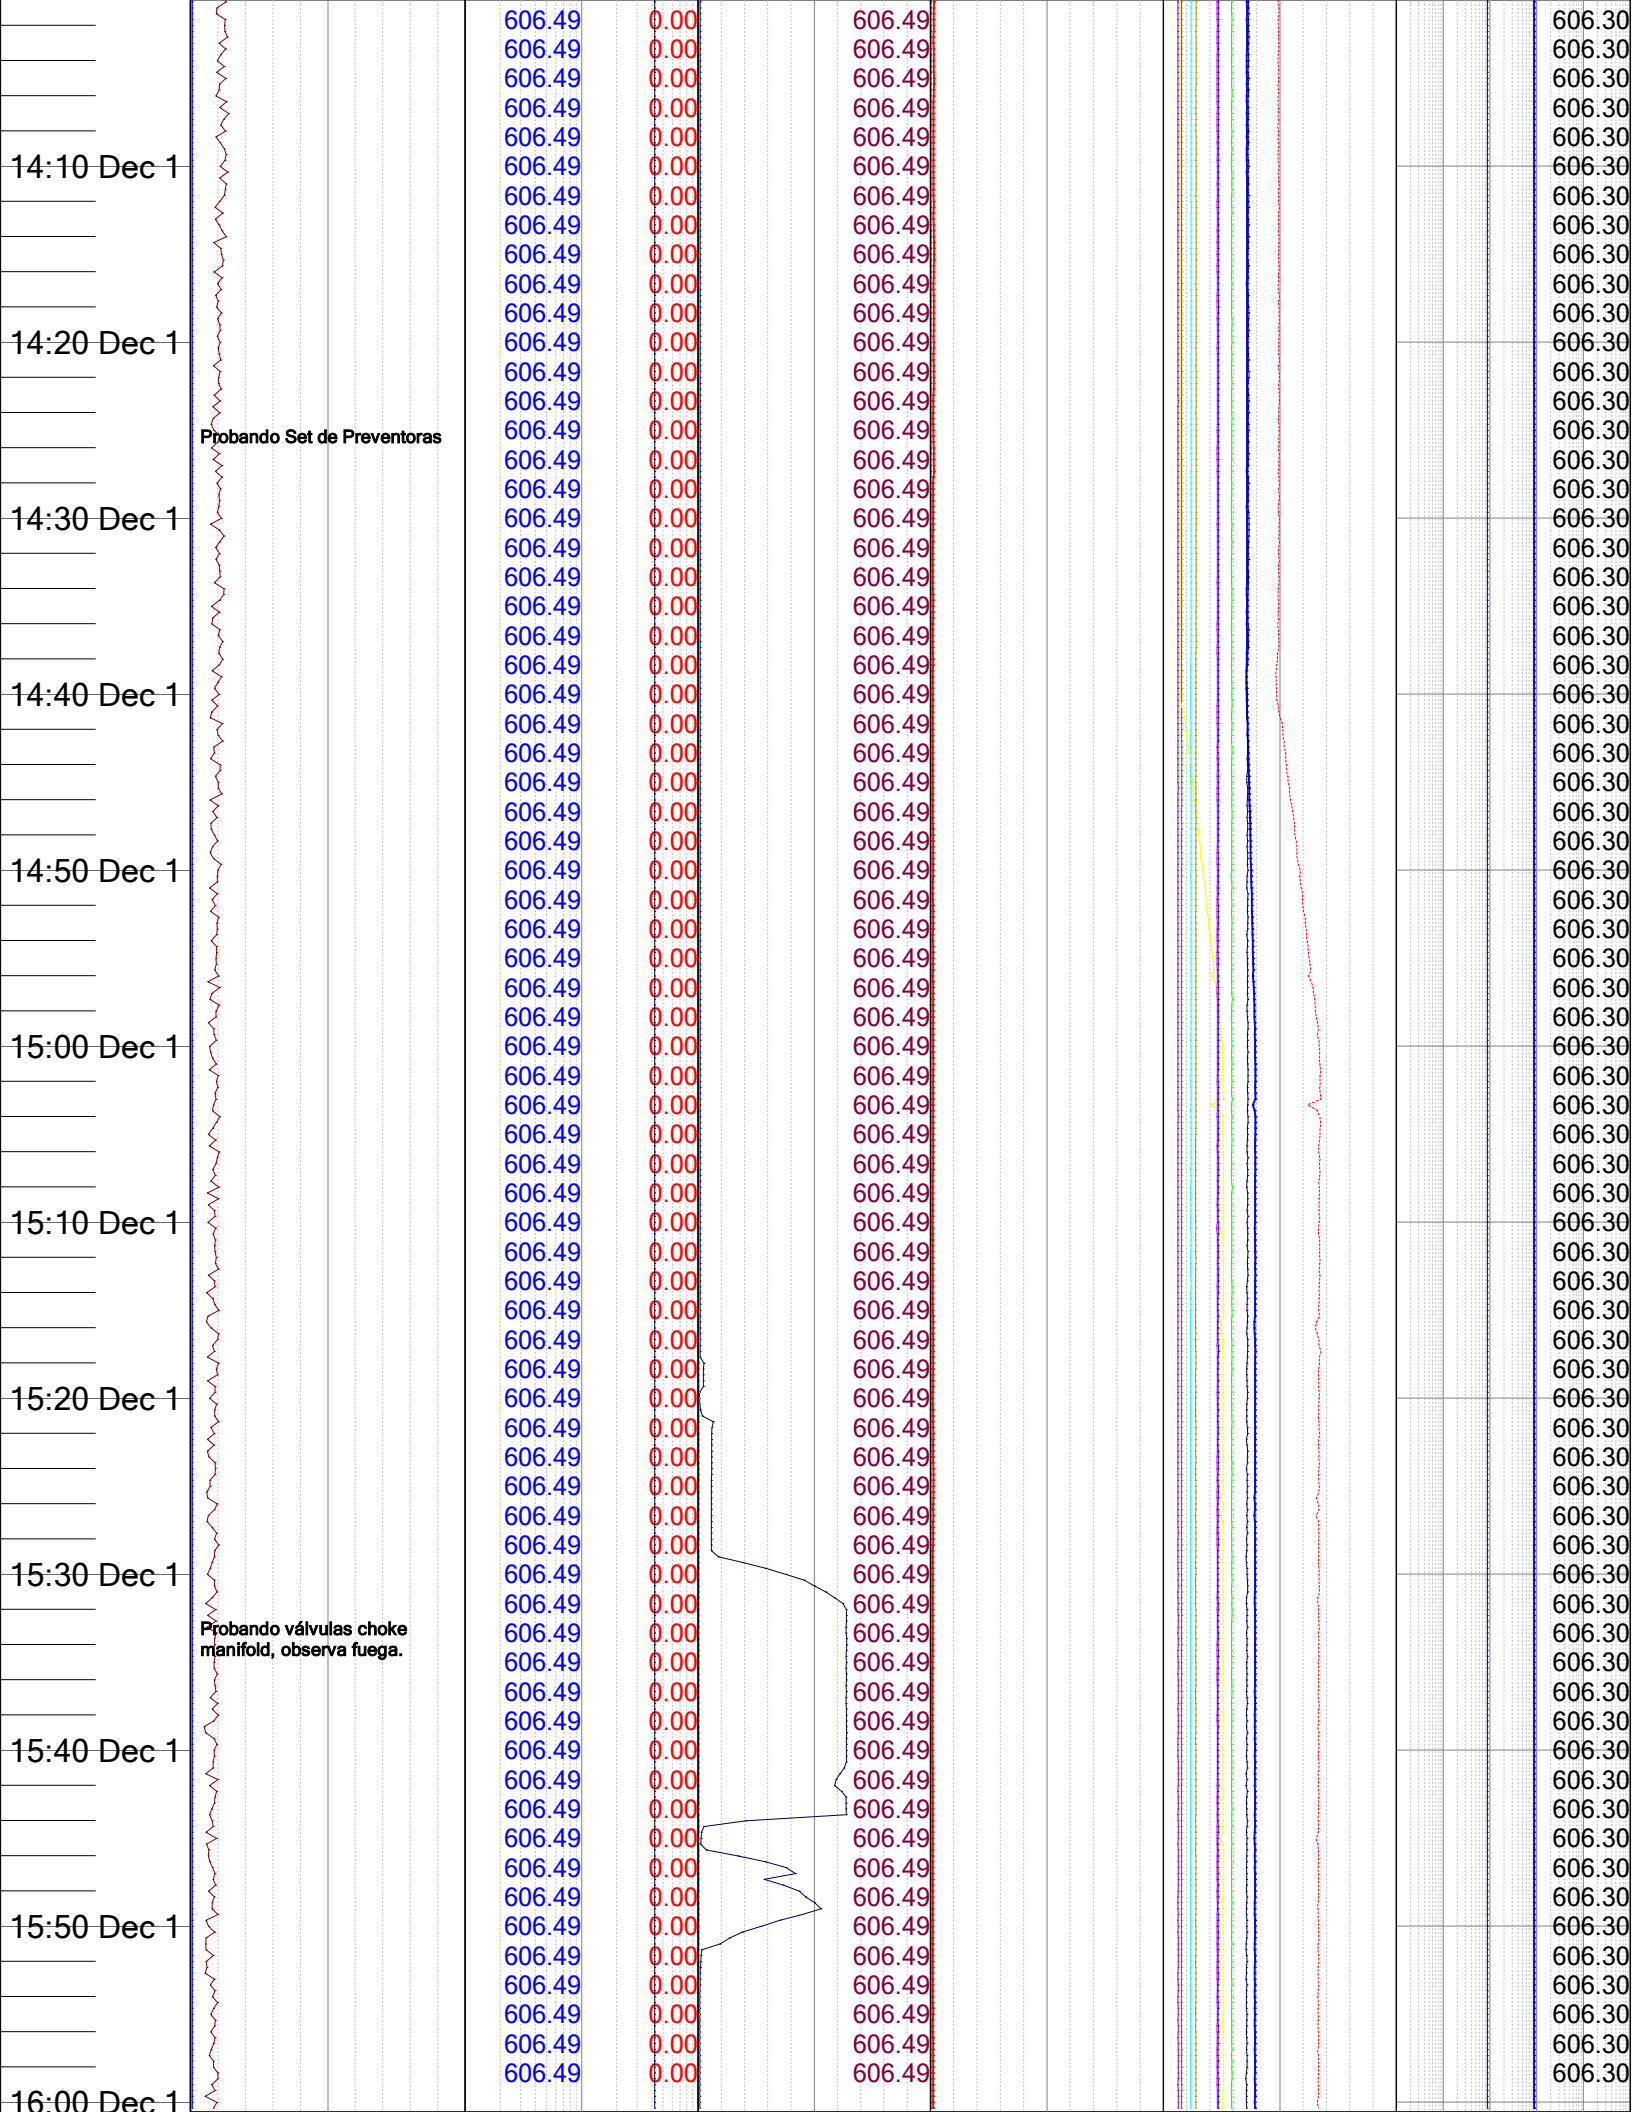

04:10 Dec 1
04:20 Dec 1
04:30 Dec 1
04:40 Dec 1
04:50 Dec 1
05:00 Dec 1
05:10 Dec 1
05:20 Dec 1
05:30 Dec 1
05:40 Dec 1
05:50 Dec 1
06:00 Dec 1
Corrigiendo fuga en mangueras
Corrigiendo fugas en mangueras
Corrigiendo fugas en mangueras
Orden y aseo mesa y BOP
Orden y aseo mesa y BOP
Orden y aseo mesa y BOP
606.49 0.01 606.49 606.30
606.49 21.00 606.49 606.30

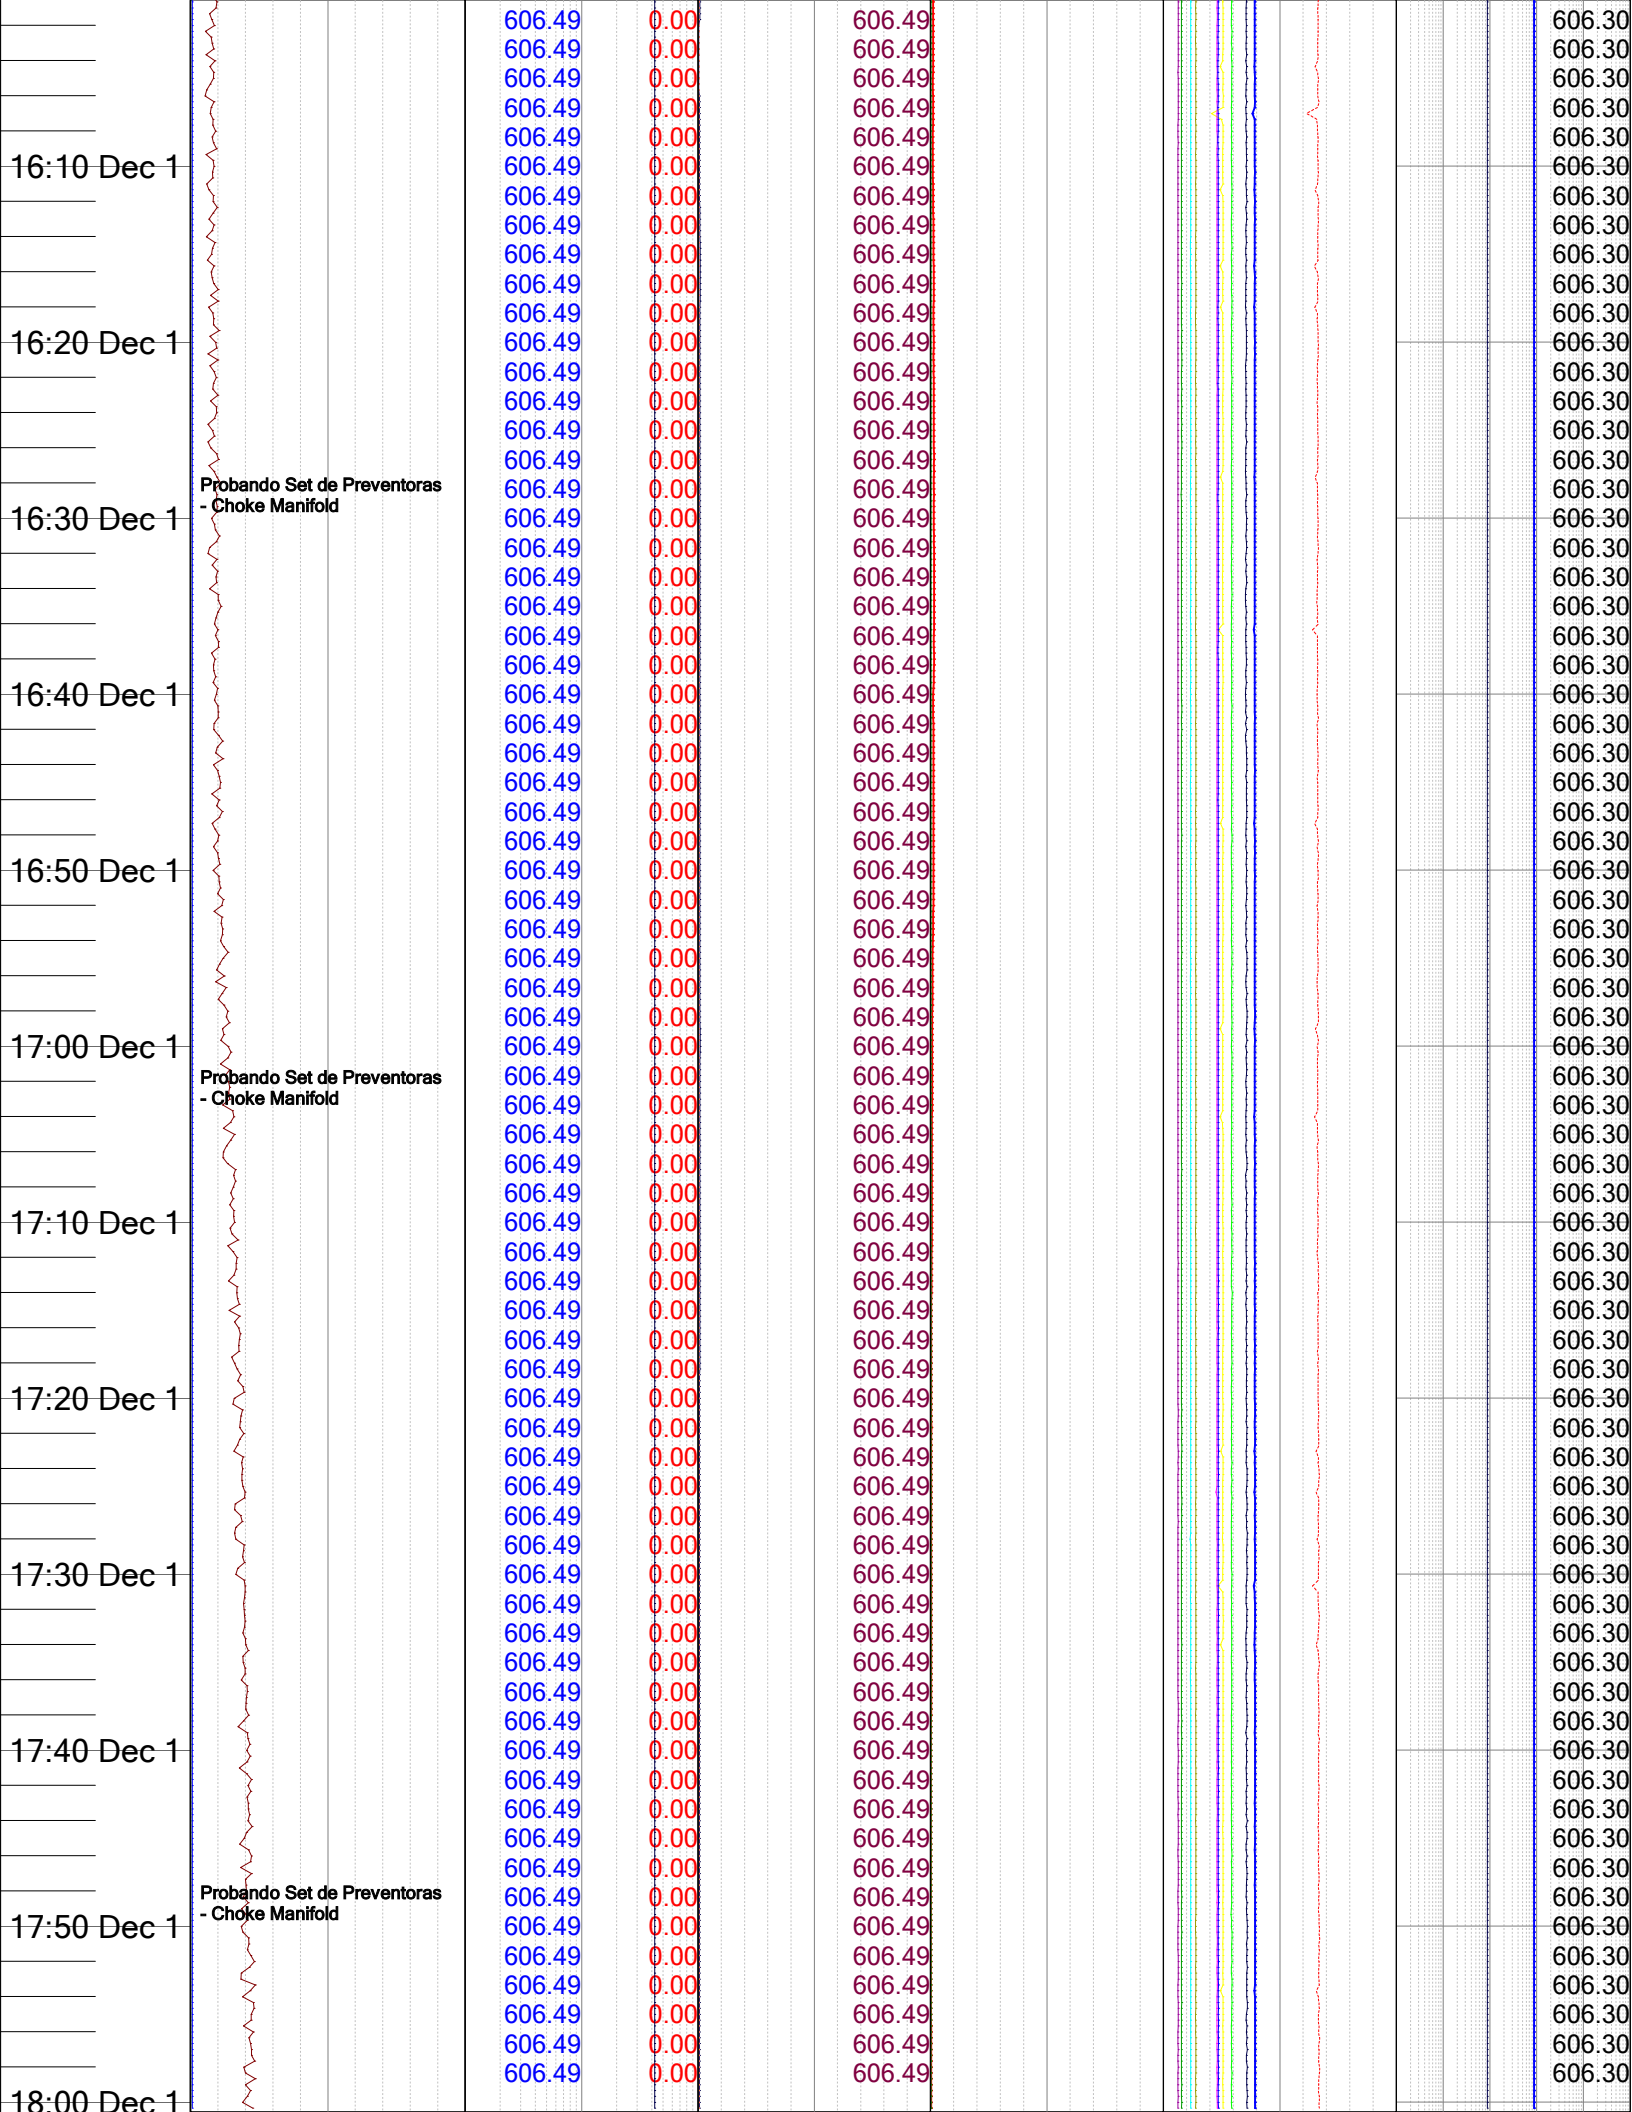

06:10 Dec 1
06:20 Dec 1
06:30 Dec 1
06:40 Dec 1
06:50 Dec 1
07:00 Dec 1
07:10 Dec 1
07:20 Dec 1
07:30 Dec 1
07:40 Dec 1
07:50 Dec 1
08:00 Dec 1
Probado BOP con 5100 psi
Probado BOP con 3900 psi
Probando anular vs valvulas 1-2-3 vs Test Plug 370 psi. ok
Probando anular vs valvulas 1-2-3 vs Test Plug 5100 psi. ok
Probando Pipe Rams vs Choke Manifold - 412 psi
606.49
21.00
606.30

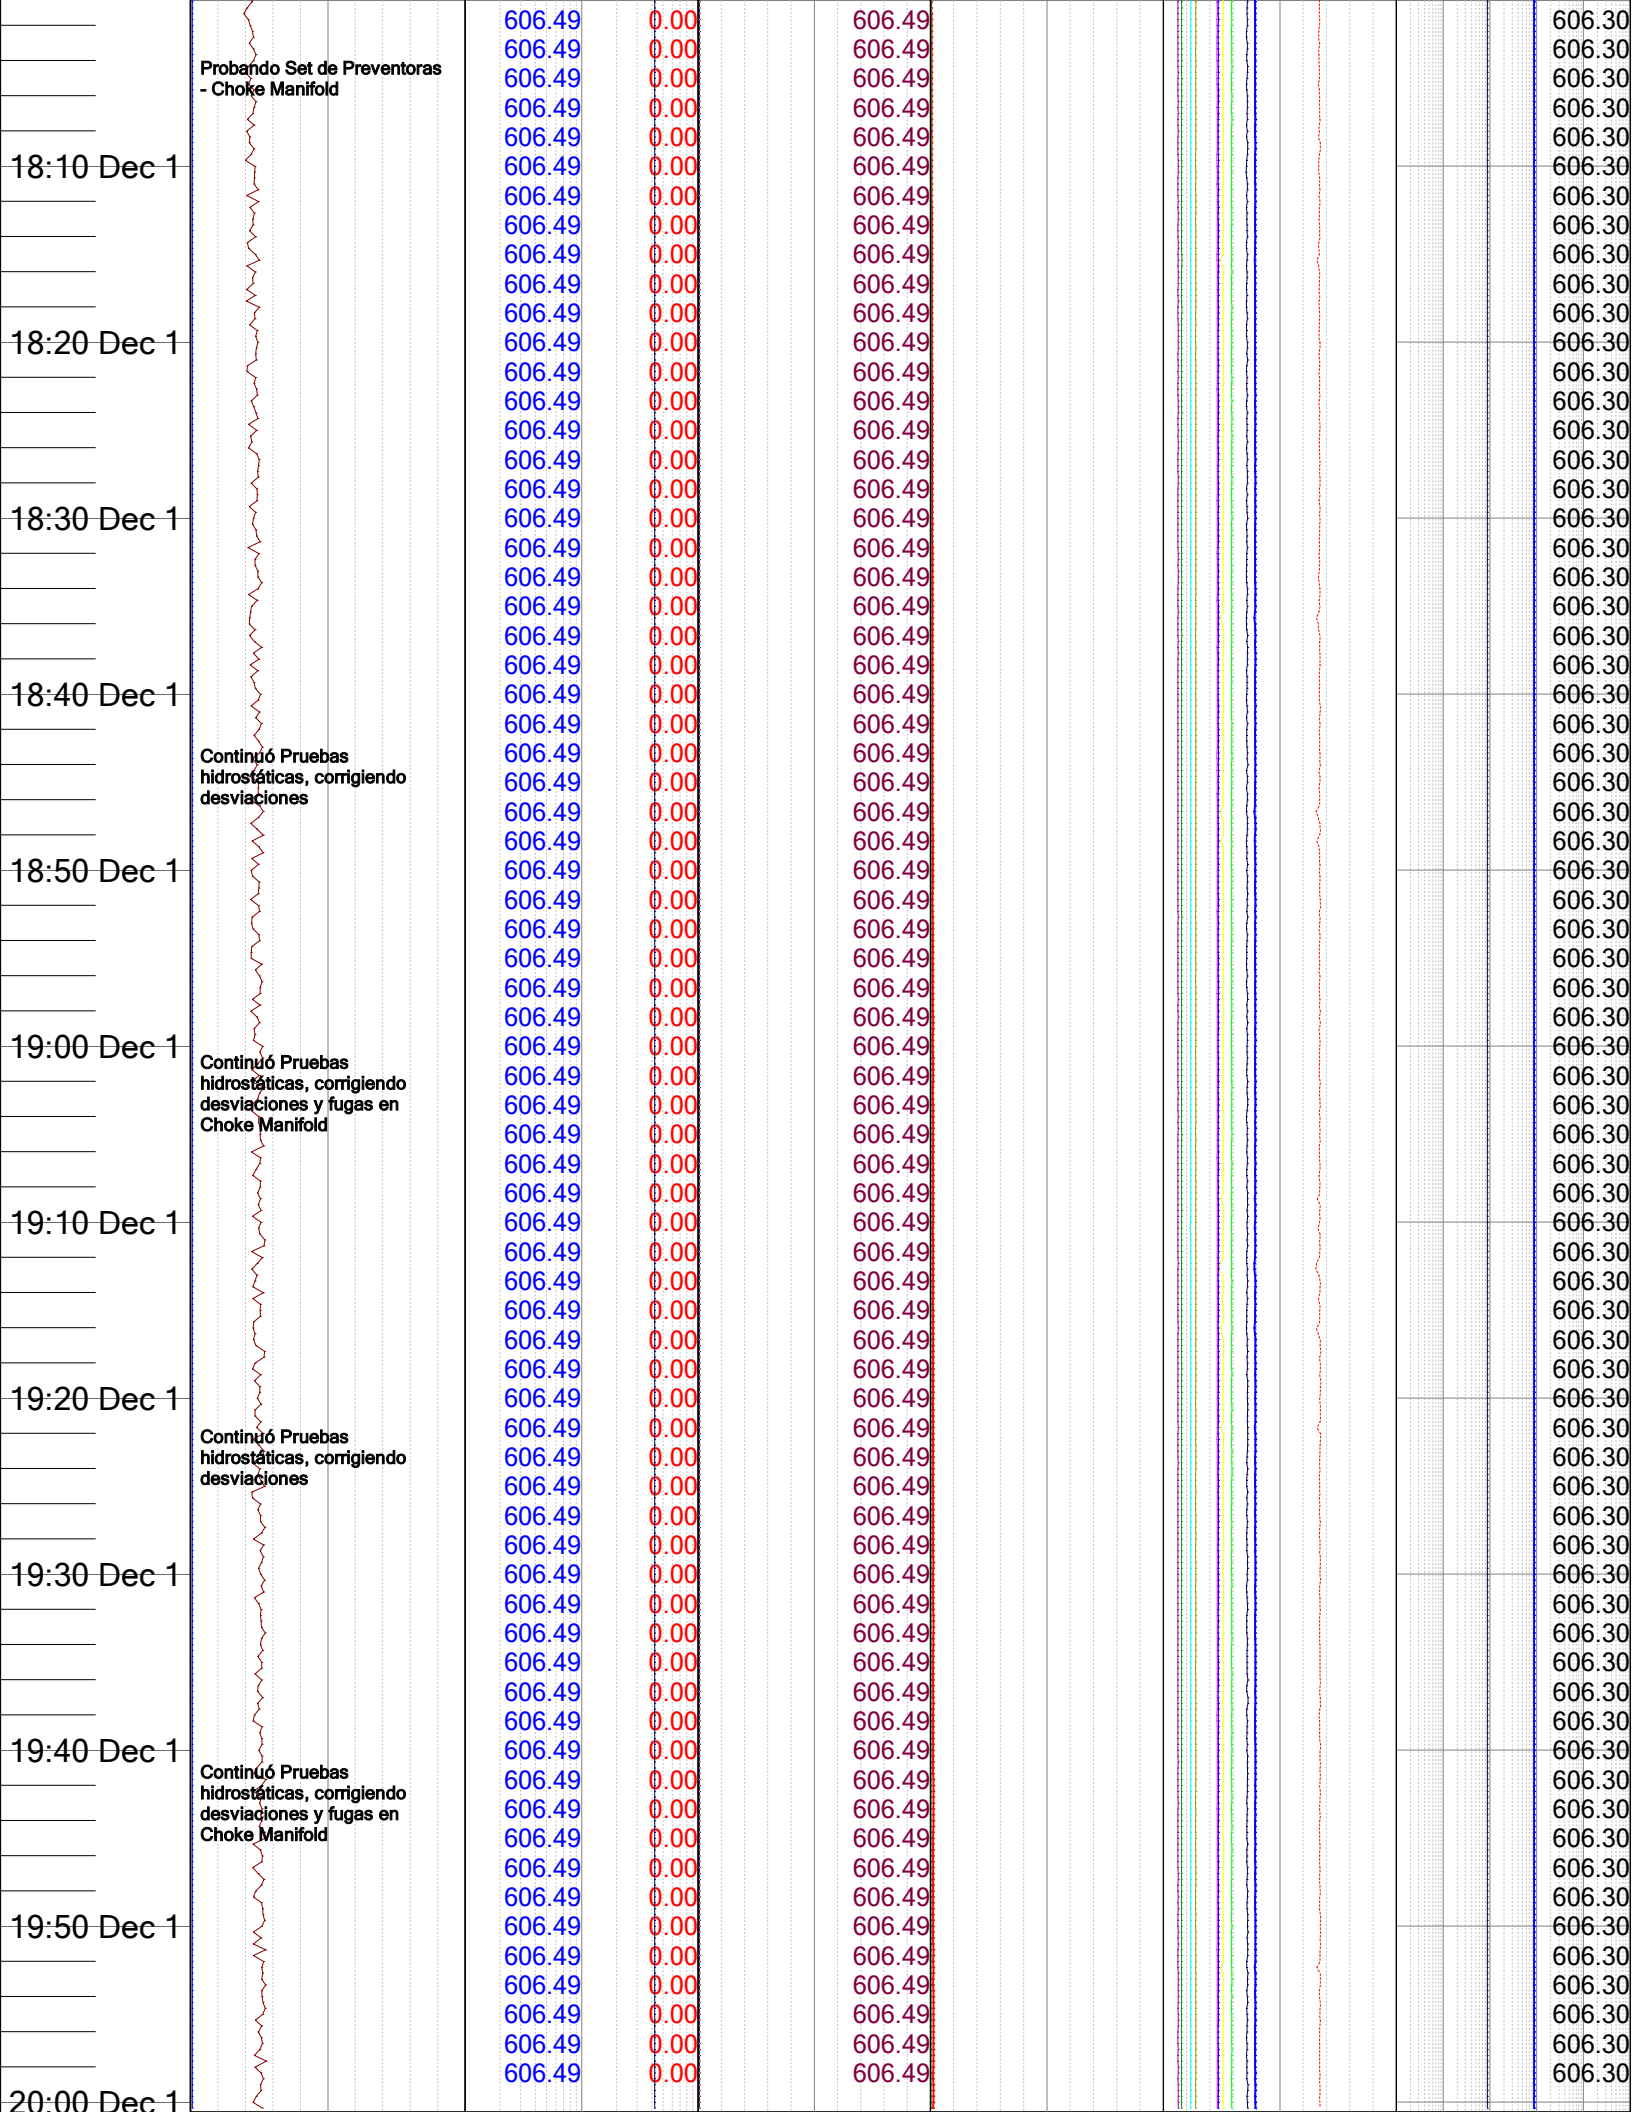

08:10 Dec 1
08:20 Dec 1
08:30 Dec 1
08:40 Dec 1
08:50 Dec 1
09:00 Dec 1
09:10 Dec 1
09:20 Dec 1
09:30 Dec 1
09:40 Dec 1
09:50 Dec 1
10:00 Dec 1
Probando Pipe Rams vs Choke Manifold - 5105 psi
Quebró sencillo DP 5" + Test Plug
Probando Blind Rams vs Kill Line Vs Choke Manifold
Probando Blind Rams vs Kill Line Vs Choke Manifold - 5100 psi
Liberó presión
Probando Blind Rams vs Kill Line Vs Choke Manifold - 290 psi
606.49
21.00
606.30

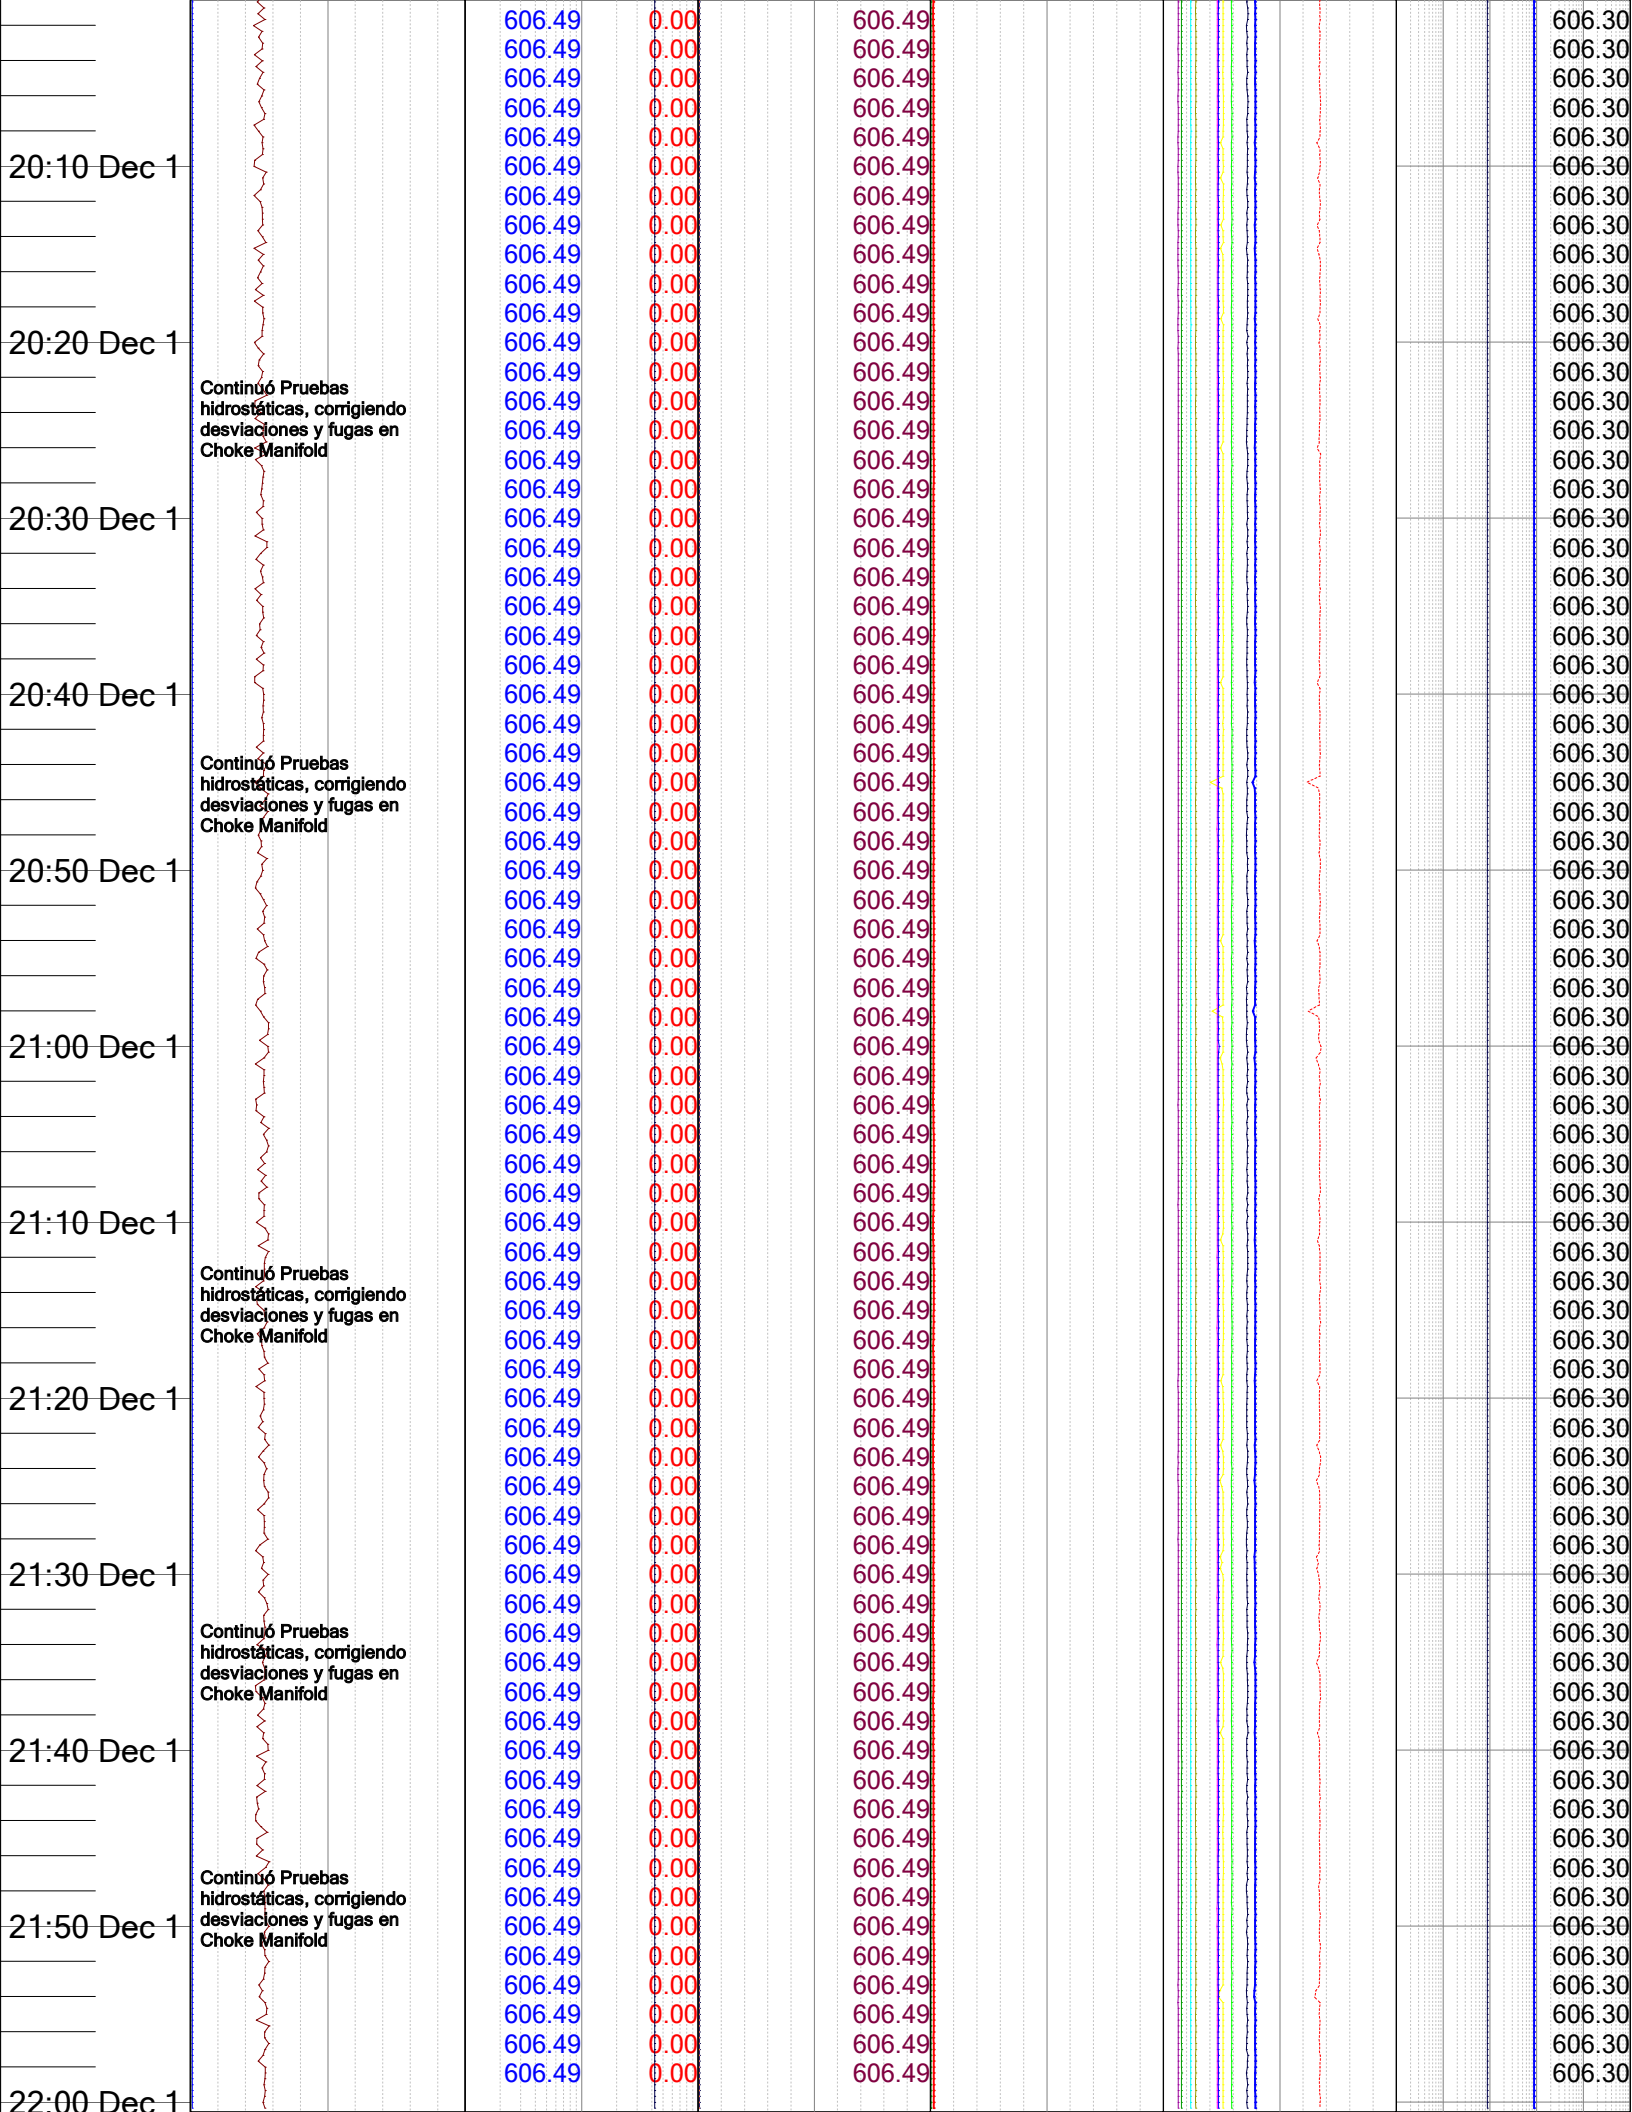

Probando Blind Rams vs Kill Line Vs Choke Manifold - 5100 psi
10:10 Dec 1
10:20 Dec 1
10:30 Dec 1
10:40 Dec 1
10:50 Dec 1
11:00 Dec 1
Probando Top Drive RPM:60-120 - SPP:650 psi
11:10 Dec 1
Probando Válvula HCR CSP: 5100 psi, SPP:1600 psi
11:20 Dec 1
Observa fuga en conexión HCR - Ajustando
11:30 Dec 1
Probando Válvula Hidráulica HCR CSP: 5100 psi.
11:40 Dec 1
Probando Válvula Manual HCR CSP: 400 psi.
11:50 Dec 1
Probando Válvula Manual HCR CSP: 5100 psi.
12:00 Dec 1
606.49
21.00
0.00
606.30

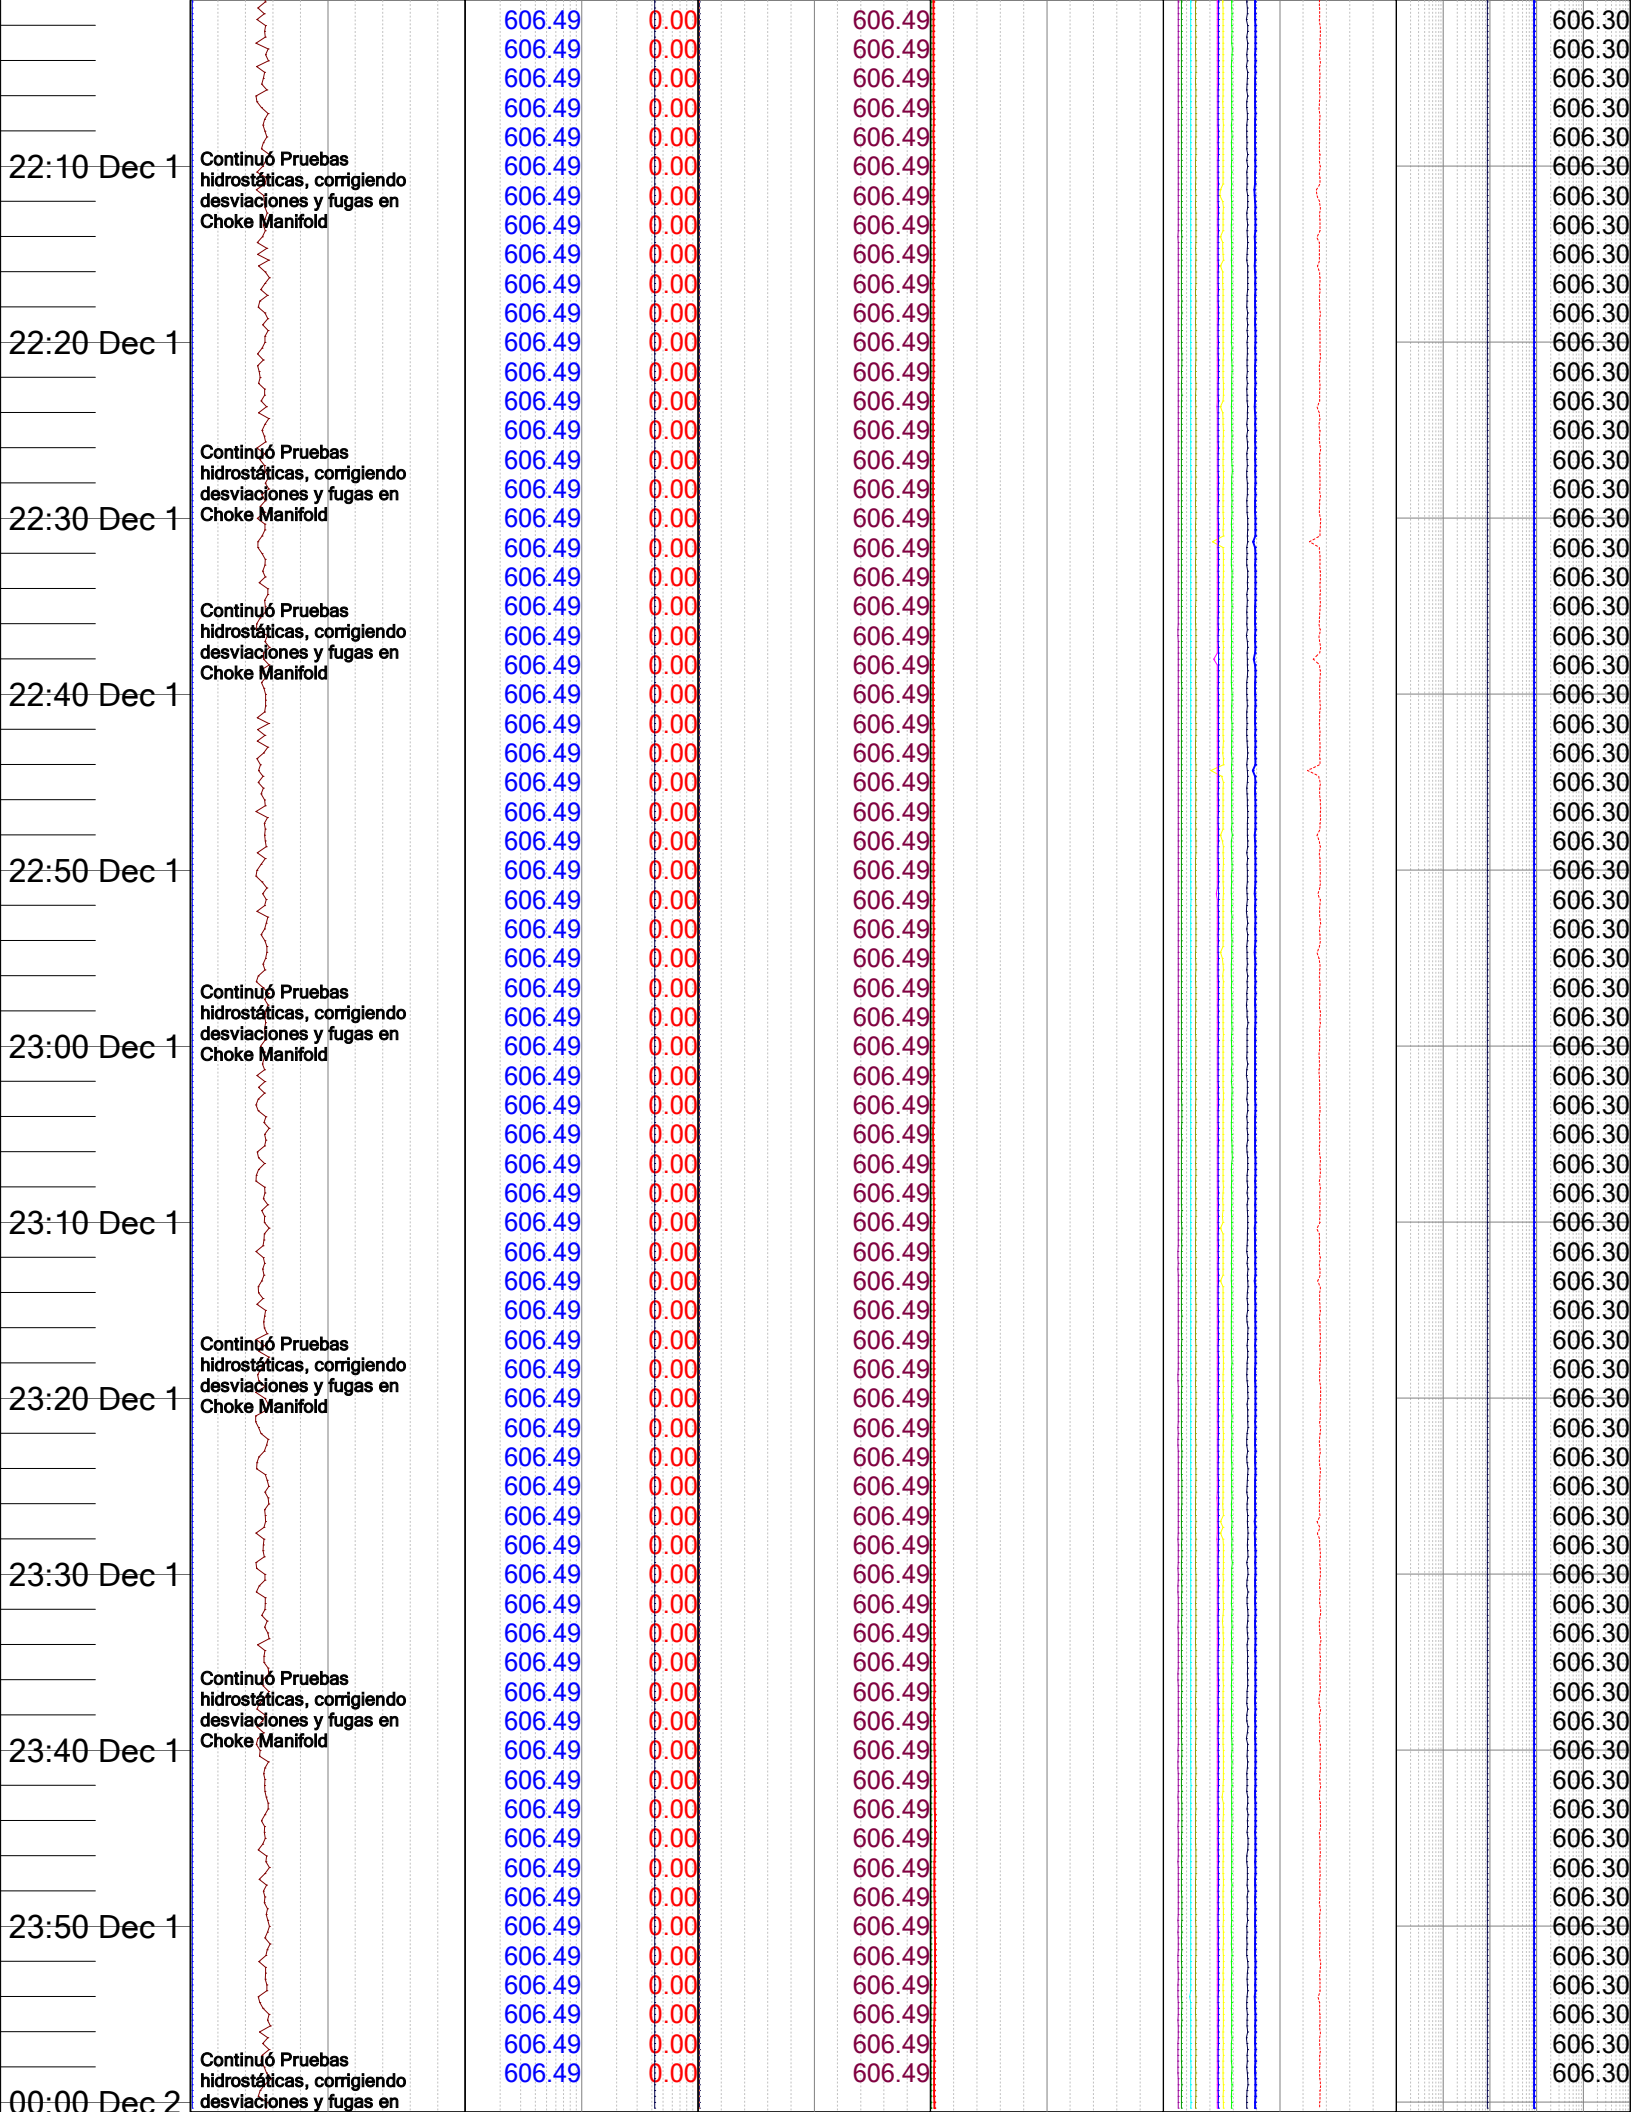

Probando Válvula Choke Manifold No. 10
Probando válvulas externas Choke Manifold 1-2-3 con CCP:440 psi
Probando válvulas externas Choke Manifold 1-2-3 con CCP:5104 psi
SPP:767 psi
Probando Set de Preventoras
12:10 Dec 1
12:20 Dec 1
12:30 Dec 1
12:40 Dec 1
12:50 Dec 1
13:00 Dec 1
13:10 Dec 1
13:20 Dec 1
13:30 Dec 1
13:40 Dec 1
13:50 Dec 1
14:00 Dec 1
606.49
0.00
606.30

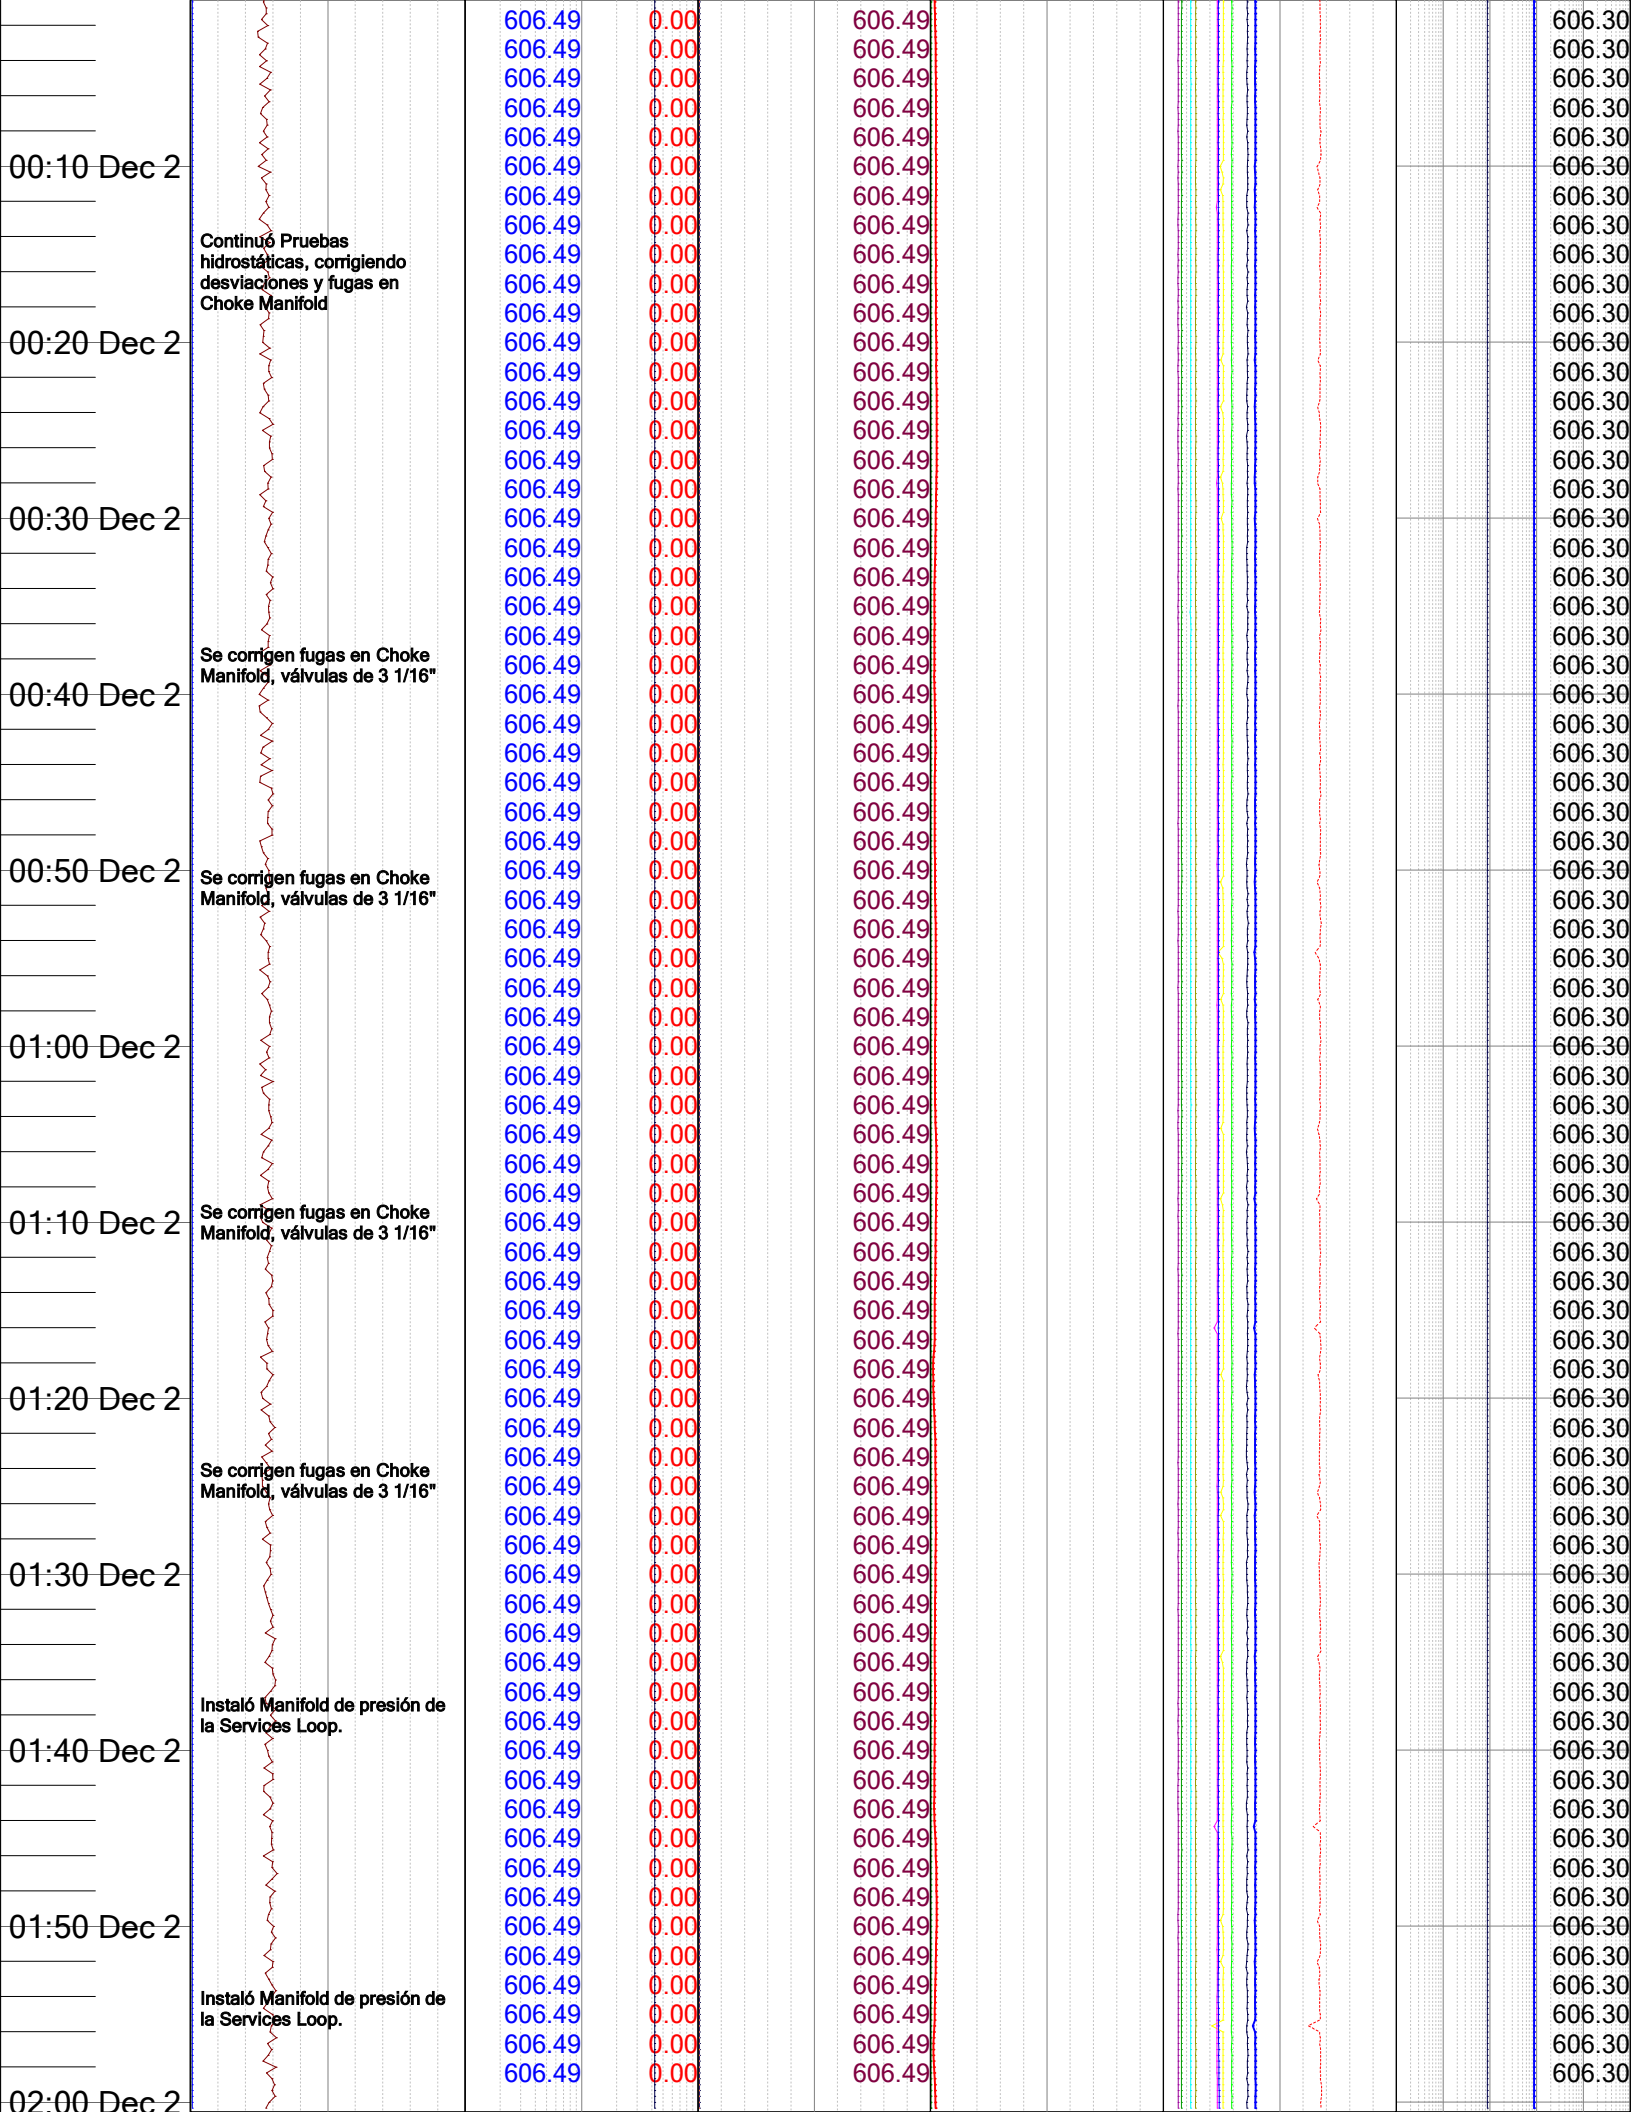

14:10 Dec 1
14:20 Dec 1
14:30 Dec 1
14:40 Dec 1
14:50 Dec 1
15:00 Dec 1
15:10 Dec 1
15:20 Dec 1
15:30 Dec 1
15:40 Dec 1
15:50 Dec 1
16:00 Dec 1
Probando Set de Preventoras
Probando válvulas choke manifold, observa fuega.
606.49
0.00
606.30

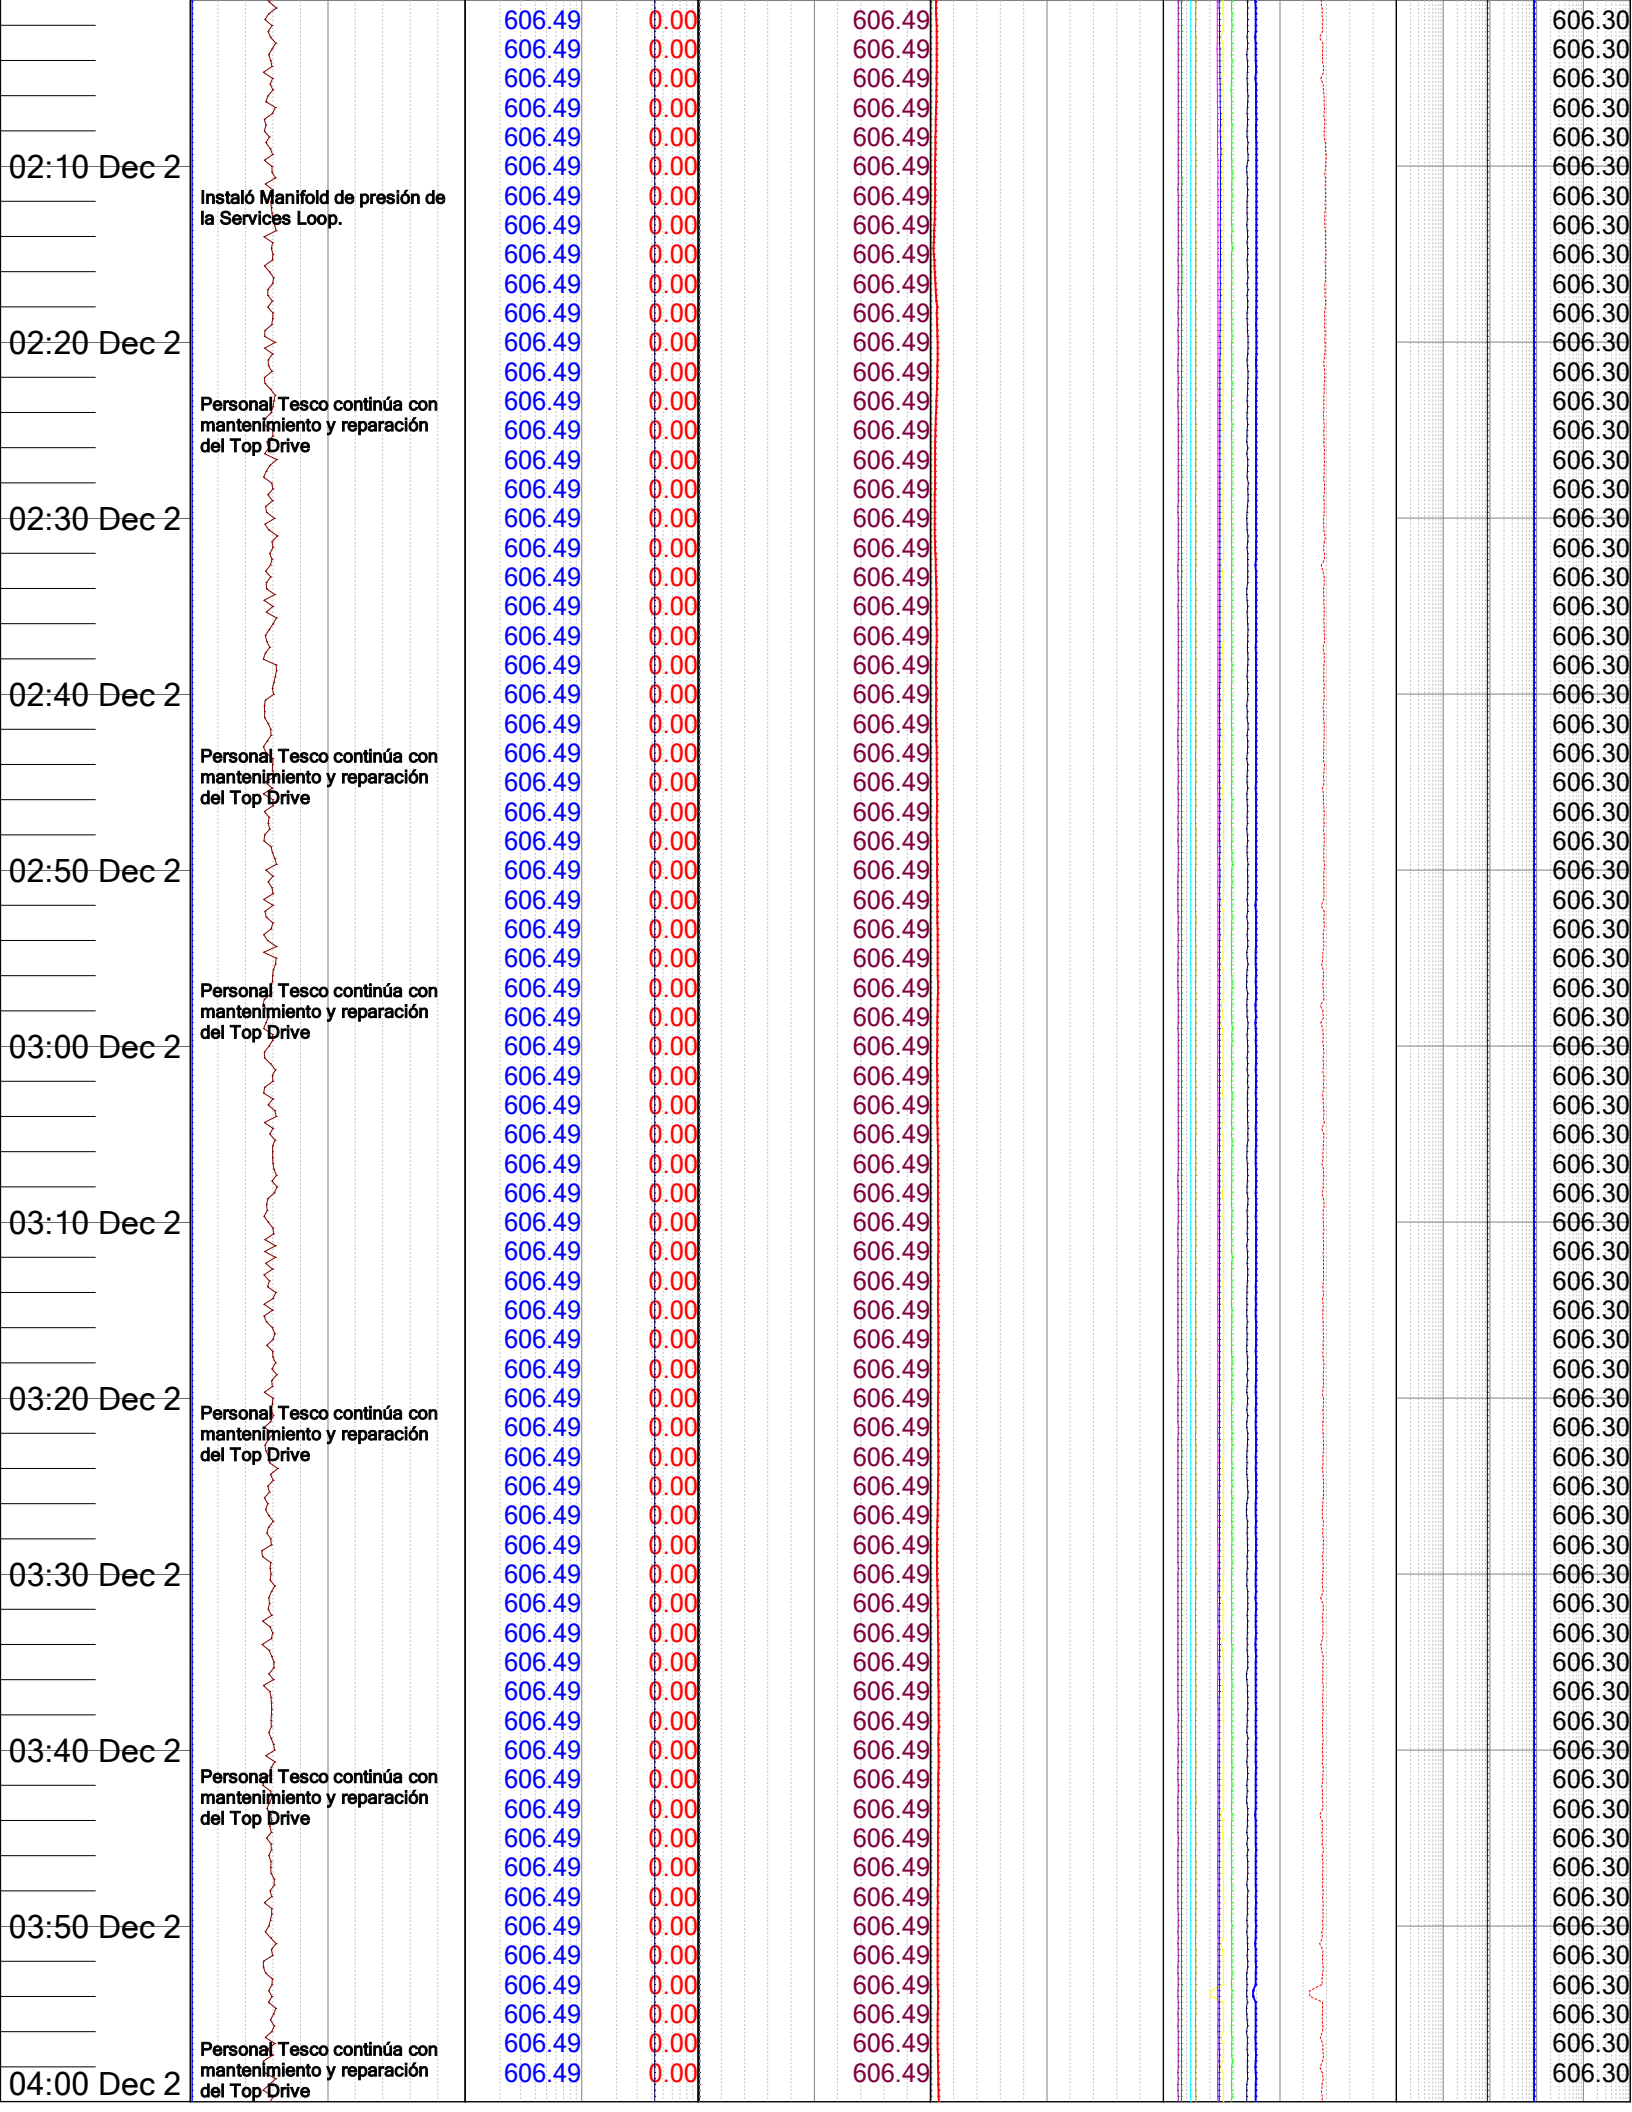

16:10 Dec 1
16:20 Dec 1
Probando Set de Preventoras - Choke Manifold
16:30 Dec 1
16:40 Dec 1
16:50 Dec 1
17:00 Dec 1
Probando Set de Preventoras - Choke Manifold
17:10 Dec 1
17:20 Dec 1
17:30 Dec 1
17:40 Dec 1
Probando Set de Preventoras - Choke Manifold
17:50 Dec 1
18:00 Dec 1
606.49
0.00
606.30


Probando Set de Preventoras - Choke Manifold
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
18:10 Dec 1
18:20 Dec 1
18:30 Dec 1
18:40 Dec 1
18:50 Dec 1
19:00 Dec 1
19:10 Dec 1
19:20 Dec 1
19:30 Dec 1
19:40 Dec 1
19:50 Dec 1
20:00 Dec 1
606.49
0.00
606.30


606.49 0.00 606.49 606.30
20:10 Dec 1
20:20 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
20:30 Dec 1
20:40 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
20:50 Dec 1
21:00 Dec 1
21:10 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
21:20 Dec 1
21:30 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
21:40 Dec 1
21:50 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
22:00 Dec 1


22:10 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
22:20 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
22:30 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
22:40 Dec 1
22:50 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
23:00 Dec 1
23:10 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
23:20 Dec 1
23:30 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
23:40 Dec 1
23:50 Dec 1
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en
00:00 Dec 2
606.49
0.00
606.30


00:10 Dec 2
00:20 Dec 2
00:30 Dec 2
00:40 Dec 2
00:50 Dec 2
01:00 Dec 2
01:10 Dec 2
01:20 Dec 2
01:30 Dec 2
01:40 Dec 2
01:50 Dec 2
02:00 Dec 2
Continuó Pruebas hidrostáticas, corrigiendo desviaciones y fugas en Choke Manifold
Se corrigen fugas en Choke Manifold, válvulas de 3 1/16"
Se corrigen fugas en Choke Manifold, válvulas de 3 1/16"
Se corrigen fugas en Choke Manifold, válvulas de 3 1/16"
Se corrigen fugas en Choke Manifold, válvulas de 3 1/16"
Instaló Manifold de presión de la Services Loop.
Instaló Manifold de presión de la Services Loop.
606.49
0.00
606.30


02:10 Dec 2
Instaló Manifold de presión de la Services Loop.
02:20 Dec 2
Personal Tesco continúa con mantenimiento y reparación del Top Drive
02:30 Dec 2
02:40 Dec 2
Personal Tesco continúa con mantenimiento y reparación del Top Drive
02:50 Dec 2
Personal Tesco continúa con mantenimiento y reparación del Top Drive
03:00 Dec 2
03:10 Dec 2
03:20 Dec 2
Personal Tesco continúa con mantenimiento y reparación del Top Drive
03:30 Dec 2
03:40 Dec 2
Personal Tesco continúa con mantenimiento y reparación del Top Drive
03:50 Dec 2
Personal Tesco continúa con mantenimiento y reparación del Top Drive
04:00 Dec 2
606.49
0.00
606.30

REPORTE DE BIENES Y SERVICIOS

NIT DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	TIPO DE SERVICIO	NO. TELEFONO DE CONTACTO PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA
9274332	AMARIS ALBARRACIN PABLO	TRASIEGO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	3108781435
36641506	ARNACHE CASTRO ENITH	SUM DE CUBETAS DE HIELO	3113833625
85165030	ARRIERA GUERRA BENITO	SEV PUBLICIDAD DEL 24/10 AL 24/11	3229103271
85163152	ARRIETA GUERRA MIGUEL	PERIFONEO EL DIA 21/10 PARA CONTRATACION	3014620212
36642024	BARRETO MEJOA EDITH JHOJANA	688,30 GL BIOACPM	3205520157
1085042207	BORJA PINEDA DARWIN JAVIER	FUMIGACION Y DESINFECCION PARA CONTROL	3022543173
9274593	CADENA MORON JORGE LUIS	SV TRTE DE MATERIAL SUBBASE	3128092072
1085171292	CADENA SAUCEDO DERLYS	SEV ALIMENTACION DEL 01/11 AL 09/11	3145091982
80577436	CAMARGO SANCHEZ AMAURIS	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA	3128092072
53060453	CORTES ARCINIEGAS SAIDY	ASEO OFICINA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 OCT	3105379015
85167558	DIAZ SAUCEDO JOEL	SEV CELADURIA DEL 05/10 AL 05/11	3116241445
830506751	DISTRITODO VS SAS	3 CINTA SEÑAL, 15 PLAST NEGRO, 34 PLAST	3107066349
19086432	GARCIA COHEN JESUS MARIA	11,765 MTOS DE TERRAPLEN	3126156024
900934620	GEOASEO	RELOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO	3003255451
901469047	GUAMAL EXPRESS SAS	SEV TRTE ESPECIAL EN BUS	(035)3551226
1102825986	GUTIERREZ BARRIOS MARLON	RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA LOCAL	3017286657
53068627	HEREDIA GARCIA MONICA	SEV HOSPEDAJE 16 AL 31 OCT	3126056081
19086432	JESUS MARIA GARCIA	COMPRA DE MATERIAL SUBBASE	3126156024
85160462	MARTINEZ TORRES OSCAR	SEV PRESTADOS EN CAMPAÑA DE SALUD	3004476201
26783798	NARVAEZ DE TOLOZA IVONNE	SEV ALOJAMIENTO DEL 01 AL 30 SEP	3145091982
85480728	ORTIZ PALLARES ALEXANDER	TRABAJO COMO PERTIGUERO	3145440937
36640602	RAMOS AREVALO YOLIMA	ALIMENTACION PARA OBRA CIVIL 16 AL 31 OCT	3117642521
26784109	RIBON MORENO FLOR MARIA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA	3143291455
85443448	SALAS BALDOVINO WALTER	SEV TRTE DE MATERIAL SUBBASE	3105379015
36640418	SAUCEDO GOMEZ LUPITA	SEV LAVANDERIA DEL 03 AL 25 NOV	3215207203
36640418	SAUCEDO GOMEZ LUPITA	SEV LAVANDERIA MES NOV	3215207203
19710188	SIERRA ARCE ANTONIO JOSE	ALQUILER DE 30 TABLAS	3107057587
5039151	TOLOZA CARDENAS GABRIEL	COMBUSTIBLE PARA MOTORES 274,28G	3103664039
1004505975	TRESPALACIOTRUJILLO VANESSA	SEV LAVANDERIA DEL 01 AL 31 OCT	3117282535
19285317	VEGA CALLEJAS MARIO	SEV ALIMENTACION DE 20 AL 31 OCT	3003428452
22404550	ZAMBRANO OVIEDO ERIMELBA	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 27/10 AL 26/11	3165265834


En el mes de noviembre se utilizaron los servicios enunciados en la tabla anterior. El manejo de las facturas ha sido de máximo 4 días entre la recepcion de las facturas por parte de auditoria y el pago de las mismas a los proveedores, cerrando cada mes con un 80 % en pagos terminados.

REPORTE DE GESTION ADMINISTRATIVA

En este mes se realizaron las siguientes actividades:

- Recopilación u manejo de información documental para enviar a base en Bogotá
- Revisión y respuesta de correos.
- Escaneo y envió de documentación a la base.
- Atención al personal.
- Realizar informe administrativo.
- Archivar documentación.
- Logística para el ingreso del personal operación obra civil.
- Compra de elementos para campaña salud oral para veredas de Guamal.
- Logística para solucionar hospedaje y alimentación de personal ingresando toda la semana
- Reporte Diario de nómina para Bogotá.
- Compras Locales para el equipo
- Contratación de Perforador relevo
- Actualización Matriz de Personal
- Entrega de Otrosí y Desprendibles de pago personal del equipo

En constancia de la veracidad de la información se hace firmar este reporte por parte del director de proyecto



_____

Luis Castillo
Director proyecto ANH Pailitas 1X
