INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	3	DEL	03/05/2018	AL	09/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	20 EQUIVALE AL 9,39%	PLAZO TRANSCURRIDO:	20 EQUIVALE AL 10,99%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
1	1	47
2		
3		
4		

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador
1		
2		
3		
4		

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 37,01% V0

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V1

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V2

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Actualización de pólizas tanto del contratista como de la interventoría.
- Se programaron visitas a los sitios propuestos por la entidad SMD.
- Revisión y aprobación de los APUs presentados por el contratista.
- Se realizó comité de obra.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	3	DEL	03/05/2018	AL	09/05/2018

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

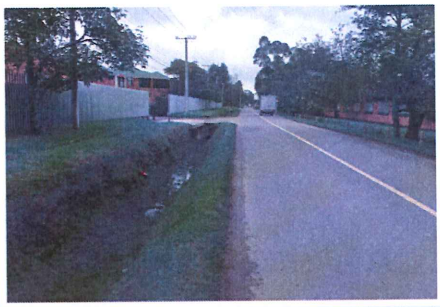


Foto 1.Algunos de los sitios críticos visitados.KR 51 entre CL 212 y CL



Foto 2. Algunos de los sitios críticos visitados.Diagonal 73B sur con



Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Diagonal 73B sur con

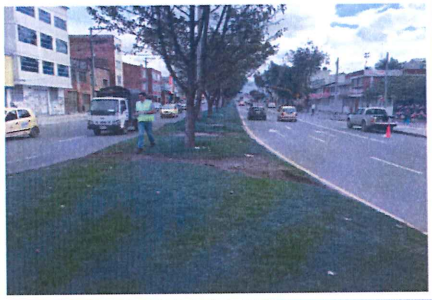


Foto 4.Algunos sitios visitados..Carrera 27 con Calle 14 sur

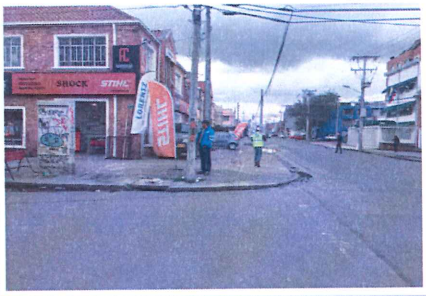


Foto 5.Algunos sitios visitados.CL 73 x KR 20 a KR 20 A (Costado sur).



Foto 6.Algunos sitios visitados.CL 73 x KR 20 a KR 20 A (Costado sur).



Foto 7.Algunos sitios visitados.Avenida Boyacá por calle 63 - canal.



Foto 8.Algunos sitios visitados.Avenida Calle 127 en tre autopista norte y Avenida Córdoba

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
