INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10 de mayo de 2018	PERIODO No.	4	DEL	10/05/2018	AL	16/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	27 EQUIVALE AL 12,68%	PLAZO TRANSCURRIDO:	27 EQUIVALE AL 14,84%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado	
1	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 37,01%
2	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 44,88%
3			
4			

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

		Acumulador	
1			Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V0
2			Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V1
3			Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V2
4			Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	10 de mayo de 2018	PERIODO No.	4	DEL	10/05/2018	AL	16/05/2018

6. Actividades Administrativas

En la Cuarta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Se programaron Nuevas visitas a los sitios propuestos por la entidad SMD.
• Aprobación de los APUs presentados por el contratista.
•Se realizó comité de obra.
•Realizan Capacitacion de Sistemas de Contecion Vial.

• Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.
La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios Autopista Sur con Calle 59 sur, costado



Foto 2. Algunos de los sitios .Av. Boyacá x Diagonal 61a Sur Meissen



Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Carrera 20 por Calle 70D Sur



Foto 4.Algunos sitios visitados.Diagonal 73B sur con Transversal 27B

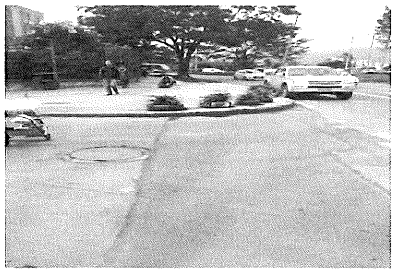


Foto 5.Algunos sitios visitados.Carrera 27 con Calle 14 sur



Foto 6.Algunos sitios visitados.Carrera 68 sobre el rio fucha en los dos costados



Foto 7.Algunos sitios visitados.Av. Carrera 30 por Av de las Américas

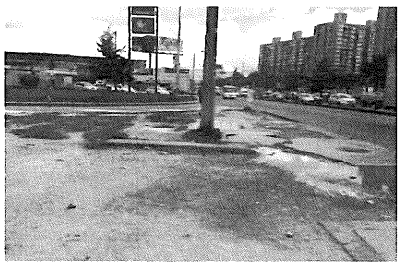


Foto 8.Algunos sitios visitados.Calle 3 con Carrera 68 costado sur

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
