# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## GERENCIA DE PROYECTOS

| FECHA | 24 de mayo de 2018 | PERIODO No. | 6 | DEL | 24/05/2018 | AL | 30/05/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | BOGOTÁ D.C. |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 2018363 | CONTRATO No.: | 20171833 |
| INTERVENTORÍA | JASEN CONSULTORES S.A.S. | CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065 |
| PLAZO INICIAL: | SIETE (7) MESES | PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de abril de 2018 | FECHA DE INICIACIÓN: | 19 de abril de 2018 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 de noviembre de 2018 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 de octubre de 2018 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 213 | PLAZO ACTUALIZADO: | 182 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 41 EQUIVALE AL 19,25% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 41 EQUIVALE AL 22,53% |
| VALOR INICIAL : | $ 433.207.600,00 | VALOR INICIAL : | $ 4.558.441.199,00 |
| VALOR ADICIÓN(ES): | $ - | VALOR ADICIÓN(ES): | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 433.207.600,00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 4.558.441.199,00 |
| VALOR PAGADO: | $ - | VALOR PAGADO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ 433.207.600,00 | VALOR POR PAGAR: | $ 4.558.441.199,00 |
| SUPERVISOR: | Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez | INTERVENTOR: | JASEN CONSULTORES S.A.S. |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

### 2.Visitas Realizadas

| | Semana | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 47 | 47 | Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 37,01% |
| 4 | 10 | 57 | Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 44,88% |
| 5 | 0 | 57 | Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 44,88% |
| 6 | 5 | 62 | Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 48,82% |

### 3. Diseños Entregados ( Conceptualización - Diseños en físico)

| | Semana | Acumulador | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ | 0,79% V0 |
| 2 | | | Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ | V1 |
| 3 | | | Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ | V2 |
| 4 | | | Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ | V3 |

### 4. Diseños Entregados ( Dibujar y georreferenciación en magnética)

| | Semana | Acumulador | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | V0 |
| 2 | | | V1 |
| 3 | | | V2 |
| 4 | | | V3 |
| | | | Aprobada |

### 5. Ejecución de Obra

| | Trabajados en la semana | Terminados en la semana |
|---|---|---|
| 1 | | |

| Programados Semanal | % |
|---|---|

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## GERENCIA DE PROYECTOS

| FECHA | 24 de mayo de 2018 | PERIODO No. | 6 | DEL | 24/05/2018 | AL | 30/05/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Avance Semanal | % |
| Programado Acumulado | % |
| Avance Acumulado | % |

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

## GERENCIA DE PROYECTOS

| FECHA | 24 de mayo de 2018 | PERIODO No. | 6 | DEL | 24/05/2018 | AL | 30/05/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**6. Actividades Administrativas**

En la Sexta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Realizan nuevas visitas a puntos priorizados por la entidad.
- Realiza comite de Seguimiento de Obra.
- Realiza Reunion con el equipo de Consultoria de la SDM (Reunion con la Diseñadora de la Entidad)
- Continuan con las Mesas de trabajo para revision de fichas tecnicas y esquemas tipicos (Trabajo con los diseñadores).
- Entrega de PMT General.
- Revision y definicion de Coompromisos acordadeos en el acta de comite.
- Reunion de Espacio publico.
- Entrega de informe Semanal y Mensual.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

**7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




Foto 1.Algunos de los sitios visitados. CAI la calera.




Foto 2. Algunos de los sitios .Av. Calle 72 con Carrera 51

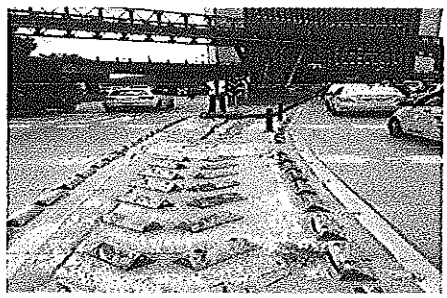


Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Carrera 30 por calle 23



Foto 4.Algunos sitios visitados.CL 3 Sur entre KR 4 Este y TV 1 Este



Foto 5.Algunos sitios visitados.TV 80B entre CL 65D Sur y CL 65F Sur

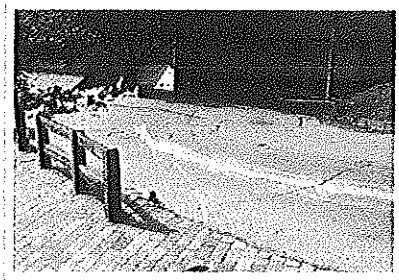


Foto 6.Algunos sitios Carrera 4S con diagonal 68G sur

**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**
**NOMBRE:** Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
**SUPERVISOR:** Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
