INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	13 de septiembre de 2018	PERIODO No.	21	DEL	6/09/2018	AL	12/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018343	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 055
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	143 EQUIVALE AL 63,54%	PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 80,22%
VALOR INICIAL:	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL:	$ 4.558.441.189,00
VALOR ADICIONALES:	$ -	VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.189,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.189,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Esico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,84%	V2
11	3	16	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	23,19%	V1
12	3	19	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	86,96%	V1
20	2	62	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	89,86%	V0
21	0	62	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Obrajar y georeferenciación en magnética)

Semana	Acumulador

V0
V1
V2
V3
Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	6	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	2	0
Acum		15

Programado Semanal	%
Avance Semanal	0,00%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	32,61%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA **GERENCIA DE PROYECTOS**	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	13 de septiembre de 2018	PERIODO No.	21	DEL	6/09/2018	AL	12/09/2018

6. Actividades Administrativas

En la Vigésimo primer semana de ejecución del contrato 2017-1633 realizaron las siguientes actividades:

• Del total de diseños establecidos, esta semana no se presenta avances en la entrega de diseños correspondientes al componente de consultoría y los porcentajes se mantienen de la siguiente manera:
52 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 69,66%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 68,66%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

•En el componente de obra se trabajó en los ID 1_2 y 1_4, presentando avances significativos en obra.
El proceso de excavación presenta un avance de 100%.
El proceso de fundida de intraplotes se presenta en 100%.
El proceso de instalación de mallas se presenta en 87,5%.
El avance permanece igual con un reporte de 15 ID's ejecutados, correspondientes a un valor de 32,61%.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 21.


• El contratista emite informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana



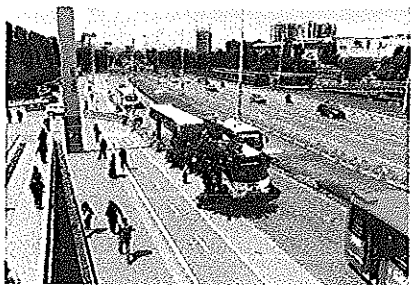

ID 1_2 y 1_4 (Autopista Norte con Calle 187)

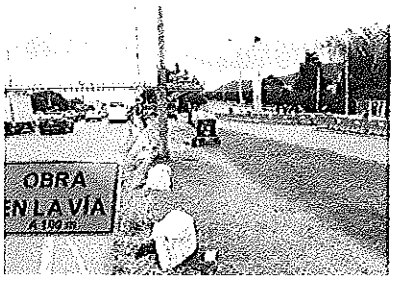

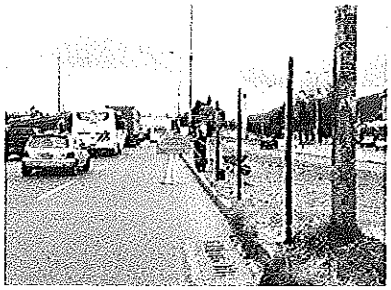

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: ING. ERICK JOSE CASTILLO QUESADA

* Visto de supervisión (firma) :
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma
