	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	11 de octubre de 2018	PERIODO No.	25	DEL	4/10/2018	AL	10/10/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VERTICULAR, ELEVENTOS DE CANALIZACION PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRANSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	174 EQUIVALE AL 71,60%	PLAZO TRANSCURRIDO:	174 EQUIVALE AL 71,60%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

Semana		Acumulado	
1	0	0	
2	0	0	
3	47	47	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 34,81%
4	10	57	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 42,22%
5	0	57	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 42,22%
6	5	62	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 45,93%
7	7	69	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 51,11%
8	52	121	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 89,63%
9	14	135	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Visitar — 100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

Semana		Acumulador			
7	1	1	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	1,45%	V2
8	1	1	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	1,45%	V2
9	12	13	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	18,84%	V2
11	3	16	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	23,55%	V1
12	3	19	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	50,72%	V1
15	3	38	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	86,96%	V1
20	2	62	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	89,86%	V0
21	0	62	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	89,86%	V0
22	0	62	Indicador = Diseños recibidos / Total de diseños	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

Semana		Acumulador	
			V0
			V1
			V2
			V3
			Anticipada

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	11 de octubre de 2018	PERIODO No.	25	DEL	4/10/2018	AL	10/10/2018

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
Acum		19

Programados Semana	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	43,18%

5. Actividades Realizadas obra

En la vigésimo quinta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 69,66%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 85,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

• En el componente de obra se trabajó en los ID 11_4, 9_2 y 19_2.

ID 2_7 : Durante esta semana, el Contratista ejecutó 22 unidades de defensa metálica sobre el corredor de la Carrera 51, correspondientes a 83,82m lineales de defensas.

ID 9_2: Se realizó la excavación de 22 pntos, donde se colocarán los micropilotes y los postes para el anclaje de las mallas.

ID 16_2: Instalación de terminales de Impacto (2).

ID 19_5: Este ID ya había sido trabajado el corte anterior y se realizó la instalación de defensas metálicas segpun el diseño aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el presente corte se ejecutó la tarea de instalación de terminess Impacto X-lite (1 unidad) y se presenta un porcentaje de avance de ID de 100%. Cabe aclarar que los ID que presenan instalación de terminales de Impacto no generan avance en la tabla de ejecución de obras debido a que ya habían sido tenidos en cuenta en cortes anteriores.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 25.

• El contratista envía informe semanal


•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La Interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 19_6 (Carrera 20 con Calle 70D sur)



ID 9_2 Av. Ciudad de Cali entre Calles 18 y 20

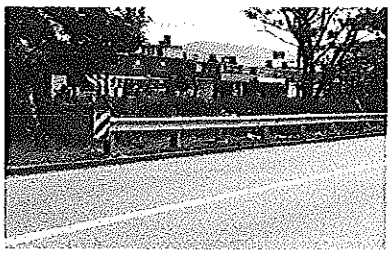

ID 16_2 (Calle 3 entre Carreras 50 y 53D)

FIRMA INTERVENTOR (REP. LEGAL O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

* VOBO SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este Informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma
