6422

DEPARTAMENTO DEL CESAR
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

RELACIÓN DE EGRESOS ENVIADOS A:
Secretaría de Infreestructura
Planilla de Remisión Número: 16
Fecha: 19 Enero 2022
Cantidad Egresos Remitidos: 9

Vigencia Egreso	Egreso No.	Orden(es) No.	Beneficiario	Concepto	Contrato Convenio No.	Valor Egreso	Folio
2021	20820	16896	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR CDT-CESAR	PAGO INFORME PARCIAL No.2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2021 AL 30/09/2021 - AUNAR ESFUE...	2021030048	$200.000.000,00	
2021	20835	16582	CONSORCIO CIUDAD VERDE	PAGO DE INFORME FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/06/2021 AL 29/10/2021 "INTERVENTORIA TEC...	2021050006	$24.766.654,00	
2021	97105022	16364	CONSORCIO INTERCOMEDOR	PAGO ACTA PARCIAL No.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2021 AL 27/11/2021- CDP EN EL SPGR 7...	2021050008	$65.133.135,41	
2021	97105222	16363	CONSORCIO BERESHIT	PAGO DE ACTA PARCIAL No.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2021 AL 26/11/2021 CONSTRUCCION ...	2021040001	$763.282.207,57	
2021	97105322	16376	A CONSTRUIR S.A	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRAS No.2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 10/11/2021 - PR...	2021040002	$336.105.219,14	
2021	97105522	16375	A CONSTRUIR S.A	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRAS No.2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 10/11/2021 - P...	2021040002	$336.106.219,14	
2021	97107622	16468	CONSORCIO RAICES BADILLO 2019	PAGO ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRAS No. 8 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL RAICES ALTO DE LA VUELTA BADIL...	2019020754	$240.037.444,49	
2021	97203622	16853	A CONSTRUIR S.A	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRAS No3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2021 AL 15/12/2021 PROYECTO D...	2021040002	$2.092.256.621,45	
2021	97203822	16377	A CONSTRUIR S.A	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRAS No.3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2021 AL 15/12/2021R PROYECTO...	2021040002	$2.092.255.621,46	

Acta 213

José Alexander Gonzalez
19/01/2022

Tesorero(a) General - Departamento del Cesar

8

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlalarcon ISABEL ALARCON CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-07-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97105322	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:		Autorizada		Nro Obligación:	47921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2022-01-12		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	542.106.760,14	Valor Deducciones:	206.001.541,00	Valor Neto:	336.105.219,14	Saldo x Pagar:	542.106.760,14

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890115406	Razón Social:	A CONSTRUIR S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	560027569991238	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	FE1220	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR / 00AR-3301-1603-2021-00220-0022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR									
	Nación	AR20000	CSF	542.106.760,14	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6423

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHolgiesia OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-12:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	47921	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	542.106.760,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	542.106.760,14	Saldo x Ordenar:	542.106.760,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	206.001.541,00	Valor Neto:	336.105.219,14			Nro. Compromiso:	9121	Nro. Cdp:	8121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2341 2343 2344

TERCERO

Identificacion:	890116406	Razon Social:	A CONSTRUIR S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	560027569991238	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	57021	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AR-3301-1503-2021-00220-0022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AR20000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2021-12-29				
Total:	542.106.760,14	0,00	542.106.760,14	542.106.760,14

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2021-12-31	Generada	542.106.760,14

$ 542.106.760,14

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHolgtesia OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-12:09 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	542.106.760,14	2,000 %	10.842.135,00	10.842.135,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 890115406	A CONSTRUIR S A	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800088811	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	542.106.760,00	1,000 %	5.421.068,00	5.421.068,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	1,000 %	40.658.000,00	40.658.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	0,500 %	20.329.000,00	20.329.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	1,000 %	40.658.000,00	40.658.000,00
2-10-03 CONTRIBUCION VIAL CON UNA TARIFA DEL 1%	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	542.106.760,00	5,000 %	27.105.338,00	27.105.338,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.666.698,00	1,500 %	60.988.000,00	60.988.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6925

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolgiesla	OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-29-11:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	57021	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	9121	Nro. Cdp:	6121
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	542.106.760,14	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	542.106.760,14	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890115406	Razon Social:	A CONSTRUIR S A				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE1220	FACTURA	2021-12-06

Objeto.:	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRAS 2 PERIODO 1/9/2021 AL 10/11/2021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6426

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHialarcon ISABEL ALARCON CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-07-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97105522	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:		Autorizada		Nro Obligación:	48021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:		2022-01-12		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	542.106.760,14	Valor Deducciones:	206.000.541,00	Valor Neto:	336.106.219,14	Saldo a Pagar:		542.106.760,14

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890115406	Razón Social:	A CONSTRUIR S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	560027569991238	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	FE1220	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR / 00AD-3301-1603-2021-00220-0022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR									
	Nación	AD20000	CSF	542.106.760,14	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6427

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHolgiesia	OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-29-12:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48021	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	542.106.760,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	542.106.760,14	Saldo x Ordenar:	542.106.760,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	206.000.541,00	Valor Neto:	336.106.219,14			Nro. Compromiso:	9221	Nro. Cdp:	6521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2342

TERCERO

Identificacion:	890115406	Razon Social:	A CONSTRUIR S A	Modio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	5C0027569991238	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	57121	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-3301-1603-2021-00220-0022 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICOS Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	Nación	AD20000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2021-12-29				
Total:	542.106.760,14	0,00	542.106.760,14	542.106.760,14

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2021-12-31	Generada	542.106.760,14

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHolgiesia OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-12:16 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	542.106.760,14	2,000 %	10.842.135,00	10.842.135,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	542.106.760,14	5,000 %	27.105.338,00	27.105.338,00
2-01-05-01-86-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	542.106.760,00	1,000 %	5.421.068,00	5.421.068,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	1,500 %	60.987.000,00	60.987.000,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	1,000 %	40.658.000,00	40.658.000,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	0,500 %	20.329.000,00	20.329.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.065.800.000,00	1,000 %	40.658.000,00	40.658.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6429

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolguin	OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-20000	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-29-12:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	57121	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR			
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	9221	Nro. Cdp:	8521
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	542.106.760,14	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	542.106.760,14	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	890115406	Razon Social:	A CONSTRUIR S A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE1220	FACTURA	2021-12-06

Objeto.:	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA 2 1/9/2021 AL 10/11/2021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6430

16375- 16376 643

GOBERNACIÓN DEL CESAR	**OFICIO REMISORIO DE RADICACIÓN**	Código: GC-FPA-058 Versión: 1 Fecha adopción:02-06-2011 Página 1 de 1

SPGR.

Valledupar, 22 de diciembre de 2021 24 12 2021

28 DIC 2021 8

28 DIC 2021 04:30

Señores
Secretaría de Hacienda – Área de Contabilidad – Central de Cuentas
Gobernación del Cesar

Asunto: Remisión de documentos soportes de pago.

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento para pagos a terceros vigente, remito para los fines pertinentes los documentos requeridos para que se procede a emitir la Orden de Pago correspondiente al contrato/convenio según los datos a continuación:

SECTORIAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO PREVIO	Secretaria de Infraestructura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021040002
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A
NIT	890115406-0
SUPERVISOR	JORGE E. OLIVEROS GALINDO/ANDRES ALMARALES MELO
N° DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FE1220
N° DE ACTA O INFORME CONCEPTO DEL PAGO	ACTA DE OBRA 2

Para lo anterior, se adjunta al presente los siguientes documentos:

DOCUMENTO	N° DE FOLIOS
OFICIO REMISORIO DE RADICACIÓN	1-2
INFORME DE SUPERVISIÓN DELEGADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3-9
INFORME ACTIVIDAD CONTRATISTA DE OBRA	10-12
FACTURA FE1220	13
CERTIFICACION BANCARIA	14-15
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT	16-21
REGISTRO PRESUPUESTAL 3238	22
REGISTRO PRESUPUESTAL 3237	23
CDP REGALIAS	24-29
REGISTROS PRESUPUESTALES	
COPIA DEL CONTRATO DE OBRA	30-43

6432

GOBERNACIÓN DEL CESAR	**OFICIO REMISORIO DE RADICACIÓN**	Código: GC-FPA-058 Versión: 1 Fecha adopción:02-06-2011 Página 1 de 1

DOCUMENTO	Nº DE FOLIOS
CERTIFCACION INTERVENTORIA NO PROYECCION	44
CERTIFICACION INTERVENTORIA CANTIDADES DE OBRA	45-46
CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA	47
CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL REVISOR FISCAL	48-51
PLANILLAS DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	52-73
ACTA PARCIAL DE OBRA 2	74-121
PREACTA No. Obra 2	122-
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA	123-193
INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA	194-282

Atentamente,

JORGE E. OLIVEROS GALINDO
Profesional Especializado
Vo. Bo. SUPERVISOR CONTRATO

6433

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	LOP-SIN-0002-2021
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II	CO1.BDOS.1797395
TIPO DE CONTRATACIÓN	OBRA
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021040002
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE MAYO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	890115406-0
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	85475046
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta CORRIENTE Nro. 0560027569991238
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC	$ 0,00; Cuenta Nro.

Clasificación P.N: N/A ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO ¿Es Declarante de Renta?: SI

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2020 SUPERARON $ 49.849.800,00? NO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

ANTICIPO: NO HABRÁ LUGAR AL DESEMBOLSO DE ANTICIPO SEGÚN LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. FORMA DE PAGO: EL 100% MEDIANTE ACTAS PARCIALES O FINAL DE OBRA (ANEXANDO Y PRESENTANDO PRE ACTAS) FIRMADAS POR EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA, APROBADAS POR EL INTERVENTOR, VISTO BUENO DEL SUPERVISOR Y DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESE MOMENTO Y QUE TEN CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE OBRA. LAS OBRAS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO CONTIENE O LAS PRE ESCRITAS A NIVEL NACIONAL. PARAGRAFO 1: PARA EL PAGO DE LA ÚLTIMA ACTA DE OBRA SE DEBE PRESENTAR EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO. LAS ACTAS DE OBRA DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL MES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL DEPARTAMENTO LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LAS ACTAS DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADAS POR DEPARTAMENTO, Y EL DEPARTAMENTO LAS PAGARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS O, SI SE EVIDENCIAN ERRORES EN LAS CUENTAS PRESENTADAS O INSUFICIENCIA EN LOS SOPORTES, LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES PARA EL PAGO SE CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LAS GLOSAS QUE SE FORMULEN. SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA CUENTA CON SUS SOPORTES RESPECTIVOS, DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, NO PODRÁ HACER NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		22 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO		N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		22 MES(ES)
FECHA DE INICIO		12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN		11 DE MAYO DE 2023
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	901493970

Formato No. 1070 | Sirec II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por JORGE ELIECER OLIVEROS GALINDO el día: 28 de diciembre de 2021

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

	NOMBRE DEL INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
	FECHA DE DESIGNACIÓN	7 DE JULIO DE 2021

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
88283491	JORGE ELIECER OLIVEROS GALINDO	6 DE JULIO DE 2021

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	8521	VALOR	$ 44.207.808.221,10	FECHA	17 DE MARZO DE 2021
N°	8121	VALOR	$ 95.292.076.215,90	FECHA	12 DE MARZO DE 2021

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	3238	VALOR	$ 43.699.960.726,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	3237	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N°	9221	VALOR	$ 43.699.960.726,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	9121	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 138.817.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00	32021012775	06/07/2021
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 138.817.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00	32021012772	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 138.817.668.949,00	1,5 %	$ 2.082.265.000,00	32021012772	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 138.817.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00	32021012772	-
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 138.817.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00	32021012772	-

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COLPATRIA	4617	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/05/2021 AL 12/07/2023	2021040002
COLPATRIA	4617	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	4617	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	12/03/2023 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	4617	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	12/03/2023 AL 12/03/2026	2021040002
OLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2023	2021040002
COLPATRIA	4617	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 AL 11/09/2023	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4617	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4617	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	11/05/2023 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4617	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2023	2021040002-ACT01

Formato No. 1070 | Sirec II V1.0 © Todos los derechos reservados.

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

	EXTRACONTRACTUAL		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA	0050 DEL 6 DE JULIO DE 2021		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2021040002-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA	0050-A DEL 27 DE JULIO DE 2021		

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	12-07-2021	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
2021040002-01	MODIFICATORIO	23-09-2021	SE CORRIGE AL AIU DE ACUERDO A LO OFERTADO POR EL PROPONENTE

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
acta parcial #01	25-10-2021	DEL 12/07/2021 AL 30/08/2021

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 989.095.946,99			$ 989.095.946,99	10885, 10886	512, 513	27/10/2021, 27/10/2021
TOTAL:		$ 989.095.946,99						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
9422956709	MES DE JULIO DE 2021	$ 409.400,00	$ 1.703.400,00	$ 712.500,00	$ 409.400,00	$ 3.234.700,00
9422956788	MES DE JULIO DE 2021	$ 96.000,00	$ 384.000,00	$ 167.100,00	$ 96.000,00	$ 743.100,00
9422956788	MES DE JULIO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 149.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424217396	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 22.000,00	$ 88.000,00	$ 38.300,00	$ 22.000,00	$ 170.300,00
9424224767	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.900,00	$ 659.900,00	$ 5.191.000,00
9424671615	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 1.062.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.167.900,00
9423448119	MES DE JULIO DE 2021	$ 810.700,00	$ 3.238.000,00	$ 1.403.400,00	$ 807.000,00	$ 6.259.100,00
9424224767	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.900,00	$ 659.900,00	$ 5.191.000,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424671615	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 1.062.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.167.900,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 149.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
9425498928	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00

Formato No. 1070 | Sirce II V1.0 © Todos los derechos reservados.

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

9425499001	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 464.400,00
9425499146	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 815.100,00	$ 3.325.500,00	$ 1.418.100,00	$ 815.100,00	$ 6.373.800,00
9426498928	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.586.000,00	$ 8.049.300,00
9425572597	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.841.600,00	$ 7.349.600,00	$ 3.105.400,00	$ 1.786.600,00	$ 14.083.200,00
9426660920	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9426656314	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 61.000,00	$ 243.600,00	$ 106.100,00	$ 61.000,00	$ 471.900,00
9426660789	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 901.300,00	$ 3.669.200,00	$ 1.493.000,00	$ 858.300,00	$ 6.921.800,00
9427792155	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 907.000,00	$ 3.692.400,00	$ 1.522.700,00	$ 880.600,00	$ 7.002.700,00
9427793079	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9427793079	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.586.000,00	$ 8.049.300,00
9428479084	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.482.500,00	$ 9.913.100,00	$ 4.287.000,00	$ 2.486.300,00	$ 19.147.900,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

En atención a la autorización de descuento directo acogido por el contratista A CONSTRUIR S.A con relación a lo estipulado en la ordenanza No. 226 del 26 de febrero de 2021 para el pago de los impuestos de PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO DESARROLLO FRONTERIZO, PRO CULTURA Y PRO ADULTO MAYOR. Se AUTORIZA a la entidad contratante para que de la presente acta sea descontado el 30% del valor de esta según lo estipulado en la autorización de descuento directo firmado por el contratista y que dicho recurso sea destinado al pago de los impuestos de PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO DESARROLLO FRONTERIZO, PRO CULTURA Y PRO ADULTO MAYOR. Saldo valor estampillas pendientes $5,255,978,216 Descuento estampillas acta parcial 2: $325,265,000 PRO DESARROLLO DPTAL: $81,316,000 PRO DESARROLLO FRONTERIZO: $121,975,000 PRO CULTURA: $81,316,000 PRO ADULTO MAYOR: $40,658,000 Nuevo Saldo valor estampillas después de acta parcial 2: $4,930,713,216

_ACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Para periodo de la presente acta se encuentra vinculado a la obra personal perteneciente al área de influencia del proyecto
- Se está desarrollando las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad del proyecto
- Se cuenta con la vigilancia por parte de la interventoría y supervisión técnica necesaria para la ejecución de la obra
- Se cumple con las especificaciones técnicas y de calidad de acuerdo a lo contratado

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existante al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Implementar acciones tendentes a que en la ejecución del contrato se mitigue los riesgos de desastres en cumplimiento de lo establecido en la ley 1523 del 24 de abril de 2012, y de sus normas que la modifican o

Formato No. 1070 | Sirce II V1.0 © Todos los derechos reservados.

complementan.

- Implementación del Plan de Manejo de Transito. (Si aplica) 7.19. Desarrollar acciones propias para contribuir a la gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.
- Implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), en cumplimiento de normas constitucionales y legales que regula la protección al medio ambiente (Si aplica).
- Cumplir con la resolución No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, las que la modifiquen, sustituyan y/o complementen, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, etc
- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
- Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
- Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
- Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
- Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad
- Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
- Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y condiciones de los anexos del Pliego de Condiciones.
- Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
- Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al respectivo Municipio donde se esté ejecutando la obra y reportar mensualmente a la entidad contratante la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra
- Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) propuesto y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 1.084.213.520,28
TOTAL:		$ 1.084.213.520,28

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO

DESCUENTO	NÚMERO OP	FECHA	TOTAL DESCONTADO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	10885	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	10886	27-10-2021	$ 37.091.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			$ 74.182.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	10885	27-10-2021	$ 18.546.000,00
	10886	27-10-2021	$ 18.546.000,00
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			$ 37.092.000,00

Formato No. 1070 | Sirac II V1.0 © Todos los derechos reservados.

6438

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	10885	27-10-2021	$ 55.637.000,00
	10886	27-10-2021	$ 55.637.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO			$ 111.274.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	10885	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	10886	27-10-2021	$ 37.091.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			$ 74.182.000,00
TOTAL DESCONTADO			$ 286.730.000,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI X

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 1.084.213.520,28

Valor Amortización Anticipo: $ 0,00

Valor neto a Cobrar: $ 1.084.213.520,28

se da visto bueno para realizar el pago de **UN MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 28/100.- PESOS M/CTE ($ 1.084.213.520,28)**, el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
3238 del 2021 (9221 del 2021)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 542.106.760,14	2021040002
3237 del 2021 (9121 del 2021)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 542.106.760,14	2021040002
	TOTAL	$ 1.084.213.520,28	

Por concepto de **ACTA PARCIAL #02** correspondiente al pago del periodo *del 01/09/2021 al 10/11/2021*, del contrato **2021040002.**

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que registro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122821462	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE122821500**
JORGE ELIECER OLIVEROS GALINDO **SUPERVISOR** **SUPERVISOR DESIGNADO**	ROCIO MARIA ACOSTA ARGOTE Rep. legal de UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR **INTERVENTOR**

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por JORGE ELIECER OLIVEROS GALINDO el día: 28 de diciembre de 2021

6439

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE122821516

ESTHER MENDOZA PEINADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Formato No. 1070 | Sirco II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por JORGE ELIECER OLIVEROS GALINDO el día: 28 de diciembre de 2021

6440

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE ACTIVIDADES

Documento No. INAC-SIN-1614-2021

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos	A CONSTRUIR S.A.	c.c o NIT	890116406-0	Teléfono	3538555098
Clasificación P.N	N/A	Dependientes	NO	¿Es Pensionado?	NO
Régimen	NO RESPONSABLE DE IVA	Pens. Voluntarias	$ 0,00	¿Es Declarante de Renta?	SI
No. Cuenta Bancaria	05600276699991298			Intereses Vivienda	$ 0,00
Tipo de Cuenta	CORRIENTE	Aportes AFC	$ 0,00	Tipo de Cuenta AFC	
Banco el cual Consignar	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta AFC No.		Entidad Bancaria AFC	
			¿Sus Ingresos en el 2020 Superaron $ 49.848.600.00?		NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

No. del contrato	2021040002	No. RP	3236, 3237 | 9221, 9121	Modalidad Contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Informe No.	2 de 2
No. del Proceso SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104	Periodo Cobrado	del 01/09/2021 al 10/11/2021		¿Factor Multiplicador en Retefuente?		NO
Tipo de Contrato	OBRA	Justificación de la Modalidad			ARTICULO 30, LEY 80 DE 1993		

OBJETO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
ANTICIPO: No habrá lugar al desembolso de anticipo según lo previsto en el pliego de condiciones de la licitación. FORMA DE PAGO: El 100% mediante actas parciales o final de obra (anexando y presentando pre actas) firmadas por el contratista, el residente y director de obra, aprobadas por el interventor, visto bueno del Supervisor y del Secretario de Infreestructura, según el porcentaje de las actividades ejecutadas en ese momento y que estén cumpliendo con el programa de inversión financiera y de actividades de obra. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional. PARAGRAFO 1: Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Departamento las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por Departamento, y el Departamento las pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si se evidencian errores en las cuentas presentadas o insuficiencia en los soportes, los treinta (30) días hábiles para el pago se contarán a partir de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se formulen. . Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

No. de Poliza	Amparo	Valor Amparado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.655,00	12/05/2021	12/07/2023
4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021	12/03/2026
4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.655,00	12/03/2023	12/03/2026
4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	12/03/2023	12/03/2026
1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021	12/03/2023
4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.655,00	12/07/2021	11/09/2023
4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.655,00	11/05/2023	11/05/2026
4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

		DOCUMENTO SOPORTE DEL COBRO		SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA		
Valor Antes de Iva	$ 1.084.213.520,26	Cuenta de Cobro	☐	Administración	21,00 %	$ 227.684.839,25
Más: IVA	$ 0,00	Factura	[X]	Imprevistos	4,00 %	$ 43.368.540,81
Valor Total	$ 1.084.213.520,26	Inf. de Actividades	☐	Utilidades	5,00 %	$ 43.368.540,81
Menos: Amortización	$ 0,00					
Menos: Glosa	$ 0,00					
Valor Neto a Cobrar	$ 1.084.213.520,26					

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Mes Cotizado	No. Planilla	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales	Total
AGOSTO - 2021	9424224767	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.800,00	$ 659.800,00	$ 5.191.000,00
AGOSTO - 2021	9424218831	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
AGOSTO - 2021	9424671815	$ 1.082.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.187.900,00
AGOSTO - 2021	9424216631	$ 148.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
SEPTIEMBRE - 2021	9425499028	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
SEPTIEMBRE - 2021	9425499001	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 464.400,00
SEPTIEMBRE - 2021	9425499146	$ 815.100,00	$ 3.325.500,00	$ 1.416.100,00	$ 815.100,00	$ 6.373.800,00
SEPTIEMBRE - 2021	9425498928	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
SEPTIEMBRE - 2021	9425572597	$ 1.841.600,00	$ 7.348.800,00	$ 3.185.400,00	$ 1.786.600,00	$ 14.083.200,00
OCTUBRE - 2021	9426660020	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
OCTUBRE - 2021	9426656314	$ 61.000,00	$ 243.600,00	$ 106.100,00	$ 61.000,00	$ 471.900,00
OCTUBRE - 2021	9426660789	$ 901.300,00	$ 3.589.200,00	$ 1.403.000,00	$ 658.300,00	$ 6.921.800,00

PAGO DE IMPUESTOS

Impuesto	No. Liquidación	Valor Base	Tarifa	Valor Impuesto
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	32021012775	$ 138.617.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	32021012772	$ 138.617.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	32021012772	$ 138.617.668.949,00	1,5 %	$ 2.082.265.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	32021012772	$ 138.617.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	32021012772	$ 138.617.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00

PARA LOS EFECTOS LEGALES Y BAJO GRAVEDAD DEL JURAMENTO, MANIFIESTO QUE

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual descritas en el formato anexo.
2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, que los aportes Voluntarios o cuentas AFC y FVP, correspondan a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.
3. Que pertenezco a la categoría descrita en la casilla "Clasificación P.N."
4. Toda la información aquí suministrada es veridica.

RADICADO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE122321351

A CONSTRUIR S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos	A CONSTRUIR S.A.	c.c o NIT	900118405-0	Teléfono	3533550000

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

No. del contrato	2021040002	No. RP	3238, 3237 9221, 9121	Modalidad Contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Informe No.	2 de 2				
No. del Proceso SECOP II	CO1.PCCNTR.2488104	Periodo Cobrado	del 01/09/2021 al 10/11/2021	¿Factor Multiplicador en Retefuente?	NO
Tipo de Contrato	OBRA	Justificación de la Modalidad	ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993		

ITEM	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES
1	Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al respectivo Municipio donde se esté ejecutando la obra y reportar mensualmente a la entidad contratante la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra	Para periodo de la presente acta se encuentra vinculado a la obra personal perteneciente al área de influencia del proyecto
2	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y condiciones de los anexos del Pliego de Condiciones.	Se está desarrollando las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad del proyecto
3	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Se cuenta con la vigilancia por parte de la interventoría y supervisión técnica necesaria para la ejecución de la obra
4	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Se cumple con las especificaciones técnicas y de calidad de acuerdo a lo contratado

6443

A CONSTRUIR S.A.

A CONSTRUIR S.A. NIT: 890115406-0
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de Diciembre 2020
Responsables de IVA
Autorización Numeración de Facturación DIAN
18763002826914 de 2019-12-19
Desde 1001 hasta 2000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE1220

CLIENTE: GOBERNACION DEL CESAR
NIT: 892399999-1
TELÉFONO: 5748230
DIRECCIÓN: Cl 16 No 12 120
200001 Valledupar

FECHA FACTURA: 06/12/2021 18:10:07
FECHA VENCIMIENTO: 05/01/2022

DESCRIPCIÓN

Cobro de ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 002 - CONTRATO DE OBRA N° 2021040002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

1	VTA001	UND	SERVICIOS DE CONSTRUCCION		$	756.488.639,72
2	AIU0004	UND	A.I.U.	30%	$	226.946.591,92
3	VTA008	UND	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$	64.900.556,28
4	VTA005	UND	IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		$	35.877.732,00
			SUBTOTAL ANTES DE IVA		$	**1.084.213.519,92**
			IVA sobre Utilidad	19%	$	0,00
			TOTAL		$	**1.084.213.519,92**

VALOR EN LETRAS

MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M.L.

OBSERVACIONES

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE No. 0275-6999-123-8
TITULAR DE LA CUENTA: A CONSTRUIR S.A.
NIT: 890.115.406-0

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIONES POR CONCEPTO DE IVA E ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO Y ES TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

CUFE: 7a6606dbcd5b140517c0cffb83e1d293da14195cbc701f030ebb92bc8613fc4e92c00ea010df984393cb3c54bf4edda6

6444

A CONSTRUIR S.A.

A CONSTRUIR S.A. NIT: 890115406-0
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de Diciembre 2020
Responsables de IVA

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 1

CLIENTE: GOBERNACION DEL CESAR
NIT: 892399999-1
TELÉFONO: 5748230
DIRECCIÓN: Cl 16 No 12 120
200001 Valledupar

FECHA DOCUMENTO: 28/12/2021 12:14:33
FECHA VENCIMIENTO: 27/01/2022

DESCRIPCION

MENOR VALOR FACTURADO EN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 2 EN LA FACTURA ELECTRONICA FE1220.

1	VTA009	UND	MENOR VALOR FACTURADO		$	0,36
			SUBTOTAL ANTES DE IVA		**$**	**0,36**
			IVA sobre Utilidad	19%	$	0,00
			TOTAL		**$**	**0,36**

VALOR EN LETRAS

CERO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M.L.

OBSERVACIONES

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE No. 0275-6999-123-8
TITULAR DE LA CUENTA: A CONSTRUIR S.A.
NIT: 890.115.406-0

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIONES POR CONCEPTO DE IVA E ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES
A LA LETRA DE CAMBIO Y ES TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

CUDE: 748b4b682a4c795b2fab1ee8354292586f195c892a1d142917f6bb6ca623951b8fc4150675411d8aada60ec6cb2c6d8c

6445

A CONSTRUIR S.A.

Barranquilla, Diciembre 6 de 2021 **2021-CVUP-060**

Señores
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Atn.: Dra. ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestrutura
Valledupar, Cesar

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA N° 2021040002**
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: Radicar Acta Parcial de obra #2

Cordial saludo,

Por medio de este oficio se hace entrega de la siguiente documentación para su posterior revisión y aprobación:

1. Certificación de cantidades de obra por parte de la interventoría.
2. Certificación de parafiscales por parte de la interventoría.
3. Factura de venta.
4. Certificación revisor fiscal parafiscales del contratista.
5. Autorización de descuento de impuestos contractuales.
6. Planillas de pago de seguridad social.
7. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal de Regalías.
8. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal del Departamento.
9. Pre-acta parcial No. 2.
10. Acta parcial de cobro No. 2.
11. Memorias de cálculo de acta parcial de cobro No. 2.
12. Informe de gestión del contratista.
13. Copia de pólizas y su aprobación según acta de inicio.

Quedo atento a sus comentarios, salvedades o cualquier observación pertinente.

Atentamente,

IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 77B Nº 59-61 – Oficina 203 - Centro Empresarial Las Américas II
Teléfono: (57) (5) 3855098 E-Mail: ac@aconstruir.co
Barranquilla - Colombia

6446

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BARRANQUILLA, , ATLÁNTICO, 28/06/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **A CONSTRUIR SA** con NIT **8901154060** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560027569991238

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

6447

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No 2021040002 DE 2021 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y A CONSTRUIR

CERTIFICA:

Que las cantidades a pagar en el acta de obra No. 02 del contrato de obra No. 2021040002, corresponden a las realmente ejecutadas hasta la fecha, y en ningún evento incluyen proyecciones o cantidades que no reúnen condiciones de ejecución satisfactoria.

NOMBRE: UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR

IDENTIFICACION: NIT. 901493970-2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROCIO MARIA ACOSTA ARGOTE

FIRMA:

6498

UNIÓN TEMPORAL
INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT. 901.493.970-2

CERTIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SEGÚN ACTA PARCIAL No.02

DATOS GENERALES

CONTRATO _X_ CONVENIO ___

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PUBLICA
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN	LOP-SIN-0002-2021
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	12 DE MAYO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A
IDENTIFICACION/NIT	890115406-0
REPRESENTANTE LEGAL	IVÁN ALBERTO JIMÉNEZ AGUIRRE
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 85.475.046
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS INCLUIDO AIU PESOS MCTE ($138.817.668.949,11) INCLUIDO AIU.
FORMA DE PAGO DE DESEMBOLSOS	CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: EL 100% MEDIANTE ACTAS PARCIALES O FINAL DE OBRA (ANEXANDO Y PRESENTANDO PRE-ACTAS) FIRMADAS POR EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA, APROBADAS POR EL INTERVENTOR, VISTO BUENO DEL SUPERVISOR Y DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESE MOMENTO Y QUE ESTÉN CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE OBRA. LAS OBRAS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO CONTIENE O LAS PRE ESCRITAS A NIVEL NACIONAL.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS (22) MESES
FECHA DE INICIO	12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	11 DE MAYO DE 2023
SUPERVISORES	JORGE ELIECER OLIVEROS GALINDO – ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO
FECHA DE DESIGANACIÓN DE LOS SUPERVISORES	6 DE JULIO DE 2021

Dirección: CARRERA 13A No 7B – 48
Email: toralconstruccionessas@gmail.com
Teléfono: 313-5392449
Valledupar, Colombia

6449

UNIÓN TEMPORAL
INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT. 901.493.970-2

CONTINÚA CERTIFICACIÓN

Según la normativa vigente, manual de interventoría de la Gobernación del Cesar y las cláusulas del contrato de obra que a continuación se citan: **VIGESIMA SEGUNDA:** actas, **TRIGESIMA:** cantidades y medidas, **TRIGESIMA PRIMERA: entregas parciales de obras,** se realizó en forma conjunta la medición y el computo de las cantidades de obra ejecutadas en el acta parcial de obra No.02, desarrolladas en cumplimiento del contrato de obra No. 2021040002 las cuales fueron cuantificadas en trabajo de campo por los ingenieros residentes e inspectores de obras responsables (memorias de cálculo) y verificadas posteriormente en trabajo de oficina por los profesionales asignados por la firma contratista, quienes emiten los resultados en pre-actas que hacen parte del proceso de suscripción del acta elaborada por el contratista que posteriormente revisa y acepta la interventoría, las cantidades expuestas en las actas parciales de obra serán pagadas conforme a lo estipulado en la cláusula sexta de este contrato.

El presente documento es soporte para el trámite del pago del acta parcial No.02 del contrato de obra No. 2021040002.

Para mayor constancia se firma el día 17 de noviembre de 2021.

IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
R/L A CONSTRUIR S.A.
CONTRATISTA

ROCIO ACOSTA ARGOTE
R/L UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
INTERVENTORIA

6450

	CERTIFICADO DE SEGURIDAD	LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE – INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2021-02-0007

CERTIFICA:

Que **A CONSTRUIR S.A** identificado con NIT.890115406-0 representada legalmente por el Dr. **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, con quien el Departamento del Cesar suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 2021-04-0002 cuyo objeto es **CONSTRUCCION DEL CENTRO EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, se encuentra al día en el pago correspondiente a **SALUD, PENSION, ARL** de los meses de septiembre, octubre, según consta en las certificaciones que forman parte del presente informe.

Para mayor constancia se firma a los (17) diecisiete días del mes de noviembre de 2021.

ROCIO ACOSTA ARGOTE
Representante legal
INTERMUSEO VALLEDUPAR

Dirección: CARRERA 13A No 7B – 48,
Email: toralconstruccionessas@gmail.com
Teléfono: 313-5392449
Valledupar, Colombia

6451

A CONSTRUIR S.A.

Barranquilla, 11 de Noviembre de 2021 **2021-098**

Certificación de Pagos de Seguridad Social
y Aportes Parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002

JAIME ALBERTO CANDAMA HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía **72.233.314**, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **A CONSTRUIR S.A.**, identificada con NIT **890.115.406-0**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la Empresa ha pagado los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicios Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) durante los últimos seis (6) meses, y que dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dicho período.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JAIME ALBERTO CANDAMA HERRERA
T.P. No. 116940-T
REVISOR FISCAL

Calle 77B Nº 59-61 - Oficina 203 - Centro Empresarial Las Américas II
Teléfono: (57) 605 3855098 E-Mail: ac@aconstruir.co
Barranquilla - Colombia

6452

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0600288D0E9C7FCA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ALBERTO CANDAMA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72233314 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 116940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

6453

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11694-T



JAIME ALFREDO
CANDAMIL HERRERA
C.C. [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION [illegible] FECHA [illegible]
UNIVERSIDAD [illegible]


FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

6454

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.233.314
NUMERO
CANDAMA HERRERA
APELLIDOS
JAIME ALBERTO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1977
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S RH SEXO
13-FEB-1996 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-0300191-22146702-M-0072233314-20060815 05116 00226A 02 187328830

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A CONSTRUIR S.A. identificado(a) con NI 890115406 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDUARDO ENRIQUE CEPEDA CAMACHO identificado(a) con CC 72127336

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9426660920	25633698	E	2021-11-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30
9426660920	25633698	E	2021-11-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30

Este certificado se expide el día 2021-11-03 a las 02:24.

6455

aportes en línea

Pl la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRURR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 51 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25633698	9426660920	E	2021/11/03	2021/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$69,415,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ingret	Ldetlab	Sln	Ige	Irl	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Irl	Vsp	Cor	Vst	Avp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																											
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																											
1	CC	43970830	ARIZA ROMERO EMMSA LOANA															230201	30	EPS016	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
2	CC	1065998647	GALINDO BARRIOS JOSE DAVID															230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
Total Afiliados(2)																											

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$348,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$348,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$200,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$200,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$80,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$120,000
TOTAL				2	$1,548,000

2021/11/03 02:14 PM

6456

aportes en línea

Pl la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25633698	9426660789	E	2021/11/03	2021/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$74,782,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (11 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																															
1	CC	77090391	AHUMADA MENA CESAR AUGUSTO									X										231001	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
2	CC	77185729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING											X								231001	14	EPS002	14	CCF15	14	14-7	14	14	SI
3	CC	77185729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING																			231001	16	EPS002	16	CCF15	16	14-7	16	16	SI
4	CC	1065591193	BRACHO VARGAS LORENA ROCIO																			25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
5	CC	1046813806	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA																			230301	30	EPS010	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
6	CC	85470281	ESCOBAR GARCIA EDUARDO RAFAEL									X										231001	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
7	CC	1124032806	GOMEZ SOTO TATIANA PAOLA	X																		231001	27	EPS037	27	CCF15	27	14-7	27	27	SI
8	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN																			230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
9	CC	1065641212	OSPINO PACHECO ANDRES EDUARDO	X																		25-14	27	EPS002	27	CCF15	27	14-7	27	27	SI
10	CC	49787228	PEÑALOZA TORRES ADA LUZ									X										230301	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
11	CC	1063921741	TORRES ALCINA KEINER RAFAEL									X										230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
12	CC	15171031	YANCE ARRIETA NESTOR MANUEL									X										25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
Total Afiliados(11)																															

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,669,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,096,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$681,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,714,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$176,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,493,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$1,493,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$858,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$858,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$901,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$41,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$68,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$168,000

2021/11/03 02:16 PM

6454

aportes en línea

Pl la Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$169,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$374,300
TOTAL				11	$6,921,800

2021/11/03 02:16 PM

6458

aportes en línea

Pl ila Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	25633695	9476656314	E	2021/11/03	2021/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$31,598,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																											
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																											
1	CC	1018[illegible]605	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEJO								X								230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
Total Afiliados(1)																											

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$106,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$61,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$61,000
TOTAL				1	$471,900

2021/11/03 02:15 PM

6459

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A CONSTRUIR S.A. identificado(a) con NI 890115406 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDUARDO ENRIQUE CEPEDA CAMACHO identificado(a) con CC 72127336

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										tde	ret	tdp	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	rl	vip			
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-10	30																		$17,400,000	12.5%	$2,175,000
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$17,400,000	16%	$2,784,000
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-09	30																		$17,400,000		$87,000
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-09	30																		$17,400,000		$226,200
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-09	30																		$0	0%	$0
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-09	30																		$0	0%	$0
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$17,400,000	6.96%	$1,211,100
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$17,400,000	4%	$696,000
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$17,400,000	2%	$348,000
9425498928	1153575879	E	2021-10-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$17,400,000	3%	$522,000

Este certificado se expide el día 2021-10-04 a las 04:47.

6960

aportes en línea

Pl la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	8	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cite 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1153575879	9425498918	E	2021/10/04	2021/10/04	BANCO DE OCCIDENTE		565,684,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																															
1	CC	43920830	ARIZA ROMERO ENAISA LOANA																			230201	30	EPS016	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
2	CC	1065996647	CALLINOO BARROS JOSE DAVID																			230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
Total			Afiliados(2)																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$348,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$348,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$200,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$200,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$80,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$120,000
TOTAL				2	$1,548,000

2021/10/04 04:20 PM

6949

aportes en línea

Pl lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	Cite 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1153614814	94254991 46	E	2021/10/04	2021/10/04	BANCO DE OCCIDENTE		$74,022,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	sl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (10 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																														
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)																														
1	CC	77090391	ARHUACO MENA CESAR AUGUSTO																		231001	30	EPS005	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
2	CC	77165729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
3	CC	1065591193	BRACHO VARGAS LORENA ROCIO																		25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
4	CC	1046813906	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA																		230301	30	EPS010	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
5	CC	85470281	ESCOBAR GARCIA EDUARDO RAFAEL								X										231001	30	EPS005	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
6	CC	19994764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN																		230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
7	CC	1003314861	MENDEZ ALTAMAR RONAL FELIPE	X							X										230301	16	EPS041	16	CCF15	16	14-11	16	16	SI
8	CC	49787228	PERALOZA TORRES AIDA LUZ								X										230301	30	EPS017	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
9	CC	1063971741	TORRES ALCINA LEINER RAFAEL								X										230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
10	CC	1512103 1	YANCE ARRIETA NESTOR MANUEL								X										25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
Total Afiliados(10)																														

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,325,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$746,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$546,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,861,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$171,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,418,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,418,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$815,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$815,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$815,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$40,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$77,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$28,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$134,800

6962

aportes en línea

Pl lla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$358,700
TOTAL				10	$6,373,800

2021/10/04 04:40 PM

6463

aportes en línea

Pl lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1153588641	9425499001	E	2021/10/04	2021/10/04	BANCO DE OCCIDENTE		$32,948,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1018344605	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEX																	230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
Total Afiliados(1)																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000
TOTAL				1	$464,400

2021/10/04 04:23 PM

6464

aportes en línea

Resumen neral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVK CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CLL 54 32 12	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1171680423	94235572597	E	2021/10/19	2021/10/20	BANCO POPULAR		$14,083,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (75 Afiliados)						$42,276,765	$6,768,000			$42,276,765	$1,696,000			$40,913,972	$1,641,000			$42,276,765	$2,852,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO B (75 Afiliados)						$42,276,765	$6,768,000			$42,276,765	$1,696,000			$40,913,972	$1,641,000			$42,276,765	$2,852,200		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (75 Afiliados)						$42,276,765	$6,768,000			$42,276,765	$1,696,000			$40,913,972	$1,641,000			$42,276,765	$2,852,200		$0	$0
1	CC	1065675357	AMAYA ANGEL	230301	28	$847,958	$135,700	EPS002	28	$847,958	$34,000	CCF15	28	$847,958	$34,000	14-7	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0
1	CC	1065675357	AMAYA ANGEL	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
3	CC	7143920	ARAUJO ARAMIS	05-14	3	$90,853	$14,600	ESSC07	3	$90,853	$3,700	CCF15	3	$90,853	$3,700	14-7	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
4	CC	1065820333	ARIAS YISETH	230301	20	$605,684	$97,000	EPS005	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
5	CC	73541387	BALLESTEROS JOHAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1063954482	BARROS LUIS	230301	29	$878,242	$140,600	ESSC24	29	$878,242	$35,200	CCF15	29	$878,242	$35,200	14-7	29	$878,242	$61,200	29	$0	$0
7	CC	1063954482	BARROS LUIS	230301	1	$30,285	$4,900	ESSC24	1	$30,285	$1,300	CCF15	0	$0	$0	14-7	1	$30,285	$0	0	$0	$0
8	CC	1003331075	BELEÑO LUIS	231001	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	1121044069	BERRIO YOOLDIR	230301	23	$696,537	$111,500	EPS041	23	$696,537	$27,900	CCF15	23	$696,537	$27,900	14-7	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0
10	CC	9097121	BETANCUR VALENTIN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	1004372596	BOLAÑO JOSE	230301	25	$757,105	$121,200	EPS002	25	$757,105	$30,300	CCF15	25	$757,105	$30,300	14-7	25	$757,105	$52,700	25	$0	$0
12	CC	7629630	CAMARGO RAUL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	1124012639	CARDENAS LUIS	230301	9	$272,558	$43,700	EPS002	9	$272,558	$10,000	CCF15	9	$272,558	$11,000	14-7	9	$272,558	$19,000	9	$0	$0
14	CC	80105069	CASADIEGO NELSON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	1126124102	CHICA LUIS	230301	18	$545,116	$87,300	EPS005	18	$545,116	$21,900	CCF15	18	$545,116	$21,900	14-7	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0
16	CC	9003132923	CONTRERAS DEIVER	05-14	4	$121,137	$19,400	EPS017	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
17	CC	12285949	COTACIO WILLIAM	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
18	CC	1044553544	CUESTA HOLBER	230301	18	$545,116	$87,300	EPS017	18	$545,116	$21,900	CCF15	18	$545,116	$21,900	14-7	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0
19	CC	1003202845	DE AGUAS JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
20	CC	12694869	DIAZ EDINSON	230301	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0
21	CC	1124016753	FERNANDEZ JONATHAN	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
22	CC	1065630648	FLOREZ EDUARDO	230301	4	$121,137	$19,400	EPS017	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
23	CC	1003241879	FLOREZ JEFFREY	230301	4	$121,137	$19,400	EPS002	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
24	CC	85464874	FONSECA OSCAR	230301	7	$211,990	$34,000	EPS017	7	$211,990	$8,500	CCF15	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
25	CC	77092349	GAMEZ LUIS	230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF15	3	$90,853	$3,700	14-7	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
26	CC	77033484	GARCIA ABNAMEL	230301	27	$817,674	$130,900	EPS002	27	$817,674	$32,800	CCF15	27	$817,674	$32,800	14-7	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
27	CC	1143397533	GARCIA MIGUEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
28	CC	1065645870	GOMEZ JULIO	230301	17	$514,832	$82,400	EPS002	17	$514,832	$20,600	CCF15	17	$514,832	$20,600	14-7	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0
29	CC	1065645870	GOMEZ JULIO	230301	13	$393,695	$63,000	EPS002	13	$393,695	$15,800	CCF15	0	$0	$0	14-7	13	$393,695	$0	0	$0	$0
30	CC	1065561382	GONZALEZ HOLMER	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF15	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
31	CC	19706551	GUERRA EVER	05-14	16	$484,548	$77,600	EPS037	16	$484,548	$19,400	CCF15	16	$484,548	$19,400	14-7	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
32	CC	19706551	GUERRA EVER	05-14	2	$60,569	$9,700	EPS037	2	$60,569	$2,500	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
33	CC	12021919	LAGAREJO JOSE	230301	20	$605,684	$97,000	EPS037	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
34	CC	77174068	LARA HENRRY	230301	4	$121,137	$19,400	EPS037	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
35	CC	1065572967	LOPEZ ALBEIRO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
36	CC	19938266	MADRID YEFERSON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
37	CC	1621338097	NARRINGA EDIER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

6965

aportes en línea

Resumen neral de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC 1046271807	MARTINEZ BORMEL	230301	9	$272,558	$43,700	ESSC07	9	$272,558	$11,000	CCF15	9	$272,558	$11,000	14-7	9	$272,558	$19,000	9	$0	$0
39	CC 1002354129	MARTINEZ ELKIN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
40	CC 85440323	MARTINEZ TOMAS	230301	3	$90,853	$14,600	ESSC07	3	$90,853	$3,700	CCF15	3	$90,853	$3,700	14-7	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
41	CC 8485331	MEJIA CARLOS	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
42	CC 5165243	MENDOZA YESMAN	230201	15	$454,263	$72,700	EPS002	15	$454,263	$18,200	CCF15	15	$454,263	$18,200	14-7	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0
43	CC 1063968793	MOLINA JEINER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
44	CC 1003115824	MOLINA WILFRIDO	230301	13	$393,695	$63,000	EPS002	13	$393,695	$15,800	CCF15	13	$393,695	$15,800	14-7	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
45	CC 1124505230	MONTIEL PABLO	230201	20	$605,684	$97,200	EPS017	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
46	CC 1050953701	MONTOYA YERSON	230301	3	$90,853	$14,600	ESSCA2	3	$90,853	$3,700	CCF15	3	$90,853	$3,700	14-7	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
47	CC 1143436176	MORALES KEZIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
48	CC 1065632464	MORALES REINALDO	25-14	23	$696,537	$111,900	ESSC24	23	$696,537	$27,900	CCF15	23	$696,537	$27,900	14-7	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0
49	CC 1065632464	MORALES REINALDO	25-14	2	$60,569	$9,700	ESSC24	2	$60,569	$2,500	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
50	CC 1065986621	MOYA RICARDO	230301	8	$242,274	$38,800	EPS002	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
51	CC 1095099044	NAVARRO ANDER	230201	11	$333,127	$53,400	EPS002	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
52	CC 1065593974	NEGRETE ALEXANDER	230301	4	$121,137	$19,400	CCFC55	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
53	CC 1149201887	NOGUERA EDUARDO	231001	4	$121,137	$19,400	EPS017	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
54	CC 12693763	NOYDA ARSENIO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
55	CC 1003338779	OÑATE EVALDO	230201	20	$605,684	$97,000	EPS002	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
56	CC 1065078262	ORTIZ WILLINGTON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
57	CC 1065641212	OSPINO ANDRES	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
58	CC 1065661875	OVIEDO JESUS	231001	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF15	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
59	CC 1088427088	PACHECO FARID	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
60	CC 85484564	PATERNINA MANUEL	230301	18	$545,116	$87,300	EPS037	18	$545,116	$21,900	CCF15	18	$545,116	$21,900	14-7	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0
61	CC 85440567	PUERTA ERIC	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
62	CC 17948356	PUSHAINA JOSE	230301	4	$121,137	$19,400	EPS017	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
63	CC 1065612484	QUESADA AYAN	230301	25	$757,105	$121,200	EPS002	25	$757,105	$30,300	CCF15	25	$757,105	$30,300	14-7	25	$757,105	$53,700	25	$0	$0
64	CC 1065648367	QUINTERO XAVIER	230301	4	$121,137	$19,400	EPS037	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
65	CC 1065123681	RAMBAL LUIS	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
66	CC 19708936	RAMOS DEIBIS	231001	11	$333,127	$53,400	CCFC55	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
67	CC 9069634890	RODRIGUEZ JOSE	230301	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
68	CC 9069634890	RODRIGUEZ JOSE	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
69	CC 9069856645	RODRIGUEZ PABLO	230301	9	$272,558	$43,700	EPS017	9	$272,558	$11,000	CCF15	9	$272,558	$11,000	14-7	9	$272,558	$19,000	9	$0	$0
70	CC 1002412771	ROJAS JOBANY	230301	13	$393,695	$63,000	EPS017	13	$393,695	$15,800	CCF15	13	$393,695	$15,800	14-7	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
71	CC 77094262	ROMERO JHONNYS	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
72	CC 19935180	SALVARTIN PEDRO	230309	19	$333,127	$53,400	EPS037	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
73	CC 1010051213	SANTAMARIA BORIS	230309	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
74	CC 15172407	SIERRA CARLOS	230309	18	$545,116	$87,300	EPS037	18	$545,116	$21,900	CCF15	18	$545,116	$21,900	14-7	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0
75	CC 15174874	SOTO GUALBER	230309	2	$60,569	$9,700	EPS017	2	$60,569	$2,500	CCF15	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
76	CC 1233338434	SOTO JOSE	230309	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
77	CC 1065133460	TORRES OMAR	230309	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
78	CC 1065662463	VENERA XAVIER	230309	15	$454,263	$72,700	EPS037	15	$454,263	$18,200	CCF15	15	$454,263	$18,200	14-7	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0
79	CC 77093227	VILLA JAIDER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
80	CC 1007443554	VILLANUEVA JHOAN	230309	3	$90,853	$14,600	EPS041	3	$90,853	$3,700	CCF15	3	$90,853	$3,700	14-7	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
81	CC 85485631	ZURITA YERSON	230309	7	$211,990	$34,000	EPS002	7	$211,990	$8,900	CCF15	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
82	CC 85485631	ZURITA YERSON	230309	23	$696,537	$111,900	EPS002	23	$696,537	$27,900	CCF15	0	$0	$0	14-7	23	$696,537	$0	0	$0	$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMBARRANQUILLA (4 Afiliados)					$3,634,104	$581,600			$3,634,104	$145,600			$3,634,104	$145,600			$3,634,104	$253,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)					$3,634,104	$581,600			$3,634,104	$145,600			$3,634,104	$145,600			$3,634,104	$253,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen general de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$3,634,104	$581,600			$3,634,104	$145,600			$3,634,104	$145,600			$3,634,104	$253,200		$0	$0
83	CC	72210593	CABALLERO JORGE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCFD6	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
84	CC	72163267	MORALES EDGARD	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCFD6	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
85	CC	1007451199	MORALES REGGIE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCFD6	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
86	CC	1143465288	MORALES VERUSCA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCFD6	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total Afiliados(79)						$45,910,869	$7,349,600			$45,910,869	$1,841,600			$44,548,076	$1,786,600			$45,910,869	$3,105,400		$0	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A CONSTRUIR S.A. identificado(a) con NI 890115406 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDUARDO ENRIQUE CEPEDA CAMACHO identificado(a) con CC 72127336

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlr			
9424216631	24473579	E	2021-09-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$17,400,000	12.5%	$2,175,000
9424216631	24473579	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$17,400,000	16%	$2,784,000
9424216631	24473579	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																		$17,400,000		$87,000
9424216631	24473579	E	2021-09-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																		$17,400,000		$226,200
9424216631	24473579	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424216631	24473579	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424216631	24473579	E	2021-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$17,400,000	6.96%	$1,211,100
9424216631	24473579	E	2021-09-02	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$17,400,000	4%	$696,000
9424216631	24473579	E	2021-09-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$17,400,000	2%	$348,000
9424216631	24473579	E	2021-09-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$17,400,000	3%	$522,000

Este certificado se expide el día 2021-09-24 a las 11:30.

6469

aportes en línea

Pl lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
A Periodo		Clave		Tipo	Fecha		T Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	24473579	9424216631	E	2021/09/02	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA		$66,864,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre		Ingreso	Retiro	Traslado	Lic/Inap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac-LR	Avp	Vct	Irl	Vsc	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																												
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																												
1	CC	43970830	ARIZA ROMERO DIANA LOANA																230201	30	EPS016	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
2	CC	1065996647	CALIMDO BARRIOS JOSE DAVID	X															230301	11	CCFC55	11	CCF15	11	14-11	11	11	SI
Total		Afiliados(2)																										

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$597,400
PORVENIR	230301	800,224,808	6	1	$117,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$259,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$259,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$149,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$149,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$149,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$29,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$120,000
TOTAL				2	$1,156,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/09/02 10:45 AM

aportes en línea

Pl lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1115774516	9424224767	E	2021/09/02	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA		$74,336,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (10 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)																															
1	CC	77090391	AHUMADA MENA CESAR AUGUSTO	X																		23-1004	14	EPS005	14	CCF15	14	14-11	14	14	SI
2	CC	77185729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING																			23-1001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
3	CC	1065591193	BRACHO VARGAS LORENA ROCIO	X																		25-14	22	EPS037	22	CCF15	22	14-11	22	22	SI
4	CC	1045813908	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA																			23-1003	30	EPS010	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
5	CC	85470281	ESCOBAR GARCIA EDUARDO RAFAEL	X																		23-1001	7	EPS005	7	CCF15	7	14-11	7	7	SI
6	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN																			23-1003	30	EPS010	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
7	CC	1003314861	MENDEZ ALTAMAR RONAL FELIPE	X																		23-1003	14	EPS041	14	CCF15	14	14-11	14	14	SI
8	CC	49787228	PERALOZA TORRES ADA LUZ																			23-1003	30	EPS017	30	CCF15	30	14-11	30	30	SI
9	CC	1063971741	TORRES ALCINA REINER RAFAEL															X				23-1002	1	EPS002	1	CCF15	1	14-11	1	1	SI
10	CC	1063971741	TORRES ALCINA REINER RAFAEL															X				23-1002	2	EPS002	2	CCF15	2	14-11	2	2	SI
11	CC	1063971741	TORRES ALCINA REINER RAFAEL	X																		23-1002	19	EPS002	19	CCF15	19	14-11	19	19	SI
12	CC	15171031	YANCE ARRIETA NESTOR MANUEL	X																		25-14	14	CCFC55	14	CCF15	14	14-11	14	14	SI
Total		Afiliados(10)																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,719,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$508,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$351,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,751,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$109,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,147,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,147,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$659,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$659,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$663,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$17,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$344,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,400

2021/09/02 10:42 AM

6471

aportes en línea

Pl lla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$17,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$119,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$35,100
TOTAL				10	$5,191,000

2021/09/02 10:42 AM

6472

aportes en línea

Pl lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	24473579	9424217396	E	2021/09/02	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA		$31,671,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																												
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																												
1	CC	1018344605	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEX	X																230301	11	EPS037	11	CCF15	11	14-11	11	11	SI
Total Afiliados(1)																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$88,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$88,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$38,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$22,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$22,000
TOTAL				1	$170,300

2021/09/02 10:44 AM

3+69

aportes en línea

Resumen neral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVX CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFACESAR	CLL 54 32 22	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1134549619	94246716 15	E	2021/09/16	2021/09/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$8,167,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONFACESAR (58 Afiliados)					$22,107,490	$3,540,400			$22,107,490	$887,000			$21,804,646	$874,700			$22,107,490	$1,520,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (58 Afiliados)					$22,107,490	$3,540,400			$22,107,490	$887,000			$21,804,646	$874,700			$22,107,490	$1,520,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (58 Afiliados)					$22,107,490	$3,540,400			$22,107,490	$887,000			$21,804,646	$874,700			$22,107,490	$1,520,500		$0	$0
1	CC	1065675357	AMAYA ANGEL	230301	7	$211,990	$34,000	EPS002	7	$211,990	$8,500	CCF15	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$44,800	7	$0	$0
2	CC	1065830333	ARIAS YISETH	230301	1	$30,285	$4,900	EPS005	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
3	CC	73541387	BALLESTEROS JOHAN	230301	11	$333,127	$53,400	EPS017	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
4	CC	1063954482	BARRIOS LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$65,300	30	$0	$0
5	CC	9003231075	BELEÑO LUIS	231001	8	$242,274	$38,800	EPS037	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
6	CC	1121044069	BERRIO YOOLDIR	230301	8	$242,274	$38,800	EPS041	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
7	CC	5097121	BETANCUR VALENTIN	230301	6	$181,706	$29,100	EPS037	6	$181,706	$7,300	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0
8	CC	9065570107	CADENA RAFAEL	230301	2	$60,569	$9,700	CCFC55	2	$60,569	$2,500	CCF15	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
9	CC	7629630	CAMARGO RAUL	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
10	CC	80105069	CASADIEGO NELSON	230301	8	$242,274	$38,800	EPS002	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
11	CC	9003702645	DE AGUAS JOSE	230301	13	$393,695	$63,000	EPS041	13	$393,695	$15,800	CCF15	13	$393,695	$15,800	14-7	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
12	CC	1192736899	DE LA CRUZ JAIR	230301	20	$605,684	$97,000	EPS002	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
13	CC	1192736896	DE LA CRUZ YEN	230301	20	$605,684	$97,000	EPS002	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
14	CC	9007574037	ESCORCIA RICARDO	230301	12	$363,411	$58,200	EPS017	12	$363,411	$14,600	CCF15	12	$363,411	$14,600	14-7	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
15	CC	1124016753	FERNANDEZ JOHATHAN	231001	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
16	CC	85454874	FONSECA OSCAR	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
17	CC	77033484	GARCIA ABIMAMEL	230301	10	$302,842	$48,500	EPS002	10	$302,842	$12,200	CCF15	10	$302,842	$12,200	14-7	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0
18	CC	1143397533	GARCIA MIGUEL	230201	14	$423,979	$67,900	EPS017	14	$423,979	$17,000	CCF15	14	$423,979	$17,000	14-7	14	$423,979	$29,600	14	$0	$0
19	CC	77176216	GELVIS ADALBERTO	230201	4	$121,137	$19,400	EPS037	4	$121,137	$4,900	CCF15	4	$121,137	$4,900	14-7	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0
20	CC	1065643893	GELVIS KRUGER	230301	7	$211,990	$34,000	EPS037	7	$211,990	$8,500	CCF15	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$211,990	$44,800	7	$0	$0
21	CC	1065645470	GOMEZ JULIO	230201	14	$423,979	$67,900	ESSC24	14	$423,979	$17,000	CCF15	14	$423,979	$17,000	14-7	14	$423,979	$29,600	14	$0	$0
22	CC	1065836420	GONZALEZ ANGEL	230301	14	$423,979	$67,900	EPS017	14	$423,979	$17,000	CCF15	14	$423,979	$17,000	14-7	14	$423,979	$29,600	14	$0	$0
23	CC	1065583182	GONZALEZ HOLMER	230201	8	$242,274	$38,800	ESSC24	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
24	CC	19706551	GUERRA EVER	15-14	20	$605,684	$97,000	EPS037	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
25	CC	19706551	GUERRA EVER	15-14	2	$60,569	$9,700	EPS037	2	$60,569	$2,500	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
26	CC	1120748508	HERNANDEZ EDUYAR	230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF15	3	$90,853	$3,700	14-7	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0
27	CC	12021919	LAGAREJO JOSE	230301	8	$242,274	$38,800	EPS037	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
28	CC	1065572967	LOPEZ ALBEIRO	230301	11	$333,127	$53,400	ESSC24	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
29	CC	7574907	LOPEZ WILMAN	230201	12	$363,411	$58,200	CCFC55	12	$363,411	$14,600	CCF15	12	$363,411	$14,600	14-7	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
30	CC	18938266	MADRID YEFERSON	230301	6	$181,706	$29,100	EPS005	6	$181,706	$7,300	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0
31	CC	79875098	MARCELO RAUL	230301	22	$666,253	$106,700	EPS002	22	$666,253	$26,700	CCF15	22	$666,253	$26,700	14-7	22	$666,253	$46,400	22	$0	$0
32	CC	1121038097	MARRIAGA EDIER	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
33	CC	77176776	MARRUGO LUIS	230301	6	$181,706	$29,100	CCFC55	6	$181,706	$7,300	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0
34	CC	9002384129	MARTINEZ ELKIN	230301	14	$423,979	$67,900	ESSC07	14	$423,979	$17,000	CCF15	14	$423,979	$17,000	14-7	14	$423,979	$29,600	14	$0	$0
35	CC	8485331	MEJIA CARLOS	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
36	CC	1063968793	MOLINA JEINER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
37	CC	1124505320	MONTIEL PABLO	230201	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0

2021/09/17 03:48 PM

64 47

aportes en línea

Resumen neral de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
38	CC	1143436176	MORALES KEZIA	230301	8	$242,274	$38,800	EPS002	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
39	CC	12693761	NOVOA ARSENIO	230301	22	$666,253	$106,700	ESSC07	22	$666,253	$26,700	CCF15	22	$666,253	$26,700	14-7	22	$666,253	$46,400	22	$0	$0
40	CC	1003236779	ORATE EMALDO	230201	8	$242,274	$38,800	ESSC24	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
41	CC	1085096262	ORTIZ WALLINGTON	230301	8	$242,274	$38,800	EPS002	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
42	CC	1065644102	OSPINO ANDRES	25-14	11	$333,127	$53,400	EPSIC1	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
43	CC	1080429088	PACHECO FARID	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
44	CC	1123994909	PALACIOS GUSTAVO	230301	10	$302,842	$48,500	EPS037	10	$302,842	$12,200	CCF15	10	$302,842	$12,200	14-7	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0
45	CC	85484264	PATERNINA MANUEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
46	CC	77183530	PONCE KILIAN	230301	16	$484,548	$77,600	CCFC55	16	$484,548	$19,400	CCF15	16	$484,548	$19,400	14-7	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0
47	CC	85440567	PUERTA ERIC	230301	6	$181,706	$29,100	CCFC55	6	$181,706	$7,300	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0
48	CC	1065610546	RAMBAL ALVARO	230301	11	$333,127	$53,400	EPS002	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-7	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
49	CC	1065123681	RAMBAL LUIS	230201	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
50	CC	19708936	RAMOS DEIBIS	231001	14	$423,979	$67,900	CCFC55	14	$423,979	$17,000	CCF15	14	$423,979	$17,000	14-7	14	$423,979	$29,600	14	$0	$0
51	CC	1065826688	REYES LUIS	230301	9	$272,558	$43,700	ESSC24	9	$272,558	$11,000	CCF15	9	$272,558	$11,000	14-7	9	$272,558	$19,000	9	$0	$0
52	CC	1065654590	RODRIGUEZ JOSE	230301	20	$605,684	$97,000	CCFC55	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
53	CC	1065654590	RODRIGUEZ JOSE	230301	2	$60,569	$9,700	CCFC55	2	$60,569	$2,500	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
54	CC	1032412771	ROJAS JOBANY	230301	14	$423,979	$67,900	EPS017	14	$423,979	$17,000	CCF15	14	$423,979	$17,000	14-7	14	$423,979	$29,600	14	$0	$0
55	CC	77094262	ROMERO JHONNYS	231001	6	$181,706	$29,100	EPS017	6	$181,706	$7,300	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$181,706	$12,700	6	$0	$0
56	CC	40100051231	SANTAMARIA BORIS	230301	8	$242,274	$38,800	EPS017	8	$242,274	$9,700	CCF15	8	$242,274	$9,700	14-7	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
57	CC	1195338434	SOTO JOSE	230301	5	$151,421	$24,300	EPS005	5	$151,421	$6,100	CCF15	5	$151,421	$6,100	14-7	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
58	CC	1065135460	TORRES OMAR	230301	20	$605,684	$97,000	EPS037	20	$605,684	$24,300	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$605,684	$42,200	20	$0	$0
59	CC	77093327	VILLA JAIDER	230301	22	$666,253	$106,700	EPS041	22	$666,253	$26,700	CCF15	22	$666,253	$26,700	14-7	22	$666,253	$46,400	22	$0	$0
60	CC	85485631	ZURITA YEISON	230301	15	$454,263	$72,700	EPS002	15	$454,263	$18,200	CCF15	15	$454,263	$18,200	14-7	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0
61	CC	85485631	ZURITA YEISON	230301	6	$181,706	$29,100	EPS002	6	$181,706	$7,300	CCF15	0	$0	$0	14-7	6	$181,706	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMBARRANQUILLA (7 Afiliados)						$4,360,927	$698,000			$4,360,927	$175,000			$4,300,358	$172,500			$4,360,927	$299,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)						$4,360,927	$698,000			$4,360,927	$175,000			$4,300,358	$172,500			$4,360,927	$299,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)						$4,360,927	$698,000			$4,360,927	$175,000			$4,300,358	$172,500			$4,360,927	$299,600		$0	$0
62	CC	72210591	CABALLERO JORGE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
63	CC	72163267	MORALES EDGARD	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
64	CC	1007451199	MORALES REGGIE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
65	CC	1143465288	MORALES VERUSKA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
66	CC	1047238887	PACHECO SADAIS	230301	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF06	1	$30,285	$1,300	14-7	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
67	CC	1048325487	VELASQUEZ ALEX	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF06	2	$60,569	$2,500	14-7	2	$60,569	$4,300	2	$0	$0
68	CC	1045325487	VELASQUEZ ALEX	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF06	0	$0	$0	14-7	2	$60,569	$0	0	$0	$0
69	CC	1140838491	VELASQUEZ LAGEYONYS	230301	19	$575,400	$92,100	EPS037	19	$575,400	$23,100	CCF06	19	$575,400	$23,680	14-7	19	$575,400	$40,100	19	$0	$0
Total			**Afiliados(65)**			$26,468,417	$4,238,400			$26,468,417	$1,062,000			$26,105,004	$1,047,200			$26,468,417	$1,820,300		$0	$0

694

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVK CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CLL 54 32 22	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1134549619	94246716 15	E	2021/09/16	2021/09/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$8,167,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$4,238,400	$0	$0	$4,238,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$174,600	$0	$0	$174,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$160,100	$0	$0	$160,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$3,283,100	$0	$0	$3,283,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$620,600	$0	$0	$620,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$1,820,300	$0	$0	$1,820,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	65	$1,820,300	$0	$0	$1,820,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				65	$1,047,200	$0	$0	$1,047,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$172,500	$0	$0	$172,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	58	$874,700	$0	$0	$874,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				65	$1,062,000	$0	$0	$1,062,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	7	$94,900	$0	$0	$94,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$60,800	$0	$0	$60,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$13,400	$0	$0	$13,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$263,400	$0	$0	$263,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$43,700	$0	$0	$43,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$162,900	$0	$0	$162,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$52,200	$0	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$356,000	$0	$0	$356,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$14,700	$0	$0	$14,700
TOTAL				65	$8,167,900	$0	$0	$8,167,900

2021/09/17 03:48 PM

6476

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	20210400022	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2020	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499184	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	830115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.658.919,11					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	20210500071	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901493870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
8/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

...al de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 20210400022 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...ncreto para losa maciza E=15cm	m3	78,26	$ 1.029.440,00	80.585.714,40	-	-		-	-	-	78,26	80.585.714,40	0%	100%
...ero Electrosoldado fy 60.000psi M-188	kg	2.954,00	$ 5.809,00	17.159.786,00	-	-		-	-	-	2.954,00	17.159.786,00	0%	100%
...aldeck 3" calibre 22	m2	705,00	$ 58.842,00	41.483.610,00	-	-		-	-	-	705,00	41.483.610,00	0%	100%
- 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE				-	-	-		-	-	-	-	-		
...ncreto para losa maciza E=15cm	m3	266,73	$ 1.029.440,00	274.615.801,20	-	-		-	-	-	266,73	274.615.801,20	0%	100%
...ero Electrosoldado fy 60.000psi M-188	kg	9.700,00	$ 5.809,00	56.362.154,00	-	-		-	-	-	9.700,00	56.362.154,00	0%	100%
...aldeck 3" calibre 22	m2	266,73	$ 58.842,00	15.694.926,66	-	-		-	-	-	266,73	15.694.926,66	0%	100%
ESTRUCTURA METALICA	0,00			$ 34.834.788.905,34	-	-		$ -	-	-	-	$ 34.834.788.905,34	0%	100%
...structura metalica (Inc. Pletinas, pernos y demas)	kg	2.736.124,00	$ 12.108,00	33.128.989.392,00	-	-		-	-	-	2.736.124,00	33.128.989.392,00	0%	100%
...atura Intermedia	m2	13.680,62	$ 123.857,00	1.695.808.613,34	-	-		-	-	-	13.680,62	1.695.808.613,34	0%	100%
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	und			$ 457.474.777,70	-	-		$ 15.808.859,45	-	$ 15.808.859,45	-	$ 671.343.878,82	4%	96%
...AS Y POZOS DE INSPECCION	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...A DE INSPECCIÓN	und	11,00	$ 715.121,00	7.866.331,00	-	-		-	-	-	11,00	7.866.331,00	0%	100%
...BERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	ml	527,81	$ 147.180,00	77.687.235,80	-	-		-	-	-	527,81	77.687.235,80	0%	100%
...BERIA PERFORADA PARA DRENAJE 8"	ml	81,29	$ 195.705,00	15.908.859,45	-	-	81,29	15.908.859,45	81,29	15.908.859,45	-	-	100%	0%
...NEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00	$ 1.331.346,00	1.331.346,00	-	-		-	-	-	1,00	1.331.346,00	0%	100%
...NEXIÓN A RED SANITARIA 10"	und	1,00	$ 1.207.553,00	1.207.553,00	-	-		-	-	-	1,00	1.207.553,00	0%	100%
...ANTE S AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...ANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 4"	ml	8,18	$ 56.270,00	460.286,60	-	-		-	-	-	8,18	460.286,60	0%	100%
...ANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 6"	ml	49,09	$ 116.129,00	5.705.308,71	-	-		-	-	-	49,09	5.705.308,71	0%	100%
...ANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4"	ml	570,52	$ 90.261,00	28.674.905,72	-	-		-	-	-	570,52	28.674.905,72	0%	100%
...ANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 6"	ml	120,38	$ 122.801,00	14.782.784,38	-	-		-	-	-	120,38	14.782.784,38	0%	100%
...LIDAS SANITARIAS	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...NTO DESAGUE PVC 2"	und	57,00	$ 69.600,00	5.185.200,00	-	-		-	-	-	57,00	5.185.200,00	0%	100%
...NTO DESAGUE PVC 3"	und	7,00	$ 84.478,00	591.346,00	-	-		-	-	-	7,00	591.346,00	0%	100%
...NTO DESAGUE PVC 4"	und	49,00	$ 111.697,00	5.357.136,00	-	-		-	-	-	49,00	5.357.136,00	0%	100%
...LVULA DE ADMISION DE AIRE	und	98,00	$ 325.815,00	31.929.478,00	-	-		-	-	-	98,00	31.929.478,00	0%	100%
RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...BERIA PVC-S 4" VENTILACION	ml	76,04	$ 58.618,00	4.480.124,72	-	-		-	-	-	76,04	4.480.124,72	0%	100%
...BERIA PVC-S 3"	ml	25,89	$ 68.066,00	1.761.943,85	-	-		-	-	-	25,89	1.761.943,85	0%	100%
...BERIA PVC-S 1 1/2"	ml	963,81	$ 23.665,00	13.272.129,45	-	-		-	-	-	560,64	13.272.129,45	0%	100%
...BERIA PVC-S 2"	ml	174,67	$ 41.066,00	7.176.267,85	-	-		-	-	-	174,67	7.176.267,85	0%	100%
...BERIA PVC-S 4"	ml	1.237,83	$ 60.210,00	74.529.744,30	-	-		-	-	-	1.237,83	74.529.744,30	0%	100%
...BERIA PVC-S 6"	ml	714,24	$ 99.472,00	71.046.881,28	-	-		-	-	-	714,24	71.046.881,28	0%	100%
...AGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" METALICO	und	25,00	$ 96.183,00	2.413.128,00	-	-		-	-	-	25,00	2.413.128,00	0%	100%
...NDEROS, REJILLAS Y TRAMPAS DE GRASAS	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...JILLA Aluminio 4 x 2"	und	35,00	33.463,00	1.171.205,00	-	-		-	-	-	35,00	1.171.205,00	0%	100%
...RGAMO CONCRETO 3.000 PSI	ml	11,08	269.845,00	2.991.001,59	-	-		-	-	-	11,08	2.991.001,59	0%	100%
...AMPA DE GRASAS	und	2,00	2.860.272,00	5.720.544,00	-	-		-	-	-	2,00	5.720.544,00	0%	100%
...UPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	und	1,00	24.962.197,00	24.962.197,00	-	-		-	-	-	1,00	24.962.197,00	0%	100%
...UPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE NIVEL FREATICO	und	1,00	31.258.782,00	31.258.782,00	-	-		-	-	-	1,00	31.258.782,00	0%	100%
...STALACIONES HIDRAULICAS	und			$ 251.591.545,93	-	-		$ -	-	$ -	-	$ 251.591.545,93	0%	100%
...STALACIÓN HIDRÁULICA	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...NEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 3"	und	1,00	442.813,00	442.813,00	-	-		-	-	-	1,00	442.813,00	0%	100%
...NEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 4"	und	2,00	490.043,00	980.086,00	-	-		-	-	-	2,00	980.086,00	0%	100%
...LVULA BOLA 3"	und	5,00	774.377,00	3.871.885,00	-	-		-	-	-	5,00	3.871.885,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIH - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.3499184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115466-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.668.949,13				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.845.300.585,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 8.940.853.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.845.300.585,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 8.940.853.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
10/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
VULA BOLA 4"	und	8,00	1.277.225,00	7.663.950,00	-	-	-	-	-	-	8,00	7.663.950,00	0%	100%
VULA COMPUERTA ELASTICA 3"	und	8,00	1.156.878,00	4.627.504,00	-	-	-	-	-	-	4,00	4.627.504,00	0%	100%
VULA COMPUERTA ELASTICA 3 1/2"	und	5,00	620.368,00	3.101.840,00	-	-	-	-	-	-	5,00	3.101.840,00	0%	100%
VULA COMPUERTA ELASTICA 1"	und	6,00	330.195,00	1.981.170,00	-	-	-	-	-	-	6,00	1.981.170,00	0%	100%
VULA CHECK 3"	und	9,00	1.267.609,00	11.408.481,00	-	-	-	-	-	-	9,00	11.408.481,00	0%	100%
VULA CHECK 1"	und	3,00	149.999,00	449.997,00	-	-	-	-	-	-	3,00	449.997,00	0%	100%
UPO DE PRESION PARA AGUA POTABLE 180GPM, 62 m.c.a.	und	1,00	58.758.659,00	58.758.659,00	-	-	-	-	-	-	1,00	58.758.659,00	0%	100%
NEXIÓN A TANQUE EN 1 1/2". INCLUYE FLOTADORA 1.1/2"	und	1,00	1.395.089,00	1.395.089,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.395.089,00	0%	100%
NJUNTO DE VACIADO DE DEPOSITOS DE AGUA	und	1,00	4.479.116,00	4.479.116,00	-	-	-	-	-	-	1,00	4.479.116,00	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 9 1/2"	ml	154,23	15.354,00	2.368.047,42	-	-	-	-	-	-	154,23	2.368.047,42	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 21 1"	ml	579,36	20.397,00	11.817.205,92	-	-	-	-	-	-	579,36	11.817.205,92	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 21 1 1/2"	ml	294,47	44.173,00	12.567.031,19	-	-	-	-	-	-	294,47	12.567.031,19	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 21 2"	ml	126,27	60.305,00	7.735.322,35	-	-	-	-	-	-	126,27	7.735.322,35	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 21 2 1/2"	ml	37,00	79.803,00	2.952.711,00	-	-	-	-	-	-	37,00	2.952.711,00	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 21 3"	ml	18,27	94.415,00	1.724.982,05	-	-	-	-	-	-	18,27	1.724.982,05	0%	100%
ERIA PVC-P RDE 21 4"	ml	282,00	155.336,00	43.804.752,00	-	-	-	-	-	-	282,00	43.804.752,00	0%	100%
GISTRO Red White o Similar 1/2"	und	3,00	96.180,00	288.540,00	-	-	-	-	-	-	3,00	288.540,00	0%	100%
GISTRO Red White o Similar 1"	und	10,00	134.580,00	1.345.800,00	-	-	-	-	-	-	10,00	1.345.800,00	0%	100%
GISTRO Red White o Similar 1 1/2"	und	16,00	230.889,00	3.694.224,00	-	-	-	-	-	-	16,00	3.694.224,00	0%	100%
GISTRO Red White o Similar 2"	und	2,00	371.276,00	742.552,00	-	-	-	-	-	-	2,00	742.552,00	0%	100%
TO AGUA FRIA 1/2"	und	61,00	31.274,00	1.907.714,00	-	-	-	-	-	-	61,00	1.907.714,00	0%	100%
TO AGUA FRIA 1"	und	58,00	39.994,00	2.319.652,00	-	-	-	-	-	-	58,00	2.319.652,00	0%	100%
MITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RA ACCEDER AL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y IDUALES DEL PROYECTO	und	1,00	15.225.145,00	15.225.145,00	-	-	-	-	-	-	1,00	15.225.145,00	0%	100%
IDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IDOR AGUA 2"	und	1,00	4.048.311,00	4.048.311,00	-	-	-	-	-	-	1,00	4.048.311,00	0%	100%
IDOR AGUA 1 1/2"	und	1,00	549.566,00	549.566,00	-	-	-	-	-	-	1,00	549.566,00	0%	100%
IDOR AGUA 1"	und	3,00	434.770,00	1.304.310,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.304.310,00	0%	100%
ITARIOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITARIO CON FLUXOMETRO	und	37,00	1.720.715,00	63.666.455,00	-	-	-	-	-	-	37,00	63.666.455,00	0%	100%
ITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO. INCLUYE BARRAS DE URIDAD EN U	und	11,00	2.250.863,00	24.760.593,00	-	-	-	-	-	-	11,00	24.760.593,00	0%	100%
NALES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AL CON FLUXOMETRO	und	10,00	1.804.826,00	18.048.260,00	-	-	-	-	-	-	10,00	18.048.260,00	0%	100%
AMANOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AMANOS SOBREPONER	und	36,00	312.260,00	11.241.360,00	-	-	-	-	-	-	36,00	11.241.360,00	0%	100%
AMANOS DE COLGAR FREE	und	11,00	530.787,00	5.838.657,00	-	-	-	-	-	-	11,00	5.838.657,00	0%	100%
ERIA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	800115406-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.665.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.893.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.893.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

l de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y PÉROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
FERIA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	und	47,00	277.905,00	13.064.235,00	-	-		-	-	-	47,00	13.064.235,00	0%	100%
ADERO PREFABRICADO DE 60x60x30cm EN ACRILICO	und	4,00	538.692,00	2.154.768,00	-	-		-	-	-	4,00	2.154.768,00	0%	100%
FERIA DUCHA BALANCE DE PRESIÓN	und	7,00	180.166,00	1.261.162,00	-	-		-	-	-	7,00	1.261.162,00	0%	100%
DE GAS	gbal			$ 19.014.790,80	-	-		$ -	-	$ -	-	$ 19.014.790,80	0%	100%
DE GAS	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
METIDA DE GAS	und	1,00	1.460.077,00	1.460.077,00	-	-		-	-	-	1,00	1.460.077,00	0%	100%
ERÍA 3/4" PE 80 RDE 11 PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS	ml	26,98	17.220,00	464.595,60	-	-		-	-	-	26,98	464.595,60	0%	100%
NTADOR PARA GAS DE MEMBRANA	und	2,00	1.345.355,00	2.690.710,00	-	-		-	-	-	2,00	2.690.710,00	0%	100%
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 3/4"	und	276,55	23.644,00	6.538.748,20	-	-		-	-	-	276,55	6.538.748,20	0%	100%
VULA TIPO BOLA	und	2,00	53.656,00	107.312,00	-	-		-	-	-	2,00	107.312,00	0%	100%
ACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	und	2,00	3.071.116,00	6.142.232,00	-	-		-	-	-	2,00	6.142.232,00	0%	100%
MITE ANTE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA CEDER AL SERVICIO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUERIDA, ETC.	und	1,00	811.116,00	811.116,00	-	-		-	-	-	1,00	811.116,00	0%	100%
OTECCION CONTRA INCENDIOS	und			$ 1.221.094.605,79	-	-		$ -	-	$ -	-	$ 1.221.094.605,79	0%	100%
NICIÓN	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
MPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS S/NFPA20	und	1,00	548.543.324,00	548.543.324,00	-	-		-	-	-	1,00	548.543.324,00	0%	100%
EXION SIAMESA PARA BOMBEROS CUERPO 4"	und	3,00	3.129.805,00	9.389.415,00	-	-		-	-	-	3,00	9.389.415,00	0%	100%
OMETRO DE 0 A 200 PSI	und	8,00	57.963,00	463.704,00	-	-		-	-	-	8,00	463.704,00	0%	100%
DOR DE CAUDAL	und	1,00	5.193.067,00	5.193.067,00	-	-		-	-	-	1,00	5.193.067,00	0%	100%
ERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLUMNA 6" LUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	435,21	254.650,00	111.609.019,53	-	-		-	-	-	435,21	111.609.019,53	0%	100%
ERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLUMNA 4" LUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	9,58	210.599,00	2.017.155,22	-	-		-	-	-	9,58	2.017.155,22	0%	100%
ERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLUMNA 3"	ml	127,68	126.098,00	16.099.937,28	-	-		-	-	-	127,68	16.099.937,28	0%	100%
ERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLUMNA 2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	336,85	101.568,00	34.423.060,80	-	-		-	-	-	336,85	34.423.060,80	0%	100%
ERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLUMNA 1 INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.887,18	59.097,00	111.885.240,66	-	-		-	-	-	1.887,18	111.885.240,66	0%	100%
ERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLUMNA 1" LUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.227,05	50.256,00	61.665.272,30	-	-		-	-	-	1.227,05	61.665.272,30	0%	100%
VULA MARIPOSA 4 1/2" TIPO TTV	und	4,00	479.799,00	1.919.196,00	-	-		-	-	-	4,00	1.919.196,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	20210040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2495184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.065.845,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4217	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4217	$ 8.940.863.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	20210500007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4217	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4217	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901410970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 8.940.863.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 — HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y EROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 20210040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
CRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
VULA MARIPOSA 6" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	5,00	1.889.087,00	9.445.435,00	-	-	-	-	-	-	5,00	9.445.435,00	0%	100%
VULA MARIPOSA 8" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	1,00	3.099.984,00	3.099.984,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.099.984,00	0%	100%
VULA SUPERVISADA OS&Y 6"	und	1,00	2.180.640,00	2.180.640,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.180.640,00	0%	100%
VULA SUPERVISADA OS&Y 8"	und	1,00	3.154.180,00	3.154.180,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.154.180,00	0%	100%
DA 4"	und	4,00	237.022,00	948.088,00	-	-	-	-	-	-	4,00	948.088,00	0%	100%
DA 6"	und	12,00	355.533,00	4.266.396,00	-	-	-	-	-	-	12,00	4.266.396,00	0%	100%
DA 8"	und	6,00	544.730,00	3.268.380,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3.268.380,00	0%	100%
TIHA ANTIVORTICE O VORTEX DE 6" - EQUIPO NTRAINCENDIOS	und	1,00	1.881.015,00	1.881.015,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.881.015,00	0%	100%
VULA CHECK 1 1/2"	und	1,00	693.923,00	693.923,00	-	-	-	-	-	-	1,00	693.923,00	0%	100%
VULA SEGURIDAD 1 1/2"	und	2,00	618.134,00	1.236.268,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.236.268,00	0%	100%
CIADOR COLGANTE INCLUYE ESCUDO	und	511,00	92.683,00	47.361.013,00	-	-	-	-	-	-	511,00	47.361.013,00	0%	100%
CIADOR MONTANTE	und	558,00	78.153,00	43.609.374,00	-	-	-	-	-	-	558,00	43.609.374,00	0%	100%
NEXION PARA ROCIADORES	und	1.088,00	40.806,00	43.621.614,00	-	-	-	-	-	-	1.088,00	43.621.614,00	0%	100%
STO DE CONTROL DE 6"	und	4,00	6.524.185,00	26.096.740,00	-	-	-	-	-	-	4,00	26.096.740,00	0%	100%
STO DE CONTROL DE 3"	und	11,00	2.357.982,00	25.932.802,00	-	-	-	-	-	-	11,00	25.932.802,00	0%	100%
TO DE PRUEBA/LIMPIEZA 1", ORIFICIO 1/2",	und	11,00	933.975,00	10.273.725,00	-	-	-	-	-	-	11,00	10.273.725,00	0%	100%
RANTE CROMADO 4" EXTREMO LISO	und	2,00	6.034.112,00	12.068.224,00	-	-	-	-	-	-	2,00	12.068.224,00	0%	100%
INETES CONTRAINCENDIO Y EXTINTORES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INETE CONTRAINCENDIO CLASE III	und	16,00	1.920.241,00	30.723.856,00	-	-	-	-	-	-	16,00	30.723.856,00	0%	100%
NTOR DE POLVO QUIMICO ABC	und	109,00	272.327,00	29.683.643,00	-	-	-	-	-	-	109,00	29.683.643,00	0%	100%
NTOR DE CO2	und	7,00	648.782,00	4.541.474,00	-	-	-	-	-	-	7,00	4.541.474,00	0%	100%
NEXION PARA BOMBEROS 2 1/2", EN ESCALERAS	und	13,00	1.227.108,00	15.952.404,00	-	-	-	-	-	-	13,00	15.952.404,00	0%	100%
TEMAS DE COMUNICACIONES	0,00			2.930.192.260,00	-	-	-	-	-	-	-	2.930.192.260,00	0%	100%
TEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ministro e Instalación de Panel de detección de incendios direccionable, z de soportar mínimo 4 lazos y 4 circuitos de notificación. Certificación UL 9 edición. Debe permitir secuencia de alarma positiva. Incluye marcación nto de identificación, todas las tarjetas, conectores, cables y todos los nentos necesarios para conectar 4 lazos, 5 anunciadores remotos y ción en red. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según PA72.	un	1,00	13.658.899,00	13.658.899,00	-	-	-	-	-	-	1,00	13.658.899,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIT - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2493184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.888.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.635,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.941.883.445,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.635,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERVIASEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.656.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.941.883.445,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, las señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERVIASEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación.

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
CRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro e instalación de enunciador remoto de detección de incendios, con alla LCD. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. e realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	7.414.267,00	29.657.068,00	-	-	-	-	-	-	4,00	29.657.068,00	0%	100%
inistro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de 5A. Certificado Mínimo 4 circuitos de notificación. Incluye marcación y ficho de dicación. e realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	5,00	3.730.867,00	18.654.335,00	-	-	-	-	-	-	5,00	18.654.335,00	0%	100%
inistro e instalación de Bateria 12V 18 Ah, recargable. Certificación UL. ye marcación y ficho de identificación. e realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	12,00	363.228,00	4.358.736,00	-	-	-	-	-	-	12,00	4.358.736,00	0%	100%
inistro e instalación de estrobo multicandela con sirena electrónica, nalidad seleccionable, montura pared, color rojo, Fuego en español, ficación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse cción y prueba de aceptación según NFPA72.	un	18,00	527.559,00	10.023.811,00	-	-	-	-	-	-	18,00	10.023.811,00	0%	100%
inistro e instalación de Estrobo multicandela con sirena electrónica, nalidad seleccionable, montura de techo, color rojo, Fuego en español ficación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse cción y prueba de aceptación según NFPA72.	un	139,00	540.834,00	75.154.266,00	-	-	-	-	-	-	139,00	75.154.266,00	0%	100%
inistro e instalación de multisensor de humo y temperatura (doble ológia). Incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de ficación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según M72.	un	6,00	523.127,00	3.138.762,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3.138.762,00	0%	100%
inistro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, incluye base. ficación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse cción y prueba de aceptación según NFPA72.	un	247,00	417.666,00	101.785.242,00	-	-	-	-	-	-	247,00	101.785.242,00	0%	100%
inistro e instalación de sensor de temperatura fija e incremental. Incluye . Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe zarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	61,00	438.736,00	26.762.896,00	-	-	-	-	-	-	61,00	26.762.896,00	0%	100%
inistro e instalación de sensor de humo de haz proyectado, controlados y vor.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe zarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	2,00	4.808.334,00	9.616.668,00	-	-	-	-	-	-	2,00	9.616.668,00	0%	100%
inistro e instalación de sensor de humo direccionable para ducto de aire, ye ducto de muestreo e indicador LED remoto.Certificación UL. Incluye cación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de tación según NFPA72.	un	4,00	1.175.063,00	4.700.252,00	-	-	-	-	-	-	4,00	4.700.252,00	0%	100%
inistro e instalación de estación manual, incluye Stopper. Certificación UL. ye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y ba de aceptación según NFPA72.	un	50,00	817.304,00	40.865.200,00	-	-	-	-	-	-	50,00	40.865.200,00	0%	100%
inistro e instalación de modulo de entrada, monitoreo e supervisión simple conexión a un contacto normalmente abierto. Certificación UL. Incluye , tapa protectora y todos los elementos necesarios para su correcta lación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse cución y prueba de aceptación según NFPA72.	un	78,00	576.427,00	44.961.306,00	-	-	-	-	-	-	78,00	44.961.306,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIV - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2491164
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.992.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N°A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.309.685,00	12/07/2021 A 13/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/09/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.309.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/09/2021 — HASTA 30/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOSTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro e instalación de modulo de entrada de señal para conexión de ales de telefonía y notificación. Incluye marcación y ficho de tificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según PA72.	un	10,00	576.427,60	5.764.270,00	-	-	-	-	-	-	10,00	5.764.270,00	0%	100%
inistro e instalación de modulo salida de control de señales externas. dene un relevo clase C. Certificado UL. Incluye marcación y ficho de tificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según PA72.	un	36,00	483.152,60	17.393.472,00	-	-	-	-	-	-	36,00	17.393.472,00	0%	100%
inistro e instalación de Cable FPLR 2x16. Certificación UL	ml	1.525,00	4.683,00	7.141.575,00	-	-	-	-	-	-	1.525,00	7.141.575,00	0%	100%
inistro e instalación de Cable FPLR 2x18. Certificación UL	ml	7.930,00	3.619,00	28.698.670,00	-	-	-	-	-	-	7.930,00	28.698.670,00	0%	100%
inistro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, nillates, cajas aluminio 2430 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas les, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	3.332,00	22.733,00	75.746.356,00	-	-	-	-	-	-	3.332,00	75.746.356,00	0%	100%
TEMA DE CCTV	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
inistro e instalación de grabador de video en red de 128 canales nsible, doble salida CS HD, fuente de alimentación redundante, soporte cámaras multimarca por protocolo ONVIF, incluye arreglo de discos duros rnales para CCTV de mínimo 12018, salida por VGA y HDMI 4K. pacidad de grabación mínimo de 12 MPX.	un	2,00	17.903.802,00	35.807.604,00	-	-	-	-	-	-	2,00	35.807.604,00	0%	100%
inistro e instalación del Switch para cctv de 24 Puertos PoE. 802.3af. 3at, 802.3az, mínimo 2 puertos SFP de 1000Mbps. Incluye los aceptores con conectores LC	un	10,00	3.164.809,00	31.648.090,00	-	-	-	-	-	-	10,00	31.648.090,00	0%	100%
inistro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 0X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm, sensor 1/2.8", sistema de presion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 30m. do de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de xión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta alación.	un	126,00	874.018,00	110.126.268,00	-	-	-	-	-	-	126,00	110.126.268,00	0%	100%
inistro e instalación de Cámara IP tipo bala, de resolución mínima 0X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm o superior, sensor 1/2.8", ema de compresion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de imo 50m. Grado de protección IP67, alimentación por PoE. Incluye orte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para correcta instalación.	un	65,00	1.103.542,00	71.735.230,00	-	-	-	-	-	-	65,00	71.735.230,00	0%	100%
inistro e instalación de Cámara IP PTZ de mínimo 30X ópticos, de lución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o erior, tenol-on d'ahoche con rango IR o laser de de mínimo 150m ,Grado protección IP67, incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro mento que sea necesario para su correcta instalación.	un	3,00	3.164.923,00	9.494.769,00	-	-	-	-	-	-	3,00	9.494.769,00	0%	100%
inistro e instalación de Cámara IP Fish Eye de 360 grados, de resolución ima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función /noche con rango IR de mínimo 10m ,Grado de protección IP66, IK10. luye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario a su correcta instalación.	un	2,00	1.238.228,00	2.476.456,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2.476.456,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489134
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.668.849,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901492870-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.545.300.895,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.943.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.545.300.895,00	12/07/2021 A	11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.558.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$	6.943.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

l de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora. ANDRES ALMARALES MELO y EROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
CRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro e Instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 0X1080P 30FPS, lente fijo especial para exteriores, sistema de presión H.265 o superior, función dia/noche con rango IR de mínimo 15m, do de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de xión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta lación	un	6,00	918.434,00	5.510.604,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5.510.604,00	0%	100%
inistro e instalación de teclado o joystick, basado en redes IP, soporta ples permisos de usuario, interoperabilidad con NVR y cámaras	un	1,00	1.267.548,00	1.267.548,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.267.548,00	0%	100%
inistro e instalación de decodificador de video con mínimo 12 interfases HDMI de salida, 2 interfaces HDMI de entrada y 2 interfases DVI de entrada, acidad de decodificación de mínimo 12MPX, capaz de decodificar H.265 o rior, H.264 y MPEG. Incluye todos los elementos necesarios para su ostalación.	un	1,00	17.001.653,00	17.001.653,00	-	-	-	-	-	-	1,00	17.001.653,00	0%	100%
inistro e instalación de unidad de visualización de empotre para ared, de 55" o superior, tecnología LCD o LED, resolución 1920X1080 o rior, para interior, soporta trabajo 24/7, mínimo una interfaz de conexión HDMI, 1 VGA y 1 DVI. Incluye soporte de pared y todos los elementos esarios para su correcta instalación.	un	8,00	10.594.160,00	84.753.280,00	-	-	-	-	-	-	8,00	84.753.280,00	0%	100%
inistro e instalación de estación de trabajo para central de monitoreo, ze de acuerdo al software según los requerimientos mínimos del software se instalará. Se debe entregar instalado, funcional e interconectado con el ma de vigilancia. Incluye licencia de windows 10 pro	un	3,00	4.740.960,00	14.222.880,00	-	-	-	-	-	-	3,00	14.222.880,00	0%	100%
inistro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro s, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y ados en medio impreso y magnético. Marcación y ficha de ificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para orrecta instalación.	mt	14.350,00	4.865,00	69.812.750,00	-	-	-	-	-	-	14.350,00	69.812.750,00	0%	100%
inistro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, inetes, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y ás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Rectificado en la alización de la red de datos)	mt	100,00	22.730,00	2.273.300,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2.273.300,00	0%	100%
TEMA DE INSTRUSIÓN	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
inistro e instalación de panel central de intrusión 8-246 zonas, 8 otones, incluye gabinete con llave, 1 Transformador Plug-in rated VAC, 40 VA y Backup Battery.	un	1,00	3.169.529,00	3.169.529,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.169.529,00	0%	100%
inistro e instalación de teclado de control LCD.	un	4,00	1.136.917,00	4.547.668,00	-	-	-	-	-	-	4,00	4.547.668,00	0%	100%
inistro e instalación de magnetico tvisno NA para circuitos N.C gap m. Para aplicaciones en puertas comerciales o acero detección efior.	un	135,00	172.730,00	23.318.550,00	-	-	-	-	-	-	135,00	23.318.550,00	0%	100%
inistro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro s, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y ados en medio impreso y magnético. Marcación y ficha de ificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para orrecta instalación.	mt	250,00	4.865,00	1.216.250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	1.216.250,00	0%	100%
inistro e instalación de Cable 2x18AWG apantallado.	mt	3.468,00	3.712,00	12.843.520,00	-	-	-	-	-	-	3.468,00	12.843.520,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	20210403012	PROCESO LICITATORIO No	LICP - SIPI - 0007 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.863.849,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	20210503007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901419370-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.945.359.685,00	12/07/2021 A	11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.945.359.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 15.658.129.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	30/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

30/11/2021

...ad de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERALTA, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 20210403012 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...uministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye enlaces, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (El resto se encuentra reflejado en la canalización de incendios y de datos)	ml	95,00	22.730,00	2.159.635,00	-	-	-	-	-	-	95,00	- 2.159.635,00	0%	100%
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-			
...uministro e instalación de panel control de acceso Ethernet para mínimo 4 puertas, puerto comunicación 10/100 Base-T, puerto comunicación TCS-23 y/o RS485, mínimo 12 entradas, selección de piso aplicación elevador, mínimo 4 salidas y 4 entradas para lectora, incluye gabinete, baterías, fuente de poder y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	14,00	7.343.239,00	102.793.346,00	-	-	-	-	-	-	14,00	102.793.346,00	0%	100%
...uministro e instalación de electroimán 800 lb con antiremanente o cerraduras electrónica, incluye soporte ZL, Soporte U Y/O todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	465.368,00	32.577.020,00	-	-	-	-	-	-	70,00	32.577.020,00	0%	100%
...uministro e instalación de brazo hidráulico, visagra hidráulica o cualquier otro componente que garantice el cierre automático de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	79,60	269.892,00	18.838.440,00	-	-	-	-	-	-	79,00	18.838.440,00	0%	100%
...uministro e instalación de lectora de proximidad RFID 125KHz, y/o MIFARE 13,56MHz y/o HID iClass 13,56MHZ, adicionalmente cuenta con lector de huella decidar, grado de protección IP55	un	92,00	820.552,00	75.444.784,00	-	-	-	-	-	-	92,00	75.444.784,00	0%	100%
...uministro Instalación Consola Dispensadora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coil Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido, incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	10.047.536,00	10.047.536,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.047.536,00	0%	100%
...uministro e instalación Consola recolectora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coil Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido, incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	10.047.536,00	10.047.536,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.047.536,00	0%	100%
...uministro transporte e instalación talanquera vehicular derecha/izquierda de ...m, de alto tráfico, con apertura rápida en menos de 5 segundos, barrera con ...ebicil, bandas reflectantes, cordón luminoso, luz intermitente, fotocelda, ...oporte para fotocelda, columna para fotocelda, apoyo fijo para talanquera, ...obina para detección de campo vehicular, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	2,00	5.257.896,00	10.515.792,00	-	-	-	-	-	-	2,00	10.515.792,00	0%	100%
...uministro e instalación de punto de pago automático, debe aceptar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por día y horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	un	3,00	29.337.060,00	88.011.180,00	-	-	-	-	-	-	3,00	88.011.180,00	0%	100%
...uministro e instalación de punto de pago manual, debe aceptar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por día y horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	un	4,00	11.261.550,00	45.046.200,00	-	-	-	-	-	-	4,00	45.046.200,00	0%	100%
...uministro e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568, incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	2.760,00	4.865,00	13.427.400,00	-	-	-	-	-	-	2.760,00	13.427.400,00	0%	100%
...uministro e instalación de Cable 2x16AWG apantallado.	ml	2.100,00	3.713,00	7.797.300,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	7.797.300,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040007	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SPI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2493184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.858.849,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) ; IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A , Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y
PEROS GAURDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, inetes, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y ds accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.391,00	22.733,00	31.621.603,00	-	-	-	-	-	-	1.391,00	31.621.603,00	0%	100%
TEMA RED DE DATOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
inistro e instalación de Rack cerrado de 42 unidades, en lámina cold rolled re 18. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con pasafaños, multitoma s salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás rramtas necesarios para su correcta instalación.	un	9,00	4.398.582,00	39.587.238,00	-	-	-	-	-	-	9,00	39.587.238,00	0%	100%
inistro e instalación de bandeja portacables para rack. Incluye todos los entos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	9,00	77.454,00	697.086,00	-	-	-	-	-	-	9,00	697.086,00	0%	100%
inistro e instalación de organizador horizontal de cables 40x40 para les en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta lación y funcionamiento.	un	43,00	843.029,00	5.721.120,00	-	-	-	-	-	-	43,00	5.721.120,00	0%	100%
inistro e instalación de Switch Core de mínimo 24 puertos SFP 1/10000Mbps, 2 puertos 10 Gigabit de Uplink. Incluye los transceptores con nectores LC y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y ionamiento. Incluye la marcación de los puertos en el switch según 606	un	2,00	17.992.800,00	35.985.600,00	-	-	-	-	-	-	2,00	35.985.600,00	0%	100%
inistro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 rtos, capa 3, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para e. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye transceptores con conectores LC	un	5,00	4.345.689,00	21.728.445,00	-	-	-	-	-	-	5,00	21.728.445,00	0%	100%
inistro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 6 hilos, Interior, Tight er, No Conductivo (Dieléctrico), Plenum, Multimodo OM3 50/125 mizada, debe cumplir con estándares ISO/IEC 11801:2002 OM3, SI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-568-C, ANSI/TIA-492 AAAC, Telcordia GR- -CORE. Incluye módulos, elementos anclados,conectores, marcación place en acrílico o térmica según norma TIA606, ducto pvc, curvas, ptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos rsarios para su correcta instalación	ml	980,00	84.708,00	83.070.690,00	-	-	-	-	-	-	980,00	83.070.690,00	0%	100%
inistro e instalación Panel de Conexión de Fibra para Rack de 19in, ndeja Fija, Acepta mínimo 72 Fibras, 1 UR. Incluye de Placa acopladora Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para re Multimodo, Placa adaptadora doble, elementos anclados,conectores, ración con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, y demás mentos necesarios para su correcta instalación	un	9,00	2.159.136,00	19.432.224,00	-	-	-	-	-	-	9,00	19.432.224,00	0%	100%
inistro e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6A, aplicable normas TIA 568, cumpla standares industriales y estén en el listado UL y más sean marca reconocida en el mercado. Incluye el tema de voz y os, caja 4ml con tapa suplemento, bacelizas, módulos, elementos uctores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, to pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás mentos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros)	un	80,00	257.040,00	20.563.200,00	-	-	-	-	-	-	80,00	20.563.200,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040007	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115436-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.968.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 10.858.129.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901492970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/05/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores(as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A . Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora. ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PIEDADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040007 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES OFICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro e instalación de salida sencilla de datos RJ 45 Categoría 6A, cable a normas TIA 568, cumple estandares industriales y están en el do UL y además esta marca reconocida en el mercado. Incluye: toma de o datos, caja metálica 12x8cm con tapa ingreso, faceplate, módulo, rentos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica según norma 606, ducto EMT, curves, uniones, adaptadores, grapas y demás rentos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros). ncluye cable	un	284,00	226.195,00	64.239.380,00	-	-	-	-	-	-	284,00	64.239.380,00	0%	100%
inistro, transporte e instalación de Patch panel preensamblado en fábrica capacidad para 24 puertos UTP, RJ-45, categoría 6A. Incluye elementos ijación y marcación de los puertos de los puertos según norma TIA 606. uye patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos emos, cat 6A del tamaño indicado para interconectarlo correctamente, ensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color ún la norma TIA 606	un	27,00	1.119.638,00	30.203.226,00	-	-	-	-	-	-	27,00	30.203.226,00	0%	100%
inistro e instalación de patch cord cable flexible 4 pares con conectores 45 en ambos extremos, cat 6A de 60 cm, preensamblado en fábrica uye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	mt	468,00	82.781,00	38.704.068,00	-	-	-	-	-	-	468,00	38.704.068,00	0%	100%
inistro e instalación de Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 LO, LC-LC Duplex, del tamaño adecuado para conexión de switches en tos de comunicaciones. Incluye marcación en ambos extremos y color ún la norma TIA 606	un	23,00	97.332,00	2.238.636,00	-	-	-	-	-	-	23,00	2.238.636,00	0%	100%
inistro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 rtos, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. uye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los sceptores con conectores LC	un	12,00	3.431.769,00	41.181.228,00	-	-	-	-	-	-	12,00	41.181.228,00	0%	100%
inistro e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple nes EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio reso y magnético, marcación y ferro de identificación según norma /TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	12.880,00	4.865,00	62.661.200,00	-	-	-	-	-	-	12.880,00	62.661.200,00	0%	100%
inistro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, rminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y más accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.782,00	22.733,00	40.510.206,00	-	-	-	-	-	-	1.782,00	40.510.206,00	0%	100%
inistro e instalación piso falso antiestático, de gran resistencia y tratado ra el fuego, incluye pedestal de alumno con una altura ente 20 y 50 cms y es los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	72,00	746.855,00	53.773.560,00	-	-	-	-	-	-	72,00	53.773.560,00	0%	100%
inistro e instalación de Rack cerrado de 12 unidades, en lámina cold rolled ore 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con pelaños, multitoma 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás rentos necesarios para su correcta instalación.	Un	2,00	897.500,00	1.795.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.795.000,00	0%	100%
inistro e instalación de tubería EMT 1 1/2", incluye uniones, codos, rminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y más accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	235,00	58.900,00	13.841.500,00	-	-	-	-	-	-	235,00	13.841.500,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	202104.0002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SM - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2493184		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:					
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11						PERIODO FACTURADO
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2023	08/9/2021 10/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026	
CONTRATO No	20210500007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2026	FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026	10/11/2021
NIT:	901439070-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026	

...al de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 202104.0002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera, de 300mm X mm, incluye curvas de 90 grados, uniones en T, uniones lineales, soportes, odos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	1.633,00	207.320,00	337.768.600,00	-	-		-	-	-	1.630,00	337.768.600,00	0%	100%
STEMA DE RED INALAMBRICA WIFI	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
ministro e instalación punto de acceso WIFI empresarial, para interior y/o erior, compatible con el estandar 802.11AC wave 2 de doble banda, ance exterior de 120m o superior, cuenta con minimo 2 puertos Ethernet 100/1000 Mbps, cuenta con la capacidad de radiar en las frecuencias de GHz y 5GHz, la alimentación debe ser PoE, compatible con 802.3at incluye os los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	57,00	1.544.707,00	88.048.299,00	-	-		-	-	-	57,00	88.048.299,00	0%	100%
ministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 ertos PoE 802.3af / 802.3at, 802.3bt PoE++, con 2 puertos a 1000 Mbps + os SFP a 10000 Mbps, para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el ach según TIA606. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta stalación. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	4.320.099,00	21.600.495,00	-	-		-	-	-	5,00	21.600.495,00	0%	100%
ministro e instalación de controladora WIFI y gateway de seguridad con inimo 2 puertos SFP a 10Gbps, mínimo 8 puertos LAN 10/100/1000. Incluye marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los ementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	2.854.172,00	2.854.172,00	-	-		-	-	-	1,00	2.854.172,00	0%	100%
ministro e instalación de cable UTP categoría 6A de cuatro pares, cumple mas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio reso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma A/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.990,00	4.865,00	19.411.350,00	-	-		-	-	-	3.990,00	19.411.350,00	0%	100%
ministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, minales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y más accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en ...elaboración de red de datos)	ml	100,00	22.793,00	2.279.300,00	-	-		-	-	-	100,00	2.279.300,00	0%	100%
STEMA SONIDO AMBIENTAL Y AUDIO EVACUACIACION	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
ministro e instalación de controlador de audio de mínimo 8 entradas y 4 idas, certificado EN para audioevacuación, supervisión interna y monitoreo ...señales, debe poder grabar almenos 50 minutos de mensajes internos y ...mitir de prioridad a señales de emergencia con respecto al resto de ...radas de audio y tener interconexión con estadores de formado para ...ceo. Incluye fuente de alimentación, marcación, ficho de identificación y más accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	9.868.431,00	9.868.431,00	-	-		-	-	-	1,00	9.868.431,00	0%	100%
ministro e instalación matriz de audio DSP mínimo 8 zonas, certificado EN ...ety, debe permitir manipulación desde PC, dispositivo movil, tablets y/o ...lado de control. Incluye marcación, ficho de identificación y demás ...esorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	6.720.053,00	6.720.053,00	-	-		-	-	-	1,00	6.720.053,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499194	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	830115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.868.949,13					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	PERIODO FACTURADO
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE HASTA	DESDE HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,09	12/07/2021 A 11/05/2023	1/05/2021 10/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 8.940.893.448,09	12/07/2021 A 11/05/2026	
CONTRATO No	2021050002	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,09	12/07/2021 A 11/05/2026	FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 18.658.120.274,09	11/05/2023 A 11/05/2026	09/11/2021
NIT:	901439970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 8.940.893.448,09	12/07/2021 A 11/05/2023	

...al de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Concesisa de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...ministro e instalación de arrayTeador DSP de mínimo 4 canales de 220W, ...das de 100W/70V/8ohms y 4ohms. Debe ser compatible con la ...ecta.Incluye marcación, ficha de identificación y demás accesorios ...queridos para su adecuado montaje.	un	5,00	8.738.537,00	43.692.685,00	-	-	-	-	-	-	5,00	43.692.685,00	0%	100%
...ministro e instalación estación de llamado compatible con la matriz de 7.02, ...be permitir programación de grabación de zonas, Incluye marcación, ficha ...identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	2.688.021,00	10.752.084,00	-	-	-	-	-	-	4,00	10.752.084,00	0%	100%
...ministro e instalación teclado de gestion de volumen y fuente de audio ...patible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de ...nes. Incluye marcación, ficha de identificación y demás accesorios ...queridos para su adecuado montaje.	un	4,00	1.253.664,00	5.014.656,00	-	-	-	-	-	-	4,00	5.014.656,00	0%	100%
...ministro e instalación amplificador profesional DSP para sonido en vivo,de ...nimo dos salidas de 1800w, debe permitir procesamiento profesional de ...eseos con tecnologia FIR drive, y supervición y control a traves de display ...ubicado en la aparta delantera. Incluye marcación, ficha de identificación y ...más accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	3,00	7.728.828,00	23.180.484,00	-	-	-	-	-	-	3,00	23.180.484,00	0%	100%
...ministro e instalación modulo de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, ...be contener mínimo dos arreglos en cada module, dos woofers de 8" de ...ja distorsión, cuatro diafragmas de titanio con driver HF de 1.25", ...nsibilidad a mínimo 104 decibeles, manejo de energía de mínimo 350w ...mínimos, 1400w pico . Incluye marcación, ficha de identificación y demás ...cesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	8,00	16.912.820,00	135.302.560,00	-	-	-	-	-	-	8,00	135.302.560,00	0%	100%
...ministro e instalación modulo de subwoofer de arreglo lineal para ...icaciones de sonido, debe contener mínimo dos subwoofers de 15" para ...ja distrosión y alto SPL con una sensibilidad de 100db, manejo de energía ...1000w continuos y 4000w pico y un SPL mínimo de 130 db. Incluye ...arcación, ficha de identificación y demás accesorios requeridos para su ...ecuado montaje.	un	4,00	18.472.333,00	73.889.332,00	-	-	-	-	-	-	4,00	73.889.332,00	0%	100%
...ministro e instalación de atravez modular de 24 Vatios para orraje en techo, ...ra reproducción de música ambiental y voz, certificado UL 2043, UL 1480 y ...54-24 para audio evacuación, debe contener transformador de derivación ...alimentación de 70/100V con funcionamiento a máxima potencia, a ...tencia media, a un octavo de potencia o a un octavo de potencia. Incluye ...porte para montaje en escenarios, marcación y ficha de identificación y ...más accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	109,00	604.568,00	65.896.672,00	-	-	-	-	-	-	109,00	65.896.672,00	0%	100%
...ministro e instalación de cable de cobre 2X18AWG especialmente diseñado ...ra sonido, de alta pureza y sin colgare para un amplio rango de frecuencia, ...ja pérdida de señal y mayor definió en el extremo bajo para una ...producción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ...cha de identificación y demás elementos necesarios para su correcta ...stalación.	ml	3.270,00	7.745,00	25.326.150,00	-	-	-	-	-	-	3.270,00	25.326.150,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2493184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115426-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.665.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.620.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1002604	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/11/2021 — HASTA 18/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

18/11/2021

...d de Valledupar, Cesar, el día 18 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, las señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS DALMIDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación.

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...inistro e instalación de cable de cobre 2X12AWG especialmente diseñado ...e sonido, de alta pureza y sin colgano para un amplio rango de frecuencia. ...a pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una ...producción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores. marcación ...no de identificación y demás elementos necesarios para su correcta ...stalación.	ml	360,00	10.224,00	3.680.640,00	-	-	-	-	-	-	360,00	3.680.640,00	0%	100%
...inistro e instalación de Tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, ...minales, cajas 2x00 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y ...más accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	495,00	22.733,00	11.252.835,00	-	-	-	-	-	-	495,00	11.252.835,00	0%	100%
STEMA HVAC - HEATING + VENTILATION + AIR CONDITIONING	0,00			2.662.862.518,00	-	-	-	-	-	-	-	2.662.862.518,00	0%	100%
UIPOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 500.000 U, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	48.585.850,00	48.585.850,00	-	-	-	-	-	-	1,00	48.585.850,00	0%	100%
IDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 440.000 U, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	43.930.354,00	43.930.354,00	-	-	-	-	-	-	1,00	43.930.354,00	0%	100%
IDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 540.000 U, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	56.147.075,00	56.147.075,00	-	-	-	-	-	-	1,00	56.147.075,00	0%	100%
IDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 320.000 U, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	34.656.288,00	34.656.288,00	-	-	-	-	-	-	1,00	34.656.288,00	0%	100%
IDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 140.000 U, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	16.405.677,00	16.405.677,00	-	-	-	-	-	-	1,00	16.405.677,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 12.000 BTU, 220 2 PH	Und	2,00	2.095.407,00	4.190.814,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.190.814,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 18.000 BTU, 220 2 PH	Und	1,00	2.189.577,00	2.189.577,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.189.577,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU, 220 2 PH	Und	2,00	2.167.062,00	4.334.124,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.334.124,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 30.000 BTU, 220 2 PH	Und	1,00	2.317.049,00	2.317.049,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.317.049,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 36.000 BTU, 220 2 PH	Und	5,00	2.440.250,00	12.201.250,00	-	-	-	-	-	-	5,00	12.201.250,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 48.000 BTU, 220 2 PH	Und	19,00	2.664.151,00	50.618.869,00	-	-	-	-	-	-	19,00	50.618.869,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 7.000 BTU, 220 V,2	Und	1,00	1.208.706,00	1.208.706,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.208.706,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 9.000 BTU, 220 V,2	Und	5,00	1.252.605,00	6.260.025,00	-	-	-	-	-	-	5,00	6.260.025,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 12.000 BTU, 220 V,2	Und	1,00	1.330.472,00	1.330.472,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.330.472,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 18.000 BTU, 220 V,2	Und	1,00	1.720.765,00	1.720.765,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.720.765,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	928.070,00	7.424.560,00	-	-	-	-	-	-	8,00	7.424.560,00	0%	100%
IDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	1.098.680,00	2.197.360,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2.197.360,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LQP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499194
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 5.940.853.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901133970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 5.940.853.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
PERIODO FACTURADO	
DESDE	HASTA
1/05/2021	30/11/2021
FECHA PRESENTE ACTA	
10/11/2021	

ad de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNDA.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
IDAD FANCOIL OCULTA DEDICADA DE AIRE EXTERIOR DE 48.000 U, 220 V,2 PH	Und	8,00	3.719.540,00	29.756.320,00	-	-	-	-	-	-	8,00	29.756.320,00	0%	100%
NTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES TERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN	Und	1,00	2.078.892,00	2.078.892,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.078.892,00	0%	100%
NTROL REMOTO ALAMBRADO TÁCTIL / SENSOR DETEMPERATURA, TEGRADO Y RECEPTOR DE SEÑAL INALAMBRICA	Und	8,00	264.631,00	2.117.048,00	-	-	-	-	-	-	8,00	2.117.048,00	0%	100%
NTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE CIRCULAR	Und	5,00	102.595,00	512.975,00	-	-	-	-	-	-	5,00	512.975,00	0%	100%
NTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE 1 VIA	Und	8,00	76.704,00	613.632,00	-	-	-	-	-	-	8,00	613.632,00	0%	100%
FRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 40 TR, 208/230 V, 3 L COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	81.070.000,00	81.070.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	81.070.000,00	0%	100%
FRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 60 TR, 208/230 V, 3 L COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	114.950.000,00	114.950.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	114.950.000,00	0%	100%
MBA DE AGUA FRIA DE 223 GPM, CABEZA 90 FT	Und	2,00	11.495.000,00	22.990.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	22.990.000,00	0%	100%
IDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 6.800 CFM, 202.400 BTU, 8/230 V, 3 PH	Und	3,00	30.250.000,00	90.750.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	90.750.000,00	0%	100%
IDAD MANEJADORA (DEDICADA DE AIRE EXTERIOR) AGUA HELADA 6.400 CFM, 376.323 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	173.030.000,00	173.030.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	173.030.000,00	0%	100%
IDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 4000 CFM, 105.000 BTU, 8/230 V, 3 PH	Und	1,00	18.150.000,00	18.150.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	18.150.000,00	0%	100%
CTRACTOR AXIAL TUBULAR DE 14.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	9.202.050,00	27.606.150,00	-	-	-	-	-	-	3,00	27.606.150,00	0%	100%
NTILADOR JET FAN BAJO PERFIL DE 6.497 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	10,00	9.365.400,00	93.654.000,00	-	-	-	-	-	-	10,00	93.654.000,00	0%	100%
CTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 540 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.123.560,00	2.123.560,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.123.560,00	0%	100%
CTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.668.050,00	0%	100%
CTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 560 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.306.800,00	0%	100%
CTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 400 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.306.800,00	0%	100%
CTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 320 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.306.800,00	0%	100%
CTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 720 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.668.050,00	0%	100%
XTRACTOR DE BAÑO TIPO PLAFON DE 80 CFM, 120 V 1 PH	Und	1,00	108.900,00	108.900,00	-	-	-	-	-	-	1,00	108.900,00	0%	100%
XTRACTOR TIPO HONGO DE TEJADO DE 6200 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6.043.950,00	12.087.900,00	-	-	-	-	-	-	2,00	12.087.900,00	0%	100%
NTILADOR DE SUMINISTRO TIPO PENTHOUSE DE 6.400 CFM, 208/230 3 PH	Und	2,00	6.261.750,00	12.523.500,00	-	-	-	-	-	-	2,00	12.523.500,00	0%	100%
NDUCTOS	Kg	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, SQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE BRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	12.856,20	22.738,00	292.324.275,60	-	-	-	-	-	-	12.856,20	292.324.275,60	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499134
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154084-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.669.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.545.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.545.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901439870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 9/09/2021 HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventoria, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERALTO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
LAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE SLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA BRICACION E INSTALACION)	m²	898,43	52.364,00	47.063.357,12	-	-	-	-	-	-	898,43	47.063.357,12	0%	100%
CTO EN FIBRA DEVIDRIO DUCTO GLASS METO, INCLUYE (LAMINA FIBRA, PEGANTE, MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m²	92,48	121.236,00	11.211.905,28	-	-	-	-	-	-	92,48	11.211.905,28	0%	100%
CTO FLEXIBLE DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE (DUCTO FLEXIBLE, TA FOIL, PEGANTE MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACION)	m	85,00	48.235,00	4.099.975,00	-	-	-	-	-	-	85,00	4.099.975,00	0%	100%
OPLE FLEXIBLE A EQUIPOS CON LONA	und	44,00	79.672,00	3.505.568,00	-	-	-	-	-	-	44,00	3.505.568,00	0%	100%
BERIA DE REFRIGERACION	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", INCLUYE (TUBERIA, CODO, ION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE TALACION)	m	151,80	36.735,00	5.576.985,00	-	-	-	-	-	-	151,80	5.576.985,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, ION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE TALACION)	m	326,00	42.035,00	13.703.410,00	-	-	-	-	-	-	326,00	13.703.410,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 1/2" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, ION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE TALACION)	m	289,00	48.995,00	14.158.655,00	-	-	-	-	-	-	289,00	14.158.655,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 5/8", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, LDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE TALACION)	m	367,00	54.635,00	20.059.295,00	-	-	-	-	-	-	367,00	20.059.295,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, ION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE TALACION)	m	395,00	66.150,00	26.019.250,00	-	-	-	-	-	-	395,00	26.019.250,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, DO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE RA DE INSTALACION)	m	98,00	105.130,00	10.400.740,00	-	-	-	-	-	-	98,00	10.400.740,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 3/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, DO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE RA DE INSTALACION)	m	85,00	122.445,00	10.407.825,00	-	-	-	-	-	-	85,00	10.407.825,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, DO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE RA DE INSTALACION)	m	211,00	146.081,00	30.823.091,00	-	-	-	-	-	-	211,00	30.823.091,00	0%	100%
BERIA DE COBRE RIGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, DO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE RA DE INSTALACION)	m	59,00	221.961,00	13.095.699,00	-	-	-	-	-	-	59,00	13.095.699,00	0%	100%
RMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA PRD 2000	Und	5,00	234.000,00	1.170.000,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.170.000,00	0%	100%
S REFRIGERANTE R-410A	Lb	410,00	24.958,00	10.233.600,00	-	-	-	-	-	-	410,00	10.233.600,00	0%	100%
SES DE SOLDADURA INCLUYE (GASES OXIACETILENICOS Y ROGENO)	und	1,00	3.640.000,00	3.640.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.640.000,00	0%	100%
CESORIOS TIPO Y-BRACH Y CONTROLES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DONT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 45KBTU	m	2,00	635.954,00	1.271.908,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.271.908,00	0%	100%
DONT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 45KBTU	m	3,00	510.916,00	1.532.748,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.532.748,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0082 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499164
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115436-9	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.919,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	19/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

19/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

...d de Valledupar, Cesar, el dia 19 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARSOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA N° 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
...SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU	ds	3,00	964.552,00	2.893.656,00	-	-		-	-	-	3,00	2.893.656,00	0%	100%
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - ...KBTU	ds	22,00	322.608,00	7.097.376,00	-	-		-	-	-	22,00	7.097.376,00	0%	100%
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - ...KBTU	ds	3,00	655.620,00	1.966.860,00	-	-		-	-	-	3,00	1.966.860,00	0%	100%
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU	ds	8,00	211.492,00	1.691.936,00	-	-		-	-	-	8,00	1.691.936,00	0%	100%
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - ...KBTU	ds	4,00	588.234,00	2.352.936,00	-	-		-	-	-	4,00	2.352.936,00	0%	100%
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - ...KBTU	ds	6,00	469.826,00	2.764.956,00	-	-		-	-	-	6,00	2.764.956,00	0%	100%
...DOR UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - ...KBTU	ds	5,00	393.287,00	1.966.435,00	-	-		-	-	-	5,00	1.966.435,00	0%	100%
...BERIA DE PVC	0.00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...BERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, ...E, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, ...LDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y ...NO DE OBRA DE INSTALACION)	m	1,00	176.031,00	176.031,00	-	-		-	-	-	1,00	176.031,00	0%	100%
...BERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, ...E, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, ...LDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y ...NO DE OBRA DE INSTALACION)	m	55,00	428.758,00	23.582.240,00	-	-		-	-	-	55,00	23.582.240,00	0%	100%
...BERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, ...ION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, ...LDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y ...NO DE OBRA DE INSTALACION)	m	12,00	494.384,00	5.932.608,00	-	-		-	-	-	12,00	5.932.608,00	0%	100%
...BERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, ...E, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, ...LDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y ...NO DE OBRA DE INSTALACION)	m	20,00	593.391,00	11.867.820,00	-	-		-	-	-	20,00	11.867.820,00	0%	100%
...BERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, ...E, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, ...LDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y ...NO DE OBRA DE INSTALACION)	m	170,00	550.816,00	93.638.720,00	-	-		-	-	-	170,00	93.638.720,00	0%	100%
...LVULAS DE CORTE	0.00			-	-	-		-	-	-	-	-		
...LVULA DE CORTE DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, ...LDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	219.886,00	2.638.632,00	-	-		-	-	-	12,00	2.638.632,00	0%	100%
...LVULA MARIPOSA DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, ...LDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	4,00	576.892,00	2.307.568,00	-	-		-	-	-	4,00	2.307.568,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115436-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.617.668.849,16				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VIEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
LVULA MARIPOSA DE 4", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, LDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	581.726,00	3.490.356,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3.490.356,00	0%	100%
LVULAS DE GLOBO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LVULA GLOBO DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, LDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	416.856,00	5.002.272,00	-	-	-	-	-	-	12,00	5.002.272,00	0%	100%
LVULA GLOBO DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, LDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	Und	2,00	1.302.292,00	2.604.584,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2.604.584,00	0%	100%
LVULAS TRES VIAS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LVULA TRES VIAS DE 6 1/2", INCLUYE (VALVULA, ADAMPATADOR ACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	8,00	1.847.866,00	11.085.936,00	-	-	-	-	-	-	8,00	11.085.936,00	0%	100%
CESORIOS PARA EQUIPOS AGUA HEALDA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NQUE DE EXPASION CERRADO	Und	1,00	6.303.648,00	6.303.648,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.303.648,00	0%	100%
DO DIFUSOR DE SUCCION DE 4"	Und	2,00	2.715.648,00	5.431.296,00	-	-	-	-	-	-	2,00	5.431.296,00	0%	100%
S + AIREADOR	Und	1,00	5.118.048,00	5.118.048,00	-	-	-	-	-	-	1,00	5.118.048,00	0%	100%
RTEX	Und	1,00	1.171.248,00	1.171.248,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.171.248,00	0%	100%
NEXIONES ANTI-VIBRATORIAS	Und	2,00	469.428,00	938.856,00	-	-	-	-	-	-	2,00	938.856,00	0%	100%
TIRO EN Y	Und	2,00	2.712.528,00	5.425.056,00	-	-	-	-	-	-	2,00	5.425.056,00	0%	100%
NOMETRO DE CARATULA	Und	4,00	491.090,00	1.964.360,00	-	-	-	-	-	-	4,00	1.964.360,00	0%	100%
RMOQUETRO DE COLUMNA	Und	4,00	648.973,00	2.595.892,00	-	-	-	-	-	-	4,00	2.595.892,00	0%	100%
BLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BLERO ELECTRICO TE-01	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.669.000,00	0%	100%
BLERO ELECTRICO TE-02	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.669.000,00	0%	100%
BLERO ELECTRICO TE-03	Und	1,00	9.789.000,00	9.789.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	9.789.000,00	0%	100%
RIADOR DE VELOCIDAD DE 11,5 KW	Und	1,00	7.137.000,00	7.137.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	7.137.000,00	0%	100%
RIADOR DE VELOCIDAD DE 7,5 KW	Und	1,00	3.393.000,00	3.393.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.393.000,00	0%	100%
RIADOR DE VELOCIDAD DE 2 KW	Und	1,00	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.925.000,00	0%	100%
STEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOMATIZACION Y CONTROL	Und	1,00	135.408.000,00	135.408.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	135.408.000,00	0%	100%
FUSORES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 20"X20"	Und	8,00	279.084,00	2.232.672,00	-	-	-	-	-	-	8,00	2.232.672,00	0%	100%
FUSOR DE SUMINISTRO 3 CONOS Ø14 C.D.	Und	36,00	469.404,00	16.898.544,00	-	-	-	-	-	-	36,00	16.898.544,00	0%	100%
RILLAS DE SUMINISTRO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE 60"X6"	Und	8,00	341.848,00	2.734.784,00	-	-	-	-	-	-	8,00	2.734.784,00	0%	100%
RILLAS DE RETORNO O EXTRACCION	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 6"X4" C.D.	Und	44,00	52.884,00	2.326.896,00	-	-	-	-	-	-	44,00	2.326.896,00	0%	100%
RILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 54"X8" C.D.	Und	15,00	336.804,00	5.052.060,00	-	-	-	-	-	-	15,00	5.052.060,00	0%	100%
RILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 32"X18" C.D.	Und	18,00	335.244,00	6.034.392,00	-	-	-	-	-	-	18,00	6.034.392,00	0%	100%
RILLAS TIPO LOUVER	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RILLA TIPO LOUVER DE 18"X8" C.D.	Und	2,00	124.644,00	249.288,00	-	-	-	-	-	-	2,00	249.288,00	0%	100%
RILLA TIPO LOUVER DE 24"X8" C.D.	Und	1,00	166.324,00	166.324,00	-	-	-	-	-	-	1,00	166.324,00	0%	100%
RILLA TIPO LOUVER DE 26"X8" C.D.	Und	1,00	180.264,00	180.264,00	-	-	-	-	-	-	1,00	180.264,00	0%	100%
RILLA TIPO LOUVER DE 36"X8" C.D.	Und	1,00	235.404,00	235.404,00	-	-	-	-	-	-	1,00	235.404,00	0%	100%
RILLA TIPO LOUVER DE 50"X14" C.D.	Und	8,00	444.444,00	3.555.552,00	-	-	-	-	-	-	8,00	3.555.552,00	0%	100%
RILLA TIPO LOUVER DE 6"X4" C.D.	Und	1,00	57.564,00	57.564,00	-	-	-	-	-	-	1,00	57.564,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDV - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499184		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:					
NIT:	830113406-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.695.949,31						
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO		DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4917	$ 44.545.300.695,00		12/07/2021	A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4917	$ 6.940.883.448,00		12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4917	$ 43.545.300.695,00		12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4917	$ 16.858.120.274,00		11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901433970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00		12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ERDS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
	SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	LLA TIPO LOUVER DE 32"X8" C.D.	Und	1,00	212.004,00	212.004,00	-	-	-	-	-	-	1,00	212.004,00	0%	100%
	PERS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		100%
	PER MANUAL UNA ALETA DE 20"X16"	Und	4,00	258.198,00	1.032.784,00	-	-	-	-	-	-	4,00	1.032.784,00	0%	100%
	PER MANUAL UNA ALETA DE 16"X14"	Und	4,00	211.600,00	844.400,00	-	-	-	-	-	-	4,00	844.400,00	0%	100%
	NSPORTE DE MATERIALES , UBICACIÓN DE EQUIPOS. INGENIERIA RRAMIENTE	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	und	1,00	6.895.200,00	6.895.200,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.895.200,00	0%	100%
	O DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS	und	1,00	27.572.220,00	27.572.220,00	-	-	-	-	-	-	1,00	27.572.220,00	0%	100%
	E Y UBICACIÓN DE EQUIPOS	und	1,00	8.736.000,00	8.736.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	8.736.000,00	0%	100%
	RANQUE DEL SISTEMA	und	1,00	27.823.224,00	27.823.224,00	-	-	-	-	-	-	1,00	27.823.224,00	0%	100%
	NSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	und	1,00	26.379.600,00	26.379.600,00	-	-	-	-	-	-	1,00	26.379.600,00	0%	100%
	ENIERÍA Y SUPERVISION	und	1,00	29.484.000,00	29.484.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	29.484.000,00	0%	100%
	TALACIONES ELECTRICAS	0,00		$	2.594.231.573,00	-	-		$ -		$ -	-	$ 2.594.231.573,00	0%	100%
	RAS CIVILES EN VIA PÚBLICA (CANTIDADES APROXIMADAS, AN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR RTE DE ELECTROCARIBE (AFIRMA))	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	de paso en piso duro, para energía Norma Electricaribe Afirma	un	2,00	3.275.390,00	6.550.780,00	-	-	-	-	-	-	2,00	6.550.780,00	0%	100%
	OMETIDA PRIMARIA CANALIZADA (CANTIDADES APROXIMADAS, AN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR RTE DE ELECTROCARIBE (AFIRMA))	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ería PVC canalizada de 4(3/4" desde la caja de paso exterior hasta la caja paso metálica interior, incluye terminales campana, cinta peligro y demas esorios para su correcta instalación.	ml	80,00	152.600,00	12.208.000,00	-	-	-	-	-	-	80,00	12.208.000,00	0%	100%
	de paso metálica 100x100, norma para cambio nivel, incluye acrilico go alta tensión, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta lación.	un	1,00	836.600,00	836.600,00	-	-	-	-	-	-	1,00	836.600,00	0%	100%
	de paso metálica 900x100, norma para cambio de tubería PVC a tubería , incluye acrilico peligro alta tensión, tornillos para sello y demas esorios para su correcta instalación.	un	2,00	660.400,00	1.320.800,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.320.800,00	0%	100%
	ería PVC 6" expuesta desde la caja de paso metálica hasta el equipo de dida, incluye curvas, uniones, soportes y demas accesorios para su recta instalación.	ml	20,00	534.800,00	10.696.000,00	-	-	-	-	-	-	20,00	10.696.000,00	0%	100%
	rmetida en 3x4/0 AWXLPE-15 kV desde punto de conexión asignado por ador de red a subestación (Medida aproximada)	ml	150,00	134.148,00	20.122.350,00	-	-	-	-	-	-	150,00	20.122.350,00	0%	100%
	ctura de subterranización/soterramiento (incluye cajas terfonía/cableados, seccionamiento, cruceta, herrajes, poste de concreto a 1050 Kgf)	Un	1,00	3.332.000,00	3.332.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.332.000,00	0%	100%
	minales premoldeados uso exterior 15kV (Juego completo de conos) uye conectores, accesorios y elementos para su correcta instalación hasta pruebas finales.	Jgo	2,00	637.873,00	1.275.746,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.275.746,00	0%	100%
	ESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	le Cu No. 2/0 AWG desnudo	ml	40,00	22.510,00	901.400,00	-	-	-	-	-	-	40,00	901.400,00	0%	100%
	dura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T)	un	16,00	78.900,00	1.262.400,00	-	-	-	-	-	-	16,00	1.262.400,00	0%	100%
	ne terminal española 2/0	un	16,00	9.832,00	157.312,00	-	-	-	-	-	-	16,00	157.312,00	0%	100%
	de inspección 30x30	un	4,00	214.600,00	858.400,00	-	-	-	-	-	-	4,00	858.400,00	0%	100%
	ódo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m	un	9,00	127.200,00	1.144.800,00	-	-	-	-	-	-	9,00	1.144.800,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.3499104		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:					
NIT:	8901154076-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.868.849,11						
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO		DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.309.685,00		12/07/2021	A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.945.883.448,00		12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050002	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.309.685,00		12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 19.656.126.274,05		11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901437907-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.945.883.448,00		12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/09/2021 HASTA 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

ad de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: CELDA MEDIDA SF6 gún diagrama Unifilar (Incluye Medidor electrónico, multifunción, multirango, (3) nsformadores de corriente 40:5A, (3) PTs de 13200/√3:120/√3 y demás cesarios)	un	1,00	22.562.102,00	22.562.102,00	-	-			-	-	1,00	22.562.102,00	0%	100%
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Celda de protección SF6 incluye fusibles HH 63 A) según diagrama Unifilar	un	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-			-	-	1,00	27.000.000,00	0%	100%
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Seccionador de 17.5 630A bajo carga, cuchilla de puesta a tierra.	un	2,00	9.080.875,00	18.161.750,00	-	-			-	-	2,00	18.161.750,00	0%	100%
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Gabinete metálico a encerrar el transformador de acuerdo con conexiones Electricaribe y TIE.	un	1,00	11.748.400,00	11.748.400,00	-	-			-	-	1,00	11.748.400,00	0%	100%
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Transformador tipo co de 800 KVA, 13.800 a 208/120, Clase F, ahorrador de energía, con mosquitos por debanado y termometro, Incluye DPS, extractor, chequeo y nsporte y puesta en sitio	un	1,00	61.130.000,00	61.130.000,00	-	-			-	-	1,00	61.130.000,00	0%	100%
el Transformador	un	1,00	280.000,00	280.000,00	-	-			-	-	1,00	280.000,00	0%	100%
ogullado y pintura	un	1,00	4.266.300,00	4.266.300,00	-	-			-	-	1,00	4.266.300,00	0%	100%
esta tierra de cuarto S/E, puertas y elementos metálicos	un	1,00	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-			-	-	1,00	2.450.000,00	0%	100%
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones nterior entre Celda de medida - TRF 1 (barras de cobre forradas en funda moconcible)	un	1,00	5.897.787,00	5.897.787,00	-	-			-	-	1,00	5.897.787,00	0%	100%
nistro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones rnales entre transformador de 800 kVA y Tablero general Distribución 10,5 (Bus de barras trifásico para 3000 A + neutro y tierra, tramo recto, incluye cesorios, curves y soportes)	un	1,00	29.698.710,00	29.698.710,00	-	-			-	-	1,00	29.698.710,00	0%	100%
ductor de puesta a tierra para aterrizaje de tableteria, en cable Cu No. 2, luye elementos de conexión	ml	12,00	12.500,00	150.000,00	-	-			-	-	12,00	150.000,00	0%	100%
ABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
tablero General de Distribución de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos. Incluye barraje (interruptores de caja moldeada 25kA). Fabricar según U.	un	1,00	107.764.682,00	107.764.682,00	-	-			-	-	1,00	107.764.682,00	0%	100%
ela de BT 208 V , para alojar los siguientes equipos. Incluye barraje, interruptores de caja moldeada 25kA] según Diagrama Unifilar	un	1,00	21.196.686,00	21.196.686,00	-	-			-	-	1,00	21.196.686,00	0%	100%
ela de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos. Incluye barraje, Según agrama Unifilar	un	1,00	19.613.483,00	19.613.483,00	-	-			-	-	1,00	19.613.483,00	0%	100%
AUDAS ELECTRICAS	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
OTANO 1	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
ida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Hermetica Led 2x18 (No cluida)	un	154,00	162.500,00	25.025.000,00	-	-			-	-	154,00	25.025.000,00	0%	100%
ida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa tas, cable LSHF, premacable, conectas de reserva y encauchetado (3x15) de la da a la luminaria. Luminaria Bala LED 18W.	un	23,00	57.057,00	1.313.601,00	-	-			-	-	23,00	1.313.601,00	0%	100%
ida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, ación, cajas, cable LSHF , conectores de anillo, tramo de encauchetado 15, Juego de conectores macho y hembra para desconexión rapida rtificada (formanse de conexion). Luminaria Lotus 10W LED.	un	45,00	108.954,00	4.903.350,00	-	-			-	-	45,00	4.903.350,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1PCCNTR.2459184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901540-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4217	$ 6.940.680.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERKUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.858.120.274,00	11/05/2023 A 11/09/2026
NIT:	9014809/6-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.680.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

ad de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERKUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VIEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables de control No 16 HH a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con s respectivos empalmes y derivaciones	un	222,00	36.794,00	8.168.268,00	-	-			-	-	222,00	8.168.268,00	0%	100%
ida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa liso (No incluye sensor) en ulaciones	un	8,00	98.580,00	788.640,00	-	-			-	-	8,00	788.640,00	0%	100%
uministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio SC15-IDU con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	128.689,00	1.029.512,00	-	-			-	-	8,00	1.029.512,00	0%	100%
ida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: ería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSH, empalme aparato.	un	31,00	114.760,00	3.557.560,00	-	-			-	-	31,00	3.557.560,00	0%	100%
ida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, en nalizacion superficial, que incluye: tapa troquelada, cable LSHF, empalme y tierra. No incluye la canalizacion.	un	10,00	526.949,00	5.269.490,00	-	-			-	-	10,00	5.269.490,00	0%	100%
ida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra aislada, 15 A, en nalizacion superficial, que incluye: tapa troquelada, cable LSHF, empalme y tierra. No incluye la canalizacion.	un	2,00	68.564,00	137.128,00	-	-			-	-	2,00	137.128,00	0%	100%
ida eléctrica para toma corriente, 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: ería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1,00	67.357,00	67.357,00	-	-			-	-	1,00	67.357,00	0%	100%
ida para sufete sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, pa lisa, cable LSHF, conectos de resorte y aparato.	ml	13,00	120.887,00	1.571.531,00	-	-			-	-	13,00	1.571.531,00	0%	100%
STALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS				-								-		
SOTANO 1				-								-		
stalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, ED 2x18W Hermética	un	154,00	246.762,00	38.001.348,00	-	-			-	-	154,00	38.001.348,00	0%	100%
uministro e Instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable equichetado Luminaria EMS 60LEDS.	un	45,00	199.840,00	8.992.800,00	-	-			-	-	45,00	8.992.800,00	0%	100%
stalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. oque	un	5,00	41.972,00	209.860,00	-	-			-	-	5,00	209.860,00	0%	100%
stalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. ea 18W LED.	un	23,00	145.812,00	3.353.676,00	-	-			-	-	23,00	3.353.676,00	0%	100%
LIDAS ELECTRICAS				-								-		
NIVEL 1 PISO 9				-								-		
ida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, ble LSHF, conectores de resorte. Bafa Lotus 1x13W. (No Incluida).	un	42,00	101.889,60	4.279.363,00	-	-			-	-	42,00	4.279.536,00	0%	100%
ida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, ble LSHF, conectores de resorte. Pandera LED 18W, (No incluida).	un	22,00	117.909,00	2.593.998,00	-	-			-	-	22,00	2.593.998,00	0%	100%
ida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, ble LSHF, conectores de resorte. LED 60x60 36W. (No incluida).	un	13,00	117.697,00	1.532.661,00	-	-			-	-	13,00	1.532.661,00	0%	100%
ida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, ble LSHF, conectores de resorte. Cuarl LED 12ROS 108W 6.0cs. (No cluida).	un	65,00	106.009,00	9.010.765,00	-	-			-	-	65,00	9.010.765,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SEN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2419164
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138,617,853,849,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050057				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901492978-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
10/9/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4517	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4517	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4517	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4517	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

d de Valledupar, Cesar, al dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora. ANDRES ALMARALES MELO y VERGOS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, le LSHF, conectores de resorte. Cob6 LED BROS 54W 3,6m. (No ida).	un	12,00	106.009,00	1.272.108,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.272.108,00	0%	100%
da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, le LSHF, conectores de resorte. Pilot LED 1W (No Incluida).	un	43,00	101.003,00	4.343.129,00	-	-	-	-	-	-	43,00	4.343.129,00	0%	100%
da para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, ión, cajas, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria 2 60LEDS (No Incluida)	un	33,00	120.059,00	4.585.047,00	-	-	-	-	-	-	38,00	4.585.042,00	0%	100%
da para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, le LSHF, pransecable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No Incluida).	un	2,00	65.772,00	131.544,00	-	-	-	-	-	-	2,00	131.544,00	0%	100%
da para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, rbre, pransecable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a minaria. Luminaria Riel estudio de grabación (No Incluida).	un	50,00	79.439,00	3.971.950,00	-	-	-	-	-	-	50,00	3.971.950,00	0%	100%
da para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, rbre, pransecable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a minaria. Luminaria Riel Galeria de arte (No Incluida).	un	30,00	79.438,00	2.383.140,00	-	-	-	-	-	-	30,00	2.383.140,00	0%	100%
da para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa , alambre, pransecable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la a la luminaria. Luminaria AP1 aplique de pared (No Incluida).	un	80,00	65.772,00	5.261.760,00	-	-	-	-	-	-	80,00	5.261.760,00	0%	100%
da para vendor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja electrica de 10cm con doble fondo, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa lisa -Incluye sensor) en Escalera	un	9,00	98.580,00	887.220,00	-	-	-	-	-	-	9,00	887.220,00	0%	100%
ministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo Bms de Rango C15-40W con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	126.890,00	772.140,00	-	-	-	-	-	-	8,00	772.140,00	0%	100%
da para control iluminacion, Incluye instalacion 3 cables No 16 THHN a ar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus ectores empalmes y derivaciones	un	432,00	25.044,00	10.819.008,00	-	-	-	-	-	-	432,00	10.819.008,00	0%	100%
da eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye ría EMT, accesorios, fijación, cajas metalica, tapa troquelada, cable LSHF, alambre y aparato.	un	13,00	118.597,00	1.541.761,00	-	-	-	-	-	-	13,00	1.541.761,00	0%	100%
da eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con tamiento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	156.405,00	312.810,00	-	-	-	-	-	-	2,00	312.810,00	0%	100%
da eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con amiento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	117.420,00	587.100,00	-	-	-	-	-	-	5,00	587.100,00	0%	100%
ca eléctrica de piso, para toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que ye caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y erros.	un	5,00	1.398.120,00	6.990.600,00	-	-	-	-	-	-	5,00	6.990.600,00	0%	100%
ca eléctrica de piso, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra ado, (1) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja ecial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	8,00	562.109,00	4.496.872,00	-	-	-	-	-	-	8,00	4.496.872,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIF - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115405-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.668.849,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.945.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.945.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.656.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	18/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

18/11/2021

...al de Valledupar, Cesar, el día 18 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALVIDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES ORIGINALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...da eléctrica para sensor, de puertas, que incluya: tubería EMT, accesorios, ...ción, cajas, cable LSHF. (No incluye sensor).	un	10,00	117.173,00	1.171.730,00	-	-	-	-	-	-	10,00	1.171.730,00	0%	100%
...da para salcho sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, Ejación, caja ...C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	117.173,00	585.865,00	-	-	-	-	-	-	5,00	585.865,00	0%	100%
...da para salcha doble en tubería EMT, incluye: accesorios, Ijación, caja ...C, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	135.757,00	678.785,00	-	-	-	-	-	-	5,00	678.785,00	0%	100%
...da para salche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, Ejación, caja ...C, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	141.066,00	564.264,00	-	-	-	-	-	-	4,00	564.264,00	0%	100%
...TALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...NIVEL 1 PISO 1				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Bala Lotus 1x13W.	un	42,00	145.812,00	6.124.104,00	-	-	-	-	-	-	42,00	6.124.104,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Pandora LED 18W.	un	22,00	174.603,00	3.841.266,00	-	-	-	-	-	-	22,00	3.841.266,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. 60x60 LED 36W.	un	13,00	246.762,00	3.207.906,00	-	-	-	-	-	-	13,00	3.207.906,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	85,00	879.429,00	74.751.465,00	-	-	-	-	-	-	85,00	74.751.465,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Cubik LED 6ROS 54W 3.0m.	un	12,00	564.988,00	6.779.856,00	-	-	-	-	-	-	12,00	6.779.856,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Poso LED Exterior.	un	43,00	36.839,00	1.584.077,00	-	-	-	-	-	-	43,00	1.584.077,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado Luminaria EM2 60LEDS.	un	38,00	199.840,00	7.593.920,00	-	-	-	-	-	-	38,00	7.593.920,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Luminaria AP1 platón en muro.	un	2,00	41.972,00	83.944,00	-	-	-	-	-	-	2,00	83.944,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchotado. Luminaria AP1 aplique de pared.	un	50,00	41.972,00	2.098.600,00	-	-	-	-	-	-	50,00	2.098.600,00	0%	100%
...ALIDAS ELECTRICAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...NIVEL 2 PISO 2				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, Ejación, caja ...tálica cero, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No ...luidas).	un	195,00	101.889,00	19.868.355,00	-	-	-	-	-	-	195,00	19.868.355,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No ...luidas).	un	16,00	117.909,00	1.886.544,00	-	-	-	-	-	-	16,00	1.886.544,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 6W. (No incluida).	un	38,00	117.897,00	4.480.086,00	-	-	-	-	-	-	38,00	4.480.086,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. ...o incluida).	un	60,00	105.909,00	6.360.540,00	-	-	-	-	-	-	60,00	6.360.540,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3.0m. ...o incluida).	un	80,00	105.009,00	8.400.720,00	-	-	-	-	-	-	80,00	8.400.720,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2493104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.468.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERÍODO FACTURADO

DESDE: 14/09/2021 HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021	A 14/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000804	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

d de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, Firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERNIDO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES SOCIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ulos,cable LSHF, conectores de resorte. Dyto LED GU10 7W 400-4000K (no incluida).	un	20,00	101.000,00	2.020.000,00	-	-			-	-	20,00	2.020.000,00	0%	100%
da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja 12x5 cms, cable LSHF, conectores de resorte. Culeb LED 8ROS 72W n. (No Incluida).	un	15,00	106.008,00	1.590.120,00	-	-			-	-	15,00	1.590.120,00	0%	100%
da para iluminación de emergencia en tubería EMT. Incluye accesorios, ción, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. minaria EM2 GOLEDS.(No Incluida).	un	71,00	120.659,00	8.566.789,00	-	-			-	-	71,00	8.566.789,00	0%	100%
da para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa , cable LSHF, prensaestopa, conector de resorte y encauchetado (3x15) de aje a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en vidrio.	un	8,00	67.895,00	543.158,00	-	-			-	-	8,00	543.158,00	0%	100%
da para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable HF, incluye accesorios, tornillos tapa Duo (No incluye sensor) en ubicaciones	un	18,00	98.579,00	1.774.422,00	-	-			-	-	18,00	1.774.422,00	0%	100%
ministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio C15-IDW con Unidad de Control Sugerido	un	18,00	128.690,00	2.316.420,00	-	-			-	-	18,00	2.316.420,00	0%	100%
da para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a cabar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus pectivos empalmes y derivaciones	un	521,00	25.044,00	13.047.924,00	-	-			-	-	521,00	13.047.924,00	0%	100%
da eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: ría EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa incuetada, cable LSHF, palme y aparato.	un	63,00	118.597,00	7.471.611,00	-	-			-	-	63,00	7.471.611,00	0%	100%
da eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con elemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	156.405,00	469.215,00	-	-			-	-	3,00	469.215,00	0%	100%
da eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado A, que incluye tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con elemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	49,00	117.479,00	5.753.580,00	-	-			-	-	49,00	5.753.580,00	0%	100%
da eléctrica para toma corriente Miller 220 V con polo a tierra, 15 A, que luye tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y rado.	un	12,00	124.722,00	1.496.664,00	-	-			-	-	12,00	1.496.664,00	0%	100%
da eléctrica para toma corriente Miller 220 V con polo a tierra, 15 A, tería y tienda, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, le LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	124.722,00	1.496.664,00	-	-			-	-	12,00	1.496.664,00	0%	100%
da para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	12,00	117.173,00	1.406.076,00	-	-			-	-	12,00	1.406.076,00	0%	100%
da para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	135.757,00	135.757,00	-	-			-	-	1,00	135.757,00	0%	100%
da para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	141.066,00	564.264,00	-	-			-	-	4,00	564.264,00	0%	100%
TALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
NIVEL 2 PISO 2	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchetado, Bala Luminaria 1x18W.	un	195,00	145.812,00	28.433.340,00	-	-			-	-	195,00	28.433.340,00	0%	100%
ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchetado, Pendore LED 18W.	un	16,00	174.603,00	2.793.648,00	-	-			-	-	16,00	2.793.648,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	20210403002	PROCESO LICITATORIO No	LGF - SSN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2699104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8301154080	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	20210503007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901435870-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/09/2021 HASTA 19/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

19/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021	A 11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

...d de Valledupar, Cesar, el dia 19 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 20210403002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES SOCIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Pandora LED 6W.	un	35,00	246.762,00	9.376.656,00	-	-		-	-	-	35,00	9.376.656,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Cobra LED 12ROS 10SW 6.0m.	un	60,00	879.479,00	52.768.740,00	-	-		-	-	-	60,00	52.768.740,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Cobra LED 6ROS 54W 3.6m.	un	80,00	564.988,00	45.199.040,00	-	-		-	-	-	80,00	45.199.040,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Cyro LED GU10 7W 450 4000K	un	20,00	36.839,00	736.780,00	-	-		-	-	-	20,00	736.780,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Cobra LED 8ROS 72W 4,8m.	un	15,00	669.452,00	10.041.780,00	-	-		-	-	-	15,00	10.041.780,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	71,00	199.840,00	14.189.640,00	-	-		-	-	-	71,00	14.189.640,00	0%	100%
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	41.972,00	335.776,00	-	-		-	-	-	8,00	335.776,00	0%	100%
...LIDAS ELÉCTRICAS				-	-	-		-	-	-	-	-		
...NIVEL 3 PISO 3				-	-	-		-	-	-	-	-		
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 6x13W. (No ...luida).	un	69,00	135.825,00	9.371.925,00	-	-		-	-	-	69,00	9.371.925,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 16W. (No ...luida).	un	12,00	135.825,00	1.629.900,00	-	-		-	-	-	12,00	1.629.900,00	0%	100%
...da para iluminación, que incluya: tubería PVC, accesorios, caja metálica, ...a fija, alambre, preensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de ...caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No Incluido).	un	12,00	90.300,00	1.083.600,00	-	-		-	-	-	12,00	1.083.600,00	0%	100%
...da para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, ...ación, caja metálica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. ...minaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	28,00	154.783,00	4.334.358,00	-	-		-	-	-	28,00	4.334.358,00	0%	100%
...da para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable ...SHF. incluye accesorios, tornillos, tapa fija (No incluye sensor) en ...ubicaciones	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	-	-		-	-	-	8,00	1.086.600,00	0%	100%
...ministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio ...SC15-40W con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	90.300,00	722.400,00	-	-		-	-	-	8,00	722.400,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye elementos de fijación, cable ...cauchetado. Cobra LED 12ROS 10SW 6.0m. (No incluida)	un	11,00	135.825,00	1.494.075,00	-	-		-	-	-	11,00	1.494.075,00	0%	100%
...da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ...tálica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-6OBR 4ROS 54W . (No ...luida).	un	4,00	135.825,00	543.300,00	-	-		-	-	-	4,00	543.300,00	0%	100%
...da para iluminación a 6 metros, en tubería EMT, incluye: accesorios, ...ación, caja metálica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de ...cauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexión ...da certificada (tuercas de conexión). Luminaria AP3 LED 45W.	un	12,00	151.343,00	1.816.116,00	-	-		-	-	-	12,00	1.816.116,00	0%	100%
...da para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHW a ...ocar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus ...spectivas empalmes y derivaciones	un	162,00	31.848,00	5.175.576,00	-	-		-	-	-	162,00	5.175.576,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499186
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021 A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021060009	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493670-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 — HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 18/11/2021

ed de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES SEGÚN EL CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: ería EMT, accesorios, fijación, caja metálica, tapa troquelada, cable LSHF, uadrea y aparato.	un	5,00	152.719,00	763.595,00	-	-	-	-	-	-	5,00	763.595,00	0%	100%
ida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con plamento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	20,00	151.543,00	3.030.860,00	-	-	-	-	-	-	20,00	3.030.860,00	0%	100%
ida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con plamento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	414.130,00	1.242.390,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.242.390,00	0%	100%
ida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con plamento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	409.917,00	1.229.751,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.229.751,00	0%	100%
ida eléctrica tipo Intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V n polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja VC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	173.796,00	695.184,00	-	-	-	-	-	-	4,00	695.184,00	0%	100%
ida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, uadrea y aparato	un	5,00	158.845,00	794.225,00	-	-	-	-	-	-	5,00	794.225,00	0%	100%
ida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a rra, (2) toma corriente polo a tierra aislado, 15 A, que incluye: caja especial, bezas EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	1.833.886,00	7.335.544,00	-	-	-	-	-	-	4,00	7.335.544,00	0%	100%
ida para salida sencilla en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja VC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	31,00	155.132,00	4.809.092,00	-	-	-	-	-	-	31,00	4.809.092,00	0%	100%
ida para salida doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja VC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	135.757,00	135.757,00	-	-	-	-	-	-	1,00	135.757,00	0%	100%
ida eléctrica empotrada, para timba y puerta levadiza de teatro, que duye: tubería 1.1/2 PVC, accesorios, fijación, caja metálica. No incluye ableado y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	-	-	-	-	-	-	4,00	823.412,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Start track spot smart 14W 3 rs90 nb black.	un	8,00	341.067,00	2.728.536,00	-	-	-	-	-	-	8,00	2.728.536,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref. Rane led r 500 ho 4k uerpo ext w gen7	un	156,00	333.333,60	51.999.948,00	-	-	-	-	-	-	156,00	51.999.948,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria tipo Bata, Ref: LYTEFRAM Recessed 70 W HI-PAR 111 24°	un	48,00	291.667,00	14.000.016,00	-	-	-	-	-	-	48,00	14.000.016,00	0%	100%
STALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N NIVEL 3 PISO 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
uministro e instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable ncauchetado. Bata Lotus 1x13W.	un	69,00	181.624,00	12.532.056,00	-	-	-	-	-	-	69,00	12.532.056,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ncauchetado, Bata Lotus 1x13W.	un	12,00	145.812,00	1.749.744,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.749.744,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ncauchetado. Luminaria API pigton en cuyo	un	12,00	41.972,00	503.664,00	-	-	-	-	-	-	12,00	503.664,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ncauchetado. Luminaria EM2 60LEDS.	un	26,00	199.840,00	5.195.840,00	-	-	-	-	-	-	26,00	5.195.840,00	0%	100%
uministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ncauchetado. TULED - 402 7W	un	8,00	189.840,00	1.598.720,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.598.720,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2416184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138,817,868,949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901433970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	15/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

15/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41,645,300,685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6,940,883,448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41,645,300,685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 18,058,120,274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 6,940,883,448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

ad de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Consesista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADO		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ministro e instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable cauchotado 3/cnj de retólgenos. Pandora LED 75W.	un	85,00	174.853,00	14.841.255,00	-	-			-	-	85,00	14.841.255,00	0%	100%
ministro e instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable cauchotado. DESC-GOBR 4ROS 108W.	un	11,00	246.762,00	2.714.382,00	-	-			-	-	11,00	2.714.382,00	0%	100%
ministro e instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable cauchotado. DESC-90BR 4ROS 36W .	un	4,00	566.735,00	2.266.940,00	-	-			-	-	4,00	2.266.940,00	0%	100%
ministro e instalación de luminaria. Incluye elementos de fijación, cable cauchotado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	209.459,00	2.465.508,00	-	-			-	-	12,00	2.465.508,00	0%	100%
ALIDAS ELÉCTRICAS				-	-	-			-	-	-	-		
NIVEL 4 PISO 4				-	-	-			-	-	-	-		
ida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica cmq, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No cluida).	un	13,00	135.825,00	1.765.725,00	-	-			-	-	13,00	1.765.725,00	0%	100%
ida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No cluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00	0%	100%
ida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No cluida)	un	6,00	90.300,00	541.800,00	-	-			-	-	6,00	541.800,00	0%	100%
ida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, ación, caja metálica, tomo conferto, cable LSHF, conectores de resorte. minaria EM2 60LEDS (No incluida).	un	12,00	154.783,00	1.857.396,00	-	-			-	-	12,00	1.857.396,00	0%	100%
ida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte. Panel LED 60x60 36W (No cluida).	un	2,00	135.825,00	271.650,00	-	-			-	-	2,00	271.650,00	0%	100%
ida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable SHF, incluye accesorios, tornillos, tapa liso (No incluye sensor) en ualquiera.	un	8,00	98.529,00	788.632,00	-	-			-	-	8,00	788.632,00	0%	100%
uministre e instalación de Sensor de movimiento 360° Techo Ents de Radio SC15-IDW con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	128.690,00	1.029.520,00	-	-			-	-	8,00	1.029.520,00	0%	100%
ida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja, cable LSHF, conectores de resorte. Dabli LED 12ROS 60BW 6.0m. (No cluida).	un	25,00	135.825,00	3.395.625,00	-	-			-	-	25,00	3.395.625,00	0%	100%
ida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-60BR 4ROS 54W . (No cluida).	un	34,00	135.825,00	4.618.050,00	-	-			-	-	34,00	4.618.050,00	0%	100%
ida para iluminación a 6 metros, en tubería EMT, incluye: accesorios, ación, caja metálica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de cauchotado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexión pida certificada (bomeras de conexión). Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	151.343,00	3.783.575,00	-	-			-	-	25,00	3.783.575,00	0%	100%
ida para control iluminación, incluye básicamente 2 cables #o 16 THHN a stalar en las tuberías de las salidas de iluminación anteriores con sus spectivos empalmes y derivaciones	un	141,00	31.948,00	4.504.668,00	-	-			-	-	141,00	4.504.668,00	0%	100%
ida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye tubería EMT, accesorios, fijación, caja metálica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	39,00	152.719,00	5.803.322,00	-	-			-	-	39,00	5.803.322,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SEN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2413184		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:					
NIT:	830115426-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.869.949,13						
PLAZO:	23 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO		DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.695,00	12/07/2021 A	11/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.695,00	12/07/2021 A	11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
NIT:	901433979-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 HASTA: 18/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 18/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el día 18 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que uye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre HW, conector de resorte y aparato.	un	28,00	151.343,00	4.237.604,00	-	-	-	-	-	-	28,00	4.237.604,00	0%	100%
ida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente 120 V con o a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja ática con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	18,00	414.130,00	7.454.340,00	-	-	-	-	-	-	18,00	7.454.340,00	0%	100%
ida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con tamario, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	30,00	409.017,00	12.267.510,00	-	-	-	-	-	-	30,00	12.267.510,00	0%	100%
ida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V, o polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja C con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	45,00	173.796,00	7.820.820,00	-	-	-	-	-	-	45,00	7.820.820,00	0%	100%
ida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente trifilar 220 V polo a tierra, 20 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja ática, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	158.845,00	794.225,00	-	-	-	-	-	-	5,00	794.225,00	0%	100%
ida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a ra. (2) toma corriente polo a tierra aislado, 15 A, que incluye: caja especial, ería EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	1.833.886,00	7.335.544,00	-	-	-	-	-	-	4,00	7.335.544,00	0%	100%
ida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	17,00	155.132,00	2.637.244,00	-	-	-	-	-	-	17,00	2.637.244,00	0%	100%
ida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	135.757,00	271.514,00	-	-	-	-	-	-	2,00	271.514,00	0%	100%
ida para suiche conmutable sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, ción, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	-	-	-	-	-	-	4,00	823.412,00	0%	100%
STALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NIVEL 4 PISO 4	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. Bala Lotus 1x13W.	un	13,00	181.624,00	2.361.112,00	-	-	-	-	-	-	13,00	2.361.112,00	0%	100%
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. Pandora LED 18W.	un	8,00	145.812,00	1.166.496,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.166.496,00	0%	100%
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. 1x28 Hermetica LED	un	6,00	41.972,00	251.832,00	-	-	-	-	-	-	6,00	251.832,00	0%	100%
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. Luminaria EU2 6XLEDS.	un	12,00	199.840,00	2.398.080,00	-	-	-	-	-	-	12,00	2.398.080,00	0%	100%
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. Panel LED 60x60W	un	2,00	199.840,00	399.680,00	-	-	-	-	-	-	2,00	399.680,00	0%	100%
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. DESC-SOBR 4RDS 36W .	un	34,00	566.735,00	19.269.990,00	-	-	-	-	-	-	34,00	19.269.990,00	0%	100%
mínistro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cauchotado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	205.459,00	5.136.475,00	-	-	-	-	-	-	25,00	5.136.475,00	0%	100%
LIDAS ELECTRICAS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NIVEL 5 PISO 5	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ática cna, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No ábida).	un	76,00	135.925,00	10.322.700,00	-	-	-	-	-	-	76,00	10.322.700,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0082 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	830115428-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.669.949,11					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIDIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.683.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.683.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
PERIODO FACTURADO	
DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021
FECHA PRESENTE ACTA	
18/11/2021	

d de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERNAD, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
da para iluminación en tubería EMT, incluye accesorios, fijación, caja ática, cable LSHF, conectores de resorte. Pendora LED 12W. (No uida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	-	-		-	-	-	8,00	1.086.600,00	0%	100%
da para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No uida)	un	7,00	90.300,00	632.100,00	-	-		-	-	-	7,00	632.100,00	0%	100%
da para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, ción, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. minaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	19,00	154.783,00	2.940.877,00	-	-		-	-	-	19,00	2.940.877,00	0%	100%
da para iluminación en tubería EMT, incluye. accesorios, fijación, caja ática, cable LSHF, conectores de resorte. Aplique LED 40W (No incluida).	un	5,00	135.825,00	679.125,00	-	-		-	-	-	5,00	679.125,00	0%	100%
da para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable HF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en alaciones	un	5,00	98.579,00	492.895,00	-	-		-	-	-	5,00	492.895,00	0%	100%
minstro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio C15-6DW con Unidad de Control Sugerido	un	5,00	128.690,00	643.450,00	-	-		-	-	-	5,00	643.450,00	0%	100%
da para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja ática, cable LSHF, conectores de resorte. Tipo Poste Tabaco LED 54W . o incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	-	-		-	-	-	8,00	1.086.600,00	0%	100%
da para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a ular en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus pectivos empalmes y derivaciones	un	133,00	31.948,05	4.249.084,00	-	-		-	-	-	133,00	4.249.084,00	0%	100%
da eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye ería EMT, accesorios, fijación, caja metálica, tapa troquelada, cable LSHF, palme y aparato.	un	12,00	152.719,00	1.832.628,00	-	-		-	-	-	12,00	1.832.628,00	0%	100%
da eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V polo a tierra a 15 A, que incluye tubería PVC, accesorios, fijación, caja C con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	173.796,00	868.980,00	-	-		-	-	-	5,00	868.980,00	0%	100%
da para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	10,00	155.132,00	1.551.320,00	-	-		-	-	-	10,00	1.551.320,00	0%	100%
da para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	135.757,00	271.514,00	-	-		-	-	-	2,00	271.514,00	0%	100%
da para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja C, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	-	-		-	-	-	4,00	823.412,00	0%	100%
STALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
NIVEL 3 PISO 3	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
minstro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cheteado. Bulla Lutra 1x13W.	un	75,00	181.524,00	13.803.424,00	-	-		-	-	-	75,00	13.803.424,00	0%	100%
minstro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cheteado. Pendora LED 16W.	un	8,00	145.812,00	1.166.496,00	-	-		-	-	-	8,00	1.166.496,00	0%	100%
minstro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cheteado. 1x28 Hermetica LED	un	7,00	41.972,00	293.804,00	-	-		-	-	-	7,00	293.804,00	0%	100%
minstro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cheteado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	19,00	199.840,00	3.796.960,00	-	-		-	-	-	19,00	3.796.960,00	0%	100%
minstro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable cheteado. Aplique LED	un	5,00	199.840,00	999.200,00	-	-		-	-	-	5,00	999.200,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2493104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154064	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138,817,668,942.11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901439910-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41,545,300,685.00	12/07/2021	A 11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6,940,693,443.00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41,545,300,685.00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 18,858,120,274.00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6,940,693,443.00	12/07/2021	A 11/05/2023

...d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...YEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
...SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...ministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable ...ucheteado. Tipo Poste Tafasco LED 54W	Un	8,00	147.292,00	1,178,336,00	-	-			-	-	8,00	1,178,336,00	0%	100%
...NEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...LIDAS DE FUERZA, INCLUYENDO; TUBERIAS EMT CON ...CESORIOS Y ANCLAJES, CABLES, ACOPLES FLEXIBLES, ...NECTORES, ETC, DESDE EL TABLERO HASTA LA BOMBAS SEGÚN ...ANOS	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
- Bomba Equipo de Presion Agua Potable, en cable ...No.1/0(F)+1xNo.1/0(N)+1xNo.8(T) AWG Cu	ML	95,00	307,494,00	29,211,930,00	-	-			-	-	95,00	29,211,930,00	0%	100%
- Bomba Equipo Red Contra Incendio, en cable ...3xNo.4/0(F)+1xNo.4/0(N)+1xNo.1/0(T) AWG Cu	ML	100,00	832,485,00	83,248,500,00	-	-			-	-	100,00	83,248,500,00	0%	100%
- Bomba Equipo pozo Evacuar aguas freaticas, en cable ...No.2(F)+1xNo.2(N)+1xNo.8(T) AWG Cu	ML	132,00	156,078,00	20,290,140,00	-	-			-	-	132,00	20,290,140,00	0%	100%
- Bomba Equipo pozo Evacuar aguas negras, en cable ...No.6(F)+1xNo.6(N)+1xNo.10(T) AWG Cu	ML	120,00	109,866,00	13,158,920,00	-	-			-	-	120,00	13,158,920,00	0%	100%
...NEXIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...LIDA COMPLETA PARA UNIDADES VENTILADORAS, ...WEJADORAS, EVAPORADORAS. INCLUYE TUBERIA EMT CON ...CCESORIOS Y ANCLAJES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES ...SDE EL TABLERO HASTA EL EQUIPO SEGUN PLANOS.	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...VIANO 2	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...Unidad) ventiladora # 13, en cable # 12	un	1,00	186,241,00	186,241,00	-	-			-	-	1,00	186,241,00	0%	100%
...Unidad ventiladora # 14, en cable 12	un	1,00	432,489,00	432,489,00	-	-			-	-	1,00	432,489,00	0%	100%
...Unidad ventiladora # 15, en cable # 12	un	1,00	307,494,00	307,494,00	-	-			-	-	1,00	307,494,00	0%	100%
...Unidad jet fan #1, en cable 12.	un	9,00	261,553,00	2,353,977,00	-	-			-	-	9,00	2,353,977,00	0%	100%
...tano 1	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...Unidad ventiladora # 10-11, en cable # 12	un	2,00	112,178,00	224,356,00	-	-			-	-	2,00	224,356,00	0%	100%
...Unidad jet fan #1, en cable 12.	un	9,00	261,553,00	2,353,977,00	-	-			-	-	9,00	2,353,977,00	0%	100%
...vel 1	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...Unidad FCC 360, en cable # 12	un	7,00	349,092,00	2,443,644,00	-	-			-	-	7,00	2,443,644,00	0%	100%
...Unidad ventiladora # 201, en cable # 12	un	1,00	92,678,00	92,678,00	-	-			-	-	1,00	92,678,00	0%	100%
...VEL 2	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...Unidad FCC 360, en cable # 12	un	15,00	349,092,00	5,236,380,00	-	-			-	-	15,00	5,236,380,00	0%	100%
...Unidad aire exterior UMA, en cable # 10	un	8,00	456,736,00	3,653,888,00	-	-			-	-	8,00	3,653,888,00	0%	100%
...VEL 3	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...UMA # 1, en cable # 8	un	1,00	78,995,00	78,995,00	-	-			-	-	1,00	78,995,00	0%	100%
...UMA # 2, en cable # 8	un	1,00	78,995,00	78,995,00	-	-			-	-	1,00	78,995,00	0%	100%
...UMA # 3, en cable # 8	un	1,00	81,895,00	81,895,00	-	-			-	-	1,00	81,895,00	0%	100%
...UMA # 3, en cable # 8	un	1,00	530,674,00	530,674,00	-	-			-	-	1,00	530,674,00	0%	100%
...Unidad bocti pared en cable # 12	un	10,00	530,674,00	5,306,740,00	-	-			-	-	10,00	5,306,740,00	0%	100%
...VEL 4	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...Unidad fancoil cassette 1 vía FCV en cable # 12	un	8,00	92,678,00	741,424,00	-	-			-	-	8,00	741,424,00	0%	100%
...Unidad fancoil cassette 360, FCC 360, en cable # 12	un	5,00	349,092,00	1,745,460,00	-	-			-	-	5,00	1,745,460,00	0%	100%
...VEL 5	0,00			-	-	-			-	-	-	-		
...Unidad fancoil cassette 360, FCC 360, en cable # 12	un	3,00	349,092,00	1,047,276,00	-	-			-	-	3,00	1,047,276,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021043002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIH - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2413184		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:					
NIT:	8907154266-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11						
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS		N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.		4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.		4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS		4617	$ 16.658.920.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901423970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 HASTA: 30/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

Id de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VERDS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021043002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	OBERTA	0,00			-	-			-	-	-	-		
	ividad condensadora UCA # 301, en cable # 6	un	10,00	82.678,00	-	-			-	-	10,00	826.780,00	0%	100%
	ombe agua fria BAF en cable # 10	un	2,00	82.678,00	-	-			-	-	2,00	165.356,00	0%	100%
	ractor tipo hongo EXT, en cable # 8	un	2,00	102.571,00	-	-			-	-	2,00	205.142,00	0%	100%
	ividad Chiller, en cable # 250	un	2,00	552.297,00	-	-			-	-	2,00	1.104.594,00	0%	100%
	NIENTADORES	0,00			-	-			-	-	-	-		
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. T. TD_ILUV SÓTANO 1	ml	55,00	38.150,00	-	-			-	-	55,00	2.212.700,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. T. TD_TOMAS SÓTANO 1	ml	55,00	33.556,00	-	-			-	-	55,00	1.845.680,00	0%	100%
	mentador en cable 3x2, 1x2, 1x4 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye mentos de fijacion. TD_AA S1	ml	15,00	49.648,00	-	-			-	-	15,00	744.720,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x8 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye mentos de fijacion. TD_ILUV P1	ml	82,00	38.150,00	-	-			-	-	82,00	3.128.300,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_TOMAS P1	ml	83,00	38.150,00	-	-			-	-	83,00	3.166.450,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_AA P1	ml	105,00	38.150,00	-	-			-	-	105,00	4.005.750,00	0%	100%
	mentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye mentos de fijacion. TD_ILUV P2	ml	20,00	38.150,00	-	-			-	-	20,00	763.000,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_TOMAS P2	ml	67,00	38.150,00	-	-			-	-	67,00	2.556.050,00	0%	100%
	mentador en cable 3x2, 1x2, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye mentos de fijacion. TD_TOMAS CE	ml	69,00	38.150,00	-	-			-	-	69,00	2.632.350,00	0%	100%
	mentador en cable 3x10, 1x10, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_ILUV CE	ml	71,00	38.150,00	-	-			-	-	71,00	2.708.650,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_AA P2	ml	56,00	38.150,00	-	-			-	-	56,00	2.136.400,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_P3	ml	55,00	38.150,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00	0%	100%
	mentador en cable 3x140, 1x140, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye mentos de fijacion. TD_AA P3	ml	25,00	126.509,00	-	-			-	-	75,00	3.162.725,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_P4	ml	65,00	25.911,00	-	-			-	-	65,00	2.202.435,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_AA P4	ml	44,00	33.589,00	-	-			-	-	44,00	1.478.996,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_P5	ml	50,00	33.589,00	-	-			-	-	50,00	1.677.950,00	0%	100%
	mentador en cable 3x40, 1x10, 1x2 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye mentos de fijacion. TD_AA CHILLER	ml	54,00	230.423,00	-	-			-	-	54,00	12.442.842,00	0%	100%
	mentador en cable 3x250, 1x250, 1x4 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye mentos de fijacion. TD_AA CUBIERTA	ml	35,00	258.129,00	-	-			-	-	35,00	8.984.515,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_LOCAL BANCARIO	ml	35,00	38.150,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00	0%	100%
	mentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye mentos de fijacion. TD_CAFÉ	ml	35,00	38.150,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439184	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	8901154035-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.868.949,11					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPARO	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.949.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	9014 930870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.949.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
PERIODO FACTURADO	
DESDE	HASTA
16/9/2021	10/11/2021
FECHA PRESENTE ACTA	
16/11/2021	

d de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEÑALO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. TD_ESC EL 1	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	-	-		-	-	-	35,00	1.335.250,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. TD_ESC EL 2	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	-	-		-	-	-	35,00	1.335.250,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. TD_ESC EL 3	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	-	-		-	-	-	35,00	1.335.250,00	0%	100%
mentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tubería EMT 2", incluye erriantes de fijación. TD_N Ascensor 1	ml	23,00	69.282,00	1.593.336,00	-	-		-	-	-	23,00	1.593.336,00	0%	100%
mentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tubería EMT 2", incluye erriantes de fijación. TD_N Ascensor 2	ml	58,00	69.362,00	4.022.996,00	-	-		-	-	-	58,00	4.022.996,00	0%	100%
mentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tubería EMT 2", incluye erriantes de fijación. TD_N Ascensor 3	ml	40,00	69.362,00	2.774.480,00	-	-		-	-	-	40,00	2.774.480,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x4, 1x6 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. TD_N Ascensor montacargas	ml	42,00	38.150,00	1.602.300,00	-	-		-	-	-	42,00	1.602.300,00	0%	100%
mentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tubería EMT 2", incluye erriantes de fijación. TD_N Ascensor 4	ml	99,00	38.150,00	3.776.850,00	-	-		-	-	-	99,00	3.776.850,00	0%	100%
mentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tubería EMT 2", incluye erriantes de fijación. TD_N Ascensor 5	ml	108,00	38.150,00	4.120.200,00	-	-		-	-	-	108,00	4.120.200,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. TD_N Bomba Jockey	ml	98,00	38.150,00	3.662.400,00	-	-		-	-	-	96,00	3.662.400,00	0%	100%
mentador en cable 3x250, 1x250, 1x1/0 Al, por tubería EMT 3". Incluye erriantes de fijación. UPS	ml	23,00	75.716,00	1.741.468,00	-	-		-	-	-	23,00	1.741.468,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. Tablero Regulado 1	ml	50,00	32.791,00	1.639.550,00	-	-		-	-	-	50,00	1.639.550,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. Tablero Regulado 2	ml	6,00	32.791,00	196.746,00	-	-		-	-	-	6,00	196.746,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. Tablero Regulado 3	ml	25,00	32.791,00	819.775,00	-	-		-	-	-	25,00	819.775,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. Tablero Regulado 4	ml	55,00	32.791,00	1.803.505,00	-	-		-	-	-	55,00	1.803.505,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. Tablero Regulado 5	ml	33,00	32.791,00	1.082.103,00	-	-		-	-	-	33,00	1.082.103,00	0%	100%
mentador en cable 3x6, 1x8, 1x10 AWG, por tubería EMT 1" , incluye erriantes de fijación. Tablero Regulado 6	ml	43,00	32.791,00	1.410.013,00	-	-		-	-	-	43,00	1.410.013,00	0%	100%
eroenergía con la planta de emergencia en 3x(3x500, 1x500, 1x250), Cu ebidas en placa. A BCI	ml	85,00	297.697,00	25.430.245,00	-	-		-	-	-	85,00	25.430.265,00	0%	100%
eroconexión con la planta de emergencia y transferencia en Electrobarra 00 A	ml	18,00	29.626.710,00	534.570.780,00	-	-		-	-	-	18,00	534.570.780,00	0%	100%
ble de cobre desnudo, # 2 AWG, para puesta a tierra equipos, incluye ajes	ml	210,00	10.092,00	2.112.600,00	-	-		-	-	-	210,00	2.112.600,00	0%	100%
ABLEROS E INTERRUPTORES	0,00			-	-	-		-	-	-	-	-		
tablero eléctrico de distribución de 30 circuitos trifásico para interruptores nichables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra dependientes), con puerta y chapa.	un	2,00	449.686,00	899.372,00	-	-		-	-	-	2,00	899.372,00	0%	100%
tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico para interruptores nichables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra dependientes), con puerta y chapa.	un	9,00	342.639,00	3.083.751,00	-	-		-	-	-	9,00	3.083.751,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.2499164	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.943,11					
PLAZO:	27 MESES					
PRORROGA No 1:	N/A					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021					
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023					
CONTRATO No	2021050007					
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR					
NIT:	901493970-2					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/09/2021 HASTA 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1003634	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

...ad de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...blero eléctrico de distribución de 12 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra dependientes), con puerta y chapa.	un	8,00	243.690,00	2.185.010,00	-	-		-	-	-	8,00	2.185.010,00	0%	100%
...blero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra dependientes), con puerta y chapa	un	8,00	283.594,00	2.268.752,00	-	-		-	-	-	8,00	2.268.752,00	0%	100%
...jilla para control de iluminacion en todas las zonas con interuptores	un	9,00	342.638,00	3.083.742,00	-	-		-	-	-	9,00	3.083.742,00	0%	100%
...de 10 puestos, para A/A en terraza - SP, dpo intemperie, para interruptor ...dustrial, trifásico, barras de 600 A, con puerta y chapa.	un	2,00	2.793.490,00	5.586.980,00	-	-		-	-	-	2,00	5.586.980,00	0%	100%
...de 10 puestos ,para A/A en exterior, para interruptor industrial, trifásico, ...rras de 225 A, con puerta y chapa.	un	1,00	2.558.590,00	2.558.590,00	-	-		-	-	-	1,00	2.558.590,00	0%	100%
...de 6 puestos para AA en exterior, para interruptor industrial, trifásico, barras ...225 A, con puerta y chapa.	un	1,00	2.369.921,00	2.369.921,00	-	-		-	-	-	1,00	2.369.921,00	0%	100%
...STEMA UPS DE 50 KVA	un	1,00	83.300.000,00	83.300.000,00	-	-		-	-	-	1,00	83.300.000,00	0%	100%
...bre o tablero para ubicar protecciones de entrada y salida de UPS	un	1,00	567.895,00	567.895,00	-	-		-	-	-	1,00	567.895,00	0%	100%
...pass de mantenimiento manual externo para la UPS, con todos sus ...cesorios.	un	1,00	1.350.878,00	1.350.878,00	-	-		-	-	-	1,00	1.350.878,00	0%	100%
...ruptores tipo industrial de 3x40A, como mínimo 25KA a 240V, con ...idades térmico ajustable de disparo	un	10,00	179.900,00	1.799.000,00	-	-		-	-	-	10,00	1.799.000,00	0%	100%
...ruptores tipo industrial de 3x150A, como mínimo de 25KA a 240V, con ...idades térmico ajustable de disparo.	un	1,00	564.480,00	564.480,00	-	-		-	-	-	1,00	564.480,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) enchufable 1x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	400,00	12.617,00	5.046.800,00	-	-		-	-	-	400,00	5.046.800,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) enchufable 2x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	2,00	18.023,00	36.046,00	-	-		-	-	-	2,00	36.046,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) enchufable 2x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	2,00	15.949,00	33.898,00	-	-		-	-	-	2,00	33.898,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) enchufable 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	7,00	41.155,00	288.085,00	-	-		-	-	-	7,00	288.085,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) enchufable 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	41.155,00	41.155,00	-	-		-	-	-	1,00	41.155,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) enchufable 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	56.670,00	56.670,00	-	-		-	-	-	1,00	56.670,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	129.991,00	129.991,00	-	-		-	-	-	1,00	129.991,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	12,00	129.919,00	1.559.028,00	-	-		-	-	-	12,00	1.559.028,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	6,00	129.919,00	779.514,00	-	-		-	-	-	6,00	779.514,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	152.742,00	458.226,00	-	-		-	-	-	3,00	458.226,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x80 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	189.093,00	567.279,00	-	-		-	-	-	3,00	567.279,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x100 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	189.093,00	189.093,00	-	-		-	-	-	1,00	189.093,00	0%	100%
...ruptor automático (breaker) industrial 3x400 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	1.740.000,00	5.220.000,00	-	-		-	-	-	3,00	5.220.000,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021061002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - 039 - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3151164
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154060	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050003	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901439670-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
NDEJAS PORTACABLE Y CANALIZACIONES SUPERFICIALES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MINISTRO E INSTALACIÓN DE:	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ndeja portacables tipo malla de 5.4x150 mm, Incluye accesorios y mentos de Fijación.	ml	71,00	91.570,00	6.501.470,00	-	-	-	-	-	-	71,00	6.501.470,00	0%	100%
ndeja portacables tipo malla 300 mm, Incluye accesorios y elementos de ción.	ml	30,00	54.672,00	1.640.160,00	-	-	-	-	-	-	30,00	1.640.160,00	0%	100%
nalización superficial metálica 12x5 cm con división, Incluye accesorios y mentos de fijación.	ml	272,00	35.257,00	9.589.064,00	-	-	-	-	-	-	272,00	9.670.064,00	0%	100%
ANTALLAMIENTO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ta Fresvián 150 cms en acero inox	un	9,00	79.040,00	711.360,00	-	-	-	-	-	-	9,00	711.360,00	0%	100%
mbcon 8 mm	ml	564,00	8.713,00	4.914.132,00	-	-	-	-	-	-	564,00	4.914.132,00	0%	100%
le de Aluminio 2/0 AWG THHN instalado, para anillos, bajante o xiones.	ml	24,00	8.713,00	209.112,00	-	-	-	-	-	-	24,00	209.112,00	0%	100%
le de Cobre 2/0 AWG AWG desnudo, desde la caja de conexión hasta la ta de tierra.	ml	104,00	14.564,00	1.514.656,00	-	-	-	-	-	-	104,00	1.514.656,00	0%	100%
ería PVC de 1", Incluye accesorios prefabricados y soldadura PVC.	ml	468,00	7.782,00	3.641.976,00	-	-	-	-	-	-	468,00	3.641.976,00	0%	100%
lla copperweld 5/8"x2,4 mts	un	6,00	38.899,00	311.112,00	-	-	-	-	-	-	6,00	311.112,00	0%	100%
nector de compresión en aluminio Al-Al, Incluye la instalación y ambiataje	un	14,00	8.216,00	115.024,00	-	-	-	-	-	-	14,00	115.024,00	0%	100%
nector bimetálico tipo H101D para empalme Al-Cu, Incluye la instalación y ntada	un	71,00	25.709,00	1.825.339,00	-	-	-	-	-	-	71,00	1.825.339,00	0%	100%
dadura exotérmica	un	21,00	26.486,00	556.206,00	-	-	-	-	-	-	21,00	556.206,00	0%	100%
a de inspección 30x30 cm en concreto	un	5,00	241.600,00	1.208.000,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.208.000,00	0%	100%
s metálicas de 15x15 cm aprox. Para empalme entre el cable Al 2/0 bajante cable Cu 2/0 de tierra.	un	37,00	31.705,00	1.173.085,00	-	-	-	-	-	-	37,00	1.173.085,00	0%	100%
ROS TRABAJOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NISTRO DE HORAS HOMBRE, INCLUYENDO HERRAMIENTA, UIPO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN, PARA TODOS LOS RETIROS DE INSTALACIÓN SOBRANTE Y OTRAS OBRAS NO CONTEMPLADAS LOS ANTERIORES PUNTOS.	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ora oficial	un	40,00	13.453,00	538.120,00	-	-	-	-	-	-	40,00	538.120,00	0%	100%
ora ayudante	un	40,00	9.600,00	384.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	384.000,00	0%	100%
RAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES REDES EXTERNAS BLEADO ESTRUCTURADO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
nistro e Instalación de herraje para cámara de entrada 60X80 cm de comunicaciones subterráneas: Incluye, Ducteria PVC 4x2" Pesada tipo DB de red de alimentación hasta Caja de Paso en cruce y accesorios para la lación. (Prom - m x 12).	un	1,00	258.963,00	258.963,00	-	-	-	-	-	-	1,00	258.963,00	0%	100%
RAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL SOTANO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
nistro e Instalación salida para toma voz y datos en tubería EMT de 1", 12x12 cm. Incluye tubería EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, a en alambre 16 galvanizado y tapa ciega, No Incluye Ajustes, nalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	-	-	-	-	-	-	1,00	45.401,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIH - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890113408-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.658.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.045.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.840.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.045.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901430970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.840.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 14/09/2021 — HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2021

ad de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ministro e instalación salida para toma datos sencilla en tubería EMT de 1", ja 12x12 cm, incluye tubería EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, de en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No incluye Aparatos. analización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	-	-	-	-	-	-	1,00	45.401,00	0%	100%
FRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL -1	0,00			-										
ministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tubería PVC 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No duye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	66.589,00	266.356,00	-	-	-	-	-	-	4,00	266.356,00	0%	100%
ministro e instalación salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", ja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No duye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	74,00	45.401,00	3.359.674,00	-	-	-	-	-	-	74,00	3.359.674,00	0%	100%
ministro e instalación salida para toma datos sencilla en tubería PVC de 1", la 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No duye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	7,00	45.401,00	317.807,00	-	-	-	-	-	-	7,00	317.807,00	0%	100%
ministro e instalación salida para Access Point sencilla en tubería PVC de 1", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, oldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No incluye enatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	3,00	84.586,00	253.758,00	-	-	-	-	-	-	3,00	253.758,00	0%	100%
ministro e instalación salida para Caja de Telecomunicaciones 20x20 cm n tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde bolitón en nto fijo, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa o. No incluye Aparatos.	un	3,00	74.142,00	222.426,00	-	-	-	-	-	-	3,00	222.426,00	0%	100%
ministro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 30x5cm, incluye: daje y accesorios hasta bolitón punto técnico de telecomunicaciones.	ml	95,00	89.175,00	8.471.625,00	-	-	-	-	-	-	95,00	8.471.625,00	0%	100%
ministro e instalación salida para TV con tubería PVC de 3/4", caja 4x4". luye tubería PVC desde bolitón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, ía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No incluye Aparatos. analización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	-	-	-	-	-	-	1,00	45.401,00	0%	100%
FRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL 0	0,00			-										
ministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tubería PVC 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No duye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	39.810,00	39.810,00	-	-	-	-	-	-	1,00	39.810,00	0%	100%
ministro e instalación salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", a 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No duye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	6,00	45.401,00	272.406,00	-	-	-	-	-	-	6,00	272.406,00	0%	100%
ministro e instalación salida para toma datos sencilla en tubería PVC de 1", a 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa tipo. No duye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	18,00	45.401,00	817.218,00	-	-	-	-	-	-	18,00	817.218,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SDV - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	COLPCCNTR.2439104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.892.849,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPARO	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.845.300.085,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 8.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.845.300.085,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.638.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901439978-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 8.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 8/09/2021 HASTA: 10/10/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

...d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, las señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
...SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
...inistro e instalación salida para Access Point sencilla en tubería PVC de ..., caja 4x4". Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, ...oldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa ticus. No incluye ...ración. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	84.596,00	169.192,00	-	-	-	-	-	-	2,00	169.192,00	0%	100%
...inistro e instalación salida para TV con tubería PVC de 3/4", caja 4x4". ...luye tubería PVC desde buitrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, ...e en alambre 16 galvanizado y tapa ticus. No incluye Aparatos. ...nalización solamente y cableado por aparte)	un	15,00	45.401,00	681.015,00	-	-	-	-	-	-	15,00	681.015,00	0%	100%
...RAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL #1	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...inistro e instalación salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", ...4x4" doble fondo, incluye tubería PVC desde bandeja portacable, ...cesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa ticus. No ...luye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	7,00	45.401,00	317.807,00	-	-	-	-	-	-	7,00	317.807,00	0%	100%
...inistro e instalación salida para Access Point sencilla en tubería PVC de ..., caja 4x4". Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, ...oldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa ticus. No incluye ...entos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	84.596,00	84.596,00	-	-	-	-	-	-	1,00	84.596,00	0%	100%
...RAESTRUCTURA VERTICAL TELECOMUNICACIONES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...inistro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 60x8 cm, entre ...no 1 y Piso 4. Incluye: anclaje y accesorios.	ml	12,00	18.963,00	227.556,00	-	-	-	-	-	-	12,00	227.556,00	0%	100%
...el para salida voz y datos en canaleta 15x5 de presión.	un	20,00	3.027,00	60.540,00	-	-	-	-	-	-	20,00	60.540,00	0%	100%
...cación de gabinetes de seguridad, sensores, detectores, cableado y demás ...mentos que conforman el sistema con Grita en impresión Térmica	un	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.500.000,00	0%	100%
...umentación " Diagramas de Conexión, Planos de Rutas" de toda la ...alación.	un	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.500.000,00	0%	100%
...RAESTRUCTURA DETECCION DE INCENDIOS. TODOS LOS NIVELES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
...inistro de salida para sensor de temperatura en cielo en tubería EMT de ..., caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, ...e en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según diseños de plano. ...nalización solamente y cableado por aparte)	un	40,00	54.873,80	2.194.920,00	-	-	-	-	-	-	40,00	2.194.920,00	0%	100%
...inistro de salida para sensor de humo foto electrico en cielo en tubería ...T de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, ...dadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según ...lles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	115,00	77.765,00	8.945.275,00	-	-	-	-	-	-	115,00	8.945.275,00	0%	100%
...inistro de salida para sensor opto-térmico en cielo en tubería EMT de 3/4", ...4x4", incluye tubería EMT entre sensores, accesorios, soldadura, guía en ...bre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. ...alización solamente y cableado por aparte)	un	12,00	54.873,00	658.476,00	-	-	-	-	-	-	12,00	658.476,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3119184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.665,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4317	$ 8.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.665,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 18.655.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 8.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
10/07/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS CALIMDO. supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro de salida para estación manuel en muro con tubería EMT de 3/4", 4x4", incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en obre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. nalización solamente y cableado por aparte)	un	16,00	54.873,00	877.968,00	-	-	-	-	-	-	16,00	877.968,00	0%	100%
inistro de salida para sirena estroboscopica en muro con tubería EMT de , caja 4x4", incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, a en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. nalización solamente y cableado por aparte)	un	15,00	54.873,00	823.095,00	-	-	-	-	-	-	15,00	823.095,00	0%	100%
inistro de salida para módulo direccionable en muro con tubería EMT de , caja 4x4", incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, a en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. nalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	54.873,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00	0%	100%
inistro de salida para receptor beam en muro con tubería EMT de 3/4", 4x4", incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en obre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. nalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	78.873,00	315.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	315.492,00	0%	100%
inistro de salida para transmisor beam en muro con tubería EMT de 3/4", 4x4", incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en bre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano.	un	4,00	97.873,00	391.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	391.492,00	0%	100%
RAESTRUCTURA SONIDO, NIVEL SOTANO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
inistro e instalación salida para Sonido en Muro en tubería EMT de 3/4", 4x4", incluye tubería PVC desde cuarto de comunicaciones, accesorios, ubería EMT, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. No incluye ado ni aparatos(Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	77.785,00	311.140,00	-	-	-	-	-	-	4,00	311.140,00	0%	100%
RAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO, NIVEL PISO +1	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
inistro e instalación salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", 4x4", incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, ubería PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa (alización solamente y cableado por aparte)	un	21,00	54.873,00	1.152.333,00	-	-	-	-	-	-	21,00	1.152.333,00	0%	100%
inistro e instalación salida para Sonido en muro en tubería PVC de 3/4", 4x4", incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, ubería PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa (alización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	51.578,00	103.156,00	-	-	-	-	-	-	2,00	103.156,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIV - 0082 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3419184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.958.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021 A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 8.943.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.943.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 8/09/2021 HASTA: 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el dia 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Consultor de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES SOCIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
inistro e Instalación salida para Caja de Video en muro con tubería PVC 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa flex. (Construcción estimada y cobrado por aparte)	un	4,00	54.873,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00	0%	100%
inistro e Instalación salida para proyector en muro con tubería PVC de , caja 4x4", incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, dadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa flex.	un	4,00	54.873,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00	0%	100%
inistro e instalación salida para placa empotrada en tubería PVC de 3/4", 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, esorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa flex. No uye Aparatos.	un	25,00	54.873,00	1.371.825,00	-	-	-	-	-	-	25,00	1.371.825,00	0%	100%
inistro e instalación salida para control de aire en cielo en tubería PVC de , caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, esorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa flex. No uye Aparatos.	un	2,00	89.541,00	179.082,00	-	-	-	-	-	-	2,00	179.082,00	0%	100%
RAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO 0	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
inistro e Instalación salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", 4x4", incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, dadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa flex.	un	13,00	54.873,00	713.349,00	-	-	-	-	-	-	13,00	713.349,00	0%	100%
inistro e Instalación salida para Sonido en Muro en tubería PVC de 3/4", 4x4", incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, dadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa flex.	un	2,00	51.575,00	103.150,00	-	-	-	-	-	-	2,00	103.150,00	0%	100%
inistro e Instalación salida para Caja de Video en muro con tubería PVC 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa flex.	un	4,00	54.873,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00	0%	100%
inistro e instalación salida para microfono en muro con tubería PVC de , caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable, esorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa flex.	un	4,00	65.874,00	263.496,00	-	-	-	-	-	-	4,00	263.496,00	0%	100%
RAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO +1	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIM - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3439184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8301154060	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139,817,658,919.11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No I:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41,845,300,685.00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6,943,883,448.00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41,845,300,685.00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16,658,120,274.00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901423670-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1002834	$ 6,943,883,448.00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

l de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERNIDO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
ministro e Instalación salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", x 4x4", incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, dadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	16,00	54.873,00	877.968,00	-	-	-	-	-	-	16,00	877.968,00	0%	100%
RAESTRUCTURA CONTROLES DE ACCESO TODOS LOS NIVELES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	
das para lacteras en tubería EMT de 3/4" con sus uniones, curvas y grapas. incluye cableado ni aparatos (Canalización aclarante y cableado por aparte)	un	38,00	89.873,00	3.415.174,00	-	-	-	-	-	-	38,00	3.415.174,00	0%	100%
ministro de salida para pulsador de salida en pared en tubería EMT de 3/4", x 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, dadura, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización amente y cableado por aparte)	un	20,00	112.584,00	2.251.680,00	-	-	-	-	-	-	20,00	2.251.680,00	0%	100%
ministro e Instalación salida para Electroimán en dintel de la puerta con ería EMT de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería EMT desde la deja portacable; accesorios, soldadura guía en alambre 18 galvanizado, a y tapa lisa. (Canalización aclarante y cableado por aparte)	un	27,00	112.584,00	3.039.768,00	-	-	-	-	-	-	27,00	3.039.768,00	0%	100%
ministro de salida para Pulsador de liberación general en pared en tubería C de 3/4", caja 4x4", incluye tubería PVC desde pared; accesorios, dadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa lisa. nalización aclarante y cableado por aparte)	un	2,00	54.873,00	109.746,00	-	-	-	-	-	-	2,00	109.746,00	0%	100%
ministro de salida para gabinete control acceso, incluye toma Regulada	un	11,00	175.830,00	1.934.130,00	-	-	-	-	-	-	11,00	1.934.130,00	0%	100%
RAESTRUCTURA CCTV TODOS LOS NIVELES	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ministro de salida para cámara tipo domo en tubería EMT de 3/4", caja ". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable, accesorios, soldadura 7, guía en alambre 18 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización amente y cableado por aparte)	un	24,00	89.873,00	2.156.952,00	-	-	-	-	-	-	24,00	2.156.952,00	0%	100%
ministro de salida para cámara tipo bala en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". uye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, a en alambre 18 galvanizado, caja y tapa lisa (Canalización aclarante y deado por aparte)	un	8,00	89.873,00	718.984,00	-	-	-	-	-	-	8,00	718.984,00	0%	100%
ministro e Instalacion de tubería EMT 3/4 con sus respectivos accesorios no uniones, curvas, grapas, marcacion etc. Esta tubería es la adicional a la uida en los ítems anteriores	ML	400,00	15.496,00	6.198.400,00	-	-	-	-	-	-	400,00	6.198.400,00	0%	100%
RAESTRUCTURA EQUIPOS ELECTROMECANICOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ministro e Instalacion de tubería EMT 3/4 con sus respectivos accesorios no uniones, curvas, grapas, marcacion etc.	ML	500,00	15.496,00	7.748.000,00	-	-	-	-	-	-	500,00	7.748.000,00	0%	100%
ROS VARIOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
nte Electrico 800KVA electivos Valledupar	un	1,00	248.500.000,00	248.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	248.500.000,00	0%	100%
ransformador Baja-Baja Tipo Seco 225kVA, 208V/480V	un	2,00	25.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	50.000.000,00	0%	100%
QUITECTÓNICOS	0,00			$ 38.812.168.494,21	-	-	-	$ -	-	$ -	-	$ 38.812.168.494,21	0%	100%
IBERTAS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BIERTA TIPO 1 (P7) PISO FLOTADO DE MADERA	m2	1.163,71	477.478,00	$55.647.087,09	-	-	-	-	-	-	1.163,71	$55.647.087,09	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SSV - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3459184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	830115406-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.999.949,14				
PLAZO:	29 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901423970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 HASTA: 10/10/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4917	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4917	$ 6.943.883.448,60	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4917	$ 41.645.300.585,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4917	$ 15.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1600834	$ 6.943.883.448,60	12/07/2021	A 11/05/2023

...al de Valledupar, Cesar, al día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARBOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERNALDO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
BIERTA TIPO 2 (P10) MULCH DE CORTEZA VEGETAL	m2	2.945,65	277.785,00	818.257.385,25	-	-	-	-	-	-	2.945,65	818.257.385,25	0%	100%
BIERTA TIPO 3 (P11) VEGETACIÓN + SUSTRATO PARA VEGETACIÓN	m2	958,20	345.885,00	331.427.007,00	-	-	-	-	-	-	958,20	331.427.007,00	0%	100%
MPOSTERIA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RO BLOQUE #5 DE ARCILLA 33X11,5X23 CM, E=11,5CM	M2	673,00	85.471,00	57.521.983,00	-	-	-	-	-	-	673,00	57.521.983,00	0%	100%
RO DRYWALL CON LAMINA DE FIBROCEMENTO de 9mm 106/600 +90+6)	M2	4.343,00	106.524,00	462.633.732,00	-	-	-	-	-	-	4.343,00	462.633.732,00	0%	100%
RO DOBLE DRYWALL CON LAMINA DE FIBROCEMENTO de 9mm UGO (6+90+6+90+6)	M2	2.055,00	244.894,00	503.462.670,00	-	-	-	-	-	-	2.055,00	503.462.670,00	0%	100%
RO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM, 20CM	M2	983,00	141.349,00	138.947.767,00	-	-	-	-	-	-	983,00	138.947.767,00	0%	100%
ASOS DRYWALL 72,7/600 (12,7+60)	m2	445,54	53.248,00	23.945.992,84	-	-	-	-	-	-	445,54	23.945.992,84	0%	100%
ASOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	m2	129,82	61.313,00	7.959.653,66	-	-	-	-	-	-	129,82	7.959.653,66	0%	100%
RO DRYWALL CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 85,6/600 2,7+60LR+12,7)	m2	266,41	159.929,00	42.606.584,89	-	-	-	-	-	-	266,41	42.606.584,89	0%	100%
ASOS SALA DE GRABACIÓN 84,4/400 (60LR+12,7+LBM+12,7) CON MINA BETUN MODIFICADO	m2	557,50	185.277,00	105.144.897,50	-	-	-	-	-	-	557,50	105.144.897,50	0%	100%
RO SALA EVENTOS 216,7/400 (6+90LR+12,7+90LR+6+6)	m2	790,58	337.008,00	266.432.575,22	-	-	-	-	-	-	790,58	266.432.575,22	0%	100%
NVOLVENTE Y CIERRES COMPUESTOS DE FACHADA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 ENVOLVENTE EDIFICIO MEDIANTE MALLA METALICA ETALSCREEN HUNTER DOUGLAS	M2	9.500,00	930.000,00	8.835.000.000,00	-	-	-	-	-	-	9.500,00	8.835.000.000,00	0%	100%
BLOQUE CONCRETO 40X20X20 + PAÑETE HIDROFUGO + PINTURA TUMESCENTE	M2	1.141,75	351.309,00	401.209.608,25	-	-	-	-	-	-	1.141,75	401.209.608,25	0%	100%
BLOQUE CONCRETO 40X20X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA TUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	41,09	412.712,00	16.958.336,08	-	-	-	-	-	-	41,09	16.958.336,08	0%	100%
BLOQUE CONCRETO 40X20X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA TUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	621,18	409.562,00	254.411.723,16	-	-	-	-	-	-	621,18	254.411.723,16	0%	100%
CUBRIMIENTO DE MURO CON PALO Handroanthus impetiginosus (PALOS BRASIL)	M2	423,24	617.852,00	261.499.680,48	-	-	-	-	-	-	423,24	261.499.680,48	0%	100%
ECUBRIMIENTO DE MURO CON PALO Handroanthus impetiginosus (PALOS E BRASIL)Y SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE	M2	419,31	660.618,00	269.583.033,58	-	-	-	-	-	-	419,31	269.583.033,58	0%	100%
CHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P1ª SISTEMA SPIDER	M2	418,04	827.691,00	345.919.444,64	-	-	-	-	-	-	418,04	345.919.444,64	0%	100%
CHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P2ª CON LAMAS Y VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	228,50	857.709,00	196.271.506,50	-	-	-	-	-	-	228,50	196.271.506,50	0%	100%
CHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P4ª CON VIDRIO LAMINADO 8+8	M2	185,84	854.808,00	90.472.878,72	-	-	-	-	-	-	185,84	90.472.878,72	0%	100%
CHADA EN VIDRIO PERFILES DE ACERO DE P5ª CON VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	338,93	892.105,00	302.361.147,65	-	-	-	-	-	-	338,93	302.361.147,65	0%	100%
NTANA V1	M2	5,11	456.170,00	2.331.828,70	-	-	-	-	-	-	5,11	2.331.828,70	0%	100%
NTANA V2	M2	5,11	492.338,00	2.515.847,18	-	-	-	-	-	-	5,11	2.515.847,18	0%	100%
NTANA V3	M2	1,82	539.718,00	982.286,76	-	-	-	-	-	-	1,82	982.286,76	0%	100%
NTANA V5	M2	22,50	686.864,00	15.431.940,00	-	-	-	-	-	-	22,50	15.431.940,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021049002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2459184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8301154049	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.665,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.665,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901419870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1600834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 01/09/2021 — HASTA 10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

El día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARDOVIE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS CALIMDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021049002 la cual se relaciona a continuación:

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL No. 001 CANT.	ACTA PARCIAL No. 001 VR. TOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002 CANT.	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002 VR. TOTAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANT.	POR EJECUTAR VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
NTANA V7	M2	13,18	644.972,00	8.497.173,52	-	-	-	-	-	-	13,18	8.497.173,52	0%	100%
NTANA V8	M2	0,85	365.553,00	386.979,45	-	-	-	-	-	-	0,85	386.979,45	0%	100%
ERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	5,00	3.971.826,00	19.859.130,00	-	-	-	-	-	-	5,00	19.859.130,00	0%	100%
ERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA P5*	UD	5,00	2.594.156,00	12.970.780,00	-	-	-	-	-	-	5,00	12.970.780,00	0%	100%
CUBRIMIENTO EN MUROS	0,00			-							-	-		
TUCO Y PINTURA 3 MANOS VINILTEX ACRILTEX RAL SEGUN PLANOS (M+M2+M3+M8+M9+M10+M14+cortina malla metalica)	M2	13.245,27	41.601,00	551.139.200,22	-	-	-	-	-	-	13.245,22	551.139.200,22	0%	100%
RETE E=20MM, MALLA CON VENA (M8+M9+M10+M14+M24)	M2	3.312,00	37.500,00	124.464.832,09	-	-	-	-	-	-	3.312,00	124.464.832,09	0%	100%
8 / LISTONES TIPO LAMITECH SILENCIA 2400X128MM	M2	440,68	439.751,00	193.789.470,68	-	-	-	-	-	-	440,68	193.789.470,68	0%	100%
0 / ENCHAPE DE CERAMICA BRILLANTE CORONA MARIPOSAS	M2	1.171,42	72.676,00	85.134.919,92	-	-	-	-	-	-	1.171,42	85.134.919,92	0%	100%
2+M23 / RECUBRIMIENTO MADERA CONTRACHAPADA DE PINO 12MM BARNIZADO	M2	144,15	207.029,00	29.829.720,35	-	-	-	-	-	-	144,15	29.829.720,35	0%	100%
9 / TEXTIL VINILICO EN ROLLO+ADHESIVO DE CEM. CONTACTO	M2	534,91	202.590,00	108.359.021,63	-	-	-	-	-	-	534,91	108.359.021,63	0%	100%
M25/PANEL ACUSTICO RANURADO EN MADERA DE 15MM (M+M25)	M2	511,93	520.473,00	266.445.742,89	-	-	-	-	-	-	511,93	266.445.742,89	0%	100%
SOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
STADO DE PISO DE MORTERO 1M, E=5CM +P2+P3+P4+P8+P18+P19)	M2	5.323,48	33.844,00	179.103.181,12	-	-	-	-	-	-	5.323,48	179.103.181,12	0%	100%
/ PISO TEXTIL VINILICO ROLLO E=4MM Y ADHESIVO PVA BASE AGUA +P15)	M2	3.653,09	271.854,00	993.033.357,86	-	-	-	-	-	-	3.653,09	993.033.357,86	0%	100%
8 / PISO TEXTIL VINILICO E=4MM+ADHESIVO PVA BASE AGUA+PELDAÑOS CON TERRAZO 2*	M2	337,84	358.454,00	121.100.099,36	-	-	-	-	-	-	337,84	121.100.099,36	0%	100%
/ LISTONES DE MADERA E=5MM ACQUAFLOOR (ROBLE ENA)+LAMINA ANTI-IMPACTO (P2+P8)	M2	1.039,71	189.438,00	196.960.582,98	-	-	-	-	-	-	1.039,71	196.960.582,98	0%	100%
/ BALDOSA PORCELANATO SOHO GRIS DE CORONA DIMENSIONES 595X595X9,5MM (P4+P19)	M2	275,79	99.323,00	27.392.290,17	-	-	-	-	-	-	275,79	27.392.290,17	0%	100%
TERRAZO GRIS 30X30X25MM TOMADO CON MORTERO EN CALERAS	M2	224,48	172.877,00	38.807.428,96	-	-	-	-	-	-	224,48	38.807.428,96	0%	100%
/ LAMINA DE POLIETILENO + PANEL RIGIDO DE LANA ROCA E=30MM 120KG/M3 + LAMINA POLIETILENO	M2	60,41	76.341,00	4.611.759,81	-	-	-	-	-	-	60,41	4.611.759,81	0%	100%
/ ALISTADO DE PISO C.MORTERO ALTA RESISTENCIA + EPOXI DE TO DESEMPEÑO SIKAGUARD 63N RAL7035	M2	763,42	190.875,00	145.794.134,50	-	-	-	-	-	-	763,42	145.794.134,50	0%	100%
/ EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUAD 63N RAL7035 NTIDESLIZANTE CON ARIDO ARENOSO EN LA MEZCLA.	M2	267,68	153.101,00	41.012.695,68	-	-	-	-	-	-	267,68	41.012.695,68	0%	100%
5 / ACABADO PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON ENDURECEDOR E CUARZO	M2	8.444,27	44.668,00	377.357.537,76	-	-	-	-	-	-	8.444,27	377.357.537,76	0%	100%
/ / ACABADO PULIDO + EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUARD H RAL7035	M2	653,55	173.954,00	113.667.636,70	-	-	-	-	-	-	653,55	113.667.636,70	0%	100%
0 / ACABADO RANURADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	562,69	13.837,00	7.846.143,53	-	-	-	-	-	-	562,69	7.846.143,53	0%	100%
OLERA SOBRE ELEVADA DE 10CM CON EPS ICOPOR DENSIDAD 20 (50 OCM)	M2	540,81	149.848,00	81.039.296,88	-	-	-	-	-	-	540,81	81.039.296,88	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO #o	LOP - SDV - 0007 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3498104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154060	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 155,817,658,969,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPARO	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901430970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/09/2021 — HASTA 09/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A , Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES IMELO y VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
LERA SOBRE ELEVADA DE 15CM CON EPS ICOPOR DENSIDAD 20 (50 CM)	M2	540,48	168.831,00	91.790.258,88	-	-	-	-	-	-	540,48	91.790.258,88	0%	100%
SA SOBRE-ELEVADA EN SOTANO -2 DE 7-8CM + LAMINA ORIENANTE 2CM	M2	5.424,27	85.613,00	465.472.681,51	-	-	-	-	-	-	5.424,27	465.472.681,51	0%	100%
LOS RASOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
/ TECHO EN MALLA METÁLICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	5.500,00	910.000,00	5.005.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.500,00	5.005.000.000,00	0%	100%
/ CIELO SUSPENDIDO PANEL ACUSTICO MDF RANURADO TIPO 002 DECUSTIK O SIMILAR	M2	32,01	587.786,00	18.815.029,86	-	-	-	-	-	-	32,01	18.815.029,86	0%	100%
/ PINTURA VINILTEX RAL SEGUN PLANOS +C5+C7+C8+C10+C11+C15)	M2	10.339,05	33.732,00	348.756.834,60	-	-	-	-	-	-	10.339,05	348.756.834,60	0%	100%
/ PANELES DE ALUZINC DE HUNTER DOUGLAS TIPO 9IR DE 025X0,6MM Y PASO 100MM + PINTURA POLIESTER	M2	543,53	200.066,00	108.741.872,98	-	-	-	-	-	-	543,53	108.741.872,98	0%	100%
/ CIELO RASO SUSPENDIDO DOBLE DRYWALL CON AISLAMIENTO Y LOQUES DE MUELLE (C7+C8)	M2	80,41	192.331,00	7.894.115,71	-	-	-	-	-	-	80,41	7.894.115,71	0%	100%
/ CIELO SUSPENDIDO FONOABSORVENTE TIPO LAMITHEC 60X60	M2	33,42	253.891,00	8.485.637,22	-	-	-	-	-	-	33,42	8.485.637,22	0%	100%
/ CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RH	M2	416,41	62.995,00	26.232.154,35	-	-	-	-	-	-	416,41	26.232.154,35	0%	100%
/ PARETE HIDRORUGO	M2	199,86	32.073,00	6.410.109,78	-	-	-	-	-	-	199,86	6.410.109,78	0%	100%
/ CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO	M2	995,44	62.996,00	62.706.739,24	-	-	-	-	-	-	995,44	62.706.739,24	0%	100%
/ PINTURA VINILTEX ANTIHUMEDAD	M2	8.266,27	31.995,00	259.318.819,65	-	-	-	-	-	-	8.266,27	259.318.819,65	0%	100%
/ LOSA DE CONCRETO SOBRE PLACA NERVADA DE ACERO GALV. IELO RASO DRYWALL 15,8+2LR	M2	42,60	265.275,00	11.300.715,00	-	-	-	-	-	-	42,60	11.300.715,00	0%	100%
/ CIELO RASO ACÚSTICO LINEAL 601 DE LINEAR GRID DE LINDNER	M2	933,60	608.132,00	642.440.035,20	-	-	-	-	-	-	933,60	642.440.035,20	0%	100%
IOS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RTINA ALUMINIO ANODIZADO KRISKADECOR, ARAHUACA	M2	478,35	849.055,00	406.145.459,25	-	-	-	-	-	-	478,35	406.145.459,25	0%	100%
RTINA DE MALLA METALICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	450,00	917.951,00	413.077.950,00	-	-	-	-	-	-	450,00	413.077.950,00	0%	100%
ERTAS DE MADERA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ta de madera tipo PM1.1C/PM1.1Cs, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE CHURA X 2100 MM DE ALTURA y 35 mm de espesor	UD	4,00	701.191,00	2.804.764,00	-	-	-	-	-	-	4,00	2.804.764,00	0%	100%
ta de madera tipo PM1.1D/PM1.1Ds, de 1 hoja batiente, DE 1040 MM DE CHURA X 2500 MM DE ALTURA y 35 mm de espesor	UD	6,00	697.429,00	4.184.544,00	-	-	-	-	-	-	6,00	4.184.544,00	0%	100%
ta de madera tipo TIPO PM1.2F/PM 1.2Fs, de una hoja batiente, DE 1000 DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	1.169.138,00	7.014.828,00	-	-	-	-	-	-	6,00	7.014.828,00	0%	100%
ta de madera tipo PM1.3D/PM1.3Ds, de una hoja batiente,DE 840 MM ANCHURA X 2500 MM DE ALTURA y 35 mm de espesor	UD	9,00	734.806,00	6.613.254,00	-	-	-	-	-	-	9,00	6.613.254,00	0%	100%
ta de madera tipo PM1.4F/PM1.4Fs, de una hoja batiente, DE 790 MM ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	8,00	1.073.349,00	8.586.792,00	-	-	-	-	-	-	8,00	8.586.792,00	0%	100%
ta de madera tipo PM1.5D, de una hoja batiente de 920X2100MM y ro superior DE 920X1630 mm y 35 mm de espesor	UD	1,00	833.835,00	833.835,00	-	-	-	-	-	-	1,00	833.835,00	0%	100%
ta corrediza de madera tipo PMC1.11Y/PMC1.11Ys, DE 1100mm de ura x 2300 MM de altura y 35 mm de espesor	UD	18,00	964.472,00	18.135.348,00	-	-	-	-	-	-	18,00	18.135.348,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3491994
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.943,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO Ho	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.943.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2021	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 6.943.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

al de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
era corrediza de madera tipo PMC1.6R/PMC1.6Ra, de 1050mm de chura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	14,00	998.170,00	13.988.380,00	-	-	-	-	-	-	14,00	13.988.380,00	0%	100%
erta corrediza de madera tipo PMC1.9Pa, de 2550 mm de anchura x 2540 l de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	2.593.042,00	2.593.042,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.593.042,00	0%	100%
erta corrediza de madera tipo PMC1.10P, de 2550 mm de anchura x 3730 l de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	3.048.720,00	3.048.720,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.048.720,00	0%	100%
era de madera tipo PM1.17C, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE CHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	1,00	822.678,00	822.678,00	-	-	-	-	-	-	1,00	822.678,00	0%	100%
erta doble de madera tipo PM2.12G, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE CHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.360.262,00	4.720.524,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.720.524,00	0%	100%
erta doble de madera tipo PM2.11H, de 2 hojas batientes, DE 2200 MM DE CHURA X 2600 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	3.634.019,00	21.804.114,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.804.114,00	0%	100%
erta doble de madera tipo PM2.10K, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE CHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.214.463,00	4.428.926,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.428.926,00	0%	100%
era de madera tipo PM1.18L/PM1.18La, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2700 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	15,00	1.299.521,00	20.792.336,00	-	-	-	-	-	-	15,00	20.792.336,00	0%	100%
erta de madera tipo PM1.15L, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE CHURA X 2100 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	5,00	691.355,00	3.456.775,00	-	-	-	-	-	-	5,00	3.456.775,00	0%	100%
erta plegable de paneles de madera tipo PM1.16, de 3750 mm de anchura x 00 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	4,00	3.968.781,00	12.987.124,00	-	-	-	-	-	-	4,00	12.987.124,00	0%	100%
erta doble de madera, de gran tamaño, tipo PM2.14X_A y PM2.14X_B, de 2 as batientes, DE 1520 MM DE ANCHURA X 8960 MM DE ALTURA y 18 n de espesor total	UD	4,00	14.046.751,00	56.187.004,00	-	-	-	-	-	-	4,00	56.187.004,00	0%	100%
njunto de madera tipo CM1, de hojas batientes y fijo, DE 3905 MM DE CHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.514.338,00	3.514.338,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.514.338,00	0%	100%
njunto de madera tipo CM2, de hojas batientes y fijo, DE 18735 MM DE CHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	17.496.671,00	17.496.671,00	-	-	-	-	-	-	1,00	17.496.671,00	0%	100%
njunto de madera tipo CM3, de hojas batientes y fijos, DE 19401 MM DE CHURA X 1180 MM DE ALTURA milimtros y 18mm de espesor	UD	1,00	4.364.716,00	4.364.716,00	-	-	-	-	-	-	1,00	4.364.716,00	0%	100%
njunto de madera tipo CM4, de hojas batientes, DE 6570 MM DE CHURA X 2600 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.736.541,00	3.736.541,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.736.541,00	0%	100%
ique móvil de madera MDF-E1 tipo PMOV1, de 8900 mm de anchura x 0 MM de altura y 105 mm de espesor	UD	1,00	9.109.046,00	9.109.046,00	-	-	-	-	-	-	1,00	9.109.046,00	0%	100%
ique acústico móvil tipo PMOV2, serie 643E de hutzer o similar, tizado, con modulos acabados en panel decustik epoxi 612 o similar, de 00 mm de anchura x 8900 MM de altura y 90 mm de espesor	UD	2,00	690.248.408,00	1.380.496.816,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.380.496.816,00	0%	100%
arinado de escenario a base de triple tablero de plywood con acabado es-o, tipo P3, con un espesor total de 36 mm, sobre estreles de pino de 50x50	m2	314,48	837.116,00	263.256.239,68	-	-	-	-	-	-	314,48	263.256.239,68	0%	100%
njunto de señalizado de acceso a escenario a base de tablero de plywood acabado en pino, de 15 mm de espesor, sobre estreles de pino de 50x50	UD	2,00	1.555.211,00	3.110.422,00	-	-	-	-	-	-	2,00	3.110.422,00	0%	100%
rte de madera en el lateral de la escalera de acceso al escenario, a base tablero MDF-E1	UD	1,00	1.345.334,00	1.345.334,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.345.334,00	0%	100%
PO C	UD	5,00	758.364,00	3.791.820,00	-	-	-	-	-	-	5,00	3.791.820,00	0%	100%
PO D	UD	16,00	1.221.364,00	19.541.824,00	-	-	-	-	-	-	16,00	19.541.824,00	0%	100%
PO F	UD	6,00	434.632,00	2.607.792,00	-	-	-	-	-	-	6,00	2.607.792,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	20210400002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIE - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2419104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8301154035-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.958.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	20210526007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901459970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 18/01/2021 HASTA: 18/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

...d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 20210400002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
TO G	UD	2,00	4.174.518,00	8.349.036,00	-	-	-	-	-	-	2,00	8.349.036,00	0%	100%
TO H	UD	6,00	4.504.593,00	27.027.558,00	-	-	-	-	-	-	6,00	27.027.558,00	0%	100%
TO K	UD	1,00	1.536.238,00	1.536.238,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.536.238,00	0%	100%
TO L	UD	21,00	1.157.425,00	24.305.946,00	-	-	-	-	-	-	21,00	24.305.946,00	0%	100%
TO P	UD	1,00	3.966.692,00	3.966.692,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.966.692,00	0%	100%
TO R	UD	14,00	1.201.886,00	16.823.604,00	-	-	-	-	-	-	14,00	16.823.604,00	0%	100%
TO Y	UD	19,00	1.201.896,00	22.832.004,00	-	-	-	-	-	-	19,00	22.832.004,00	0%	100%
TO X	UD	4,00	2.164.927,00	8.659.708,00	-	-	-	-	-	-	4,00	8.659.708,00	0%	100%
ERTAS METALICAS	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1A / PA1.1As	UD	11,00	1.225.621,00	13.481.831,00	-	-	-	-	-	-	11,00	13.481.831,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1C / PA1.1Cs	UD	5,00	1.385.621,00	6.928.105,00	-	-	-	-	-	-	5,00	6.928.105,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1E / PA1.1Es	UD	6,00	1.555.621,00	9.333.726,00	-	-	-	-	-	-	6,00	9.333.726,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1SN / PA1.1SNs	UD	21,00	1.155.621,00	24.268.041,00	-	-	-	-	-	-	21,00	24.268.041,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.4M	UD	24,00	2.165.621,00	51.974.904,00	-	-	-	-	-	-	24,00	51.974.904,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.5J	UD	2,00	2.165.621,00	4.331.242,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.331.242,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.6J	UD	5,00	2.785.621,00	13.928.105,00	-	-	-	-	-	-	5,00	13.928.105,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.7J	UD	1,00	1.785.621,00	1.785.621,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.785.621,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.8M	UD	3,00	3.086.621,00	9.259.863,00	-	-	-	-	-	-	3,00	9.259.863,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.9M	UD	6,00	2.905.621,00	17.433.726,00	-	-	-	-	-	-	6,00	17.433.726,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.15M	UD	4,00	2.065.621,00	8.262.484,00	-	-	-	-	-	-	4,00	8.262.484,00	0%	100%
ERTA METALICA CORREDIZA DE ACERO - TIPO PA9.11Z	UD	1,00	25.380.284,00	25.380.284,00	-	-	-	-	-	-	1,00	25.380.284,00	0%	100%
ERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA2.13M	UD	4,00	4.722.082,00	18.888.328,00	-	-	-	-	-	-	4,00	18.888.328,00	0%	100%
ERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA2.14M	UD	1,00	5.253.330,00	5.253.330,00	-	-	-	-	-	-	1,00	5.253.330,00	0%	100%
ERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA1.15D / PA1.15Ds	UD	3,00	3.244.801,00	9.734.403,00	-	-	-	-	-	-	3,00	9.734.403,00	0%	100%
ERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA1.19B	UD	17,00	3.142.536,00	53.423.112,00	-	-	-	-	-	-	17,00	53.423.112,00	0%	100%
ERTA METALICA MOTORIZADA - TIPO PA.PL 1	UD	1,00	20.826.092,00	20.826.092,00	-	-	-	-	-	-	1,00	20.826.092,00	0%	100%
ERTA METALICA MOTORIZADA - TIPO PA.PL 2	UD	1,00	22.716.092,00	22.716.092,00	-	-	-	-	-	-	1,00	22.716.092,00	0%	100%
ERTA METALICA DE ACERO ENREJILLADA - TIPO PA2.18J	UD	1,00	3.624.450,00	3.624.450,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.624.450,00	0%	100%
ERTA MET. CORREDIZA BASTIDOR ALUM. Y COMPOSITE ALUMINIO RFORADO - TIPO PA5.17	UD	1,00	119.278.485,00	119.278.485,00	-	-	-	-	-	-	1,00	119.278.485,00	0%	100%
TO A	UD	11,00	512.475,00	5.637.225,00	-	-	-	-	-	-	11,00	5.637.225,00	0%	100%
TO S	UD	1,00	1.007.087,00	1.007.087,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.007.087,00	0%	100%
TO E	UD	6,00	3.551.035,00	21.306.210,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.306.210,00	0%	100%
TO J	UD	12,00	1.418.211,00	17.000.532,00	-	-	-	-	-	-	12,00	17.000.532,00	0%	100%
TO M	UD	40,00	4.377.368,00	175.094.640,00	-	-	-	-	-	-	40,00	175.094.640,00	0%	100%
TO N	UD	14,00	1.013.611,00	14.190.554,00	-	-	-	-	-	-	14,00	14.190.554,00	0%	100%
TO O	UD	7,00	3.238.745,00	22.671.222,00	-	-	-	-	-	-	7,00	22.671.222,00	0%	100%
TO Z	UD	1,00	10.279.809,00	10.279.809,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.279.809,00	0%	100%
RRERIA Y METALISTERIA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RANDA TIPO H1	ML	668,71	331.399,00	221.609.825,29	-	-	-	-	-	-	668,71	221.609.825,29	0%	100%
RANDA TIPO H2	ML	30,40	840.996,00	25.544.894,40	-	-	-	-	-	-	30,40	25.544.894,40	0%	100%
RANDA TIPO H3	ML	276,10	1.418.482,00	391.642.880,20	-	-	-	-	-	-	276,10	391.642.880,20	0%	100%
RANDA TIPO H4	ML	156,14	2.314.151,00	361.331.537,14	-	-	-	-	-	-	156,14	361.331.537,14	0%	100%
RANDA TIPO H4B	ML	32,16	2.126.193,00	68.378.369,88	-	-	-	-	-	-	32,16	68.378.369,88	0%	100%
RANDA TIPO H5	ML	102,73	1.671.468,00	170.624.173,64	-	-	-	-	-	-	102,73	170.624.173,64	0%	100%
RANDA TIPO H5B	ML	44,92	341.708,00	15.349.573,36	-	-	-	-	-	-	44,92	15.349.573,36	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	202104002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIM - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154980	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	202105007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/09/2026
NIT:	901437570-7	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

...d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...VIEROS CALIXTO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 202104002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
VIDA GALVANIZADA LACADA PERFORADA TIPO H5	M2	81,94	763.000,00	62.520.220,00	-	-	-	-	-	-	81,94	62.520.220,00	0%	100%
SARELA TIPO H8	M2	83,53	932.874,00	59.265.485,22	-	-	-	-	-	-	63,53	59.265.485,22	0%	100%
RANDA TIPO H9	M2	97,12	409.745,00	19.307.184,40	-	-	-	-	-	-	47,12	19.307.184,40	0%	100%
RANDA TIPO H10	M2	114,99	957.250,00	110.075.327,40	-	-	-	-	-	-	114,99	110.075.327,40	0%	100%
SARELA TIPO H11	M2	225,25	1.540.764,00	340.867.221,00	-	-	-	-	-	-	225,25	340.867.221,00	0%	100%
PORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO A	UD	20,00	371.845,00	7.436.900,00	-	-	-	-	-	-	20,00	7.436.900,00	0%	100%
PORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO B	UD	20,00	357.776,00	7.155.520,00	-	-	-	-	-	-	20,00	7.155.520,00	0%	100%
PORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO C	UD	43,00	558.650,00	24.022.380,00	-	-	-	-	-	-	43,00	24.022.380,00	0%	100%
PORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO D	UD	7,00	346.251,00	2.423.757,00	-	-	-	-	-	-	7,00	2.423.757,00	0%	100%
SETON TIPO H12	UD	1,00	11.705.793,00	11.705.793,00	-	-	-	-	-	-	1,00	11.705.793,00	0%	100%
SETON TIPO H13	UD	1,00	12.942.806,00	12.942.806,00	-	-	-	-	-	-	1,00	12.942.806,00	0%	100%
SETON TIPO H14	UD	1,00	6.956.570,00	6.956.570,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.956.570,00	0%	100%
SETON TIPO H15	UD	1,00	6.534.894,00	6.534.894,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6.534.894,00	0%	100%
CALERA DE GATO	ML	62,92	4.100.453,00	258.191.150,36	-	-	-	-	-	-	62,92	258.191.150,36	0%	100%
CALERA DE ACERO GALVANIZADO H17	M2	3,33	4.794.357,00	15.965.206,81	-	-	-	-	-	-	3,33	15.965.206,81	0%	100%
RIO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	2,00	3.950.410,00	7.900.820,00	-	-	-	-	-	-	2,00	7.900.820,00	0%	100%
ERRE DE VIDRIO INTERIOR FLOTANTE DE P/P SISTEMA SPIDER	M2	96,87	1.005.724,00	97.521.353,88	-	-	-	-	-	-	96,87	97.521.353,88	0%	100%
ERRE DE VIDRIO INTERIOR SISTEMA PIE DE AMIGO ACERO OXIDABLE	M2	68,27	755.181,00	51.556.206,87	-	-	-	-	-	-	68,27	51.556.206,87	0%	100%
ERTA DE VIDRIO DOBLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE IGO	UD	3,00	4.921.147,00	14.763.441,00	-	-	-	-	-	-	3,00	14.763.441,00	0%	100%
ERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE IGO 2,60X2,80M	UD	3,00	3.120.314,00	9.360.942,00	-	-	-	-	-	-	3,00	9.360.942,00	0%	100%
ERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE IGO 2,10X0,90M	UD	1,00	2.917.191,00	2.917.191,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.917.191,00	0%	100%
ERTA CORREDERA AUTOMATICA	UD	2,00	29.831.055,00	59.662.100,00	-	-	-	-	-	-	2,00	59.662.100,00	0%	100%
NTANA V4	M2	4,80	978.775,00	4.695.480,00	-	-	-	-	-	-	4,80	4.695.480,00	0%	100%
NTANA V5 y V6B	M2	4,50	1.127.691,00	5.074.609,50	-	-	-	-	-	-	4,50	5.074.609,50	0%	100%
NSPORTE VERTICAL	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CENSOR 1 y 2, Principal	ud	2,00	243.914.560,00	487.829.120,00	-	-	-	-	-	-	2,00	487.829.120,00	0%	100%
CENSOR 3 y 4, Principal	ud	2,00	212.094.560,00	424.189.120,00	-	-	-	-	-	-	2,00	424.189.120,00	0%	100%
CENSOR 5	ud	1,00	207.099.560,00	207.099.560,00	-	-	-	-	-	-	1,00	207.099.560,00	0%	100%
NTACARGAS	ud	1,00	468.399.560,00	468.399.560,00	-	-	-	-	-	-	1,00	468.399.560,00	0%	100%
CALERA MECANICA	ud	3,00	354.668.227,00	1.063.998.681,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.063.998.681,00	0%	100%
ERUARIO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LA APILABLE	UD	840,00	608.564,00	511.193.760,00	-	-	-	-	-	-	840,00	511.193.760,00	0%	100%
RRO PARA SILLA	UD	21,00	1.273.564,00	26.744.844,00	-	-	-	-	-	-	21,00	26.744.844,00	0%	100%
ADERAS TELESCOPICAS (RETRACTILES	UD	1,00	457.148.700,00	457.148.700,00	-	-	-	-	-	-	1,00	457.148.700,00	0%	100%
URPAVIMENTO	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BIDA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	93,40	965.271,00	86.295.807,40	-	-	-	-	-	-	93,40	86.295.807,40	0%	100%
PEJOS EN BAÑOS	M2	57,78	267.922,00	15.480.539,16	-	-	-	-	-	-	57,78	15.480.539,16	0%	100%
CAMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 60 CM EN CUARZO	ML	33,16	616.166,00	20.432.794,06	-	-	-	-	-	-	33,16	20.432.794,06	0%	100%
CAMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 51 CM EN CUARZO	ML	2,84	550.295,00	1.479.099,80	-	-	-	-	-	-	2,84	1.479.099,80	0%	100%
RRA FIJA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	140.225,00	1.682.700,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.682.700,00	0%	100%
RRA ABATIBLE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	10,00	650.225,00	6.502.250,00	-	-	-	-	-	-	10,00	6.502.250,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2495184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8909154066	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.658.849,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/09/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/09/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901423870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/09/2021 HASTA: 09/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2021

d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VEROS CALDIDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PERNIDO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se refactoria a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	PEJO DISCAPACITADOS INCLINADO, MARCO ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	356.254,00	4.275.048,00	-	-	-	-	-	-	12,00	4.275.048,00	0%	100%
	A BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	2,00	1.124.195,00	2.248.390,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2.248.390,00	0%	100%
	PENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE	UD	47,00	189.225,00	8.470.575,00	-	-	-	-	-	-	47,00	8.470.575,00	0%	100%
	PENSADOR DE JABON EN ENCIMERA-MESON EN ACERO XIDABLE	UD	35,00	259.225,00	8.757.875,00	-	-	-	-	-	-	35,00	8.757.875,00	0%	100%
	PENSADOR DE JABON EN PARED EN ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	270.225,00	3.242.700,00	-	-	-	-	-	-	12,00	3.242.700,00	0%	100%
	PENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ACERO INOXIDABLE	UD	33,00	370.225,00	12.217.425,00	-	-	-	-	-	-	33,00	12.217.425,00	0%	100%
	MPENTE DE DESECHOS	UD	33,00	432.283,00	14.265.339,00	-	-	-	-	-	-	33,00	14.265.339,00	0%	100%
	BANIZACION	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.042,39	84.477,00	88.481.880,00	-	-	-	-	-	-	1.042,39	88.481.880,00	0%	100%
	E GRANULAR B-200	M3	1.547,17	86.677,00	134.104.054,09	-	-	-	-	-	-	1.547,17	134.104.054,09	0%	100%
	ERMEABILIZACION CON MANTO ASFÁLTICO	M2	4.925,06	105.218,00	518.204.983,08	-	-	-	-	-	-	4.925,06	518.204.983,08	0%	100%
	A 3000 PSI REFORZADO CON MALLA 7MM 15X15 M-262	m2	1.203,89	122.231,00	147.152.878,59	-	-	-	-	-	-	1.203,89	147.152.878,59	0%	100%
	NCRETO PARA CIMENTACION LUMINARIAS	m3	1,87	693.881,00	1.279.044,47	-	-	-	-	-	-	1,87	1.279.044,47	0%	100%
	OTENTE NT 1600	m2	11.200,00	7.662,00	85.838.400,00	-	-	-	-	-	-	11.200,00	85.838.400,00	0%	100%
	JETUENO (impermeabilizacion de piso)	m2	10.530,47	5.362,00	56.474.989,54	-	-	-	-	-	-	10.530,47	56.474.989,54	0%	100%
	EN DE CONCRETO REFORZADO ESCOBEADO	m2	1.121,89	90.743,00	101.805.684,27	-	-	-	-	-	-	1.121,89	101.805.684,27	0%	100%
	ARDO LUMINOSO	UD	42,00	1.199.714,00	50.009.988,00	-	-	-	-	-	-	42,00	50.009.988,00	0%	100%
	TADO DE LINEAS Y FLECHAS CALLE	m2	257,00	36.362,00	9.350.174,00	-	-	-	-	-	-	257,00	9.350.174,00	0%	100%
	OLIEN EN HUELLAS 6X15X15cm	m2	37,44	98.562,00	3.615.281,28	-	-	-	-	-	-	37,44	3.615.281,28	0%	100%
	OLIEN EN CONTRAHUELLAS 6x10x15cm	m2	19,89	85.312,00	1.696.855,68	-	-	-	-	-	-	19,89	1.696.855,68	0%	100%
	NA ESPACIO PUBLICO	M2	1.656,80	116.005,00	192.173.883,00	-	-	-	-	-	-	1.656,80	192.173.883,00	0%	100%
	ONES DE CONCRETO 14,5 X 4,5 X 120 CM PREFABRICADO EN O	m2	3.227,00	82.258,00	265.543.376,00	-	-	-	-	-	-	3.227,00	265.543.376,00	0%	100%
	RRE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO LACADO DE 2"	m2	77,88	434.394,00	33.701.214,45	-	-	-	-	-	-	77,88	33.701.214,45	0%	100%
	BILLO PARA ALCORQUE TIPO A	m	30,00	90.180,00	2.704.800,00	-	-	-	-	-	-	30,00	2.704.800,00	0%	100%
	BILLO PARA ALCORQUE TIPO B	m	61,60	116.807,00	7.195.311,20	-	-	-	-	-	-	61,60	7.195.311,20	0%	100%
	BILLO BARRERA RECTANGULAR	m	1.732,79	83.280,00	102.668.452,59	-	-	-	-	-	-	1.732,79	102.668.452,59	0%	100%
	BILLO BARRERA RECTO	m	288,10	75.256,00	21.680.965,50	-	-	-	-	-	-	288,10	21.680.965,50	0%	100%
	RADIZACION (inc capa de 20cm de tierra negra)	m2	5.820,00	48.600,00	282.852.000,00	-	-	-	-	-	-	5.820,00	282.852.000,00	0%	100%
	NCRETO POBRE DE LIMPIEZA E=10cm	M2	47,26	47.381,00	2.239.220,06	-	-	-	-	-	-	47,26	2.239.220,06	0%	100%
	AMENTO DE EPS	m2	2.000,00	66.132,00	132.264.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	132.264.000,00	0%	100%
	O BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40CMX20 CM, DOM	M2	153,35	184.711,00	28.905.541,85	-	-	-	-	-	-	153,35	28.905.541,85	0%	100%
	OL MANGUERA	UD	130,00	342.956,00	44.584.540,00	-	-	-	-	-	-	130,00	44.584.540,00	0%	100%
	A CONCRETO CALZADA	M2	3.009,23	193.085,00	581.037.974,55	-	-	-	-	-	-	3.009,23	581.037.174,55	0%	100%
	RTERO IMPERMEABILIZADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, UYE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	3.173,00	149.150,00	473.379.670,00	-	-	-	-	-	-	3.173,00	473.379.670,00	0%	100%
	OUINERANJA PODOTÁCTIL SOBRE BASE DE ARENA	M2	450,20	66.196,00	29.774.427,20	-	-	-	-	-	-	450,20	29.774.427,20	0%	100%
	ROS Y DRENAJES PARA OBRAS DE URBANISMOS	M2	973,00	52.135,00	50.727.355,00	-	-	-	-	-	-	973,00	50.727.355,00	0%	100%
	LIARIO DE URBANIZACION	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ULO DE PUESTO DE VENTA EN ACERPO INOXIDABLE	ud	15,00	18.808.682,00	282.630.245,00	-	-	-	-	-	-	15,00	282.630.245,00	0%	100%
	O TIPO ESCOFET TWIG O SIMILAR	UD	27,00	6.841.071,00	184.708.917,00	-	-	-	-	-	-	27,00	184.708.917,00	0%	100%
	CULARES VIG	UD	4,00	14.041.071,00	56.164.284,00	-	-	-	-	-	-	4,00	56.164.284,00	0%	100%
	TROL DE ACCESO	0,00		$	606.357.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 606.357.400,00	0%	100%
	PRIED: Dispensador de toallas de papel con DR, incluye sistema para ntes mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo estrella iluminado. Control con PC industrial de alto rendimiento.	und	2,00	20.468.000,00	40.936.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	40.936.000,00	0%	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154080	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA

10/11/2021

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y VERGS CALIDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL No. 001 CANT.	ACTA PARCIAL No. 001 VR. TOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002 CANT.	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002 VR. TOTAL	ACUMULADOS CANT.	ACUMULADOS VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANT.	POR EJECUTAR VR. TOTAL	PORCENTAJE % EJECUTADO TOTAL	PORCENTAJE % POR EJECUTAR
CP2000 Verificador de salida peatonal con QR incluye sistema usuarios mensuales, pantalla gráfica de 7", mensajes de voz, lazo salida ulminado. Control con PC industrial de alto rendimiento	und	2,00	18.623.500,00	37.247.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	37.247.000,00	0%	100%
ara de control de acceso para alta tráfico con brazo de 3 metros. Con or óptico en inductivo incluido INCLEYE UNIDADES DE SEGURIDAD RESPALDO	und	4,00	8.211.000,00	32.844.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	32.844.000,00	0%	100%
ema de reconocimiento de placas para cerrites de entrada	und	4,00	5.890.500,00	23.562.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	23.562.000,00	0%	100%
Industrial Fanless Disco de estado sólido 256GB, RAM 8GB Bajo consumo licencia Windows 8 profesional	und	1,00	3.748.500,00	3.748.500,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.748.500,00	0%	100%
icio de uso software SOFTPARK (Uso en dos equipos modelo cliente-idor)	und	1,00	2.879.800,00	2.879.800,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.879.800,00	0%	100%
r para tarjeta inteligente MIFARE® Codificación tarjetas mensuales	und	1,00	487.900,00	487.900,00	-	-	-	-	-	-	1,00	487.900,00	0%	100%
de protección PC TRIPP LITE 550 VA	und	1,00	452.200,00	452.200,00	-	-	-	-	-	-	1,00	452.200,00	0%	100%
ema de guiado por medio de video para estacionamiento según planos y s, 1 Displays externo, 4 Displays internos de direccionamiento.	und	1,00	464.100.000,00	464.100.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	464.100.000,00	0%	100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS	0,00	-		89.504.376.203,83	-	760.843.039,14	-	756.488.639,72	-	1.517.331.675,87		87.987.044.528,07	1,52%	98,48%
N DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UD	1,00	244.836.361,00	244.836.361,00			0,2651	64.900.555,28	0,27	64.900.555,28	0,73	179.905.804,72	27%	73%
OTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1,00	255.487.000,00	255.487.000,00			0,1404	35.677.732,00	0,14	35.677.732,00	0,86	219.809.268,00	14%	86%
N DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	UD	1,00	240.132.364,00	240.132.364,00	-	-	-	-	-	-	1,00	240.132.364,00	0%	100%
GEOGRAFICO	0,00	1,00	5.873.296.717,80	5.873.296.717,80	-	-	-	-	-	-	1,00	5.873.296.717,80	0%	100%
BILIARIO	0,00	1,00	560.779.816,20	560.779.816,20	-	-	-	-	-	-	1,00	560.779.816,20	0%	100%
MOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA	0,00	1,00	2.270.279.850,00	2.270.279.850,00							1,00	2.270.279.850,00	0%	100%
MITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS	0,00	1,00	17.177.745,00	17.177.745,00							1,00	17.177.745,00	0%	100%
TOTAL OTROS COSTOS				9.461.879.834,00		-		$ 100.778.288		$ 100.778.288		$ 9.361.201.598	1,065%	98,93%
VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 99.504.376.203,83		$ 760.843.039,14		$ 756.488.639,72		$ 1.517.331.675,87		$ 97.987.044.528,07	PORCENTAJES	
VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS A.I.U 30%	ADMINISTRACION(3%)			$ 29.695.618.000	A.I.U 30%	$ 157.385.457,95	A.I.U 30%	$ 155.427.500,74	A.I.U 30%	$ 333.812.958,69	A.I.U 30%	$ 21.557.149.795,17	EJECUTADO DEL CONTRATO	POR EJECUTAR DEL CONTRATO
	IMPREVISTOS(4%)			$ 3.960.575.040		$ 33.042.151,81		$ 37.824.431,99		$ 75.868.583,79		$ 4.809.352.226,40		
	UTILIDAD(5%)			$ 4.975.218.810		$ 22.575.291,68		$ 22.694.658,19		$ 45.519.950,26		$ 2.939.611.335,84	1,52%	98,48%
	TOTAL AIU			$ 29.851.312.851		$ 228.252.918,85		$ 216.946.590,92		$ 455.199.502,76		$ 29.306.113.359,42		
VALOR COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 129.355.689.055,11		$ 989.095.947		$ 983.435.233		$ 1.972.531.179		$ 127.383.157.886,48		
VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 138.817.668.949,11		$ 989.095.947,00		$ 1.054.213.520,28		$ 2.073.309.467,28		$ 136.744.359.482,2		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499164	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.668.949,18					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021	A 11/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901413979-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

PERIODO FACTURADO	
DESDE	HASTA
1/09/2021	10/11/2021

FECHA PRESENTE ACTA
10/11/2021

...d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...VEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
SCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
LOR DEL CONTRATO	$ 139.817.668.949,18
TICIPO ENTREGADO	N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1	$ 989.095.947,00	$ -	$ 989.095.947,00	0,71%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2	$ 1.084.213.520,28	$ -	$ 1.084.213.520,28	0,78%
ACUMULADO TOTAL	$ 2.073.309.467,28	$ -	$ 2.073.309.467,28	1,49%
SALDOS POR FACTURAR	$ 136.744.359.481,9	$ -	$ 136.744.359.481,9	98,51%

LOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA: MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 2, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO, VERIFADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

V° B°
Nombre: JORGE OLIVEROS GALINDO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: ANDRES ALMARALES MELO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
Representante Legal
A CONSTRUIR S.A.
Contratista

Nombre: ROCIO ACOSTA ARGOTE
Representante Legal
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
Interventoria

Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Cesar

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 002

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SIH - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499184		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:					
NIT:	890115485-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.668.949,11						PERIODO FACTURADO
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.309.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023	10/28/2021 10/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.942.853.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026	
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.309.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026	FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.123.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026	10/11/2021
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.942.853.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023	

...d de Valledupar, Cesar, el día 10 de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y ...IVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 002 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				ACTA PARCIAL No. 001		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 002		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 308.265.994,00		$ 217.661.197		-		$ 217.661.197,00		$ 90.604.797,00	0%	100%
1.1	Nivelación y replanteo con equipo	m2	7.366,00	$ 3.883,00	28.602.178,00	7.366,00	28.602.178,00		-	7.366,00	28.602.178,00	-	-	100%	0%
1.2	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	483,00	$ 17.536,00	8.470.720,00	468,29	8.213.250,62		-	468,29	8.213.250,62	11,72	205.469,38	96%	2%
1.3	Excavación a maquina espesor 20cm	m2	11.974,93	$ 6.880,00	82.387.518,40	-	-		-	-	-	11.974,93	82.387.518,40	0%	100%
1.4	Caseta provisional aseo 50m	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00	1,00	950.000,00		-	1,00	950.000,00	-	-	100%	0%
1.5	Caseta provisional plastica 100ml	und.	1,00	$ 5.800.000,00	5.800.000,00	-	-		-	-	-	1,00	5.800.000,00	0%	100%
1.6	Caseta provisional telefonos	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00	1,00	950.000,00		-	1,00	950.000,00	-	-	100%	0%
1.7	Demoliciones	m3	1.376,15	$ 141.872,00	181.177.567,80	1.260,43	178.945.767,96		-	1.260,43	178.945.767,96	15,72	2.231.799,84	99%	1%
2	CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO	0,00			$ 843.241.884,50	-	351.541.033,63		21.431.557,18	-	$ 372.982.590,79	-	$ 470.279.293,71	44%	56%
2.1	Excavacion mecanica a nivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.516,40	$ 16.355,00	793.485.722,00	20.629,00	343.641.940,00	878,78	14.372.408,05	21.708,78	358.014.348,05	26.809,62	438.471.373,94	45%	55%
2.2	Excavacion manual para zapatas	m3	875,00	$ 18.245,00	15.962.950,00	288,06	5.256.011,18	158,85	2.900.129,68	447,01	8.156.150,85	377,99	6.896.799,15	54%	46%
2.3	Cargues y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	$ 15.069,00	16.161.502,50	374,46	$ 6.413.082,44	206,83	3.113.716,21	581,11	8.756.798,65	491,39	7.404.700,85	54%	46%
2.4	Llenos con material seleccionado de sitio	m3	950,00	$ 18.729,00	16.541.710,00	-	-	55,28	1.035.953,20	55,28	1.035.953,23	894,72	17.505.416,77	6%	94%
3	CIMENTACION				$ 4.745.979.679,09		92.853.565,14	-	332.647.308,42	-	$ 425.533.877,56	-	$ 4.371.334.801,44	9%	91%
3.1	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	$ 24.563,00	188.717.529,00	309,97	7.589.907,30	953,90	23.676.300,26	1.272,87	31.266.407,56	6.410,13	157.452.121,44	17%	83%
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI	0,00		$ 480.452,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	333,00	$ 896.509,00	298.837.970,00	74,85	67.066.426,15	256,49	229.731.843,85	330,00	296.837.970,00	-	-	100%	0%
3.4	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	16.500,00	$ 5.905,00	97.432.500,00	3.097,84	18.293.335,70	13.402,00	79.139.164,30	16.500,00	97.432.500,00	-	-	100%	0%
4	LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=60CM	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00	$ 857.878,00	2.579.031.732,00	-	-	-	-	-	-	3.007,00	2.579.031.732,00	0%	100%
4.2	Encofrado en cassetón de lona	m2	5.420,00	$ 32.402,00	175.618.840,00	-	-	-	-	-	-	5.420,00	175.618.840,00	0%	100%
4.3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	181.000,00	$ 5.905,00	1.068.805.000,00	-	-	-	-	-	-	181.000,00	1.068.805.000,00	0%	100%
4.4	Malla electrosoldada 15x15cm 7.0x6.5mm	kg	58.812,00	$ 5.905,00	340.477.108,00	-	-	-	-	-	-	58.812,00	340.477.108,00	0%	100%
5	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO	0,00			$ 4.373.952.825,00	-	85.652.236,80	-	300.618.914,59	-	435.253.151,49	-	$ 3.938.699.173,51	11%	89%
5.1	COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA	0,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2	Concreto 4000psi	m3	1.467,00	$ 1.155.437,00	1.695.029.079,00	-	-	86,36	99.777.762,14	86,36	99.777.762,14	1.380,65	1.595.249.316,87	6%	94%
5.3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	366.745,00	$ 5.905,00	2.165.679.225,00	16.706,96	98.652.236,80	10.489,31	61.960.945,55	27.196,27	160.556.182,35	339.555,13	2.005.073.042,65	7%	93%
6	MURO DE CONTENCIÓN				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1	Concreto 4000psi	m3	333,00	$ 1.155.437,00	384.780.521,00	-	-	133,77	154.560.207,78	133,77	154.560.207,78	199,23	230.220.313,24	40%	60%
6.2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	13.300,00	$ 5.905,00	78.536.500,00	-	-	11.916,85	70.368.929,25	11.916,85	70.368.929,25	1.383,15	8.167.570,75	90%	10%
7	PLACAS DE SOTANO	area			$ 3.275.378.312,00	-	-	-	$ -	-	$ -	-	$ 3.275.378.312,00	0%	100%
7.1	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA NIVEL N+0,90	area	7.543,00		-	-	-	-	-	-	-	7.543,00	-		
7.2	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	m3	1.759,00	$ 1.029.440,00	1.809.925.960,00	-	-	-	-	-	-	1.759,00	1.809.925.960,00	0%	100%
7.3	Cerramiento en cassetón de icopor removible	m2	5.660,00	$ 67.402,00	381.495.320,00	-	-	-	-	-	-	5.660,00	381.495.320,00	0%	100%
7.4	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	140.457,00	$ 5.905,00	829.457.835,00	-	-	-	-	-	-	140.457,00	829.457.835,00	0%	100%
7.5	Malla electrosoldada 15x15 6mm	kg	35.333,00	$ 5.905,00	208.249.397,00	-	-	-	-	-	-	35.333,00	208.249.397,00	0%	100%
8	PLACAS DE ENTREPISO	0,00			$ 2.096.871.497,48	-	-	-	$ -	-	$ -	-	$ 2.096.871.497,48	0%	100%
8.1	- 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE	0,00	4.697,00		-	-	-	-	-	-	-	4.697,00	-		
8.2	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	521,37	$ 1.029.440,00	536.197.762,80	-	-	-	-	-	-	521,37	536.197.762,80	0%	100%
8.3	Malla Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	18.146,00	$ 5.809,00	105.418.114,00	-	-	-	-	-	-	18.145,00	105.418.114,00	0%	100%
8.4	Soldeck 3" calibre 22	m2	4.697,00	$ 58.842,00	276.360.874,00	-	-	-	-	-	-	4.697,00	276.360.874,00	0%	100%
8.5	- 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.6	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	394,61	$ 1.029.440,00	406.232.706,40	-	-	-	-	-	-	394,61	406.232.706,40	0%	100%
8.7	Malla Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	13.504,00	$ 5.809,00	78.444.736,00	-	-	-	-	-	-	13.504,00	78.444.736,00	0%	100%
8.8	Soldeck 3" calibre 22	m2	3.555,00	$ 58.842,00	209.183.310,00	-	-	-	-	-	-	3.555,00	209.183.310,00	0%	100%
8.9	- 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE	0,00	705,00		-	-	-	-	-	-	-	705,00	-		

PRE - ACTA DE OBI... : 002

CONTRATO DE OBRA No	2021040002		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	2021050007
NIT:	890115406	CONTRATISTA:	UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
FECHA DE INICIO	12/07/2021	NIT:	901493970-2
FECHA DE TERMINACIÓN	12/05/2023		

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 2	ACUMULADO TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUTADO DEL ITEM
1,00	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES							
1,10	Localizacion y replanteo con equipo	m2	7.366,00	7.366,00		7.366,00		100,00%
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	480,00	468,28		468,28	11,72	97,56%
1,30	Descapote a maquina espesor 20cm	m2	11.974,93				11.974,93	0,00%
1,40	Acometida provisional agua 50ml	und.	1,00	1,00		1,00		100,00%
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und.	1,00				1,00	0,00%
1,60	Acometida provisional telefonos	und.	1,00	1,00		1,00		100,00%
1,70	Demoliciones	m3	1.276,15	1.260,43		1.260,43	15,72	98,77%
2,00	CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO							
2,10	Excavacion mecanica a nivel bajo plana de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.516,40	20.829,00	878,79	21.706,79	26.809,62	44,74%
2,20	Excavacion manuel para zapatas	m3	825,00	288,06	158,95	447,01	377,99	54,18%
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	374,48	206,63	581,11	491,39	54,18%
2,40	Rellenos con material seleccionado de sitio	m3	990,00		55,28	55,28	934,72	5,58%
3,00	CIMENTACION							
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	308,87	963,90	1.272,87	6.410,13	16,57%
3,20	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI							
3,2,1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,00	74,60	255,40	330,00		100,00%
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	16.500,00	3.097,94	13.402,06	16.500,00		100,00%
3,30	LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=80CM							
3,3,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00				3.007,00	0,00%
3,3,2	Aligeramiento en casetón de lona	m2	5.420,00				5.420,00	0,00%
3,3,3	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	181.000,00				181.000,00	0,00%
3,3,4	Malla electrosoldada 15x15cm 7,0x6,5mm	kg	56.612,00				56.612,00	0,00%
4,00	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO							
4,10	COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA							
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.467,00		86,36	86,36	1.380,65	5,89%
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	366.745,00	16.706,56	10.483,31	27.189,87	339.555,13	7,41%
4,20	MURO DE CONTENCIÓN							
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	333,00		133,77	133,77	199,23	40,17%
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	13.300,00		11.916,85	11.916,85	1.383,15	89,60%
5,00	PLACAS DE SOTANO	area	7.543,00				7.543,00	0,00%
9,00	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	und						
9,10	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION							
9,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	11,00				11,00	0,00%
9,1,2	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	ml	527,91				527,91	0,00%
9,1,3	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 8"	ml	81,29		81,29	81,29		100,00%
9,1,4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00				1,00	0,00%
9,1,5	CONEXIÓN A RED SANITARIA 10"	und	1,00				1,00	0,00%
	Por frera de AIU							
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)	UD	1,00		0,27	0,27	0,73	26,51%
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1,00		0,14	0,14	0,86	14,04%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	UD	1,00				1,00	0,00%
	MUSEOGRAFICO		1,00				1,00	0,00%
	MOBILIARIO		1,00				1,00	0,00%
	EQUIPOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA		1,00				1,00	0,00%
	TRAMITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS		1,00				1,00	0,00%

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE PRE - ACTA, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO Y VERIFADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR SA

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: ROCIO ACOSTA ARGOTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6559

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	2	ITEM	2,1	Excavación mecánica a nivel bajo placa de subpresión, con retiro hasta 10 km	UNID.	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANT	M3
	REF	LARGO	ANCHO	H	sobre ancho		
	Z-32	14,80	7,35	1,65	0,50	1	217,68
	Z-33	12,95	6,90	1,65	0,50	1	181,84
	Z-34	14,45	7,00	1,65	0,50	1	203,94
	Z-35	9,30	8,90	1,65	0,50	1	168,25
	Z-36	7,95	6,25	1,65	0,50	1	107,06
						SUBTOTAL	878,78
						CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	20.828,00
						CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	878,78
						TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	21.706,78
						CANTIDAD CONTRACTUAL	48.516,40
						PENDIENTE POR PAGAR	26.809,62
						TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	878,78

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6526

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. — NIT 890115406-0 — CONTRATO No. 2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR — NIT 901493970-2 — CONTRATO No. 2021050007
CAPÍTULO	2 — ITEM 2,2 — Excavacion manual para zapatas — UNID. M3



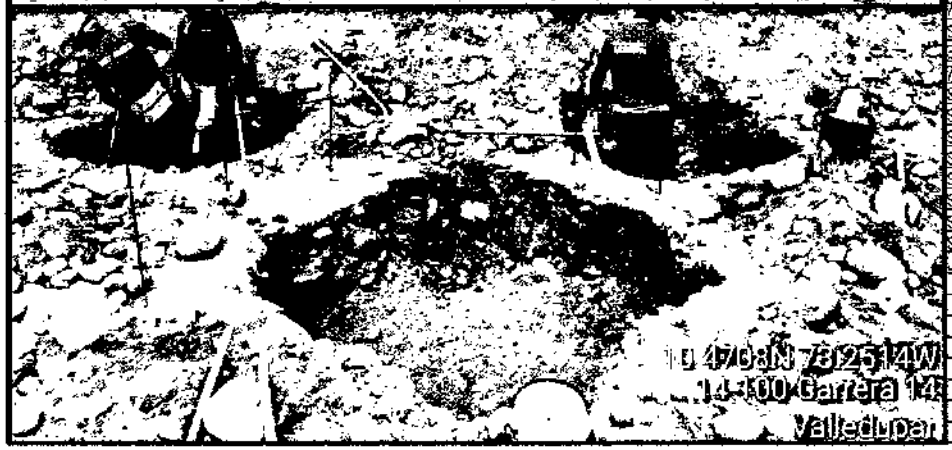

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	H	sobre ancho	CANT	M3
(S1,Diag)	Z-1	1,05	1,05	0,68	0,20	1	1,43
(9,S!);(7,Diag);(S9,Diag);(7S9,Diag)	Z-2	1,25	1,25	0,68	0,20	4	7,41
(S1,Su);(S1,Sv);(S1,Sw);(S12,DIAG);(S1,K);(S1,St);(S1,Sm)	Z-3	1,30	1,30	0,68	0,20	7	13,76
(7',Diag)	Z-4	1,15	1,15	0,68	0,20	1	1,63
(S13,Diag)	Z-5	1,20	1,20	0,68	0,20	1	1,74
(S8,Diag)	Z-6	1,10	1,10	0,68	0,20	1	1,53
(3',Diag);(S9,Se);(S8,Se)	Z-7	1,35	1,35	0,68	0,20	3	6,25
(S13,Sm);(S13,Sp);(S7,Sp)	Z-8	1,55	1,55	0,68	0,20	3	7,76
(S2,Sw);(S8,Su);(S7,Sv)	Z-10	1,60	1,60	0,68	0,20	3	8,16
(S3,Sv);(S3,Sw);(S12,Sp);(S12,J)	Z-11	1,50	1,50	0,68	0,20	4	9,82
(S2,Sx)	Z-12	1,40	1,40	0,68	0,20	1	2,20
(S2,Diag);(9,Diag)	Z-13	0,85	0,85	0,68	0,20	2	2,13
(S2S3,Diag)	Z-14	0,80	0,80	0,68	0,20	1	0,98
(S3,Diag);(S7,Diag)	Z-16	1,00	1,00	0,68	0,20	2	2,67
(S9,St)	Z-17	1,70	1,70	0,68	0,20	1	3,00
(7',K);(3',S!);(S7,Sm)	Z-18	1,80	1,80	0,68	0,20	3	9,87
(S12,Sm);(S9,Sm);(S9,S!);(S8,S!);(S8,Sk)	Z-19	1,85	1,85	0,68	0,20	5	17,21
(3',Sv);(S12,S!);	Z-20	1,80	1,80	0,68	0,20	2	6,58
(7,Sk)	Z-21	1,95	1,95	0,68	0,20	1	3,76
(S7,D)	Z-22	2,40	1,40	0,68	0,20	1	3,43
(S9,K);(S8,K);(7,S!);(7,Sm);(S8,Sm)	Z-23	1,90	1,90	0,68	0,20	5	17,99
(S7,J)	Z-24	2,50	1,00	0,68	0,20	1	2,76
(S9,Sc);(S8,Sc)	Z-25	1,75	1,75	0,68	0,20	2	6,29
(S8S9,Diag);(S7S8,Diag);(S13 9, Diag)	Z-26	0,90	0,90	0,68	0,20	3	3,45
(S8,Sd)	Z-27	3,00	1,80	0,68	0,20	1	5,09
(S8,Sh)	Z-28	2,80	1,70	0,68	0,20	1	4,57
(S9,D)	Z-29	2,60	1,60	0,68	0,20	1	4,08
(S9,7)	Z-30	3,20	1,00	0,68	0,20	1	3,43
						62	
						SUBTOTAL	158,95

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	288,06
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	158,95
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	447,01
CANTIDAD CONTRACTUAL	825,00
PENDIENTE POR PAGAR	377,99
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	158,95

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6527

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTI[illegible]ES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02


PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	2	ITEM	2,3	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	UNID. M3





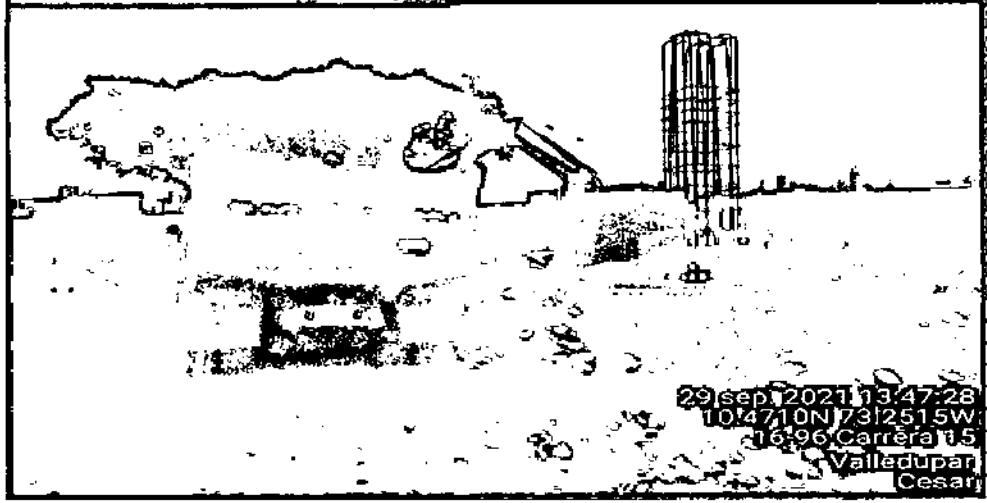

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	H	sobre ancho	CANT	M3
(S1,Diag)	Z-1	1,05	1,05	0,68	0,20	1	1,43
(9,S!);(7,Diag);(S9,Diag);(7S9,Diag)	Z-2	1,25	1,25	0,68	0,20	4	7,41
(S1,Su);(S1,Sv);(S1,Sw);(S12,);(S1,K);(S1,S!);(S1,Sm)	Z-3	1,30	1,30	0,68	0,20	7	13,76
(7',Diag)	Z-4	1,15	1,15	0,68	0,20	1	1,83
(S13,Diag)	Z-5	1,20	1,20	0,68	0,20	1	1,74
(S8,Diag)	Z-6	1,10	1,10	0,68	0,20	1	1,53
(G',Diag);(S9,Sa);(S8,Sa)	Z-7	1,35	1,35	0,68	0,20	3	6,25
(S13,Sm);(S13,Sp);(S7,Sp)	Z-8	1,55	1,55	0,68	0,20	3	7,76
(S2,Sw);(S8,Su);(S7,Sv)	Z-10	1,60	1,50	0,68	0,20	3	8,16
(S3,Sv);(S3,Sw);(S12,Sp);(S12,J)	Z-11	1,50	1,50	0,68	0,20	4	9,82
(S2,Sx)	Z-12	1,40	1,40	0,68	0,20	1	2,20
(S2,Diag);(9,Diag)	Z-13	0,85	0,85	0,68	0,20	2	2,13
(S2S3,Diag)	Z-14	0,80	0,80	0,68	0,20	1	0,98
(S3,Diag);(S7,Diag)	Z-16	1,00	1,00	0,68	0,20	2	2,67
(S9,S!)	Z-17	1,70	1,70	0,68	0,20	1	3,00
(7,K);(3',S!);(S7,Sm)	Z-18	1,80	1,80	0,68	0,20	3	9,87
(S12,Sm);(S9,Sm);(S9,S!);(S8,S!);(S8,Sk)	Z-19	1,85	1,85	0,68	0,20	5	17,21
(3',Sv);(S12,S!);	Z-20	1,80	1,80	0,68	0,20	2	6,58
(7,Sk)	Z-21	1,95	1,95	0,68	0,20	1	3,76
(S7,O)	Z-22	2,40	1,40	0,68	0,20	1	3,43
(S9,K);(S8,K);(7,S!);(7,Sm);(S8,Sm)	Z-23	1,90	1,90	0,68	0,20	5	17,99
(S7,J)	Z-24	2,50	1,00	0,68	0,20	1	2,75
(S9,Sc);(S8,Sc)	Z-25	1,75	1,75	0,68	0,20	2	5,29
(S8S9,Diag);(S7S8,Diag);(S13 9, Diag)	Z-26	0,90	0,90	0,68	0,20	3	3,45
(S8,Sd)	Z-27	3,00	1,80	0,68	0,20	1	5,09
(S8,Sh)	Z-28	2,80	1,70	0,68	0,20	1	4,57
(S9,D)	Z-29	2,60	1,60	0,68	0,20	1	4,08
(S9,7)	Z-30	3,20	1,00	0,68	0,20	1	3,43
				FACTOR DE EXPANSION		1,3	158,95
						SUBTOTAL	206,63

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	374,48
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	206,63
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	581,11
CANTIDAD CONTRACTUAL	1072,50
PENDIENTE POR PAGAR	491,39
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	206,63

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6528

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES de OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. — 860115406-0
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR — 901493970-2
CAPÍTULO	2 — ITEM 2,40

CONTRATO No 2021040002

CONTRATO No. 2021050007

Relleno con material seleccionado de sitio

UNID. M3



LOCALIZACIÓN	REF	VOL EXCAVADO CON H PROMEDIO LADO	ANCHO	PROFUNDIDAD ACTA 1	PROFUNDIDAD ACTA 2	PROFUNDIDAD PROM	DIMENSIONES vol exc	vol concreto de zapata	vol solado	CANT	M3
(9,Sb)	Z-1	1,05	1,05	0,75	0,68	0,72	1,50	0,28	0,08	1	1,15
(9,Sd)	Z-2	1,25	1,25	0,75	0,68	0,72	1,95	0,43	0,11	1	1,41
(S12,Sb)	Z-3	1,30	1,30	0,75	0,68	0,72	2,07	0,46	0,11	1	1,49
(S1,D)	Z-4	1,15	1,15	0,75	0,68	0,72	1,72	0,33	0,09	1	1,30
(9,Sc)	Z-5	1,20	1,20	0,75	0,68	0,72	1,80	0,36	0,10	1	1,37
(S13,Sa)	Z-6	1,10	1,10	0,75	0,68	0,72	1,61	0,30	0,08	1	1,22
(S7,Sa)	Z-7	1,35	1,35	0,75	0,68	0,72	2,19	0,50	0,12	1	1,57
(S13,Sd)	Z-8	1,55	1,55	0,75	0,68	0,72	2,72	0,72	0,15	1	1,85
(S13,Sb)	Z-9	1,65	1,65	0,75	0,68	0,72	3,00	0,90	0,15	1	1,95
(S13,D)	Z-10	1,60	1,60	0,75	0,68	0,72	2,88	0,77	0,16	1	1,93
(S13,Sc)	Z-11	1,50	1,50	0,75	0,68	0,72	2,58	0,69	0,14	1	1,76
(S3,Sc)	Z-12	1,40	1,40	0,75	0,68	0,72	2,32	0,54	0,13	1	1,65
(S2,Diag)	Z-13	0,85	0,85	0,75	0,68	0,72	1,12	0,18	0,06	1	0,88
(S283,Diag)	Z-14	0,80	0,80	0,75	0,68	0,72	1,03	0,16	0,05	1	0,82
(S3,D)	Z-15	1,45	1,45	0,75	0,68	0,72	2,45	0,63	0,12	1	1,70
(S3,Diag)	Z-16	1	1	0,75	0,68	0,72	1,40	0,25	0,07	1	1,08
(S12,Sb)	Z-17	1,7	1,7	0,75	0,68	0,72	3,15	0,94	0,18	1	2,03
(S7,Sc)	Z-18	1,8	1,8	0,75	0,68	0,72	3,46	1,05	0,20	1	2,21
(S12,Sd)	Z-19	1,85	1,85	0,75	0,68	0,72	3,62	1,20	0,21	1	2,29
(3,Sv)	Z-20	1,8	1,8	0,75	0,68	0,72	3,46	1,13	0,20	1	2,13
(S7,Sd)	Z-21	1,95	1,95	0,75	0,68	0,72	3,95	1,33	0,23	1	2,39
(S7,D)	Z-22	2,4	1,4	0,75	0,68	0,72	3,60	1,01	0,21	1	2,39
(7,Sd)	Z-23	1,9	1,9	0,75	0,68	0,72	3,78	1,26	0,22	1	2,30
(S7,J)	Z-24	2,5	1	0,75	0,68	0,72	2,90	0,63	0,16	1	2,11
(S12,Sc)	Z-25	1,75	1,75	0,75	0,68	0,72	3,31	1,00	0,19	1	2,11
(S859,Diag)	Z-26	0,9	0,9	0,75	0,68	0,72	1,21	0,20	0,06	1	0,95
(S8,Sd)	Z-27	3	1,8	0,75	0,68	0,72	5,36	2,43	0,32	1	3,60
(S8,Sb)	Z-28	2,8	1,7	0,75	0,68	0,72	4,80	1,67	0,29	1	2,85
(S9,D)	Z-29	2,6	1,8	0,75	0,68	0,72	4,29	1,46	0,25	1	2,58
(J59,7)	Z-30	3,2	1	0,75	0,68	0,72	3,60	1,12	0,20	1	2,28
(9,Sa)	Z31	0,95	0,95	0,75	0,68	0,72	1,30	0,23	0,05	1	1,02
										SUBTOTAL	55,28

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	55,28
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	55,28
CANTIDAD CONTRACTUAL	990
PENDIENTE POR PAGAR	934,72
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	55,28

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6529

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	3	ITEM	3.2.1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	UNID. M3

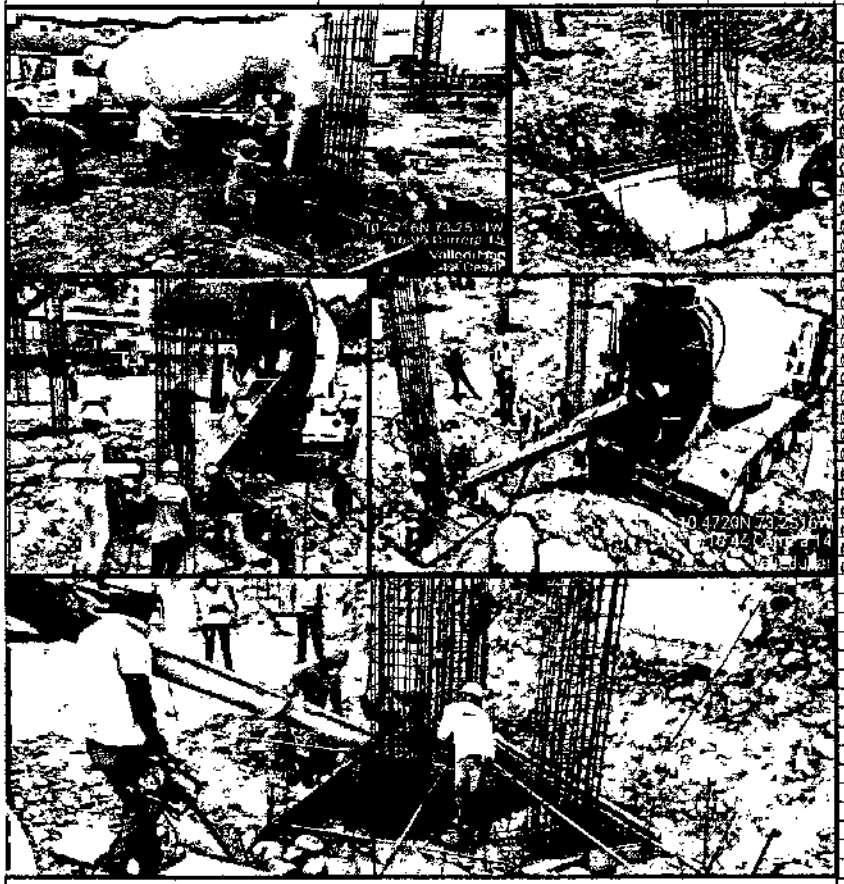

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES H	CANT	M3
(S1,Diag)	Z-1	1,05	1,05	0,25	1	0,28
(9,S);(7,Diag);(S9,Diag);(7S9,Diag)	Z-2	1,25	1,25	0,28	4	1,72
(S1,So);(S1,Sv);(S1,Sw);(S12,);(S1,K);(S1,Si);(S1,Sm)	Z-3	1,30	1,30	0,28	7	3,25
(7,Diag)	Z-4	1,15	1,15	0,25	1	0,33
(S13,Diag)	Z-5	1,20	1,20	0,25	1	0,36
(S8,Diag)	Z-6	1,10	1,10	0,25	1	0,30
(3,Diag);(S9,Sa);(S8,Sa)	Z-7	1,35	1,35	0,28	3	1,50
(S13,Sm);(S13,Sp);(S7,Sp)	Z-8	1,55	1,55	0,30	3	2,16
(S2,Sw);(S8,Su);(S7,Sv)	Z-10	1,60	1,60	0,30	3	2,30
(S3,Sv);(S3,Sw);(S12,Sp);(S12,J)	Z-11	1,50	1,50	0,30	4	2,70
(S2,Sk)	Z-12	1,40	1,40	0,28	1	0,54
(S2,Diag),(9,Diag)	Z-13	0,85	0,85	0,25	2	0,36
(S2S3,Diag)	Z-14	0,80	0,80	0,25	1	0,16
(S3,Diag);(S7,Diag)	Z-16	1,00	1,00	0,25	2	0,50
(S9,Si)	Z-17	1,70	1,70	0,33	1	0,94
(7,K);(3',Si);(S7,Sm)	Z-18	1,60	1,60	0,33	3	3,16
(S12,Sm);(S9,Sm);(S8,Si);(S8,Si);(S8,Sk)	Z-19	1,85	1,85	0,35	5	5,99
(3',Sv);(S12,Si);	Z-20	1,80	1,80	0,35	2	2,27
(7,Sk)	Z-21	1,95	1,95	0,35	1	1,33
(S7,D)	Z-22	2,40	1,40	0,28	1	0,94
(S9,K);(S8,K);(7,Si);(7,Sm);(S8,Sm)	Z-23	1,90	1,90	0,35	5	6,32
(S7,J)	Z-24	2,50	1,00	0,25	1	0,63
(S9,So);(S8,Sc)	Z-25	1,75	1,75	0,33	2	1,99
(S8S9,Diag);(S7S8,Diag);(S13 9, Diag)	Z-26	0,90	0,90	0,25	3	0,61
(S8,Sd)	Z-27	3,00	1,80	0,35	1	1,89
(S8,Sh)	Z-28	2,80	1,70	0,30	1	1,43
(S9,D)	Z-29	2,60	1,60	0,30	1	1,25
(7S9,J)	Z-30	3,20	1,00	0,30	1	0,96
	Z-35	9,30	8,90	0,90	1	74,49
	Z-34	14,45	7,00	0,70	1	70,81
	Z-32	14,80	7,35	0,70	1	76,15
					65	
					SUBTOTAL	287,61
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	74,60	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	287,61	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	342,21	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	330,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	-12,21	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		255,40

Nota: El valor aquí reflejado en memorias supera la cantidad contractual en 12,21m3, por lo tanto este valor será cobrado en la siguiente acta con el acta modificatoria a través de las mayores cantidades de obra.

Nombre: FABIO LOPEZ ROSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6530

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRURR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	3	ITEM	3,1	Concreto pobre e =5cm	UNID.	M2

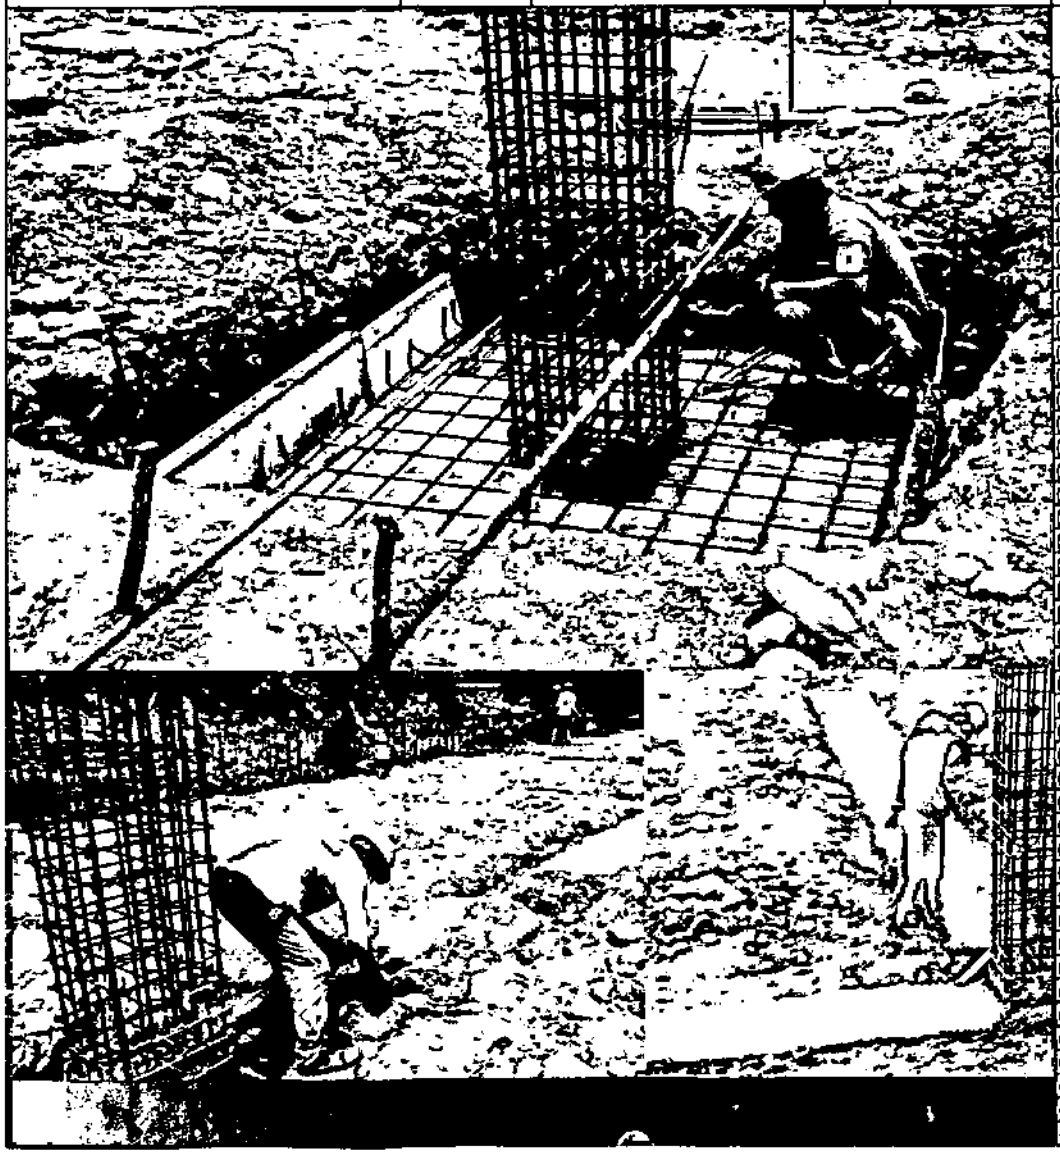

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES sobre ancho	CANT	M2
(S1,Diag)	Z-1	1,05	1,05	0,10	1	1,56
(9,St);(7,Diag);(S9,Diag);(7S9,Diag)	Z-2	1,25	1,25	0,10	4	8,41
(S1,Su);(S1,Sv);(S1,Sw);(S12,DIAG);(S1,K);(S1,St);(S1,Sm)	Z-3	1,30	1,30	0,10	7	15,75
(7',Diag)	Z-4	1,15	1,15	0,10	1	1,82
(S13,Diag)	Z-5	1,20	1,20	0,10	1	1,96
(S8,Diag)	Z-6	1,10	1,10	0,10	1	1,69
(3',Diag);(S9,Sa);(S8,Sa)	Z-7	1,35	1,35	0,10	3	7,21
(S13,Sm);(S13,Sp);(S7,Sp)	Z-8	1,55	1,55	0,10	3	9,19
(S2,Sw);(S8,Su);(S7,Sv)	Z-10	1,60	1,60	0,10	3	9,72
(S3,Sv);(S3,Sw);(S12,Sp);(S12,J)	Z-11	1,50	1,50	0,10	4	11,56
(S2,Sx)	Z-12	1,40	1,40	0,10	1	2,56
(S2,Diag);(9,Diag)	Z-13	0,85	0,85	0,10	2	2,21
(S2S3,Diag)	Z-14	0,80	0,80	0,10	1	1,00
(S3,Diag);(S7,Diag)	Z-16	1,00	1,00	0,10	2	2,88
(S9,St)	Z-17	1,70	1,70	0,10	1	3,61
(7,K);(3',St);(S7,Sm)	Z-18	1,80	1,80	0,10	3	12,00
(S12,Sm);(S9,Sm);(S9,St);(S8,St);(S8,Sk)	Z-19	1,85	1,85	0,10	5	21,01
(3',Sv);(S12,St);	Z-20	1,80	1,80	0,10	2	8,00
(7,Sk)	Z-21	1,95	1,95	0,10	1	4,62
(S7,D)	Z-22	2,40	1,40	0,10	1	4,16
(S9,K);(S8,K);(7,St);(7,Sm);(S8,Sm)	Z-23	1,90	1,90	0,10	5	22,05
(S7,J)	Z-24	2,50	1,00	0,10	1	3,24
(S9,Sc);(S8,Sc)	Z-25	1,75	1,75	0,10	2	7,61
(S8S9,Diag);(S7S8,Diag);(S13 9, Diag)	Z-26	0,90	0,90	0,10	3	3,63
(S8,Sd)	Z-27	3,00	1,80	0,10	1	6,40
(S8,Sh)	Z-28	2,80	1,70	0,10	1	5,70
(S9,D)	Z-29	2,60	1,60	0,10	1	5,04
(JS9,7)	Z-30	3,20	1,00	0,10	1	4,08
(Sa→S1DIAG)	VC-1	0,50	126,00	0,10	1	76,80
(Sa→S2DIAG)	VC-2	0,50	123,00	0,10	1	73,80
(Sa→S3DIAG)	VC-3	0,50	118,50	0,10	1	71,10
(Sa→Sd);(St→3'DIAG)	VC-4	0,50	40,46	0,10	1	24,28
(Sa→Sd);(St→S7DIAG)	VC-6	0,50	64,04	0,10	1	38,42
(Sa→Sd);(St→S8DIAG)	VC-7	0,50	50,38	0,10	1	30,23
(Sa→D)	VC-8	0,50	52,71	0,10	1	31,63
(Sa→Sd)	VC-9	0,50	17,35	0,10	1	10,41
(Sa→Sh)	VC-11	0,50	32,35	0,10	1	19,41
(Sa→Sh)	VC-12	0,50	32,35	0,10	1	19,41
(Sa→Sh)	VC-13	0,50	32,35	0,10	1	19,41
(S1→9)	VC-14	0,50	65,40	0,10	1	39,24
(S1→9)	VC-15	0,50	65,40	0,10	1	39,24
(S1→9)	VC-16	0,50	66,39	0,10	1	39,83
(S1→9)	VC-17	0,50	65,40	0,10	1	39,24
(S1→S3);(S12→9)	VC-18	0,50	34,20	0,10	1	20,52

9539



(S1→S...2→9)	VC-19	0,50	21,20	0,10	1	12,72
(S1→S3)	VC-21	0,50	11,00	0,10	1	6,60
(S1→S3)	VC-22	0,50	11,00	0,10	1	6,60
(S1→S3)	VC-23	0,50	11,25	0,10	1	6,75
(S1→S3)	VC-24	0,50	11,00	0,10	1	6,60
(S1→S3)	VC-26	0,50	11,00	0,10	1	6,60
(S1→S3)	VC-27	0,50	24,50	0,10	1	14,70
(S1→S3)	VC-29	0,50	26,00	0,10	1	15,60
(S1→S8)	VC-30	0,50	39,61	0,10	1	23,77
(S1→S8)	VC-31	0,50	34,92	0,10	1	20,95
(S1→S7S8DIAG)	VC-32	0,50	25,82	0,10	1	15,49
(S1→3'4DIAG)	VC-33	0,50	17,27	0,10	1	10,36
(S1→S2S3DIAG)	VC-34	0,50	8,61	0,10	1	5,17
(S1DIAG→S9DIAG)	VC-35	0,50	50,60	0,10	1	30,36
					SUBTOTAL	963,90
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	308,97	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	963,90	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1272,87	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	7683,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	6410,13	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		963,90


Nombres FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6532

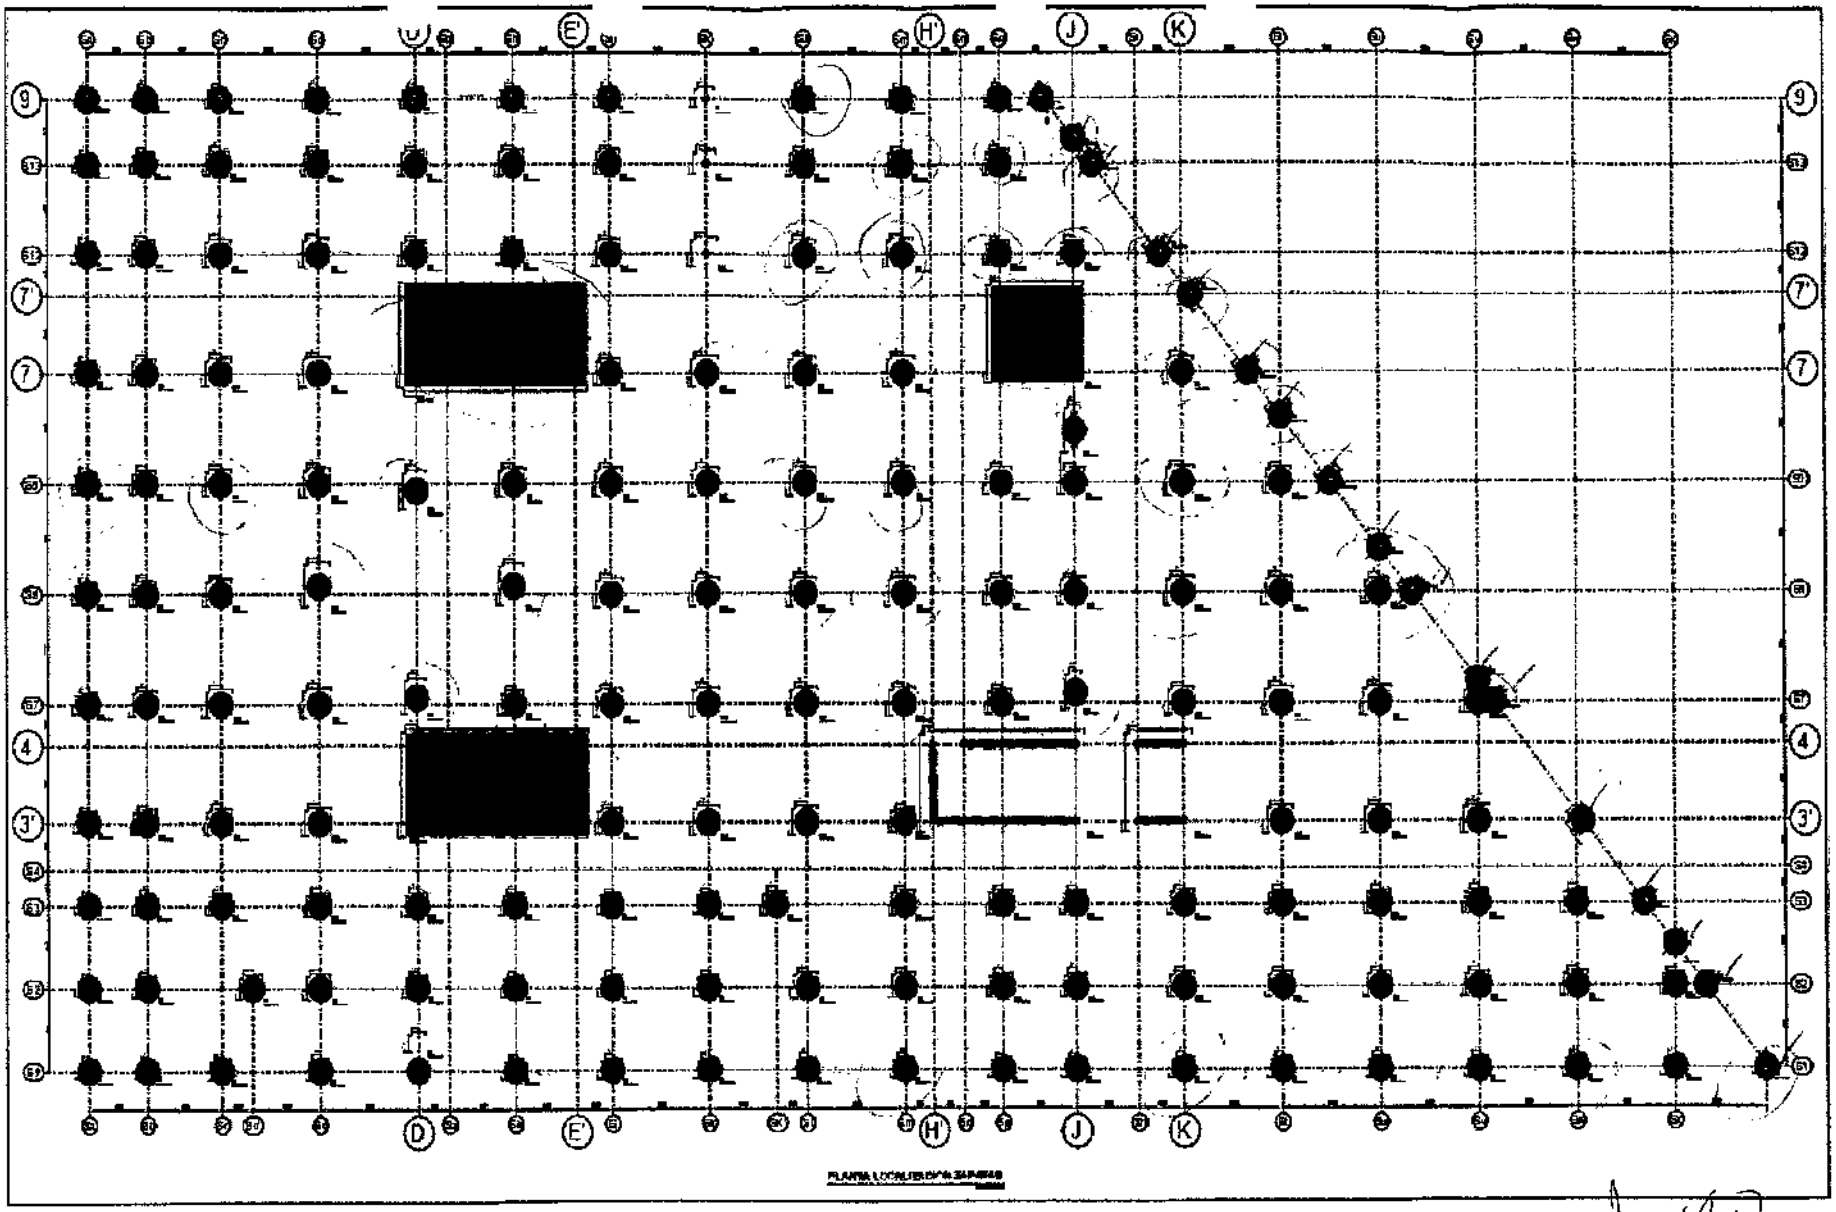

Las zapatas en color verde fueron las cobradas mediante acta #1
Las zapatas en color rojo son las cobradas en la presente acta #2

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACION: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. — NIT 890115406-0 — CONTRATO No. 2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR — NIT 901493970-2 — CONTRATO No. 2021050007
CAPÍTULO	3 — ITEM 3,2,2 — Acero de refuerzo fy 60,000psi (Zapatas) — UNID. KG

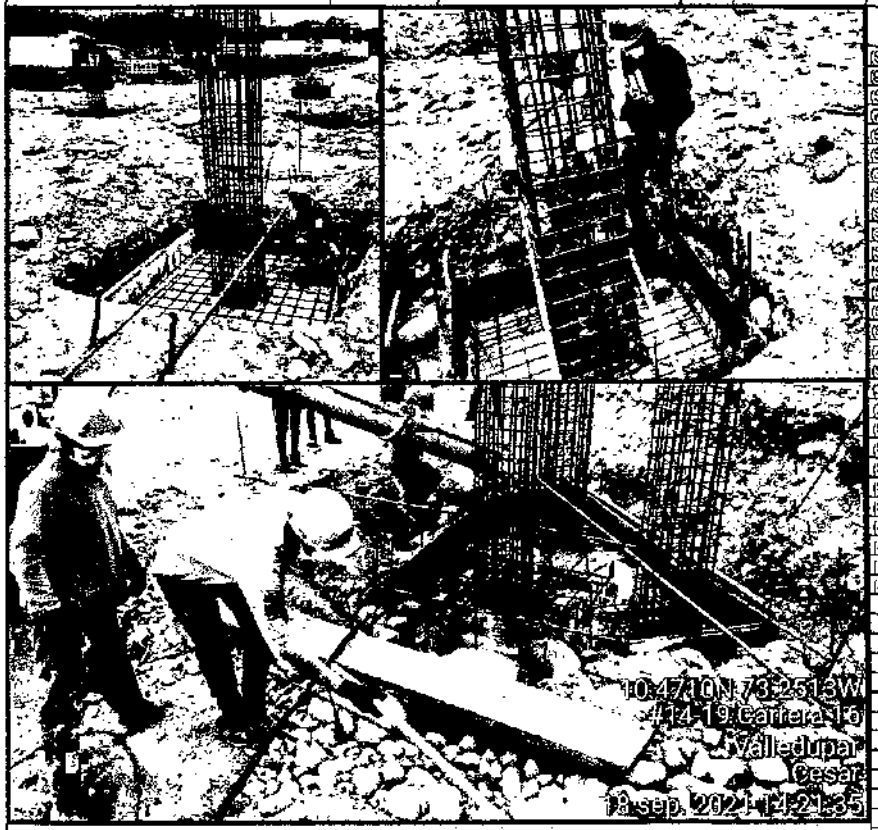

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES	KG	CANT	KG
(S1,Diag)	Z-1		9,84	1	9,84
(9,S1);(7,Diag);(S9,Diag);(7S9,Diag)	Z-2		15,99	4	63,96
(S1,Su);(S1,Sv);(S1,Sw);(S12,);(S1,K);(S1,Sl);(S1,Sm)	Z-3		16,60	7	116,20
(7',Diag)	Z-4		12,07	1	12,07
(S13,Diag)	Z-5		12,58	1	12,58
(S8,Diag)	Z-6		10,29	1	10,29
(3',Diag);(S9,Se);(S8,Se)	Z-7		18,78	3	56,34
(S13,Sm);(S13,Sp);(S7,Sp)	Z-8		30,42	3	91,26
(S2,Sw);(S8,Su);(S7,Sv)	Z-10		31,31	3	93,93
(S3,Sv);(S3,Sw);(S12,Sp);(S12,J)	Z-11		29,52	4	118,08
(S2,Sx)	Z-12		19,45	1	19,45
(S2,Diag);(9,Diag)	Z-13		6,04	2	12,08
(S2S3,Diag)	Z-14		5,70	1	5,70
(S3,Diag);(S7,Diag)	Z-16		9,39	2	18,78
(S9,Sl)	Z-17		40,46	1	40,46
(7,K);(3',Sl);(S7,Sm)	Z-18		46,52	3	139,56
(S12,Sm);(S9,Sm);(S9,Sl);(S8,Sl);(S8,Sk)	Z-19		51,69	5	258,45
(3',Sv);(S12,Sl);	Z-20		50,40	2	100,80
(7,Sk)	Z-21		58,45	1	58,45
(S7,D)	Z-22		33,46	1	33,46
(S9,K);(S8,K);(7,Sl);(7,Sm);(S8,Sm)	Z-23		57,06	5	285,30
(S7,J)	Z-24		21,97	1	21,97
(S9,Sc);(S8,Sc)	Z-25		41,55	2	83,10
(S8S9,Diag);(S7S8,Diag);(S13 9, Diag)	Z-26		7,43	3	22,29
(S8,Sd)	Z-27		81,41	1	81,41
(S8,Sh)	Z-28		58,75	1	58,75
(S9,D)	Z-29		50,69	1	50,69
(JS9,7)	Z-30		8,39	1	8,39
	Z-33		12.724,30	1	12.724,30
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	14.607,94

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	3.097,94	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	14.607,94	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	17.705,88	
CANTIDAD CONTRACTUAL	16.500,00	
PENDIENTE POR PAGAR	- 1.205,88	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		13.402,06

Nota: El valor aquí reflejado en memorias supera la cantidad contractual en 1205,88kg, por lo tanto este valor será cobrado en la siguiente acta con el acta modificatoria a través de las mayores cantidades de obra.

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6534

6535

ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD DE VARILLAS	LONGITUD TOTAL EN METROS	CANTIDAD DE ZAPATAS	Peso por zapata (KG)	peso total (Kg)	TOTAL X ZAPATA
ZAPATAS CCMV									
ZAPATA Z-1	3	0,075 — 0,95 — 0,075	1,10	16	17,6	1,0	9,84	9,84	9,84
ZAPATA Z-2	3	0,075 — 1,15 — 0,075	1,30	22	28,6	4,0	15,99	63,95	63,95
ZAPATA Z-3	3	0,075 — 1,20 — 0,075	1,35	22	29,7	7,0	16,60	116,22	116,22
ZAPATA Z-4	3	0,075 — 1,05 — 0,075	1,20	18	21,6	1,0	12,07	12,07	12,07
ZAPATA Z-5	3	0,075 — 1,10 — 0,075	1,25	18	22,5	1,0	12,58	12,58	12,58
ZAPATA Z-6	3	0,075 — 1,00 — 0,075	1,15	16	18,40	1,0	10,29	10,29	10,29
ZAPATA Z-7	3	0,075 — 1,25 — 0,075	1,40	24	33,60	3,0	18,78	56,35	56,35
ZAPATA Z-8	4	0,125 — 1,45 — 0,125	1,70	18	30,60	3,0	30,42	91,25	91,25
\PATA Z-10	4	0,125 — 1,5 — 0,125	1,75	18	31,50	3,0	31,31	93,93	93,93
ZAPATA Z-11	4	0,125 — 1,4 — 0,125	1,65	18	29,70	4,0	29,52	118,09	118,09
ZAPATA Z-12	3	0,075 — 1,3 — 0,075	1,45	24	34,80	1,0	19,45	19,45	19,45
ZAPATA Z-13	3	0,075 — 0,75 — 0,075	0,90	12	10,80	2,0	6,04	12,07	12,07
ZAPATA Z-14	3	0,075 — 0,7 — 0,075	0,85	12	10,20	1,0	5,70	5,70	5,70
ZAPATA Z-16	3	0,075 — 0,9 — 0,075	1,05	16	16,80	2,0	9,39	18,78	18,78
ZAPATA Z-17	4	0,125 — 1,6 — 0,125	1,85	22	40,70	1,0	40,46	40,46	40,46
ZAPATA Z-18	4	0,125 — 1,7 — 0,125	1,95	24	46,80	3,0	46,52	139,56	139,56
ZAPATA Z-19	4	0,125 — 1,75 — 0,125	2,00	26	52,00	5,0	51,69	258,44	258,44
ZAPATA Z-20	4	0,125 — 1,7 — 0,125	1,95	26	50,70	2,0	50,40	100,79	100,79
ZAPATA Z-21	4	0,125 — 1,85 — 0,125	2,10	28	58,80	1,0	58,45	58,45	58,45
ZAPATA Z-22	3	0,075 — 2,3 — 0,075	2,45	12	29,40	1,0	16,43	16,43	33,46
ZAPATA Z-22	3	0,075 — 1,3 — 0,075	1,45	21	30,45	1,0	17,02	17,02	
ZAPATA Z-23	4	0,125 — 1,8 — 0,125	2,05	28	57,40	5,0	57,06	285,28	285,28
ZAPATA Z-24	3	0,075 — 2,4 — 0,075	2,55	8	20,40	1,0	11,40	11,40	21,97
ZAPATA Z-24	3	0,075 — 0,9 — 0,075	1,05	18	18,90	1,0	10,57	10,57	
ZAPATA Z-25	4	0,125 — 1,65 — 0,125	1,90	22	41,80	2,0	41,55	83,10	83,10
ZAPATA Z-26	3	0,075 — 0,8 — 0,075	0,95	14	13,30	3,0	7,43	22,30	22,30
ZAPATA Z-27	4	0,125 — 2,9 — 0,125	3,15	13	40,95	1,0	40,70	40,70	81,41
ZAPATA Z-27	4	0,125 — 1,7 — 0,125	1,95	21	40,95	1,0	40,70	40,70	

ZAPATA Z-28	4	0,125 — 2,7 — 0,125	2,95	10	29,50	1,0	29,32	29,32	58,75
ZAPATA Z-28	4	0,125 — 1,6 — 0,125	1,85	16	29,60	1,0	29,42	29,42	
ZAPATA Z-29	4	0,125 — 2,5 — 0,125	2,75	9	24,75	1,0	24,60	24,60	50,69
ZAPATA Z-29	4	0,125 — 1,5 — 0,125	1,75	15	26,25	1,0	26,09	26,09	
ZAPATA Z-30	3	0,075 — 2,45 — 0,075	2,60	3	7,80	1,0	4,36	4,36	8,39
ZAPATA Z-30	3	0,075 — 0,25 — 0,075	0,40	18	7,20	1,0	4,02	4,02	
ZAPATA Z-33	5	0,2 — 9,7	9,90	54	534,60	1,0	829,70	829,70	12.724,30
ZAPATA Z-33	5	0,2 — 4,05	4,25	54	229,50	1,0	356,18	356,18	
ZAPATA Z-33	5	0,2 — 8,65	8,85	54	477,90	1,0	741,70	741,70	
ZAPATA Z-33	5	0,2 — 4,85	5,05	54	272,70	1,0	423,23	423,23	
ZAPATA Z-33	5	0,2 — 6,8 — 0,200	7,20	180	1.296,00	1,0	2.011,39	2.011,39	
VIGA Z2	10	0,45 — 6,05 — 0,450	6,95	10	69,50	1,0	445,08	445,08	
ESTRIBOS VG-Z2	5	2,02 0,52 0,100 0,100 2,02 0,52	5,28	19	100,32	1,0	155,70	155,70	
ESTRIBOS VG-Z2	5	0,125 — 2,04 — 0,125	2,29	19	43,51	1,0	67,53	67,53	
VIGA Z5	10	0,45 — 6,05 — 0,450	6,95	15	104,25	3,0	667,62	2.002,85	
VIGA Z5	8	0,325 — 6,05 — 0,325	6,70	6	40,20	3,0	159,71	479,14	
ESTRIBOS VG-Z5	5	2,02 0,52 0,100 0,100 2,02 0,52	5,28	43	227,04	3,0	352,37	1.057,10	
ESTRIBOS VG-Z5	5	0,125 — 2,04 — 0,125	2,29	43	98,47	3,0	152,83	458,48	
VIGA Z6	10	0,45 — 6,05 — 0,450	6,95	10	69,50	1,0	445,08	445,08	
VIGA Z6	8	5,9	5,90	4	23,60	1,0	93,76	93,76	
ESTRIBOS VG-Z6	5	2,02 0,52 0,100 0,100 2,02 0,52	5,28	19	100,32	1,0	155,70	155,70	
ESTRIBOS VG-Z6	5	0,125 — 2,04 — 0,125	2,29	19	43,51	1,0	67,53	67,53	
VIGA Z7	10	0,45 — 8,5	8,95	5	44,75	2,0	286,58	573,16	
VIGA Z7	10	0,45 — 5,85	6,30	5	31,50	2,0	201,73	403,45	
VIGA Z7	10	0,45 — 8,65	9,10	5	45,50	2,0	291,38	582,76	
VIGA Z7	10	0,45 — 5,2	5,65	5	28,25	2,0	180,91	361,83	
ESTRIBOS VG-Z7	5	2,02 0,62 0,100 0,100 2,02 0,62	5,48	42	230,16	2,0	357,21	714,42	
ESTRIBOS VG-Z7	5	0,125 — 2,04 — 0,125	2,29	42	96,18	2,0	149,27	298,54	
					TOTAL REFUERZO ZAPATAS				14.607,90

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE TIDADES DE OI

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	4	ITEM	4,1,1	Concreto 4000Psi para columnas	UNID. M3





LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LADO	ANCHO	H	CANT	M3
(9,Sa);(9,Sb);(9,Sc);(9,Sd);(9,D);(9,Sh);(S13,Sa);(S13,Sb);(S13,Sc);(S13,Sd);(S13,D);(S13,Sh);(S12,D);(S12,Sh);(S12,Sa);(S12,Sb);(S12,Sc);(S12,Sd);(7,Sa);(7,Sb);(7,Sc);(7,Sd);(S9,Sa);(S9,Sb);(S9,Sc);(S9,Sd)(S8,Sa);(S8,Sb);(S8,Sc);(S7,Sa);(S7,Sb);(S7,Sc);(S7,Sd);(3',Sa);(3',Sb);(3',Sc);(3',Sd);(S3,Sa);(S3,Sb);(S3,Sc);(S3,Sd);(S3,D);(S3,Sh);(S3,Sj);(S3,Sk);(S3,Sk');(S2,Sa);(S2,Sb);(S2,Sc');(S2,Sd);(S2,D);(S2,Sh);(S2,Sj);(S2,Sk);(S2,Sl);(S1,Sa);(S1,Sb);(S1,Sc);(S1,Sd);(S1,D);(S1,Sh);(S1,Sj);(S1,Sk);(S1,Sl);(S1,Sm);(S1,Sp);(S1,J);(S1,K);(S1,St);(S1,Su);(S1,Sv);(S1,Sw);(S1,Sx);(S1,DIAG)(S2,Sm);(S2,Sp);(S2,J);(S2,K);(S2,Sl);(S2,Su);(S2,Sv);(S2,Sw);(S2,Sx);(S2,DIAG);(S2S3DIAG,Sx);(S3,Sm);(S3,Sp);(S3,J);(S3,K);(S3,Sl);(S3,Su);(S3,Sv);(S3,Sw);(S3,DIAG);(3',Sl);(3',Su);(3',Sv);(3',DIAG);(S7,K);(S7,Sl);(S7,Su);(S7,Sv),(S7,DIAG),(S7,S8DIAG);(S8,J);(S8,K);(S8,Sl);(S8,Su);(S8,DIAG);(S8,S9DIAG);(S9,J);(S9,K);(S9,Sl);(S9,DIAG)	C1	0,50	0,50	2,95	114	84,08
PEDESTAL DE NIVELACIÓN	C1	0,50	0,50	0,08	114	2,28
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					SUBTOTAL	86,36
					CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00
					CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	86,36
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	86,36
					CANTIDAD CONTRACTUAL	1467,00
					PENDIENTE POR PAGAR	1380,65
					TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	86,36


Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

653

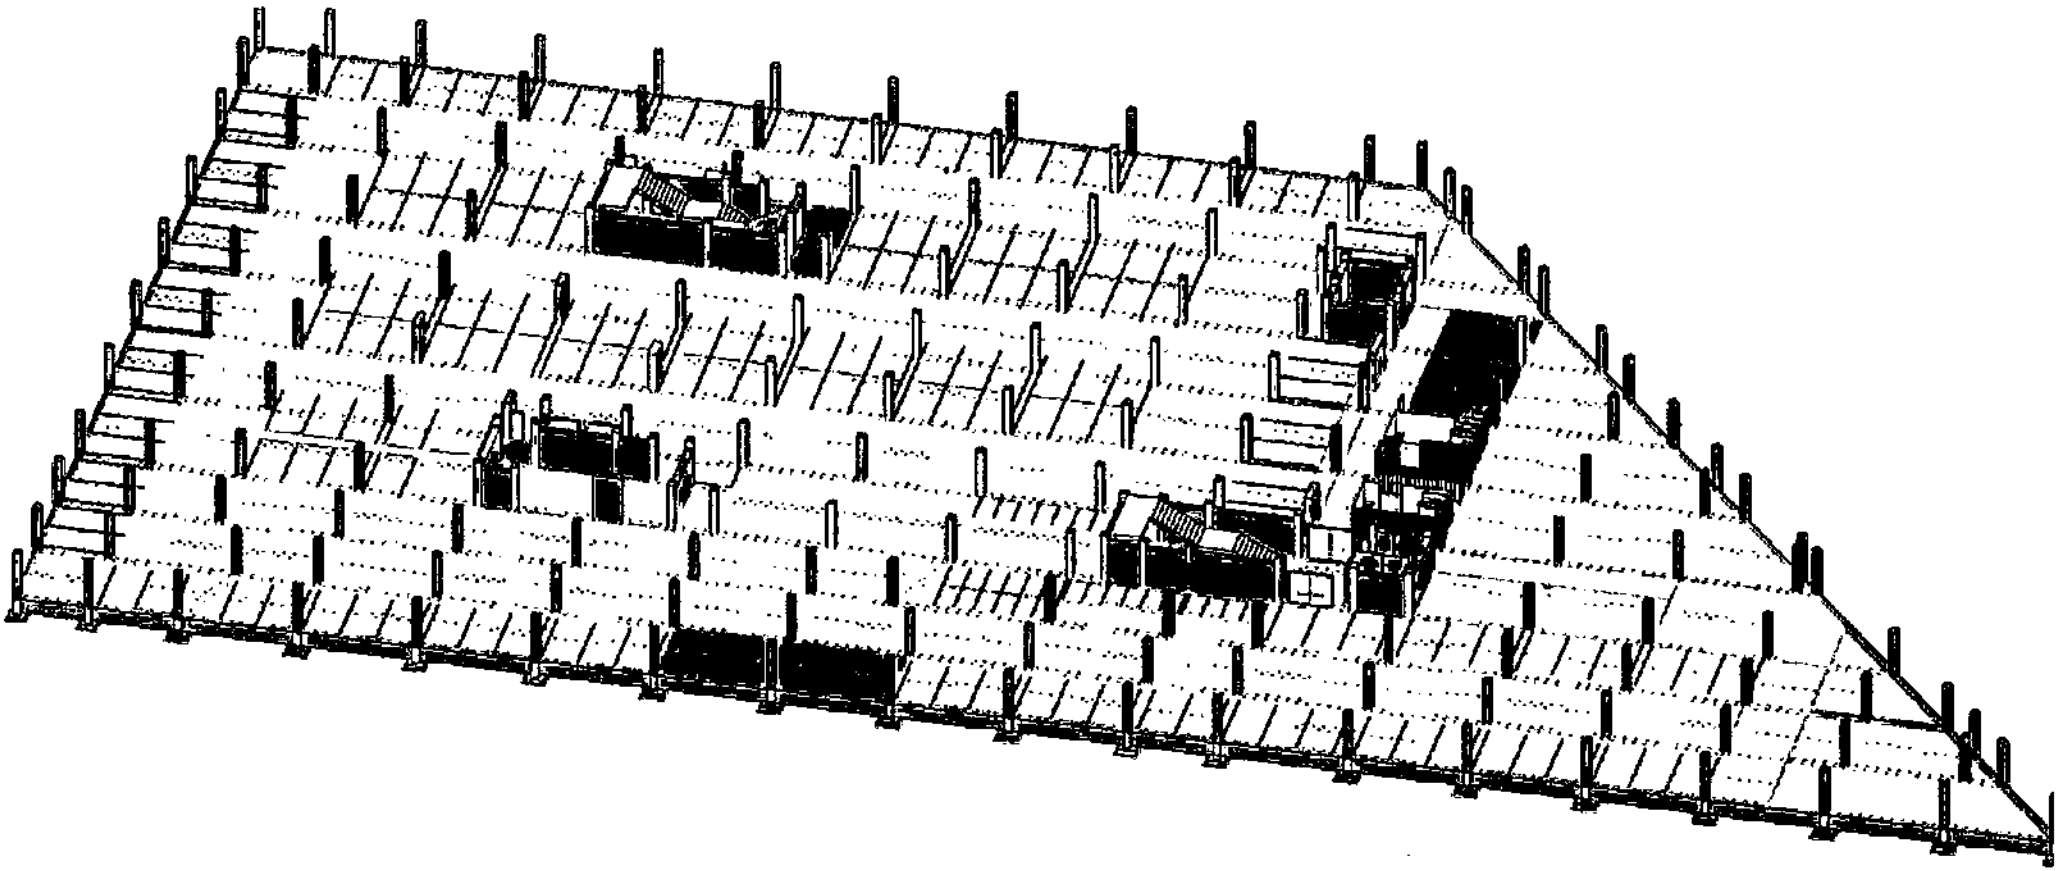

Columnas fundidas a corte 10 de noviembre de 2021 [redacted]

65386

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

IEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDA DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	4	ITEM	4.1.2	Acero de refuerzo fy 60.000psi (Columnas)		UNID.	KG





LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES		KG	CANT	KG
(S1,)	C1			160,64	1	160,64
(9,S);(7,);(S9,);(,S)	C1			160,64	4	642,56
(S1,Se);(S1,Sv);(S1,Sw);(S12,);(S1,K);(S1,Sb);(S1,Sm)	C1			160,64	7	1124,48
(7,)	C1			160,64	1	160,64
(S13,)	C1			160,64	1	160,64
;S8,)	C1			160,64	1	160,64
(3',);(S9,Se);(S8,Se)	C1			160,64	3	481,92
(S13,Sm);(S13,Sp);(S7,Sp);	C1			160,64	3	481,92
;S2,Sw);(S8,Su);(S7,Sv)	C1			160,64	3	481,92
(S3,Sv);(S3,Sw);(S12,Sp);(S12,J)	C1			160,64	4	642,56
;S3,Sc);(S3,Sh);(S12,Sh);(S2,Sx)	C1			160,64	1	160,64
(S2,);(9,)	C1			160,64	2	321,28
(,Sx)	C1			160,64	1	160,64
(S3,);(S7,)	C1			160,64	2	321,28
(S9,S!)	C1			160,64	1	160,64
(7,K);(3',S!)	C1			160,64	2	321,28
(S12,Sm);(S9,Sm);(S9,S!);(S8,S!);(S8,Sk)	C1			160,64	5	803,20
(3',Sv);(S12,S!);	C1			160,64	2	321,28
(7,Sk)	C1			160,64	1	160,64
(S7,D)	C3			518,06	1	518,06
;S9,K);(S8,K);(7,S!);(7,Sm)	C1			160,64	4	642,56
(S9,Sc)	C1			160,64	1	160,64
;S8,Sp)	C1A			184,65	1	184,65
(Su);(,Sv), (,J)	C1			160,64	3	481,92
(S9,D)	C3			518,06	1	518,06
;J)	C2			748,62	1	748,62
					SUBTOTAL	10.483,31

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	16.706,56	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	10.483,31	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	27.189,87	
CANTIDAD CONTRACTUAL	366.745,00	
PENDIENTE POR PAGAR	339.555,13	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		10.483,31

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


6530

6540

COLUMNA : C-1A

CORTE	B	H	EST	G//B	G//H
1	56.0	50.0	3.3	3.3	3.3

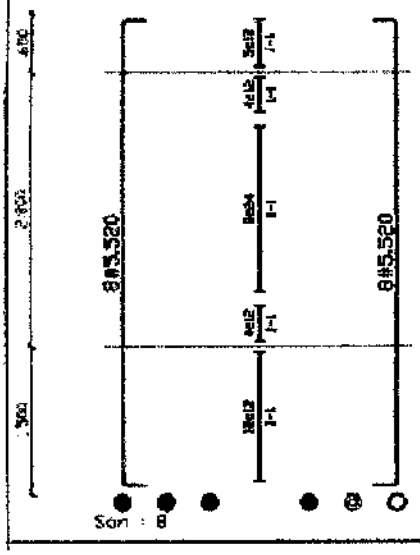





CORTE : 1 - 1
Escala 1 : 25

COLUMNA : C-1

CORTE	B	H	EST	G//B	G//H
1	50.0	50.0	3.3	3.3	3.3

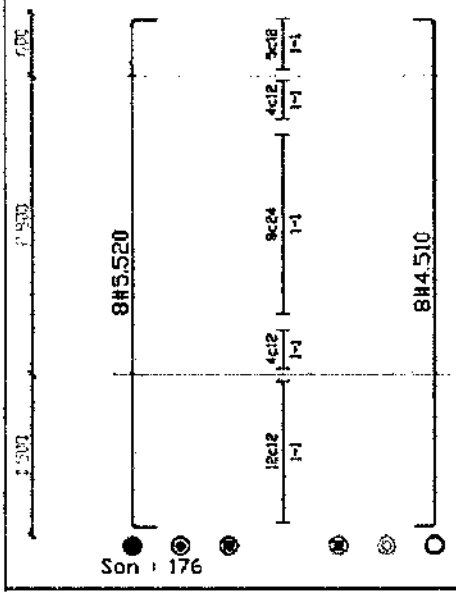





CORTE : 1 - 1
Escala 1 : 25

6547

COLUMNA : C-3

CORTE	B	H	EST	G//B	G//H
1	50.0	150.0	43	215	43

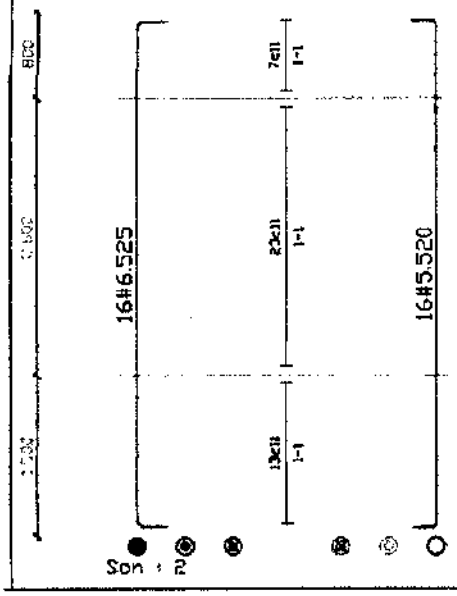


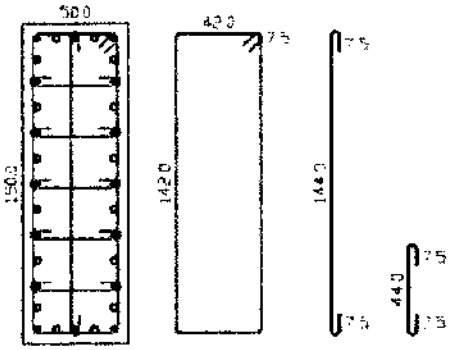


CORTE : 1 - 1
Escala 1 : 25.

COLUMNA : C-2

CORTE	B	H	EST	G//B	G//H
1	50.0	195.0	58	290	58

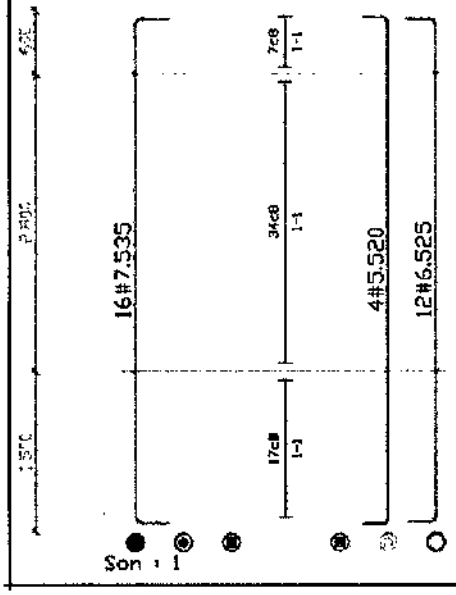

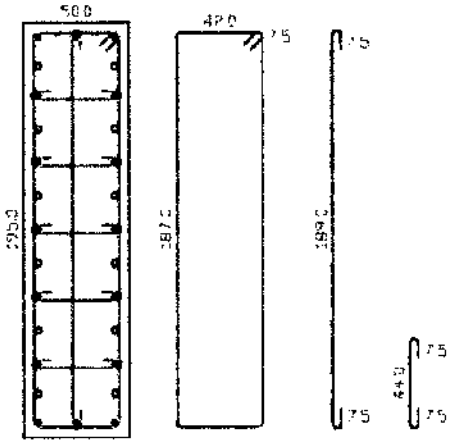



CORTE : 1 - 1
Escala 1 : 25.

6542

COLUMNA : C-6

CORTE	B	H	EST	G//B	G//H

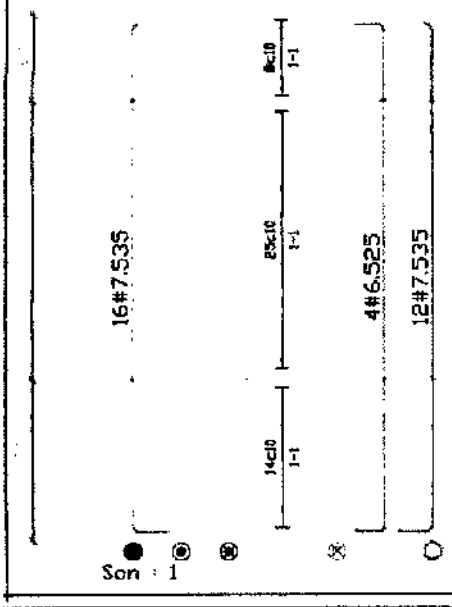


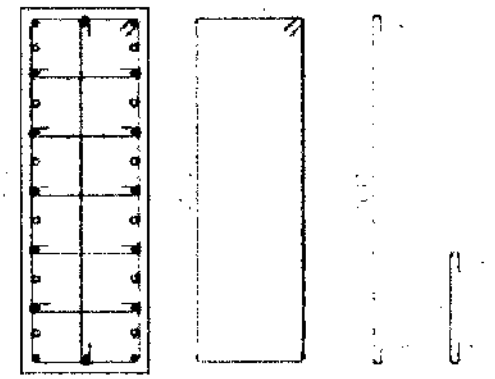


CORTE 1 - 1
Escala 1 : 25.

COLUMNA : C-4

CORTE	B	H	EST	G//B	G//H

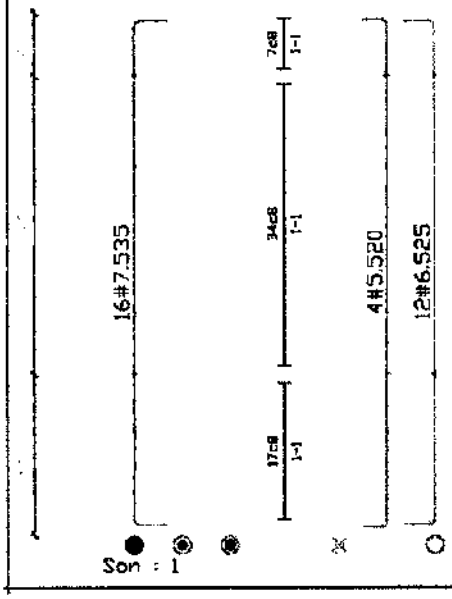

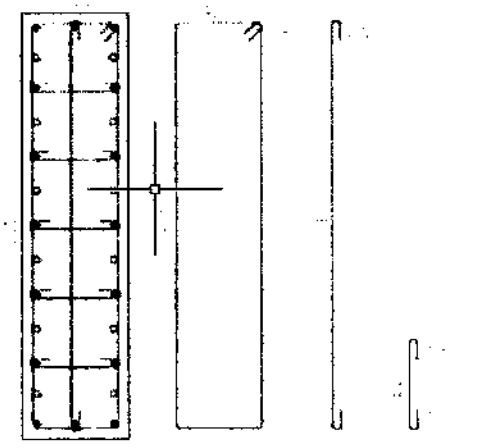

CORTE : 1 - 1
Escala 1 : 25.

LOCALIZACIÓN	IDENTIFICACIÓN	Ø ACERO	Kg/m	ESQUEMA	LONGITUD (M)	CANTIDAD DE VARILLA	LONGITUD TOTAL (M)	CANTIDAD DE COLUMNAS	PESO POR COLUMNA (KG)	PESO TOTAL (KG)
(9,Sa);(9,Sb);(9,Sc);(9,Sd);(9,D);(9,Sh);(9,Si);(S13,Sa);(S13,Sb);(S13,Sc);(S13,Sd);(S13,D);(S13,Sh);(S13,Si);(S13,Sl);(S13,Sm);(S13,Sp);(S13,);(S12,Sa);(S12,Sb);(S12,Sc);(S12,Sd);(S12,D);(S12,Sh);(S12,Si);(S12,Sl);(S12,Sm);(S12,Sp);(S12,J);(S12,)(7',);(7,Sa);(7,Sb);(7,Sc);(7,Sd);(7,Si);(7,Sl);(7,Sk);(7,Sm);(7,);(S9,Sa);(S9,Sb);(S9,Sc);(S9,Sd);(S8,Sh);(S9,Si);(S9,Sk);(S9,Sl);(S9,Sm);(S9,Sp);(S9,J);(S9,K);(S9,Si);(S9,);(S8,Sa);(S8,Sb);(S8,Sc);(S8,Si);(S8,Sk);(S8,Sl);(S8,J);(S8,K);(S8,Si);(S8,Su);(S8,);(S7,Sa);(S7,Sb);(S7,Sc);(S7,Sd);(S7,Si);(S7,Sk);(S7,Sl);(S7,Sp);(S7,K);(S7,Si);(S7,Su);(S7,Sv);(S7,);(Sv,);(3',Sa);(3',Sb);(3',Sc);(3',Sd);(3',Si);(3',Sk);(3',Sl);(3',St);(3',Su);(3',Sv);(3')(S3,Sa);(S3,Sb);(S3,Sc);(S3,Sd);(S3,D);(S3,Sh);(S3,Si);(S3,Sk);(S3,SK');(S3,Sm);(S3,Sp);(S3,J);(S3,K);(S3,Sl);(S3,Su);(S3,Sv);(S3,Sw);(S3,);(S2,Sa);(S2,Sb);(S2,Sc');(S2,Sd);(S2,D);(S2,Sh);(S2,Si);(S2,Sk);(S2,Sl);(S2,Sm);(S2,Sp);(S2,J);(S2,K);(S2,Si);(S2,Su),(S2,Sv);(S2,Sw);(S2,Sx);(S2,);(,Sx);(S1,Sa);(S1,Sb);(S1,Sc);(S1,Sd);(S1,D);(S1,Sh);(S1,Si);(S1,Sk);(S1,Sl);(S1,Sm);(S1,Sp);(S1,J);(S1,K);(S1,Si);(S1,Su);(S1,Sv);(S1,Sw);(S1,Sx);(S1,)	COLUMNA C-1	5	1,552	0,200 / 4,80 / 0,200	5,20	8	41,6	53,0	64,56	3.421,85
	COLUMNA C-1	4	0,994	0,150 / 4,80 / 0,150	5,10	8	40,8	53,0	40,56	2.149,43
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-1	3	0,559	0,42 / 0,42 / 0,075 / 0,42 / 0,42 / 0,075	1,83	33	60,4	53,0	33,76	1.789,17
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-1	3	0,559	0,075 / 0,44 / 0,075	0,59	66	38,9	53,0	21,77	1.153,68
(S8,Sp)	COLUMNA C-1A	5	1,552	0,200 / 4,80 / 0,200	5,20	16	83,2	1,0	129,13	129,13
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-1A	3	0,559	0,42 / 0,42 / 0,075 / 0,42 / 0,42 / 0,075	1,83	33	60,39	1,0	33,76	33,76
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-1A	3	0,559	0,075 / 0,44 / 0,075	0,59	66	38,94	1,0	21,77	21,77
(,J)	COLUMNA C-2	7	3,042	0,275 / 4,80 / 0,275	5,35	16	85,60	1,0	260,40	260,40
	COLUMNA C-2	6	2,235	0,225 / 4,80 / 0,225	5,25	12	63,00	1,0	140,81	140,81
	COLUMNA C-2	5	1,552	0,200 / 4,80 / 0,200	5,20	4	20,80	1,0	32,28	32,28
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-2	3	0,559	1,87 / 0,42 / 0,075 / 0,42 / 1,87 / 0,075	4,73	58	274,34	1,0	153,36	153,36
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-2	3	0,559	0,075 / 1,89 / 0,075	2,04	58	118,32	1,0	66,14	66,14
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-2	3	0,559	0,075 / 0,44 / 0,075	0,59	290	171,10	1,0	95,64	95,64
(S9,D);(S7,D)	COLUMNA C-3	6	2,235	0,225 / 4,80 / 0,225	5,25	16	84,00	2,0	187,74	375,48
	COLUMNA C-3	5	1,552	0,200 / 4,80 / 0,200	5,20	16	83,20	2,0	129,13	258,25
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-3	3	0,559	1,42 / 0,42 / 0,075 / 0,42 / 1,42 / 0,075	3,83	43	164,69	2,0	92,06	184,12
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-3	3	0,559	0,075 / 1,44 / 0,075	1,59	43	68,37	2,0	38,22	76,44
	ESTRIBOS DE COLUMNA C-3	3	0,559	0,075 / 0,44 / 0,075	0,59	215	126,85	2,0	70,91	141,82
								60,00		
									SUBTOTAL	10.483,51

6543

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CAN...DES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 10/11/21

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	4	ITEM	4.2.1	Concreto 4000Psi para MUROS DE CONTENCIÓN	UNID.	M3

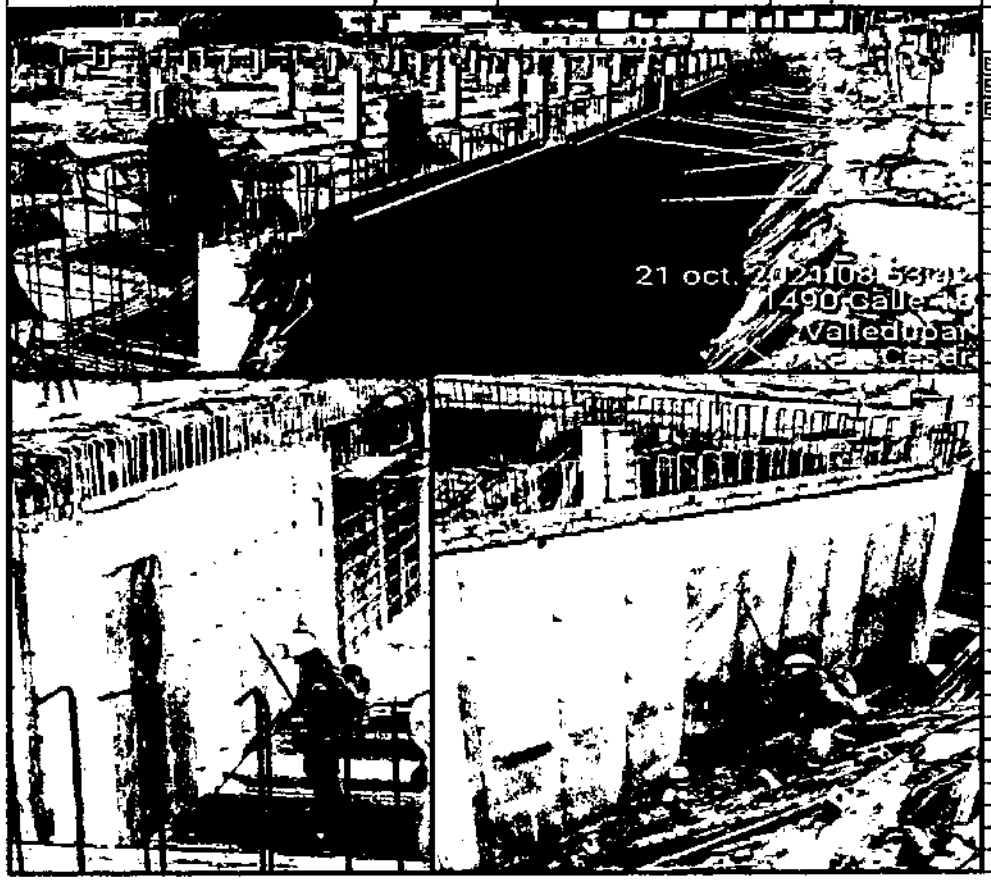

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LARGO	H	ESPESOR	CANT	M3
EJE Sa (S1,9)		65,41	2,95	0,25	1	48,24
EJE 9 (Sa,Sh)		32,36	2,95	0,25	1	23,87
EJE S1 (Sa,Sh)(Sk,Su)		83,61	2,95	0,25	1	61,66
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					SUBTOTAL	133,77

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	133,77
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	133,77
CANTIDAD CONTRACTUAL	333,00
PENDIENTE POR PAGAR	199,23
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	133,77

Nombre: FABIO LOREZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

654

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJE


CONT

INTE

CA





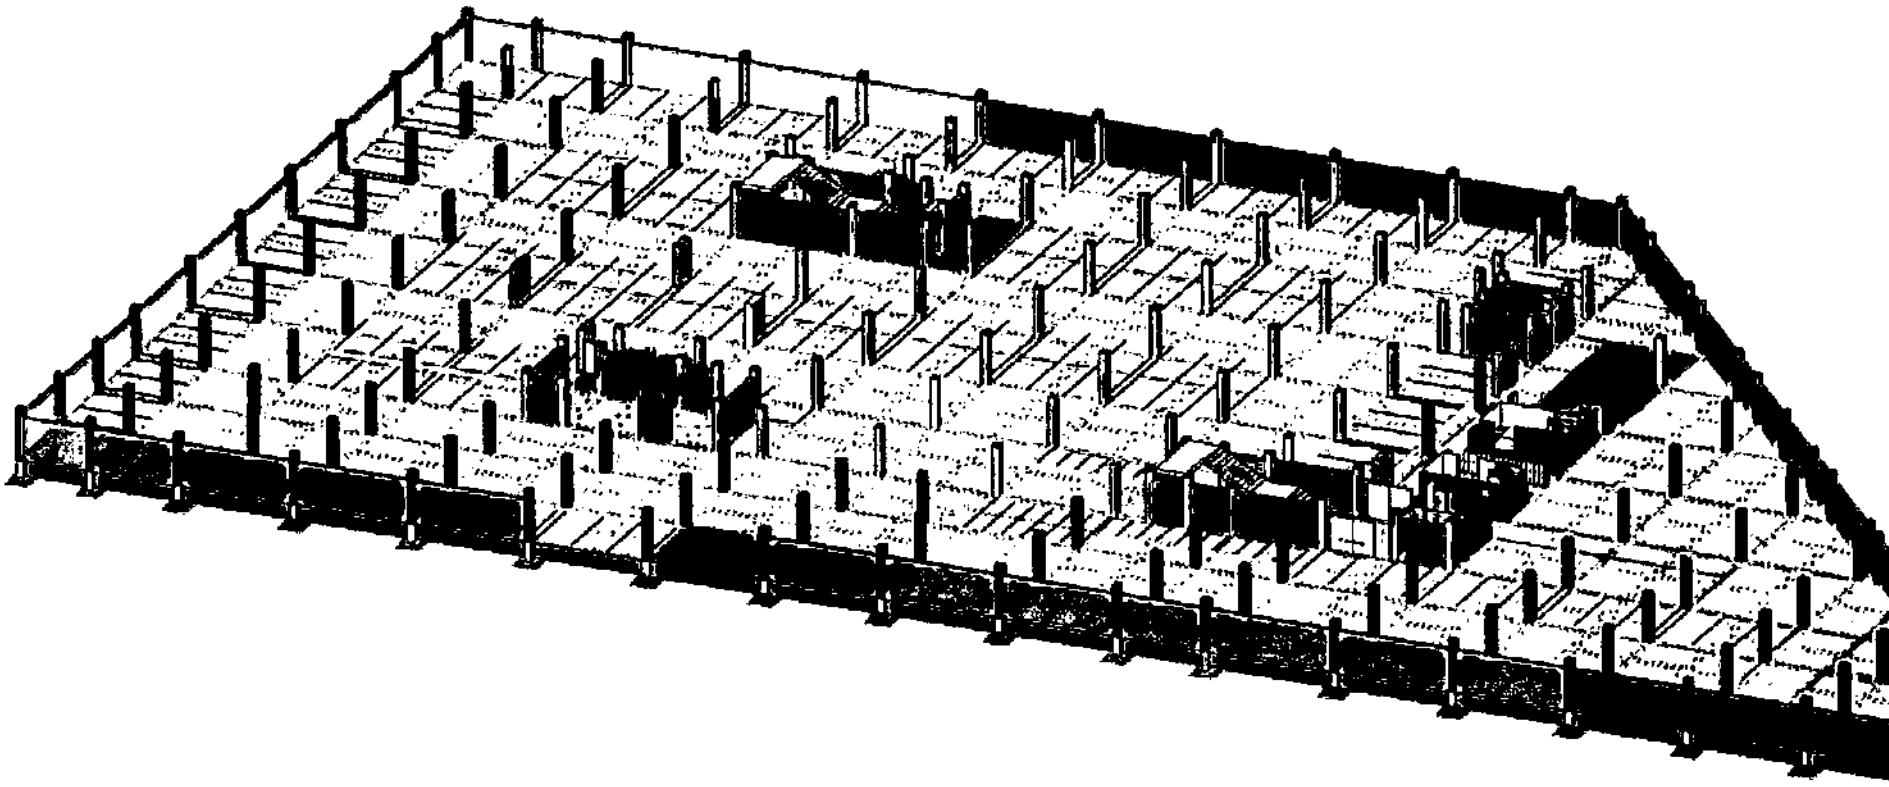

Muros de contención ejecutados a 10 de noviembre de 2021


Nombre: FABIO LOPEZ PO
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPED
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A

6547

LOCALIZACIÓN	IDENTIFICACIÓN	Ø ACERO	Kg/m	ESQUEMA	LONGITUD (M)	LONGITUD DE RUEDO	CANTIDAD DE VARILLA	CANTIDAD DE RUEDO	PESO POR RUEDO (KG)	PESO TOTAL (KG)	total
Eje 3 (5a,5b)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	4,28	22,40	1,0	103,04	103,04	282,49
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	4,28	16,29	1,0	73,29	73,29	
	Longitudinal	3	0,559	4,78	4,78	4,28	22,00	1,0	105,16	105,16	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	4,28	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	4,28	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 5 (5b,5d)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	5,58	28,90	1,0	132,94	132,94	371,68
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	5,58	20,93	1,0	94,18	94,18	
	Longitudinal	3	0,559	6,08	6,08	5,58	22,00	1,0	133,76	133,76	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	5,58	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	5,58	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 9 (5c,9d);(5d,9d);(5,9a)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,90 / 0,150	4,60	7,5	38,50	3,0	177,10	531,30	1.467,41
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	7,5	27,79	3,0	125,04	375,11	
	Longitudinal	3	0,559	8,00	8,00	7,5	22,00	3,0	176,00	528,00	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	7,5	22,00	3,0	11,00	33,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	7,5	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 9a (5,5a)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,90 / 0,150	4,60	4,2	22,00	1,0	101,20	101,20	297,60
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	4,2	16,00	1,0	72,00	72,00	
	Longitudinal	3	0,559	4,70	4,70	4,2	22,00	1,0	103,40	103,40	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	4,2	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	4,2	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 9a (5,5a)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	6	31,00	3,0	142,60	142,60	287,53
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	6	22,43	1,0	100,93	100,93	
	Longitudinal	3	0,559	6,50	6,50	6	22,00	1,0	143,00	143,00	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	6	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	6	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 6a (7,8)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	8,1	41,50	1,0	190,90	190,90	625,78
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	8,1	29,93	1,0	134,68	134,68	
	Longitudinal	3	0,559	8,60	8,60	8,1	22,00	1,0	189,20	189,20	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	8,1	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	8,1	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 8a (5b,7);(5d,8b);(5,8d)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	7,5	38,50	3,0	177,10	531,30	1.467,41
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	7,5	27,79	3,0	125,04	375,11	
	Longitudinal	3	0,559	8,00	8,00	7,5	22,00	3,0	176,00	528,00	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	7,5	22,00	3,0	11,00	33,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	7,5	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 8a (7,8)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	8,11	41,55	1,0	191,13	191,13	526,30
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	8,11	29,96	1,0	134,84	134,84	
	Longitudinal	3	0,559	8,61	8,61	8,11	22,00	1,0	189,42	189,42	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	8,11	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	8,11	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 8a (5,5);(5,7);(5d,8);(5d,8b)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	5,5	28,50	3,0	131,10	393,30	1.108,98
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	5,5	20,64	3,0	92,83	278,48	
	Longitudinal	3	0,559	6,00	6,00	5,5	22,00	3,0	132,00	396,00	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	5,5	22,00	3,0	11,00	33,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	5,5	9,00	0,0	5,40	0,00	
Eje 5a (5b,5d)	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	4,28	22,40	1,0	103,04	103,04	282,49
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	4,28	16,29	1,0	73,29	73,29	
	Longitudinal	3	0,559	4,78	4,78	4,28	22,00	1,0	105,16	105,16	
	Traslapo	3	0,559	0,50	0,50	4,28	22,00	1,0	11,00	11,00	
	Separador	3	0,559	0,15 / 0,21 / 0,21	0,60	4,28	9,00	0,0	5,40	0,00	
	Transversal Interior	4	0,994	0,150 / 4,30 / 0,150	4,60	5,58	28,90	1,0	132,94	132,94	
	Transversal Exterior	3	0,559	0,100 / 4,30 / 0,100	4,50	5,58	20,93	1,0	94,18	94,18	

6549

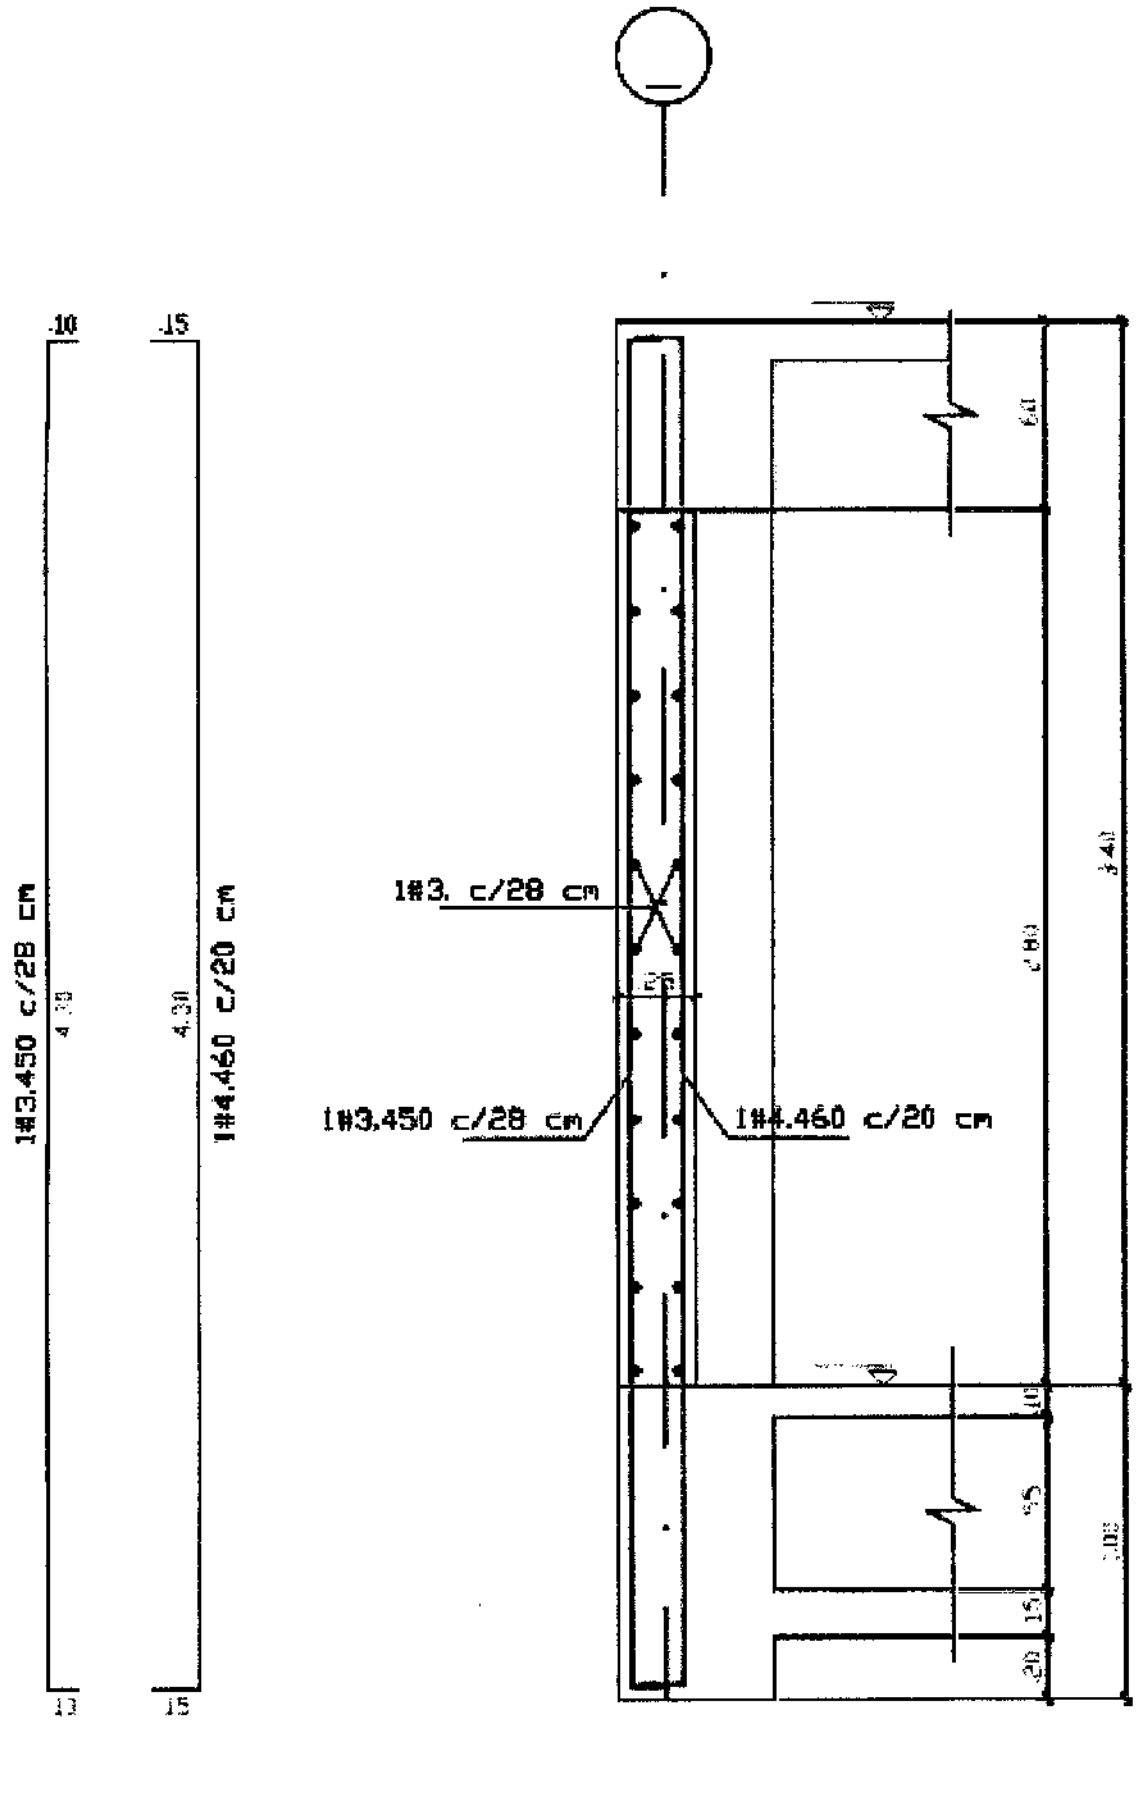

MURO DE CONTENCION
MC-1

ESCALA 1:50


6550

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.

MEMORIAS DE CALCULO PMA.

Valor total: $64.900.556,28

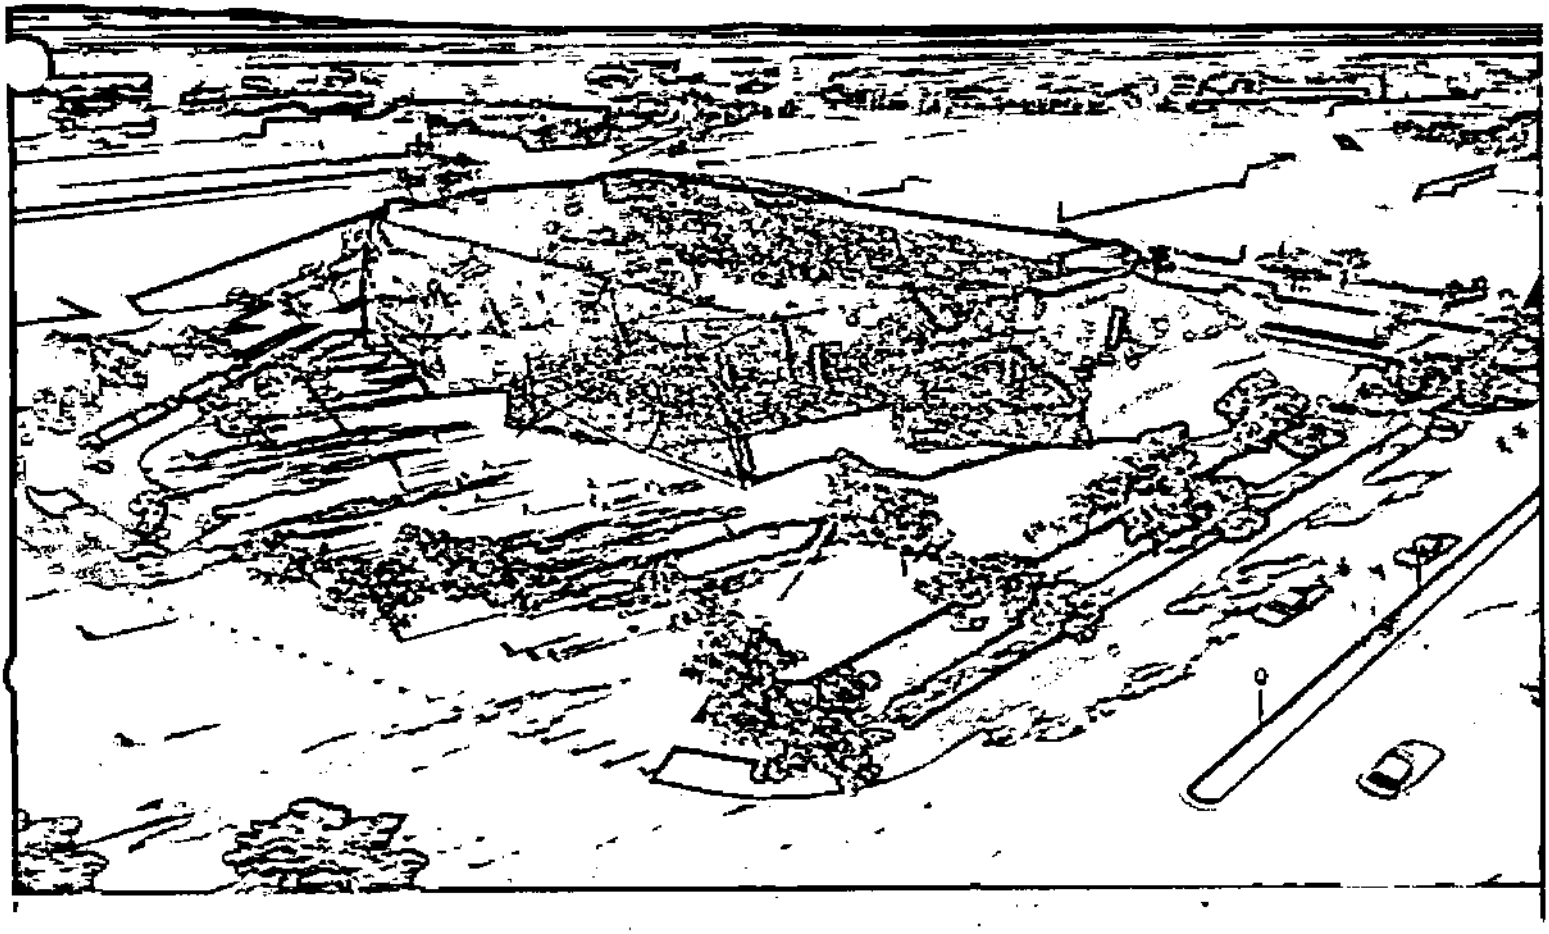

6551

RESUMEN DE MEMORIAS PMA Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CCMV PARA COBRO DE ACTA PARCIAL No. 2

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR


A CONSTRUIR S.A.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	AMBIENTAL	SOCIAL	SST	SUBTOTAL
	37.771.906,28	878.860,00	26.249.790,00	64.900.556,28
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				35.877.732,00
TOTAL				100.778.288,28

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03	PERIODO DE EVALUACIÓN 01/10/2021 al 30/10/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	PDAGA-01: Conformación de grupo socio ambiental	



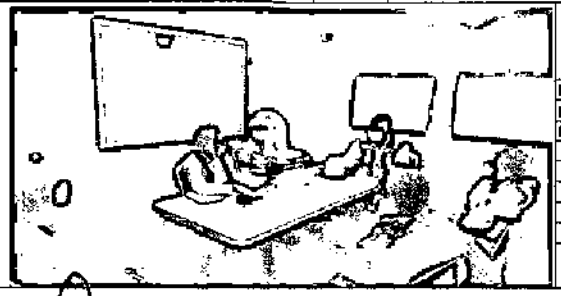

Item	Unidad	Cantidad	Tiempo	% Dedicación	Valor mensual	Valor parcial
Residente Ambiental	Persona	1	1	50%	$ 2.500.000,00	$ 1.250.000,00
Residente SISO	Persona	1	1	50%	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00
Residente Social	Persona	1	1	20%	$ 2.000.000,00	$ 400.000,00
				SUBTOTAL		2.650.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	2.650.000,00	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	9.628.254,50	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	58.300.000,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	48.671.745,50	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.650.000,00	

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CERPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6552

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No3

PERIODO DE EVALUACIÓN

01/10/2021 AL 30/10/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PDAGA-02 Capacitación para el personal de obra







Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Capacitación Personal	Unidad	1	1	$ 15.000	$ 15.000,00
					$ 15.000,00
				SUBTOTAL	15.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	15.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	78.990,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	330.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR	251.010,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	15.000,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6553

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03


PERIODO DE EVALUACIÓN

01/10/2021 AL 30/10/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	PAC-05 Manejo y Disposición final de residuos convencionales y especiales.		





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	ValorTotal
Bolsas para Residuos	UN	100	1	$ 300	$ 30.000
				SUBTOTAL	$ 30.000
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	30.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	67.596,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	4.930.200
				PENDIENTE POR PAGAR	4.862.604
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	30.000,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

659


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	PERIODO DE EVALUACIÓN
DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03	01/10/2021 AL 30/10/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115405-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.







Elemento	Cantidad	Dedicación (Hom/mes)	Tiempo (meses)	Costo mensual	Costo Total
Brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) 2 Obreros	2	0.2	1	$ 1.241.356	$ 496.542
				SUBTOTAL	$ 496.542
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No3	496.542,40
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.044.755
				CANTIDAD CONTRACTUAL	11.393.973,00
				PENDIENTE POR PAGAR	9.349.218,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 496.542

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6555

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMO DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE O.	PERIODO DE EVALUACIÓN
DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02	12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	PDAGA-01: Conformación de grupo socio ambiental



Item	Unidad	Cantidad	Tiempo	% Dedicación	Valor mensual	Valor parcial
Residente Ambiental	Persona	1	1,63333	50%	$ 2.500.000,00	$ 2.041.662,50
Residente SISO	Persona	1	1,63333	50%	$ 2.000.000,00	$ 1.633.330,00
Residente Social	Persona	1	1,63333	20%	$ 2.000.000,00	$ 653.332,00
				SUBTOTAL		4.328.324,50
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	4.328.324,50	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.328.324,50	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	58.300.000,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	53.971.675,50	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.328.324,50	

Nombre: LORENA ERACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

1

6556

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02	PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PDAGA-02 Capacitación para el personal de obra





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Capacitación Personal	Unidad	2	1,633	$ 15.000	$ 48.990,00
Carteleras	Global	1	0	$ 6.264	$ 6.264,00
Plegables	Global	1	0	$ 4.000	$ 4.000,00
					$ 59.254,00
				SUBTOTAL	59.254,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	59.254,00	
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	59.254,00	
			CANTIDAD CONTRACTUAL	360.792,00	
			PENDIENTE POR PAGAR	301.538,00	
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		59.254,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6557

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

EMORIA DE CÁLCULO DE CAN. . ADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02


PERIODO DE EVALUACIÓN

12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No. 2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No. 2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	PAC-05 Manejo y Disposición final de residuos convencionales y especiales.	



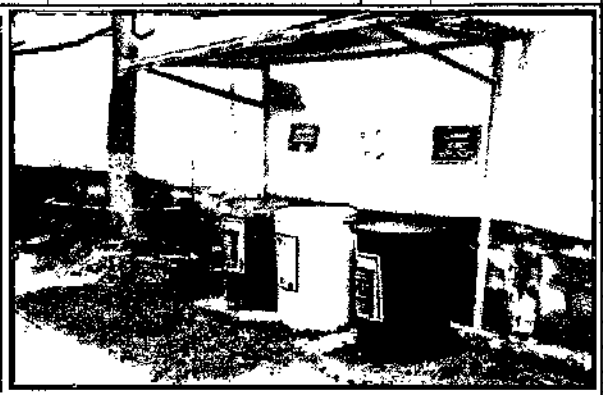

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	ValorTotal
Suministro en Instalacion de punto ecologico : incluye canecas por 56 Galones, y colocación de cubierta para desagüe de aguas lluvias	UN	9	1	$ 90.000	$ 810.000
Bolsas para Residuos	UN	40	1,633	$ 300	$ 19.596
				SUBTOTAL	$ 829.596
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	829.596,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	829.596,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 5.740.200
				PENDIENTE POR PAGAR	4.910.604,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	829.596,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

2559

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

EMORIA DE CÁLCULO DE CAN..ADES DE OBR


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN


12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	PAC-01 Manejo Integral de Materiales de Construcción		

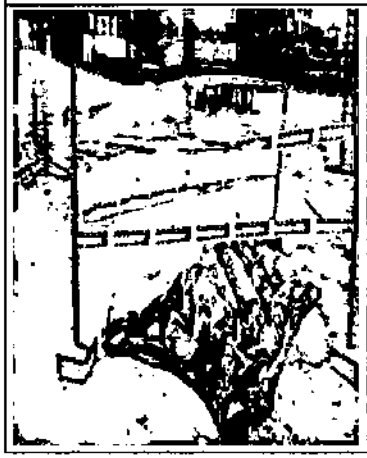





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Contenedores de 12 litros (para manejo de residuos del área administrativa)	Unidad	4	1	$ 33.000	$ 132.000
Cubrimiento de Material	M2	200	1	$ 3.700	$ 740.000
Demarcación (Cinta)	ML	1500	1	$ 80	$ 120.000
				SUBTOTAL	992.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	992.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	992.000,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	992.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR	-
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	992.000,00

Nombre: LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6559

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

EMORIA DE CÁLCULO DE CAN. .ADES DE OBR.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN


12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	PGH-01 Proyecto de manejo aguas superficiales y subterráneas.



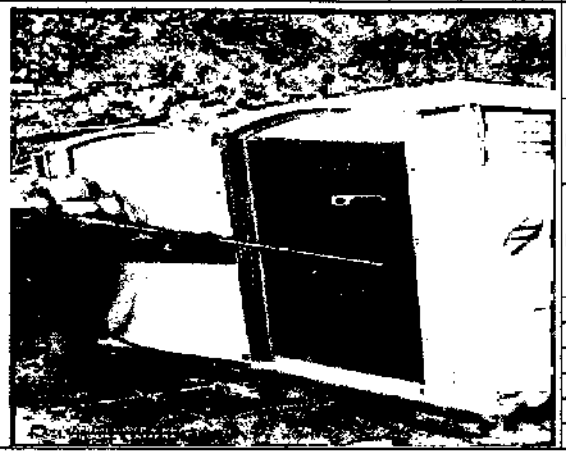

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Baños Portátiles	Unidad	2	1,633	$ 300.000	$ 979.800
Limpieza y Mantenimiento	Unidad	2	1,633	$ 200.000	$ 653.200
				SUBTOTAL	1.633.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	1.633.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.633.000,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	22.000.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR	20.367.000,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.633.000,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6959

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

EMORIA DE CÁLCULO DE CAN..ADES DE OBR.


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN

12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1		DESCRIPCION	PGH-03 Control de la contaminación atmosférica y ruido	

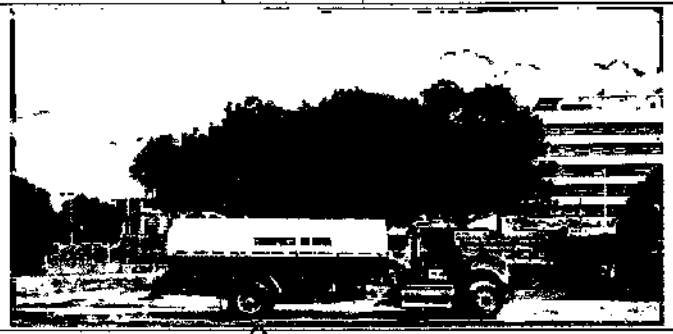

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Humectación, incluye suministro de Agua y Alquiler de carrotanque,conductor y combustible	Unidad	1	1	$ 1.843.123,00	$ 1.843.123,00
				SUBTOTAL	1.843.123,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	1.843.123,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.843.123,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	3.686.246,00
				PENDIENTE POR PAGAR	1.843.123,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.843.123,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6569

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN

12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRPICION	PGH-02. Manejo de Residuos liquidos domésticos e Industriales	



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Tela Oleofílica absorbente para el control de derrames	Rollos	1	1	$ 50.000	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 50.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	50.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	50.000,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	50.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR	-
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	50.000,00

Nombre: LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6562

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PBSE01. Manejo de cobertura vegetal	

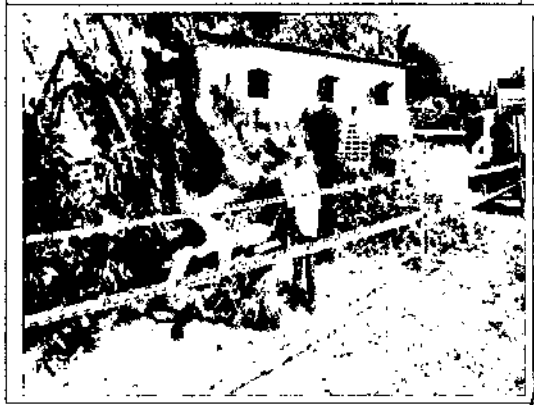



APROVECHAMIENTO FORESTAL	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.9.1	Erradicación de árboles (Incluye destroncado,	N° árboles erradicados	15	$ 1.275.000	$ 19.125.000,00
1.9.2	Pode árboles de mas de 3 de altura	N° árboles para poda	2	$ 230.000	$ 460.000,00
				SUBTOTAL	$ 19.585.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	19.585.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	19.585.000,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	40.445.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR	20.860.000,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	19.585.000,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6563

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


:MORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADL :E OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.		





Elemento	Cantidad	Dedicación (Hom/mes)	Tiempo (meses)	Costo mensual	Costo Total
Brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) 2 Obreros	2	0.2	1.66	$ 1.241.356	$ 824.260,38
				SUBTOTAL	$ 824.260,38
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	824.260,38
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	824.260,38
				CANTIDAD CONTRACTUAL	11.238.973,00
				PENDIENTE POR PAGAR	10.414.712,62
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	824.260,38

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6564

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA	PERIODO DE EVALUACIÓN
DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02	12/07/2021 AL 30/06/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.		





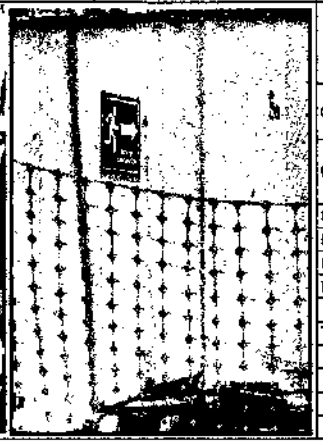

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Costo mensual
Carretilla tipo boogui con llanta		4	$ 80.000	$ 320.000
Picas	Un	4	$ 29.500	$ 118.000
Palas	Un	4	$ 17.000	$ 68.000
Escobas	Un	8	$ 10.000	$ 80.000
Recogedores	Un	8	$ 10.000	$ 80.000
Malla para cerramiento	ML	20	$ 8.500	$ 170.000
SUBTOTAL				$ 836.000
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA				
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1				$ 836.000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				836.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL				836.000,00
PENDIENTE POR PAGAR				-

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6565

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA	M. ...RIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE ...RA DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02	PERÍODO DE EVALUACIÓN 01/08/2021 al 30/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493870-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	PDAGA-01: Conformación de grupo socio ambiental	





Item	Unidad	Cantidad	Tiempo	% Dedicación	Valor mensual	Valor parcial
Residente Ambiental	Persona	1	1	50%	$ 2.500.000,00	$ 1.250.000,00
Residente SISO	Persona	1	1	50%	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00
Residente Social	Persona	1	1	20%	$ 2.000.000,00	$ 400.000,00
				SUBTOTAL		2.650.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	2.650.000,00	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.978.254,50	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	58.300.000,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	51.321.745,50	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		2.650.000,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CANACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN

01/09/2021 AL 30/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PDAGA-02 Capacitación para el personal de obra





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Capacitación Personal	Unidad	1	1	$ 15.000	$ 15.000,00
Carteleras	Global	1	0	$ 6.264	$ 6.264,00
Plegables	Global	1	0	$ 4.000	$ 4.000,00
					$ 25.264,00
				SUBTOTAL	25.264,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2		25.264,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		84.518,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		360.792,00
			PENDIENTE POR PAGAR		276.274,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		25.264,00

Nombre:LORENA BRASHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6564

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN

01/09/2021 AL 30/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	PAC-05 Manejo y Disposición final de residuos convencionales y especiales.	

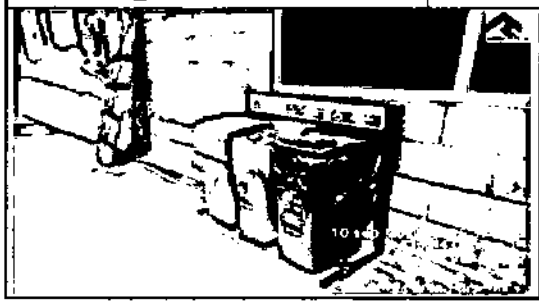



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	ValorTotal
Bolsas para Residuos	UN	60	1	$ 300	$ 18.000
				SUBTOTAL	$ 18.000
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	18.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	37.596,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	4.930.200
				PENDIENTE POR PAGAR	4.892.604
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	18.000,00

Nombre:LORENA BRAGNO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6568

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN

01/09/2021 AL 30/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	PGH-01 Proyecto de manejo aguas superficiales y subterráneas.	

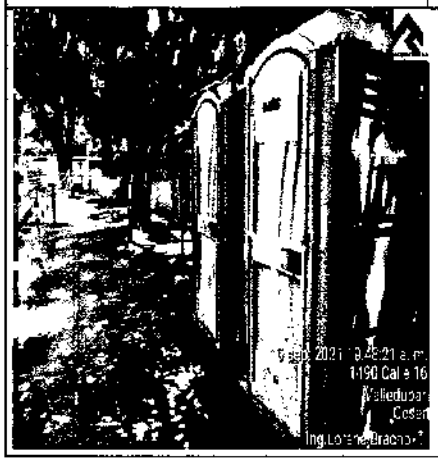





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Baños Portátiles	Unidad	1	1	$ 300.000	$ 300.000
Limpieza y Mantenimiento	Unidad	1	1	$ 200.000	$ 200.000
				SUBTOTAL	500.000,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	500.000,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.133.000,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	22.000.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR	19.867.000,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	500.000,00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6569

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/09/2021 AL 30/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.	







Elemento	Cantidad	Dedicación (Hom/mes)	Tiempo (meses)	Costo mensual	Costo Total
Brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) 2 Obreros	2	0,2	1	$ 1.241.356	$ 496.542
				SUBTOTAL	$ 496.542,40
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	496.542,40
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.344.574,01
				CANTIDAD CONTRACTUAL	11.238.973,00
				PENDIENTE POR PAGAR	9.894.398,99
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	496.542,40

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

0459

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CALCULO DE CA. ..ADES DE OBR.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/21 AL 30/08/21.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDMGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL

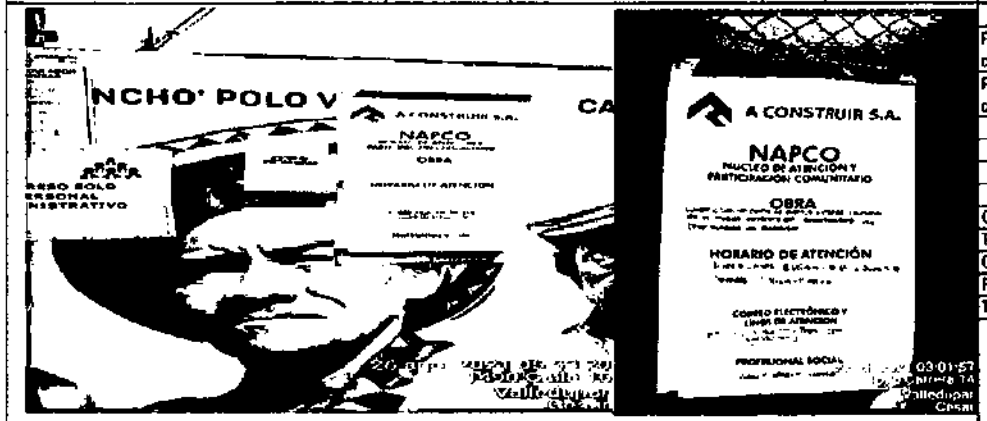

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Pendon Nucleo de atencion y participacion comunitaria	Unidad	1,00	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00
Pendon Nucleo de atencion y participacion comunitaria	Unidad	1,00	1,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00
				SUBTOTAL	$ 200.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2					$ 200.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ -
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 400.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 200.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 200.000,00

Nombre: Tatiana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

159

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CAN. ..DES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/21 AL 30/08/21.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDIAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Temp	V. unitario	Valor Total.
Funcionamiento de SAU	Mes	1,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
Funcionamiento de SAU	Mes	1,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
				SUBTOTAL	$ 156.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2					$ 156.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ -
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.716.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 1.560.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 156.000,00

Nombre: Fiorella Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

652

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CALCULO DE CAN. .ADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/21 AL 30/08/21.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Buzon de atencion (mediano)	1	1,00	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00
				SUBTOTAL	$ 84.860,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2					$ 84.860,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ -
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 84.860,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ -
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 84.860,00

Fiorana Contreras G.
Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hinojosa
Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

65473

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CALCULO DE CAN. ADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/21 AL 30/08/21.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL	

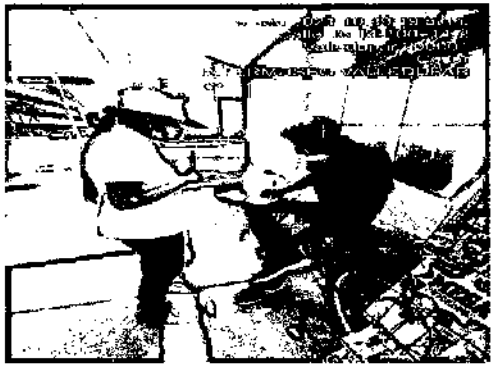

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total
Volantes y comunicados	Mes	1,00	22,00	$ 500.000,00	$ 50.000,00
Volantes y comunicados	Mes	1,00	22,00	$ 500.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 100.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2					$ 100.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ -
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 1.000.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 100.000,00

Nombre: Liliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

654

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CALCULO DE CAN. ADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/21 AL 30/08/21.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115408-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021060007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Buzon de atención estandar	Unidad	1,00	1,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00
				SUBTOTAL	$ 170.000,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	$ 170.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 170.000,00
PENDIENTE POR PAGAR	$ -
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 170.000

Nombre: Tatiana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6575

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CALCULO DE CAI. ADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/0921 AL 30/09/21.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL	



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Funcionamiento del Sau	Mes	22,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
				SUBTOTAL	$ 78.000,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	$ 78.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 156.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 1.716.000,00
PENDIENTE POR PAGAR	$ 1.560.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 78.000,00

Nombre: Liliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hugo 089

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6576

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CAN ADES DE OBRA.


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/0921 AL 30/09/21.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total
Carteleras y vallas	Mes	1,00	21,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
Carteleras y vallas	Mes	1,00	21,00	$ 20.000,00	$ 20.001,00
				SUBTOTAL	$ 40.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2					$ 40.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ -
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 420.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 380.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 40.000,00

Nombre: Liliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6574

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CAN[illegible]ADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/10/21 al 30/10/21

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDIAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total
Volantes y comunicados	Unidad	1,00	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 50.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 100.000
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 950.000,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 50.000,00

Nombre: Liliana Contreras G

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Arregocés

RESIDENTE SOCIAL DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

9548

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION		EXAMENES MEDICOS	



CONCEPTO DE APTITUD

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Optometria	Unidad	11	$ 11.970,00	$ 131.670
Espirometria	Unidad	11	$ 13.440,00	$ 147.840
Audiometria	Unidad	11	$ 11.340,00	$ 124.740
Examen Medico General	Unidad	11	$ 15.750,00	$ 173.250
Examen de Retiro	Unidad	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	577.500,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	577.500,00
			CANTIDAD MES ANTERIOR	1.613.725,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.191.225,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00
			PENDIENTE POR PAGAR	11.981.175,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	577.500,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6579

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	16,1	DESCRIPCION	EXAMENES MEDICOS		



CONCEPTO DE APTITUD

EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

RESTRICCIONES LABORALES

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Optometria	Unidad	18	$ 11.970,00	$ 215.460
Espirometria	Unidad	18	$ 13.440,00	$ 241.920
Audiometria	Unidad	18	$ 11.340,00	$ 204.120
Examen Medico General	Unidad	18	$ 15.750,00	$ 283.500
Examen de Retiro	Unidad	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	945.000,00
		CANTIDAD PRESENTE ACTA	945.000,00	
		CANTIDAD MES DE AGOSTO	1.613.725,00	
		CANTIDAD MES DE SEPTIEMBRE	1.113.725,00	
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.672.450,00	
		CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00	
		PENDIENTE POR PAGAR	10.499.950,00	
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		945.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ASOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6580

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021070007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:		EXAMENES MEDICOS	



CONCEPTO DE APTITUD

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Optometria	Unidad	83	$ 11.970,00	$ 993.510
Espirometria	Unidad	83	$ 13.440,00	$ 1.115.520
Audiometria	Unidad	83	$ 11.340,00	$ 941.220
Examen Medico General	Unidad	83	$ 15.750,00	$ 1.307.250
Examen de Retiro	Unidad	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 4.357.500
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.357.500,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.357.500,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 14.172.400
			PENDIENTE POR PAGAR	9.814.900,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.357.500,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6591

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 12/07/2021 AL 30/08/2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	TSA - TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Lineas de Vida por Metros (30 Lineas de vida)	Metro	499	1	$ 7.000,00	$ 3.493.000,00
Mosquetones 3 seguros	Unidad	17	1	$ 25.000,00	$ 425.000,00
Tie Off de 1 metro con Proteccion (Pnto Anclaje Portatil)	Unidad	11	1	$ 45.000,00	$ 495.000,00
Arrestadores de Caida	Unidad	7	1	$ 135.000,00	$ 945.000,00
Arnes multiproposito 4 argollas	Unidad	40	1	$ 95.200,00	$ 3.808.000,00
Eslinga de detencion en Y	Unidad	25	1	$ 196.390,00	$ 4.909.750,00
Eslingas de Posecionamiento graduable	Unidad	3	1	$ 83.300,00	$ 249.900,00
Barbuquejos	Unidad	100	1	$ 5.950,00	$ 595.000,00
Curso de trabajo en altura	Unidad	25	1	$ 210.000,00	$ 5.250.000,00
				SUBTOTAL	20.170.650,00
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	20.170.650,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	20.170.650,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	360.792,00
				PENDIENTE POR PAGAR	- 19.809.858,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	20.170.650,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

2859

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115405-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021070007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	BIOSEGURIDAD





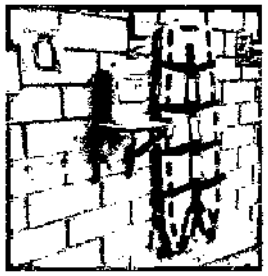

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Botiquín tipo B	unidad	2	$ 7.070,00	$ 14.140
camilla	unidad	2	$ 25.000,00	$ 50.000
extintor PQR ABC 20 Lbs	unidad	3	$ 45.000,00	$ 135.000
			SUBTOTAL	$ 199.140
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	199.140,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	199.140,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 1.251.120
			PENDIENTE POR PAGAR	1.051.980,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	199.140,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6583


6584

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.

MEMORIAS DE CALCULO
BIOSEGURIDAD.

Valor Total: $35.877.732

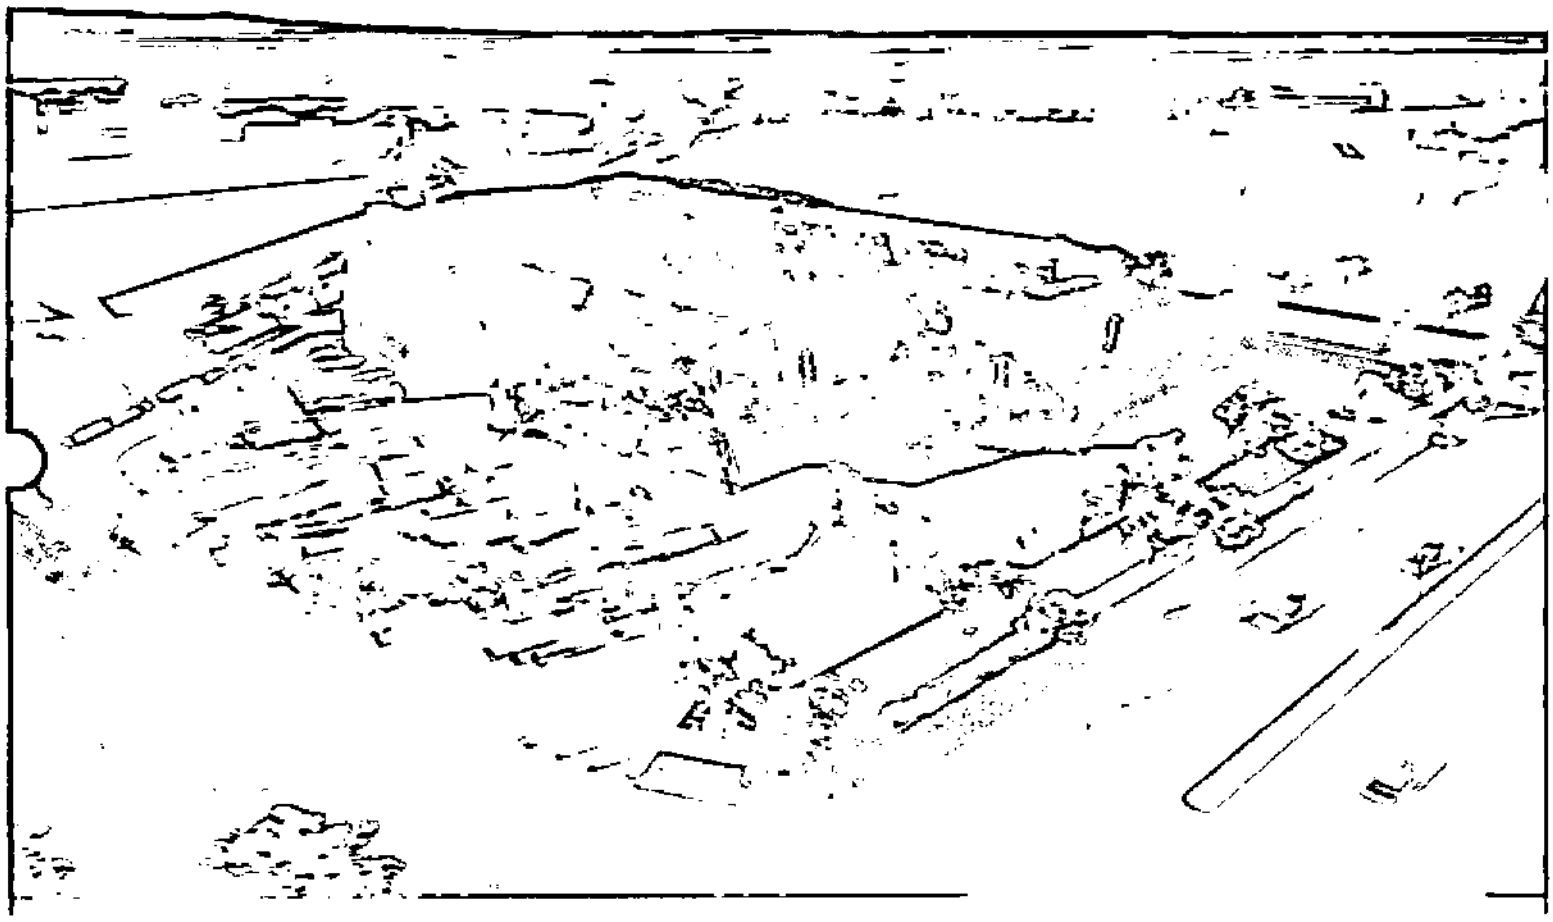

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	4	$ 106.000,00	$ 424.000
Jabon liquido x 20 litros	Litro	4	$ 79.000,00	$ 316.000
Toallas desechables x 100 unidades	Paquete	25	$ 2.949,00	$ 73.725
Tapabocas Desechable	Paquete	30	$ 10.000,00	$ 300.000
			SUBTOTAL	1.113.725,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.113.725,00
			CANTIDAD MES ANTERIOR	1.613.725,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.727.450,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00
			PENDIENTE POR PAGAR	11.444.950,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.113.725,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6585

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CAN ADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)

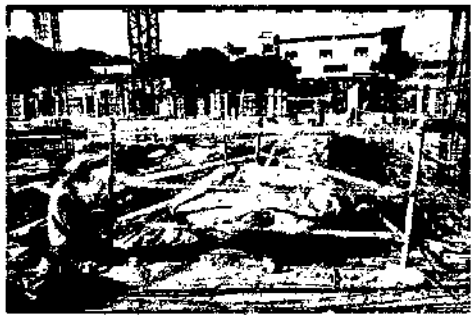

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	15	$ 21.420,00	$ 321.300
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	15	$ 73.780,00	$ 1.106.700
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	15	$ 45.000,00	$ 675.000
Colombinas	UN	40	$ 38.000,00	$ 1.520.000
			SUBTOTAL	$ 3.623.000
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	3.623.000,00
			CANTIDAD MES ANTERIOR	8.836.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	12.459.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 24.695.200
			PENDIENTE POR PAGAR	12.236.200,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	3.623.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6586

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CA DADES DE C \

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL		



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	0	$ 1.273.000,00	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	2.300.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.300.000,00
			CANTIDAD MES ANTERIOR	2.300.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.600.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	65.095.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.300.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6587

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	8	$ 106.000,00	$ 848.000
Jabon liquido x 20 litros	Litro	1	$ 79.000,00	$ 79.000
Toallas desechables x 100 unidades	Paquete	6	$ 2.949,00	$ 17.694
Tapabocas Desechable	Paquete	12	$ 10.000,00	$ 120.000
			SUBTOTAL	1.064.694,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.064.694,00
			CANTIDAD MES DE AGOSTO	1.613.725,00
			CANTIDAD MES DE SEPTIEMBRE	1.113.725,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.792.144,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00
			PENDIENTE POR PAGAR	10.380.256,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.064.694,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

22559

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	13	$ 21.420,00	$ 278.460
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	5	$ 73.780,00	$ 368.900
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	0	$ 45.000,00	$ 0
Colombinas	UN	0	$ 38.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 647.360
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	647.360,00
			CANTIDAD MES DE AGOSTO	8.836.000,00
			CANTIDAD MES DE SEPTIEMBRE	3.623.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	13.106.360,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	11.588.840,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	647.360,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6589

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL	



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	0	$ 1.273.000,00	$ -
			SUBTOTAL	2.300.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.300.000,00
			CANTIDAD MES DE AGOSTO	2.300.000,00
			CANTIDAD MES DE SEPTIEMBRE	2.300.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.900.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	62.795.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.300.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6540

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP

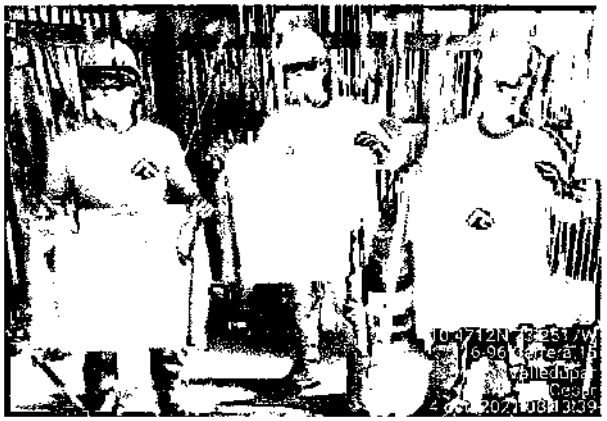

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	182	$ 7.735,00	$ 1.407.770,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	201	$ 4.736,00	$ 951.936,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	60	$ 2.300,00	$ 138.000,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	49	$ 2.300,00	$ 112.700,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	24	$ 11.900,00	$ 285.600,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	25	$ 1.785,00	$ 44.625,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad		$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	2	$ 73.661,00	$ 147.322,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad		$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	123	$ 15.000,00	$ 1.845.000,00
			SUBTOTAL	4.932.953,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.932.953,00
			CANTIDAD MES DE AGOSTO	18.128.385,00
			CANTIDAD MES DE SEPTIEMBRE	7.535.328,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	30.596.666,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
			PENDIENTE POR PAGAR	186.429.406,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.932.953,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM		DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	0	$ 1.273.000,00	$ -
			SUBTOTAL	2.300.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.300.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.300.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	67.395.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.300.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6592

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021070007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Paleta de Pare y Siga	UN	3	$ 16.000,00	$ 48.000
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	15	$ 21.420,00	$ 321.300
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	15	$ 73.780,00	$ 1.106.700
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	80	$ 45.000,00	$ 3.600.000
Valla de Seguridad	UN	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000
Colombinas	UN	20	$ 38.000,00	$ 760.000
			SUBTOTAL	$ 8.836.000
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	8.836.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8.836.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 24.695.200
			PENDIENTE POR PAGAR	15.859.200,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	8.836.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6593

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021070007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	BIOSEGURIDAD





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	1	$ 106.000,00	$ 106.000
Jabon liquido x 20 litros	Litro	1	$ 79.000,00	$ 79.000
Hipoclorito	Litro		$ 38.900,00	$ 0
Toallas desechables x 100 unidades	Paquete	4	$ 2.949,00	$ 11.796
Tapabocas Desechable	Paquete	13	$ 10.000,00	$ 130.000
			SUBTOTAL	$ 326.796
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	326.796,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	326.796,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 14.172.400
			PENDIENTE POR PAGAR	13.845.604,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	326.796,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CERERA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

659

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02 | 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115405-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP	



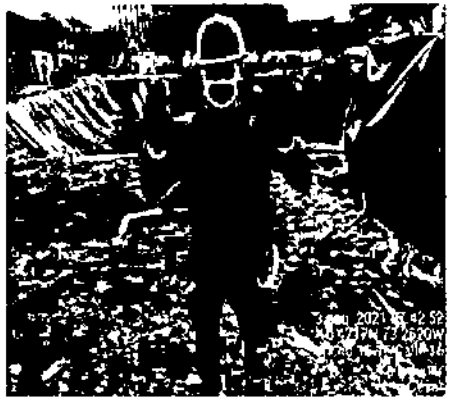

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	192	$ 7.735,00	$ 1.485.120,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	80	$ 4.736,00	$ 378.880,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	60	$ 2.300,00	$ 138.000,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	50	$ 2.300,00	$ 115.000,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	34	$ 11.900,00	$ 404.600,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	34	$ 1.785,00	$ 60.690,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	3	$ 6.500,00	$ 18.500,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	1	$ 73.661,00	$ 73.661,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	40	$ 34.391,00	$ 1.375.640,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	2	$ 12.495,00	$ 24.990,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	27	$ 15.000,00	$ 405.000,00
			SUBTOTAL	4.481.081,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.481.081,00
			CANTIDAD MES ANTERIOR	18.128.385,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.609.466,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
			PENDIENTE POR PAGAR	194.416.606,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.481.081,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

5959

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

periodo: 12 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO - 2021

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021070007
CAPÍTULO	**18.0**	**ITEM**	**18.1**	**DESCRIPCION**	



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	59	$ 7.735,00	$ 456.365,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	56	$ 4.736,00	$ 260.480,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	52	$ 2.300,00	$ 119.600,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	7	$ 2.300,00	$ 16.100,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	27	$ 11.900,00	$ 321.300,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	0	$ 1.785,00	$ 0,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	2	$ 6.600,00	$ 13.200,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	13	$ 73.661,00	$ 957.593,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	3	$ 12.495,00	$ 37.485,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	118	$ 15.000,00	$ 1.770.000,00
			SUBTOTAL	3.952.123,00
		CANTIDAD PRESENTE ACTA	3.952.123,00	
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.952.123,00	
		CANTIDAD CONTRACTUAL	499.198.872,00	
		PENDIENTE POR PAGAR	495.246.749,00	
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		3.952.123,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

EDUARDO OZPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

6596


6597

A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #2

FECHA DE CORTE: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

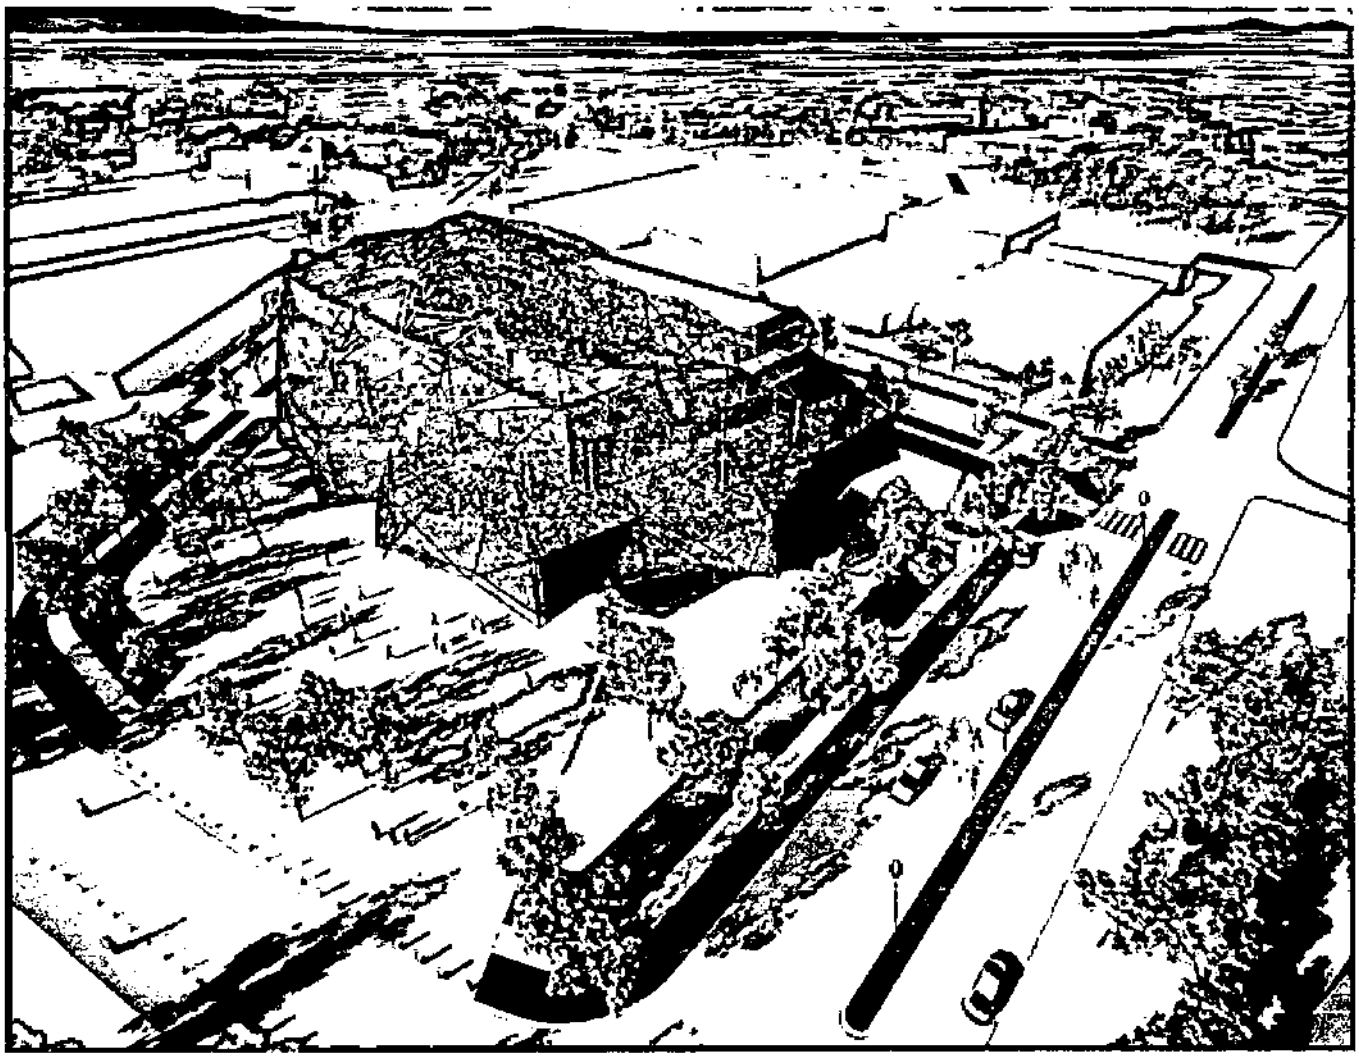

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. INFORME DE GESTIÓN DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1.1. Número de contrato: 2021040002

1.1.2. Objeto: Construcción del Centro de eventos, histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

1.1.3. Vr. contrato: $ 138.817.668.949,109

1.1.4. Plazo: 22 MESES

1.1.5. Fecha de Inicio: 12 de Julio de 2021

1.2. AVANCE DE OBRA

1.2.1. Cronograma de actividades programadas y ejecutadas para este corte

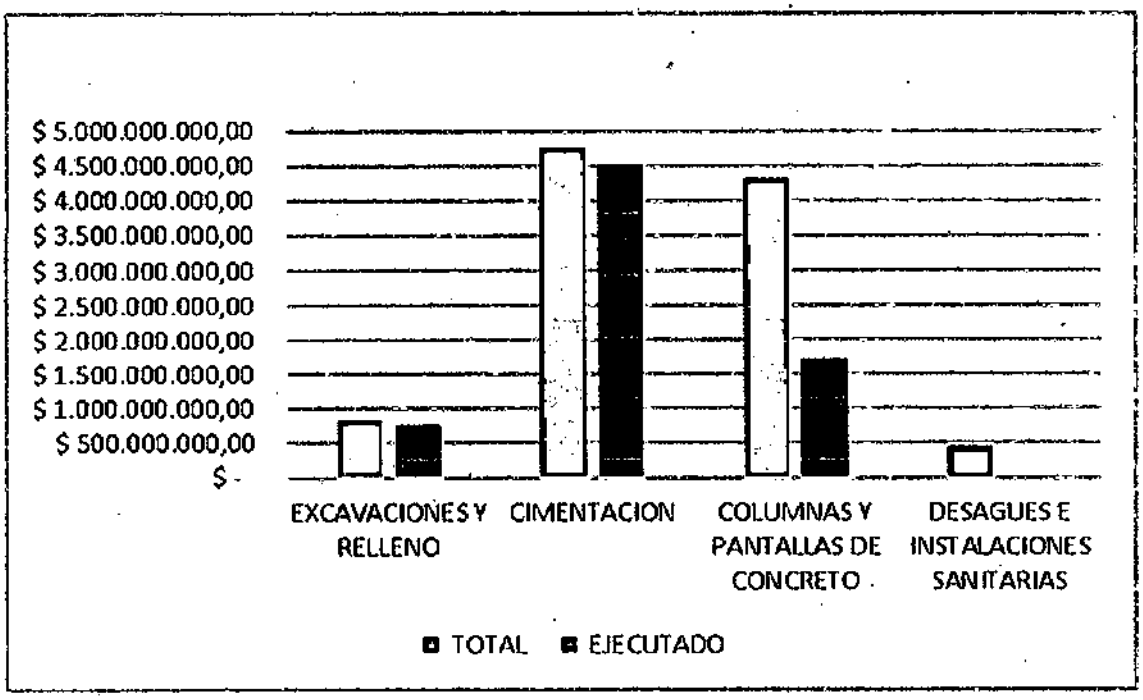


Imagen No. 1. Gráfico de barras programado vs ejecutado

A la fecha se tiene un avance de obra **ejecutado de 8.43%** con un avance de obra **programado de 8.16%.**

1.2.2. Actividades Administrativas

1.2.2.1. Revisión de planos en genera:

Se continuó con la revisión de planos con el apoyo del Ing. Calculista del proyecto, tras continuas reuniones con el acompañamiento de la supervisión por parte de la gobernación, la interventoría y el Dir. de obra, se realizaron unos cambios en beneficio de la obra misma, tales como el replanteamiento de la losa aligerada, cambios significativos en refuerzo de zapatas y vigas de cimentación, inclusive el diseño de elementos nuevos para arriostrar las vigas de la losa.

Se recibió por parte del Ing. Eberto Ortega (consultor en geotecnia) el diseño del filtro, donde se planteó una tubería de mayor diámetro, de 4" paso a 8" y se adicionaron unas cajas de intersección. Adicionalmente se recibió el diseño de la conexión sobre la calle 16 para las aguas de nivel freático del filtro.

Se hizo una revisión de las actividades nuevas necesarias para el desarrollo de la obra, tales como; la ejecución de suelo cemento perimetral para obtener mejoramiento del suelo alrededor de la cimentación del sótano.

1.2.2.2. Revisión de planes de manejo:

Tras varias reuniones entre el personal ambienta, social y SST del contratista, interventoría y la gobernación, se planteó unas modificaciones al plan de manejo Ambiental en aras de optimizar los recursos presupuestados, de allí se aprobó un nuevo presupuesto sin cambiar el valor total contractual.

1.2.3. Actividades Técnicas

1.2.3.1. Excavaciones y Relleno

1.2.3.1.1. Excavación mecánica:

En los diseños se contempló la ejecución de 5 zapatas grandes o zapatas núcleo, que por sus dimensiones hubo que excavar con máquina para un volumen total de 878.78m3 aproximadamente.

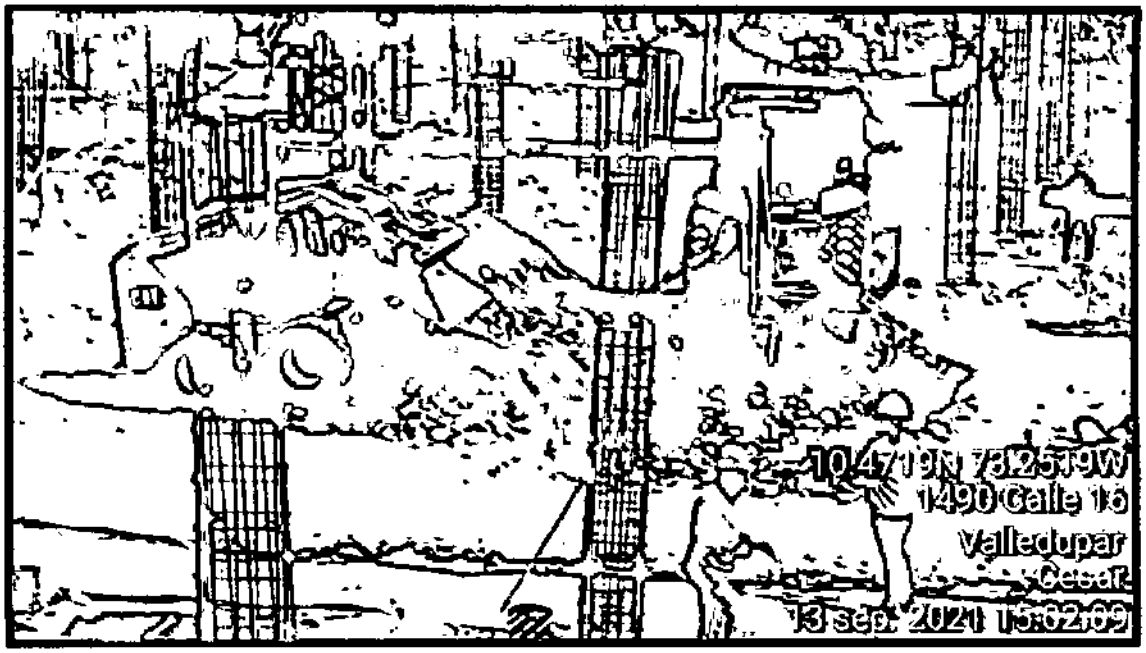


Imagen No. 2. Excavación Mecánica Zapata Núcleo

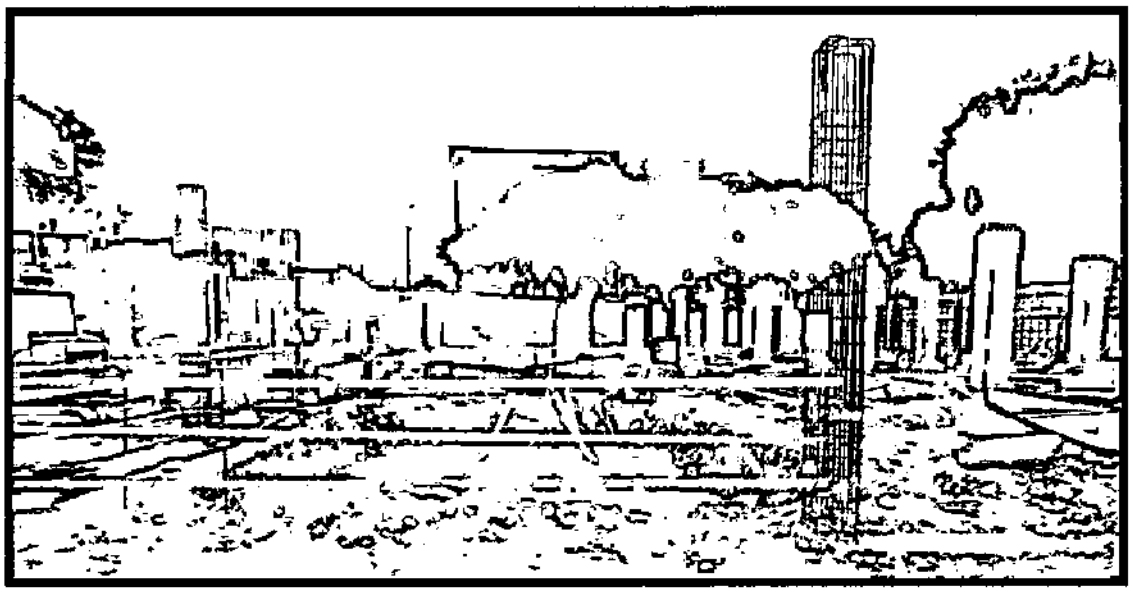


Imagen No. 3. Excavación Mecánica Zapata Núcleo

1.2.3.1.2. Excavación Manual para zapatas:

Se continuó con la actividad de excavación de zapatas, continuando con el sobre ancho de 20 cm para dar espacio a la instalación de Guarderas y manipulación del instalador.

Para esta actividad se contó con la revisión por parte de interventoría y topografía para el manejo de niveles, medidas y liberación de la actividad, para este periodo se ejecutó en excavación 132.06m3 aproximadamente para un total de 62 unidades de zapatas.

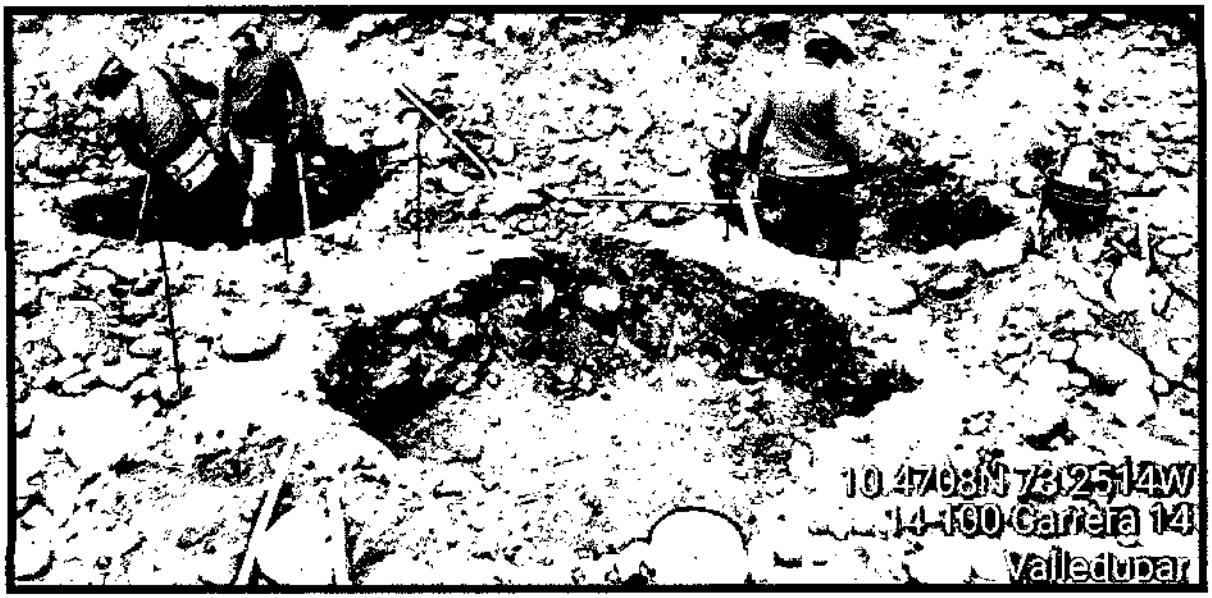


Imagen No. 4. Excavación Manual

1.2.3.1.3. Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km:

Para esta actividad se hizo el respectivo cargue y disposición de material en la cantera certificada para tal fin, en este período se hizo más de 1314m3 en sobrante de zapatas sin embargo solo se cobrará 698m3 debido a que la cantidad contractual no permite cobrar lo ejecutado (Esto se sustentará y se cobrará mediante acta modificatoria).



Imagen No. 5. Material sobrante de excavación zapatas.

1.2.3.1.4. Relleno con material de sitio:

Se tomó material de sitio y se realizó el lleno de los espacios entre el suelo y los bordes de las zapatas incluido el espacio entre el nivel de placa contrapiso de sótano y la parte superior de la zapata. Se llenó una altura aproximada de 0.72m. Como en el periodo pasado esta actividad no se cobró, para esta acta parcial #2 se relaciona el total de zapatas fundidas a la fecha con relleno, para un total de 165 unidades de zapatas.



Imagen No. 6. Relleno 1

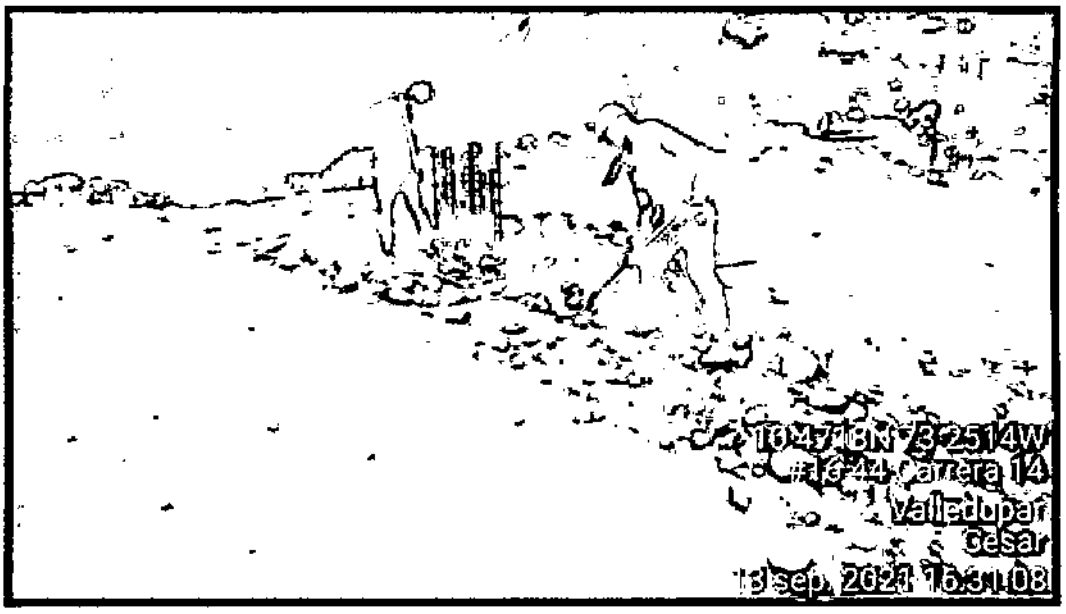


Imagen No. 7. Relleno 2



Imagen No. 8. Relleno 3

1.2.3.2. Cimentación

1.2.3.2.1. Concreto Pobre:

Para esta actividad se realizaron los trabajos con el debido proceso ejecutando el solado para 60 unidades de zapatas y más de 1000ml de viga. Se continuó con la política de un sobre ancho de 10cm para la instalación de las guaderas. Resistencia para este concreto es de 2500psi corroborado con las muestras de cilindros enviadas al laboratorio para su respectiva prueba.



Imagen No. 4. Concreto pobre para solado de vigas.



Imagen No. 5. Concreto pobre para solado de vigas.



Imagen No. 6. Concreto pobre para solado de zapatas.

1.2.3.2.2. Concreto zapatas:

Se vaciaron 60 unidades de zapatas como se venía haciendo en el periodo anterior, debido a que el nivel freático subió y las aguas se vertían en la excavación de zapatas, para ello se emplearon bombas para la extracción de dicha agua y además se usó un concreto de 4000psi de baja permeabilidad.



Imagen No. 7. Concreto zapatas 1

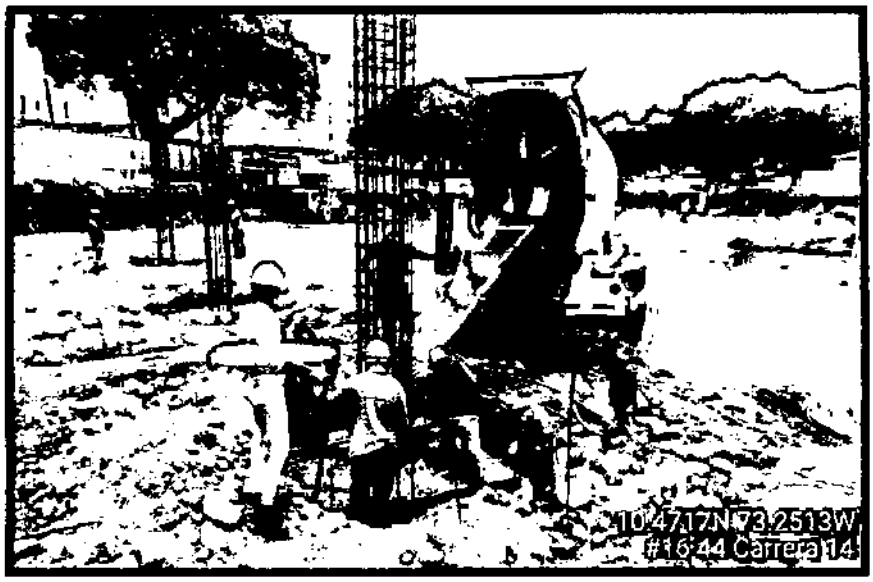


Imagen No. 8. Concreto zapatas 2

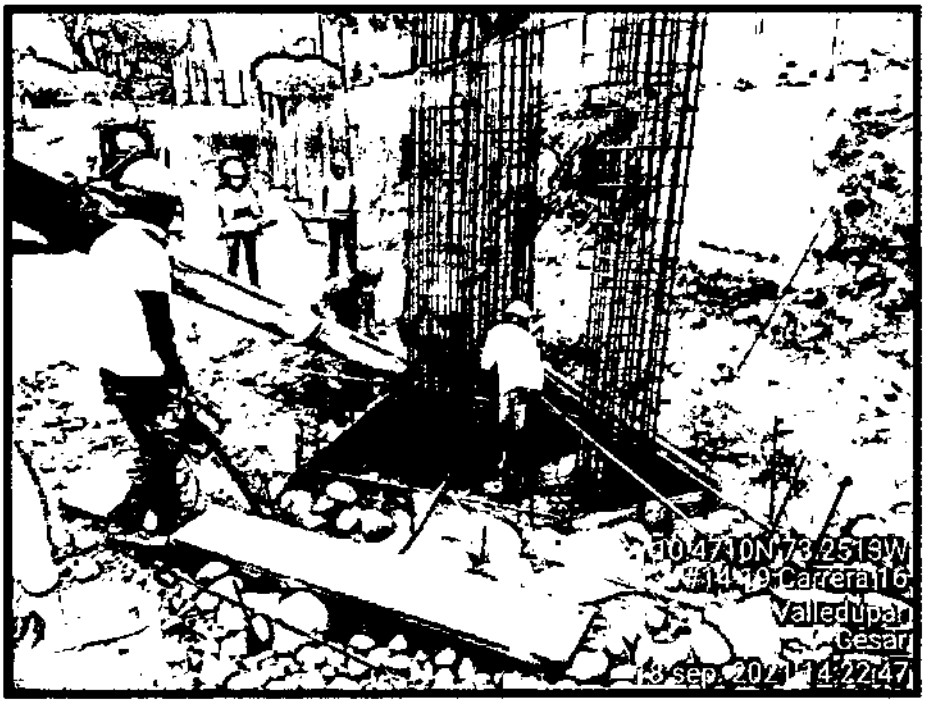


Imagen No. 9. Concreto zapatas 3

1.2.3.2.3. Acero Zapatas:

Dentro de la revisión que se hizo de planos se definió un kilaje distinto para las zapatas de referencia Z32, Z33, Z34, Z35 y Z36 para posteriormente proceder con el corte y figuración del acero. En este periodo se instaló un total de 13.400kg aproximadamente para 62 unidades de zapatas.

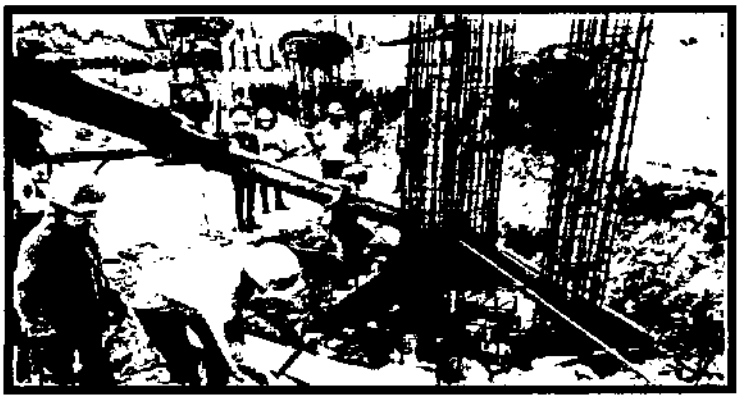


Imagen No. 10. Acero Zapatas 1.

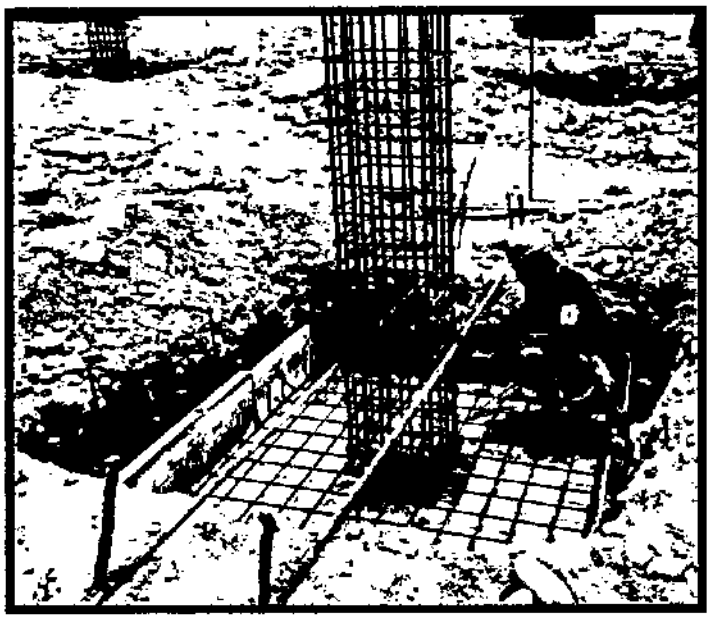


Imagen No. 11. Acero zapatas 2

1.2.3.3. Columnas y pantallas de concreto:

1.2.3.3.1. Concreto Columnas:

Se han fundido 58 unidades de columnas para un volumen de 86.36m3 en este período, el concreto usado tiene una resistencia de 4000psi con grava

de ¾", todas las columnas tienen una altura de 2.95 metros y una sección típica de 50cm de cada lado para las columnas cuadradas, las atípicas cada una maneja sus dimensiones tal cual se muestra en las memorias.

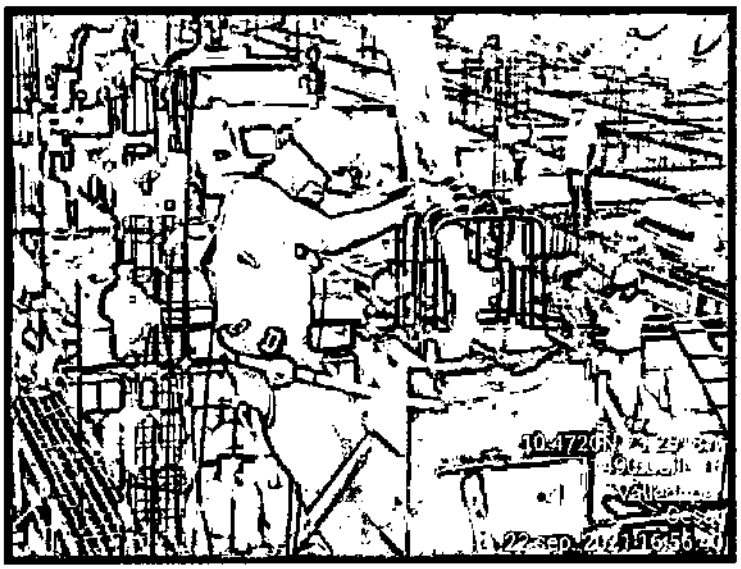


Imagen No. 12. Concreto Columnas 1

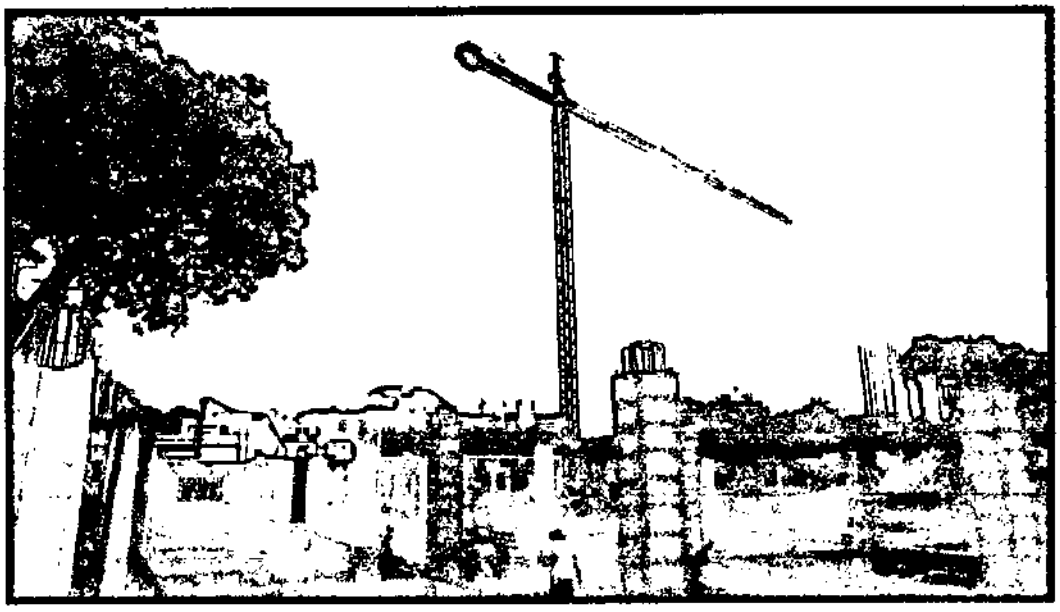


Imagen No. 13. Concreto columnas 2



Imagen No. 14. Concreto columnas 3

1.2.3.3.2. Acero Columnas:

Para esta actividad se figuró 60 unidades de columnas, sin embargo, este tipo de columnas en el diseño se encuentran referenciadas como columnas tipo C1 en su mayoría, adicional a estas hay 6 tipos más donde el despiece cambia significativamente según los planos, cuyo peso aprox. en kilos por unidad es de 160kg, de las zapatas de referencia C2, C3, C4, C5 y siguientes, superan los 500kg por unidad, para un total de 10.000kg. aprox. Tal como se podrá observar en las memorias de cálculo de las actividades.



Imagen No. 15. Acero Columnas 1.

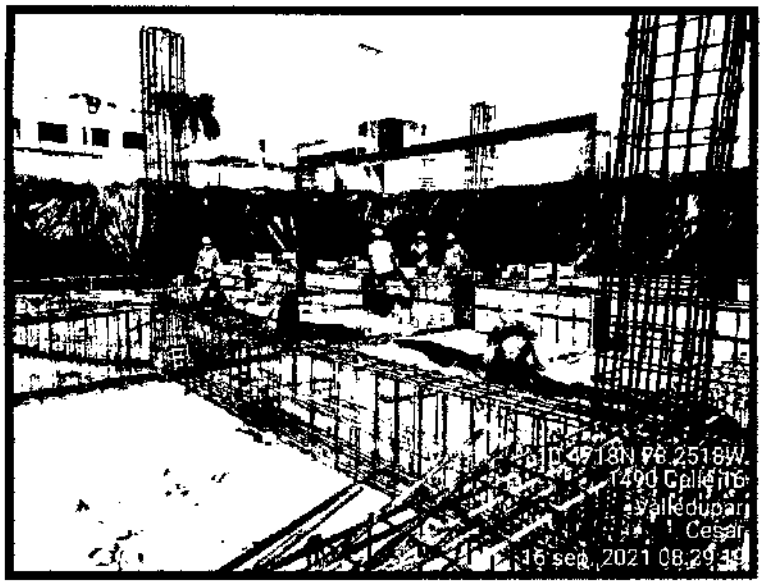


Imagen No. 16. Acero Columnas 2.

1.2.3.3.3. Muro de contención:

Muros de contención perimetral de cierre del sótano, cuyo espesor es de 25cm con altura a ras de columnas con H:2.95m. para estos muros se usó un concreto de 4000psi con grava de ¾", se usó luego de desencofrar antisol blanco para asegurar un correcto curado de la estructura.

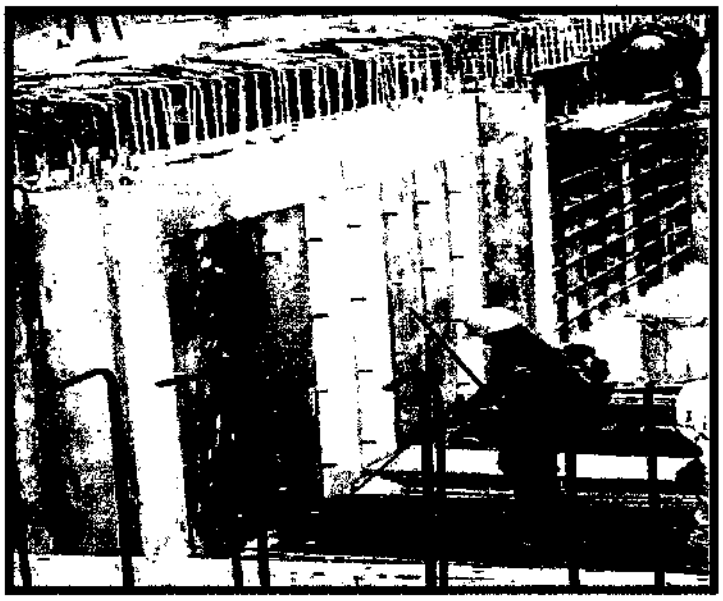


Imagen No. 17. Muro de contención.

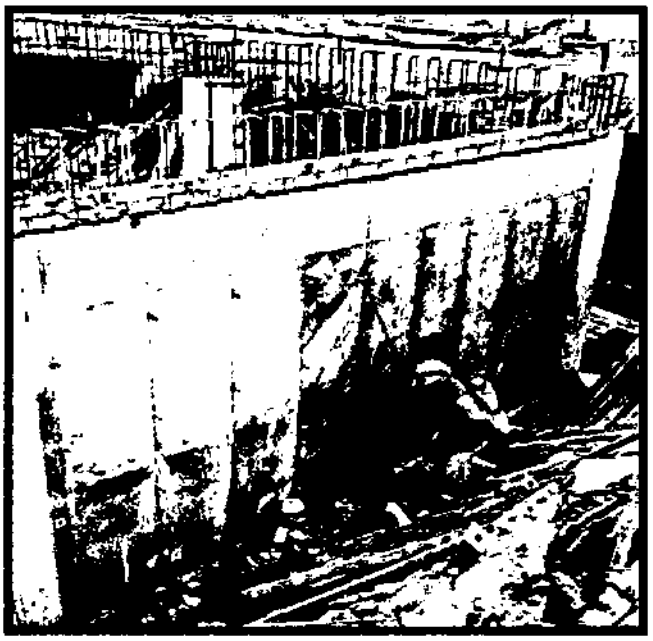


Imagen No. 18. Muro de contención

1.2.3.3.4. Acero muro de contención:

Esta actividad se ejecutó para 180 ml de muro aproximadamente, con un total de acero de 11.916kg. En su mayoría se usó varillas de diámetro de 3/8" para el acero longitudinal y para el vertical se usó de ½".



Imagen No. 19. Acero Muro de contención

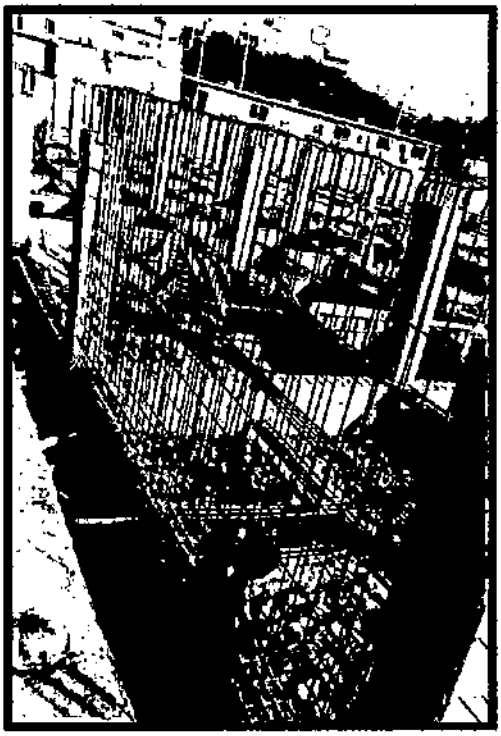


Imagen No. 20. Acero Muro de contención

1.2.3.4. Desagües

1.2.3.4.1. Filtro francés con tubería de 8"

Para esta actividad, se realizaron excavaciones de más de 900ml, luego se instaló el geotextil, se hizo una cama de piedra, se insertó la tubería perforada de 8" vertiendo sobre esta la capa de material piedra filtro, luego se tapó con geotextil asegurado en costura con alambre.

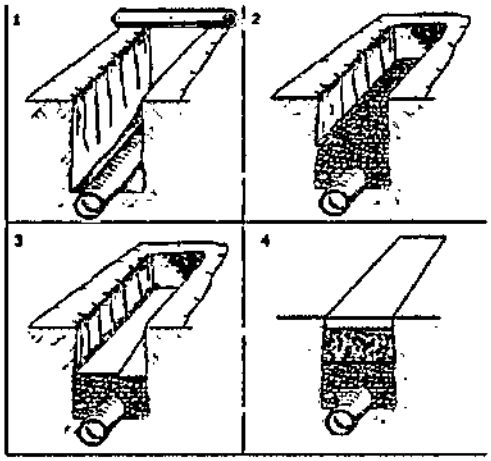


Imagen No. 26. Sección típica filtro francés

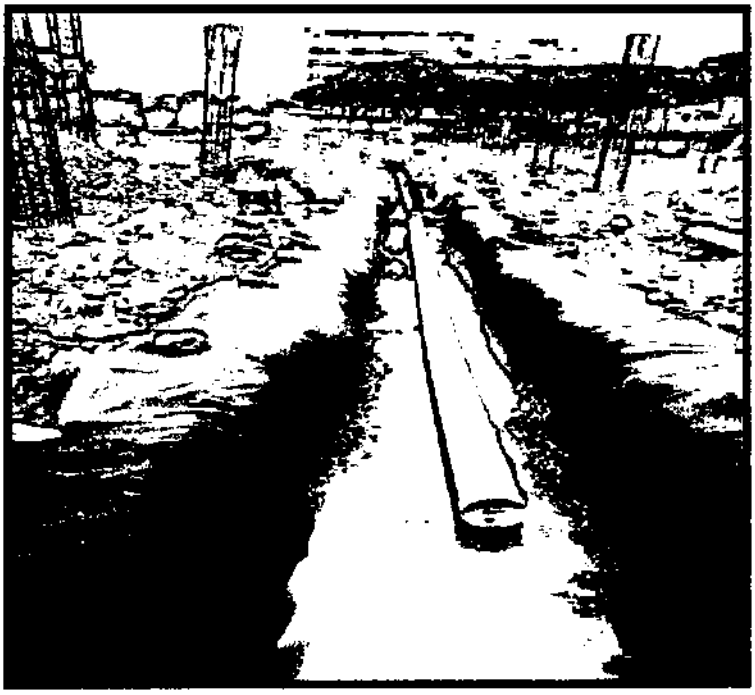


Imagen No. 27. Filtro francés


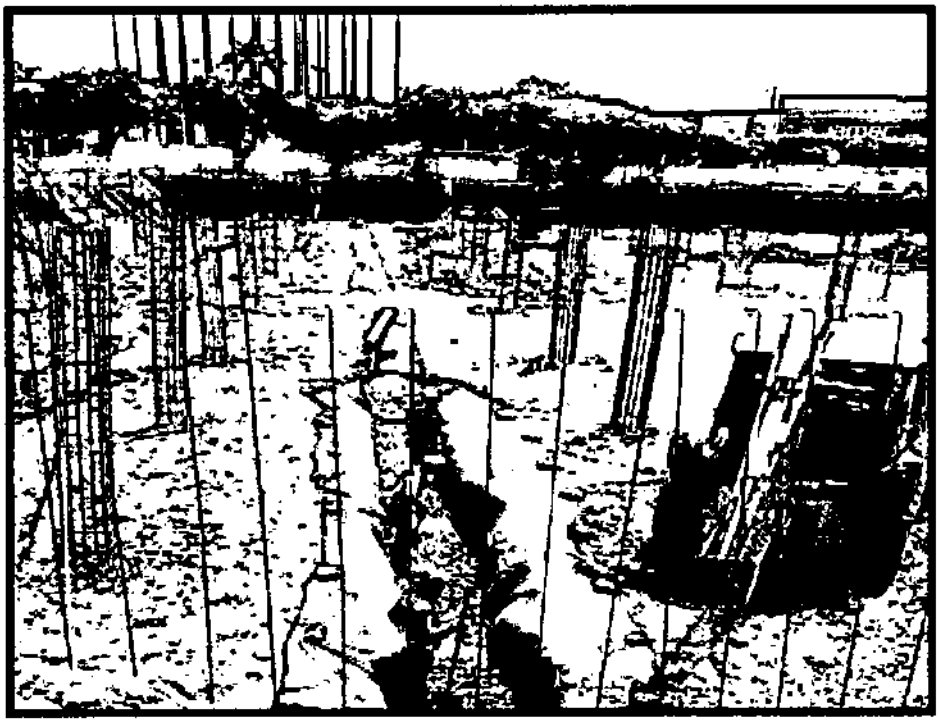


Imagen No. 27. Filtro francés

1.2.3.5. Actividades Socio – Ambientales

1.2.3.5.1. Reunión grupo de gestión socioambiental

Se realiza una vez al mes para organizar las actividades a ejecutar de orden, limpieza y señalización, entre otros temas inherentes a las actividades que se ejecutan en la obra para el desarrollo del proyecto.

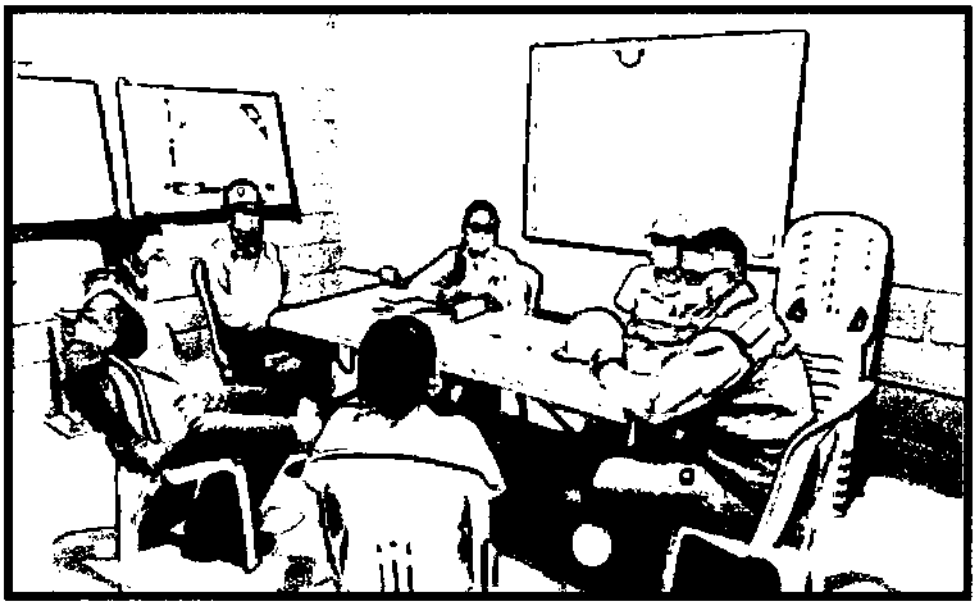

1.2.3.5.2. Señalización de acopio de materiales de obra:

Por medio de esta actividad, se hace el acopio de materiales tales como el hierro, el cemento, pisos etc., con la señalización respectiva para el buen uso y manejo de los insumos.



1.2.3.5.3. Aseo en frentes de obra:

Mediante estas brigadas, se organiza periódicamente la recolección de residuos generados en la obra de acuerdo a su clasificación, así mismo se organizan jornadas diarias de orden- aseo-limpieza de frentes o áreas de trabajo.



1.2.3.5.4. Acopio temporal de residuos de demolición:





1.2.3.5.5. Inspecciones:



1.2.3.5.6. Señalización de sitios de trabajo y control de tráfico:


Con el personal de obra se organizaron las cuadrillas para la ejecución de esta actividad no solo para entrada y salida de volquetas sino también para los mixeres de concreto y la bomba estacionaria.

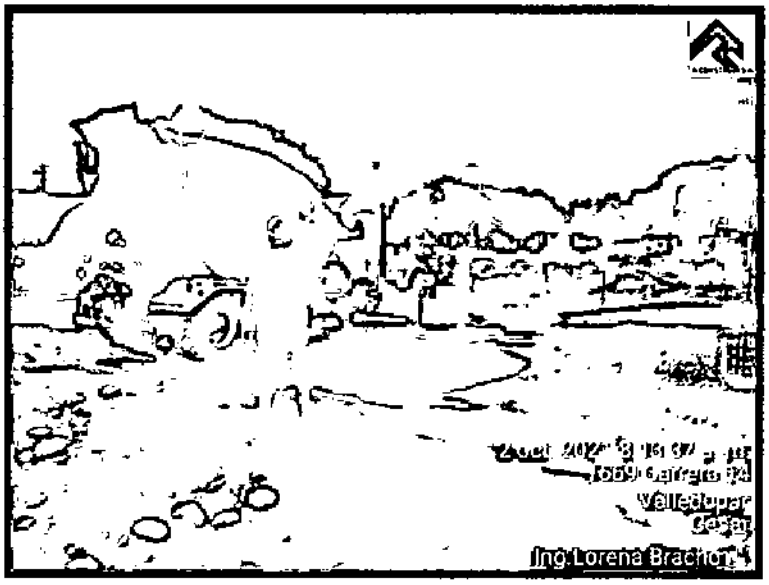

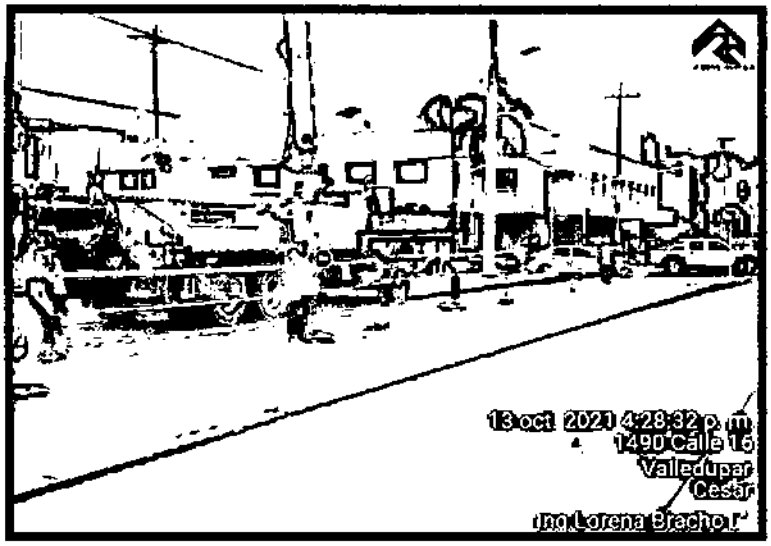

1.2.3.5.7. Mantenimiento de puntos ecológicos:

Con el personal de oficios varios permanentemente se le hace mantenimiento y recoleccion de residuos para desecharlos como corresponde.

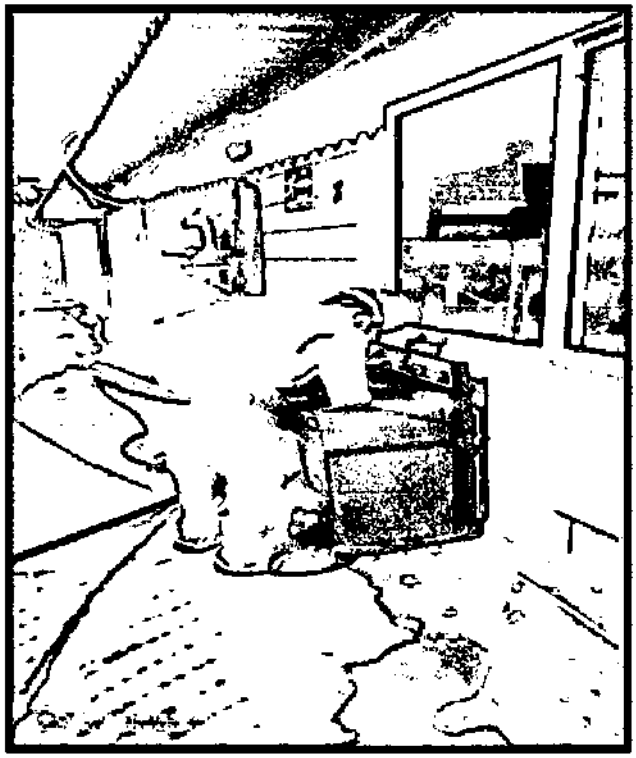


1.2.3.5.8. Puntos ecológicos ubicados estratégicamente:




1.2.3.5.9. Limpieza y aseo de baños:



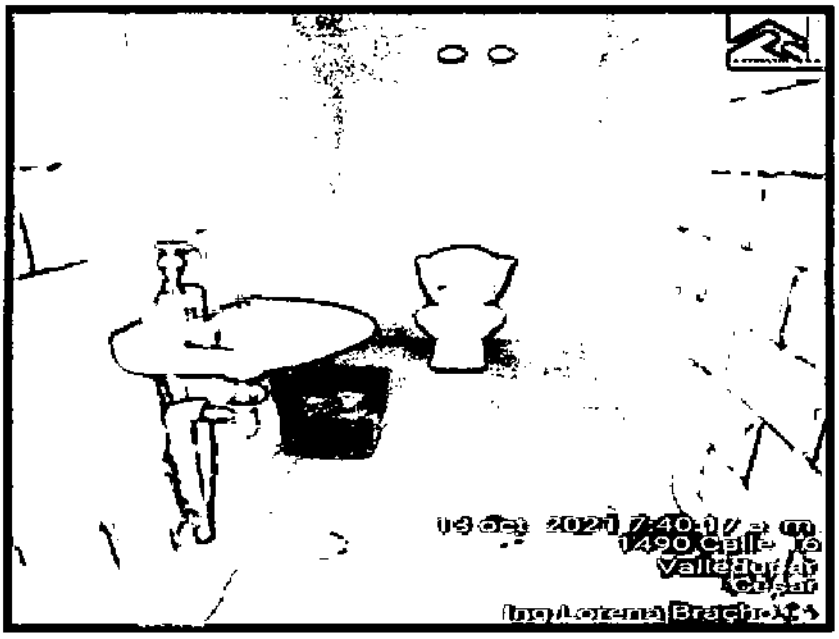

1.2.3.5.10. Cargue de material: volqueta debidamente carpada para evitar la emisión de material particulado:

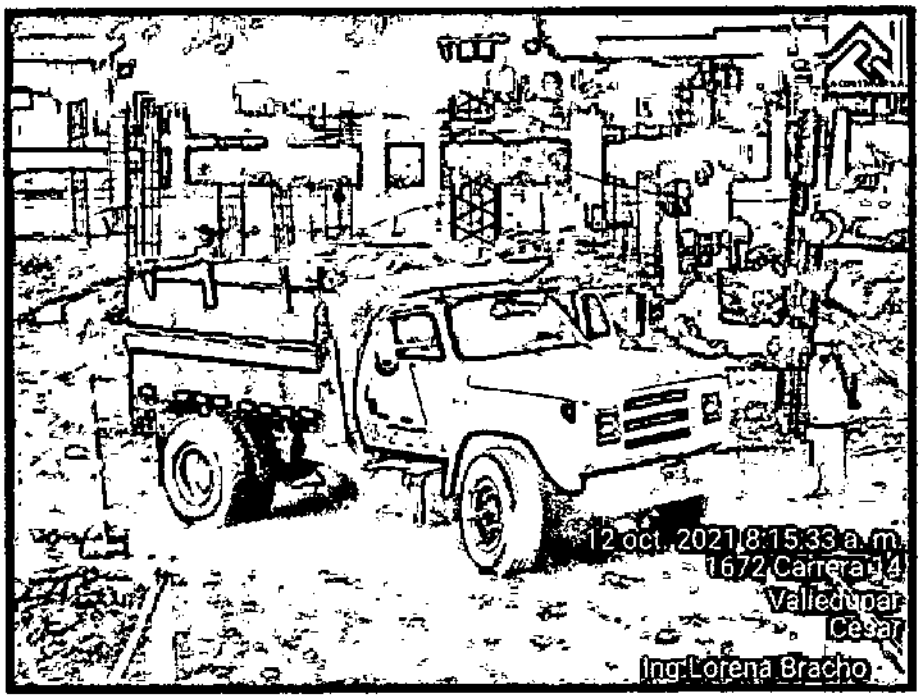

1.2.3.6. Actividades de Seguridad industrial y Salud en el trabajo

1.2.3.6.1. Exámenes de ingreso del personal:

Se hizo por parte del ingeniero SISO del contratista la inspección de los exámenes de ingreso del personal de obra, verificando que la documentación de éstos esté en regla conforme a los entes de control como lo son el ministerio de salud y ministerio de trabajo.


1.2.3.6.2. Entrega de dotación y EPPs




Todo personal que ingresa a obra debe tener su dotación y EPPs de acuerdo a la actividad que va a ejecutar, esta parte es validada durante la ejecución del proyecto por el personal encargado de ésta.

1.2.3.6.3. Instalación de senderos peatonales y señalización en general:

Se realizó durante la obra la instalación de la señalización en general y los senderos peatonales como lo sugiere la norma SST.

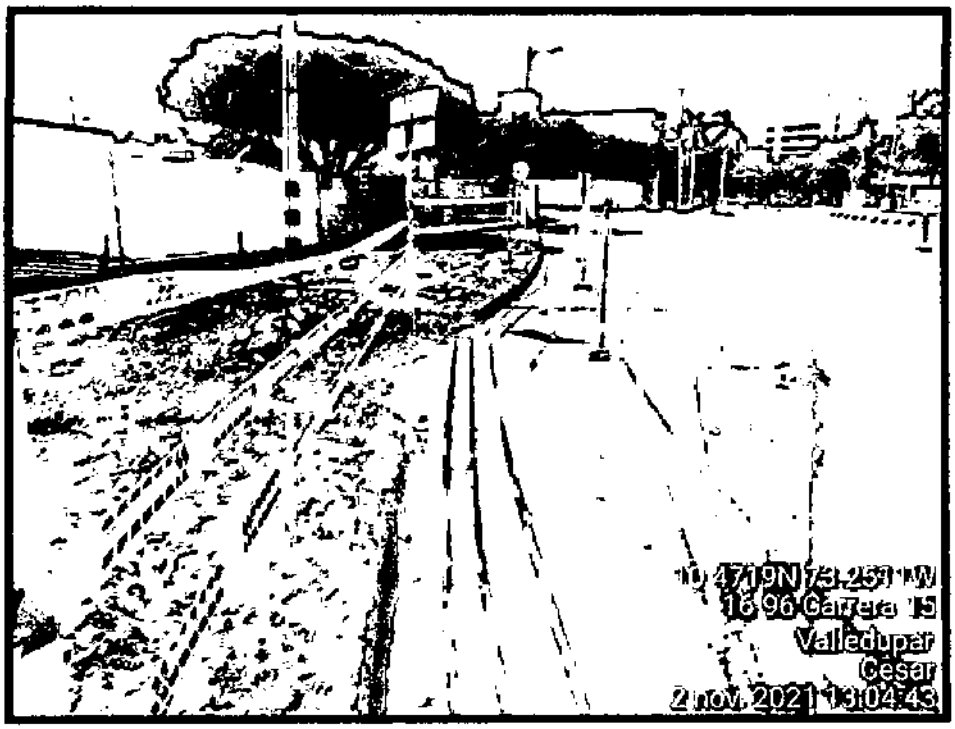


1.2.3.6.4. Charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo:

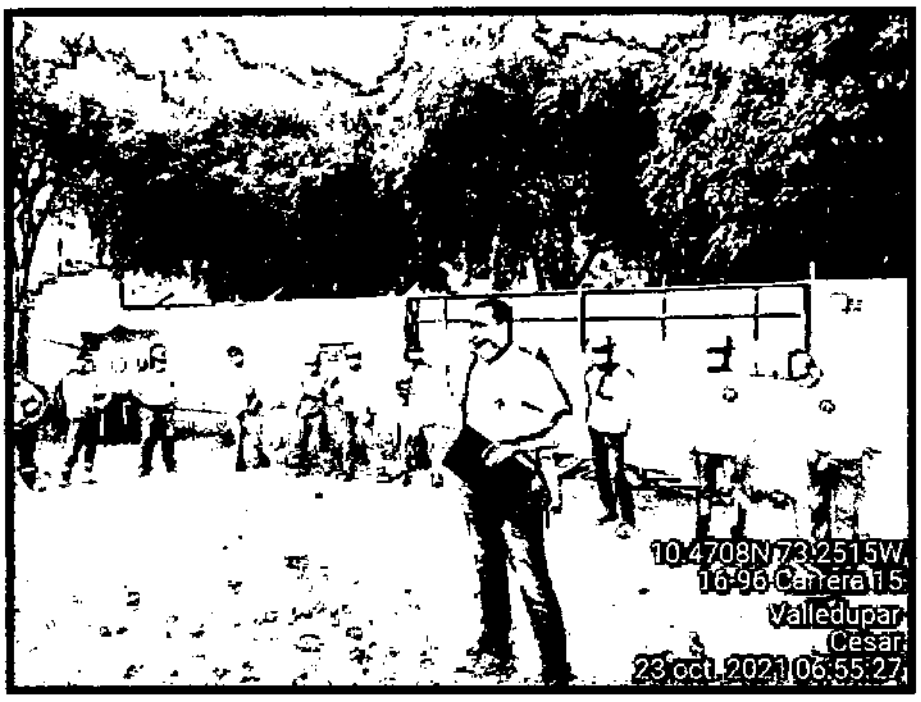

1.2.3.7. Información a la comunidad

El día 6 de octubre de 2021, la empresa Aseo del Norte realizó socialización a los comerciantes del sector, con el objetivo sensibilizar sobre el manejo de los residuos sólidos, la empresa de aseo ilustro cual es el manejo ideal de cada residuo según su clasificación y entrego elementos como bolsas recolectoras a cada comerciante y pedagogía de los horarios y la forma correcta de la disposición final.

Dándole la continuidad a la socialización y teniendo en cuenta los conceptos impartidos se realiza taller de manejo de residuos por parte de gestión ambiental y social, se entregó taller evaluativo, para afianzar los conocimientos a los comerciantes.

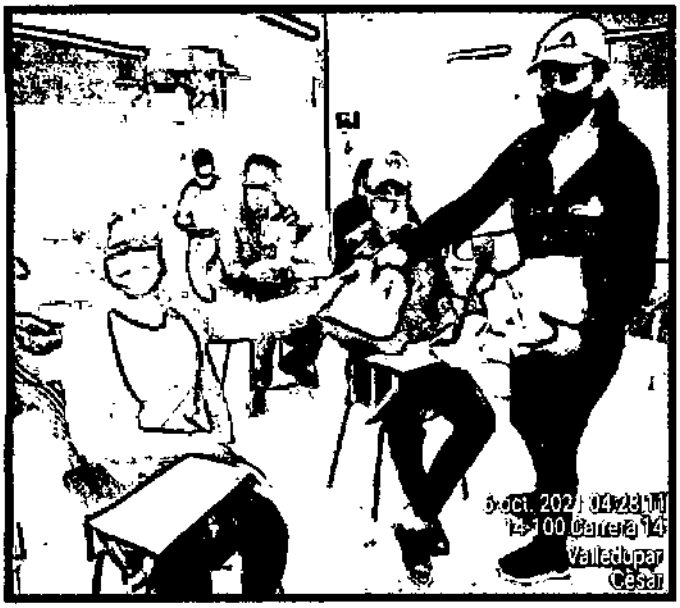




1.2.3.8. Divulgación:

Mediante volantes durante este periodo se dio paso a informar a la comunidad y a los comerciantes sobre avance de obra, manejo de residuos, entre otros.



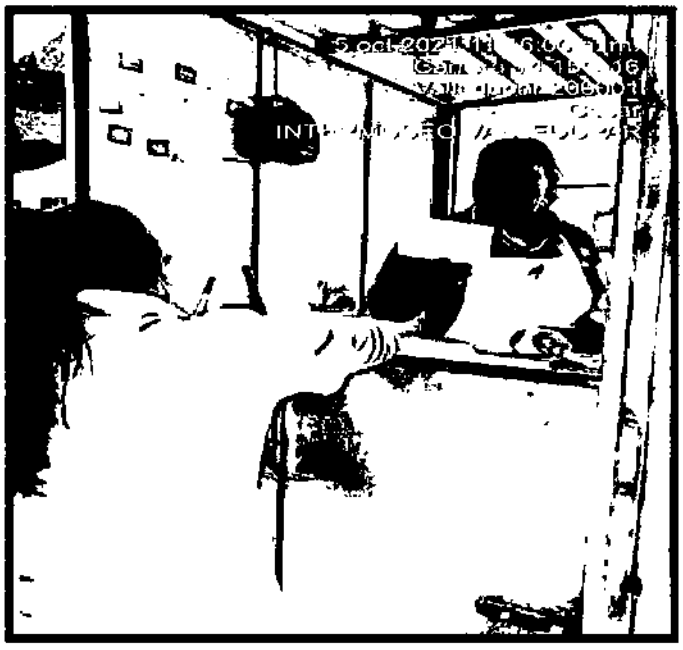

1.2.3.9. Atención y participación ciudadana:

Instalación de buzón para la recepción de hojas de vida, atención al ciudadano etc.



Atención a la veeduría especializada del cesar – recorrido.



1.2.3.10. Aprovechamiento forestal

Luego de pasado dos meses sin respuesta por parte de la Corporación ante el recurso de reposición, la gobernación del Cesar, con el ánimo de NO generar retrasos en el área técnica del proyecto, se continúa con la actividad de aprovechamiento forestal, el día 29 de octubre de 2021, se continuó con la de erradicación de árboles autorizados por la autoridad ambiental competente. Se llevaba un consolidado de 15 árboles erradicados, para el día 29 de octubre de 2021 se talaron 6 árboles, llevando un consolidado total hasta la fecha del presente informe de 21 árboles erradicados de 26 permitidos por la resolución 0045 de 05 de agosto de 2021.





ACREDITADO ONAC IEC/ISO 17025:2017 OLAB-004	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13 **INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS**	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.61 13/09/2021 PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 18 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolpsu@gmail.com
TELEFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.024-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-03): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12)(3)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(31.1 HUMEDAD(%) 78 CURADO:
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 30
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO


AVANCE N°.59

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	AREA PROM. (cm²)	CARGA (KN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	(psi)	REPRESENTACIÓN	TIPO DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE #15 COD 2106 (4000 PSI)	2021-08-30	2021-09-27	28	153,0	303,5	12,675	183885	542,48	29,51	4278,6	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	3277,1
1	ZAPATAS EJE #16 COD 2107 (4000 PSI)	2021-08-30	2021-09-27	28	153,0	305,6	12,640	183585	589,95	32,09	4654,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	3249,1
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Elementos de Protección (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado es la relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3658

RUBEN V. AMORO
DIRECTOR TECNICO DEL LABORATORIO

CALLE 2C N°8-21 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3126490172-3005681896
Pagina Web: www.vyoingenieria.com E-MAIL: vyoingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC

NTC/IEC 17025:2017
9-LAB-002

VYO INGENIERIA S.A.S

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.83 13/05/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 9
SOLICITANTE:	CONSORCIO A CONSTRUIR
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 8595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.026-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-CON-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 28,8 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 04
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 26
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO


AVANCE N° 23

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE MOLDEO	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (Ton)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)		REFRENDACION	PATRÓN DE FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
										(kg/cm²)	(psi)			
1	ZAPATAS EJE ST - SB #22 COD 1984 (4000 PSI)	2021-08-25	2021-09-01	7	154,0	300,0	12,460	18627	403,29	21,65	3140,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2229,8
1	ZAPATAS EJE ST - SB #22 COD 1985 (4000 PSI)	2021-08-25	2021-09-01	7	154,0	301,0	12,510	18627	412,75	22,16	3214,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	6	2231,3
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que aquí se consignan son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S reside los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Recuperar de Formato de Foto Testigo (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el Item sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 1659

REVISO Y APROBO

FIN DEL INFORME

6626

ACREDITADO ONAC IC CMEC 17025:2017 LAB-054	**RESITENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.53 13/01/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 2

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 9
SOLICITANTE:	-CONSORCIO A CONSTRUIR
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.027-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) VERNIER DIGROMETRO (VH-01): (X) BALANZA (BAL-D-115)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 28,6 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 06
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 26
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 24

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	AREA (cm²)	CARGA MAX. (KN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION (MPa)	(kg/cm²)	REFRENTADO	PATRON DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE SL - S1 M3 COD 2014 (4000 PSI)	2021-08-26	2021-09-02	7	155,0	301,0	12,440	18869	452,90	24,00	481,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2190,3
1	ZAPATAS EJE SL - S1 M3 COD 2015 (4000 PSI)	2021-08-26	2021-09-02	7	155,0	300,0	12,410	18869	420,36	22,28	1291,1	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2192,5
TOTAL CILINDROS											2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de extracción de la loza existente serán suministrado cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Personas de Alto Riesgo (Ajuste 810-1)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este Informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item remitido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

REVISO Y APROBO
DIRECTOR TECNICO

FIN DEL INFORME

7398

ACREDITADO ONAC

IDÓNEO 17316-2017
I-LAB-324

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.69 13/08/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 9
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp93@gmail.com
TELEFONO	302 378 9585
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.028-08-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) BCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 28.0 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 08
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 28
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 25

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	ÁREA (cm²)	CARGA MÁX. (kN)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (kg/cm²)	(mpa)	REFRENDACION	FACTOR DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE #14 COD 2008 (4000 PSI)	2021-08-27	2021-09-03	7	153,0	304,0	12,480	18385	422,45	22,98	3352,8	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	1,5	2232,8
1	ZAPATAS EJE #14 COD 2009 (4000 PSI)	2021-08-27	2021-09-03	7	153,0	304,0	12,530	18385	419,61	22,82	3330,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	1,5	2241,0
	TOTAL CILINDROS										2			

Nota: Los resultados que están sombreados con los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S resalta los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquemas de Fracturas de Falla Típicas (Figura 410-1)



REMITENTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensaye
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

REVISO Y APROBO

FIN DEL INFORME

8299

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17025:2017
P-LAB-004

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO 30C-F-83 13/09/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 8
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 16 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp80@gmail.com
TELÉFONO	302 378 8595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CODIGO:	RC.RE.AF.029-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERE 340 CODIGO INTERNO P-COM-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-18) 30
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 30 HUMEDAD(%):75 CURADO:
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 07
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 26

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: (MPa)	(psi)	REFRENTADO	FORMA DE FRACTURA	DUREZA (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE B15 COD 2098 (4000 PSI)	2021-08-28	2021-09-04	7	154,0	304,0	12,590	186,27	423,12	22,98	3325,8	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2223,9
1	ZAPATAS EJE B15 COD 2099 (4000 PSI)	2021-08-28	2021-09-04	7	154,0	304,0	12,630	186,27	397,36	21,58	3084,1	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2230,5
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitidos en este informe son responsabilidad de VYC INGENIERÍA SAS
VYC INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Protocolo de Falla Típicas (Figura 410-2)

IMPORTANTE:
*Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado está relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
*Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3969

BRAYAN Y ARDILA
DIRECTOR TECNICO LABORATORIO

6629

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 LAB 18-006	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/09/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 9
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO:	302 378 9585
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.030-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO: P-CON -02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-01-13)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(30 HUMEDAD(%):75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 09
FECHA RECEPCION MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 27

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYE	EDAD (Días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (g)	ÁREA TRANSV. (mm²)	CARGA MÁX. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)		REPRESENTACION	TIPO DE FRACTURA	ESFUERZO (kg/cm²)
										(kg/cm²)	(psi)			
1	ZAPATAS EJE #16 COD Z104 (4000 PSI)	2021-08-30	2021-09-06	7	153,0	305,0	12,570	18385	423,67	235,04	3341,8	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	S	2241,6
1	ZAPATAS EJE #16 COD Z105 (4000 PSI)	2021-08-30	2021-09-06	7	153,0	306,0	12,510	18385	402,21	221,88	3172,9	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	S	2196,3
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de ubicacion de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe con responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S no se hace responsable de los resultados de este informe acorde a las caracteristicas de las muestras recibidas

Observaciones:

Graficas de Patrones de Falla Típicos (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y en relacion al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 1989

ROMÁN Y AMADO
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DEL INFORME

6630

ACREDITADO ONAC IPÓVEC 17065:2017 17LAB-004	**RESITENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F-63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 08
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9585
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CODIGO:	RC.RE.AP.032-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM -03
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-12): (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 30 HUMEDAD(%): 75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 09
FECHA RECEPCION MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO


AVANCE N° 28

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO kg	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)		REFRENTADO	PERDIDA DE PRACTICA	DENSIDAD (kg/m³)
1	ZAPATAS EJE J17 COD 2130 (4000 PSI)	2021-08-31	2021-09-07	7	153,0	306,0	12,670	18385	405,64	22,06	3200,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2252,1
2	ZAPATAS EJE B17 COD 2111 (4000 PSI)	2021-08-31	2021-09-07	7	153,0	305,0	12,620	18385	435,41	23,68	3434,8	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2250,5
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están contenidos son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la (resistencia) son suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados revelada en este informe son responsabilidad de VYD INGENIERÍA SAS
VYD INGENIERIA S A S no avala los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Diagramas de Patrones de Falla Típicos (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio solo va la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado está relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3658

REVISÓ Y APROBÓ
DIRECTOR TÉCNICO

CALLE 2C Nº8-28 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3124490172-3005483896
Pagina Web www.vydingenieria.com E-MAIL: vydingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6631

ACREDITADO ONAC 17025:2017 LAB-054	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F-82 13/09/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 11
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.044-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO: RC-42 SERIE 340	CODIGO INTERNO: F-CON-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-10):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 30 HUMEDAD(%):75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 11
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 09
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 29

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDICIÓN	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	Área (cm²)	CARGA máx. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)		REPRESENTACION	RATIÓN DE FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
1	ZAPATA EJE SK-58 #23 COD 2278 (4000 PSI)	2021-09-08	2021-09-10	2	153,0	307,0	12,480	18385	287,08	15,61	2264,7	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2211,1
1	ZAPATA EJE SK-58 #23 COD 2279 (4000 PSI)	2021-09-08	2021-09-10	2	153,0	304,0	12,400	18385	279,30	15,19	2203,3	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2218,6
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitada en este informe con responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S no avala los resultados de este informe a razón a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Representación de Patrones de Falla Típicos (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos, y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3969

REVISÓ Y APROBÓ
Director Técnico

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC
IDONEO LTDA 2012
13-LAB-004

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO ~ INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL RESISTENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 14
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp60@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.079-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR – CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) BRICUMORA (BE-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 31,1 HUMEDAD(%) 75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 11
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YINMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 30

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (k	Área media (mm²)	CARGA MAX. (kN)	RESISTENCIA CALCULADA (MPa)	(kg/cm²)	OBSERVACION	N° FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
1	ZAPATAS EJE #18 COD 2116 (4000 PSI)	2021-09-01	2021-09-08	7	154,0	304,0	12,610	18627	493,01	26,47	269,9	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2226,9
1	ZAPATAS EJE #18 COD 2117 (4000 PSI)	2021-09-01	2021-09-08	7	152,0	305,0	12,460	18146	486,93	26,83	273,6	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2251,3
1	SOLADO VIGA EJE 18M COD 2122 (2500 PSI)	2021-09-01	2021-09-08	7	102,0	203,0	3,657	8171	147,70	18,08	184,3	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2204,5
	TOTAL CILINDROS										3			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquemas de Patrones de Falla Típicos (Figura 430-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3658

REVISÓ Y APROBÓ

CALLE 2C N°e-28 LOS CAMPANOS TEL. 5854724 CEL. 3136490172-3005653886
Pagina Web www.vyoingeniria.com E-MAIL. vyoingeniria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6633

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 VYO LAB-004	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F-03 15/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 14
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiotp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 8595
OBRA:	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.080-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO F-CON-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-12)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 32 HUMEDAD(%):75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 13
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 17
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 31

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE MOLDEO	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA (kN)	MÁXIMA N° CONVENCIONAL (kN)	(psi)	ESPECIFICACIÓN	PRESIÓN DE DISEÑO	RESULTADO (kg/cm²)
1	SOLADO CDO 1815 (2500 PSI)	2021-08-13	2021-09-10	28	153,0	305,0	12,920	18385	464,29	25,25	3662,7	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2304,0
1	SOLADO CDO 1816 (2500 PSI)	2021-08-13	2021-09-10	28	153,0	305,0	12,920	18385	420,90	22,89	3320,41	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	3	2304,0
	TOTAL CILINDRO									2				

Nota: Los resultados que están encerrados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S avala los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquema de Fallas de Cilindros (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* En el informe emitido solamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 1926

REVISÓ Y APROBÓ:

CALLE 2C N°6-29 LOS CAMBANOS TEL. 5834724 CEL. 3126896172-3005431896
Pagina Web www.vyoingenieria.com E-MAIL: vyoinganieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6634

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 LE-924	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 14
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 15 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	febloip90@gmail.com
TELÉFONO:	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.081-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 — CODIGO INTERNO: P-COM-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12)-(X)
CONDICIONES AMBIENTALES:	TEMPERATURA: 30 HUMEDAD(%) 74 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 13
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 17
LABORATORISTA:	YEIMAR BARRIOS SOTELO

AVANCE N° 32

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (cm)	PESO (k)	ÁREA TRANSV. (mm²)	CARGA MAX. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)	REFRENDACION	FACTOR DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS COD 1603 (4000 PSI)	2021-08-12	2021-09-09	28	153,0	308,0	12,850	18385	442,94	24,09	3494,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2269,2
1	ZAPATAS COD 1604 (4000 PSI)	2021-08-12	2021-09-09	28	153,0	307,0	12,870	18385	456,72	24,84	3602,9	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2271,31
TOTAL CILINDROS											2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Todo información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de UYO INGENIERÍA SAS
UYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Ensayos de Alta Tensión (Ingeniero Civil)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y registrados al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3669

PROBO Y AMORO
DIRECTOR TÉCNICO

CALLE 2C N°4-28 LOS CAMPANOS TEL. 5834734 CEL. 3126690173-3005683896
Pagina Web www.uyoingenieria.com E-MAIL uyoingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6635

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 P-LAB-004	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO 300-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 23
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiohp90@gmail.com
TELEFONO	302 378 8595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.134-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) MEDIDORES : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-18)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 30,1 HUMEDAD(%):78 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 20
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 22
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO


AVANCE N° 83

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (g)	AREA TRANSV. (mm²)	CARGA MAX. (KN)	ESFUERZO A LA COMPRESION (MPa)	(kg/cm²)	RETRENDACION	TIPO DE FRACTURA	OBSERVACIONES (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE S13 - SA NB COD 1942 (4000 PSI)	2021-08-20	2021-09-17	28	154,0	305,0	12,860	18627	508,32	27,29	3458,1	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2263,6
1	ZAPATAS EJE S13 - SA NB COD 1943 (4000 PSI)	2021-08-20	2021-09-17	28	154,0	300,0	12,780	18627	530,40	28,48	4130,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2267,1
TOTAL CILINDROS											2			

Nota: Los resultados que aquí se consignados son los que conforman este informe.
Los datos de estos ensayos de la fecha indicada serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitidos en este informe son responsabilidad de VYD INGENIERÍA SAS
VYD INGENIERIA S.A.S no avala los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Resistencia de Cilindros de Falla Tipica (Norma 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

CALLE 2C Nº8-29 LOS CAMPANOS TEL. 5884734 CEL. 3126690172-3005683898
Pagina Web www.vydingeniería.com E-MAIL: vydingeniería@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6636

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 LAB-1204	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 11 CODIGO SGC-F.63 12/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION	2021 DE SEPTIEMBRE 23
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp80@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9565
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.135-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
GRUPO	FC-02 SOPE 040 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERM ONGOMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12 (1)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 30,1 HUMEDAD(%):70 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 14
FECHA RECEPCION MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 17
LABORATORISTA	YESNAR BARROS BOTELLO

AVANCE N° 34

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	RAZÓN (%)	ÁREA (cm²)	CARGA MÁX. (kN)	RESISTENCIA (kg/cm² / MPa / %)	OBSERVACIONES	FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS COD 1809 (4000 PSI)	2021-08-14	2021-09-13	28	154,0	300,0	12,810	18627	463,30	24,87 / 2537,1 / 63,4	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2292,4
1	ZAPATAS COD 1810 (4000 PSI)	2021-08-14	2021-09-13	28	153,0	306,0	12,760	18385	424,80	23,11 / 2357,1 / 58,9	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2168,1
TOTAL CILINDROS										2			

NOTA: Los resultados que están sombreados son los que contienen el informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitidos en este informe es responsabilidad de VIO INGENIERÍA SAS
VIO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

[redacted]

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio son la forma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa Solamente los resultados obtenidos y no refiere a diseños y condiciones en que es realizado los ensayos.
* Este resultado de ensayo se relaciona solamente con el ítem sometido a ensayo
* Las tolerancias de conversión son tomadas de la norma Técnica Colombiana NTC 3669

[redacted]

CALLE 3C Nº8-28 LOS CAMPANOS TEL. 5884734 CEL. 3126490172-3005618894
Pagina Web www.vyolingenieria.com E-MAIL: vyolingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6637

ACREDITADO ONAC IEC/ISO 17025:2017 14-LAB-324	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION	2021 DE SEPTIEMBRE 24
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELEFONO	302 378 9585
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.139-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 30,7 HUMEDAD(%) 72 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 20
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 20
LABORATORISTA	YIMMAR BARROS BOTELLO


AVANCE N° 35

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (k)	AREA (cm²)	CARGA MAX. (kg)	Resistencia a la compresión (kg/cm²)	(MPa)	E	REFRENTADO	TIPO DE FRACTURA	densidad (kg/m³)
1	ZAPATA DE 9 - 5A #7 COD 1925 (4000 PSI)	2021-08-19	2021-09-16	28	154,0	304,0	12,880	18627	517,00	27,76	4825,7		TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2274,6
1	ZAPATA DE 9 - 5A #7 COD 1926 (4000 PSI)	2021-08-19	2021-09-16	28	154,0	299,0	12,110	18627	496,57	26,66	4636,4		TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2274,4
	TOTAL CILINDROS											2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que confirman este informe.
Los datos de extracción de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados contenida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S A Garantiza los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquemas de fracturas de probetas (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este estudio esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

ARQUEO Y ARCHIVO
DIRECTOR TECNICO

FIN DEL INFORME

6638

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.53 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 24
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp80@gmail.com
TELÉFONO	302 376 8595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO	RC.RE.AP.140-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-C DE 42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-10)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(30,7 HUMEDAD(%):72 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 18
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 28
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO


AVANCE N° 36

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	AREA TRANSV (cm²)	CARGA MAX. (kg)	RESISTENCIA A LA COMPRESION (kg/cm²)	(psi)	OBSERVACION	TIPO DE FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
1	ZAPATA 6 EK - S2 #7 COD 1930 (4000 PSI)	2021-08-18	2021-09-15	28	153,0	305,0	12,800	18385	530,98	28,88	4104,8	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2282,6
2	ZAPATA 6 EK - S2 #7 COD 1933 (4000 PSI)	2021-08-18	2021-09-15	28	153,0	305,0	12,850	18385	520,84	28,33	4104,8	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2291,5
	TOTAL CILINDROS										2			

NOTA: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estas tablas de la inconformidad serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite.
Toda información de resultados anulada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S excluye los resultados de este informe dirigido a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquema de Patrones de Falla Típicos (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3549

REVISO Y APROBO

CALLE 2C N°8-13 LOS CAMPANOS TEL. 5834726 CEL. 3126590172-3005328896
Pagina Web: www.vyoingenieria.com E-MAIL: vyoingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6638

ACREDITADO ONAC
IC-OIEC 17025:2017
PRUEBAS

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9605
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO.	RC.RE.AP.170-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): [X] GALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-03): (X) BALANZA (BAL-ID-15)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(30) HUMEDAD(%):79 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 16
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 17
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 37

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO kg	ÁREA TRANSV. (mm²)	CARGA MAX (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION (MPa)	(psi)	REFRENDACION	PATRÓN DE FRACTURA	DUREZA (kg/cm²)
1	SOLADO DE ZAPATA COD LB23 (2500 PSI)	2021-08-15	2021-09-12	28	152,0	307,0	12,870	18146	451,78	24,90	3611,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2310,3
1	SOLADO DE ZAPATA COD LB24 (2500 PSI)	2021-08-15	2021-09-12	28	153,0	305,0	12,860	18385	448,50	24,39	3538,1	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2293,3
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de ubicación de la (s) estructura (s) son suministrados tienente y cuando el cliente lo solicite
Toda información de resultados anteriores en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S puede los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Proceso: de Pablo Rojas (Firma digital)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este resultado está relacionado solamente con el item sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

RAMÓN Y ARROYO
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/05/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabioipz90@gmail.com
TELÉFONO:	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:


CÓDIGO:	RC.RE.AP.171-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12.10)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 33,4 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 24
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 16
LABORATORISTA	YEINAR BARROS ARTEAGA

AVANCE N° 38

MUESTRA N°	CONCRETO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIAMETRO (pulg)	ALTURA (pulg)	PESO (lb)	AREA (pulg²)	CARGA (psi)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	REFRENTADO	FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	SOLADO HECHO EN OBRA VIGAS 826 COD 2356 (2500 PSI)	2021-09-14	2021-09-21	7	133,0	304,0	12,350	13385	270,44	11,99	7799,0	TAPAS RIO ADHERIDA(NEOPRENO)	1 S	2209,8
TOTAL CILINDROS												1		

Nota : Los resultados que están indicados con (*) no se encuentran en el alcance.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados contenida en este informe son responsabilidad de VID INGENIERIA SAS
VID INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y es válido en el momento y condiciones en que se realizaron los ensayes.
*Este resultado está relacionado solamente con el Remuestreo o ensaye
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 1659



CALLE 2C N°8-23 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3126490172-3005433894
Pagina Web www.vidingenieria.com E-MAIL vidingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

4699

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 PLANTA	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F-03 19/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiotp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 8595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CODIGO:	RC.RE.AP.172-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-CDU-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS ((X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-15) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 31,4 HUMEDAD(%) 77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 21
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 15
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELLO

AVANCE N° 39

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	Área Nominal (cm²)	CARGA MAX. (kg)	ÁREA CORREGIDA (cm²)		TIPO DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
										(cm²)	(cm²)		
1	SOLADO VIGAS HECHO EN OBRA f25 CON 2350 (2500 PSI)	2021-09-13	2021-09-18	7	152,0	305,0	12,550	181,46	344,87	19,01	2756,5	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2267,6
TOTAL CILINDROS													1	

Nota: Los resultados que están consignados son los que conforman esta columna.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYC INGENIERÍA SAS
VYC INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable del Polígono de Falla Rígida (Nivel 130-F)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio (en la forma original del Director Técnico del Laboratorio, son los unicos validos.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayes.
* Este resultado está relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3649

REVISO Y APROBO

CALLE 2C N°8-13 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3126690172-3005622896
Pagina Web: www.vycingenieria.com E-MAIL: vycingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6642

ACREDITADO ONAC	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.83 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELEFONO:	302 378 9695
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.173-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO: P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-12):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 31,4 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 23
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 15
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELLO


AVANCE N° 45

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (g)	AREA TRANSV. (mm²)	CARGA MAX. (kN)	LECTURA MANOMETRO (Lb/pul²)		RESISTENCIA (kg/cm²)	PATRON DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	SOLADO HECHO EN OBRA VIGAS #26 COD 2353 (2500 PSI)	2021-09-13	2021-09-20	7	151,0	305,0	12,010	17908	223,54	12,45	1810,5	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2198,9
	TOTAL CILINDROS										1			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados anulada en este informe son responsabilidad de VVO INGENIERÍA SAS
VVO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Resultados de Ensayos de Falla Tipicos (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado es relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3658

REVISÓ Y APROBÓ
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 LAB-206	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.62 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 18 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO:	302 378 9685
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CODIGO:	RC.RE.AF.174-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-47 SERIE 340 CODIGO INTERNO: P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (N) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-13) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES:	TEMPERATURA: 31,4 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 20
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 15
LABORATORISTA:	VEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 41

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO kg	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (psi)	REFRENTADO	TIPOLOGÍA DE FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
1	SOLADO HECHO EN OBRA #24 COD 2947 (2500 PSI)	2021-09-09	2021-09-16	7	152,0	304,0	12,320	181,46	253,92	13,99	2029,6	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2293,4
TOTAL CILINDROS														

Nota: Los resultados que están consignados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados contenida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Equipos de Patrones de Referencia (Ejes 450 t):

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayes.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item sometido a ensayo
* Los factores de correcciones se tomaron de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

APROBÓ Y AUTORIZÓ
CARGO: DIRECTOR TÉCNICO
FIRMA Y SELLO

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17025:2017
17-LAB-004

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.61 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL RESITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp99@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.175-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERE 340 CODIGO INTERNO P-CON-02
HERRAMIENTAS:	PIÉ DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-13):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(31,6 HUMEDAD(%) 77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 20
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 09
LABORATORISTA:	YEINAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 42

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	Peso(Kilos)	ALTURA (mm)	PSI kg	ÁREA Teórica (cm²)	ÁREA REAL (cm²)	RESISTENCIA A RUPTURA Kg/cm²		REFRENTADO	TIPO DE FRACTURA	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	psi			
1	SOLADO HECHO EN OBRA #20 COD 2287 (2500 PSI)	2021-09-09	2021-09-16	17	153,0	305,0	13,030	180,85	180,07	15,29	2209,4	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2316,1
	TOTAL CILINDROS										1			

Nota: Los resultados que aparecen en el encabezado son los que conforman este informe.
Los datos de referencia de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquema de Fallas de Falla Típicas (Figura 410-5)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el ítem ensayado o entregado
*Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3459

REVISO Y APRUEBO

CALLE 2C N°9-28 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3126690173-3005633896
Pagina Web:www.vyoingenieria.com E-MAIL: vyoingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6645

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17025:2017
LABORATORIO

VIO INGENIERIA

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.65 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PÁGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION	2021 DE SEPTIEMBRE 23
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp00@gmail.com
TELEFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.176-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO F-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA 20 HUMEDAD(%):70 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 23
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 26
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N°23

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	AREA TRANSV. (mm²)	CARGA MAX. (kg)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)	(MPa)	OBSERVACIÓN	PATRON DE FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
1	PEDESTALES #10 COD 1998 (4000 PSI)	2021-08-23	2021-09-20	28	153,0	304,0	12,880	18385	527,49	28,69	2,81	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2304,5
2	PEDESTALES #10 COD 1999 (4000 PSI)	2021-08-23	2021-09-20	28	153,0	303,0	12,810	18385	518,51	28,20	2,76	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2299,5
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la fecha de ruptura serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VIO INGENIERIA SAS
VIO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Ejecución de Ensayos (Nombre y cargo)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el ítem remitido a ensayo
* Los factores de conversion son los normados en la Norma Tecnica Colombiana NTC 3669

REVISO Y APROBÓ
DIRECTOR TECNICO

CALLE 2C Nº8-23 LOS CAMPANOS TEL. 5804724 CEL. 3126690123-3008635595
Pagina Web: www.vioingenieria.com E-MAIL: vioingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

9946

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 14-LAB-004	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F-63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL RESIDENTE

FECHA DE EXPEDICION	2021 DE SEPTIEMBRE 29
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabioip90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.177-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADO(03-10-19) (X) ESCUADRA (05-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-13) 09
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29 HUMEDAD(%) 70 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 24
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 25
LABORATORISTA	YOMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 44

MUESTRA N°	DISEÑO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	AREA (cm²)	CARGA (kN)	ESFUERZO A LA COMPRESION (MPa)	(kg/cm²)	%	TIPO DE FRACTURA	OBSERVACIONES	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE SJ - SB 811 CDO 1993 (4000 PSI)	2021-08-24	2021-09-21	28	153,0	305,0	12,540	18365	533,29	29,90	304,9	7,6	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)		3289,3
2	ZAPATAS EJE SJ - SB 811 CDO 1993 (4000 PSI)	2021-08-24	2021-09-21	28	154,0	305,0	12,880	18627	525,48	28,21	287,7	7,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)		3267,2
TOTAL CILINDROS												2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Segmentos de Polinomio de Falla Splines [Figura 410-8]



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al material y condiciones en que se recibieron los ensayos.
*Este resultado está relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3809

CALLE 2C N°8-23 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3126090173-3005481596
Postne Web:www.vyoingeniaria.com E-MAIL: vyoingeniaria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC

ACREDITACIÓN 17025:2017
LABORATORIO

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.65 23/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 29
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp88@gmail.com
TELEFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.178-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO F-COM-62
HERRAMIENTAS.	PIE DE REY (PR-01): (X) GALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12)-(3)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(29 HUMEDAD(%) 81 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 25
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 28
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 45

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	AREA TEORICA (cm²)	Dia de Ens. (dia)	Carga máxima a la compresión (kN)	(kgf)	REFERENCIACIÓN	Variación del Especimen	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATAS EJE SL - S1 813 COD 2016 (4000 PSI)	2021-08-26	2021-09-23	28	15,0	30,0	12,640	176,625	513,42	97,69	4050,3	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2354,1
2	ZAPATAS EJE SL - S1 813 COD 2017 (4000 PSI)	2021-08-26	2021-09-23	28	15,0	30,0	12,730	176,625	521,57	98,37	4114,5	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2270,3
	TOTAL CILINDROS										2			

Nota: Los resultados que estan sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados contenida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERIA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las caracteristicas de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Registro de Entrega de Informe de Ensayos (Figura 410-2)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa Solamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Que resultado a esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3665

VYO INGENIERIA Y ASESORIA
ARQUITECTA - GERENTE

CALLE 2C N°8-28 LOS CAMPANOS TEL. 5834734 CEL. 3126690172-3005633896
Pagina Web www.vyoingenieria.com E-MAIL: vyotecnia@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC IDONEO 1205-2017 13-LAB-004	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.59 19/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 29
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELEFONO:	302 378 8595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.178-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-13) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29,2 HUMEDAD(%):80 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 17
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 20
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 46

MUESTRA N°	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	ÁREA (mm²)	CARGA MAX. (KN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	(kg/cm²)	REPRESENTACIÓN	PATRÓN DE FRACTURA	RESISTENCIA (kg/cm²)
1	ZAPATA EJE SK' - 53.85 COD 1936 (4000 PSI)	2021-08-17	2021-09-14	28	154,0	305,0	12,700	18627,1	510,72	27,42	279,6	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2735,5
1	ZAPATA EJE SK' - 53.85 COD 1937 (4000 PSI)	2021-08-17	2021-09-14	28	154,0	304,0	12,680	18627	508,56	27,30	278,4	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2739,3
TOTAL CILINDROS											2			

Nota: Los resultados que están reportados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de WD INGENIERIA SAS
WD INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Protocolo de Pablo Galvan (Planta 416-1)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa solamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Es el resultado de esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

RAMIRO V. RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO

FIN DEL INFORME

6699

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-002

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 13 CODIGO SGC-F-63 13/03/2018
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE SEPTIEMBRE 29
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 18 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.180-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-CON-03
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) MEDIDORES : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29.2 HUMEDAD(%):63 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 17
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 09
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO


AVANCE N° 47

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE RUPTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	F'c (Kg/cm²)	AREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm²)		REFERENCIACION	CONDICIÓN DE FRACTURA	PORCENTAJE (%)
										(kgf/cm²)	(psi)			
1	SOLADO HECHO EN OBRA #22 COD 2290 (3500 PSI)	2021-09-07	2021-09-14	7	15LO	304,0	12,610	176,90	184,90	10,33	147,0	(AP-AS NO ADHERIDA)(NEOPRENO)	5	2316,2
TOTAL CILINDROS														

Nota: Los resultados que están consignados son los que conforman este informe.
Los datos de extracción de la concretera/obra son suministrados cliente cuando el mismo lo solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYD INGENIERÍA SAS
VYD INGENIERIA S.A.S avala los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

Observaciones:

Indicador de Resistencia de Falla Típica (Figura 410-2)



IMPORTANTE:
*Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y no enlaza ni menciona condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item solicitado o ensayo
*Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3553

VYD INGENIERIA Y ASESORIAS
Diseño de mezclas y supervisión
Ambiental Web: vydingenieria.com

FIN DEL INFORME

0559

ACREDITADO ONAC	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 29
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

CÓDIGO	RC.RE.AP.163-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-43 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADOR (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) MEDIDORES : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-B-12)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29,8 HUMEDAD(%): 81 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 25
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 09
LABORATORISTA	TOMAR BARROS BOTELO


AVANCE N° A9

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	ÁREA TRANSV. (mm²)	CARGA MÁX. (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)		REFRENDACIÓN	CANTIDAD DE MUESTRAS	CONCRETO (kg/m³)
										(kg/cm²)	(psi)			
1	ZAPATA EJE SK-58 #23 COD 2280 (6000 PSI)	2021-09-08	2021-09-22	14	153,0	305,0	12,730	18385	521,25	28,35	4033,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2270,2
1	ZAPATA EJE SK-58 #23 COD 2281 (6000 PSI)	2021-09-08	2021-09-22	14	153,0	305,0	12,820	18385	562,34	30,58	4350,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2285,2
TOTAL CILINDROS													2	

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado algunos y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados resuelta en este informe son responsabilidad de VIVI INGENIERÍA SAS
VIVI INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe solo de las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Croquis de Fracturas de Falla Típicas (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el lote especifico a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

FIRMA Y ABREVIO
ROBERTO PEREA MARTINEZ
DIRECTOR TECNICO

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17025:2017
NTC-ISO/IEC 17025

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SQC-F.63 28/09/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 28
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELEFONO	302 378 9395
OBRA:	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.184-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 940 CODIGO INTERNO P-CON-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) MEDIDORES : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-12):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 28.9 HUMEDAD(%) 80 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 25
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 26
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 50

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	AREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (kN)	RESISTENCIA (kg/cm²)		REFRENTADO	CONDICIÓN DE HUMEDAD	RESISTENCIA (Kg/cm²)
	ZAPATAS EJE ST - SB #12 COD 1985 (4000 PSI)	2021-08-25	2021-09-22	28	153,0	305,0	12,530	18385	429,92	23,386	2385,5	TAPAS NO ADHERIDAS(INCOMPLETO)	S	2252,9
	ZAPATAS EJE ST - SB #12 COD 1987 (4000 PSI)	2021-08-25	2021-09-22	28	153,0	304,0	12,580	18385	412,22	22,42	2285,9	TAPAS NO ADHERIDAS(INCOMPLETO)	S	2250,8
	TOTAL CILINDROS									2				

Nota: Los resultados que están consignados son los que conforman este informe.
Los datos de identificación de la muestra deben ser suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYS INGENIERIA SAS
VYS INGENIERIA S.A.S rehúsa los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Ensayos de Alta Rotura (Operativo)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y es valedero al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item suministrado o ensayado
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

ATENTO Y ADHERENTE

CALLE 3C N°1-23 LOS CAMPANOS TEL. 5834724 CEL. 3136690172-3005438496
Pagina Web www.vysingenieria.com E-MAIL: vysingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

6652

ACREDITADO ONAC

IDEAPO 2005 2013
LAE-004

VIO INGENIERIA

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.55 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE SEPTIEMBRE 30
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO.	RC.RE.AP.185-09-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERE 340 CODIGO INTERNO P-CON-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-12) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 28.9 HUMEDAD(%) 61 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 28
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 51

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (g)	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA MAX. (Kg)	RESISTENCIA A LA COMPRESION (Kg/cm²)		REFRENTADO	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA (Kg/cm²)
										(Kg/cm²)	(MPa)			
1	ZAPATAS EJE 814 COD 2030 (4000 PSI)	2021-08-27	2021-09-24	28	154,0	305,0	12,780	18627,6	517,25	27,90	3988,7	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	1	2249,8
2	ZAPATAS EJE 814 COD 2031 (4000 PSI)	2021-08-27	2021-09-24	28	153,0	304,0	12,560	18385,1	523,29	28,47	4054,9	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	1	2247,2
	TOTAL CILINDROS										2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este Informe.
Los datos de muestreo de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este Informe son responsabilidad de VIO INGENIERÍA SAS
VIO INGENIERIA S.A.S avala los resultados de este Informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Diagramas de Patrones de Falla Típicos (Figura 410-3)



IMPORTANTE:
*Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
*Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
*Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

REVISO Y APROBO
DIRECTOR TECNICO

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 19-LAB-304	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 11 CODIGO SGC-F-65 13/09/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiahp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.017-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 140 CODIGO INTERNO P-CON-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NIVEL (N-01): (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12(XX)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29,7 HUMEDAD(%):76 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE OCTUBRE 01
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 05
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 52

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (Kg)	AREA TRANSV. (mm²)	CARGA MAX. (Kg)	RESISTENCIA A LA COMPRESION (Mpa)		REPARTICION	TIPO DE FRACTURA	SOBRE (Kg/m³)
1	CILINDROS CONCRETO SOLADO COD 1678 (2500 PSI)	2021-08-03	2021-08-28	56	153,0	307,0	12,620	18395	298,23	16,21	162,1	TAPAS NO ADHERIDAS(NO PEGADO)	5	2295,9
	TOTAL CILINDROS													

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimacion de la incertidumbre seran suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados entrada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S A S emite los resultados de este informe acorde a las caracteristicas de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Esquemas de Patrones de Falla Típicos (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado está relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3669

APOYO Y ASESORIA

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 15/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELEFONO	302 375 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.010-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS.	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29,7 HUMEDAD(%):78 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE OCTUBRE 01
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 05
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS SOTELO

AVANCE N° 53

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	DIÁMETRO (cm)	ÁREA (cm²)	PESO (Kg)	ÁREA FINAL (cm²)	CARGA MAX. (KN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Mpa)	(Kg/cm²)	REFRENTADO	FACTOR DE FRACTURA	DENSIDAD (Kg/m³)
1	ZAPATAS EJE #17 COD 2112 (4000 PSI)	2021-08-31	2021-09-28	28	153,0	305,0	12,650	183,85	551,84	30,02	4355,3	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2255,9
1	ZAPATAS EJE #17 COD 2113 (4000 PSI)	2021-08-31	2021-09-28	28	154,0	301,0	12,710	186,27	416,24	21,95	3141,3	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2267,0
TOTAL CILINDROS											2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERIA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Cilindros de Pulmones de Falla Dúctil (Tipos 4,5y 6)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado esta relacionado solamente con el item sometido a ensayo
* Las factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3689

REVISÓ Y APROBÓ

FIN DEL INFORME

6655

ACREDITADO ONAC
IEC/ISO 17025:2017
LAB-065

VYO INGENIERIA S.A.S

	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F 63 13/09/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRONICO:	fabiolp90@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.019-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-0-12):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(30,7 HUMEDAD(%):76 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE OCTUBRE 01
FECHA RECEPCION MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 54

MUESTRA Nº	DIAMETRO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	MASA (Kg)	AREA (cm²)	CARGA MAX. (Kn)	ESFUERZO A LA COMPRESION (Mpa)	(Kg/cm²)	REFRENTADO	CANTIDAD DE FRACTURAS	RESISTENCIA (Kg/cm²)
	ZAPATAS EJE SP - S7 #29 COD 2429 (4000 PSI)	2021-09-18	2021-09-28	10	153,0	306,0	13,150	183,85	307,00	17,58	179,3	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2387,4
	ZAPATAS EJE SP - S7 #29 COD 2430 (4000 PSI)	2021-09-18	2021-09-28	10	154,0	307,0	13,190	186,27	526,10	28,24	287,9	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	3506,6
	TOTAL CILINDROS										2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERIA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S avala los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Espacio de Firmas de Pala Tapas (Opcional)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este resultado esta relacionado únicamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

ANDRES V. ARRIETA
DIRECTOR TECNICO

FIN DEL INFORME

6656

ACREDITADO ONAC IC-LAB-XX	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 02 CODIGO SGC-F.53 19/01/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL SOLICITANTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp90@gmail.com
TELEFONO	302 375 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

CODIGO:	RC.RE.AP.020-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 540 CODIGO INTERNO P-CON-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADOR (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-B-13) (X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA: 29,8 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE OCTUBRE 02
FECHA RECEPCION MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO


AVANCE N° 55

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	F'C (kg/cm²)	ÁREA (cm²)	CARGA MÁX. (kN)	RESISTENCIA (kg/cm²)	(psi)	REFRENTADO	CANTIDAD DE MUESTRAS	DENSIDAD (kg/m³)
1	VIGAS CONCRETO BOMBEABLE EJE VC-16 SLUMP 7.0" #31 COD 2437 (4000 PSI)	2021-09-22	2021-09-29	7	154,0	303,0	19,040	186,27	504,26	27,07	3926,5	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2310,5
1	COLUMNAS CONCRETO BOMBEABLE EJE S1-S7 #31 COD 2438 (4000 PSI)	2021-09-22	2021-09-29	7	153,0	306,0	19,070	183,85	530,91	28,88	4188,2	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	2	2313,7
	TOTAL CILINDROS												2	

Nota: Los resultados que aquí se reportan son los que suministra este laboratorio.
Los datos de procedencia de la concretera serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite.
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERIA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S no emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Diagrama de Fracturas de Falla Típicas (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio solo son válidos en forma original del Director Técnico del Laboratorio, no poseen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y no refleja ni establece otras condiciones en que se obtuvieron los ensayes.
*Este resultado solo relacionado solamente con el item suministrado y ensayo
* Los factores de corrección son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3549

INGENIERIA Y ASESORIA

FIN DEL INFORME

6657

ACREDITADO ONAC IEC/EC 17025:2017 LAB-204	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp80@gmail.com
TELEFONO	302 378 9596
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.021-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) MEDIRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12): [X]
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA 29,9 HUMEDAD(%).77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE OCTUBRE 02
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 56

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE MOLDEO	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)	Área Promedio (cm²)	CARGA MAX (kN)	ESFUERZO A LA COMPRESIÓN (MPa)	(kg/cm²)	REFRENDACION	FACTOR DE CORRECCIÓN	RESISTENCIA (kg/cm²)
	ZAPATAS EJE #18 COD 2118 (4000 PSI)	2021-09-01	2021-09-29	28	153,0	305,0	12,890	183,85	535,84	29,14	4277	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2298,7
	ZAPATAS EJE #18 COD 2119 (4000 PSI)	2021-09-01	2021-09-29	28	153,0	306,0	12,980	183,85	542,36	29,50	4278,5	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2307,2
	TOTAL CILINDROS										2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de muestreo de la(s) muestra(s) fueron suministrados siempre y cuando el cliente lo solicite
Toda información de resultados emitida en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERIA SAS
VYO INGENIERIA S A S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Observaciones del Personal de Alta Técnica (Página 1 de 1)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos y lo reflejado al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos
* Estos resultados están relacionados solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversión son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3669

APROBÓ Y ADECUÓ
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DEL INFORME

6658

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 OLAE-002	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CÓDIGO SGC-F.53 15/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL PERITENTE:

FECHA DE EXPEDICION:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabioap98@gmail.com
TELEFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.022-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA.	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM -02
HERRAMIENTAS.	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) MEDIDORES : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-02)(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA 29,9 HUMEDAD(%):77 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE OCTUBRE 02
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE AGOSTO 05
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 57

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FABRICACIÓN	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	ÁREA TRANSV. (cm²)	CARGA MÁX. (Ton)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)	(psi)	%	REFRENTADO	TIPO DE FRACTURA	DENSIDAD (kg/m³)
1	CILINDROS CONCRETO SOLADO COD 1681 [2500 PSI]	2021-08-04	2021-09-29	56	153,0	304,0	12,730	18385	277,09	15,07	215,9	86	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	6	2277,6
TOTAL CILINDROS															

Nota: Los resultados que están contenidos en los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrados siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Elaboración del Acta Técnica (Página 4 de 4)

FIRMANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa y refiere sus resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado se relaciona solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los resultados obtenidos son tomados de la Norma Técnica Colombiana NTC 3658

REVISO Y APROBO

FIN DEL INFORME

ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 14-LAE-004	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 11 CODIGO SGC-F.63 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO:	fabiolp80@gmail.com
TELÉFONO	302 378 9595
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.023-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO	FC-42 SERIE 340 CÓDIGO INTERNO P-COM-02
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (GA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12): (X)
CONDICIONES AMBIENTALES:	TEMPERATURA: 31,1 HUMEDAD(%):75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE:	2021 DE SEPTIEMBRE 30
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 27
LABORATORISTA	YEIMAR BARROS BOTELO

AVANCE N° 58

MUESTRA Nº	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIAMETRO (cms)	ALTURA (cms)	PESO (Kg)	AREA MEDIA (cm²)	CARGA MAX. (Ton)	RESISTENCIA A LA COMPRESION (kg/cm²)	(Mpa)	REFRENTADO	PROMEDIO DE MUESTRA	DENSIDAD (kg/m³)
1	PANELITAS HECHO EN OBRA 028 COD 2427 (4000 PSI)	2021-09-17	2021-09-27	10	151,2	304,5	12,695	179,53	414,81	23,07	2,26	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2321,5
1	VIGA AUTO BOMBA VC 14 #30 COD 2433 (4000 PSI)	2021-09-20	2021-09-27	7	153,0	305,0	12,780	183,85	551,25	29,98	2,94	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	2179,1
1	VIGA AUTO BOMBA VC 14 #30 COD 2434 (4000 PSI)	2021-09-20	2021-09-27	7	153,5	303,5	12,979	185,06	568,76	30,73	3,01	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	12	2310,8
TOTAL CILINDROS									3					

Nota: Los resultados que estan sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimacion de la incertidumbre seran suministrado siempre y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S acepta los resultados de este informe acorde a las caracteristicas de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Responsable de Patrones de Referencia (Ruptura 410-13)

IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayos de laboratorio no lleva firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos para referenciar momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
*Este resultado no es relacionado totalmente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3665

CALLE 1C N°8-23 LOS CAMPANOS TEL. 5854724 CEL. 3126690172-3005631896
Pagina Web www.vyoingeniaria.com E-MAIL: vyoingenieria@gmail.com
VALLEDUPAR-CESAR-COLOMBIA

FIN DEL INFORME

0990

ACREDITADO ONAC INGENIERIA LAB-204	**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** NORMA DE ENSAYO – INV. E-410-13	VERSIÓN 12 CODIGO SGC-F.83 13/03/2021
	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	PAGINA 1 de 1

DATOS DEL REMITENTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN:	2021 DE OCTUBRE 04
SOLICITANTE:	A CONSTRUIR SA
DIRECCION:	CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 15 VALLEDUPAR - CESAR
CORREO ELECTRÓNICO	fabiotp90@gmail.com
TELEFONO	302 378 9695
OBRA:	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

CÓDIGO:	RC.RE.AP.024-10-21
LOCALIZACIÓN OBRA:	MUNICIPIO VALLEDUPAR - CESAR
EQUIPO:	PC-42 SERIE 340 CODIGO INTERNO P-COM-42
HERRAMIENTAS:	PIE DE REY (PR-01): (X) CALIBRADORES (CA-01): (X) ESCUADRA (ES-01): (X) NEOPRENOS : (X) TERMOHIGROMETRO (TH-01): (X) BALANZA (BAL-D-12):(X)
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA(31,1 HUMEDAD%:75 CURADO :
FECHA DISPONIBLE AL CLIENTE	2021 DE SEPTIEMBRE 30
FECHA RECEPCIÓN MUESTRA:	2021 DE SEPTIEMBRE 02
LABORATORISTA	YEIMAR BARRIOS SOTELO


AVANCE N°.59

MUESTRA N°	ELEMENTO	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (días)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	ÁREA (cm²)	CARGA (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/cm²)	REFRENDACIÓN	FACTOR DE FRACTURA	CARGA (kgf)
	ZAPATAS EJE N16 COD 2106 (4000 PSI)	2021-08-30	2021-09-27	28	153,0	303,5	12,675	18385	542,49	29,51	4279,6	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	27271,5
	ZAPATAS EJE N16 COD 2107 (4000 PSI)	2021-08-30	2021-09-27	28	153,0	305,8	12,640	18385	1589,96	32,09	4654,0	TAPAS NO ADHERIDA(NEOPRENO)	5	29249,7
	TOTAL CILINDROS										2			

Nota: Los resultados que están sombreados son los que conforman este informe.
Los datos de estimación de la incertidumbre serán suministrado durante y cuando el cliente los solicite
Toda información de resultados enviada en este informe son responsabilidad de VYO INGENIERÍA SAS
VYO INGENIERIA S.A.S emite los resultados de este informe acorde a las características de las muestras recibidas

OBSERVACIONES:

Disposición de Probetas de Falla Típica (Figura 410-1)



IMPORTANTE:
* Los informes de los ensayes de laboratorio sin la firma original del Director Técnico del Laboratorio, no tienen validez.
* Este informe expresa únicamente los resultados obtenidos y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
* Este resultado esta relacionado solamente con el ítem sometido a ensayo
* Los factores de conversion son tomados de la Norma Tecnica Colombiana NTC 3658

PEDRO V ARROYO

FIN DEL INFORME

9999

6662

PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA

Elaborado por:

C.R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S.

VALLEDUPAR – CESAR
DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 10 DE NOVIEMBRE

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

INTRODUCCIÓN

Para la correcta implantación del proyecto en el lote es necesario realizar un levantamiento topográfico actualizado de los linderos, vías colindantes y estructuras existentes con el fin de verificar en campo el cumplimiento de retiros según la norma vigente.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Levantamiento topográfico.

a. Objetivo.

El objetivo principal es la correcta implantación del proyecto de construcción del CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA.

b. Alcance del Estudio

- Levantamiento topográfico inicial que servirá como base para los cálculos de movimiento de tierra requeridos durante la construcción.
- Localización y replanteo del polígono del sótano del proyecto.
- Verificación de paramentos con respecto a las vías existentes.
- Trazado de ejes estructurales en el lote.
- Localización en altura del proyecto.

c. Equipo de Trabajo.

El levantamiento general se llevó a cabo con un frente de trabajo conformado por el siguiente grupo humano y logístico.

Comisión Topografía:

CARGO	NOMBRE
TOPOGRAFO	LUIS AFRANIO AMAYA MOJICA
CADENERO I	ASNER ROCHA
INGENIERO	CARLOS ALBERTO ROCA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

d. Equipos utilizados:

- ESTACIÓN TOTAL STONEX R15.

Ficha de datos

ANGLE MEASUREMENT	
Accuracy[1]	2"
Reading system	Absolute encoder
Display Resolution (selectable)	1" /5" /10" 0.0002g/0.001g/0.002g 0.005mil/0.02mil/0.05mil
Angle Units	DEG 360°/GON 400/MIL 6,400

TELESCOPE	
Magnification/ Field of view	30x/1°30'
Tube length	156 mm
Minimum focus distance	1.0 m (3.28 ft)
Reticle	10 brightness levels adjustable
Objective aperture	φ 45 mm
Laser pointer	Red light, coaxial

TILT SENSOR	
Type	Electronic, dual-axis
Compensation range/accuracy	± 3.0'/1"

DISTANCE MEASUREMENT RANGE[2]	
Standard mode prism	3.000 m [3]
Long mode prism	5.000 m [4]
Reflective sheet (6cm x 6cm)	800 m [4]
Reflectorless[5]	Up to 600 m [4]

DISTANCE MEASUREMENT ACCURACY[6]	
Standard mode prism	2 mm + 2 ppm
Long mode prism	2 mm + 2.5 ppm
Reflective sheet (6cm x 6cm)	3 mm + 2 ppm
Reflectorless	3 mm + 2 ppm

MEASUREMENT TIME	
Standard mode/Prism (Tracking/Fast/Fine)	0.4/0.6/1.0 sec
Reflectorless	1.5+5 sec

DISTANCE MEASUREMENT	
Distance Units	m/US ft/INT ft
Display Resolution (selectable)	0.0001m/0.001m 0.001ft/0.01ft

LASER PLUMMET	
Laser type	635nm semiconductor laser
Accuracy	1mm/1.5 m
Spot	± 1.5mm/1.5 m

LEVEL VIAL SENSITIVITY	
Plate level	30"/2mm
Circular level	8'/2mm

ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature	-20° C +50° C
Storage Temperature	-40° C +70° C
Waterproof/Dustproof	IP55


PHYSICAL SPECIFICATION	
Dimensions	202 x 197 x 345 mm
Weight including battery and tribrach	5.5 Kg

POWER	
Battery Voltage/Capacity	7.4V/3.400mAh Li-ion
Operating time (angle measurement)	Up to 24 hours
Operating time (distance meas. every 30 sec)	Up to 12 hours
Operating time (angle + distance meas.)	Up to 10 hours
Battery charger	110/220V, charging time 4h

OTHER SPECIFICATIONS	
Display/Keyboard	Two sides, LCD 96x160 Dots/Alphanumeric
Memory	120 000 points SD card (max 16Gb)
Interface	RS-232C/mini USB/SD card/ Bluetooth
Sensor	Temperature/Pressure

ON BOARD FIELD APPLICATION PROGRAMS

Data recording and management, Stake out, Area, Offset, Traverse, Inverse, Point projection, MLM, REM, Resection, Line stake out, Arc stake out, Polarire, Repeat measure, Road calculation

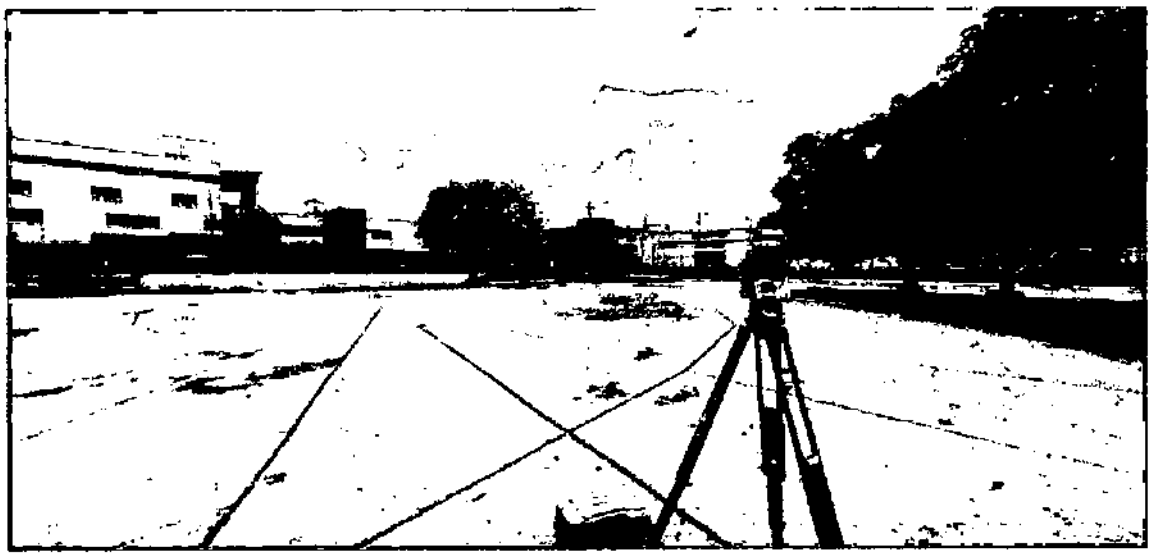

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

- NIVEL TOPCON AT-B4

Especificaciones

Longitud: 215 mm (8,46 pulg.)
Ampliación: 24x
Apertura del objetivo: 32 mm (1,26 pulg.)
Poder de resolución: 4 pulg.
Campo visual: (a 100 m/328 pies) 1°25'
(a 100 m/328 pies):(2,5 m/8,2 pies)
Enfoque mínimo desde el extremo del telescopio: 0,2 m (7,9 pulg.)
Enfoque mínimo desde el centro del instrumento: 0,3 m (1 pie)
Imagen: Montar
Constante estadimétrica: 100
Proporción estadimétrica: 100
Perilla de enfoque: 1 velocidad
Ayuda para la observación: Mira telescópica

PRECISIÓN (1 km de nivelación de doble pasada)

Sin micrómetro 2,0 mm (0,08 pulg.)
Con micrómetron /d

Compensador

Tipo Compensador de péndulo con sistema de amortiguación magnética
Precisión del montaje 0,5 pulg.
Rango de trabajo ±15 pies.

NIVEL CIRCULAR

Sensibilidad 10 pies/2 mm

Circulo Horizontal

Diámetro 103 mm (4,1 pulg.)
División mínima 1°/1 gon

General

PX6 (IEC 60529:2001)
Temperatura de funcionamiento -4° F a +122° F (-20° C a +50° C)
Ancho 5,12 pulg. (130 mm)
Longitud 8,46 pulg. (215 mm)
Altura 5,31 pulg. (135 mm)
Peso 3,7 lbs. (1,7 kg)
Resistencia al agua


LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR


e. Puntos de Amarre

Para este levantamiento topográfico se tomaron las coordenadas de los puntos georreferenciados y materializados en el levantamiento del diseñador:

Punto D-7
Norte: 1649912.779
Este: 1090402.417

Punto D-8
Norte: 1649914.958
Este: 1090436.416

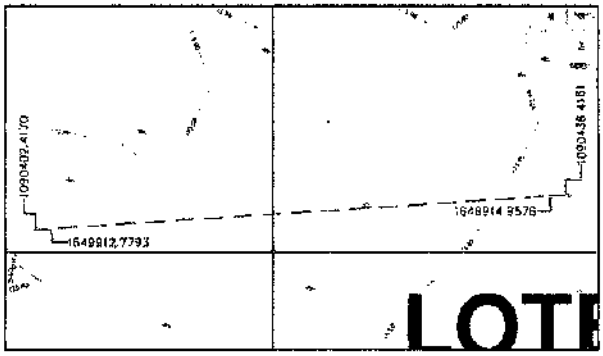

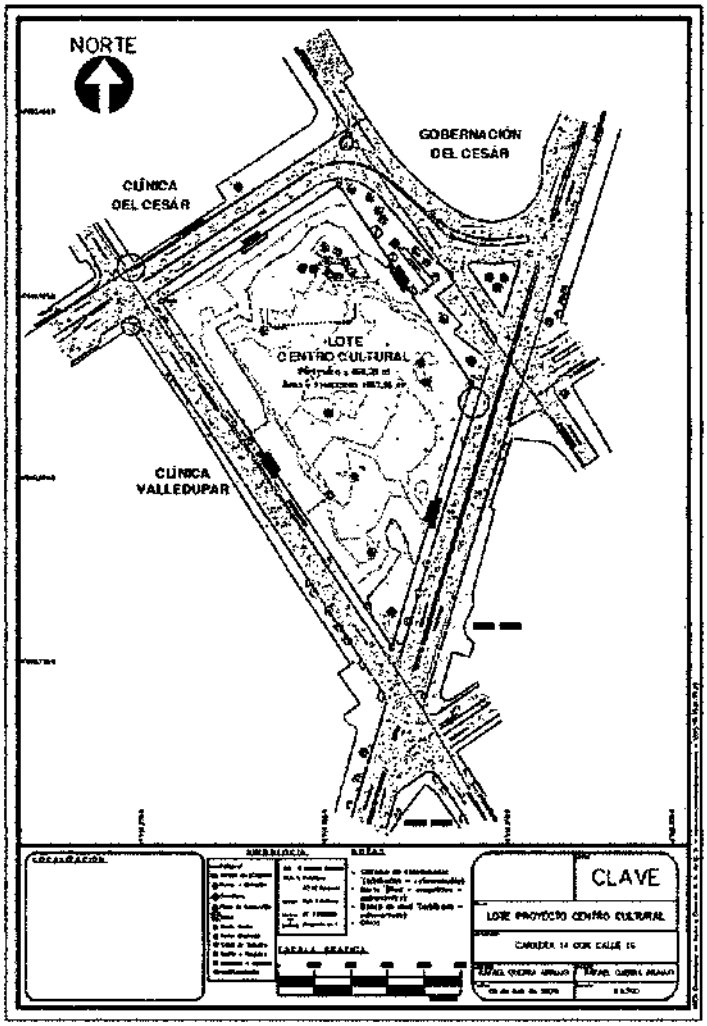

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

ANEXOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

CERTIFICADOS

ASB EQUIPOS TOPOGRÁFICOS S.A.S	CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION	FECHA: 21/05/2021
		NIVEL AUTOMATICO
		N°. MAY2021-083

Cliente: CR INGENIERIA TOPOGRAFIA S.A.S **CC/NIT:** 900711611-6

Dirección: CRA 43A No.98-64, BARRANQUILLA **Teléfono:** 3002415576

Fecha recomendada prox. Ajuste: 21/11/2021

Datos del Instrumento

Marca: TOPCON **Modelo:** AT-B4 **Serie:** 312493

Aumento telescopio o Magnificador: 32X

Ajustes realizados

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Códigos 1. Optimo 2. Corregido o Aplicado 3. No corregido 4. No aplica

Limpieza exterior	2
Mantenimiento interno	1
Ajuste del compensador	1
Ajuste nivel circular	2
Ajuste sistema de enfoque	1
Ajuste retículo	2
Ajuste colimación	2
Ajuste malla de puntería	2
Verticalidad	1
Mantenimiento base nivelante	1
Tornillo movimiento lento	1
Revision display/teclado	4

Ajuste en colimador

Descripción	Tolerancia	Error	Descripción	Tolerancia	Error
Rango de compensación	± 15'	<30"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Línea de visión	<5"	<5"

Se ejecutan los procesos de ajuste y pruebas de acuerdo a los parámetros técnicos de precisión establecidos por el fabricante, y que este se encuentra en optimas condicines para ejecutar trabajos.

El procedimiento de ajuste y verificación realizado al equipo contará con una garantía de un (1) mes, posterior a la revisión y corrección del error obtenido, previendo que este no se deba a defectos o daños físicos del equipo.
Patrones utilizados: Estación total SOKKIA CX-65 serie YN1801, nivel SOKKIA B40A serie WS059792

Realizó

Andrés Santiago Bolivar
Técnico Especializado

CALLE 68C #65-73, PISO 2 323-4065020
asbequipostopograficos@gmail.com
ASB_equitop ASB Equipos Topográficos S.A.S
Barranquilla - Atlántico

ASB EQUIPOS TOPOGRÁFICOS S.A.S	CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION	FECHA: 12/06/2021
		ESTACION TOTAL
		N°. JUN2021-089

Cliente: CR INGENIERIA TOPOGRAFIA S.A.S **CC/NIT:** 900711631-6

Dirección: CRA 42A No.98-64, BARRANQUILLA **Teléfono:** 3002415576

Fecha recomendada próx. Ajuste: 12/12/2021

Datos del Instrumento

Marca: STONEX **Modelo:** R15 **Serie:** DL11687

Precisión: 2" **Aumento telescopio o Magnificador:** 20X

Ajustes realizados

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Códigos 1. Optimo 2. Corregido o Aplicado 3. No corregido 4. No aplica

Limpieza exterior	2	Plomada óptica o laser	1
Mantenimiento interno	1	Mantenimiento base nivelante	2
Ajuste del compensador	2	Tornillos movimiento lento Hz-V	1
Ajuste nivel tubular y/o circular	2	Chequeo teclado y/o display	1
Ajuste sistema enfoque	1	Ajuste tornillos puntería	2
Ajuste retículo	2	Ajuste distanciómetro	2
Ajuste verticalidad	1	Ajuste infrarrojo o laser con respecto al retículo	2
Ajuste de colimación	2		

Datos logrados en comprobación inicial del instrumento

Referencia	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Residuo	Guía	Error
Horizontal	0°00'00"	180°00'17"	0,0006	0°00'11"	180°00'00"	0°00'00"
Vertical	90°00'00"	269°59'50"	0,0006	0°00'04"	180°00'00"	0°00'00"
Distancia	4,600	18,393	± 0,001	0,005	4,543/18,360	0,001

Ajuste en colimador

Descripción	Tolerancia	Error	Descripción	Tolerancia	Error
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<10"	<5"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5"	<5"	Plomada óptica o láser	<1mm	<1mm
Colimación horizontal	<10"	<5"			

Se ejecutan los procesos de ajuste y pruebas de acuerdo a los parámetros técnicos de precisión establecidos por el fabricante, y que este se encuentre en óptimas condiciones para ejecutar trabajos.
El procedimiento de ajuste y verificación realizado al equipo contará con una garantía de un (1) mes, posterior a la revisión y corrección del error obtenido, previendo que este no se deba a defectos o daños físicos del equipo.
Patrones utilizados: Estación total SOKKIA CX-65 serie YN1801, nivel SOKKIA B40A serie W5059792

Realizó

Andrés Santiago Bolivar
Técnico Especializado

CALLE 68C #65-73, PISO 2 320-4055020
arbsequipostopograficos@gmail.com
ASS_equipos ASS Equipos Topográficos S.A.S
Barranquilla - Atlántico


6670

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

ACTIVDADES DE OBRAS

EXCVACION MECANICA

Se realiza trazado y replanteo de las ZAPATAS Z-32 Z-33- Z-34- Z-35 Z -36
Se chequea los niveles de diseños corespondiente al proyecto y verificado por la topografia de la interventoria

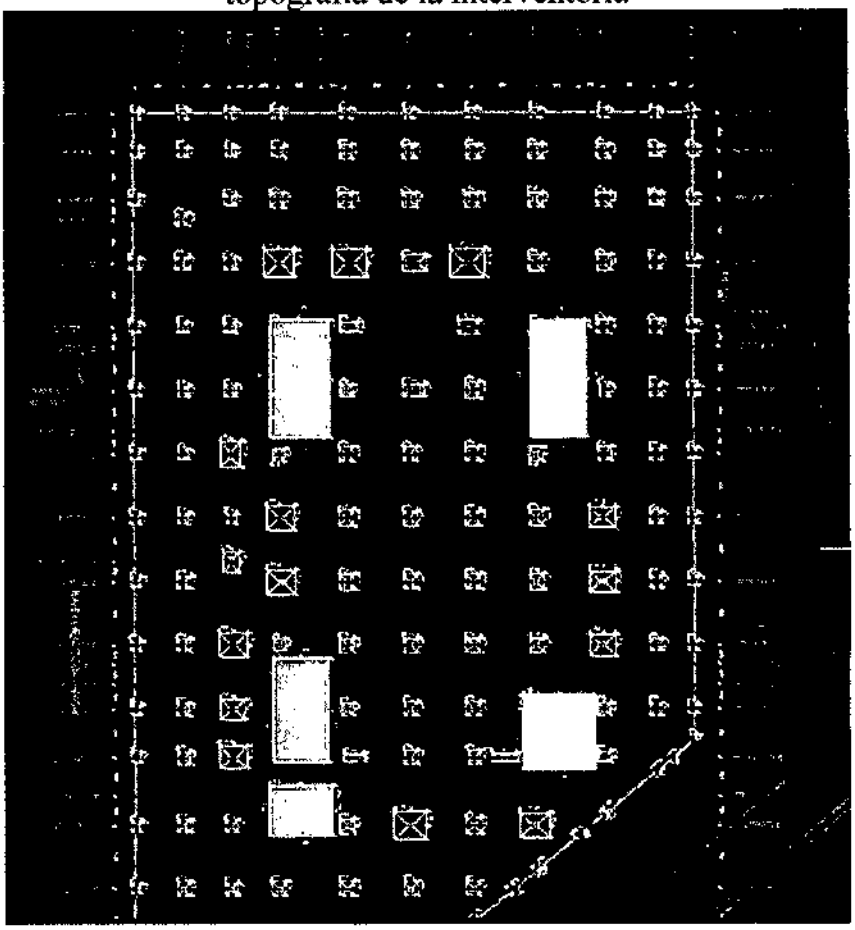


6671

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR






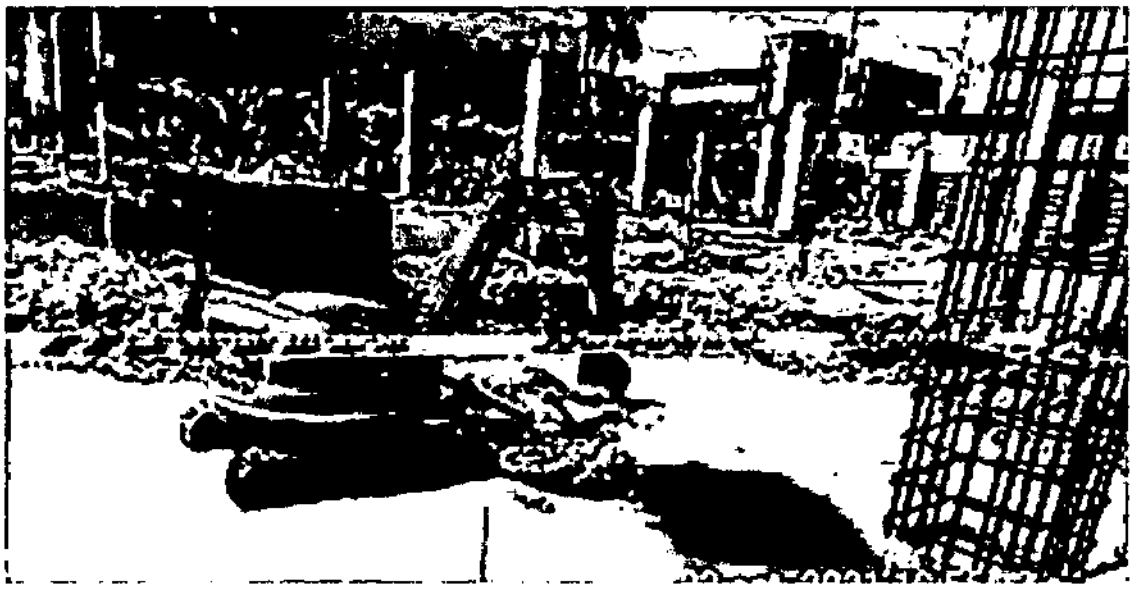

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

FILTROS

Se continua con la instalación de filtros verificando los niveles de diseños y sus cotas correspondiente y entre haciéndole entrega ala interventoría y así se procede con la liberación de los tramos.

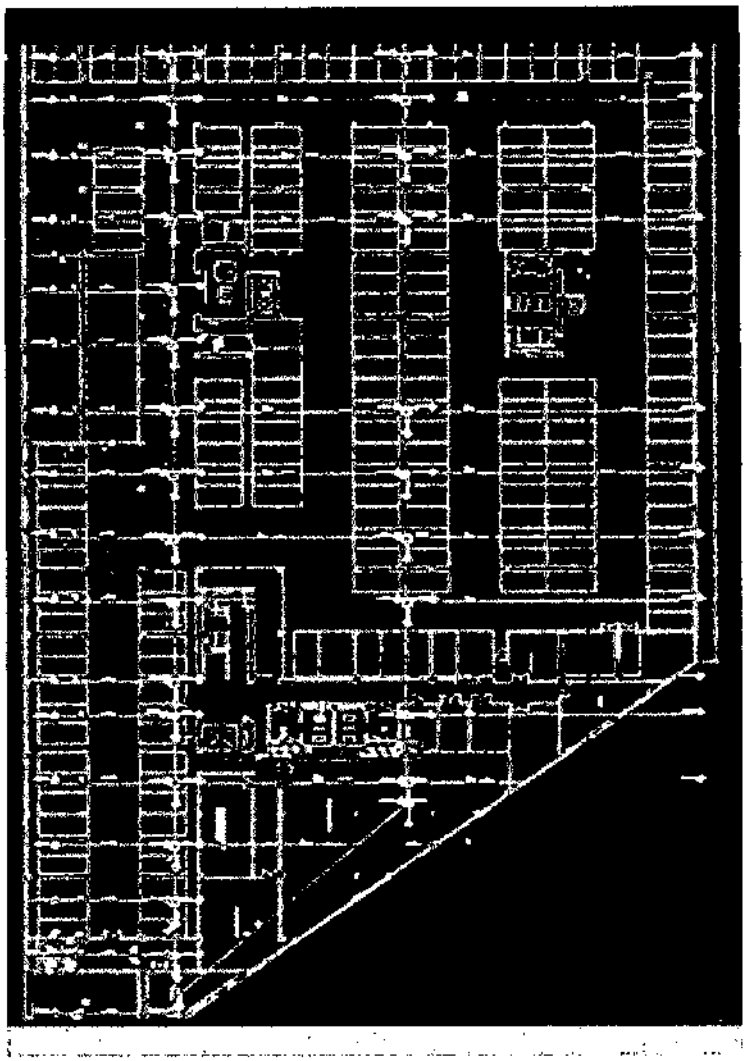

6673

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR






LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

SOLADOS

Se continúa con la instalación de concreto para solado para vigas de los ejes s1 – s2 s3 y verificado niveles de diseños y sus cotas correspondiente y se le hace entrega ala interventoría y así se procede con la liberación de los tramos.

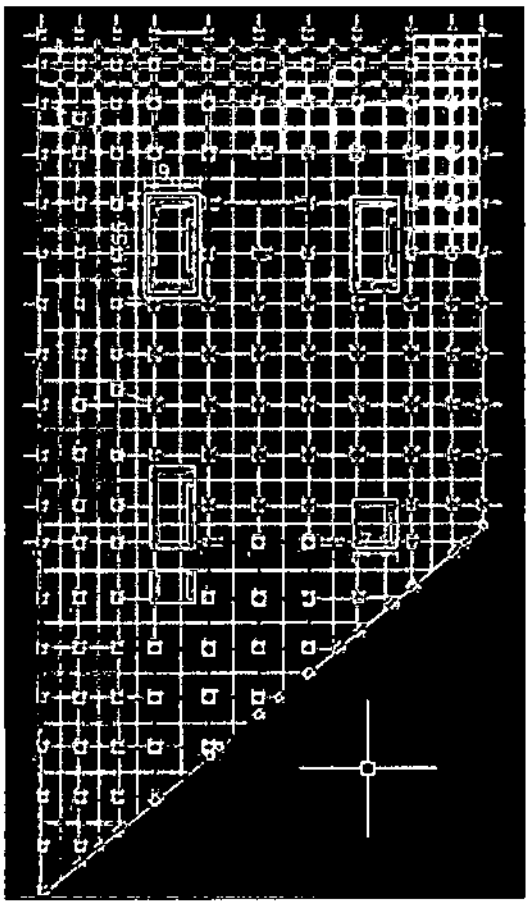

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA VALLEDUPAR – CESAR




6676

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA
VALLEDUPAR – CESAR

MUROS Y COLUMAS Y HACERO DE ZAPATAS

Se revisa la verticalidad y ubicación del hierro de la zapata z-35 que cumpla con su recubrimiento y liberado por interventoría.

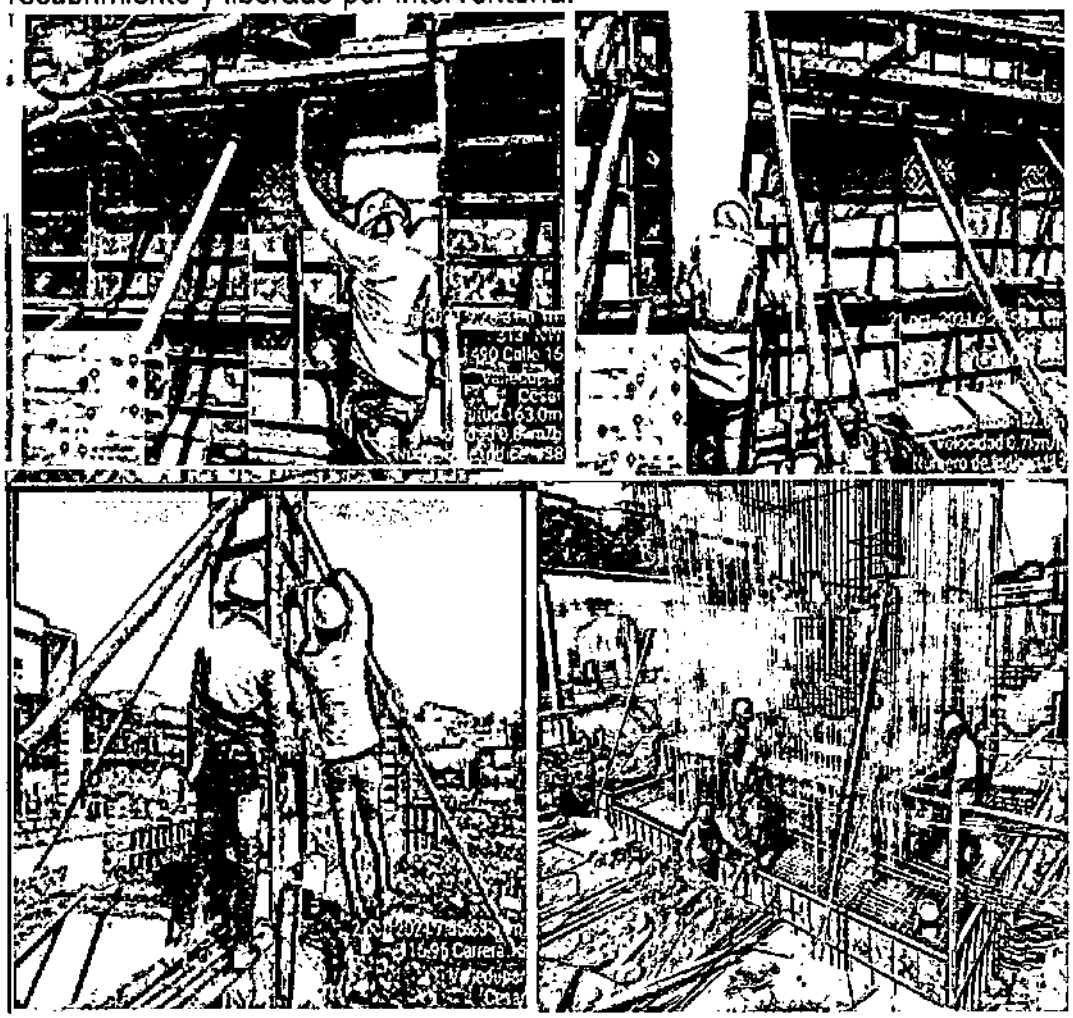

LUIS AFRANIO AMAYA MOJICA
C.C. 1065616361
Topógrafo contratista
A CONSTRUIR S.A.

VoBo. JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHES
C.C. 1.065.580.756
Topógrafo INTEVENTORÍA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
