PROYECTO PERFORACIÓN POZO ESTRATIGRÁFICO PAILITAS 1X



INFORME SEMANAL

27 DE FEBRERO A 05 DE MARZO 2022

UT SERCOMADI

eterritorio
Transformamos Vidas

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

REPORTE DE LA GESTIÓN HS

Durante la semana del 27 de febrero al 05 de marzo de 2022, la gestión HS estuvo en marcada principalmente en el avance documental, acompañamiento, seguimiento y apoyo durante la actividad de perforación.


Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total Actividades. Gestión
Reuniones de seguimiento	Participación en reunión diaria de seguimiento operacional y de HSE.	Asistencia y participación en reunión Operativa para aseguramiento de actividades	Participación en Reunión Gerencial.	3
Charlas	Durante la semana se realizaron 7 charlas, haciendo énfasis en los riesgos y controles de las actividades a realizar, sumado al proceso de concientización en prevención de accidentes y cumplimiento de las Políticas de HSE	Se realiza refuerzo en Medidas de prevención del Covid-19. y la importancia en el uso obligatorio del tapabocas y lavado de manos.	Divulgaciones de cada uno de los peligros y riesgos en el desarme, izaje de cargas y cargue	3
Gestión documental	Seguimiento y aseguramiento de las actividades relacionadas con Permisos de Trabajo y los soportes, (AR) Análisis de Riesgo.	Seguimiento y verificación a los Pre operacionales, Inspecciones de los equipos y maquinaria	Se continúa realizando la retroalimentación a la Matriz de Tarjetas de Observaciones y reportes de incidentes, actos y condiciones inseguras.	3
Otras actividades	Actividad teórico práctica de primeros, por parte del Medico temas Golpes, Fracturas, primeros auxilios. Sensibilización con el riesgo mecánico por los puntos de atrapamiento en el desmonte del equipo.	Atención a las actividades de desarme de equipo, por izaje de cargas, atrapamientos, golpes o resbalones.	Entrega de EPP correspondiente a la actividad a desarrollar.	3
Otras actividades	Briefing al personal de conductores y operadores de equipos a movilizar.	Aseguramiento y apoyo a los vehículos durante la movilización por el Centro Poblado de Guamal Magdalena. Control de PARE/SIGA.	Aseguramiento de la actividad de desarme del equipo en general.	3

INDICADORES HS

Relación Promedio de personal y vehículos.

CONTROL PROMEDIO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS SEMANA 27 FEBRERO A 05 MARZO 2022						
DEPARTAMENTO	**PERSONAL STAFF**	**PERSONAL CALIFICADO**	**PERSONAL NO CALIFICADO**	**VEHÍCULOS**	**ÁREA**	**PERSONAL SUBCONTRATISTA**
	Día	**Día**	**Día**	**Día**		**Día**
Director del Proyecto	1	0	0	0	Conductores	0
Ingeniero de Operaciones / Asistente COMAN	1	0	0	0	Estudio Ambiental	0
Gestión Ambiental (Campo)	1	0	0	0	Vigilancia	3
Gestión Social (Campo)	1	0	0	0	Casino	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	0	0	0	Halliburton (Brocas)	0
Interventoría	3	0	0	1	Weatherford (Direccional)	0
Conductores	0	9	0	0	Baker (Control Sólidos y osmosis)	0
Obras Civiles	0	0	0	0	Exlog (Unidad Geológica)	0
Perforación	0	7	2	2	Halliburton (Lodos)	0
Administrativos	1	1	0	1	CYCO SERVICES	0
Médico	1	0	0	0	CPVEN (Cementación)	0
Visitas / Otros (Campo)	0	0	0	0	Halliburton (Registros))	0
	0	0	0	0	C&CO (Coring)	0
	0	0	0	0	TRyRS	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**7**	**17**	**2**	**3**	**TOTAL**	**3**
TOTAL	**10**	**17**	**2**	**4**	**TOTAL, PERSONAL PROYECTO**	**32**


Relación de personal y vehículos.

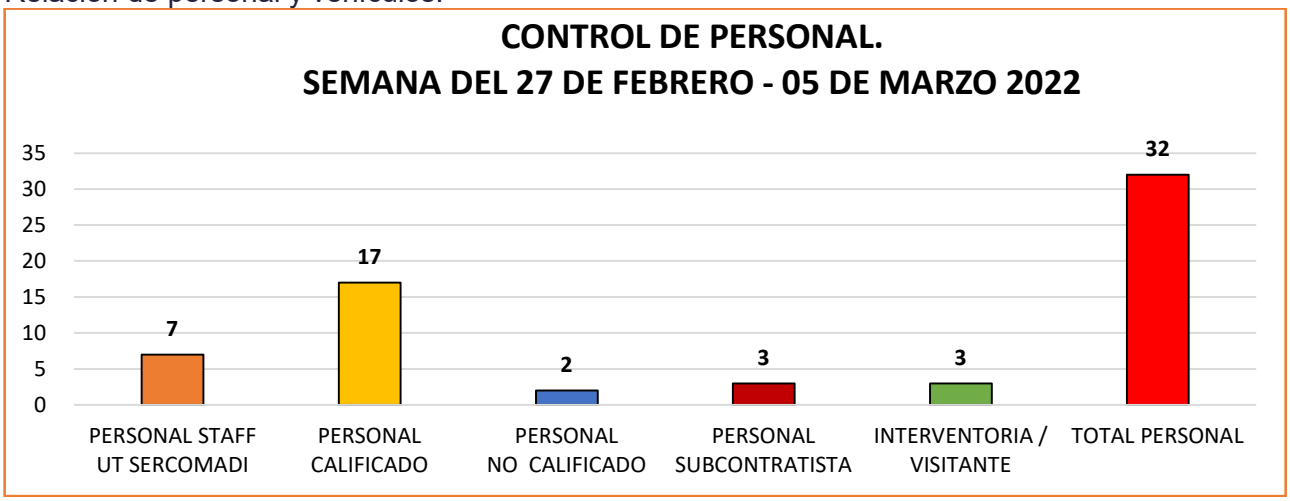

Relación de Charlas 5 Minutos.

RELACIÓN DE CHARLAS SEMANA DEL 27 DE FEBRERO A 05 MARZO 2022				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
1	Movilización de equipos. Cuidado en la movilización Riesgos eléctricos. Riesgos de Atrapamiento. Golpe de calor Hidratación	27/02/2022	0:15:00	29
2	Desarme de Equipo. Atención a los equipos en movimiento por izaje de cargas, atrapamientos, caídas y golpes.	28/02/2022	0:15:00	19
3	Uso apropiado de Herramientas. – Atención a los Izajes de cargas. – Prevención de golpes en manos y pies. – Hidratación prevención de Golpe de Calor.	1/03/2022	0:15:00	17
4	Resbalones y caídas, terrenos con desniveles.	2/03/2022	0:15:00	10
5	Izaje de cargas, prevención de caídas, atrapamientos, por terrenos resbalosos.	3/03/2022	0:15:00	12
6	Izaje de cargas, cuidado de manos, uso apropiado de EPP	4/03/2022	0:15:00	12
7	Desmovilización, manejo de cargas por el municipio de Guamal, prevención de accidentes, uso de señalizadores viales y pertiguero.	5/03/2022	0:15:00	12
TOTAL			**1:45:00**	**111**

Charlas / Capacitación HSEQ

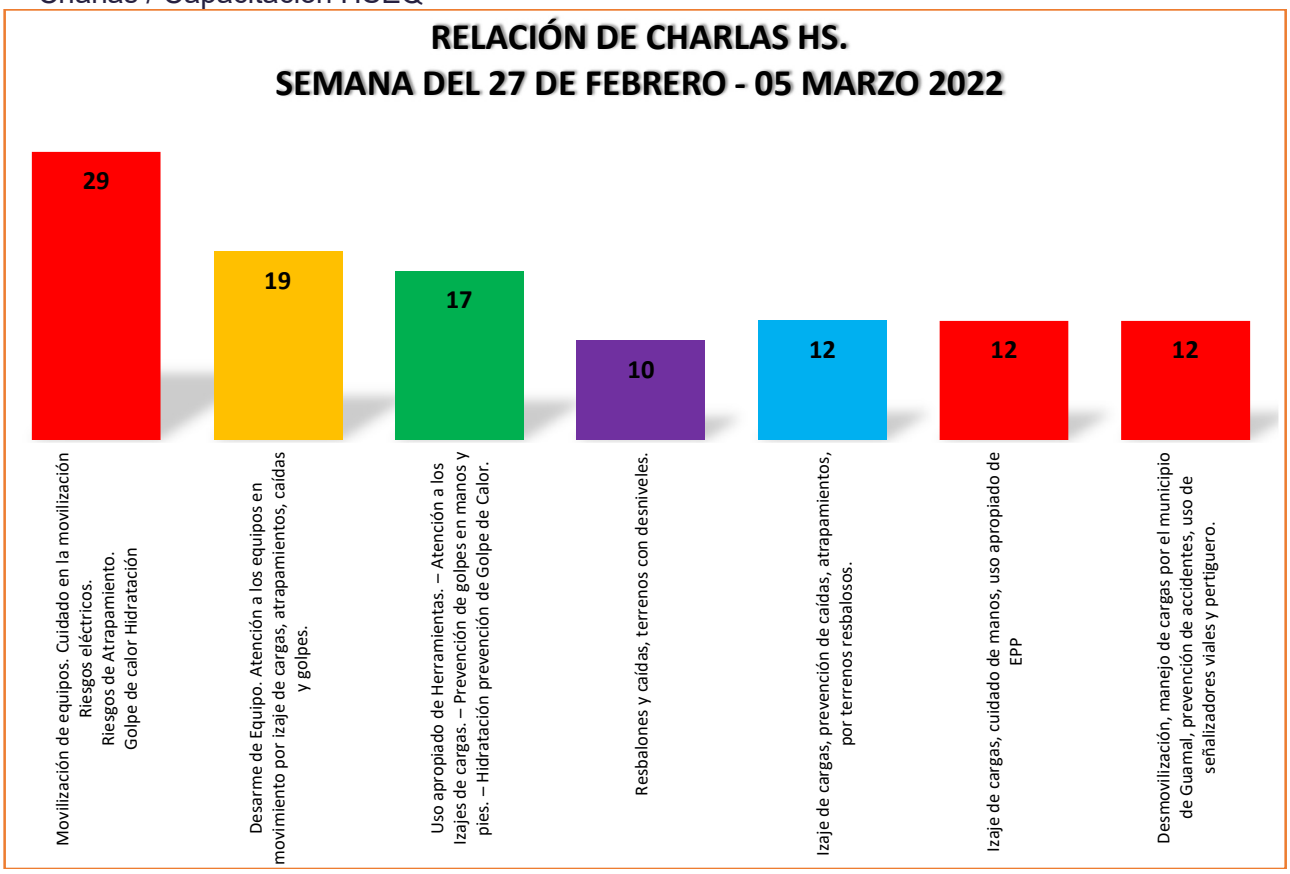

Relación de Estadísticas de HS.

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE SEMANA DEL 27 DE FEBRERO - 05 MARZO 2022								
DIA	**27**	**28**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**CANTIDAD**
CHARLAS HSE	1	1	1	1	1	1	1	**7**
BRIEFING HSE	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INDUCCIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INDUCCIÓN ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INSPECCIONES	0	0	0	0	0	0	0	**0**
REUNIONES	0	1	0	0	0	1	0	**2**
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PERMISOS DE TRABAJO	6	6	6	6	6	6	6	**6**
ALCOHOLIMETRIAS	22	22	17	15	10	12	10	**108**
ALCOHOLIMETRIAS POSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AUDITORIAS	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANÁLISIS DE RIESGO	6	6	6	6	6	6	6	**6**


Relación de Estadísticas de HS.



Relación de Estadísticas Acumulados de HS

RELACIÓN ESTADISTICAS HS / SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2022								
DIA	**27**	**28**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**CANTIDAD**
H/H EXPOSICIÓN H/H EXPOSICIÓN SIN LT	352	304	232	224	256	288	256	1912
H/H acumulado	127836	128140	128372	128596	128852	129140	129396	129396
KM. RECORRIDOS	220	220	180	198	180	665	480	2143
Km acumulado	92906	93126	93306	93504	93684	94349	94829	93684


Relación de Estadísticas Acumulados de HS

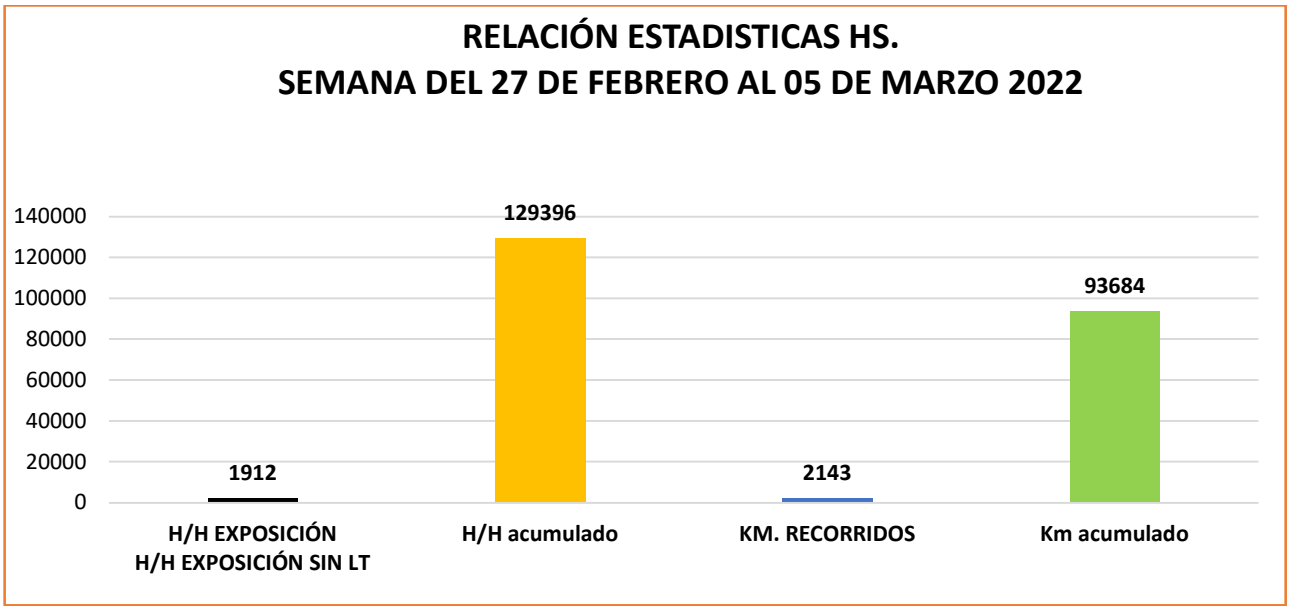

Relación de Estadísticas Acumulados de HS.

INDICADORES – ACCIDENTALIDAD SEMANA DEL 27 DE FEBRERO A 02 MARZO 2022	VALORES
Accidentes de trabajo	0
Accidentes mortales	0
Enfermedades Laborales	0
Días perdidos por accidentes de trabajo	0
Días perdidos por Enfermedad Laboral	0
Índice de Frecuencia	0
Índice de Severidad	0
ILI	0
Índice de Mortalidad	0
Índice de Prevalencia de Enfermedad laboral	0
Índice de Incidencia de Enfermedad laboral	0
Tasa de Ausentismo	0

Relación de Estadísticas Acumulados de HS.

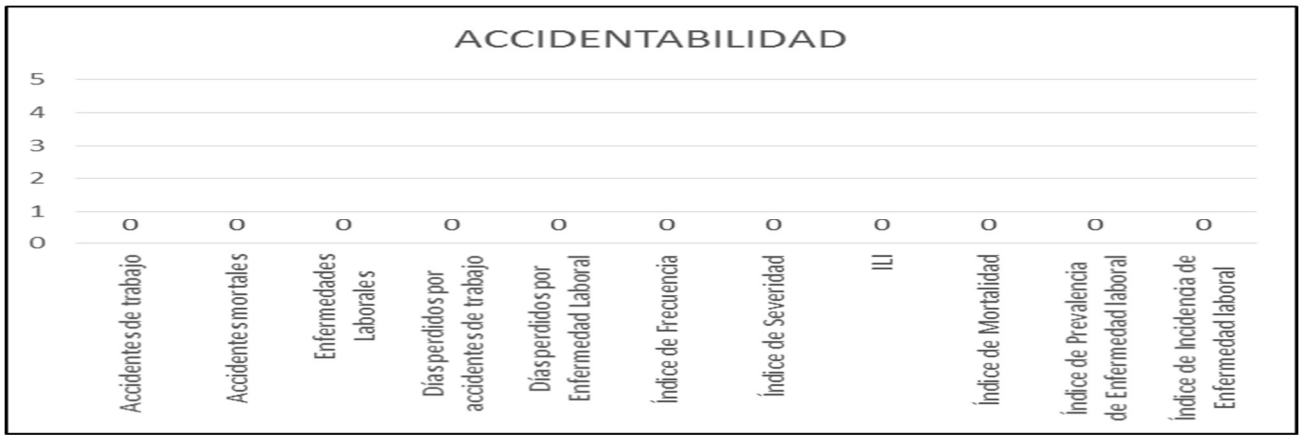

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN HS





Jornada de Orden y Aseo





Retiro y recolección de Geomembrana. - Manejo de equipos, orden de cada uno de los mismos.



Charla PreTurno Tema: Riesgos en la Movilización, Riesgos Eléctricos. – Riesgos de Atrapamiento. – golpes de calor, hidratación.



Labores de apoyo e identificación de Izaje de cargas, prevención de accidentes.









Movilización de cargas y equipos









Movilización de cargas y equipos

REPORTE DE LA GESTION AMBIENTAL

Durante la semana del 27 de febrero al 5 de Marzo de 2022, la gestión ambiental del proyecto se desarrolló en el seguimiento a las actividades de la etapa de desmantelamiento, recuperación y abandono.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Actividades de Gestión
Seguimiento Fichas de manejo	Verificación cumplimiento de las actividades de desmantelamiento. Retiro de equipos y estructuras del taladro, contenedores del campamento, Verificación de retiro de rejillas, skimmer perimetral e interno, geomembranas de cuencas perimetrales y de diques de contención.	Verificación diaria de cumplimiento del manejo de residuos sólidos y líquidos, realizándose una disposición adecuada. Verificación y aseguramiento de áreas desmanteladas.,	Verificación manejo de lodos y cortes de perforación realizándose una disposición adecuada. Cierre de pozo de acuerdo a lineamientos establecidos.	3 3
Seguimiento a la gestión de Proveedores y Gestores Ambientales	Se realiza el aseguramiento en la recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos por parte del gestor autorizado Geoaseo SAS ESP. Solicitud a la firma MCS la premura de entrega de informe de los monitoreos a las aguas superficiales y subterráneas.	Se realiza la recolección, transporte y disposición de cortes de perforación con el gestor externo Geoambiental S.A.S. contando con los manifiestos de transporte respectivos,	Se realiza seguimiento pago a proveedores de servicios ambientales. Solicitud de paz y salvos de gestores externos.	3 2

BALANCES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO

A continuación, se referencia el cumplimiento a la gestión ambiental de las fichas de manejo ambiental establecidas en el PGA conforme al avance de las etapas del Proyecto

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO
Programa de manejo de las actividades constructivas	Movilización de Vehículos, Maquinaria y Equipos Pesados	PGA-1	100%
	Adecuación del sitio de perforación	PGA-2	100%
Programa de manejo del suelo	Remoción de la Cobertura Vegetal y el Descapote	PGA-3	100%
	Fauna Silvestre	PGA-4	100%
	Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	PGA-5	100%
	Manejo residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales	PGA-6	100%
	Resíduos Líquidos Domésticos e Industriales	PGA-7	100%
	Materiales Radiactivos	PGA-8	100%
	Lodos de Perforación	PGA-9	100%
	Desmantelamiento y Abandono	PGA-10	65%
	Revegetalización de Áreas Intervenidas.	PGA-11	10%
Programa de manejo del recurso hídrico	Manejo de aguas superficiales	PGA-12	100%
	Manejo de aguas subterráneas	PGA-13	100%
Programa de manejo del recurso aire	Manejo de fuentes de emisiones y ruido	PGA-14	100%

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO
Programa de Seguimiento a la Gestión Ambiental	Seguimiento a la Protección del Recurso Hídrico	PSM-1	100%
	Seguimiento a la gestión de residuos sólidos y líquidos	PSM-2	100%
	Seguimiento a las emisiones atmosféricas y ruido	PSM-3	100%
	Seguimiento al programa de gestión de fauna y flora	PSM-4	100%
	Seguimiento a la revegetalización	PSM-5	0%

BALANCE GENERAL AMBIENTAL

En el transcurso de la semana del 27 febrero al 5 de marzo de 2022, se ejecutaron charlas ambientales en cumplimiento al PGA sobre: PGA-10 Desmantelamiento y Abandono y PSM-4 Seguimiento al Programa de Gestión de la fauna y la flora,. Asistencia y participación en reuniones operativas. Se continuó con el aseguramiento de la recolección, manejo y clasificación de residuos resultantes de las diferentes áreas de la locación. Gestiones para garantizar la premura de entrega del informe de monitoreos de agua superficial y subterránea. Se efectuó seguimiento del riego en la vía en acuerdo de colaboración con la Alcaldía Municipal de Guamal, debido a fuertes lluvias presentadas durante la semana se realizaron dos días de riego en horas de la mañana y un riego en horas de la tarde. Se realizó la verificación y aseguramiento ambiental de las actividades de desmantelamiento. Se efectuaron jornadas de Orden y Aseo en locación, realizando el aseguramiento de las áreas de desmantelamiento. Se gestionaron órdenes de servicio para gestores externos de servicios ambientales. Desarrollo de cotizaciones de insumos para la revegetalización. Se concluyeron los retiros de centro de acopio de residuos sólidos, de skimmer de cuneta perimetral e interno, parrillas, rejillas, geomembranas de cunetas perimetrales y diques de contención, postes de cemento y alambre de púas al lado perimetral para su posterior entrega al dueño de predio. Se desarrolla el movimiento de remoción de tierra para relleno de áreas de skimmer perimetral e interno y cunetas.


A continuación, el balance general de la semana:

RESIDUOS	27/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	05/03/2022	TOTAL
Aprovechable (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
No Aprovechables (kg)	0	510	0	0	0	0	0	510
Residuos contaminados (kg)	0	153	0	0	0	0	0	153
Residuos Organicos (kg)	0	260	0	0	0	0	0	260
Cortes de Perforación (Bbls)	0	140	0	0	0	140	210	490
Residuos Líquidos domésticos (m3)	0	0	0	0	35	0	0	35
Residuos Líquidos industriales (m3)	0	0	0	0	0	35	0	35
Desechos de cementación (Bbls)	0	0	0	0	0	0	0	0

CHARLAS AMBIENTALES	27/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	05/03/2022	TOTAL
Cantidad	0	0	1	0	0	0	1	2
No. personas	0	0	12	0	0	0	11	23
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción ambiental	27/02/2022	28/02/2022	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022	04/03/2022	05/03/2022	TOTAL
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes ambientales	0	0	0	0	0	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se evidencia la gestión ambiental adelantada durante la semana del 27 de febrero al 5 de marzo de 2022 mediante registro fotográfico,

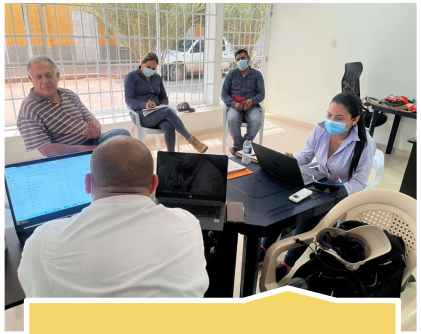

Reunión con interventoría revisión entregables de cierre



Recorridos en acompañamiento de la interventoría en la locación, efecutando la verificación y aseguramiento de las áreas desmanteladas.



Jornadas de Orden y Aseo



Riego en la vía en acuerdo de colaboración con Alcaldía de Guamal, Magdalena



Retiro de cortes de perforación para su respectiva disposición final



Retiro de geomembranas



Remoción de tierra para relleno de cuentas perimetrales.



Sensibilización al personal en etapa de desmantelamiento.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- ✓ Acompañamiento y aseguramiento ambiental en actividades de desmantelamiento.
- ✓ Cumplimiento de las fichas del PGA aplicables a la etapa de desmantelamiento.
- ✓ Gestión externa de residuos sólidos y líquidos con Geoaseo E.S.P.
- ✓ Jornadas de orden y aseo en el área de la plataforma.
- ✓ Gestión externa, transporte y manejo de cortes de perforación con Geoambiental.
- ✓ Charlas sobre temas ambientales al personal que permanece en etapa de desmantelamiento.
- ✓ Cotización de elementos y equipos necesarios para las actividades de reconformación y revegetalización.
- ✓ Desarrollo de acta de entrega de predio en compañía de interventoría.

REPORTE DE LA GESTIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Durante la semana se inició con terminación de contratos de Personal en la etapa de perforación: Total 26 trabajadores.

RETIROS DE PERSONAL		
CANTIDAD	**CARGO**	**PROCEDENCIA**
3	Cuñeros	Externo
1	Encuellador	Externo
1	Aceitero	Local
6	Obrero de patio	Local
2	Chef	Externo
1	Panadeo-Lonchero	Externo
1	Bodeguero	Externo
1	Cocinera	Local
2	Auxiliares de cocina	Local
2	Meseras	Local
2	Lavanderas	Local
2	Camareras	Local
2	Stewart	Local


PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES DE INTERES ISQR

ISQR ABIERTAS:

- ISQR 48. 07-02-2022. El señor José Rangel envía una queja formal, vía correo electrónico, dirigida a la interventoría, con copia a UT-Sercomadi, manifestando los siguiente: """"Que la compañía GEOASEO nos adeuda por servicios, que realizamos desde el mes de diciembre , enero y el día 03 de febrero nos envía un comunicado, donde pone parámetros de facturación ya terminado la operación, lo que veo es que nos quieren dilatar los pagos quiere decir que hacemos los servicios facturamos mes vencido y se demoran 60 días para realizar el pago, entonces nos cancelaran en los meses de marzo y abril y ustedes ya se han ido del municipio, porque está operación ya se acabó. y quién nos asegura que esta empresa nos cancele"
16-02-22: Se realizó seguimiento, obteniendo información por parte del señor José Rangel, manifestando que recibió por parte de GEOASEO los pagos correspondientes.
24-02-22: UT SERCOMADI envía respuesta y soportes respectivos a la QUEJA en contra de la empresa GEOASEO SAS ESP, presentada por el Sr. José Luis Rangel, representante legal de la empresa local Guamal Express S.A.S, por supuestas anomalías en la prestación del servicio de

transporte de agua para el proyecto. (Respuesta enviada a Director de Interventoría) Estado: Seguimiento

-ISQR 51. 04-03-2022: El grupo de mujeres del proyecto productivo, programa de formación Modistería Básica, con el fin de impulsar el emprendimiento en las mujeres del corregimiento de los Andes. Solicitan colaboración a ENTerritorio y UT SERCOMADI, para adquirir materia prima (telas), como aporte al desarrollo al proyecto de emprendimiento de modistería.

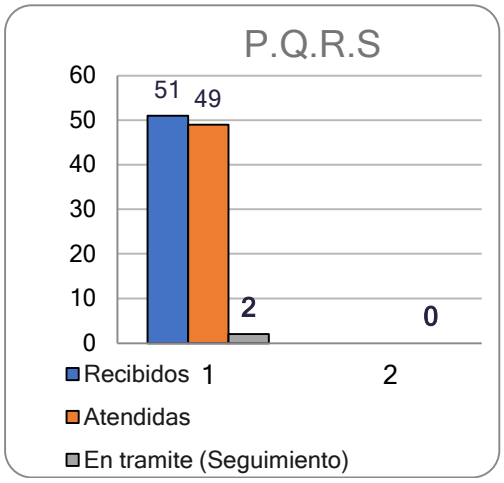

INVERSIÓN SOCIAL

-Entrega donación por parte de la UT SERCOMADI de (3) tres escritorios de oficina y 3 sillas ergonómicas de oficina, propiedad de la UT SERCOMADI, (1) una silla y (1) un escritorio para la escuela San Jan de Dios-KM14, (1) una silla y (1) un escritorio para corregimiento los Andes, (1) una silla y (1) un escritorio para la escuela del corregimiento San José de Paraco del Proyecto Perforación Pozo Estratigráfico ANH-PAILITAS-1-X.

-Atendiendo las indicaciones y sugerencia de la Supervisora de ENTerritorio e Interventoría Social, referente con algunas anomalidades identificadas en la madera del mesón de corte de confecciones que hace parte de la unidad productiva entregada el 27/02/2022 en el marco del proyecto productivo de emprendimiento de Modistería Básica en el Corregimiento de los Andes, el día de hoy 17/02/2022 se realizó visita con un delegado del proveedor contratado Almacén El Pueblo, la cual fue atendida por algunas mujeres beneficiadas del proyecto; con el fin verificar el estado de la mesa de corte y tomar acciones al respecto. Concluyendo que el proveedor hará el cambio de mesa y será entregada la siguiente semana.
El día 02/03/2022, el proveedor entregó mesón de corte de confecciones nueva, cumpliendo con la garantía exigida; las cuales recibieron el nuevo mesón de corte de confecciones a satisfacción.

- Seguimiento a los Proyectos productivos de porcicultura:

Vereda Sabanas de Marañón, se encuentra reubicada la nueva porqueriza, la cual quedo en óptimas condiciones, los porcinos se encuentran en buen estado y adaptados al nuevo ambiente.

Corregimiento San José de Paraco, los porcinos se encuentran en buen estado y adaptados al nuevo ambiente.

-Se realizó seguimiento a la entrega por parte del proveedor, maquinas parque biosaludable, para el mejoramiento de escenarios deportivos del Corregimiento los Andes. El contratista manifestó como fecha tentativa inicialmente que si no se presenta ningún contratiempo, quedarían instaladas entre el 03 y 04 de marzo 2022. Seguidamente se continuó con la instalación de bases para empotrar los biosaludables, el contratista informa que se deben esperar 6 días para el secado de las bases, ya que las maquinas son muy pesadas. Está pendiente la instalación de los tableros de baloncesto, por lo tanto, se reprograma nuevamente la fecha de entrega para el 11-03-2022.

BIENES Y SERVICIOS

En esta semana se realizaron lo siguientes pagos a proveedores de la zona:

NIT DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	TIPO DE SERVICIO	CIUDAD O MUNICIPIO DE ORIGEN DEL PROVEEDOR	DEPARTAMENTO ORIGEN DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR TOTAL DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
53068627	HEREDIA GARCIA MONICA TATIANA	ARREDAMIENTO DE LOCAL 27 ENE AL 27 FEB	GUAMAL	MAGDALENA	DE02207	$ 500.000
85161411	OSPINO ORTIZ JOSE MARIA	ARRENDAMIENTO LOCAL AREA ADICIONAL	GUAMAL	MAGDALENA	DE02208	$ 3.863.969
85161411	OSPINO ORTIZ JOSE MARIA	TPTE DE MATERIAL PARA REVEGETALIZACION	GUAMAL	MAGDALENA	DE02209	$ 50.000.000
12580350	PALOMINO FLORIAN EXIFREDO	COMPRA DE VERDURAS PARA CASINO	GUAMAL	MAGDALENA	0262-22	$ 1.079.474
5039151	TOLOZA CARDENAS GABRIEL	SERV TPRE 21.23,25 Y 28 FEB	GUAMAL	MAGDALENA	436-22	$ 4.708.800
830506751	DISTRITODO VS SAS	1 AGUANEGRA, 4 TUBO SANI	GUAMAL	MAGDALENA	3239-22	$ 366.998
1102825986	GUTIERREZ BARRIOS MARLON	SERV DE ACOMPAÑAMIENTO CON PERTIGA	GUAMAL	MAGDALENA	DE02215	$ 118.800
85165030	ARRIETA GUERRA BENITO	SERV DE PUBLICIDAD 25 AL 23 FEB	GUAMAL	MAGDALENA	DE02217	$ 497.550
35542354	ALFARO VILLAREAL MARLA	40 BOTELON DE AGUA, 2 AGUA BOTELLA	GUAMAL	MAGDALENA	DE02218	$ 727.323
901545991	GUAMAL SERVICES	SERVICIO DE ALIMENTACION 09/02 AL 24/02	GUAMAL	MAGDALENA	00024-22	$ 8.109.860
85272437	MARTINEZ ACOSTTA CARLOS	SUMINISTRO DE CARNES	GUAMAL	MAGDALENA	003-22	$ 1.444.450
36642354	ALFARO VILLAREAL MARLA	50 BOTELLONES 18,9L	GUAMAL	MAGDALENA	DE02219	$ 719.925
36642354	ALFARO VILLAREAL MARLA	240 AGUA EN BOLSA	GUAMAL	MAGDALENA	DE02220	$ 944.542
					Total febrero	**73.081.691**

OTRAS ACTIVIDADES

-Se realizó el scanner de las actas de entregas parciales y finales de los proyectos de inversión social, proyecto de emprendimientos de mujeres de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón, Corregimiento de San José de Paraco, Los Andes y Alcaldía de Municipal. (Soportes enviados a Interventoría Social para revisión.), quedando pendiente el acta de entrega final del Mejoramiento del Parque y otros escenarios Deportivos en el Corregimiento de Los Andes.
-Se entregó el informe mensual de febrero aprobado por interventoría.
-En desarrollo índice dossier.
-en desarrollo consolidado estado actual de los programas sociales

Actividades Programadas / Compromisos

* Monitoreo de Entorno áreas de influencia directa e indirecta.
*Seguimiento a los Proyectos de Inversión Social entregados a las comunidades de áreas de influencia directa.
* Seguimiento a ISQR.
*Participación en la reunión de seguimiento semanal con Interventoría - ENTerritorio
* Organización documental de Gestión Social.
* Entrega Final del Proyecto de Inversión Social con el Corregimiento de los Andes.
* Seguimiento a la consecución de los Paz y Salvos de Proveedores de Inversión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTION SOCIAL

			
Foto No. 1	Fecha: 28/02/2022 Lugar: Proveedor Banco Magdalena. Actividad: Seguimiento proveedor, para cumplimiento garantía mesa de confección proyecto productivo de emprendimiento de mujeres (Modistería), de la comunidad de los Andes.	Foto No. 2	Fecha: 01/03/2022 Lugar: Escuela San José de Paraco, San juan de Dios, Los Andes. Actividad: Entrega donación por parte de SERCOMADI, escritorios de oficina y sillas ergonómicas de oficina, escuela San Jan de Dios-KM14, corregimiento los Andes, escuela del corregimiento San José de Paraco.

			
Foto No. 3	Fecha: 01/03/2022 Lugar: Corregimiento los Andes. Actividad: Seguimiento proveedor, para cumplimiento garantía mesa de confección proyecto productivo de emprendimiento de mujeres (Modistería), de la comunidad de los Andes. Se realiza cabio de mesa.	Foto No. 4	Fecha: 02/03/2022 Lugar: Corregimiento los Andes. Actividad: Seguimiento entrega por parte del proveedor, maquinas parque biosaludable, para el mejoramiento de escenarios deportivos del Corregimiento los Andes.


	

Foto No. 5	Fecha: 02/03/2022 Lugar: Corregimiento los Andes. Actividad: Seguimiento proveedor, para cumplimiento garantía mesa de confección. Entrega cambio de mesa reciben a satisfacción.	Foto No. 6	Fecha: 03/03/2022 Lugar: Sabanas de Marañón Actividad: Seguimiento Proyecto productivo Porcícola, Sabanas de Marañón

 			
Foto No. 7	Fecha: 03/03/2022 Lugar: San José de Paraco Actividad: Seguimiento Proyecto productivo Porcícola, San José de Paraco	Foto No. 8	Fecha: 03/03/2022 Lugar: Ferretodo Actividad: Revisión de matriz contra las facturas parciales por parte del área administrativa Sercomadi, proveedor ferrotodo y el Ing. David Surmay, en seguimiento PIS del Corregimiento los Andes.

 			
Foto No. 9	Fecha: 04/03/2022 Lugar: Corregimiento los Andes Actividad: Seguimiento entrega, maquinas parque biosaludable, para el mejoramiento de escenarios deportivos del Corregimiento los Andes.	Foto No. 10	Fecha: 05/03/2022 Lugar: Corregimiento los Andes Actividad: Seguimiento entrega, maquinas parque biosaludable, para el mejoramiento de escenarios deportivos del Corregimiento los Andes.

REPORTE DE AVANCE DE ANALISIS DE NUCLEOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Se entregó a la interventoría el primer set de datos correspondiente a los cores 1 al 15 (708,90 pies) para su revisión.

Se terminó el procesamiento inicial de tomografía para todo el núcleo y en versión final para 708.90 pies. Se realizó corte longitudinal hasta el core 29 (1391,25 pies) En fotografía se han adquirido imágenes hasta el core 24 (1155,25 pies) de los cuales 1074,85 pies (core 22) han sido editados.

Avance de análisis por actividades

4 DE MARZO	Total Estimado	Ejectutado	Pendiente	Avance
Recepción de Núcleos en Laboratorio	1777,95	1777,95	0	100,0%
Registro Core Gamma	1777,95	1777,95	0	100,0%
Tomografía Escaneo	1777,95	1777,95	0	100,0%
Tomografía Procesamiento Inicial	1777,95	1777,95	0	100,0%
Tomografía Procesamiento Final	1777,95	708,9	1069,05	39,9%
Corte Longitudinal	1777,95	1391,25	386,7	78,3%
Fotografía Digital	1777,95	1155,25	622,7	65,0%
Edición y Montaje Fotografía Digital	1777,95	1074,85	703,1	60,5%
Preservación de Muestras	1777,95	0	1777,95	0,0%
Envío a Litoteca	1777,95	0	1777,95	0,0%

Gráfica de avance general del proyecto

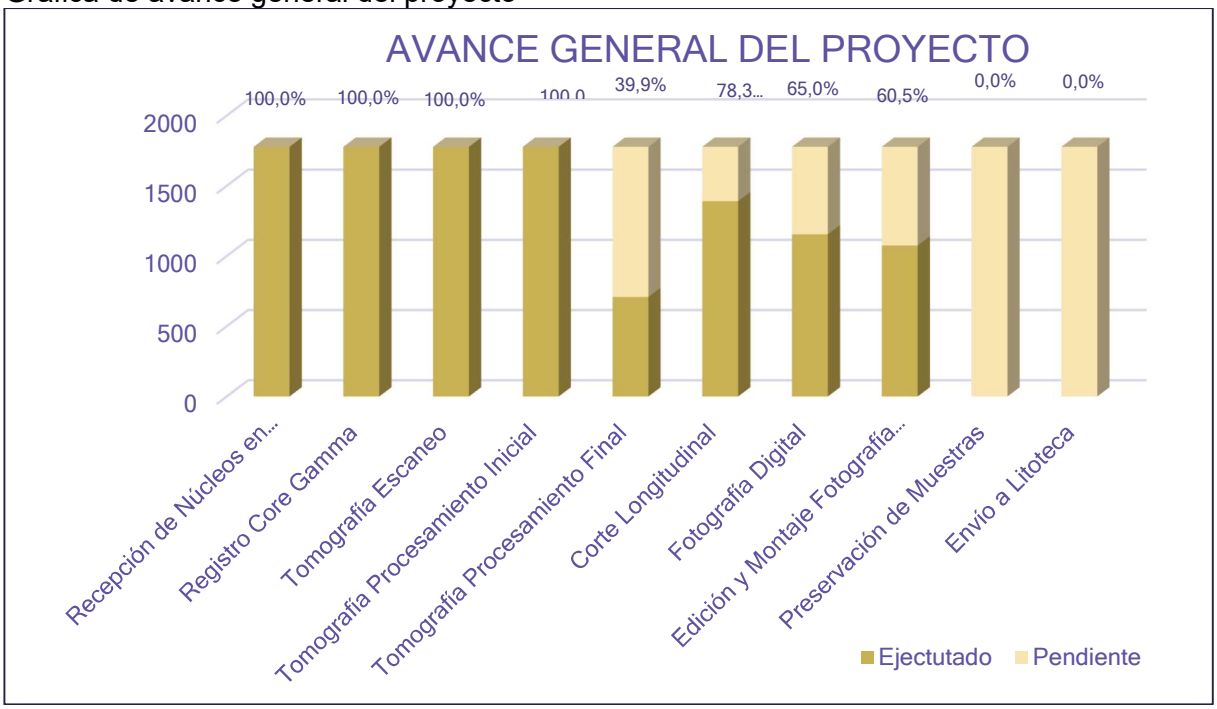

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRÓXIMO CORTE A MARZO

Continuar con las actividades de fotografía y edición de núcleos sobre el núcleo que ha sido cortado. Se espera la espera la revisión de los cores undergage por parte de la interventoría. En espera de revisión de fotografía digital para iniciar proceso de preservación.

REPORTE DE ACTIVIDAD DE DESARME Y MOVILIZACIÓN

Domingo 27/02/2022

Despacho de 4 casetas con destino lote salida Guamal

- Se despinó torre
- Se bajó mesa y se lavó con agua que se encontraba remanente en los silos

-Realizó trasiego de cortes de tanque de Baker a cash tank propio, liberando carga baker

-Guardó reguero de mangueras en trampa

-Personal eléctrico recogió y guardó cables del campamento

Lunes 28/02/2022

Se realizó despacho de las siguientes cargas:

1. Unidad de tratamiento de Baker con destino Villavicencio.
2. Frack Tank.
3. Caseta Company man
4. Caseta Interventoría
5. Bodega de víveres
6. Caseta N°12

- Campamentero realizando desarme de bombas e hidroflow en campamento
- Soldó casetas generador equipo y top drive para viaje
- Retiró e inventarió tanque de retornos
- Bajó consola y tijera de la unidad básica
- Realizó recolección de avisos de seguridad
- Lavó mud board y Viga papa

Martes 01/03/2022

Se realizó despacho de las siguientes cargas:

1. Unidad básica
2. Caseta HSEQ

-Se despinó mesa de viga papá

-Saco y tapo espacio de canecas aguas residuales

-Tumbó tanques de almacenamiento de agua residual a posición de cargue

-Recolectó tableros eléctricos del equipo

-Despegó camisas de comunicación entre los tanques

-Inicio trabajo de reparación de la motoniveladora

Miércoles 02/03/2022

Se realizó despacho de las siguientes cargas:

1. Tanque cisterna azul

-Realizó orden y aseo en locación.
-Recolectó rejillas perimetrales de canaletas placa de cemento
-Cambio de aceite a grúa Link belt
-Registro fotográfico a todas las bodegas del rig.

Jueves 03/03/2022

Se realizó despacho de las siguientes cargas:
1. Caseta generadores Rig
2. Casa del perro + compresores de aire
3.Caseta Unidad Top drive
4. Caseta #11
5. Caseta #15
6. Caseta #2 + tanque de viaje

Equipo y campamento desarmado en totalidad 100%
-Realizó orden y aseo en locación.
-Retiró viga papa y mud board de placa de cemento
-Inventario y aseguramiento de casa del perro y de unidad Top drive
-Continuó con reparación motoniveladora
- Instalación llanta de cargador quedando ambas operativas

Viernes 04/03/2022

Despacho de 19 cargas, campamento movilizado en un 95%. Cargas pendientes: 2 campamento y 23 equipo.

-Realizó orden y aseo en locación.
-Retiro y movilizó skimmers


Sábado 05/03/2022

- Despacho de 11 cargas
-Retiró geomembranas de canales perimetrales y cubrió espacio con trabajo de retro


RELACION DE CARGAS MOVILIZADAS D10

FECHA		CARGA	TIPO	CONDUCTOR	PLACA
27/02/2022	30	Caseta Enfermería	Cama alta	Jesus Herrera	WWA 662
	31	Caseta Asistente CoMan	Cama baja	William Acosta	GYL 032
	32	Caseta Intervenventoría	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	33	Caseta #16	Cama alta	William Acosta	GYL 032
28/02/2022	34	Caseta Company	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	35	Bodega víveres	Cama baja	William Acosta	GYL 032
	36	Caseta Intervenventoría	Cama alta	Jesus Herrera	WWA 662
	37	Frack Tank	Cama alta	Rodrigo Beltrán	VKK 844
	38	Caseta #12	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	39	Unidad de tratamiento Baker	Cama alta	Wilson Carrillo	TRG 285
1/03/2022	40	Unidad básica	Autopropulsada	Emilio Henao	-
	41	Caseta HSEQ	Enganche	Alvaro Alfaro	VKK 872
2/03/2022	42	Cisterna azul	Enganche	Rodrigo Beltrán	VKK 844
3/03/2022	43	Caseta Generadores	Cama alta	Jesus Herrera	WWA 662
	44	Unidad Top drive	Cama alta	William Acosta	GYL 032
	45	Casa del perro + Compresores	Cama alta	Jose Arias	MCC 915
	46	Caseta #2 + tanque de viaje	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	47	Caseta #11	Cama alta	Rodrigo Beltrán	VKK 849
	48	Caseta #15	Cama alta	Dairo Peña	SWO 073
4/03/2022	49	Caseta lavandería	Cama alta	William Acosta	GYL 032
	50	Caseta #19	Cama alta	Jose Arias	MCC 915
	51	Caseta #21	Cama alta	Jesus Herrera	WWA 662
	52	Caseta #5	Cama alta	Rodrigo Beltrán	VKK 844
	53	Caseta #4	Cama alta	Omar Florez	SWN 732
	54	Caseta Quimicos, bebidas, neveras	Cama alta	Dairo Peña	SWO 073
	55	Caseta comedor	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	56	Caseta #3	Cama alta	William Acosta	GYL 032
	57	Caseta #9	Cama alta	Jose Arias	MCC 915
	58	Caseta hall comedor	Cama alta	Jesus Herrera	WWA 662
	59	Caseta Cuarto frío y bodega aguas	Cama alta	Omar Florez	SWN 732
	60	Caseta cocina	Cama alta	Dairo Peña	SWO 073
	61	Generadores campamento	Cama alta	Rodrigo Beltrán	VKK 844
	62	Tanques de agua campamento	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	63	PTAR + Caseta electricos	Cama alta	William Acosta	GYL 032
	64	Tanque agua cruda + planta tratamiento agua	Cama alta	Jose Arias	MCC 915
	65	Bodega campamento + skimmer	Cama alta	Jesus Herrera	WWA 662
	66	Caseta baños + Skimmer	Cama alta	Omar Florez	SWN 732
	67	Caseta pusher + planta estadio	Cama alta	Dairo Peña	SWO 073
5/03/2022	68	Taller soldador + planta estadio	Cama alta	Jose Arias	MCC 915
	69	Container taller mto	Cama alta	William Acosta	WWA 662
	70	Bodega cables + mud board	Cama alta	Jesus Herrera	GYL 032
	71	BodegaS: principal + topdrive/bombas	Cama alta	Omar Florez	SWN 732
	72	Tk agua + Tk ACPM	Cama alta	Dairo Peña	SWO 073
	73	Tk agua + Tijera	Cama alta	Alvaro Alfaro	VKK 872
	74	Tk agua + caseta reflectores	Cama alta	Rodrigo Beltrán	VKK 844
	75	Subestructura	Cama alta	Edinson Bautista	SUK 322
	76	Tanque acpm + shut basuras	Cama alta	Omar Florez	SWN 732
	77	Viga papa	Cama alta	William Acosta	WWA 662
	78	Alerones y escaleras mesa	Cama alta	Rodrigo Beltrán	VKK 844


AVANCE MOVILIZACION CARGAS PROPIAS

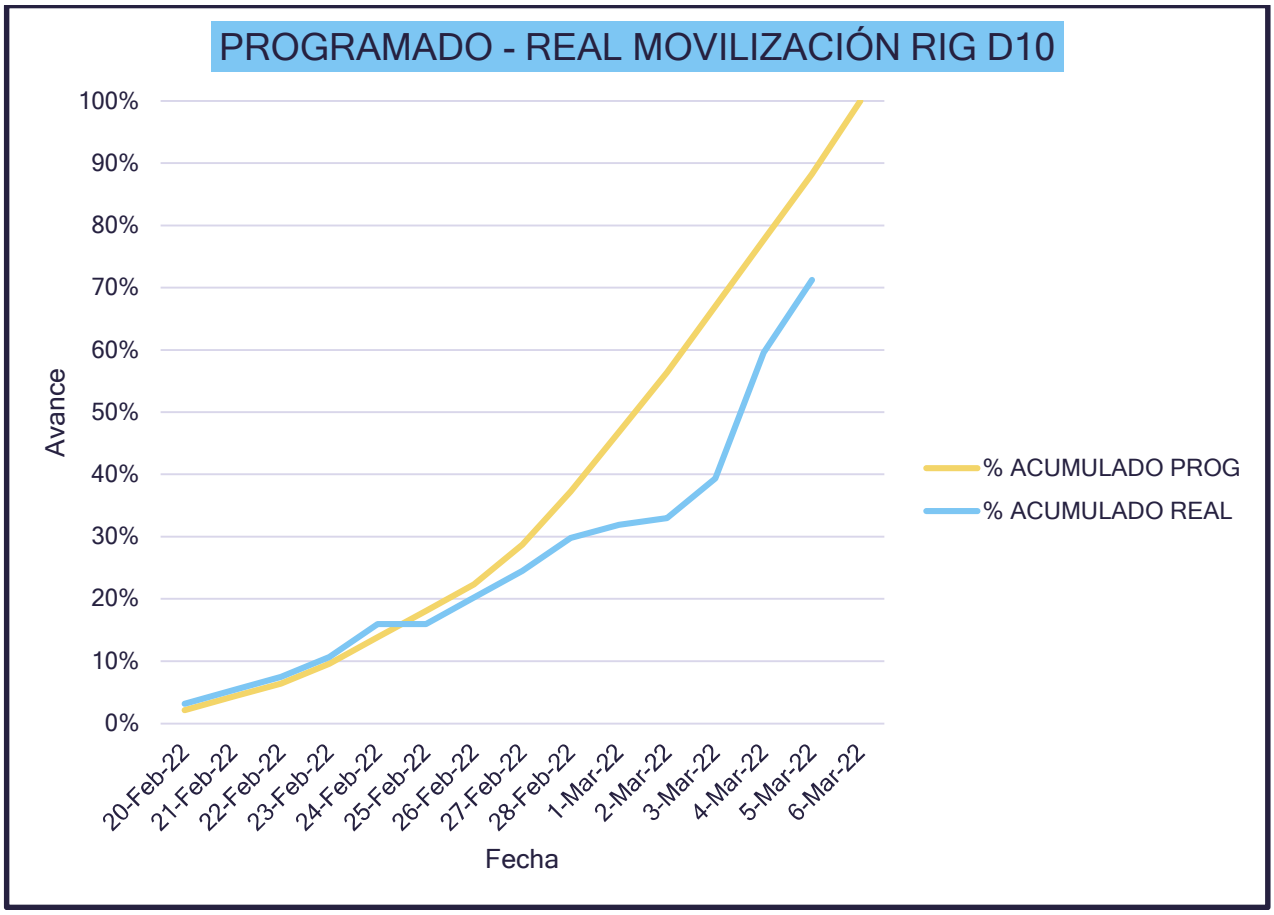


AVANCE MOVILIZACION TERCERAS COMPAÑIAS

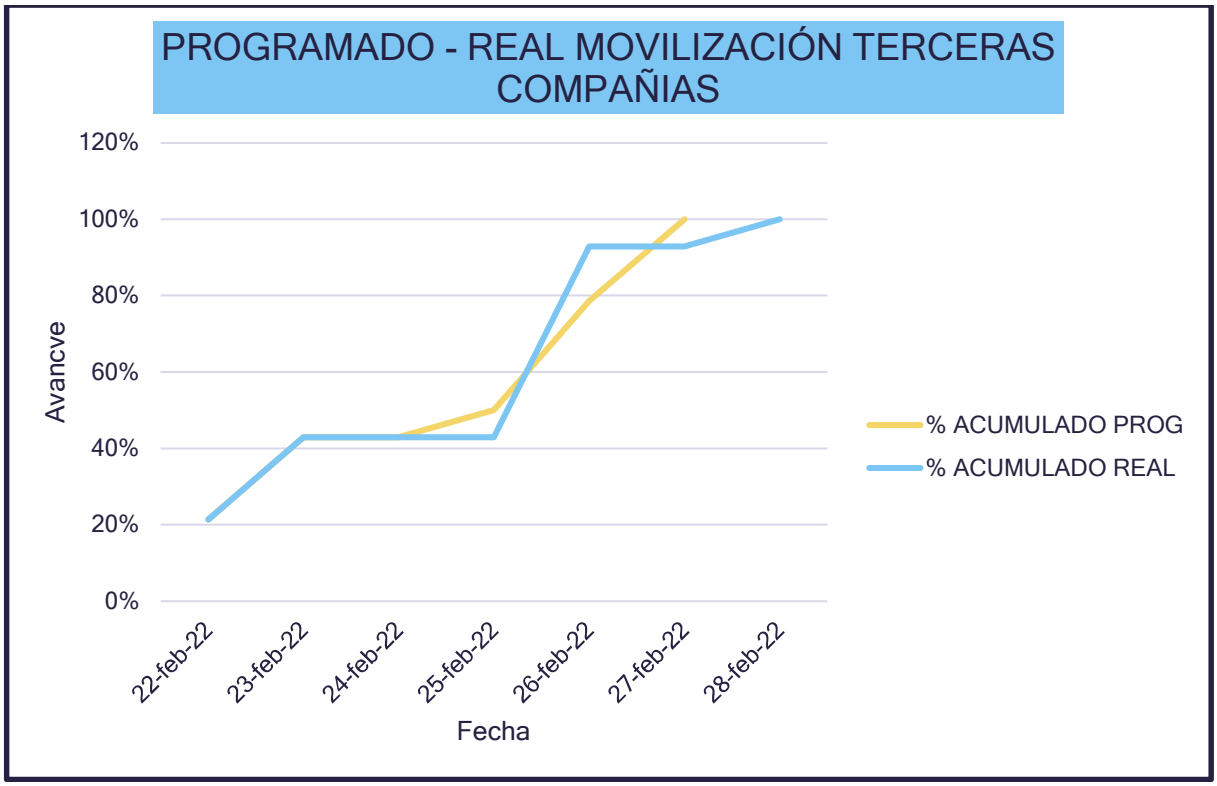

AVANCE DE DESARME

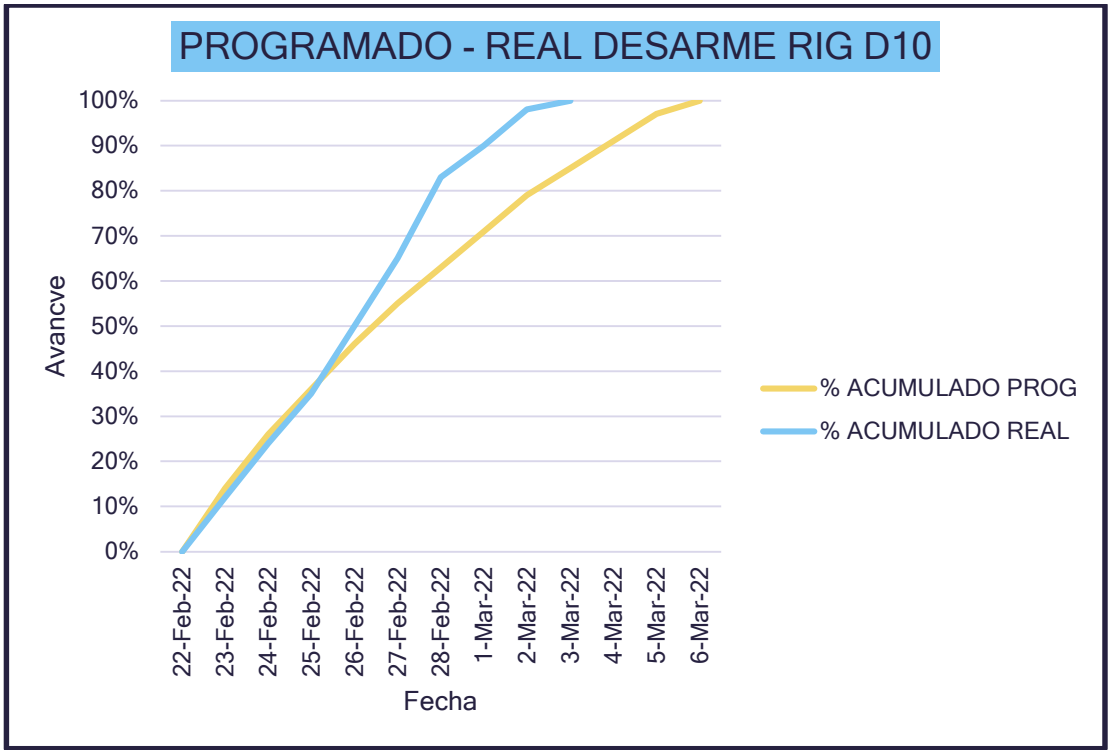

En constancia de la veracidad de la información se hace firmar este reporte por parte del director de proyecto



Luis Castillo
Director proyecto ANH Pailitas
