REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBF

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04

PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de diciembre al 31 de diciembre de 2021.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR		NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Itemp	V. unitario	Valor Total.
Volante y comunicados	1	1,00	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 50.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					**$ 50.000,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 250.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					**$ 850.000,00**
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 50.000,00**

Nombre: Liliana Contreras García.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hugues.

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04.

PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de enero al 31 de enero de 2022.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL	



Elemento	Unidad	Cantidad	Itemp	V. unitario	Valor Total.
Funcionamiento de SAU	Mes	1,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
				SUBTOTAL	$ 78.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					$ 78.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 468.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.716.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 1.248.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 78.000,00**

Nombre: Tiliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Arroyo

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04

PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de enero al 31 de enero de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL	



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Cartelera y vallas	1	1,00	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				SUBTOTAL	$ 20.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					**$ 20.000,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 120.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 420.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					**$ 300.000,00**
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 20.000,00**

Liliana Contreras G.

Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hugon

Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04

PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de enero al 31 de enero de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL	



Elemento	Unidad	Cantidad	Temp	V. unitario	Valor Total.
Volante y comunicados	1	1,00	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 50.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					**$ 50.000,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 300.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					**$ 800.000,00**
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 50.000,00**

Fiana Contreras G.

Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hugues

Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04

PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de febrero de 1 de marzo de 2022.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Itemp	V. unitario	Valor Total.
Volante y comunicados	1	1,00	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 50.000,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	**$ 50.000,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 350.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR	**$ 750.000,00**
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 50.000,00**

Nombre: Liliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudio Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04

PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de febrero al 1 de marzo 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR		NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Cartelera y vallas	1	1,00	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				SUBTOTAL	$ 20.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					**$ 20.000,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 140.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 420.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					**$ 280.000,00**
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 20.000,00**

Nombre: Liliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hurtado

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04.


PERIODO DE EVALUACIÓN

1 de febrero al 1 de marzo de 2022.

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR		NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Funcionamiento de SAU	Mes	1,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
				SUBTOTAL	$ 78.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					$ 78.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 546.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.716.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 1.170.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 78.000,00

Nombre: Liliana Contreras G

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hinojosa

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

A CONSTRUIR S.A.

PMA- COMPONENTE SST
PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL $1.837.500,00

EXAMENES DE INGRESO	**TOTAL**
EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO	$1.837.500,00
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$1.837.500,00

PMA- COMPONENTE SST
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL $2.152.500,00

EXAMENES DE INGRESO	**TOTAL**
EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO	$2.152.500,00
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$2.152.500,00

PMA- COMPONENTE SST
PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL $2.152.500,00

EXAMENES DE INGRESO	**TOTAL**
EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO	$2.152.500,00
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$2.152.500,00

PMA- COMPONENTE SST
PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2022
VALOR TOTAL $2.992.500,00

EXAMENES DE INGRESO	**TOTAL**
EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO	$2.992.500,00
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$2.992.500,00

TOTAL COMPONENTE PMA-SST	**$9.135.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBI

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 PMA

1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:		SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	



CONCEPTO DE APTITUD



CONCEPTO DE APTITUD

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Optometria	UN	35	$ 11.970,00	$ 418.950
espirometria	UN	35	$ 13.440,00	$ 470.400
audiometria	UN	35	$ 11.340,00	$ 396.900
examenes medicos general	UN	35	$ 15.750,00	$ 551.250
examen de retira	UN	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 1.837.500
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	$ 1.837.500
			agosto	4.357.500,00
			septiembre	577.000,00
			octubre	945.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 7.717.000
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	16.978.200,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.837.500,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBI

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 PMA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:		SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	



CONCEPTO DE APTITUD

EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de ingreso

Cargo u Oficio: OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN

EXAMENES REALIZADOS

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: APTO CON RECOMENDACIONES



CONCEPTO DE APTITUD

EVALUACIÓN OCUPACIONAL REALIZADA

Examen medico ocupacional de ingreso

Cargo u Oficio: MAESTRO DE OBRA

EXAMENES REALIZADOS

RESTRICCIONES LABORALES

CONCEPTO DE APTITUD: APTO CON RECOMENDACIONES

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Optometria	UN	41	$ 11.970,00	$ 490.770
espirometria	UN	41	$ 13.440,00	$ 551.040
audiometria	UN	41	$ 11.340,00	$ 464.940
examenes medicos general	UN	41	$ 15.750,00	$ 645.750
examen de retira	UN	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 2.152.500
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	$ 2.152.500
			agosto	4.357.500,00
			septiembre	577.000,00
			octubre	945.000,00
			noviembre	3.990.000,00
			diciembre	$ 1.837.500
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 13.859.500
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	10.835.700,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.152.500,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 PMA

1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)		

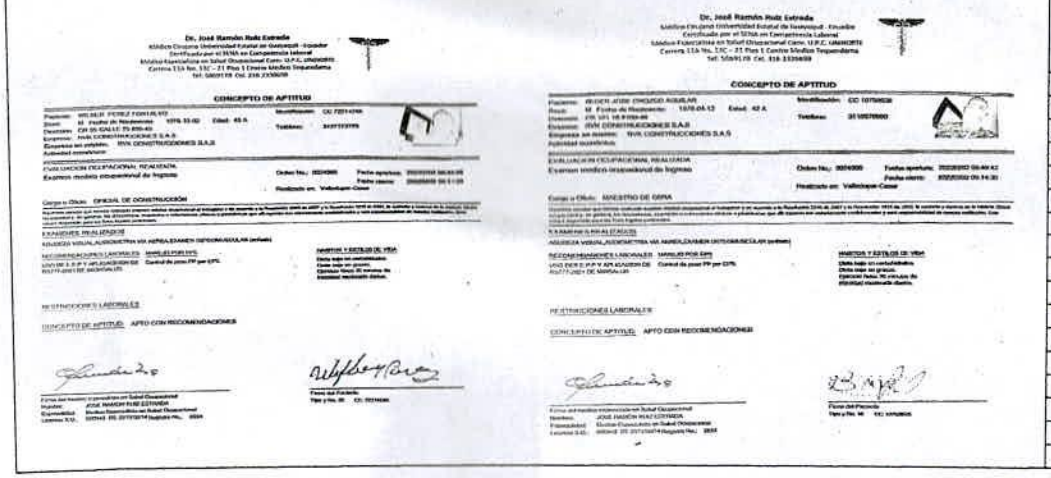

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Optometria	UN	41	$ 11.970,00	$ 490.770
espirometria	UN	41	$ 13.440,00	$ 551.040
audiometria	UN	41	$ 11.340,00	$ 464.940
examenes medicos general	UN	41	$ 15.750,00	$ 645.750
examen de retira	UN	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 2.152.500
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	$ 2.152.500
			agosto	4.357.500,00
			septiembre	577.000,00
			octubre	945.000,00
			noviembre	$ 1.837.500
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 9.869.500
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	14.825.700,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.152.500,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 PMA

1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	

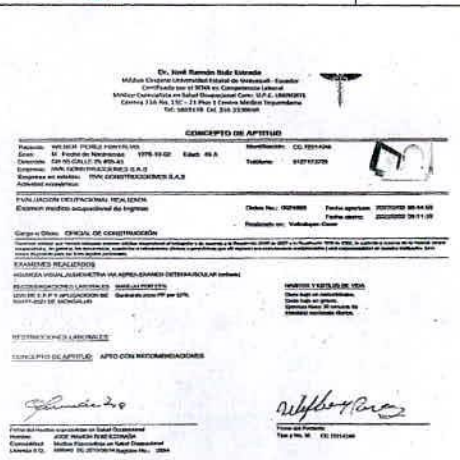

CONCEPTO DE APTITUD



CONCEPTO DE APTITUD

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Optometria	UN	57	$ 11.970,00	$ 682.290
espirometria	UN	57	$ 13.440,00	$ 766.080
audiometria	UN	57	$ 11.340,00	$ 646.380
examenes medicos general	UN	57	$ 15.750,00	$ 897.750
examen de retira	UN	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 2.992.500
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	$ 2.992.500
			agosto	4.357.500,00
			septiembre	577.000,00
			octubre	945.000,00
			noviembre	3.990.000,00
			diciembre	$ 1.837.500
			enero	$ 2.152.500
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 16.852.000
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	7.843.200,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.992.500,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

A CONSTRUIR S.A.

RESUMEN ITEM 18.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TOTAL DE LOS COMPONENTES A COBRAR	VALOR
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL	$9.616.626,00
TOTAL COMPONENTE SOCIAL	$444.000,00
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$9.135.000,00
VALOR A COBRAR EN ACTA #4	**$ 19.195.626,00**

A CONSTRUIR S.A.

COMPONENTE BIOSEGURIDAD
PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL $8.820.662,14

BIOSEGURIDAD	**TOTAL**
ALCOHOL, JABON LIQUIDO,TOALLAS DESECHABLES, TAPABOCAS	$1.046.754,14
SEÑALIZACION	
CINTA DE SEÑALIZACION, MALLA DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION INFORMATIVA, COLOMBINAS	$1.028.160,00
ENTREGA DE EPP	
GUANTES (NITRILO Y TIPO INGENIERO), GAFAS, CASCOS,CAMISETAS)	$4.445.748,00
NOMINA DE PERSONAL	
SUPERVISOR SST	$2.300.000,00
TOTAL COMPONENTE BIOSEGURIDAD	$8.820.662,14

COMPONENTE BIOSEGURIDAD
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL $10.871.430,00

BIOSEGURIDAD	**TOTAL**
ALCOHOL, JABON LIQUIDO,TOALLAS DESECHABLES, TAPABOCAS	$1.392.813,00
SEÑALIZACION	
CINTA DE SEÑALIZACION, MALLA DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION INFORMATIVA, COLOMBINAS	$2.768.000,00
ENTREGA DE EPP	
GUANTES (NITRILO Y TIPO INGENIERO), GAFAS, CASCOS,CAMISETAS)	$4.410.617,00
NOMINA DE PERSONAL	
SUPERVISOR SST	$2.300.000,00
TOTAL COMPONENTE BIOSEGURIDAD	$10.871.430,00

A CONSTRUIR S.A.

PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL $9.182.706.64

BIOSEGURIDAD	**TOTAL**
ALCOHOL, JABON LIQUIDO,TOALLAS DESECHABLES, TAPABOCAS	$2.018.483,64
SEÑALIZACION	
CINTA DE SEÑALIZACION, MALLA DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION INFORMATIVA, COLOMBINAS	$1.437.780,00
ENTREGA DE EPP	
GUANTES (NITRILO Y TIPO INGENIERO), GAFAS, CASCOS,CAMISETAS)	$3.426.443,00
NOMINA DE PERSONAL	
SUPERVISOR SST	$2.300.000,00
TOTAL COMPONENTE BIOSEGURIDAD	$9.182.706.64

PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2022
VALOR TOTAL $11.548.668

BIOSEGURIDAD	**TOTAL**
ALCOHOL, JABON LIQUIDO,TOALLAS DESECHABLES, TAPABOCAS	$1.714.392,00
SEÑALIZACION	
CINTA DE SEÑALIZACION, MALLA DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION INFORMATIVA, COLOMBINAS	$1.313.720,00
ENTREGA DE EPP	
GUANTES (NITRILO Y TIPO INGENIERO), GAFAS, CASCOS,CAMISETAS)	$3.674.556,00
NOMINA DE PERSONAL	
SUPERVISOR SST, INSPECTORES SST	$4.846.000,00
TOTAL COMPONENTE BIOSEGURIDAD	**$11.548.668**

TOTAL COMPONENTE BIOSEGURIDAD A COBRAR EN ACTA # 4	**$40.423.466,78**

A CONSTRUIR S.A.

RESUMEN ITEM 18.2 COMPONENTE BIOSEGURIDAD

TOTAL DEL COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD	VALOR
TOTAL MES NOVIEMBRE	$8.820.662,14
TOTAL MES DICIEMBRE	$10.871.430,00
TOTAL MES ENERO	$9.182.706.64
TOTAL MES FEBRERO	$11.548.668
VALOR A COBRAR EN ACTA #4	**$40.423.466,78**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OB. . .

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03

1 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	1,0567	$ 106.000,00	$ 112.009
Jabon liquido x 20 litros	Litro	10	$ 79.000,00	$ 790.000
Teoallas desechables x 100 unidades	Paquete	5	$ 2.949,00	$ 14.745
Tapabocas Desechable	Paquete	13	$ 10.000,00	$ 130.000
			SUBTOTAL	**$ 1.046.754**
			CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	**1.046.754,14**
			octubre	**1.064.694,00**
			septiembre	**1.113.725,00**
			agosto	**326.496,00**
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.551.669,14
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 14.172.400
			PENDIENTE POR PAGAR	10.620.730,86
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	**1.046.754,14**

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03

1 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	17	$ 21.420,00	$ 364.140
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	9	$ 73.780,00	$ 664.020
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	0	$ 45.000,00	$ 0
Colombinas	UN	0	$ 38.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 1.028.160
			CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	1.028.160,00
			octubre	647.360,00
			septiembre	3.623,00
			agosto	8.836.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10.515.143,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 24.695.200
			PENDIENTE POR PAGAR	14.180.057,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.028.160,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03

1 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	159	$ 7.735,00	$ 1.229.865,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	83	$ 4.736,00	$ 393.088,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	65	$ 2.300,00	$ 149.500,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	10	$ 2.300,00	$ 23.000,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	25	$ 11.900,00	$ 297.500,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	9	$ 1.785,00	$ 16.065,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad		$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	0	$ 73.661,00	$ 0,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	30	$ 34.391,00	$ 1.031.730,00
Chaleco Reflectivos	Unidad		$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	87	$ 15.000,00	$ 1.305.000,00
			SUBTOTAL	$ 4.445.748,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	$ 4.445.748,00
octubre	4.932.953,00
septiembre	4.481.081,00
agosto	3.951.923,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	25.663.713,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
PENDIENTE POR PAGAR	191.362.359,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.445.748,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE O A

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 03

1 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	0	$ 1.273.000,00	$ -
			SUBTOTAL	2.300.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	2.300.000,00
			octubre	2.300.000,00
			septiembre	2.300.000,00
			agosto	4.600.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11.500.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	58.195.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.300.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD | 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	2,378	$ 106.000,00	$ 252.068
Jabon liquido x 20 litros	Litro	4	$ 79.000,00	$ 316.000
Tecallas desechables x 100 unidades	Paquete	5	$ 2.949,00	$ 14.745
Tapabocas Desechable	Paquete	81	$ 10.000,00	$ 810.000
			SUBTOTAL	**1.392.813,00**
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	**1.392.813,00**
			agosto	**325.795,00**
			septiembre	**1.112.725,00**
			octubre	**1.064.694,00**
			noviembre	**1.046.754,00**
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.942.781,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00
			PENDIENTE POR PAGAR	9.229.619,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	**1.392.813,00**

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST. DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGUIRIDAD | 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	0	$ 21.420,00	$ 0
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	0	$ 73.780,00	$ 0
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	48	$ 45.000,00	$ 2.160.000
Colombinas	UN	16	$ 38.000,00	$ 608.000
			SUBTOTAL	$ 2.768.000
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.768.000,00
			agosto	8.836.000,00
			septiembre	3.623.000,00
			octubre	647.360,00
			noviembre	1.028.160,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	16.902.520,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	7.792.680,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.768.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO AGOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OB

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD

periodo: 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	231	$ 7.735,00	$ 1.786.785,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	62	$ 4.736,00	$ 293.632,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	132	$ 2.300,00	$ 303.600,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	4	$ 2.300,00	$ 9.200,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	46	$ 11.900,00	$ 547.400,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	0	$ 1.785,00	$ 0,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	0	$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	0	$ 73.661,00	$ 0,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	0	$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	98	$ 15.000,00	$ 1.470.000,00
			SUBTOTAL	4.410.617,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.410.617,00
agosto	3.951.923,00
septiembre	4.481.081,00
octubre	4.912.953,00
noviembre	4.445.748,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.202.322,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
PENDIENTE POR PAGAR	194.823.750,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.410.617,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE (A

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD | 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	0	$ 1.273.000,00	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	2.300.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.300.000,00
			agosto	4.600.000,00
			septiembre	2.300.000,00
			octubre	2.300.000,00
			novimbre	2.300.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	13.800.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	55.895.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.300.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD | 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	5,283	$ 106.000,00	$ 560.045
Jabon liquido x 20 litros	Litro	14	$ 79.000,00	$ 1.106.000
Teoallas desechables x 100 unidades	Paquete	11	$ 2.949,00	$ 32.439
Tapabocas Desechable	Paquete	32	$ 10.000,00	$ 320.000
			SUBTOTAL	**2.018.483,64**
		CANTIDAD PRESENTE ACTA	**2.018.483,64**	
			agosto	**325.795,00**
			septiembre	**1.112.725,00**
			octubre	**1.064.694,00**
			noviembre	**1.392.813,00**
			diciembre	**1.046.754,00**
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5.914.510,64	
		CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00	
		PENDIENTE POR PAGAR	8.257.889,36	
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		**2.018.483,64**

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBR

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGUIRIDAD | 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	9	$ 21.420,00	$ 192.780
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	0	$ 73.780,00	$ 0
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	15	$ 45.000,00	$ 675.000
Colombinas	UN	15	$ 38.000,00	$ 570.000
			SUBTOTAL	$ 1.437.780
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.437.780,00
			agosto	8.836.000,00
			septiembre	3.623.000,00
			octubre	647.360,00
			noviembre	2.768.000,00
			diciembre	1.028.160,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	18.340.300,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	6.354.900,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.437.780,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OB

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD

periodo: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	101	$ 7.735,00	$ 781.235,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	278	$ 4.736,00	$ 1.316.608,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	139	$ 2.300,00	$ 319.700,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	28	$ 2.300,00	$ 64.400,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	5	$ 11.900,00	$ 59.500,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	0	$ 1.785,00	$ 0,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	0	$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	0	$ 73.661,00	$ 0,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	0	$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	59	$ 15.000,00	$ 885.000,00
			SUBTOTAL	3.426.443,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	3.426.443,00	
agosto	3.951.923,00	
septiembre	4.481.081,00	
octubre	4.912.953,00	
noviembre	4.410.617,00	
diciembre	4.445.748,00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	25.628.765,00	
CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00	
PENDIENTE POR PAGAR	191.397.307,00	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		3.426.443,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE O

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL		





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	0	$ 1.273.000,00	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	2.300.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.300.000,00
			agosto	4.600.000,00
			septiembre	2.300.000,00
			octubre	2.300.000,00
			noviembre	2.300.000,00
			diciembre	2.300.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	16.100.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	53.595.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.300.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD | 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18,1	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD	



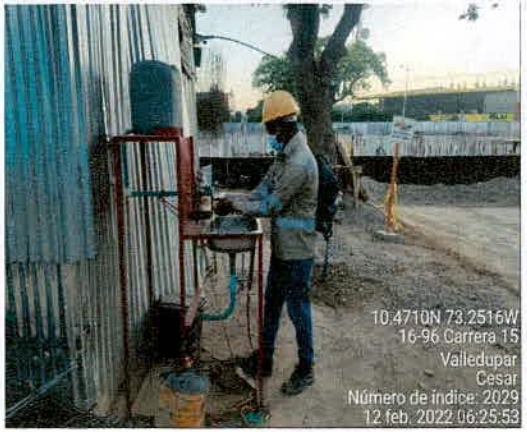

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	3,300	$ 106.000,00	$ 349.800
Jabon liquido x 20 litros	Litro	9	$ 79.000,00	$ 711.000
Toallas desechables x 100 unidades	Paquete	8	$ 2.949,00	$ 23.592
Tapabocas Desechable	Paquete	63	$ 10.000,00	$ 630.000
			SUBTOTAL	**1.714.392,00**
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	**1.714.392,00**
			agosto	**325.795,00**
			septiembre	**1.112.725,00**
			octubre	**1.064.694,00**
			noviembre	**1.392.813,00**
			diciembre	**1.046.754,00**
			enero	**2.018.483,64**
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5.610.419,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00
			PENDIENTE POR PAGAR	8.561.981,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	**1.714.392,00**

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBR.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGUIRIDAD | 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:		SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	21	$ 21.420,00	$ 449.820
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	5	$ 73.780,00	$ 368.900
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	11	$ 45.000,00	$ 495.000
Colombinas	UN	0	$ 38.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 1.313.720
		CANTIDAD PRESENTE ACTA		1.313.720,00
		agosto		8.836.000,00
		septiembre		3.623.000,00
		octubre		647.360,00
		noviembre		2.768.000,00
		diciembre		1.028.160,00
		enero		1.437.780,00
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		19.654.020,00
		CANTIDAD CONTRACTUAL		24.695.200,00
		PENDIENTE POR PAGAR		5.041.180,00
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		1.313.720,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBI

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD

periodo: 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	72	$ 7.735,00	$ 556.920,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	226	$ 4.736,00	$ 1.070.336,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	52	$ 2.300,00	$ 119.600,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	33	$ 2.300,00	$ 75.900,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	22	$ 11.900,00	$ 261.800,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	0	$ 1.785,00	$ 0,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	0	$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	0	$ 73.661,00	$ 0,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	0	$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	106	$ 15.000,00	$ 1.590.000,00
			SUBTOTAL	3.674.556,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	3.674.556,00
agosto	3.951.923,00
septiembre	4.481.081,00
octubre	4.912.953,00
noviembre	4.410.617,00
diciembre	4.445.748,00
enero	3.426.443,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	29.303.321,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
PENDIENTE POR PAGAR	187.722.751,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	3.674.556,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

...EMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 04 BIOSEGURIDAD | 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	2	$ 1.273.000,00	$ 2.546.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	4.846.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.846.000,00
			agosto	4.600.000,00
			septiembre	2.300.000,00
			octubre	2.300.000,00
			noviembre	2.300.000,00
			diciembre	2.300.000,00
			enero	2.300.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	20.946.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	48.749.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.846.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #4

FECHA DE CORTE: 16 DE DICIEMBRE DE 2021 – 01 DE MARZO DE 2022



CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. INFORME DE GESTIÓN DE OBRA #4

1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1.1. Número de contrato: 2021040002

1.1.2. Objeto: Construcción del Centro de eventos, histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

1.1.3. Vr. contrato: $ 138.817.668.949,109

1.1.4. Plazo: 22 MESES

1.1.5. Fecha de Inicio: 12 de Julio de 2021

1.2. AVANCE DE OBRA

1.2.1. Cronograma de actividades programadas y ejecutadas para este corte

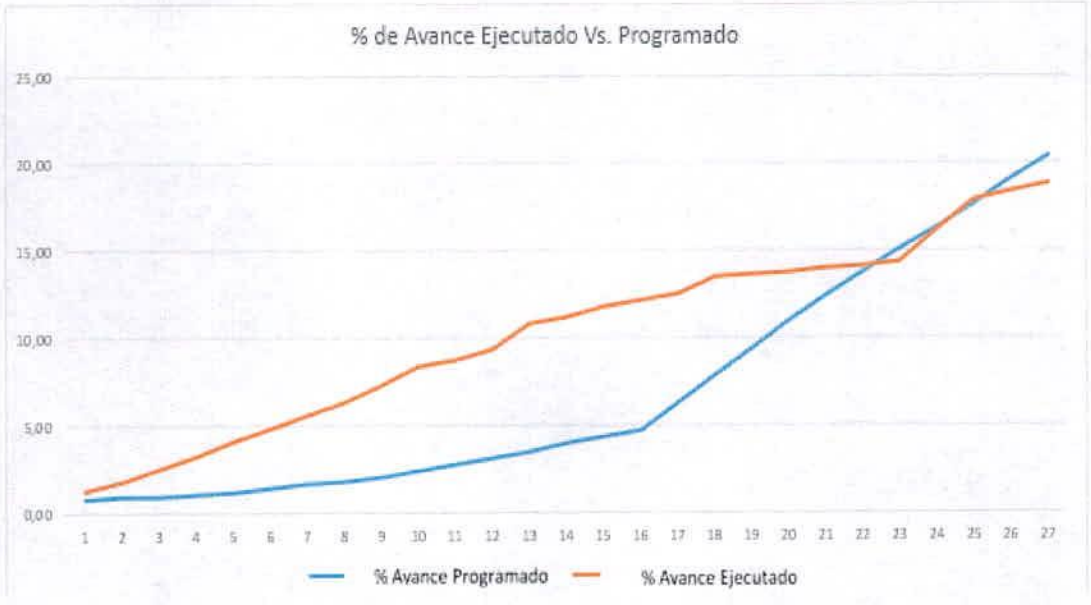


Imagen No. 1. Gráfico programado vs ejecutado

A la fecha se tiene un avance de obra **ejecutado de 18.83%** con un avance de obra **programado de 20.47%.**

1.2.2. Actividades Administrativas

1.2.2.1. Revisión de planos en general:

Se recibió visita de un miembro del equipo estructural para las inspecciones in situ de los diferentes elementos estructurales del proyecto, dando como resultado unas observaciones de mejoras constructivas al diseño estructural, se enuncian algunas de ellas:


- Se debe fundir las vigas de cimentación completas hasta su cara superior generando la junta en la losa.
- No dejar juntas frías en la placa entrepiso, dejarlas rugosas para mayor adherencia entre el concreto viejo y nuevo.
- Curado de entrepiso se deberá hacer siempre cubierto y mantener la humedad.
- Se recomienda cubrir fisuras de muros con lechada de cemento en vez de usar epóxico.
- No se debe rellenar la parte externa del muro de contención por encima de 1/3 de su altura.

1.2.3. Actividades Técnicas

1.2.3.1. Excavaciones y Relleno


1.2.3.1.1. Excavación Zapatas:

Se cobra para este periodo la excavación de 3 zapatas y queda por cobrar 1 zapata que hace parte de la rampa por donde actualmente entran los mixers de concreto para las fundidas de la estructura. El volumen para esta acta es de 13.01 m3 aproximadamente.

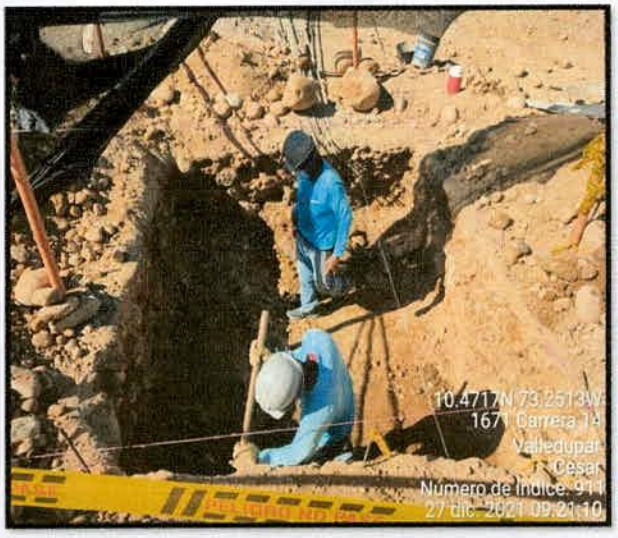

1.2.3.1.2. Cargue y retiro:

El material extraído durante las excavaciones de las zapatas se ubicó en la cantera autorizada para la disposición de desechos de la obra, la cantidad producida por una zapata excavada es de 16.92 m3 aprox. Teniendo en cuenta un porcentaje de expansión del 30%.

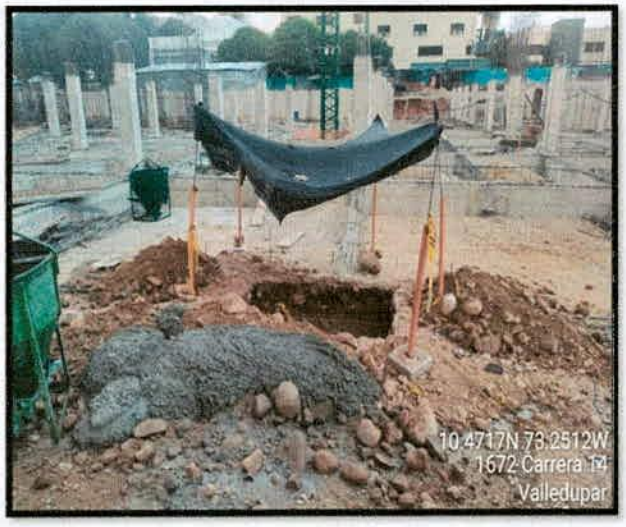

1.2.3.1.3. Relleno con material de sitio:

Se tomó material de sitio y se realizó el lleno de los espacios entre el suelo y los bordes de las zapatas incluido el espacio entre el nivel de placa contrapiso de sótano y la parte superior de la zapata. Se llenó una altura aproximada de 0.75 m. Para este corte se cobran el relleno de 3 unidades de zapatas equivalente a 6.70 m3.



1.2.3.2. Cimentación

1.2.3.2.1. Concreto Pobre:

Para esta actividad se realizaron los trabajos con el debido proceso, ejecutando el solado para 60.90 ml de Viguetas y alrededor 5.95 ml de zapata, dando un total de 62.23 m². Se continuó con la política de un sobre ancho de 10cm para la instalación de las Guarderas y 20cm para la zapata. Resistencia para este concreto es de 2500psi corroborado con las muestras de cilindros enviadas al laboratorio para su respectiva prueba.



1.2.3.2.2. Concreto zapatas:

Se vaciaron 2 unidades de zapata para un total de 1.15 m³. Como se venía haciendo en el periodo anterior, debido a que el nivel freático subió y las aguas se vertían en la excavación de zapatas, para ello se emplearon bombas para la extracción de dicha agua y además se usó un concreto de 4000psi de baja permeabilidad.



1.2.3.2.3. Acero Zapatas:

En este periodo se suministró e instaló un total de 46.41 Kg, usado en zapatas y vigas de zapatas.



1.2.3.2.4. Actividades para Cimentación

1.2.3.2.4.1. Acero de refuerzo para vigas de cimentación

Debido a los cambios de losa de cimentación según acta modificatoria #1; en conciliación con el estructural, la cantidad ejecutada a este momento es de 4604.14 Kg el cual fue suministrado y armado con alambre negro.



1.2.3.2.4.2. Viga De Cimentación

Debido a los cambios presentados en la cimentación, los cuales fueron generados por el aumento del nivel de la edificación; se reevaluó la cimentación, por lo que se produce una cantidad de 47.92 m3 de vigas de cimentación. En esta cantidad se tiene en cuenta Vigas y Viguetas de cimentación, en las cuales la primera se funde a una profundidad de 0.85 mts por 0.5mts de ancho y la segunda se funde con una profundidad de 0.65 mts y 0.40 mts de ancho.



1.2.3.3. Columnas y pantallas de concreto:

La altura de columnas es de H: 2.95m. Para estos columnas se usó un concreto de 4000psi con grava de ¾", se usó luego de desencofrar antisol blanco para asegurar un correcto curado de la estructura. En total para este periodo se usó 12.60 m3.



1.2.3.4. Placas de Sótano

1.2.3.4.1. Losa de entrepiso aligerada nivel N+0,50


1.2.3.4.1.1. Aligeramiento en casetón de icopor removible

Se prepara la superficie sobre la cual se va a fundir la losa donde se incluye instalación y nivelación de chazas, parales y cerchas, además de otras actividades subyacentes para un total ejecutado 2633.82 m².




1.2.3.4.1.2. Malla electro soldada Losa

Para esta actividad Se usó malla de 8mmx8mm espaciadas 15x15cm, tal como lo indica el diseño para un total de 23322.61 Kg.

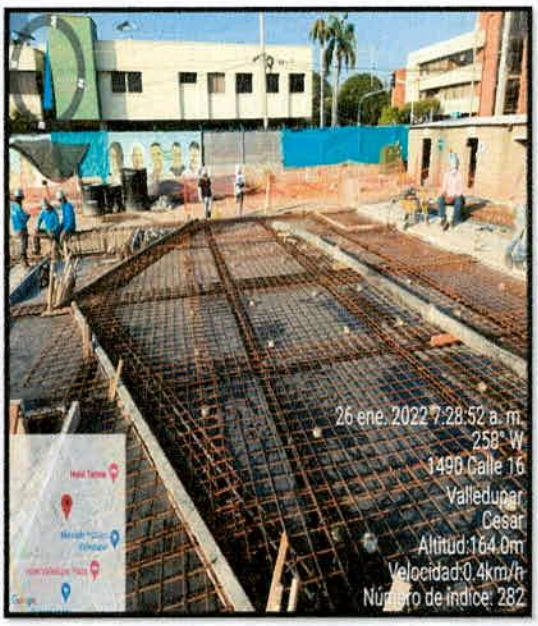

1.2.3.4.1.3 Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm

Se vaciaron vigas, viguetas y riostras de un total de 2619.34 ml, igualmente se vació 2633.82 m2 de losa para un total de 797 m3 con concreto de 4000 psi según indicaciones en los planos

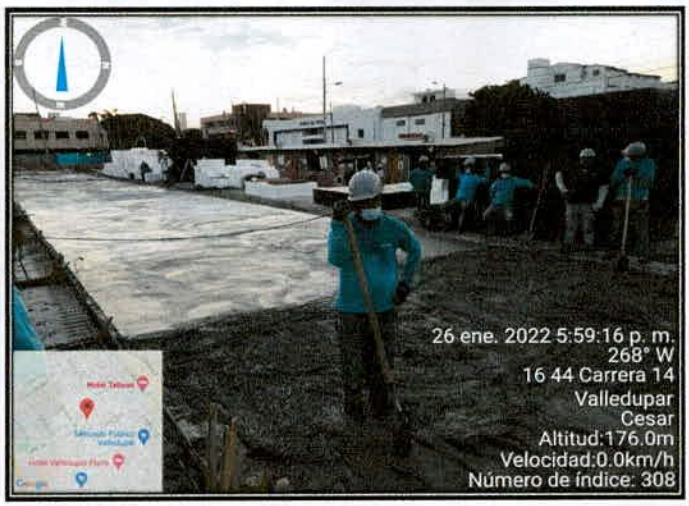

El día 13 de enero de 2022, se entrega plan de capacitaciones del año a la interventoría

2. Resumen de Actividades del Plan de Manejo Ambiental

2.1 Programa 01: información a la comunidad.

2.1.1 Actividades Desarrolladas:

El día 30 de diciembre de 2021, se realiza reunión de socialización al comerciante Salvador Navarro, en donde se le expone las necesidades de la obra para el uso del espacio público.


El día 6 de enero de 2022, se realiza reunión por la plataforma meet, con interventoría y representante de interventoría para evaluar pendientes por parte de la gobernación del Cesar.

El día 14 de enero de 2022, se realiza recorrido para la reubicación voluntaria de comerciantes en el sector de la obra, además se toman las medidas de los puestos de para conocer sus dimensiones y saber si el espacio identificado por los comerciantes será útil para la reubicación de sus módulos de venta.

El día 18 de enero de 2022, Reunión para general diagnóstico para el análisis del riesgo de comerciantes y terceros que se encuentran usando el espacio público.

El día 20 de enero de 2022, se asiste y participa en reunión convocada por la gobernación del cesar con el fin de planificar la reubicación temporal y voluntaria de los comerciantes, junto a representante de la oficina de espacio público, secretaria de infraestructura, gerencia del proyecto CCMV gobernación del cesar y se realiza planeación de actividades del área de gestión social de las actividades pendientes por parte de la gobernación del Cesar.

Registro de fotográfico PGS:

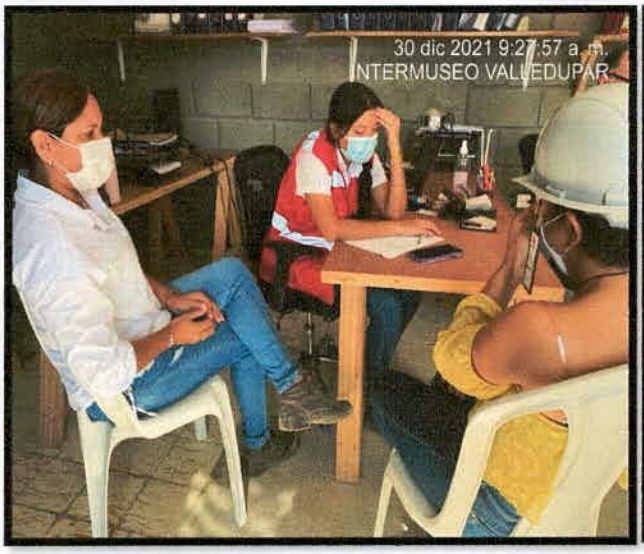



2.2 Programa 02: PGS- divulgación.

2.2.1 Actividades desarrolladas:

El día 7 de enero de 2022, se realiza socialización del Boletín No. 9 de 2022 a todos los subcontratistas del proyecto.





2.3. Programa 03: PGS- restitución de bienes afectados.

2.3.1 Actividades a desarrolladas:

- Durante el mes de noviembre no se ejecutaron actividades para este programa, dado a que su cobertura del plan de gestión social no completa desarrollo de actividades mensuales.

2.4. Programa 04: PGS-atención y participación ciudadana.

2.4.1 Actividades desarrolladas:

El día 11 de enero de 2022, se realizó recorrido en la obra junto a la interventoría, se solicitó el retiro de buzón de la entrada sobre la carrera 15 puesto que este se encuentra afectado por el tiempo y se realicen las reparaciones a lugar.


El día 11 de enero de 2022, se realiza revisión de buzón de pqrs y buzón de hojas de vida del proyecto. En el buzón de PQRS no se encontraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes y el buzón de hojas de vida se reciben 15 currículos.

El día 11 de enero de 2022, se realizó actualización de la cartelera informativa, publicando el nuevo cronograma de capacitaciones mensuales y el grupo de empleados del mes destacados según el área desempeñada.

El día 25 de enero de 2022, se instaló nuevamente el punto de atención a la comunidad, entrada sobre la carrera 16 frente a la clínica Cesar.

Registro de fotográfico PGS:



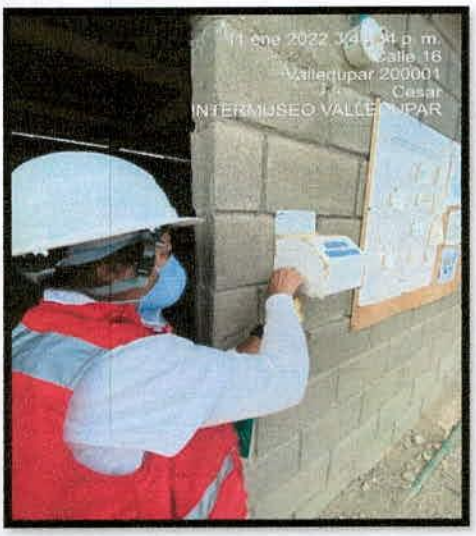



2.5. Programa 5: PGS- vinculación de mano de obra.

2.5.1. Actividades desarrolladas:

El día 24 de enero de 2022, se realizó la entrega a la gobernación del Cesar de liquidaciones del personal de la obra correspondiente al año 2021 con oficio de consecutivo 2021-cvup-082 de fecha 21 de enero de 2021.

El día 11 de enero de 2022, Se publica listado y entrega los empleados del mes de diciembre del año 2021 reconociendo por su labor ejercida.

Se presenta formato de vinculación de mano de obra correspondiente al mes de enero de 2021.

Registro de cumplimiento



2.6. Programa 06: capacitación al personal de obra.

2.6.1 Actividades desarrolladas:

El día 22 de enero de 2021, se realizó capacitación mensual sobre salud mental en los tiempos del civil 19 /omicron, además se realizó entrega de sopas de letras a los trabajadores obre esta temática.

El día 14 de enero de 2022, se realizó instalación de letreros sobre la importancia y publicidad de la vacuna en la zona del comedor de los trabajadores y se instala según solicitud verbal de trabajadores punto de hidratación.

Se radica oficio con consecutivo **2021-cvup-085** de fecha enero 28 de 2022 de asunto solicitud de reubicación de comerciantes en la oficina de infraestructura gobernación del Cesar.

Se entrega informe de Arl seguros bolívar con consecutivo **2021-cvup-093** de fecha febrero 21 de 2022 de asunto remisión de informe de inspección de seguridad Arl a la Gobernación del Cesar e Intermuseo Valledupar, en donde se ilustra en páginas 12 y 13 el riesgo de los comerciantes informales estacionarios por caída de objetos de la torre grúa.

2.6.2 Programa 07: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental.

2.6.2.1 Actividades a desarrolladas:

- Grupo Coac:

Se mantiene a la espera la ejecución de reunión con el comité de orientación y atención ciudadana solicitada por la veeduría especializada del Cesar, con el fin de conocer el proceso ejecutado de reubicación y legalización de los 21 comerciantes alrededor de la obra.



Atención de Comfacesar para servios de los empleados.

2.7 PROGRAMA 01: INFORMACION A LA COMUNIDAD

2.7.1 Actividades desarrolladas:

El día 24 de enero de 2022, se recibe plan de trabajo del área de gestión social de la secretaria de infraestructura de la Gobernación del Cesar, con el fin de realizarle el acompañamiento pertinente a cada actividad a ejecutarse a largo del proyecto.

El día 4 de febrero de 2022, cámara de comercio de Valledupar le envía a la gobernación del cesar temáticas del programa de fortalecimiento a vendedores estacionarios informales.

El día 15 de febrero de 2022, se realizó recorrido junto al director de obra para evaluar las zonas para ampliar el cerramiento de la obra sin generar afectaciones a los comerciantes estacionarios informales del CCMV.

El día 24 de febrero de 2022, acompañe a la gobernación del cesar en reunión de socialización reubicación temporal a vendedores estacionarios de lote CCMV.

El día 18 de febrero de 2022, se realiza el acompañamiento al desarrollo mesa de trabajo liderada por la secretaria de infraestructura en donde se evalúan

los espacios en los cuales se dará permiso por parte de la oficina espacio público de la Alcaldía municipal de Valledupar, además se realiza recorrido por los lugares en donde se ubicarán posiblemente los comerciantes.

El día 21 de febrero de 2022, se realizó acompañamiento a mesa de trabajo con el asesor de Gobernación del Cesar, Sergio López y secretaria de infraestructura, posterior a ello se realizó mesa de trabajo con los 21 comerciantes del sector para conocer el plan de reubicación temporal.

REGISTRO DE FOTOGRÁFICO PGS:



Acompañamiento a la gobernación del Cesar en mesa de trabajo con los vendedores informales estacionarios del CCMV.



Acompañamiento a reunión de reubicación temporal de los comerciantes informales a Gobernación del Cesar.


2.8 PROGRAMA 02: PGS- divulgación.

2.8.1 Actividades desarrolladas:

El día 3 y 9 febrero de 2022, se realizó la entrega de volante informativo No 12 a la comunidad, en donde se anunció los horarios nocturnos y extendidos que iniciara la obra.

El día 4 de febrero se envió al correo de la clínica salud total Coordinacionadmvalledupar@virreysolisips.com.co el volante informativo No 12.

REGISTRO DE FOTOGRAFICO PGS:

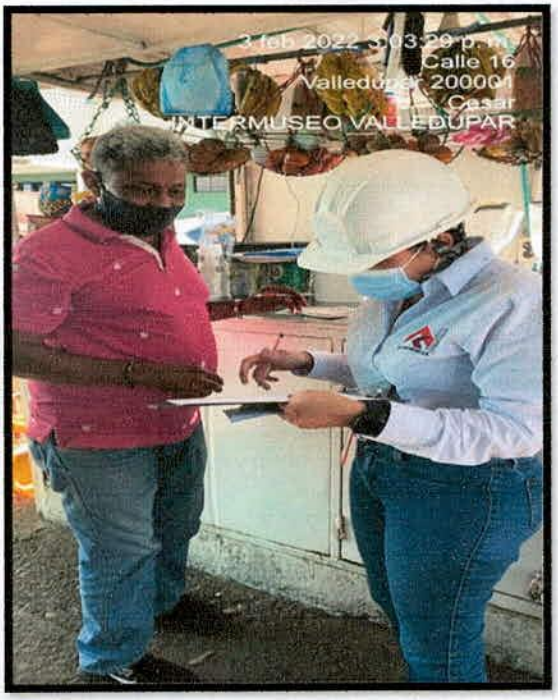

Entrega de volantes

2.9 PROGRAMA 03: PGS- RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS.

2.9.1 ACTIVIDADES A DESARROLLADAS:

Durante el mes de febrero no se ejecutaron actividades para este programa, dado a que su cobertura del plan de gestión social no contempla desarrollo de actividades mensuales.

Indicadores de cumplimiento mes de febrero de 2022: No aplica

2.10 PROGRAMA 04: PGS-ATENCIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA.


2.10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El día 31 de enero se recibe visita en el punto de atención a la comunidad de la oficina municipal de espacio público, secretaria de infraestructura e interventoría con el fin de que espacio público realice el acercamiento a los comerciantes informales estacionarios y ubique los puntos de reubicación de estos.

El día 4 de febrero de 2022, se atendió visita de representante de la veeduría especializada del Cesar, con un recorrido de obra y luego anotación en bitácora de obra donde se sentó la visita realizada.

El día 9 de febrero de 2022, se realizó revisión de buzones de la obra, en los 2 (dos) buzones de pqrs no se encontraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes. En el buzón de hojas de vida se ingresaron al sistema 12 (doce) currículos.

REGISTRO DE FOTOGRAFICO PGS

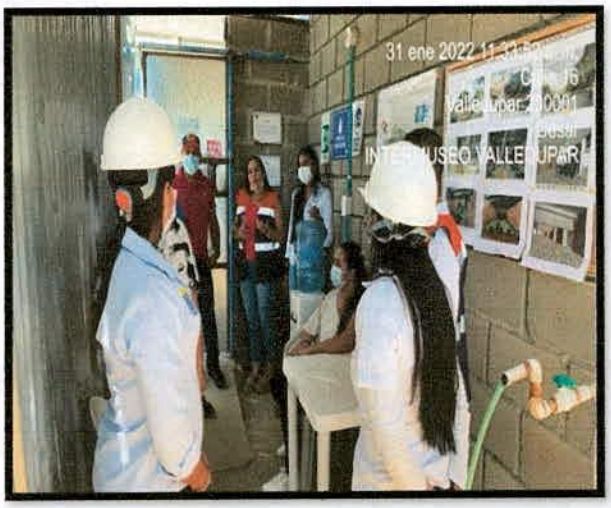

Visita de atención a espacio público.



Anotación en bitácora de obra

2.11 PROGRAMA 5: PGS- VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA.

2.11.1 Actividades desarrolladas:

El día 9 de febrero de 2021 se realizó entrega de reconocimientos del empleado del mes de enero del año 2022.
Se presenta formato de vinculación de personal correspondiente al mes de febrero de 2021.

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO



Reconocimiento de empleado del mes.

2.12 PROGRAMA 06: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRA.


2.12.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El día 14 de febrero de 2022, se realizó capacitación de trabajo en equipo, donde se resaltó la importancia de ayudar a todo el grupo de trabajo hasta lograr la meta.

El día 9 de febrero de 2022, se realizó entrega de cartelera a los diferentes subcontratistas de obra para consolidar semana a semana las metas logradas por el equipo de trabajo.

El día 24 de febrero de 2022, se realizó exposición de los servicios de Comfacesar en la obra, con un Stan de donde se atendieron los trabajadores de la obra en el subsidio de vivienda y educación.

REGISTRO DE FOTOGRÁFICO

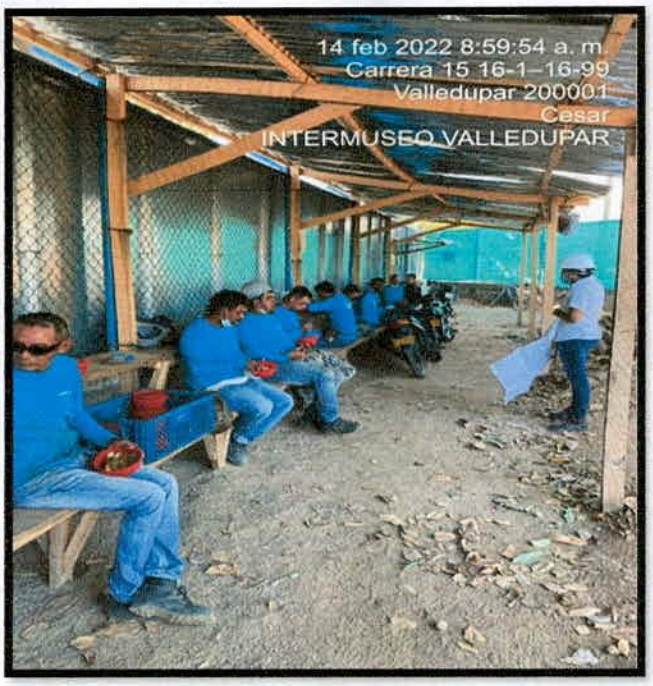

Capacitacion de trabajo en equipo

2.13 PROGRAMA 07: PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

2.13.1 ACTIVIDADES A DESARROLLADAS:

Durante este mes de febrero no se ejecutaron actividades en este programa debido a que se iniciara su desarrollo a partir de avance del 50% de obra, tal cual como se menciona el plan de gestión social.

Sistematización de experiencias: Se mantiene a la espera de conclusión de actividades realizadas en el acompañamiento a la gobernación del cesar, para el traslado de comerciantes para así plasmar la experiencia en el tema de la reubicación.



2.14 Actividades ambientales de diciembre de 2021 a enero de 2022.

Se realiza reunión mensual del grupo de gestión socio ambiental, donde se trataron temas relacionados con la correcta señalización de frentes de obra, así como también el adecuado acopio de acero para evitar accidentes e incidentes en obra.





Se realizó capacitación ambiental al personal que se encuentra vinculado al proyecto sobre: orden, aseo y limpieza, ¿Por qué es importante la humectación en las obras civiles? y la separación de residuos sólidos.





Se ubicó el área de almacenamiento de los RCD en una zona de la obra de fácil acceso y de relativa cercanía a los puntos de generación de RCD. Del mismo modo los materiales permanecieron perfectamente acordonados, apilados y cubiertos con lonas, plásticos o geo textiles, evitando la acción erosiva del agua y el viento.





Se hizo uso de contenedores metálicos (55 galones), para disposición de residuos sólidos, los cuales estaban ubicados estratégicamente en las áreas de trabajo y debidamente etiquetados. Una vez concluida las labores diarias se realizaron jornadas de aseo y limpieza, se recogieron todos los materiales sobrantes.





Para dar manejo del tráfico peatonal y vehicular, se dispuso de auxiliares de tráfico o paleteros, equipados con paletas y chalecos reflectivos, quienes controlaban el sentido de circulación del tráfico, para el ingreso y salida de volquetas u otra maquinaria del sitio de la obra.





La Brigada BOAL (brigada de orden aseo y limpieza) realizaron actividades de aseo y limpieza diariamente en los baños del personal técnico y administrativo.





Se humectó, mediante riego con manguera, la zona de acopio de la gravilla para minimizar el efecto contaminante.





Se inspeccionó que toda la maquinaria y equipo que ingresaba a la obra se encontrara en buenas condiciones de operación, con el fin de minimizar los niveles de ruido y emisiones que se puedan generar.





RESUMEN ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2022.

2.15 Reunión de grupo socio ambiental

El día 16 de febrero de 2022 se realiza reunión mensual del grupo de gestión socio ambiental, donde se trataron temas relacionados con el orden, aseo y limpieza de la obra.



2.16 Capacitación ambiental

Se realizó capacitación ambiental al sobre la generación de impactos en las obras civiles / Manejo de sustancias químicas y control de derrames.



2.17. Manejo Integral de Materiales de Construcción.

Se delimitó el área de almacenamiento de RCD con delineadores tubulares y cinta peligro, con el fin de establecer barreras para evitar el impacto visual del sitio de almacenamiento y controlar el material particulado



2.18 Señalización de obras y sitios temporales.

Se señalizó totalmente el área de trabajo (se delimitó el área con cinta peligro o malla).La cinta peligro se usó básicamente para indicar zonas de protección y cuidado al pasar. Se le hizo renovación de la polisombra del cerramiento provisional para la protección perimetral de todo la obra.





2.19 Manejo de residuos solidos.

En el sitio de obra se dispusieron de canecas para el manejo de los residuos comunes. El material que fue susceptible de recuperar se clasificó y se depositó en canecas para material de reciclaje.



2.20 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido.

Los escombros y los materiales de construcción susceptibles de generar material particulado fueron cubiertos con lonas o se mantuvieron húmedas sus pilas de almacenamiento, para evitar la generación de polvo debido a la acción de los vientos.

2.21 Proyecto de manejo aguas superficiales y subterráneas.

Se garantizó que por cada 15 personas en la obra se dispusiera de un servicio sanitario, cuya limpieza se realizó con la periodicidad apropiada para evitar generación de malos olores y condiciones insalubres. La Brigada BOAL (brigada de orden aseo y limpieza) realizaron actividades de aseo y limpieza en los baños del personal técnico y administrativo.



2.21. Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.

El campamento estuvo conformado por oficinas para la dirección de la obra (contratista e interventoría), un almacén para el resguardo de herramientas, equipos, entre otros, baños, vestieres, zona de aislamiento covid y primeros auxilios, punto de atención a la comunidad.



2.22 Manejo de Maquinaria, equipos y Vehículos.

Se realizaron inspecciones verificando el buen mantenimiento de la máquina, así como también si se han aplicado todas las medidas de seguridad (protecciones, aisladores, mecanismos de bloqueo, interruptores de desactivación de emergencia, etc. La velocidad de las volquetas y maquinaria nunca superó los 20km/h.



A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #4

FECHA DE CORTE: 16 DE DICIEMBRE DE 2021 – 01 DE MARZO DE 2022

A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #4

FECHA DE CORTE: 16 DE DICIEMBRE DE 2021 – 01 DE MARZO DE 2022

BITÁCORA DE OBRA

de acero para vigas de cimentación, de la losa de cubierta de sotano.
El contratista realiza ajuste del acero de la zapata Z33.

157 15-12-2021.

ESTADO del TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua instalación de acero para vigas de cimentación sobre plataforma de losa que cubre sotano.
Continua instalación de crucetas o tijeras, gatos para plataforma de losa que cubre sotano.
El contratista continua instalación de formaleta y ajustes para muro perimetral de contención.
El contratista realiza fundida de viguetas con concreto de 4000 PSI de argos.
El contratista continua relleno de gravilla, relleno de subbase entre vigas de cimentación y viguetas, y se realiza compactacion en el mismo.
El contratista continua y realiza fundida de muro pantalla de la zapata Z32.
El contratista realiza y continua excavación para actividades de zapatas a enchagüetar.
El contratista continua instalación de acero para zapatas graduales y para viguetas de cimentación.
El contratista para hoy realiza actividades de fundida de solado para viguetas de cimentación.
El contratista realiza limpieza, sondeo, lavado, aseo a tuberías de filtro en zona de cimentación.

158 16-12-2021.

ESTADO del TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista continua relleno de gravilla y subbase, compactacion, humedad entre vigas de cimentación y viguetas.
El contratista continua corte, figurado de acero en obra.
