**ACTA No. 20**

**COMITÉ TÉCNICO NACIONAL IRACA ZONA I**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:** BOGOTÁ D.C. – MODALIDAD VIRTUAL

**FECHA:** 19/05/2021 **HORA:** 2:00 PM A 3:30 PM

**LUGAR:** Modalidad Virtual

**DEPENDENCIA A CARGO:** Grupo interno de Trabajo - GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial - AIED

**OBJETIVO:**

Realizar el 20° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte del 30 de abril de 2021.

**Participantes:** este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional
Omar Torrijos – Delegado de la Directora de Inclusión Productiva
Walden Alberto Borja - Coordinador GIT- AIED – Supervisor Convenio 213/19
Jorge Ardila – Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Diana Chica – Apoyo financiero DIP
Luis Efren Bejarano – Apoyo financiero DIP
Susan Buitrago – Abogada de la Dirección
Catalina Cuadros - Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Giancarlo Paulina Geri - Profesional Apoyo a la supervisión DIP

Equipo Unión Temporal
Paola Pinzón – Representante Legal
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera
James Arias Gómez – Coordinador Zonal
Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT
Alejandro Cárdenas – Asesor UT

**ORDEN DEL DÍA:**

**DESARROLLO Y COMPROMISOS:**

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

## 1. Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos

Durante la verificación del quorum se informó al Comité que se cumple de acuerdo con la lista de asistencia (ver lista). Walden Borja Supervisor Convenio 213 comparte al Comité que la Doctora Brasilia Romero Sinisterra, Directora de Inclusión Productiva, delega a Omar Torrijos Asesor Financiero del despacho de la DIP para representarla en esta reunión ( se anexa delegación).

Se continúa con el proceso de revisión de compromisos por parte del coordinador zonal James Arias de la Unión Temporal (UT) donde se menciona el estado de cumplimiento de estos, cómo se presenta a continuación:

| No. | COMPROMISO | FECHA | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Envío de los comentarios de los informes de enero y febrero | 23 de abril | SI |
| 2 | Envío de las novedades pendientes y de los hogares a vincular que van a reemplazar esas novedades | 23 de abril | SI |
| 3 | Envió de las actas 17 y 18 de Comité Técnico Nacional que están pendiente por la firma del Doctor Juan Manuel Erazo, adicionalmente el envío del acta 3 y 4 firmada por el Director | 23 de abril | SI |

El supervisor del convenio pide al coordinador aclarar el tema de novedades porque aún no está al 100%; Nelson Rincón Coordinador de Seguimiento UT informa que hace dos semanas se enviaron 80 cédulas de las cuales a la fecha se tienen 72 personas registradas y aprobadas e informa que en el día de hoy se hace un segundo envío con el avance y quedan pendientes 12 registros de los cuales se está consiguiendo la documentación. En este sentido, Walden Borja pregunta si las 72 personas vienen con fotocopia de cédula y acta de vinculación, a lo anterior Nelson responde que en el primer informe se enviaron 72 cédulas de las cuales se rechazaron 10 y están en proceso de conseguir la documentación faltante y en el día de hoy se enviaron 45 completos con cédula y acta de vinculación.

## 2. Avance Financiero


Oscar Rendón coordinador financiero de la UT, presenta el componente financiero con corte a 31 de marzo de 2021.

**APORTES DE RECURSOS:**

| | |
|---|---|
| Aporte Prosperidad Social | : $ 32.165.067.502,00 |
| Adiciones | : $ 0,00 |
| **Aporte Total Prosperidad Social** | **: $ 32.165.067.502,00** |
| Aporte Contrapartida UT | : $ 14.116.275.329,00 |
| **Valor Total del Convenio** | **: $ 46.281.342.831,00** |

Oscar Rendón recuerda a los asistentes que el convenio cuenta con aportes por parte de Prosperidad Social por valor de $32.165.067.502 y, por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00, cómo se presenta en el cuadro anterior. A la fecha se han recibido cuatro desembolsos por valor de $28.948.560.752 que equivalen a un 90% y está pendiente de recibir el 5° desembolso por valor de $3.216.506.750 equivalente al 10%. Cómo se presenta a continuación:

## 2. AVANCE FINANCIERO – DESEMBOLSOS

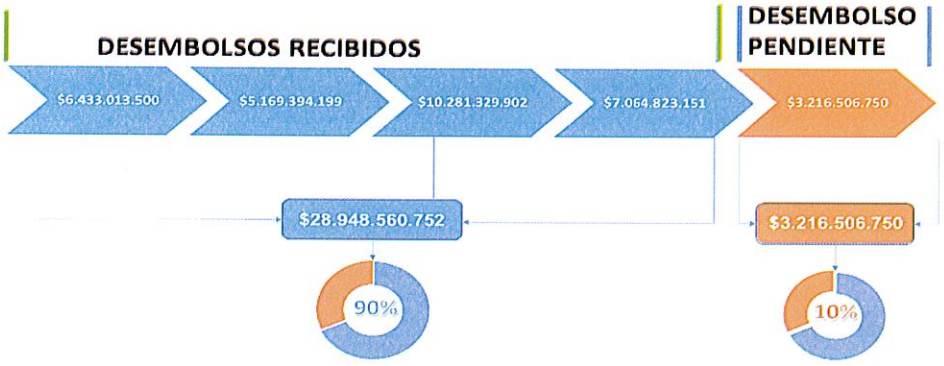


Para abril, el operador reporta que tiene un avance técnico de 84.00% y un avance de ejecución financiera del 90.00%.

**Ejecución de recursos con corte 30 de abril de 2021**

Se expone por parte del coordinador financiero de la UT la ejecución de recursos con corte 30 de abril, en el siguiente cuadro:

## 2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN

❑ **LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CORTE 30 ABRIL**

**RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL**

| Línea Presupuestal | Vr. Programado | Vr. Acumulado Legalizado Corte Diciembre 2020 | Vr Presentado a legalizar enero 2021 | Vr Presentado a legalizar febrero 2021 | Vr Presentado a legalizar Marzo 2021 | Vr Presentado a legalizar Abril 2021 | Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Abril | Vr Proyectado a legalizar Mayo 2021 (Subsanaciones) | Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Mayo | Saldo Por Legalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TALENTO HUMANO | $ 9.482.702.047,48 | $ 8.046.976.810,67 | $ 658.660.000,00 | $ 426.660.000,00 | $ 331.866.666,00 | $ 45.706.666,00 | $ 9.449.789.051,67 | $ 32.912.995,79 | $ 9.482.702.047,46 | $ 0,00 |
| 2. GASTOS OPERATIVOS | $ 4.855.714.826,00 | $ 2.502.773.551,33 | $ 278.810.975,00 | $ 1.204.440.000,00 | $ 0,00 | $ 135.124.040,49 | $ 4.521.148.566,82 | $ 334.566.912,18 | $ 4.855.714.826,00 | $ 0,00 |
| 3. INVERSIÓN | $ 15.089.600.000,00 | $ 826.009.457,00 | $ 1.314.500.976,00 | $ 1.646.452.535,97 | $ 1.838.539.749,16 | $ 229.117.979,01 | $ 5.852.623.797,14 | $ 10.137.576.202,86 | $ 15.989.900.000,00 | $ 0,00 |
| 4. COMPONENTE COMUNICACIONES | $ 62.400.000,00 | $ 0,00 | $ 38.906.140,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.804.425,00 | $ 44.200.560,00 | $ 18.199.440,00 | $ 62.400.000,00 | $ 0,00 |
| 5. SOPORTE ORGANIZACIONAL | $ 1.774.650.629,00 | $ 410.566.559,00 | $ 0,00 | $ 55.545.467,00 | $ 5.800.000,00 | $ 15.474.533,00 | $ 499.386.559,00 | $ 1.254.265.830,00 | $ 1.774.650.629,00 | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 32.165.067.502,46** | **$ 12.186.325.067,00** | **$ 2.230.972.191,00** | **$ 3.333.298.002,97** | **$ 2.175.905.415,16** | **$ 431.027.639,50** | **$ 20.357.528.314,63** | **$ 11.807.539.197,83** | **$ 32.165.067.502,46** | **$ 0,00** |
| Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS | | 37,89% | 6,94% | 10,36% | 6,76% | 1,34% | 63,29% | 36,71% | 100,00% | 0,00% |
| Porcentaje de legalización Vs Desembolso DPS | | 42,10% | 7,71% | 11,51% | 7,52% | 1,49% | 70,32% | 40,79% | 111,11% | 0,00% |

Oscar Rendón informa que a corte de diciembre se tiene un 37.89% legalizado respecto a los aportes de Prosperidad Social y respecto al cuarto desembolso el 42.10% para un total de $12.186.325.067. Adicional, por parte de la UT se envió para revisar enero $2.230.972.191, febrero $3.333.298.002, marzo $2.175.905.415 y abril 431.027.628 con ello se tiene un total de ejecutado y presentado para legalizar del 63.29% que corresponden a $20.357.527.314.

Walden Borja informa que ya se legalizó diciembre y pregunta que se necesita para avanzar con la legalización de los demás meses.

Jorge Ardila profesional apoyo del convenio informa que se ha realizado revisión exhaustiva de los comprobantes de egreso y facturas de venta de manera que correspondan con la información de las actas de entrega de enero y febrero en el tema de inversión, de igual forma, para el tema de recurso humano se está revisando que los informes sean consecuentes con los avances que se han tenido a la fecha en torno al cierre de territorio colectivo.

Adicionalmente pregunta a Oscar Rendón Coordinador Área Financiera si hay más información para enviar porque en la revisión de enero y febrero solamente se han encontrado 10 comprobantes de egreso por inversión; Oscar Rendón informa que aún falta información por enviar porque todavía hacen falta actas y se espera que para el viernes 21 de mayo se enviará más información.

## 2. AVANCE FINANCIERO - RESUMEN


❑ **LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CORTE 30 MARZO**

**RECURSOS CONTRAPARTIDA**

| Lineas Presupuestal | Vr. Programado | Vr. Acumulado Legalizado Corte Diciembre 2020 | Vr a Presentar a legalizar enero 2021 | Vr a Presentar a legalizar febrero 2021 | Vr Presentado a legalizar Marzo 2021 | Vr Proyectado a ejecutar y/o legalizar Abril 2021 | Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Abril | Vr Proyectado a legalizar Mayo 2021 (Subsanaciones) | Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Mayo | Saldo Por Legalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TALENTO HUMANO | $ 751.680.000,00 | $ 703.290.150,00 | $ 0,00 | $ 16.200.000,00 | $ 16.200.000,00 | $ 0,00 | $ 733.653.150,00 | $ 17.960.841,00 | $ 751.680.000,00 | $ 0,00 |
| 2. GASTOS OPERATIVOS | $ 776.466.677,05 | $ 111.356.161,83 | $ 286.459.000,00 | $ 112.141.677,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 509.024.778,83 | $ 267.441.898,22 | $ 776.466.677,05 | $ 0,00 |
| 3. INVERSIÓN | $ 12.588.128.652,00 | $ 96.999.999,00 | $ 4.345.739.895,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 291.000.001,00 | $ 4.733.739.895,00 | $ 7.854.391.757,00 | $ 12.588.128.652,00 | $ 0,00 |
| 4. COMPONENTE COMUNICACIONES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 5. SOPORTE ORGANIZACIONAL | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 14.116.275.329,05** | **$ 911.693.259,83** | **$ 4.631.225.895,00** | **$ 127.341.677,00** | **$ 16.200.000,00** | **$ 291.000.001,00** | **$ 5.976.460.932,83** | **$ 8.139.514.496,22** | **$ 14.116.275.329,05** | **$ 0,00** |
| Porcentaje de legalización Vs Aporte Unico Municipal | | 6,46% | 32,81% | 0,90% | 0,11% | 2,06% | 42,34% | 57,66% | 100,00% | 0,00% |

Oscar Rendón basado en el cuadro anterior informa que de la contrapartida se tienen $911.693.259 legalizado a corte diciembre y en revisión $4.631.225.895 para enero, $127.341.677 para febrero, $15.200.000 para marzo y $291.000.000 para abril con esto se llegaría a un 42.34% legalizado y en proceso de revisión y se cierra con el envío de mayo para completar el 100% de los recursos de contrapartida. Así mismo, informa que, según la gráfica adjunta, se tiene en trámite de legalización un 42.1% de abril y en trámite de revisión lo pertinente.

**Avance legalización recursos marzo - abril**

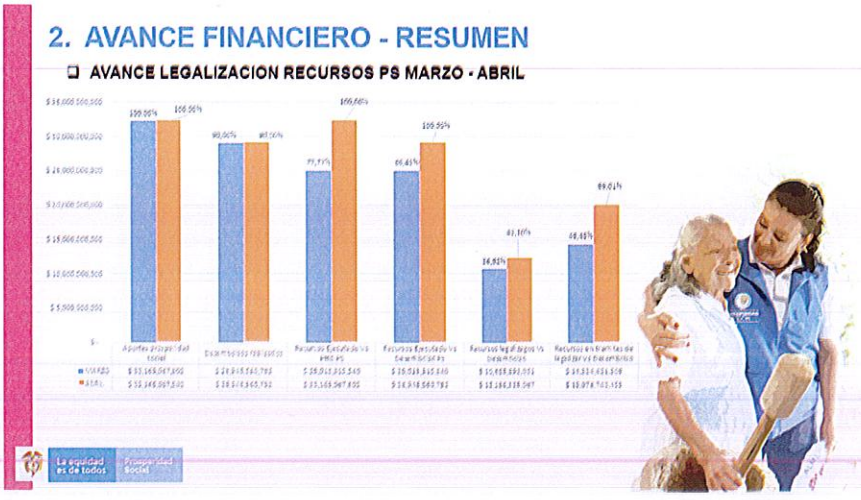


**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

**3.Avance Técnico**

Respecto al avance técnico, el coordinador zonal, informa que en la etapa de alistamiento hay 4 contratos en territorio para el equipo local con corte al 30 de abril y en el equipo zonal, 8 contratos con recursos propios del convenio. En cuanto a la rotación del equipo local en marzo se ajustó el personal al requerido para cerrar el convenio.

También informa que de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100% y en la implementación de proyectos un 92%.

| ACTIVIDAD POA | EJECUCION |
|---|---|
| CONTRATACION DE EQUIPO LOCAL | 100% |
| ALISTAMIENTO-TRANSFERENCIA | 100% |
| SOCIALIZACION CON AUTORIDADES | 100% |
| SOCIALIZACION Y CONCERTACION CON COMUNIDADES | 100% |
| VINCULACION DE HOGARES | 100% |
| CARACTERIZACION DE ENTRADA | 100% |
| ICOE DE ENTRADA | 100% |
| VISION DE DESARROLLO | 100% |
| DIAGNOSTICO COMUNITARIO | 100% |
| FICHAS DE PROYECTO | 100% |
| SOCIALIZACION DE FICHAS | 100% |
| IMPLEMENTACION DE PROYECTOS | 92% |

James Arias presenta el avance de obra y fotos en cada territorio, frente a los proyectos que tienen actividades de entrega pendientes,los cuales se presentan en los siguientes cuadros:

| MUNICIPIO | TERRITORIO | OBRA FISICA A | | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| EL CHARCO | SOCIO TAPAJE-PPC-01 | PIARA 63 M2 | DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO SOCIO TAPAJE DEL MUNICIPIO DEL CHARCO- NARIÑO. 63M2 | 79,49% |
| | | PIARA 84 M2 | DINAMIZACION DE LA ECONOMIA A TRAVES DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE, EN EL CONSEJO COMUNITARIO | 80,17% |
| | FS- UNION TAIJEÑA | CAMINO A CEMENTERIO | ADECUACIÓN DE UN CAMINO PEATONAL DE ACCESO AL CAMPO SANTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS ANCESTRALES EN EL | 69,33% |
| | PPC-UNION TAIJEÑA | PIARA 63M2 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN TAIJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 71,92% |
| | FC-TRIBUNA DE LPUEBLO | ADECUACION TIENDA | SE INCLUYE COMO SUMINISTRO | |
| | PPC-TRIBUNA DEL PUEBLO | PIARA DE 63 M2 | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA COMUNITARIA EN EL CONSEJO COMUNITARIO MENOR DEL PUEBLO 84M2 | 79,96% |
| | PPC- EL PORVENIR | PIARA 63 M2 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS DEL CONSEJO COMUNITARIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE.. 63 M2 | 79,66% |
| | FS-PROMINGA TAPAJEÑA | CUBIERTA PUESTO SALUD | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE | |
| | FC-PROMINGA TAPAJEÑA | ADECUACION TRAPICHE | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL DEL TRAPICHE DE CAÑA DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGAS TAPAJEÑA | |
| | PPC-PROMINGA TAPAJEÑA | PIARA 63 M2 | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS AGROPECUARIOS DEL CONSEJO COMUNITARIO PROMINGA TAPAJEÑA DEL MUNICIPIO DEL CHARCO NARIÑO A TRAVÉS DE LA PRODUCCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO HARTÓN Y CERDO EN PIE | 41,92% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TUMACO | PULGANDE-PPC-01 | PIARA 84 M2 | ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA PARA CEBA EN EL RESGUARDO PULGANDE CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE TUMACO. 84M2 | 53,65% |
| | | PIARA 63 M2 | ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA PARA CEBA EN EL RESGUARDO PULGANDE CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE TUMACO. PIARA 63M2 | 56,05% |
| | PEÑA ALEGRIA FSC-001 | ADECUACIÓN DE LA CASA | FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CULTURA DEL RESGUARDO PEÑA ALEGRÍA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL | |
| | LA BRAVA-FSC-001 | ADECUACIÓN 3 RESTAURANTES ESCOLARES | ADECUACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DE LAS COMUNIDADES: LA BRAVA, PILVÍ Y LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | |
| | LA BRAVA-PPC-001 | PIARAS 84 M2 | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA | |
| | LA BRAVA-PPC-001 | CENTRO DE ACOPIO 84 M2 | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA | |
| | LA BRAVA-PPC-001 | SECADEROS - MADERA MARQUESINA 35 M2 | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLAS COMO ALTERNATIVA RENTABLE DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERDO EN PIE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA BRAVA | |
| | LA BRAVA-FC-001 | ADECUACION CENTRO DE ARTESANIAS - VENTANAS, PUERTAS Y | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL COMO ALTERNATIVA PARA RESCATAR PRÁCTICAS ANCESTRALES ECONÓMICAS LA SIMBOLOGIA PROPIA EN LA GUARDIA INDIGENA DEL RESGUARDO LA BRAVA | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TUMACO | FS-INDA SABALETA | ADECUACION CENTRO DE SALUD | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE | 54,63% |
| | FC-INDA SABALETA | CENTRO DE ACOPIO | FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE MAIZ, COCO Y BOROJÓ EN EL RESGUARDO INDIGENA INDA SABALETA DEL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO | |
| | FS-INDA GUACARAY | ADECUACION CUBIERTA ESCUELA | FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO DE LOS HABITANTES DEL RESGUARDO INDA GUACARAY A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INDA GUACARAY Y LA VISIBILIDAD DE LA GUARDIA INDÍGENA. | 66,23% |
| | HOJAL LA TURBIA-FSC-001 | CASA DE PASO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO HOJAL LA TURBIA, CON LA REPARACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN. | |
| | PPC- HOJAL LA TURBIA | PIARAS 112 M2 | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA - 6 PIARA 112M2 | 70,06% |
| | | CENTRO DE ACOPIO 84M2 | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS PORCICOLA COMO ALTERNATIVA RENTABLE PARA LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA IRACA EN EL RESGUARDO LA HOJAL LA TURBIA - CENTRO DE ACOPIO | 70,06% |
| | FS-BAJO MIRA | MEJORAMIENTO CASA DE GOBIERNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 11,67% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GUAPI | PPC-RIO GUAJUI | CENTRO DE ACOPIO | FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS AGROPECUARIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO RIO GUAJUI. | |
| | PPC-ALTO GUAPI | CENTRO DE ACOPIO | FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO ALTO GUAPI | 100,00% |
| | PPC-SAN FRANCISCO | CENTRO DE ACOPIO | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE LIMÓN, CAÑA Y PLÁTANO Y LA ADECUACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO SAN FRANCISCO | |
| LA PRIMAVERA | PPC-TROMPILLO | CENTRO DE ACOPIO | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE YUCA AMARGA COMPLEMENTADO CON UN CENTRO DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL ASENTAMIENTO DEL TROMPILLO- KUWAY | 45,00% |
| | FS-TROMPILLO | CASA CULTURAL | ADECUACIÓN CASETA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL TROMPILLO - KUWAY - MUNICIPIO LA PRIMAVERA. | 35,00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO CARREÑO | PPC-CAÑO MESETAS | PIARA 84 M2 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA, 84M2 | 70,09% |
| | | PIARA 63 M2 | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDO EN PIE, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA FUENTE DE INGRESOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MESETAS DAGUA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA, 63 M2 | 71,93% |
| | PPC- CAÑO GUARIPA | PIARA 84 M2 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 84M2 | 61,04% |
| | | PIARA 63 M2 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE CERDOS EN LA LÍNEA DE CEBA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO RESGUARDO INDÍGENA CAÑO GUARIPA 63 M2 | 73,58% |

Para el Departamento de Guanía ya se encuentran entregadas todas las fichas asignadas, siendo el departamento más adelantado en el proceso de ejecución del programa.

Walden Borja pide precisar que son las cosas que hacen falta por entrega para lo cual James Arias informa que son las actividades de contrapartida como los cierres con todos los participantes como, por ejemplo, la gira con TV Agro que se realizó esta semana y se verá reflejado en la presentación del próximo mes.

Para el departamento de Nariño, se ha avanzado en el municipio del Charco y queda por hacer algunas entregas de FS y FSC. En el municipio de Tumaco está avanzando en las entregas, en este sentido, ya se hizo entrega de la ficha de Seguridad Alimentaria de Bajo Mira y Frontera y está programada la entrega de Proyecto Productivo de Bajo Mira y Frontera. El municipio de Ricaurte está afectado porque el pueblo AWA de Ricaurte y Barbacoas esta sumado a la minga indígena. También informa que las bodegas en Tumaco están al tope con los materiales para hacer las entregas al Charco y Ricaurte, pero se han visto afectadas las entregas por el paro nacional ya que las vías terrestres y fluviales están cerradas y las autoridades de estos consejos están participando activamente en el paro. No se tratará de utilizar los corredores humanitarios porque en la experiencia que tuvieron no se pudo transportar la carga con éxito y se perdieron varios animales que estaban siendo transportados.

Por último, para el departamento de Vichada, en el municipio de Cumaribo se han entregado la mayoría de los insumos de las fichas y en Primavera, se presenta un atraso en el resguardo de Trompillo, en donde se está realizando la construcción de la bodega. En el municipio de Puerto Carreño también se han hecho entregas totales y parciales a cada uno de los resguardos con la posibilidad de entregar rápidamente las piaras.

Walden Borja pide se comparta el avance al cronograma de actividades pendientes por realizar, para tener reporte a la alta dirección en tiempo real y poder hacer algún tipo de acompañamiento por parte de entidad a las actividades del mes.

A lo anterior, el coordinador zonal informa que el cronograma no se ha enviado porque el tema del paro impide tener fechas claras para las entregas, adicionalmente este tema también afectar el plazo de la prorroga porque lo que se tenia programado para hacer en 60 días, a la fecha se han perdido 19 días por el paro nacional.

Walden Borja anota que la situación es difícil y hay que ponderar, pero su deber como supervisor es evitar que haya una situación de desequilibrio económico, hacer ajustes a tiempo para que esto no se y plantear cuales serían los escenarios de acción que se podrían presentar de acuerdo con la situación que está atravesando el país.

Walden Borja propone hacer mesa de trabajo el 26 de mayo con el operador para tener el detalle por ficha de proyecto de lo que se ha entregado y se saca de la ficha solo lo que falta por entregar. Jorge Ardila pide presentar en la mesa de trabajo el formato para seguimiento de las obras civiles para tener un seguimiento pormenorizado de los avances y se muestre por cada obra locativa lo que hace falta.

En resumen, la matriz de seguimiento a los componentes del programa con corte de 30 de abril está de la siguiente manera:

- Seguridad Alimentaria al 94%
- Proyectos Productivos Comunitarios al 95.7%
- Fortalecimiento Social y Comunitario al 95.3%
- Financiamiento complementario al 89%

Jorge Ardila informa que se envió una corrección en el POA en los indicadores porque al parecer se está mostrando la fórmula de excel sobre los 14 meses que tenia el convenio, entonces se hizo una adecuación a la formula lo que hace que se disminuye el indicador global de avance al 85% y pide que Nelson Rincón revise el tema para tener los mismos indicadores técnicos.

Jorge Ardila pide información de cómo va el avance de la evaluación participativa, la encuesta de satisfacción y la caracterización de salida, los cuales son elementos de cierre y no se tiene información al respecto. Alejandro Cárdenas asesor de la UT responde que se están adelantando estos temas en todos los territorios e informa que el departamento de Guanía tiene todo terminado y los demás departamentos están esperando terminar todas las actividades para ejecutar estas tres actividades que son parte del cierre del programa en cada uno de estos territorios.

El coordinador zonal expuso la parrilla de contenidos de comunicaciones, especialmente Panorama Regional donde se reflejan las noticias de violencia de los territorios y el estado de las vías a nivel nacional afectadas por el paro nacional y el Panorama Covid del mes de abril.

**3. Otros y Varios**

Omar Torrijos expresa que espera que el tema de orden público no afecte el plazo de la prorroga y se pueda cerrar a tiempo con los compromisos adquiridos, en este mismo sentido, anota que es importante avanzar en temas documentales, hacer las entregas que hagan falta y recolectar las ultimas evidencias para que en el momento que se abran las vías se pueda culminar a tiempo.

**Compromisos:**

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar mesa de trabajo para revisar cuales son las fichas que faltan por entregar y acortar el cronograma de actividades | PS - UT | 26 de mayo |
| 2 | Envío de actas de entrega para poder avanzar en temas de inversión | UT | 21 de mayo |
| 3 | Actualizar formato con la información del avance de obras | UT | 21 de mayo |
| 4 | Retroalimentar el tema de vinculaciones en KOKAN | UT | 21 de mayo |

**PAOLA PINZON**
Representante legal UT IRACA Zona I

**WALDEN ALBERTO BORJA**
Supervisor convenio 213 Zona I

OMAR TORRIJOS CADENA
Firmado digitalmente por OMAR TORRIJOS CADENA
Fecha: 2021.06.18 14:03:04 -05'00'

**JAMES ARIAS**
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I

**OMAR TORRIJOS**
Delegado de la Directora de Inclusión Productiva

**Elaboró**: Catalina Cuadros – Apoyo a la supervisión.
**Anexo:** Correo de delegación de la Directora de Inclusión Productiva- DPS y presentación del Comité Nacional.

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.
