
BITACORA DE OBRA

sst, Inspector de Obra, 1 Almacenista, 2 Topografos
2 Cadeneros, 1 Conductor, 4 Operadores.
Equipos en obra: Motoniveladora, RetroCargador
RetroExcavadora, MiniCargador, VibroCompactador
Se realiza jornada de Aseo y limpieza
debido apestividades.

Valerio Serrano P. William sanmiguel. Maestro Pols H&O.

Sabado 01 de enero de 2022 - Festivo
Domingo 02 de enero de 2022 - Festivo
Lunes 03 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector sst, Inspector de Obra, 1 Almacenista, 2 oficios Varios, 2 Topografos.
2 Cadeneros 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Cuadrilla de Concreto, 4 conductores, 4 Operadores
Equipos de obra: Motoniveladora, RetroCargador
RetroExcavadora, MiniCargador, VibroCompactador
Se continuo con Corte y retiro de Material proveniente de la banca en Kr 12 entre 83 y Kr 13. Se realiza la Colocacion de reles para Fundido en Calle 99B y en Kr 12A entre 99 y 87.
Se recibe la visita de interventoria para la definicion del Tramo de la Calle 83b y Kr 13 ya que la tuberia de Alcantarillado queda muy Superficial y puede verse afectada en la Compactacion de Suelo Cemento. Por lo que se propone dejar la Atracado en Concreto y evitar futuros daños se deja esquema de diseño.

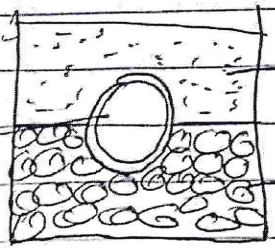

Adicional se recibe la recomendacion del

en Camisado de las Mangueras de Agua Potable que Atravieran la Calzada, las Cuales deben hacerse en tuberia Conduit de 1 1/2. la Cual fue Autorizada por el residente de interventoria Marcelo de la hoz.

Valeria Serrano P. WILLIAM SANMIENTO • Marcelo De La Hoz O.

Martes 04 de enero de 2022.
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector SST Inspector de Obra, 2 Topografos, 2 Cadeneros, 1 Almacenista 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 1 Cuadrilla concreto 4 Conductores, 4 Operadores
Equipo de Obra: Motoniveladora, Retrocargador Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador.
Se Continua con Corte y retiro de material en la Kr 12 entre Calle 85 y Kr 13.
Se realiza la instalacion de Concreto MR 45 en Carril izquierdo entre la Cll 94-87 y MR 39 en Carril 1 en Calle 99b entre 12A y 12b. Se dejan Niveles e instalados rieles para el carril 2 de la misma Calle.

Valeria Serrano P WILLIAM SANMIENTO

Miercoles 05 de enero de 2022
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector SST, Inspector de Obra, 2 Topografos, 2 Cadeneros, 1 Almacenista, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Cuadrilla de Concreto, 4 Conductores 4 Operadores
Equipos en Obra: Residente de Obra, Inspector SST Inspector de Obra. 1 Almacenista. 2 Topografos, 2 Cadeneros 1 Maestro de Obra. 1 Oficial. 1 Cuadrilla Concreto 4 Conductores 4 Operadores.
Equipos en Obra: Motoniveladora, Retrocargador Retroexcavadora

Se inicio Corte y retiro de material [illegible]
97, En Calle 89b se realiza la instalación de Concreto MR-39 de la Empresa Ultracem Con un asentamiento de 6±1.
En Kr 12A Con Calle 87 Se realiza la excavación y levante de Manhol. Abcs KO+

Valeria Serrano P WILLIAM SARMIENTO

Jueves 06 de Enero de 2022.
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector SST, Inspector de Obra, 1 Topografos, 2 Cadeneros, 1 Ayudante 1 Maestro, 1 Opicial una Cuadrilla Concreto. 6 Opicios Varios, 3 Conductores, 4 Operadores. 1 Almacenista
Equipos En Obra: Motoniveladora, Minicargador vibrocompactador, Retrocargador, Retro excavadora.
Se continua con el Corte y retiro de material proveniente de la excavación en la Diagonal 97.
En la Kr 12A entre la Calle 85b y Kr 13 se inicio con el atraque de tuberia de Alcantarillado.
En Calle 99b se realiza la instalación de Concreto para Bordillos.
En la Kr 12A Con 98 se realiza la excavacion y fundido de loso de contrapiso de manhol. en la Abcs.

Valeria Serrano P WILLIAM SARMIENTO

Viernes 07 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspectos SST Inspecto de Obra, 2 Topografo. 2 Cadenero. 1 Almacenista 1 Maestro, 1 Opicial, 3 Conductores, 4 Operadores, 1 Ayudante 6 Opicios Varios, 1 Cuadrilla Concreto.

Escaneado con CamScanner

Equipo de Obra. Motoniveladora, Minicargador Retrocargador, Vibrocompactador. Retroexcavadora
Se realiza culminacion de corte y retiro de Material en diagonal 99
en Kr 12A entre 85b y Kr 13 Se termino draque de Alcantarillado.
En Kr 12A entre 98 y 94 se realiza instalación de Concreto para bordillo.
Elaboracion de Acometidas pendientes en Kr 12A entre 94 y 87.
Perfilacion de Caja en la Kr 12A entre 87 y 86. En Kr 12A con 86 Dir Kr 12A N. 86-70 se realiza Cambio de Galapago por daño.

Valeria Serrano Pulido WILLIAM SARMIENTO

Sabado 08 de Enero de 2022
Personal en obra: Residente de Obra, Inspectos sst, Inspector de Obra, 1 Almacenista. 1 Topografo, 2 Cadeneros, 1 Maestro de Obra 1 Oficial, 3 Conductores, 4 Operadores, 1 Oficios Varios, 6 Ayudantes, 1 Cuadrilla Concreto.
Equipos en Obra. Motoniveladora, Minicargador Retrocargador, Vibrocompactador.
Se realiza Cuanto de manbal en la Kr 12A-94
Se inicio con el enconisado de Manguera 16mm en tuberia conduit de 1"1/2.
En Kr 12A entre 86 y 85b se realiza reparación 8" Novaporid y se Atraca en concreto.
En Cr 12A entre Calle 87 se realiza Cruce de pead 3" A espera de conexión por parte de triple A

Valeria Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Lunes 10 de enero de 2022.
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Inspectos SST, Topografo, Cadenero, 1 Ayudante 2 Operadores, 3 Ayudante.
Equipos en obra: Minicargador, Retrocargador.
se realiza encamisado y limpieza de Banca para instalación de Suelo Cemento
se realiza Armado de Malla para losas reforzadas.

Valerio Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Martes 11 de enero de 2022.
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Inspectos SST, Topografo, Cadenero 2 Ayudantes, 1 Maestro de Obra, 1 Cuadrillo de Concreto, 3 Operadores.
Equipos en Obra: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Minicargador.
En Tramo de la Kr 12A entre 87 y 86 se realiza la extension y Compactacion de Suelo Cemento.
en Carrera 12A entre 98 y 97 se realiza reparacion de Losas Fracturadas.
en diagonal 97 se inicio instalacion de tuberia de Alcantarillado de 8" Novafort

Valerio Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Miercoles 12 de enero de 2022
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, 1 Topografo, 2 Caderneros, 2 Oficios Varios 1 Almacenista 3 operadores, 1 Cuadrillo de Concreto, 6 Ayudantes.
Equipos en obra: Motoniveladora, Retrocargador

Se realiza la instalacion de concreto en el tramo de la calle 87 a la 86 MR-45 de la concretera Argos con un Asentamiento Maximo de 5±1. en tramo de diagonal 97 se continua con instalacion de tuberia de Alcantarillado.

Valeria Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Jueves 13 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente Tecnico, Inspector de Obra, Inspector SST, 1 Topografo, 1 Cadenero 2 Oficios Varios, 6 Ayudantes, 1 Cuadrilla Concreto, 1 Maestro de Obra, 3 Operadores en el Tramo de la Calle 87 a la 86 se realiza instalación de concreto MR-45 en Carril izquierdo de la concretera Argos. Con un Asentamiento maximo de 5±1. Adicional se deja Aislado tramo de la Abcs K0+357 K0+374 Con rieles para fundido. en tramo de diagonal se deja instalado tuberia Novaport 8" pendiente empalme a manhol existente, ya que toca remplazar tuberia de pvc de Agua potable ya que interfiere la trayectoria de la tuberia

Valeria Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Viernes 14 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector SST, Inspector de Obra, Topografo, Cadenero Almacenista, 3 Operadores, 3 Conductores, 1 Cuadrilla Concreto, 6 Ayudantes
Se realiza instalacion de concreto MR-45

excavacion e instalacion de losa de contrapiso.
Para Manhol de la Abcs KO+190.
En Kr 12A entre 87 y 86 se realizan excavaciones para registros domiciliarios.

Valeria Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Sabado 15 de enero de 2022
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector sst
Inspectos de Obra. Topografo, Cadenero, Almacenisto
3 Operadores, 2 Conductores. 1 Cuadrilla Concreto.
6 Ayudantes
se realiza la instalacion de Concreto de
MR-45 en Carril N. 2 Abcs KO+357 - KO+374
se continua con la elaboracion de registros

Valeria Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Lunes 17 de enero de 2022
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector
sst, Inspector de obra. Almacenista, Topografo
Cadenero, 3 Operadores. 1 Cuadrilla Concreto
6 Ayudantes
Equipos en obra: Motoniveladora, Vibro Compactador
Retrocargador Minicargador
Se realiza, la estabilizacion de subrasante
en tramo de la Calle 85b a Kr 13 Abcs KO+390
KO+450.
En diagonal 97 se inicia instalación de
domiciliarios 6". Adicional se continua
con la elaboracion de registros domiciliarios

Valeria Serrano P. WILLIAM SARMIENTO

Escaneado con CamScanner

Martes 18 de enero de 2022
Personal de Obra: Residente de Obra
Inspectos sst, Inspectos de Obra Topografo
Cadenero, Oficios Varios, 3 operadores
6 Ayudantes
Equipos es obra Motoniveladora minicargador,
Retrocargador Vibrocompactadores
Se continues con la estabilizacion de
Subrazante para la instalacion de
Geomalla.

Valeria Serrano P William Sanmiento

Miercoles 19 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente de Obra
Inspectos de Obra, Topografa. Cadeneros
Oficios Varios, 3 Operadores, 6 Ayudantes
1 Cuadrilla de concreto.
Se realiza la extencion de material
seleccionado sobre Geomalla y sellado
con Geotextil para instalacion de capa
de 20 cm de Suelo Cemento en tramo
de la Abcs KO+390 KO+450.
Adicional en otra Trama se Continua
con elaboracion de registros domiciliarios

Valeria Serrano P William Sanmiento

Jueves 20 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente de Obra,
Inspectos de obra, Inspectos sst,
Topografa, Cadenero, Operadores Ayudantes
En tramo de la Calle 85b A la Kr 13
Se continues con mejoramiento con

de Suelo cemento de la Abcs KO+450 Abcs+450.
En diagonal 97 se finaliza los acometidos domiciliarios que dando pendiente, reposicion de tuberia de Agua potable para empalmar Alcantarillado a Manhol.

Valerio Serrano P WILLIAM SANMIENTO

Viernes 21 de enero de 2022
Personal en Obra: Residente de Obra Inspector SST, Inspector de Obra, Ayudantes Topografos Cadenero Almacenista Operadores y Cuadrilla concreto
Se realiza la Colocacion de rieles para fundido desde la KO+374 y KO+420 en Calle 99B se realiza la conformación de Andenes para fundido
En Calle 98. se realiza la compactación de manhol.

Valerio Serrano P. WILLIAM SANMIENTO

- Sabado: 22 de enero 2022
- Personal en obra: Residente, Inspector de obra, SISO, Topografo, Cadenero, Almacenista, operadores (3), Residente Contratista pavimento, Oficios varios (1) Contratista (10)
- Actividades: Se realizó excavaciones para registros alcantarillado, Se realizó levante de registros de alcantarillado en la Carr 12A entre Call 85B y 87. Se realizó instalación de rieles para fundida del Carril derecho en la Carr 12A entre Call 85B y Carr 13; Se realizó el tendido de la manguera de 90mm en la diagonal 97

- Lunes; 24 de enero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing Residente (1); Inspector de obra (1); SISO (1); Topografo (1) Cadenero (1); Almacenista (1); operadores (3); Oficios varios (1); Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Excavaciones y levante de registros alcantarillado; Se realizó pegas de tuberia PEAD en la diagonal 97 e instalación de silletas para domiciliarias, Se realizó Conformación de anden en la Carr 12 A entre Call 97 y 98, Se realizarón apiques para descubrir las tuberias en la diagonal 97, Se realizo Corte y Figuración de acero para tapas de registros, Se inicarón excavaciones para empalmes de acueducto en la diagonal 97, Se continuo con la instalación de rieles en la Carr 12A entre Call 85B y Carr 13.

Andry Hernández B William sanmiento
Ing Residente.

- Martes; 25 de enero 2022.
- Estado del tiempo: Solcado.
- Personal en obra: Ing Residente (1); Inspector de obra (1); SISO (1); Topografo (1) Cadenero (1); Almacenista (1); Operadores (3); Oficios Varios (1); Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Excavaciones y levante de registros alcantarillado; Se continuarón Con las excavaciones de Cajas para empalmes en la Call 87 Carr 12A y en la diagonal 97; Se realizó Cerco de la banca y nivelacion final de terreno para Fundida del Carril derecho en la Carr 12 A entre Call 85B y Carr 13; Se realizó Fundida de pavimento Carril derecho Carr 12A entre Call 85 B y Carr 13; Se realizó limpieza de banca en la diagonal 97 para iniciar Con la estabilización de terreno y Conformación de la estructura de pavimento;

- Miercoles, 26 enero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing Residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operadores (3) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Se realizó instalación de rieles en el Carril izquierdo en la Carr 12 A entre Call 85 B y Carr 13; Se conformó y renivelo el terreno para la Fundida de pavimento; Se realizó Fundida de pavimento en la Carr 12 A entre Call 85B y Carr 13 (Carril Izq); Se inició con la estabilizacion de terreno (Instalación de piedra) en la diagonal 97, Se Continuo con las excavaciones para empalmes de Acueducto.

Andry Hernández B william sarmiento
Ing Residente.

- Jueves, 27 enero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operadores (3) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Se realizó instalación de rieles, nivelación de terreno, humectación y compactación de la Calzada Izquierda Carril derecho en la Carr 12A entre Call 94 y diagonal 97; Se realizó Fundida de pavimento en la Calzada Izq Carril derecho en la Carr 12 A entre Call 94 y diagonal 97; Se realizó excavación y levante de registros en la CaRR 12A entre Call 94 y 98; Se realizó Corte y figuracion de acero para elaborar tapas de registro; Se realizó excavación y levante de MH en la Carr 12A entre Call 87 y 94.

Andry Hernández B william sarmiento
Ing Residente.

- Viernes, 28 Enero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing Residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operadores (3) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades:

Excavaciones para realizar empalmes de acueducto en la Call 87 Carr 12A, Se realizó humectación de pavimento fundido el dia anterior, Se realizó instalación de rieles y cerco de suelocemento; Limpieza y conformación de via en el carril 129 Calz 120 desde la Call 94 hasta la Call 98 (Carr 12A)

Andry Hernández B william sanmiento
Ing Residente.

- Sabado, 29 enero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing Residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operadores (2) oficios varios (1) Contratista (1)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades:

Hidratacion de suelo cemento para continuar con el cereo; Cereo de banca para fundida en la Kr 12A entre diagonal 97 y Call 98; Fundida de pavimento en la Calz 120 carril derecho (Kr 12A ÷ Call 97 y 98); Excavacion, relleno y conformacion de anderes; Excavación y levant de registros de alcantarillado.

Andry Hernández B william sanmiento
Ing Residente.

- Lunes, 31 de enero 2022.
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operadores (2) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Fundida de anderes Call 99 entre Carr 12A y 13; Instalación

Fundida en la Kr 12A ÷ Call 97 y 98 (Carr der - Calz Izq); Instalación de rieles y cerco en la Kr 12A ÷ Call 87 y 94 (Calz der - Carr der); excavación para mh ubicado en la Cancha (Kr 12A ÷ diagonal 97 y Call 98); Corte y Figuración de acero para refuerzo de losas que lo requieren; Demolición y excavacion de terreno para empalmes en la diagonal 97, Excavacion para registros de alcantarillado.

Andry Hernández B William SANmiento
Ing Residente.

- Martes, 1 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operadores (2) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Fundida de pavimento Calz Izq Carril der Kr 12A entre diagonal 97 y Call 98; Fundida de pavimento Kr 12A entre Call 87 y Call 94 (Calz der Carril der); levante de mh ubicado en la cuneta, Conformación de bordillos y anden; levante de registros alcantarillado.

Andry Hernández B William SANmiento
Ing Residente.

- Miercoles; 2 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operadores (2) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Conformación y Fundida de anden; Continuación de levante de mh en la cancha; Cerco y extensión de Suelocemento en la diagonal 97; Excavación de terreno para registros; Cargue y retiro de material; levante de registros (alcantarillado); Conformación de anden y bordillos (Kr 12A ÷ Call 94 y 98).

Andry Hernández B

- Jueves; 3 de Febrero 2022.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing Residente(1) Inspector (1) SISO(1) Topografo(1) Cadenero(1) Almacenista(1) oficios Varios (1) Operadores(2) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Fundida de anderes y bordillos (KR12A ÷ Call 94 y 98); limpieza y retiro de material, excavación y levante de registros; Conformación de anderes y bordillos; Instalación y elaboración de tapas; levante de mh; relleno y Compactación alrededor de mh.

Andry Hernández B William SANMIENTO
Ing Residente.

- Jueves; 4 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente(1) Inspector(1) SISO(1) Topografo(1) Cadenero(1) Almacenista(1) oficios varios(1) operadores(2) Contratista(11)
- Interventoria: Inspector(1)
- Actividades: Fundida de anderes y bordillos; levante de registros de alcantarillado; Rellero y compactación alrededor de mh; relleno y estabilización de terreno en la diagonal 97; Conformación de anderes y bordillos; Empalme de acueducto en la Call 87 Carr 12A.

Andry Hernandez B William SANMIENTO
Ing Residente.

- Viernes; 5 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente(1) Inspector(1) SISO(1) Topografo(1) Cadenero(1) Almacenista(1) Oficios Varios(1) operadores(1) Cadenatista(11
- Interventoria: Inspector(1)
- Actividades: Conformación de anderes y bordillos; Instalación de rieles para pavimento; relleno y Compactación de Sucbocemento en la diagonal 97; hidratación de anderes y Suelo Cemento; excavacion y levante de registros (alcantarillado); Rellero y Compactación de

de acometidas de agua potable; limpieza de mh y registros.

Andry Hernández B william sanmiento
Ing Residente.

- Sabado; 6 febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) Siso (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operadores (1) oficios varios (1) Contratista (1)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Cargue y retiro de material; Fundida de andenes y bordillos Kr 12A ÷ Call 86 y 87; Cereo de via en la Kr 12A ÷ Call 87 y 94 (Calz 120 Carr Der); Relleno y Compactación de Suelo Cemento en la diagonal 97; Conformación de andenes y bordillos.

Andry Hernández william sanmiento
Ing Residente.

- Lunes; 8 de febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing Residente (1) Inspector (1) Siso (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operadores (1) oficios varios (1) Contratista (1)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Relleno de excavaciones y Compactacion; Instalación de tapas de registros de alcantarillado; Limpieza y Cargue de material de retiro; Conformación de andenes y bordillos; Fundida de andenes y bordillos Kr 12 A ÷ Call 86 y 85 B.

Andry Hernández B william sanmiento
Ing Residente.

- Martes; 9 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) Siso (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operadores (1) oficios varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Conformacion de anderes y bordillos (Kr 12A ÷ Call 85 B y 87); Continuación de Cereo y Conformación de via Kr 12 A ÷ Call 87 y 94); Cargue y retiro de material; Fundida de anderes y bordillos Kr 12A ÷ Call 87 y 85B; Instalación de acometidas de alcantarillado pendientes en la Kr 12A ÷ Call 94 y diagonal 97; Excavacion MH diagonal 97; excavación y levante de registros (Alcantarillado)

Andry Hernandez B William Sanmiento
Ing Residente.

- Miercoles; 10 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing Residente (1) Inspector (1) Siso (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operadores (1) oficios Varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Fundida de pavimento Carril der Calz 120 Kr 12A ÷ Call 87 y 94; Repello de MH y registros; Hidratación de losas de pavimento; Instalación tuberia Colector principal pendiente en la Call 94 Kr 12 A (Calz Der); Conformación anderes y bordillos (Kr 12A entre Call 86 y Carr 13; Fundida de anderes y bordillos; levante de registros alcantarillado.

Andry Hernandez B William Sanmiento
Ing Residente.

- Jueves; 11 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing Residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) oficios varios (1) Contratista (11) operadores (1)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Hidratación de placas de pavimento; Excavacion y levante de registros; Conformación de anderes; Conformación de bordillos; Jornada de Orden y aseo; Fundida de bordillos y anderes Kr 12 A entre Call 87 y 94;

Andry Hernandez B William Sanmiento
Ing Residente.

- Viernes; 12 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) oficios varios (1) Contratista (11) operadores (1)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Conformación de anderes y bordillos; Elaboración de tapas para registros (Alcantarillado); Corte y Figuración de acero para losas de pavimento que lo requieren; Cargue y retiro de material Sobrante; Conformacion de banca e instalación de niels en la Calz 128 Carril 128 Kr 12A ÷ Call 87 y 94; Jornada de orden y aseo.

Andry Hernández B William Sanmiento
Ing Residente.

- lunes; 14 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing residente (1) Inspector (1) SISO (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) oficios varios (1) Contratista (11) operadores (1)
- Interventoria: Inspector (1)

de alcantarillado; Cerco e instalación de rieles Calzada 128 Carril 12A Carr 12A entre Call 94 y diagonal 97; levante de mh y relleno en la diagonal 97; Conformación de anden y bordillos;

Andry Hernández B William Sanmiento
Ing Residente.

- Martes; 15 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente(1) Inspector(1) Siso(1) Topografo(1) Cadenero(1) Almacenista(1) operadores(1) Oficios Varios(1) Contratista(11)
- Interventoria: Inspector(1)
- Actividades: Cerco Final para Fundida en la Kr 12A entre Call 87 y 94 Calz 128 Carril 126; Se realizó Fundida de pavimento en el tramo mencionado anteriormente; Hidratación de losas Fundidas; Conformación y relleno de andenes; Instalación de rieles en la Kr 12A entre Call 94 y diagonal 97; Excavación y levante de registros de alcantarillado.

Andry Hernández B William Sanmiento
Ing Residente.

- Miercoles; 16 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing Residente(1) Siso(1) Topografo(1) Cadenero(1) Almacenista(1) Operadores(1) oficios Varios(1) Contratista(11)
- Interventoria: Inspector(1)
- Actividades: se realizó Fundida de pavimento en el Carril 128 Calz 128 Kr 12A entre Call 94 y Diagonal 97; Se realizó hidratación de pavimento Fundido; Se realizaron pruebas hidroestaticas a la tuberia de acueducto en la diagonal 97; Se realizó Conformación de bordillos y andenes; Se realizó nivelación; Cerco y instalación de rieles en la Kr 12A ÷ diagonal 97 y Call 98 (Calz 128 Carril 128); Se realizó limpieza en las bocaCalles de la 85B y 86.

Escaneado con CamScanner

- Jueves; 17 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operador (1) OF varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades Se realizó limpieza y alistamiento de terreno para Fundida de bacacalles en la Call 85B y 86; Se realizó Corte y Figura de acero para refuerzo de bacacalles; Se realizó Cerco e instalación de rieles en la K 12A entre Call 94 y Call 97. para Fundida de Pavimento; Se realizó Cargue y retiro de material; Se realizó excavación y levante de registros de alcantarillado.

Andry Hernandez B William Sanmiento
Ing Residente

- Viernes; 18 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) operador (1) OF varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Se realizó excavación y levante de registros; Se realzó Conformación de anclenes y bordillos; Se realizó Cargue y retiro de material Sobrante; Se realizó instalación de rieles; Se realizó cerco de Sueloamento.

Andry Hernández B William Sanmiento
Ing residente.

- Sabado; 19 de Febrero 2022.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing residente (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista Operador (1) OF varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Fundida de anclenes y bordillos en la K 12A ÷ Call 87 y Call 94; Instalación de rieles en la K 12A ÷ Call 97 y 98 (Calz 120 Call 120): Conformación de anclenes y bordillos

Andry Hernández B William sanmiento
Ing Residente.

- Lunes; 21 de febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing residente (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operador (1) OF varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Se realizó lavado de tubería de acueducto en la diagonal 97; Se realizó Fundida de pavimento en la Kr 12A ÷ Call 97 y 98 Calz 120 Carr 120; Se realizó toma de muestra de laboratorio por parte de triple a a la tubería de acueducto en la diagonal 97; Se realizó demolición de pavimento existente para empalme en la Carr 13 Con Carr 12A Se realizo Conformación de cinderes y bordillos.

Andry Hernandez B William sanmiento
Ing Residente.

- Martes; 22 de Febrero 2022
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing residente (1) Topografo (1) Cadenero (1) Almacenista (1) Operador (1) OF varios (1) Contratista (11)
- Interventoria: Inspector (1)
- Actividades: Se realizó instalación de rieles y cereo de Sobrecimiento en la Kr 12A entre Call 94 y diagonal 97; Se realizó instalación de rieles en la Kr 12A entre Call 97 y Call 98; Se Continuo Con la demolición de pavimento existente para empalme de tubería de alcantarillado en Kr 12A Con Kr 13; Se realizó Conformación de anden y bordillo; Se Continuo Con la excavación y levante de registros; se realizó Cargue y retiro de material Sobrante.

Andry Hernandez B William sanmiento
Ing Residente.

Escaneado con CamScanner

26/01/22

Inicio obra en el barrio santuario ubicado Cll 49E # 36 hasta Carrera 7B. Se procede a señalizar Cra 4 a Cra 5 e inicia demolicion placa de pavimento.

27/01/22

Inicio labores de demolicion placas de pavimento en el tramo de la Cra 4 - Cra 5. 70% del Tramo

28/01/22

Inicio labores se Continua con demolicion Placas pavimento Tramo Cra 4 - Cra 5 al 100%. - Se señaliza Sendero peatonal.

Escaneado con CamScanner

29/01/22

Inicio laboros retiro de piedra de la demolicion al sitio de acopia en obra Cra 3G, se Cora Cra 3G a Cra 4 para acopio del pavimento demolido

30/01/22

No se labora dia dominical.

31/01/22

Inicio laboros trasladando Material de la demolición a sitio Acopio Cra 3G, Inicio demolicion placa entre las Cra 5 a 5A (60%). Se inicia actividad corte del terreno de 0.4 mts. en la seccion via Cra 4 - Cra 5.

Escaneado con CamScanner

01/02/22

INICIO obra Retirando Material de corte a Votadero Autorizado se realizan reparaciones hidraulicas por Rotura de manguera 20mm (la mayoria de Acometidas Hidraulicas Estan Embebidas en la Placa Concreto).

02/02/22

INICIO obra Con retiro Material demolicion Placa a Votadero, demolicion 100l. del tramo CRA5-CRA5A. OBSERVACIÓN de obra: los Andenes se esta afectando Con la demolicion de las Placas, debido a que Fueron Construidos sobre la Placa de Pavimento.

Norma

Escaneado con CamScanner

03/02/22

Inicio dora actividades Retiro Material de Corte del tramo Cra 5-5A, se inicia Excavación e instalacion Tubería Alcantarillado de 8" Tramo Cra 5 a Cra 4.

04/02/22

Inicio de instalación red Alcantarillado Tramo Cra 5- Cra 4 al 50%., Con sus derivación de Acometidas de las Viviendas en Tubería Novafort 6".

05/02/22

Terminacion red Alcantarillado Tramo Cra 5a Cra 4"., e Inicio instalacion Acometidas, Fundida Fondo y levante Pamportería Foto Ubicado Cra 5,

Norma

Escaneado con CamScanner

Pellono de excavacion Con Material de sitio

Nota: las Viviendas Con Nomenclatura Cll 49E # 4B-17 Presenta caja inspección deteriorada la Cual Toda el agua Negra la estaba evacuando a la Via. esta en Concavidad genero un colchon en dicha sección.

06/02/22

No se labora dia dominical.

07/02/22

Se Continua excavaciones y Red Acometida Viviendas tramo Cra 4 - Cra 5. Se instalan las Calle Informativos Para que Vehiculos hagan respectivos Vehiculos en la zona. los Señores de gas del Caribo Visiten obra y nos dan ubicación

Norma

Escaneado con CamScanner

del Cruce de Tubería de gas 4" ubicado en la Cll 46 Cra 6 Esquina.

08/02/22

Inicio demolición Placas Tramo de la Cra 7A - 7B, cargue retiro de Material de Corte y Piedra de las Secciones demolidas. Continuan instalación Acometidas de Viviendas.

09/02/22

Inicio demolición Placa del Tramo Cra 7 - 7A, Localización de Pozo N. 2 Cra 5A, se inicia Excavación e instalación de Red Alcantarillado Tramo Cra 5A a Cra 5. En el Tramo Cra 7 - 7A se realizan 06 reparaciones Hidraulicas de 06

Mariana

Escaneado con CamScanner

viviendas, se reemplaza mangueras dañadas y unión PEAD.

10/02/22

Inicio demolición pavimento Tramo Cra 7 - 6. Continua instalación Red Alcantarillado Tramo Cra 5A - 5, Fundida fondo pozo o levanto mampostería #02, inicio fundida de Fondo y levanto Caja Inspección Cra 4 - Cra 5, demolición tramo Cra 5A - 6.

11/02/22

Retiro material demolición de placa Tramos Cra 5A - 6 - Cra 7 - 7A, levanto Caja inspección Cra 4 - Cra 5.

Escaneado con CamScanner

12/02/22

Retiro Material demolicion de los Placa Cra 7F-7B - Cra 7-6, Retiro Material Corte del tramo Cra 5A - cra 6, Tramo Cra 5A a Cra 6 se realizan 03 reparaciones hidraulica.

13/02/22

No se labora dia Dominical.

14/02/22

Inicio obra retiro Material demolicion de placas, a sitio autorizado,

15/02/22

Retiro material demolición del tramo Cra 7A-7B, se inicia red Alcantarillado Cra 6 - Cra 5A, se encuentra que la red actual de Alcantarillado esta dañado (Tubería asbesto Rota) e suspende instalación de la Red por Cruce de TUBO de 18" Agua Potable, se informa Triple A para Verificar Cotas y poder autorización e proceder a instalación.
Se informa a Interventoria del daño de la red Alcantarillado Cruce Cra 6. El Cual se decide reemplazar en 8' Novafort.

16/02/22

Inicia Corte de Material de la vía Tramos Cra 7A-7B - Cra 6-7-7A e se realiza retiro del mismo.

Norma

Escaneado con CamScanner

Se inicia limpieza Vía Tramo Cra 4 a Cra 5 del Material sobrante de Excavación Acometidas y Redes.

17/02/22

Retiro Material de Corte y demolición de placas.
Nota: en el tramo Cra 4 - a Cra 5 se levanto Tubería Alcantarillado, esto debido Filtración de Aguas negras que presentaba la zona afectada, se le informa a los señores de las Viviendas donde fue afectada la Tubería, que no sigan evacuando Aguas a la Vía. Se Conectan las Viviendas a nuevos Pozos de inspección.

Escaneado con CamScanner

18/02/22

Inicio dora excavacion - Fundida fondo y levanto pozo ubicado cra 7 a inicio Red Alcantarillado Tramo Cra 7 a Cra 6, se realiza señalizacion y demarcacion de Areas peatonales - cierre de boca calles.-

19/02/22

Se inicia dora con el cambio de Red Alcantarillado Cra 4 - Cra 5, en total fue cambiada 32 mts, los cuales fue reemplazar. se hizo ala Tubería Cama 10 cm en grava 3/4 6 atraques en concreto a cada 3 mts, se repararon 3 Acometidas en el tramo levantado. Interventoría autorizo Mejoramiento de tramo con 30 cm de Piedra en el tramo afectado.

Norma

Escaneado con CamScanner

20/02/22

Se labora este dominical, Excavación y Red de Acometidas de Viviendas del tramo Cra 7 a Cra 6.

21/02/22

Terminación cambio Red Alcantarillado Tramo Cra 4 - Cra 5, se rellena la Excavación con material de Terraplen altura de 70 cm, debido a que material de sitio no esta apto. Se inicia Compactación con Canguro.

22/02/22

Terminación Pellero y Compactación Tramo Cra 4 - cra 5. Se inicio Mejoramiento del área con piedra 30 cm en el zona afectada.

Escaneado con CamScanner

Se inicia cambio Tuboria de asbesto Cra 6,

23/02/22

Inicio cambio Tuboria Cruce Cra 6, Se colocа Piedra Cra 4 32 mts x 4 ancho, inicio cajo inspección tramo Cra 5 - Cra 5A 04 unidades

24/02/22

Inicio Pozo Cruce de la Cra 6, en el Cambio de Tubos asbesto a Novafort toco demoler Parte Pozo Existente para instalar Tubo Novafort nuevo. inicio estructura del tramo Cra 4 - Cra 5 se aplico 45 mts de Terraplen

Norma

Escaneado con CamScanner

25/02/22

Inicio Tramo Red Alcantarillado Cra 6 a Cra 5A, Con Autorización de la Triple A para pasar por debajo de Tubo Agua potable de 18" se Verificaron Cotas con topografía, las Cuales fueron Aprobadas por Triple A. Nota: en el tramo Cra 5 a Cra 5A presenta Colchones en 2 partes la Cual debe ser reemplazado el material de ~~Bolleno~~, en la zona muy Tuberia de la Triple A que presentan fugas, las Cuales fueron reparadas pero debido a que los Tubos se ~~no~~ estan muy deteriorados se siguen presentando humedades que dañan y desestabilizan el terreno.

Escaneado con CamScanner

Martes 28 de diciembra 2021.
Se inicia levantamiento sobra la calle 54D entra carreras 4 y 4a. Se continúa con el levantamiento de actas de vaindad y se realizan apiques para ubicar la tubería de agua potable y alcantarillado.
Personal en obra: Residente de obra, Topógrafo, Cadenero, 2 operadoras de maquinaria, 1 oficios varios, 1 Aux. Hsta.
Maquinaria: Minicargador, Retrocargador.

Leidys Bauzá.
Contratista

Fabian Gutierrez
Interventoría.

Miércoles 29 de diciembra 2021.
Se continúa con levantamiento topografico actas de vaindad y apiques para localización de tuberías.
Personal: Residente de obra, Topografía, Operadoras (2), 1 oficios varios, 1 aux. hsta. Maquinaria: Minicargador, retro excargadora.

Leidys Bauzá.
contratista

Fabian Gutierrez
Interventoría.

Jueves 30 de diciembre 2021
Se continua con el levantamiento topografico, apiques para reconocimiento de tuberias de acueducto y alcantarillado, se continua con las actas de vecindad.
personal: Residente de obra, Topografo Cadenero, 2 operadores de Maquinaria, 1 oficios varios, 1 SISO.

Leidys Guzon.
Contratista

Fabian Gutierrez
Interventoria

Viernes 31 de diciembre 2021
Se continua con levantamiento topografico, y construcción de actas de vecindad personal: Residente de obra, Topógrafo, Cadenero, 2 operadores de Maquinaria, 1 oficios varios, 1 SISO. Maquinaria: mini cargador, retro excavadora. Se terminan actividades a las 12:00 pm.

Leidys Guzon.
Contratista

Fabian Gutierrez

Sábado 01 de Enero de 2022
NO se programan actividades este día.

Feidys Bauzá.
Contratista

Fabian Gutierrez
Interventoría.

Domingo 02 de enero de 2022
NO se programan actividades este día.

Feidys Bauzá.
Contratista

Fabian Gutierrez
Interventoría.

Lunes 03 de enero 2022.
Se realiza reunión con la comunidad para la socialización del proyecto, se encuentra presente Interventoría y Contratista. Se inicia excavación de banca del Ko+000 - Ko+030.
Personal: Residente de obra, topografo, Cadenero, 2 operadoras de Maquinaria, oficios varios y SISO. Maquinaria: minicargador y Retroexcavadora.

Feidys Bauzá.

Fabian Gutierrez

Martes 04 enero 2022.
Se continúa con la excavación de la banca desde el K0+010 al K0+020 con ayuda de la retroexcavadora. Se realizan reparaciones domiciliarias de alcantarillado.
Personal: Residente de obra, Topografo, Cadenero, 2 operadores de maquina, 1 oficios varios, 1 siso. Maquinaria: 1 Retrocargador 1 minicargador

Judys Buzon
Contratista

Fabian Gallo
Interventor

Miércoles 05 enero 2022.
Se continúa con la excavación de la banca desde el K0+020 al K0+035 con ayuda de 1 retrocargador. Se continúa con la reparación de acometida domiciliario de alcantarillado. personal: Residente de obra, topografo, cadenero, 2 operadoras de maquina, 1 oficios varios 1 siso. Maquinaria: 1 Retrocargador 1 mini-cargador

Jueves 06 enero 2022.
Se continúa con la excaración ole la banca. Se enwentra fallo en terreno y se estabiliza con piedra rajon y Terraplén. Dimensión de fallo: 3,30m X 3,0m x 0,90m. Absuisa Ko + 046 al Ko + 049. Se realizan reparaciones de acometida de aweducto y alcantarillado.
Personal: Residente de obra, topografo, cadenero, 2 operadoras de maquinas, 1 oficios varios, 1 siso
Maquinaria: 1 Retrocargador, 1 minicargador.

Feidys Bauzdo
Contratista

Fabian Gutiérrez
Interventoría.

Vieines 07 enero 2022
Se continúa con excaración de la banca del Ko + 050 al Ko + 070. se continúa con amaglo de acometidas domiciliaria. y la construcción de Registros alcantarillados. Personal: Residente, Topografo, Cadenero, 2 operadoras de maquina, 1 oficios varios 1 siso. Maquinaria: 1 Retrocargador, 1 minicargador.

Feidys Bauzdo
Contratista

Fabian Gutiérrez
Interventoria

Sabado 08 enero 2022
Se continua con excavación de banca desde el Ko+070 al Ko+080. Se continua con la construcción de registros Sanitarios. Se continua con las reparaciones de acometidas de alcantarillado y aweducto. Personal: Residente de obra, topógrafo, Cadenero, 2 operadores de maquina, 1 oficios varias 1sisa. Maquinaria: 1 Retrocargador 1 minicargador

Feidys Bauzá. Fabian Gutierrez
Contratista Interventoría.

Domingo 09 enero 2022.
NO se programan actividades éste día.

Feidys Bauzá. Fabian Gutierrez
Contratista Inteiventoría

Lunes 10 enero 2022
NO se programan actividades éste día.
Feidys Bauzá. Fabian Gutierrez
Contratista Interventoría

Martes 11 enero 2022
Se continúa con excavación de la banca del Ko+070 - Ko+080. se continúa con la construcción de registros de alcantarillado. Se enwentra fallo en el Ko+078. se realiza estabilización de Terraplen con el Cerro. del Ko+035 al Ko+055. personal: Residente, Topógrafo, cadenero, 3 operadoras de maquinaria, 1 oficios varios, 1 siso. Maquinaria: 1 retrocargador, 1 minicargador 1 Retro excavadora 1 Vibro compactador.

Fredys Bayona
Contratista

Fabian Gutierrez
Interventoría.

Miércoles 12 enero 2022.
Se continúa con cerco de terraplén del Ko+035 al Ko+055. Se continúa con la construcción de registros de alcantarillado. se realiza acabado con pañete de registros. Se continúa con excavación de la banca de el Ko+080 al Ko+090. Se estabiliza fallo ole tramo con piedra rajón Ko+078 al Ko+080.7. dimensión: 2.70m x 3,30m x 0.90m.

Personal: Residente, topógrafo, cadenero, 1 oficios varios, 3 operadores, 1 siso.
Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 retrocargador 1 minicargador 1 vibrocompactador.

Judys Bruzón. Contratista

Fabian Gutierrez Interventoría.

Jueves 13 de Enero de 2022

En este día no se realizaron actividades.

Personal: 1 oficios varios, 3 operadores, 1 siso, topografo, cadenero.

Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 vibrocompactador

Judys Bruzón
Contratista

Mario R. Hoz O.
Interventoria

Viernes 14 de Enero de 2022

Este dia no se realizaron actividades.

Personal: 1 oficios varios, 3 operadores, 1 siso, topografo, Cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador.

Leidys Buzon
Contratista

Interventoria

Sabado 15 de Enero de 2022

Este dia no se realizaron actividades.

Personal: 1 oficios varios, 3 operadores, 1 siso, 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Leidys Buzon
Contratista

Interventoria

Domingo 16 de Enero de 2022

No se programaron actividades

Leidys Tuzon
Contratista

Manuela P. H03 O.
Interventoria

Lunes 17 de Enero de 2022

Este dia no se realizaron actividades.

Personal: 1 oficios varios, 3 operadores, 1 siso, topografo, Cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Leidys Tuzon
Contratista

Manuela P. H03 O.
Interventoria

Martes 18 de Enero de 2022

Este dia no se realizaron actividades

Personal: 1 oficios varios, 3 operadores, 1 sisto, topografo, cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador.

Leidys Tuzon
Contratista

Manuela P. H03 O.
Interventoria

Miercoles 19 de Enero de 2022

Continua la actividad de excavación de la banca desde el K0+080 hasta K0+120, se llegó a la Subrasante. Se continua las reparaciones de acometidas de acueducto.

Personal: 1 oficios varios, 2 operadores, topografo, cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Luis L. Ortiz M.
Contratista

Interventoria

Jueves 20 de Enero de 2022

Continua la actividad de excavación de la banca desde el K0+120 hasta el K0+150 con ayuda de la retroexcavadora.

Personal: 1 oficios varios, 2 operadores, topografo, cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador

Luis L. Ortiz M.
Contratista

Interventoria

Viernes 21 de Enero de 2022

Se realizó la actividad de estabilización con piedra rejón desde la abs K0+095 hasta K0+133, se encontró fallo entre las abs K0+133 hasta K0+150, se sobrexcavó 38 cm, dimensiones del fallo (0.38 x 17 x 3.30).

Personal: 1 oficios varios, 2 operadores, topografo, cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Sabado 22 de Enero de 2022

Se realizó la renivelación de la piedra, continua las actividades de reparación de tuberias sanitarias domiciliarias.

Personal: 1 oficios varios, 2 operadores, topografo, Cadenero

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 vibrocompactador

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Domingo 23 de Enero de 2022

No se programaron actividades para este dia.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Lucia L. Castaño M. — Contratista

Manuel Peña H. — Interventoria

Lunes 24 de Enero de 2022

Continua la actividad de la excavacion de la banca desde la abs K0+150 hasta K0+160, se realizo' atraque de tuberias domiciliarias.

Personal: 10 oficios varios, 1 operador, topografo, cadenero.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador.

Lucia L. Castaño M. — Contratista

Manuel Peña H. — Interventoria

Martes 25 de Enero de 2022

Continua la actividad de excavación de la banca desde la abs K0+160 hasta la K0+170, se encontró fallo entre la abs K0+165.5 hasta K0+170 con dimentiones de (4.5m x 4.4m x 0.8m), se realiza atraque de tuberias domiciliarias.

Personal: 1 oficial varios, 2 operadores, topografo, cadenero

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador

Luis F. Ustariz M.
Contratista

Mauricio Ospina H.
Interventoria

Miercoles 26 de Enero de 2022

Se realizó comité de obra entre contratista e interventoria, se observó y se trató el tema de la estabilización con piedra en fallos puntuales, Se inicia la estabilización en el fallo de las abs K0+165.5 hasta K0+170.

Personal: 1 oficial varios, 1 operadores, topografo, cadenero

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador

Luis F. Ustariz M.
Contratista

Mauricio Ospina H.
Interventoria

Jueves 27 de Enero de 2022
Se realizó la estabilización con piedra rajón en la abs K0+080 hasta K0+093, se reparó tubería principal de alcantarillado 8" averiada por el paso de la retroexcavadora.
Personal: 1oficios varios, 1operador, topografo, cadenero
Maquinaria: 1retroexcavadora, 1retrocargador, 1vibrocompactador

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Viernes 28 de Enero de 2022
En el dia de hoy se realizó repetición y reparación de tubería domiciliaria averiada por la maquinaria, esta tubería ya había sido reparada pero por el paso de la retroexcavadora sufrio aplastamiento, por lo tanto se reparó nuevamente y se le hizo un atraque en concreto (cajón), se encontró tubería de alcantarillado de 8" la cual estaba tapada y por eso los registros sufrieran rebotes, esta tubería fue repuesta. Personal: oficios varios, topografo, 1operador Cadenero.

Luis L. Ustariz M.

Interventoria

Sabado 29 de Enero de 2022

Continua la actividad de registros Sanitarios y continua la reparación de la tubería de 8", se renivela la estabilización con piedra en las abs K0+080 hasta K0+095. Personal: Oficios varios, operador, topografo, cadenero.

Luis L. Ustariz M. — Contratista

M. Ruiz H. — Interventoria

Domingo 30 de Enero de 2022

No se programó actividad para este dia.

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M. — Contratista

M. Ruiz H. — Interventoria

Lunes 31 de Enero de 2022

No se realizaron actividades.

Personal: 1 operador, topografo, oficios varios, cadenero

Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 vibro-compactador

Luis L. Ustariz M. — Contratista

M. Ruiz H. — Interventoria

Martes 1 de Febrero de 2022
Se realizó la reposición de tubería principal de alcantarillado en la abs k0+170, continua la actividad de construcción de registros sanitarios, reparación de tuberías domiciliarias, Se inició la actividad de extendida de terraplen entre las abs k0+010 y k0+025
Personal: 2 operadores, 1 topografo, 1 cadenero
Maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 minicargador, 1 vibro-compactador, 1 retrocargador.

Lucio L. Ustariz M. — Contratista
Interventoría

Miercoles 2 de Febrero de 2022
Continua la actividad de extendida de terraplén entre las abs k0+010 hasta k0+080, continua la actividad de construcción de registros para tuberías domiciliarias, inicia construcción de filtro para controlar las aguas del nivel freatico en la abs k0+170.
Personal: 2 operadores, topografo, cadenero, Oficios varios
Maquinaria: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador
Lucio L. Ustariz M. — Contratista.
Interventoría

Jueves 3 de febrero de 2022

Continua la actividad de extendida de terraplén desde la abs k0+080 hasta la k0+150, se encontró falló entre las abs k0+075 hasta la k0+095, continua la actividad de Construcción de registros para tubería domiciliaria, se realizó la compactación de terraplen desde la k0+010 hasta k0+075 y desde la k0+095 hasta la k0+150, se realiza filtro en la k0+070.

Personal: 2 operadores, oficios varios, topografo, Cadenero

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Viernes 4 de Febrero de 2022

Se inicia la actividad de extendida de suelo cemento desde la abs k0+100 hasta k0+150, se se realizó la corrección del filtro colocando tubería perforada de 8" forrada con geotextil, se realiza atraque de tuberías de 8" y domiciliaria de 4".

Personal: 2 operadores, oficios varios, topografo, cadenero

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Sabado 5 de Febrero de 2022

Se extendieron 20 ml de Suelo cemento desde K0+055 hasta K0+075, se compactaron 50ml de suelo cemento desde K0+100 hasta K0+150, se retira material de excavación de fallo en la abs K0+170, continua la actividad de construcción de registros sanitarios, se termino el filtro para control de nivel freatico.

Personal: 2 operadores, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventora

Sabado 5 de Febrero de 2022

Se extendieron 20 ml de Suelo cemento desde K0+055 hasta K0+075, se compactaron 50ml de suelo cemento desde K0+100 hasta K0+150, se retira material de excavación de fallo en la abs K0+170, continua la actividad de construcción de registros sanitarios, se termino el filtro para control de nivel freatico.

Personal: 2 operadores, topografo, Cadenero, oficios varios

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, Vibrocompactador

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Fabian Gutierrez
Interventoria

Domingo 6 de Febrero de 2022

No se realizaron actividades este dia

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, Vibrocompactador

Lunes 7 de Febrero de 2022

Se realizó la actividad de estabilización de fallo con piedra en la ABS K0+170, se extendió terraplen y suelo cemento desde la abs K0+150 hasta K0+179, en el fallo de la abs K0+075 hasta K0+095 se encontró tubería partida de 8" de alcantarillado, por esta razón el terreno está saturado.

Personal: 2 operadores, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: Retroexcavadora, mini cargador, vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M. M. Ing. Dpt. H&S O.

Contratista Interventoria

Martes 8 de febrero de 2022

Se realizó la actividad de sereo de suelo cemento entre las abs K0+150 hasta K0+174, se reparó tubería de 8" de alcantarillado en la abs K0+075.

Personal: 2 operadores, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: Retroexcavadora, mini cargador, vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M. M. Ing. Dpt. H&S O.

Contratista Interventoria

Miercoles 9 de Febrero de 2022

Se realizó la estabilización con piedra de demolición al fallo entre las abs kotogs y kot095, se realizó extensión de terraplen y suelo cemento.

Personal: 1 operador, topografo, cadenero, vibrocompactador

Maquinaria: Mini cargador, Vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Jueves 10 de Febrero de 2022

Inicio la instalación de niveles para fundida de losas de pavimento, continuan las actividades de sereo de suelo cemento, limpieza de la banca, renivelación de suelo cemento

Personal: 1 operador, topografo, cadenero, vibrocompactador

Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Viernes 11 de Febrero de 2022

- Continua la instalación de rieles para fundida de losa de pavimento, se realizó la fundida de losa de pavimento desde la abs ko+116 hasta ko+179, continua la limpieta de la banca, Corte de losas.

Personal: 1 operador, topografo, Cadenero, oficios varios

Maquinaria: minicargador, vibrocompactador

Luis F. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Sabado 12 de Febrero de 2022

Continua la instalación de rieles para fundida de losa de pavimento, continua la limpieza de la banca.

Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: minicargador, vibrocompactador.

Luis F. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Domingo 13 de Febrero de 2022

No se programaron actividades para este dia.

Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador

Luis F. Castaño A.
Contratista

Interventoria

Lunes 14 de Febrero de 2022

Se realizó la fundida de losas de pavimento entre las abs K0+116 hasta K0+090, limpieza y renivelacion de la banca, corte de losas.

Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: Minicargador, Vibrocompactador.

Luis F. Castaño A.
Contratista

Interventoria

Martes 15 de Febrero de 2022

Continua la instalación de rieles para fundida de losa de pavimento, limpieza y renivelación de la banca, extensión de terraplen y suelo cemento en la abr K0+060 hasta K0+010.

Luis F. Castaño A.

Interventoria

Miercoles 16 de febrero de 2022
Se realizó la actividad de fundida de losa de pavimento desde K0+090 hasta K0+045, renivelación y limpieza de la banca, corte de losas.
Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios
Maquinaria: micargador, vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M. — Contratista
Interventoria

Jueves 17 de Febrero de 2022
Se realizó la actividad de Fundida de losas de concreto para pavimento desde K0+045 hasta K0+13, renivelación y limpieza de la banca, corte de losas.
Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios
Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador.

Luis L. Ustariz M. — Contratista
Interventoria

Viernes 18 de Febrero de 2022
Terminó La actividad de fundido de losa de pavimento desde La abs K01000 hasta K01013 en la calle 54D entre cra 4 y M3, Corte de losas
Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios
Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador.

Lucia F. Castaño M.
Contratista

Interventoria

Sabado 19 de Febrero de 2022
Se realizó la actividad de corte de losas de pavimento, retiro de rieles, inició actividad de corte y nivelación para andenes, colocación de rieles para bordillos, limpieza de material sobrante.
Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios
Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador.

Lucia F. Castaño M.
Contratista

Interventoria

Domingo 20 de Febrero de 2022
No se realizaron actividades este dia
Maquinaria: Minicargador,

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Lunes 21 de Febrero de 2022
Continua la actividad de conformación de andenes y bordillos entre las abs K0+179 hasta K0+120.
Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios
Maquinaria: Minicargador,

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Martes 22 de Febrero de 2022
Continua la actividad de conformación de andenes y bordillos, extensión de terraplén para andenes.
Personal: 1 operador, topografo, cadenero, oficios varios
Maquinaria: Minicargador.

Luis L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Miercoles 23 de Febrero de 2022

Inicio actividad de corte y excavación en la era 4a, retiro de material de excavación.

Personal: 2 operadores, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: Retrocargador, Minicargador.

Lucia L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria

Jueves 24 de Febrero de 2022

Continua la actividad de corte y excavación en la era 4a, retiro de material de excavación, inicia la actividad de extensión de terraplen.

Personal: 2 operadores, topografo, cadenero, oficios varios

Maquinaria: Retrocargador, Minicargador

Lucia L. Ustariz M.
Contratista

Interventoria
