REPORTE

SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIROS DE REGALÍAS "SPGR"
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS "SGR"


Carrera 72 – Nro. 68-15 – Urbanización papagayo - Carepa Antioquia
Contáctenos al 322-891-73-39 / 323-359-24-85
Email: gobiernoygestiont@gmail.com

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
"SMSCE"

REPORTE MES DE FEBRERO DE 2022

En el siguiente informe se reportan las actividades que se desarrollaron con base al cierre del mes de febrero en las siguientes plataformas de Regalías y los diferentes Entes de Control.

REPORTE GENERAL DE LOS PROYECTOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS "GESPROY"

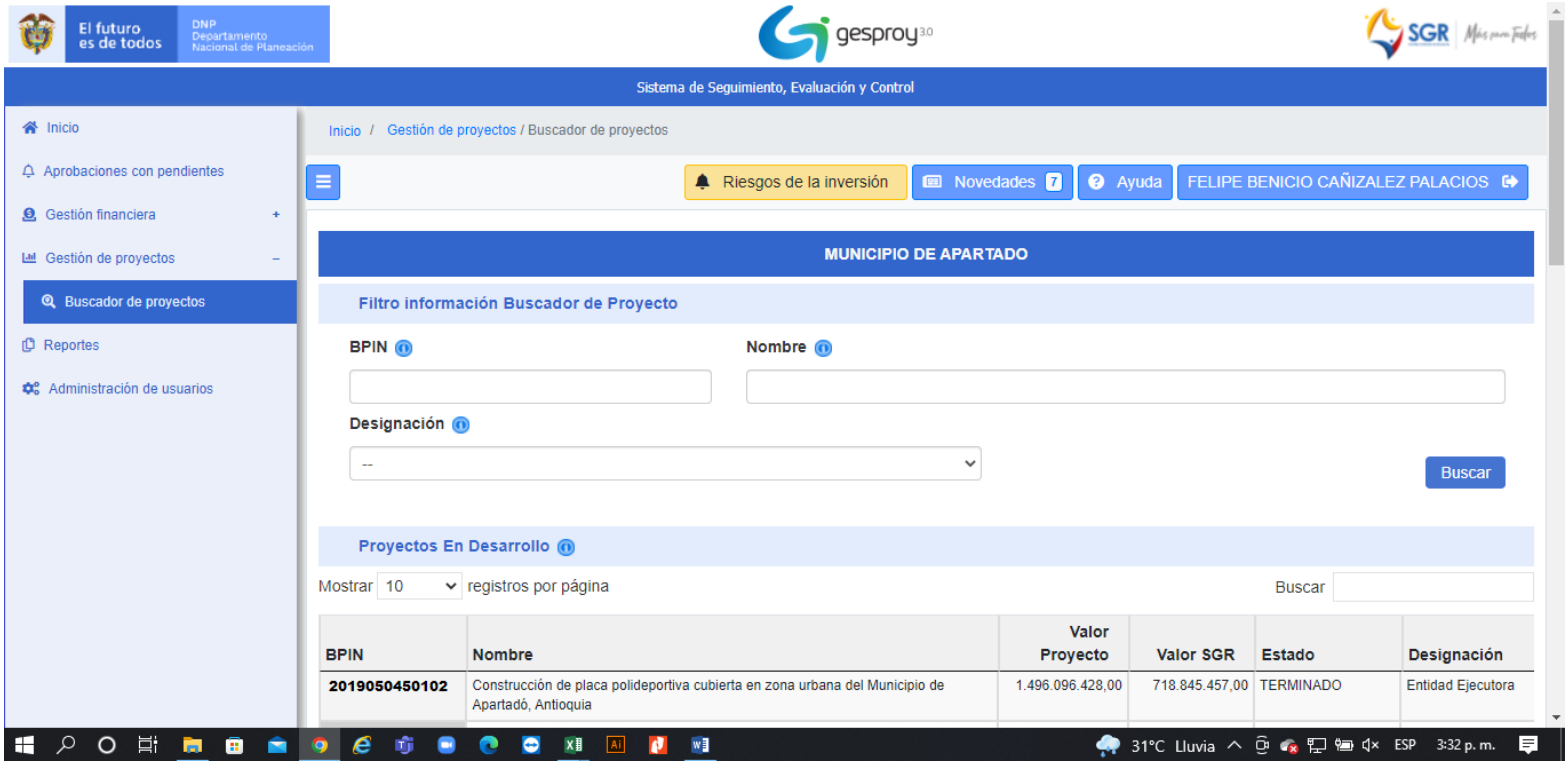


PROYECTOS EN DESARROLLO

Proyectos En Desarrollo

Mostrar 10 registros por página Buscar

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación
2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia	1.496.096.428,00	718.845.457,00	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2020000100731	Generación de plataformas de articulación de CTi+E para la reconversión económica y productiva que atiendan los efectos actuales y futuros de la emergencia económica social y ecológica causada por el covid-19 en el departamento de Antioquia	7.543.169.163,00	5.736.369.097,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2020050450048	Construcción de pavimento rígido y urbanismo en el Municipio de Apartadó Antioquia	10.397.673.176,00	5.000.000.000,00	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	Entidad Aportante Recursos
2021050450078	Construcción de la cicloinfraestructura (biosaludable educativa y deportiva) urbanismo mejoramiento vial y obras complementarias de la calle 100 en el municipio de Apartadó	17.998.323.605,00	6.000.000.000,00	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	Entidad Aportante Recursos
20181301010478	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	86.331.265.984,83	86.331.265.984,83	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó	5.098.957.370,00	5.098.957.370,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
20201301010064	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia	11.281.488.350,00	11.281.488.350,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
20201301011128	Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó	13.176.723.455,66	13.176.723.455,66	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
20201301012048	Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia	2.377.161.738,05	2.377.161.738,05	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
20211301011050	Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del	28.234.394.168,00	28.234.394.168,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora

Proyecto identificado con BPIN 2019050450102– cuyo objeto es **Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia. – por valor de $718.845.457,00** Recursos que fueron aprobados por regalías cuya fuente de financiación es el Fondo de Compensación Regional.

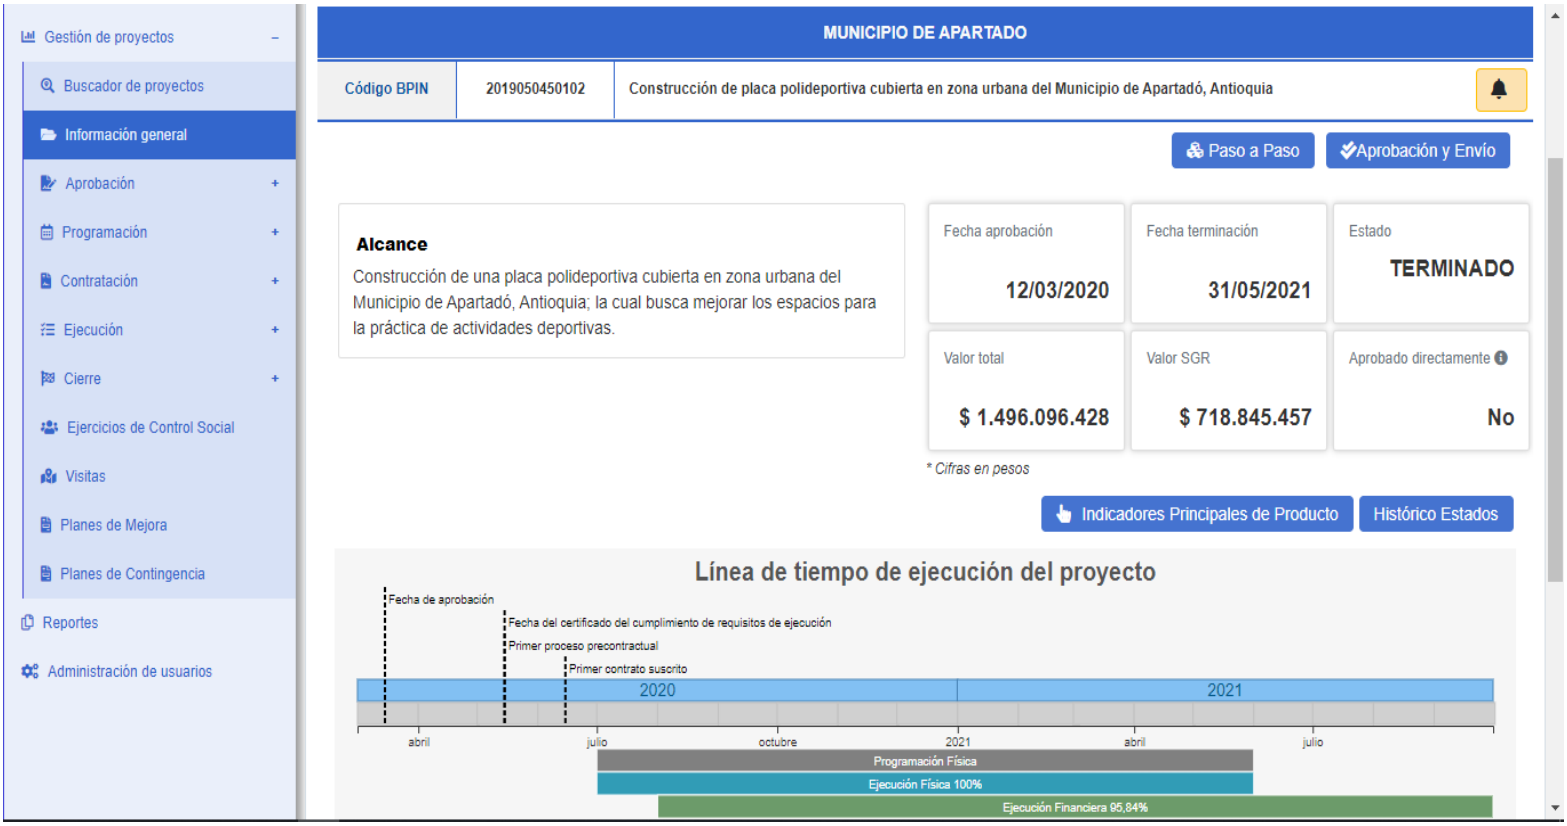

Cargue de Ejecución del Proyecto

Crear proceso de cargue masivo de Información

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	$ 1.076.910.119,00
Valor Actividades Programadas	$ 1.496.000.715,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 1.496.000.670,66

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..

Producto MGA Placa deportiva construida

Actividad MGA REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETIE 2013

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETIE 2013	und	.32	100	No		Inicial		
							Prog	1	3.800.000
							Eje	1	3.800.000

Actividad MGA REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETILAP 2013

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETILAP 2013	und	.36	100	No		Inicial		
							Prog	1	4.250.000
							Eje	1	4.250.000

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN D E PLACA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN D E PLACA - Lleno compactado con afirmado manual, incluye transporte	m3	2.09	100	No		Inicial		
							Prog	250,66	98.319
							Eje	250,66	98.319
2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada Malla electrosoldada de 6mm 15cmx15cm	Kg	.02	100	No		Inicial		
							Prog	51,04	5.434,24
							Eje	51,04	5.434,24
3	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e = 0,10 m, incluye area de seguridad y perimetro	m2	5.3	100	No		Inicial		
							Prog	697,1	89.659
							Eje	697,1	89.659
4	Construccion de bordillo en concreto de 3000 psi de 45cm x 15cm	m	.62	100	No		Inicial		
							Prog	131,17	55.580
							Eje	131,17	55.580

Actividad MGA Realizar Construcción de cimentación

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	Realizar Construcción de cimentación - Excavación en material común manual o mecánica	m3	1.06	100	No		Inicial		
							Prog	482,33	25.982
							Eje	482,33	25.982
2	Excavación en material común bajo agua de 0 - 2 m manual	m3	.06	100	No		Inicial		
							Prog	22,5	32.547
							Eje	22,5	32.547
3	Concreto de 2000 psi de limpieza e= 0,05 m	m2	.26	100	No		Inicial		
							Prog	112,5	27.026
							Eje	112,5	27.026

4	Concreto ciclópeo (3000 psi) 60:40, Para zapatas	m3	.66	100	No		Inicial			
							Prog	17	458.938	
							Eje	17	458.938	
5	Zapatas en concreto de 3000 psi, no incluye refuerzo	m3	1.75	100	No		Inicial			
							Prog	34	608.565,63	
							Eje	34	608.565,63	
6	Viga de enlace de zapatas en concreto de 3000psi, no incluye refuerzo	m3	.72	100	No		Inicial			
							Prog	13,64	623.305	
							Eje	13,64	623.305	
7	Micropilote D = 0,3 m, para malla contra impacto	m	.27	100	No		Inicial			
							Prog	24	133.169	
							Eje	24	133.169	
8	Carcamo en concreto de 2500 psi, de 41cm de ancho esterno x 28cm	m	1.2	100	No		Inicial			
							Prog	72,6	194.853	
							Eje	72,6	194.853	
9	"Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"""	Kg	7.8	100	No		Inicial			
							Prog	18.785,18	4.900	
							Eje	18.785,18	4.900	

Actividad MGA Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas - Columnas en concreto de 4000 psi, no incluye refuerzo	m3	2.07	100	No		Inicial		
							Prog	28,24	864.600
							Eje	28,24	864.600
2	Viga aérea en concreto de 4000 psi, no incluye acero	m3	.72	100	No		Inicial		
							Prog	9,07	930.421
							Eje	9,07	930.421
3	Estructura en acero A36 para Cubierta	Kg	15.26	100	No		Inicial		
							Prog	16.183	11.121
							Eje	16.183	11.121
4	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes	m2	4.34	100	No		Inicial		
							Prog	171	299.315
							Eje	171	299.315
5	Suministro e instalacion de Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon	und	.6	100	No		Inicial		
							Prog	2	3.533.083
							Eje	2	3.533.083
6	"Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3"" en tubería"	und	.03	100	No		Inicial		
							Prog	1	395.318
							Eje	1	395.318

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS - Muro en bloque de cemento de 0,14x0,19x0,39	m2	.43	100	No		Inicial		
							Prog	80,41	63.665
							Eje	80,41	63.665
2	Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa e = 0,05 m, graderia	m3	.26	100	No		Inicial		
							Prog	4	767.254
							Eje	4	767.254
3	"Pasamanos en tubería de H. G. de 2"" Cal 14, incluye accesorios"	m	.73	100	No		Inicial		
							Prog	47,34	181.879
							Eje	47,34	181.879

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - Sumibistro e instalacion de Teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica	m2	6.29	100	No		Inicial		
							Prog	894,15	82.934
							Eje	894,15	82.934
2	Suministro e instalacion de canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm	m	.68	100	No		Inicial		
							Prog	66,16	120.608
							Eje	66,16	120.608

Actividad MGA Realizar instalación de redes eléctricas

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	Realizar instalación de redes eléctricas - S.E.I de acometida para tablero TE-01 en cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 2x8+8+10 AWG	m	.03	100	No		Inicial		
							Prog	15	24.234
							Eje	15	24.234
2	S.E.I Tubería PVC 1"	m	.05	100	No		Inicial		
							Prog	72	8.762
							Eje	72	8.762
3	S.E.I Tubería PVC 2"	m	.01	100	No		Inicial		
							Prog	10	14.471
							Eje	10	14.471
4	S.E.I Contador elect. 2F-3H (120-240)V	und	.09	100	No		Inicial		
							Prog	1	1.007.371,68
							Eje	1	1.007.371,68
5	S.E.I de cable conductor monopolar sólido N 3x12 AWG	m	.52	100	No		Inicial		
							Prog	515,37	11.841
							Eje	515,37	11.841
6	S.E.I de cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 3x10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS	m	.02	100	No		Inicial		
							Prog	14	13.889
							Eje	14	13.889
7	S.E.I Tubería IMC 3/4"	m	.28	100	No		Inicial		
							Prog	115	28.975
							Eje	115	28.975
8	"S.E.I de tomacorriente doble con polo a tierra aislada a 120V en cable 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tubería EMT 3/4""""	und	.06	100	No		Inicial		
							Prog	7	93.463
							Eje	7	93.463
9	S.E.I de tomacorriente bifilar 240V en cable 3N°10 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar	und	.01	100	No		Inicial		
							Prog	1	112.706
							Eje	1	112.706
10	S.E.I. Luminaria High Bay Led 200W, 6500K, 120-277V, IP 65	und	.37	100	No		Inicial		
							Prog	12	360.596
							Eje	12	360.596
11	S.E.I de salida de iluminación 240V, en Caja 12x12x5 con tapa. Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería).	und	.14	100	No		Inicial		
							Prog	12	138.970
							Eje	12	138.970
12	"S.E.I de punta captadora tipo Franklin en acero galvanizado de 5/8"" x 60 cm. Incluye: soportería, fijación"	und	.28	100	No		Inicial		
							Prog	20	167.787
							Eje	20	167.787
13	"S.E.I de bajante en tubería IMC 3/4""""	m	.07	100	No		Inicial		
							Prog	30	28.975
							Eje	30	28.975

15	S.E.I de letrero de riesgo electrico para apantallamiento	und	.01	100	No		Prog	2	30.973
							Eje	2	30.973
16	S.E.I de cable de cobre desnudo 1/0 AWG para sistema de puesta a tierra y colas para aterrizaje de equipos	m	.41	100	No		Inicial		
							Prog	136	35.480
							Eje	136	35.480
17	S.E.I de varilla de cobre de 2,4 m de longitud y 5/8" de diámetro.	und	.09	100	No		Inicial		
							Prog	5	217.199
							Eje	5	217.199
18	S.E.I de caja de registro 400mmx400mm	und	.07	100	No		Inicial		
							Prog	3	272.145
							Eje	3	272.145

Actividad MGA REALIZAR INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	"REALIZAR INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS - Suministro e intalacion Bajante PVC agua lluvia de 4""	m	.18	100	No		Inicial		
							Prog	55,6	37.328
							Eje	55,6	37.328
2	"Suministro e instalacion de Tubería PVC 6"" (160 mm)"	m	.14	100	No		Inicial		
							Prog	38,1	44.692
							Eje	38,1	44.692

Actividad MGA Realizar la Interventoría del proyecto

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	Realizar la Interventoría del proyecto	mes	8.64	100	No		Inicial		
							Prog	1	101.916.710
							Eje	1	101.916.710
		ADMON					Inicial		

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	Realizar la Interventoría del proyecto	mes	8.64	100	No		Inicial		
							Prog	1	101.916.710
							Eje	1	101.916.710
2	ADMON Costos A.I.U	ADMON Costos A.I.U	0	0	No		Inicial		
							Prog	1	316.392.463
							Eje	1	316.392.463

Actividad MGA REALIZAR PGIO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR PGIO	und	1.27	100	No		Inicial		
							Prog	1	15.000.000
							Eje	1	15.000.000

Actividad MGA REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario
1	REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO - Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm	m	.25	100	No		Inicial		
							Prog	380	7.652
							Eje	380	7.652
2	Instalacion de truflex sobre placa deportiva, líneas de demarcación, cancha multifuncional	m2	3.79	100	No		Inicial		
							Prog	695,42	64.211
							Eje	695,42	64.211
3	Transporte de material de excavación	m3	.44	100	No		Inicial		
							Prog	284,18	18.320
							Eje	284,18	18.320

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	
1	REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO - Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm	m	.25	100	No		Inicial			
							Prog	380	7.652	
							Eje	380	7.652	
2	Instalacion de truflex sobre placa deportiva, líneas de demarcación, cancha multifuncional	m2	3.79	100	No		Inicial			
							Prog	695,42	64.211	4
							Eje	695,42	64.211	4
3	Transporte de material de excavación	m3	.44	100	No		Inicial			
							Prog	284,18	18.320	
							Eje	284,18	18.320	
4	Demolición de placa existente	m3	.77	100	No		Inicial			
							Prog	135,8	66.451	
							Eje	135,8	66.451	
5	Lleno compactado con material de sitio manual o mecánico	m3	.72	100	No		Inicial			
							Prog	327,94	25.920	
							Eje	327,94	25.920	
6	Anden en concreto de 3000 psi e = 0,08 m, incluye area perimetral de cancha y zona graderías	m2	1.52	100	No		Inicial			
							Prog	237,03	75.808	1
							Eje	237,03	75.808	1
7	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI, no incluye refuerzo	m3	.62	100	No		Inicial			
							Prog	11,56	637.440	
							Eje	11,56	637.440	
8	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 en bloque, concreto de 3000 psi	und	.06	100	No		Inicial			
							Prog	2	360.812	
							Eje	2	360.812	
9	Conformación de terreno	m2	1.13	100	No		Inicial			
							Prog	922	14.405	
							Eje	922	14.405	
10	Sub base granular	m3	.51	100	No		Inicial			
							Prog	72,63	82.129	
							Eje	72,63	82.129	
11	Piso en adoquín liso gris 40x20 sobre capa de arena	m2	3.94	100	No		Inicial			
							Prog	656,4	70.748	
							Eje	656,4	70.748	
12	Zonas duras concreto hidraulico fc= 250 Kg/cm2. Texturizado, vía peatonal	m3	2.04	100	No		Inicial			
							Prog	31,35	768.102	
							Eje	31,35	768.102	
13	Piso en loseta cuadratica prefabricada tactil alerta, 20x20 e=60mm	m2	.31	100	No		Inicial			
							Prog	31,12	116.660	
							Eje	31,12	116.660	
14	Plantación de especies vegetales forestales	und	.25	100	No		Inicial			
							Prog	40	74.492	
							Eje	40	74.492	
15	Contenedor de raíz. 100cm x 15 cm x L = 100 cm, en concreto de 2500	m	2.08	100	No		Inicial			
							Prog	145,92	168.086,57	2
							Eje	145,92	168.086,57	2
16	Borde complemento en concreto 15 cm x15 cm, de 2500 PSI	m	.46	100	No		Inicial			
							Prog	74,4	72.987	
							Eje	74,4	72.987	

17	Grama sintetica, color verde	m2	.34	100	No		Inicial		
							Prog	64,75	61.437,04
							Eje	64,75	61.437,04
18	Estructura metálica para cubierta pergola zona	Kg	2.8	100	No		Inicial		
							Prog	3.742	8.842
							Eje	3.742	8.842
19	Cubierta en policarbonato alveolar	m2	.62	100	No		Inicial		
							Prog	100	72.591
							Eje	100	72.591
20	Techo en madera de pino imunizada para pergolas	m2	.96	100	No		Inicial		
							Prog	100	113.246
							Eje	100	113.246
21	Banca en concreto de 3000 PSI tipo jardinera, incluye anclaje, formaleta	und	1.25	100	No		Inicial		
							Prog	3	4.926.029,37
							Eje	3	4.926.029,37
22	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 5M DE ALTURA, 2.5"" DE DIÁMETRO"	und	.2	100	No		Inicial		
							Prog	3	771.458
							Eje	3	771.458
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DECORATIVA PARA MONTAJE EN POSTE 80W, 6500°K, 120-277V, IP 65	und	.34	100	No		Inicial		
							Prog	3	1.345.327
							Eje	3	1.345.327
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2X20A EN TABLERO ELÉCTRICO	und	.01	100	No		Inicial		
							Prog	1	58.950
							Eje	1	58.950
26	Suministro e instalación de caneca de basura en acero inoxidable. Incluye transporte	und	.22	100	No		Inicial		
							Prog	4	650.000
							Eje	4	650.000
27	Revoque de graderías, mortero 1:4	m2	.22	100	No		Inicial		
							Prog	94,77	27.916
							Eje	94,77	27.916
28	Grama natural para zonas verdes	m2	.3	100	No		Inicial		
							Prog	115,87	30.408
							Eje	115,87	30.408
29	BANCA EN CONCRETO REFORZADO PINTADA, CON EXTERIOR AFINADO	m	.92	100	No		Inicial		
							Prog	42,6	254.445
							Eje	42,6	254.445
30	"S.E.I tuberia PVC 3/4"""	m	.05	100	No		Inicial		
							Prog	69	8.786
							Eje	69	8.786
31	suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de cable aereo trenzado triplex 2x2 + 2 Awg	m	.03	100	No		Inicial		
							Prog	22	17.514
							Eje	22	17.514
32	suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de cable antifraude 2x8 + 8 AWG.	m	.01	100	No		Inicial		
							Prog	6	21.911
							Eje	6	21.911
33	suministro e instalacion de gabinete para control de iluminacion urbana y placa polideportiva. Incluye timer semanal multivoltage, contactores 18A	und	.06	100	No		Inicial		
							Prog	1	753.391
							Eje	1	753.391

34	"suministro e instalacion de tuberia EMT 1/2"" para circuitos ramales de pergolas."	m	.02	100	No		Inicial		
							Prog	16,86	13.160,63
							Eje	16,86	13.158
35	suministro e instalacion de luminaria hermetica LED 2x18W policarbonato, IP 65, 120-240V	und	.09	100	No		Inicial		
							Prog	6	168.442
							Eje	6	168.442
36	suministro e instalacion de gabinete de distribucion principal TE-01	und	.08	100	No		Inicial		
							Prog	1	971.451,96
							Eje	1	971.451,96

Ejecución Bienes y Servicios

Crear Ejecución Bienes y Servicios

INFORMACIÓN DEL PROYECTO CERRADO

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Valor Total Contratos del proyecto: $3,630,227,631.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
270	20/10/2016	Obra pública	901019405	901019405-CONSORCIO APARTADO VIAL 2016	3,355,702,746.0	Por Aplicación	19/11/2016

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Detalle Información Contratos

Contrato No	270	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Licitación pública (Ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	901019405-CONSORCIO APARTADO VIAL 2016	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901019405	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Valor Contrato Para Proyecto	3.355.702.746,00
Fecha de Inicio	31/10/2016	Fecha Final Contractual	10/12/2017	Fecha Final Real	29/03/2018
Fecha Suscripción del Contrato	20/10/2016	Plazo Contractual	14,50 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	010/2016	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	3.355.702.746,00
Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo		
Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No	

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales — Crear Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
1	17339779	JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA	50,00	JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA	8281080
2	900456006	MANOS POR URABA S.A.S	50,00	CARLOS EDUARDO DIAZ IBARGUEN	

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Aspectos Financieros del Contrato

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1	2318	Si	Si	20/10/2016	3.355.702.746,00	2016	Construcción de pavimento en concreto	Secretaría de Hacienda	Por Aplicación	07/09/2017

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional 2016050450001	2015	Por Aplicación	07/09/2017	3.355.702.746,00	0,00
				Total Recursos Regalías	3.355.702.746,00	0,00

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
No se encontró información.						
				Total Otras Fuentes	0,00	0,00
				Total Contrato	3.355.702.746,00	0,00

No se encontró información. Anterior Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Actas del Contrato Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar


Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
Sin número del 31/10/2016	Acta de inicio	31/10/2016	Se establece como acta de inicio y se deja constancia que se cumplieron los requisitos de ley, que permiten la iniciación formal del contrato.	0,00	07/09/2017		
n/a	Acta de suspensión	30/11/2017	se decide suspender el contrato hasta tanto las condiciones climaticas sean favorables para la culminación de la obra	0,00	15/02/2018		
N/A	Acta de reinicio	26/02/2018	Luego de superar los inconvenientes se reanuda labores	0,00	13/04/2018		
Sin Número	Acta de suspensión	09/04/2018	se suspende debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona	0,00	25/05/2018		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Amparos del Contrato Crear Amparos del Contrato

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	Equidad Seguros	N. Amparo	AA026542
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADO	Tomador	CONSORCIO APARTADO VIAL 2016
Tipo Amparo	Cumplimiento		

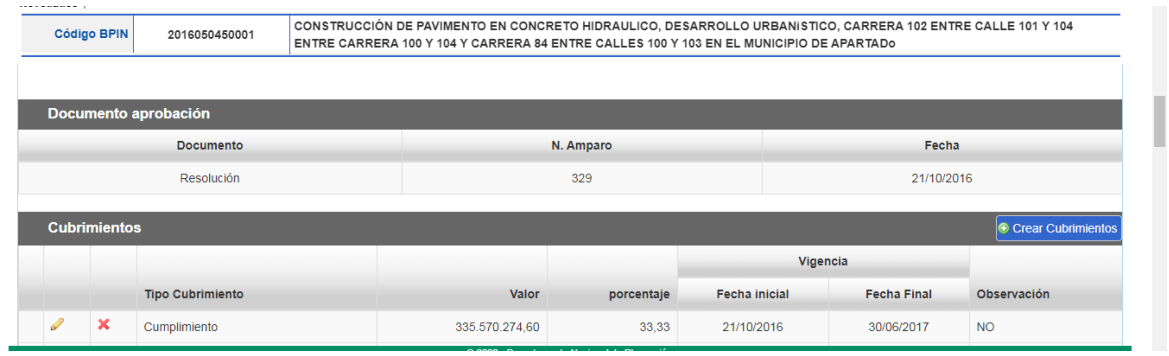


Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Resolución	329	21/10/2016

Cubrimientos — Crear Cubrimientos


			Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
						Fecha inicial	Fecha Final	
	✎	✖	Cumplimiento	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	30/06/2017	NO

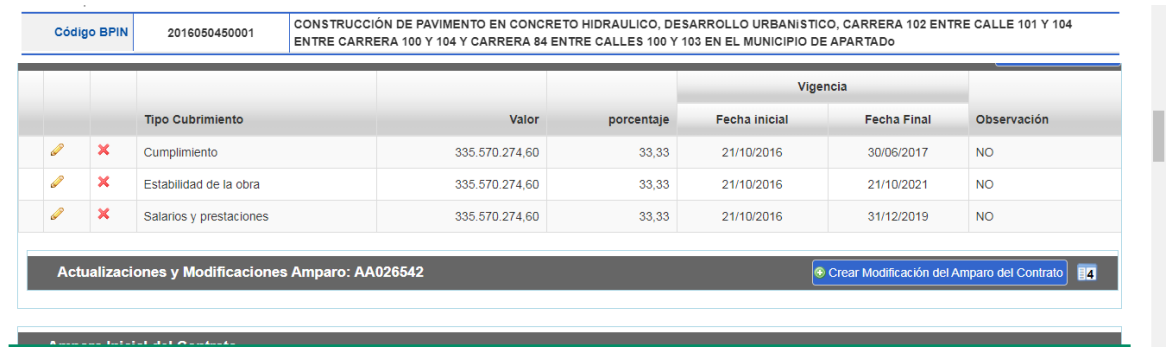

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

			Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
						Fecha inicial	Fecha Final	
	✎	✖	Cumplimiento	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	30/06/2017	NO
	✎	✖	Estabilidad de la obra	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	21/10/2021	NO
	✎	✖	Salarios y prestaciones	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	31/12/2019	NO

Actualizaciones y Modificaciones Amparo: AA026542 — Crear Modificación del Amparo del Contrato

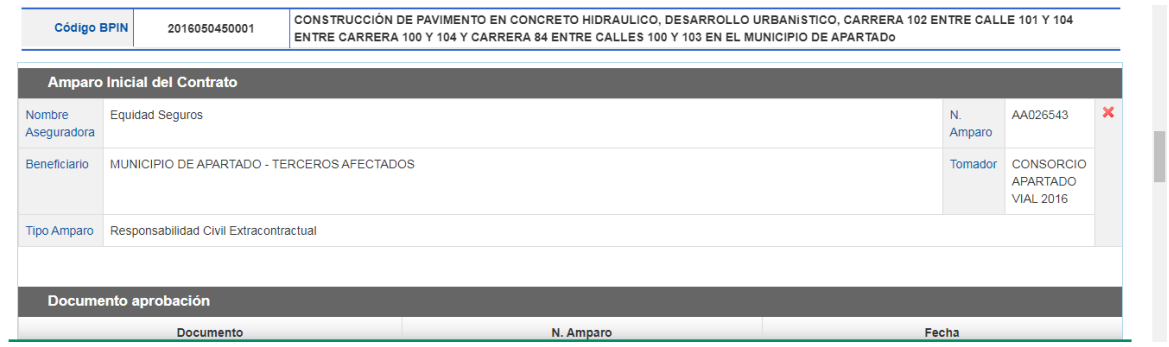

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	Equidad Seguros	N. Amparo	AA026543	✖
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADO - TERCEROS AFECTADOS	Tomador	CONSORCIO APARTADO VIAL 2016	
Tipo Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual			

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha




Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Documento	N. Amparo	Fecha
Resolución	329	21/10/2016

Cubrimientos — Crear Cubrimientos

			Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
						Fecha inicial	Fecha Final	
	✎	✖	Predios, Labores y Operaciones	275.781.600,00	100,00	21/10/2016	31/12/2016	NO

Actualizaciones y Modificaciones Amparo: AA026543 — Crear Modificación del Amparo del Contrato

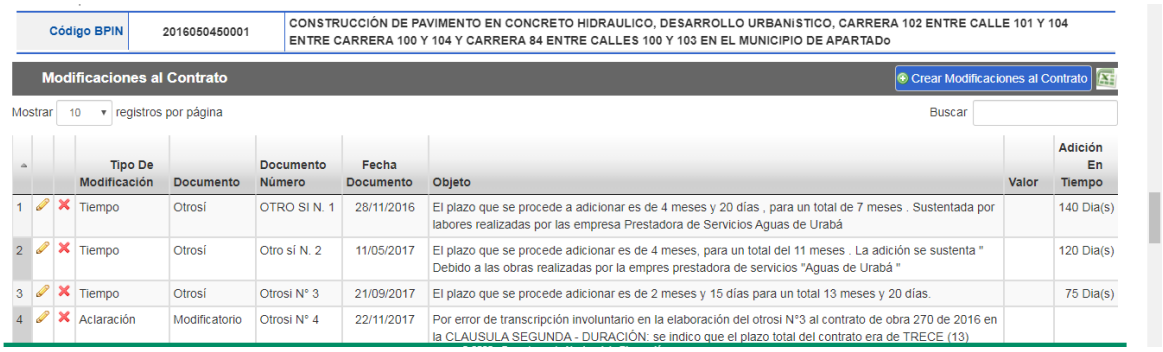


Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Modificaciones al Contrato — Crear Modificaciones al Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

			Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1	✎	✖	Tiempo	Otrosí	OTRO SI N. 1	28/11/2016	El plazo que se procede a adicionar es de 4 meses y 20 días , para un total de 7 meses . Sustentada por labores realizadas por las empresa Prestadora de Servicios Aguas de Urabá		140 Dia(s)
2	✎	✖	Tiempo	Otrosí	Otro sí N. 2	11/05/2017	El plazo que se procede adicionar es de 4 meses, para un total del 11 meses . La adición se sustenta " Debido a las obras realizadas por la empres prestadora de servicios "Aguas de Urabá "		120 Dia(s)
3	✎	✖	Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 3	21/09/2017	El plazo que se procede adicionar es de 2 meses y 15 días para un total 13 meses y 20 días.		75 Dia(s)
4	✎	✖	Aclaración	Modificatorio	Otrosi N° 4	22/11/2017	Por error de transcripción involuntario en la elaboración del otrosi N°3 al contrato de obra 270 de 2016 en la CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: se indico que el plazo total del contrato era de TRECE (13)		

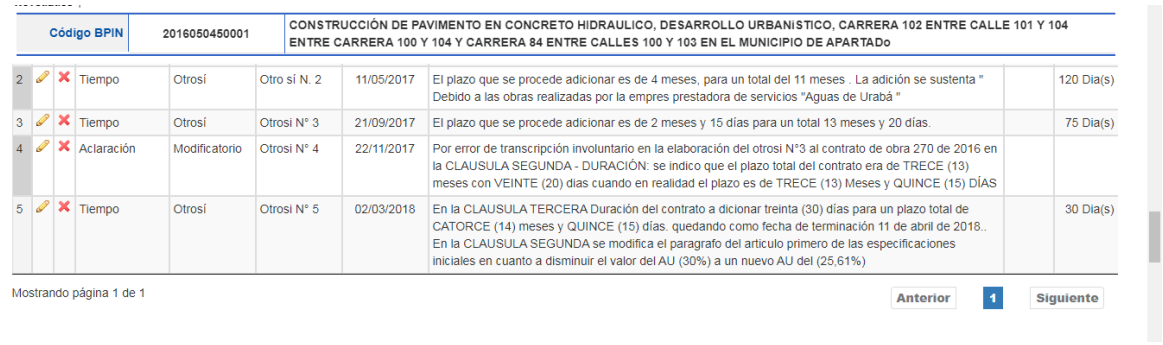

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

2	✎	✖	Tiempo	Otrosí	Otro sí N. 2	11/05/2017	El plazo que se procede adicionar es de 4 meses, para un total del 11 meses . La adición se sustenta " Debido a las obras realizadas por la empres prestadora de servicios "Aguas de Urabá "		120 Dia(s)
3	✎	✖	Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 3	21/09/2017	El plazo que se procede adicionar es de 2 meses y 15 días para un total 13 meses y 20 días.		75 Dia(s)
4	✎	✖	Aclaración	Modificatorio	Otrosi N° 4	22/11/2017	Por error de transcripción involuntario en la elaboración del otrosi N°3 al contrato de obra 270 de 2016 en la CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: se indico que el plazo total del contrato era de TRECE (13) meses con VEINTE (20) dias cuando en realidad el plazo es de TRECE (13) Meses y QUINCE (15) DÍAS		
5	✎	✖	Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 5	02/03/2018	En la CLAUSULA TERCERA Duración del contrato a dicionar treinta (30) días para un plazo total de CATORCE (14) meses y QUINCE (15) días. quedando como fecha de terminación 11 de abril de 2018.. En la CLAUSULA SEGUNDA se modifica el paragrafo del articulo primero de las especificaciones iniciales en cuanto a disminuir el valor del AU (30%) a un nuevo AU del (25,61%)		30 Dia(s)

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Contratos de Interventoría — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoría	Creado por	Fecha creación
272	21/10/2016	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	73198009	73198009-MARTELO MARTELO OSVALDO	274,524,885.0	270	Por Aplicación	07/09/2017

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo			
Contrato No	272	Tipo de Contrato	Interventoría	Modalidad de Contratación	de 2007)
Identificación del Contratista	73198009-MARTELO MARTELO OSVALDO	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	73198009	Tipo Contratista	Persona Natural
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			Valor Contrato Para Proyecto	274.524.885,00
Fecha de Inicio	31/10/2016	Fecha Final Contractual	30/09/2017	Fecha Final Real	26/02/2018
Fecha Suscripción del Contrato	21/10/2016	Plazo Contractual	13,50 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	003/2016	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	274.524.885,00
Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No		

Contratista


Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1	2326	Si	Si	21/10/2016	274.524.885,00	2016	Contrtato de interventoría 272/2016, cuyo objeto es interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción de vías urbanas en concreto rígido en el municipio de Apartado Antioquia.	Secretaría de Hacienda Municipal	Por Aplicación	07/09/2017

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

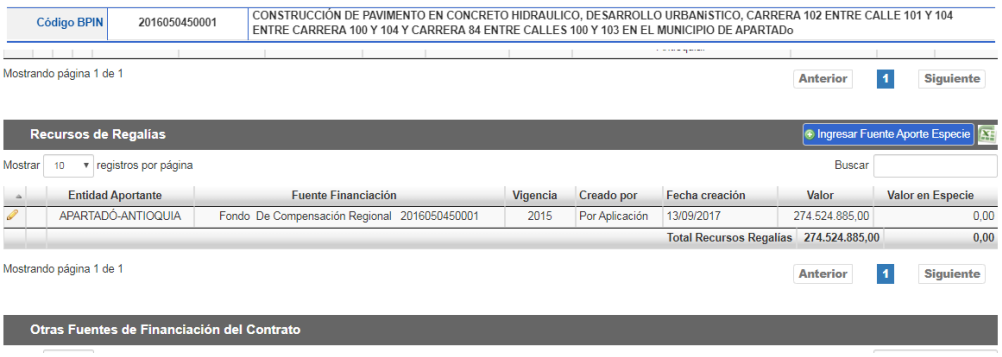

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente


Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional 2016050450001	2015	Por Aplicación	13/09/2017	274.524.885,00	0,00
				Total Recursos Regalías	274.524.885,00	0,00

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

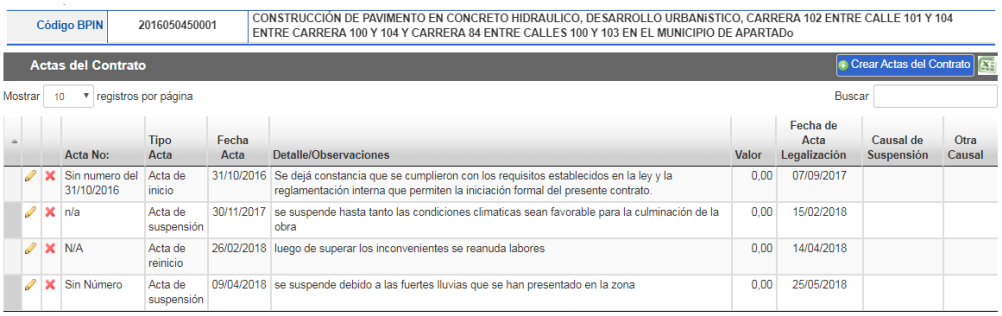

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
Sin numero del 31/10/2016	Acta de inicio	31/10/2016	Se dejá constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y la reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente contrato.	0,00	07/09/2017		
n/a	Acta de suspensión	30/11/2017	se suspende hasta tanto las condiciones climaticas sean favorable para la culminación de la obra	0,00	15/02/2018		
N/A	Acta de reinicio	26/02/2018	luego de superar los inconvenientes se reanuda labores	0,00	14/04/2018		
Sin Número	Acta de suspensión	09/04/2018	se suspende debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona	0,00	25/05/2018		

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente



Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	Equidad Seguros	N. Amparo	AA026550
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADO	Tomador	MARTELO MARTELO OSWALDO
Tipo Amparo	Cumplimiento		

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Resolución	331	21/10/2016

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Modificaciones al Contrato — Crear Modificaciones al Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1	Tiempo	Otrosí	OTRO SI N. 1	28/11/2016	El plazo que se procede a adicionar es de CUATRO (04) MESES Y (20) DIAS		140 Dia(s)
2	Tiempo	Otrosí	OTRO SI 2	11/05/2017	El plazo que se procede a adicionar es de CUATRO (04) MESES para un Plazo total de ONCE (11) MESES		120 Dia(s)
3	Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 3	21/09/2017	El plazo que se procede adicionar es de 2 meses y 15 días para un total 13 meses y 15 días.		75 Dia(s)
4	Aclaración	Modificatorio	Otrosi N° 4	02/03/2018	Por error de transcripción involuntario del otrosi N°3 se indico que se adicionaba DOS (2) meses y QUINCE (15) cuando en realidad el plazo es de DOS (2) meses y DIEZ (10) días con un plazo total de TRECE (13) Meses y DIEZ (10) DÍAS, se procede adicionar TREINTA (30) días más para un Plazo total		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No se encontró información.

Anterior Siguiente

Circunstancias Excepcionales — Crear Circunstancias Excepcionales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Tipo Circunstancia	Tipo Acto Administrativo	No. Acto Administrativo	Fecha
No se encontró información.			

No se encontró información.

Anterior Siguiente

Cargue Masivo Actividades del Contrato

Proyecto cerrado - identificado con BPIN 2019050450102 – cuyo objeto es **Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia. – por valor de $ 1.076.910.119,00 recursos que fueron aprobados por Regalías Fondo de Compensación Regional "FCR" y Recursos Propios**

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Aporte
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional	2019	718.845.457,00
		Subtotal Fuentes de Financiación SGR :	718.845.457,00

Otras Fuentes de Financiación


Entidad Aportante	Fuente	Incluida SUIFP	Valor Aporte
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Propios	Si	358.064.662,00
		Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :	358.064.662,00
		Subtotal Otras Fuentes de Financiación No Aprobadas :	0,00
		Valor Proyecto Aprobado :	1.076.910.119,00
		Valor Total del Proyecto :	1.076.910.119,00

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Ajustes en el Valor del Proyecto

Valor Total Proyecto	Fecha Operación	Operación
1.076.910.119,00	01/03/2020	Inserción
431.417.750,00	22/03/2020	Modificación
1.076.910.119,00	17/05/2020	Modificación

Recursos vs Pagos




Fuente	Aporte	Pagado
A - APARTADÓ-ANTIOQUIA	1.076.910.119,00	0,00

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia



Programación vs Ejecución

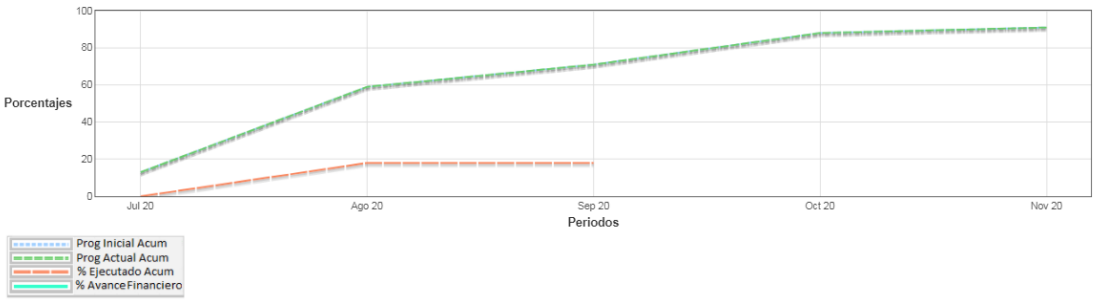

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

% Avance Financiero

Periodo	Prog Inicial Acum	Prog Actual Acum	% Ejecutado Acum	% Avance Financiero
Jul-20	13,34	13,34	0,00	0,00
Ago-20	58,66	58,66	17,67	0,00
Sep-20	70,81	70,81	17,67	0,00
Oct-20	87,58	87,58		
Nov-20	91,39	91,39		

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página Buscar

Objetivo Específico	Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicio Meta	Año Fin Meta	U. Indicador	Vlr Meta	Avance Indicador	% Ejecutado
Mejorar los espacios para la práctica de actividades deportivas	Placa deportiva construida	Número de placas deportivas	1	Placa polideportiva construida	2020	2020	Número	1,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Información Ejecución : Proyecto con retrasos en la ejecución debido a que se programó su terminación en el mes de september de 2020. Verifique el estado real de la ejecución y de ser necesario reprograme el mes de terminación de su proyecto.

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Información Representante Legal — Crear Información Representante Legal

	Nombres	Apellidos	Documento	Número ID	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Estado Contacto
1	FELIPE BENICIO	CAÑIZALEZ PALACIOS	Cédula de Ciudadanía	71253245	8280175	3215360179	alcalde@apartado.gov.co	Activo

Información Contactos — Crear Información Contactos

	Nombre	Documento	Número ID	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Estado contacto	Tipo Contacto
1	ORLET TORRES IBARRA	Cédula de Ciudadanía	71984546	8280175	3014377057	bancoproyectos@apartado.gov.co	Activo	Enlace Oficina Planeación

ACUERDO DE APROBACIÓN

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Acuerdo aprobación

Se informa a las entidades ejecutoras de proyectos del SGR que considerando que a partir del 23/06/2015 la información de las variables Fecha de Aprobación, Número de Acuerdo de Aprobación y OCAD migran al aplicativo GESPROY-SGR desde SUIFP-SGR, para los proyectos aprobados a partir de dicha fecha, tales variables se verán reflejadas en Gesproy-SGR y no se solicitará su diligenciamiento.

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Número Acuerdo	Fecha Acuerdo	OCAD	SUIFP SGR
4	12/03/2020	Municipal - APARTADO	Si

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Acuerdos de Aprobación de Ajustes

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Solicitud					Aprobación		Tipo de Ajuste					
No	Tipo	Fecha	Fecha	Fecha	Número		Disminución en Cantidad de Beneficiarios	Reducción Meta Indicadores o	Modificación Fuentes de	Incrementos hasta 50% en Valor Inicial	Disminución menor al 50% en Valor Inicial	Cambio en el Nombre del Proyecto o

CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Cumplimiento Requisitos para Contratación — Crear Cumplimiento Requisitos para Contratación

Mostrar 10 registros por página — Buscar

			Fecha	Número del Documento o Radicado	Cumplimiento	OCAD
1			26/05/2020	sin número	Total	Municipal - APARTADO

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Histórico de Modificaciones Cumplimiento de Requisitos

Fecha	Número Documento	Cumplimiento	Ocad	Fecha Modificación	Tipo Modificación	Usuario
26/05/20	sin número	Total	APARTADO	02/06/20	Inserción	Orlet
26/05/20	sin número	Total	APARTADO	02/06/20	Actualización	Orlet
26/05/20	sin número	Total	APARTADO	02/06/20	Eliminación	Aplicación
29/05/20	sin número	Total	APARTADO	02/06/20	Actualización	Orlet
29/05/20	sin número	Total	APARTADO	29/05/20	Inserción	Orlet

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Fuentes de Financiación


Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Especie	Valor Aporte	%	Saldo Aportes	Saldo Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional	2019	0,00	718.845.457,00	66,75	0,00	0,00
		Subtotal Fuentes de Financiación SGR :	0,00	718.845.457,00	66,75	0,00	0,00

Otras Fuentes de Financiación

Entidad Aportante	Fuente	Incluida SUIFP	Valor Especie	Valor Aporte	%	Saldo Aportes	Saldo Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Propios	Si	0,00	358.064.662,00	33,25	0,00	0,00
		Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :	0,00	358.064.662,00	33,25	0,00	0,00
		Subtotal Otras Fuentes de Financiación No Aprobadas :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Proyecto Aprobado :	0,00	1.076.910.119,00	100,00	0,00	0,00

VALOR COMPROMETIDO

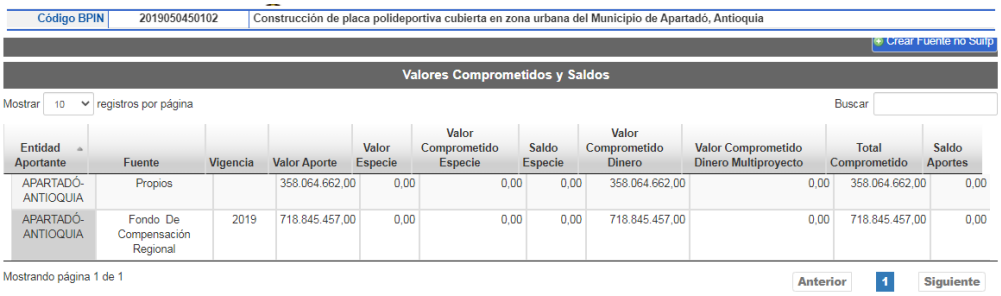

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Crear Fuente no SUIFP


Valores Comprometidos y Saldos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Aporte	Valor Especie	Valor Comprometido Especie	Saldo Especie	Valor Comprometido Dinero	Valor Comprometido Dinero Multiproyecto	Total Comprometido	Saldo Aportes
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Propios		358.064.662,00	0,00	0,00	0,00	358.064.662,00	0,00	358.064.662,00	0,00
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional	2019	718.845.457,00	0,00	0,00	0,00	718.845.457,00	0,00	718.845.457,00	0,00

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

RUBROS PRESUPUESTAL

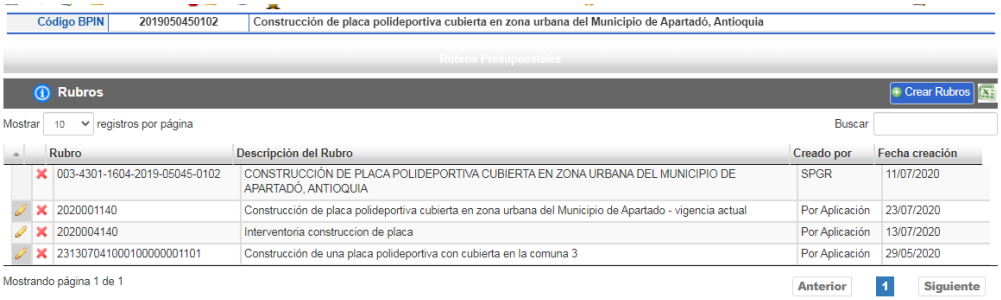

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Rubros Presupuestales

Rubros — Crear Rubros

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Rubro	Descripción del Rubro	Creado por	Fecha creación
003-4301-1604-2019-05045-0102	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA	SPGR	11/07/2020
2020001140	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartado - vigencia actual	Por Aplicación	23/07/2020
2020004140	Interventoria construccion de placa	Por Aplicación	13/07/2020
23130704100010000000l101	Construcción de una placa polideportiva con cubierta en la comuna 3	Por Aplicación	29/05/2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

DECRETO DE INCORPORACIÓN



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia


Incorporación Presupuestal del Proyecto

Incorporación Presupuestal MUNICIPIO DE APARTADO Nit : 890980095 — Incorporación Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Vigencia	Fuente	Rubro - Descripción	Valor Incorporado	Número del Acto Administrativo	Fecha de Acto Administrativo	Aplica Vigencia Futura	Número de Autorización de Vigencia Futura	Creado por	Fecha creación
2019	Fondo De Compensación Regional	003-4301-1604-2019-05045-0102 CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA	259.853.384,34	4	12/03/2020	No		SPGR	11/07/2020
2020	Fondo De Compensación Regional	2020001140 Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartado - vigencia actual	385.638.984,66	154	03/04/2020	No		Por Aplicación	23/07/2020
2020	Fondo De Compensación Regional	2020004140 Interventoria construccion de placa	73.353.088,00	154-	03/04/2020	No		Por Aplicación	13/07/2020
2020	Propios	23130704100010000000l101 Construcción de una placa polideportiva con cubierta en la comuna 3	358.064.662,00	065	14/02/2020	No		Por Aplicación	12/06/2020

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD

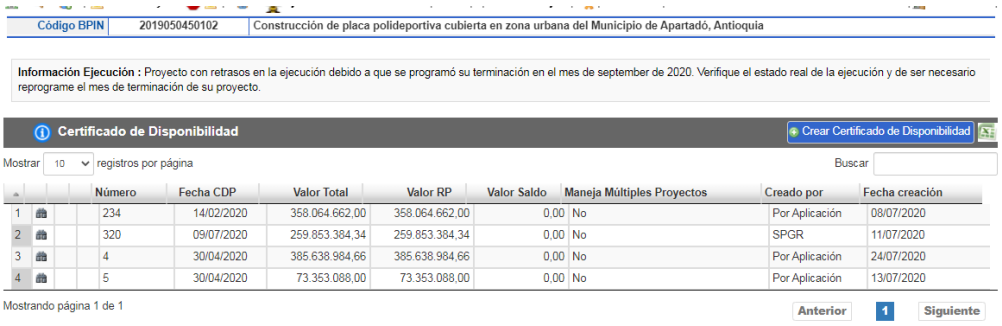

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Información Ejecución : Proyecto con retrasos en la ejecución debido a que se programó su terminación en el mes de september de 2020. Verifique el estado real de la ejecución y de ser necesario reprograme el mes de terminación de su proyecto.


Certificado de Disponibilidad — Crear Certificado de Disponibilidad

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Número	Fecha CDP	Valor Total	Valor RP	Valor Saldo	Maneja Múltiples Proyectos	Creado por	Fecha creación
1	234	14/02/2020	358.064.662,00	358.064.662,00	0,00	No	Por Aplicación	08/07/2020
2	320	09/07/2020	259.853.384,34	259.853.384,34	0,00	No	SPGR	11/07/2020
3	4	30/04/2020	385.638.984,66	385.638.984,66	0,00	No	Por Aplicación	24/07/2020
4	5	30/04/2020	73.353.088,00	73.353.088,00	0,00	No	Por Aplicación	13/07/2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

PROGRAMACIÓN PRECONTRACTUAL

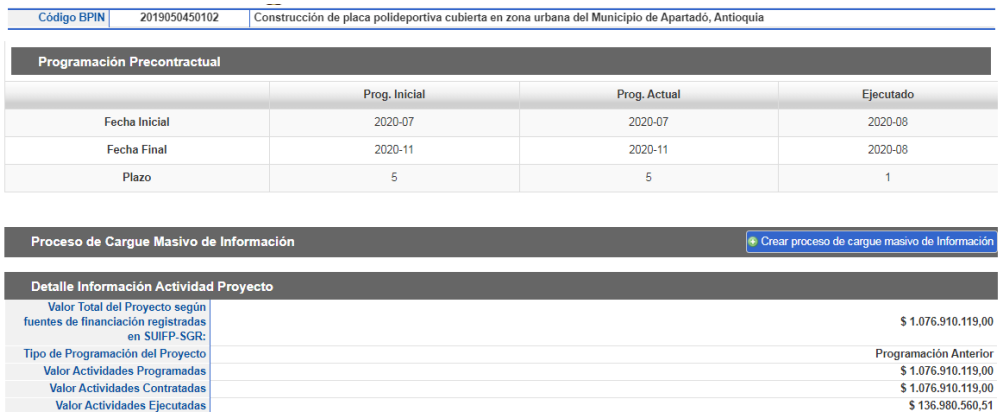

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Programación Precontractual

	Prog. Inicial	Prog. Actual	Ejecutado
Fecha Inicial	2020-07	2020-07	2020-08
Fecha Final	2020-11	2020-11	2020-08
Plazo	5	5	1

Proceso de Cargue Masivo de Información — Crear proceso de cargue masivo de Información

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto según fuentes de financiación registradas en SUIFP-SGR:	$ 1.076.910.119,00
Tipo de Programación del Proyecto	Programación Anterior
Valor Actividades Programadas	$ 1.076.910.119,00
Valor Actividades Contratadas	$ 1.076.910.119,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 136.980.560,51

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de contratación actual..

Producto MGA Placa deportiva construida

Actividad MGA REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETIE 2013

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETIE 2013	und	.47	0	No		Inicial		
							Prog	1	4
							Cont	1	4
							Eje		

Actividad MGA REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETILAP 2013

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR CERTIFICACIÓN BAJO NORMA RETILAP 2013	und	.53	0	No		Inicial		
							Prog	1	4
							Cont	1	4
							Eje		

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN D E PLACA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN D E PLACA - lleno compactado con afirmado manual , incluye transporte	m3	2.66	81	No		Inicial		
							Prog	205	
							Cont	205	




Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN D E PLACA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN D E PLACA - lleno compactado con afirmado manual , incluye transporte	m3	2.66	81	No		Inicial		
							Prog	205	
							Cont	205	
							Eje	166,04	9
2	Suministro e Instalaclon de Malla electrosoldada Malla electrosoldada de 6mm 15cmx15cm (Área graderías)	Kg	1.85	0	No		Inicial		
							Prog	3.269	
							Cont	3.269	
							Eje		
3	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e= 0,10 m, incluye area de seguridad y perímetro	m2	8.53	0	No		Inicial		
							Prog	1.021	
							Cont	1.021	
							Eje		
4	Construccion de bordillo en concreto de 3000 psi de 45cm x 15cm	m	1.41	0	No		Inicial		
							Prog	243	
							Cont	243	
							Eje		

Actividad MGA Realizar Construcción de cimentación

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
							Inicial		

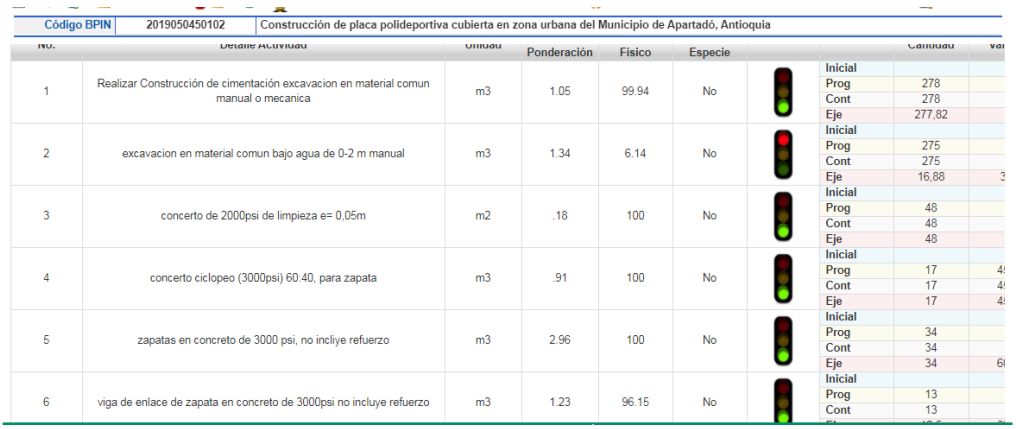

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	Realizar Construcción de cimentación excavacion en material comun manual o mecanica	m3	1.05	99.94	No		Inicial		
							Prog	278	
							Cont	278	
							Eje	277,82	
2	excavacion en material comun bajo agua de 0-2 m manual	m3	1.34	6.14	No		Inicial		
							Prog	275	
							Cont	275	
							Eje	16,88	3
3	concerto de 2000psi de limpieza e= 0,05m	m2	.18	100	No		Inicial		
							Prog	48	
							Cont	48	
							Eje	48	
4	concerto ciclopeo (3000psi) 60:40, para zapata	m3	.91	100	No		Inicial		
							Prog	17	4
							Cont	17	4
							Eje	17	4
5	zapatas en concreto de 3000 psi, no incliye refuerzo	m3	2.96	100	No		Inicial		
							Prog	34	
							Cont	34	
							Eje	34	6
6	viga de enlace de zapata en concreto de 3000psi no incluye refuerzo	m3	1.23	96.15	No		Inicial		
							Prog	13	
							Cont	13	



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

5	zapatas en concreto de 3000 psi, no incliye refuerzo	m3	2.96	100	No		Prog	34	
							Cont	34	
							Eje	34	6
6	viga de enlace de zapata en concreto de 3000psi no incluye refuerzo	m3	1.23	96.15	No		Inicial		
							Prog	13	
							Cont	13	
							Eje	12,5	6
7	micropilote D= 0,3 m para malla contra impacto excavacion manual	m	.38	0	No		Inicial		
							Prog	24	
							Cont	24	
							Eje		
8	carcamo en concreto de 2500 psi, de 41cm de ancho externo x 28cm de profundidad externo, incluye refuerzo	m	1.33	0	No		Inicial		
							Prog	64	
							Cont	64	
							Eje		
9	"acero Fy = 60.000 psi d>1/4"""	Kg	8.66	100	No		Inicial		
							Prog	14.489,86	
							Cont	14.489,86	
							Eje	14.489,86	

Actividad MGA Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas - columnas	m3	2.56	19.5	No		Inicial		
							Prog	26	

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia						
1	Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas - columnas en concreto de 4000 psi, no incluye refuerzo	m3	2.56	19.5	No		Inicial Prog Cont Eje	 26 26 5,07
2	viga area en concreto de 4000 psi, no incluye acero	m3	.94	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 9 9
3	estructura en acero A36 para cubierta	Kg	19.54	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 16.183 16.183
4	malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	8.13	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 219 219
5	suministro e instalacion de porteria multiple fija, incluye malla 100% nylon color negra entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (incluye suministro e instalacion)	und	.77	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 2 2
6	"suministro e instalacion parales de voleibol (incluye parales 3"" en tuberia con malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metalica "	und	.04	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 1 1

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia						
No.	**Detalle Actividad**	**Unidad**	**% Ponderación**	**% Avance Físico**	**Aporte Especie**			**Cantidad**
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS - Muro en bloque de cemento de 0,14x0,19x0,39	m2	.8	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 88 88
2	Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa e = 0,05 m, gradería	m3	.38	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 4 4
3	"Pasamanos en tubería de H. G. de 2"" Cal 14, Incluye accesorios"	m	.82	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 45 45

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

No.	**Detalle Actividad**	**Unidad**	**% Ponderación**	**% Avance Físico**	**Aporte Especie**			**Cantidad**
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - Sumibístro e instalacion de Teja arquitectónica	m2	9.92	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 953,77 953,77
2	Suministro e instalacion de canal en lámina galvanizada cal. 20	m	.98	0	No		Inicial Prog Cont	 66 66

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia						
1	Realizar instalación de redes eléctricas - S. E. I de acometida para tablero TE-01 en cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 2x8+8+10 AWG UBRE DE HALÓGENOS . Para circuitos ramales	m	.05	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 15 15
2	"S.E.I Tubería PVC 1"""	m	.09	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 65 65
3	"S.E.I Tubería PVC 2"""	m	.02	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 10 10
4	S .E . 1 de tablero eléctrico TE-01. Incluye: Tablero eléctrico 2fases, 12 ctos con espacio para totalizador, Frente muerto, puerta con llave de seguridad Totalizador	und	.12	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 1 1
5	S.E.I CONTADOR ELECTRONICO DE MEDIDA DIRECTA 2F-3H (120-240)V, 5(60)A ENERGIA ACTIVA 1, REACTIVA 2.	und	.1	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 1 1
6	S.E.I de cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 3x12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS. Para circuitos ramales	m	.34	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 242 242

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

8	"S.E.I Tubería IMC 3/4""	m	.19	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 50 50
9	"S.E.I Tuberla IMC 2""	m	.04	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 5 5
10	"S.E.I de tomacorriente doble con polo a tierra aislada a 120V en cable 3N""12 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tuberia EMT 3/4"". Incluye 3 metros de trabajo (cable y tuberia)"	und	.08	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 7 7
11	"S.E.I de tomacorriente bifilar 240V en cable 3N""10 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar. Incluye 3 metros de trabajo (cable y tuberia) "	und	.01	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 1 1
12	S.E.I. Luminaria High Bay Led 200W, 6500K, 120-277V, IP 65. Ref: Kunix.	und	.38	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 9 9
13	S.E.I. Luminaria High Bay Led 200W con balastro de emergencia, 6500K 120.277V IP 65. Ref: kunix	und	.19	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 3 3

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

15	"S.E.I de punta captadora tipo Franklin en acero galvanizado de 5/8"" x 60 cm. Incluye: soportería, fijación y todos los accesorios y elementos necesarios para su adecuada instalación."	und	.4	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 20 20
16	"S.E.I de bajante en tubería IMC 3/4""	m	.13	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 30 30
17	S.E.I de alambron de aluminio 8mm para apantallamiento	m	.65	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 320 320
18	S.E.I de letrero de riesgo electrico para apantallamiento	und	.02	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 6 6
19	S. E.I de cable de cobre desnudo 1/0 AWG para sistema de puesta a tierra y colas oara aterrizaje de equipos.	m	.6	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 125 125
20	"S.E.I de varilla de cobre de 2.4 m de longitud y 5/8"" de diámetro."	und	.11	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 5 5


Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Actividad MGA REALIZAR INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	"REALIZAR INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS - suministro e instalacion bajante PVC agua lluvia de 4"" "	m	.22	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 55 55 	
2	"suministro e instalacion bajante PVC 6"" (160mm) "	m	.21	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 39 39 	
3	caja de inspeccion de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en ladrillo concreto de 17,2 Mpa y tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa para instalaciones electricas	und	.07	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 2 2 	

Actividad MGA Realizar la Interventoría del proyecto

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	ADMON Costos A.I.U	ADMON Costos A.I.U	0	0	No		Inicial Prog Cont Eje	 1 1 	22 22
		INTV					Inicial Prog	 1	7

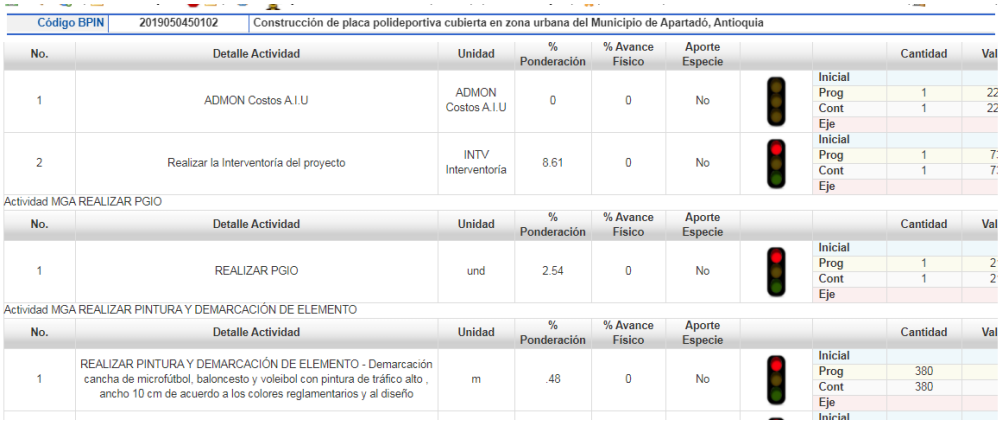

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	ADMON Costos A.I.U	ADMON Costos A.I.U	0	0	No		Inicial		
							Prog	1	22
							Cont	1	22
							Eje		
2	Realizar la Interventoría del proyecto	INTV Interventoría	8.61	0	No		Inicial		
							Prog	1	7:
							Cont	1	7:
							Eje		

Actividad MGA REALIZAR PGIO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR PGIO	und	2.54	0	No		Inicial		
							Prog	1	2
							Cont	1	2
							Eje		

Actividad MGA REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO - Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto , ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	m	.48	0	No		Inicial		
							Prog	380	
							Cont	380	
							Eje		
							Inicial		

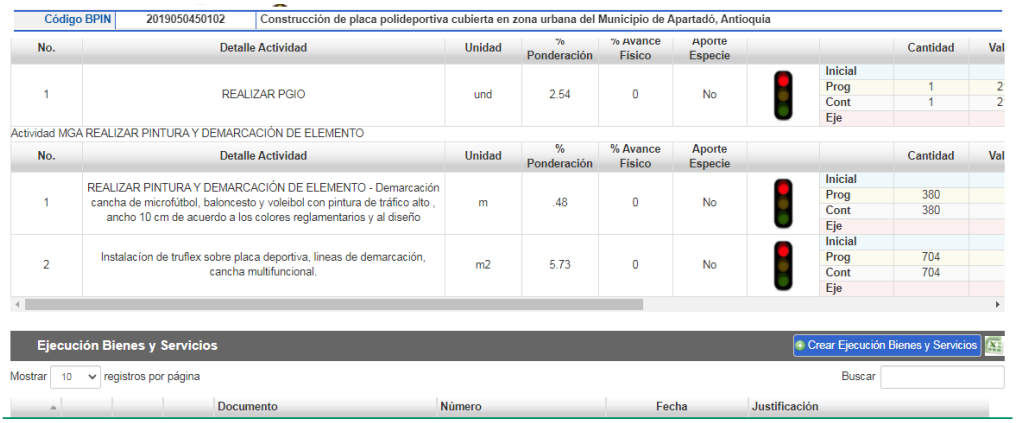

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR PGIO	und	2.54	0	No		Inicial		
							Prog	1	2
							Cont	1	2
							Eje		

Actividad MGA REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Val
1	REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO - Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto , ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	m	.48	0	No		Inicial		
							Prog	380	
							Cont	380	
							Eje		
2	Instalacíon de truflex sobre placa deportiva, lineas de demarcación, cancha multifuncional.	m2	5.73	0	No		Inicial		
							Prog	704	
							Cont	704	
							Eje		

Ejecución Bienes y Servicios — Crear Ejecución Bienes y Servicios

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Documento	Número	Fecha	Justificación

PROCESO AFECTACIÓN CDP

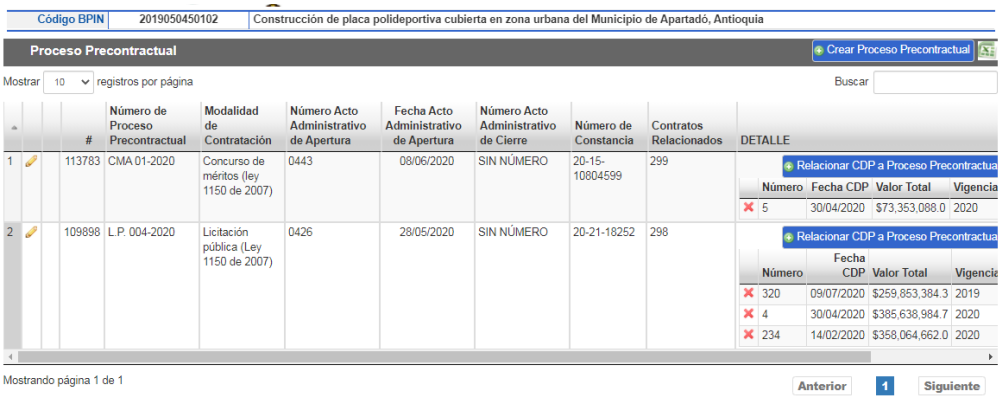

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Proceso Precontractual — Crear Proceso Precontractual

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		#	Número de Proceso Precontractual	Modalidad de Contratación	Número Acto Administrativo de Apertura	Fecha Acto Administrativo de Apertura	Número Acto Administrativo de Cierre	Número de Constancia	Contratos Relacionados	DETALLE
1		113783	CMA 01-2020	Concurso de méritos (ley 1150 de 2007)	0443	08/06/2020	SIN NÚMERO	20-15-10804599	299	Relacionar CDP a Proceso Precontractual
										Número: 5 — Fecha CDP: 30/04/2020 — Valor Total: $73,353,088.0 — Vigencia: 2020
2		109898	L.P. 004-2020	Licitación pública (Ley 1150 de 2007)	0426	28/05/2020	SIN NÚMERO	20-21-18252	298	Relacionar CDP a Proceso Precontractual
										Número: 320 — Fecha CDP: 09/07/2020 — Valor Total: $259,853,384.3 — Vigencia: 2019
										Número: 4 — Fecha CDP: 30/04/2020 — Valor Total: $385,638,984.7 — Vigencia: 2020
										Número: 234 — Fecha CDP: 14/02/2020 — Valor Total: $358,064,662.0 — Vigencia: 2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

ACTUALIZACIÓN CONTRATISTA DE OBRA

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Detalle Información Contratos

Contrato No	298	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Licitación pública (Ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	901390270-CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADÓ	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901390270	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA			Valor Contrato Para Proyecto	1.003.461.318,00
Fecha de Inicio	15/07/2020	Fecha Final Contractual	13/11/2020	Fecha Final Real	14/11/2020
Fecha Suscripción del Contrato	30/06/2020	Plazo Contractual	4,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	L.P. 004-2020	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	1.003.461.318,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
1	900863443	FAGUS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S	40,00	LINA MARCELA ZAPATA GAVIRIA	3128988183

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
1	900863443	FAGUS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S	40,00	LINA MARCELA ZAPATA GAVIRIA	3128988183
2	901176031	PRESMO INTEGRAL ZOMAC S.A.S	60,00	JAVIER ALONSO BERRIO SABALA	

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Aspectos Financieros del Contrato

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia


Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1	120	Si	Si	23/07/2020	259.853.384,34	2020	construccion de placa polideportiva cubierta en zona urbana del municipio de apartadó - vigencia actual	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	24/07/2020
2	1373	No	Si	23/07/2020	358.064.662,00	2020	construccion de una placa polideportiva	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	24/07/2020
3	6	Si	Si	30/06/2020	385.638.984,66	2020	construccion de placa polideportiva cubierta	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	24/07/2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

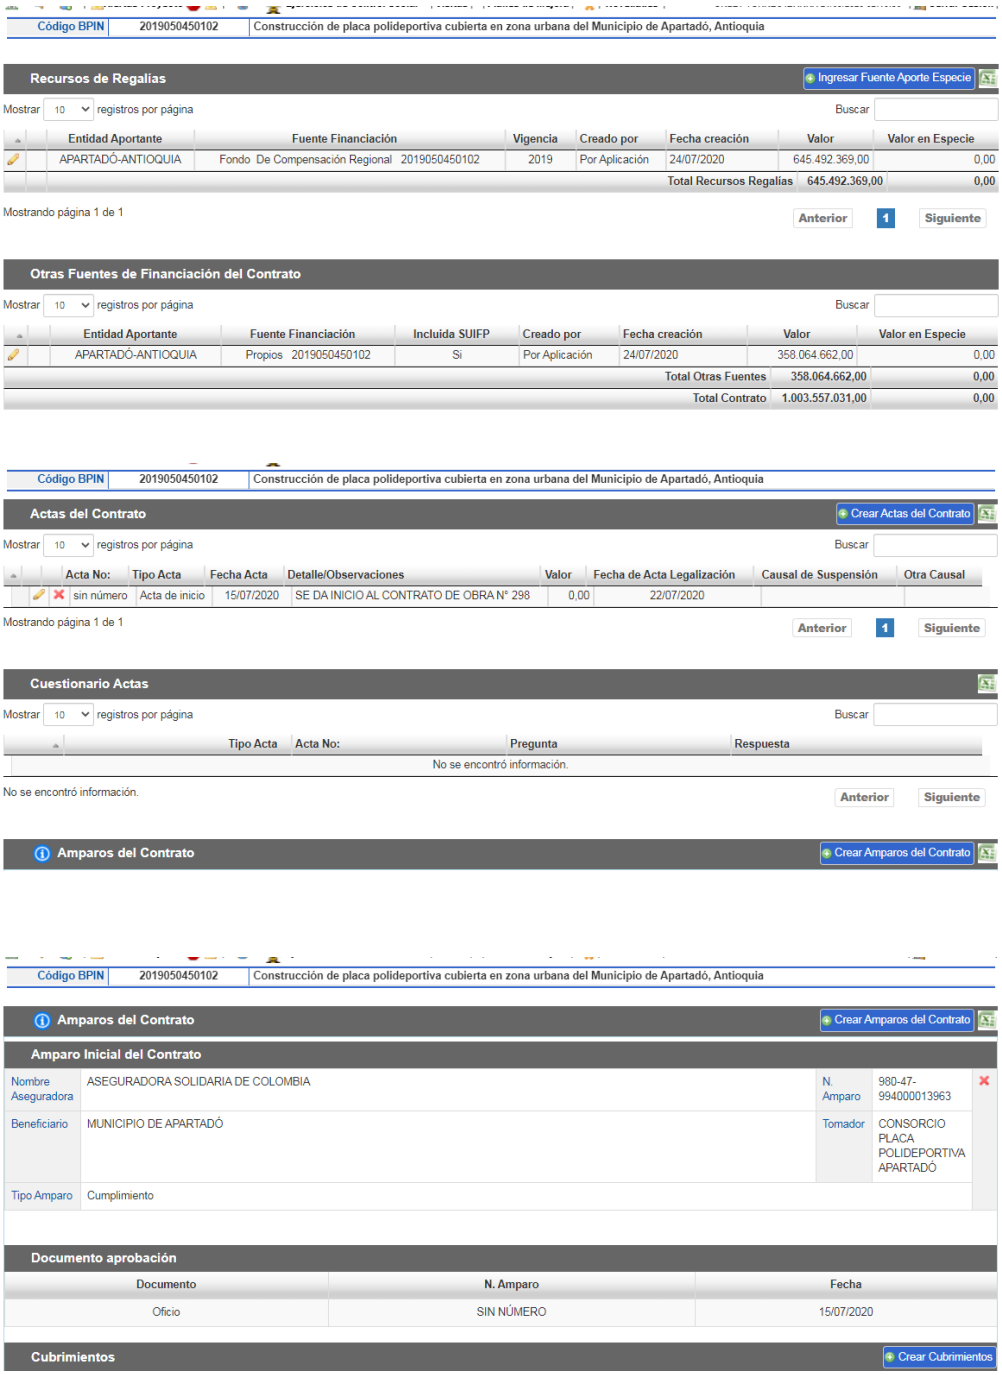

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional 2019050450102	2019	Por Aplicación	24/07/2020	645.492.369,00	0,00
				Total Recursos Regalías	645.492.369,00	0,00

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Propios 2019050450102	Si	Por Aplicación	24/07/2020	358.064.662,00	0,00
				Total Otras Fuentes	358.064.662,00	0,00
				Total Contrato	1.003.557.031,00	0,00

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	15/07/2020	SE DA INICIO AL CONTRATO DE OBRA N° 298	0,00	22/07/2020		

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Tipo Acta	Acta No:	Pregunta	Respuesta
No se encontró información.			

No se encontró información. — Anterior Siguiente

Amparos del Contrato — Crear Amparos del Contrato

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Amparos del Contrato — Crear Amparos del Contrato

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	N. Amparo	980-47-994000013963
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Tomador	CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADÓ
Tipo Amparo	Cumplimiento		

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Oficio	SIN NÚMERO	15/07/2020

Cubrimientos — Crear Cubrimientos




Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Oficio	SIN NÚMERO	15/07/2020

Cubrimientos — Crear Cubrimientos

Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia Fecha inicial	Vigencia Fecha Final	Observación
Buen manejo del Anticipo	401.384.527,20	40,00	30/06/2020	30/04/2021	NO
Cumplimiento	100.346.131,80	10,00	30/06/2020	30/04/2021	NO
Estabilidad de la obra	401.384.527,20	40,00	30/06/2020	30/06/2025	TIENE VIGENCIA 5 AÑOS CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Salarios y prestaciones	100.346.131,80	10,00	30/06/2020	30/10/2023	NO



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Tipo de Providencia	Nro Providencia	Fecha	Tipo Proceso	Pretenciones De La Acción
No se encontró información.				

No se encontró información. Anterior Siguiente

Circunstancias Excepcionales — Crear Circunstancias Excepcionales

Mostrar 10 registros por página Buscar

Tipo Circunstancia	Tipo Acto Administrativo	No. Acto Administrativo	Fecha
No se encontró información.			

No se encontró información. Anterior Siguiente

Cargue Masivo Actividades del Contrato

ACTUALIZACIÓN CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia


Detalle Información Contratos

Contrato No	299	Tipo de Contrato	Interventoria	Modalidad de Contratación	Concurso de méritos (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	901390279-CONSORCIO INTERVENTORÍAS APARTADÓ	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901390279	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA			Valor Contrato Para Proyecto	73.353.088,00
Fecha de Inicio	15/07/2020	Fecha Final Contractual	13/11/2020	Fecha Final Real	14/11/2020
Fecha Suscripción del Contrato	30/06/2020	Plazo Contractual	4,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	CMA 01-2020	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	73.353.088,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales — Crear Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página Buscar

Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
900735212	VISION PROYECTOS TARAPIWI SAS	50,00	WILFREDO TARAPUEZ MUÑOZ	3113286866



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales — Crear Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
1	✖	900725212	VISION PROYECTOS TABARWIL SAS	50,00	WILFREEDO TABAREZ MUÑOZ	3113386866
2	✖	901020000	VITUS ANALISTAS AMBIENTALES S.A.S	50,00	ALFONSO ENRIQUE CABAS REATIGA	

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente




Aspectos Financieros del Contrato

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID				No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

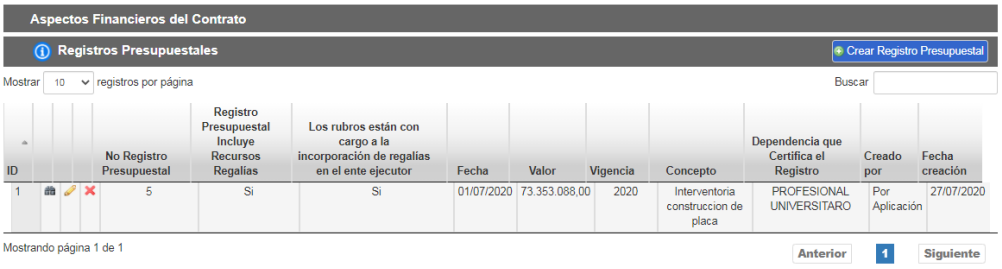

Aspectos Financieros del Contrato

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID				No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1			✖	5	Si	Si	01/07/2020	73.353.088,00	2020	Interventoria construccion de placa	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	27/07/2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente




Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página — Buscar



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia




Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
	APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional 2019050450102	2019	Por Aplicación	27/07/2020	73.353.088,00	0,00
					Total Recursos Regalías	73.353.088,00	0,00


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente



Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
			No se encontró información.				
					Total Otras Fuentes	0,00	0,00
					Total Contrato	73.353.088,00	0,00

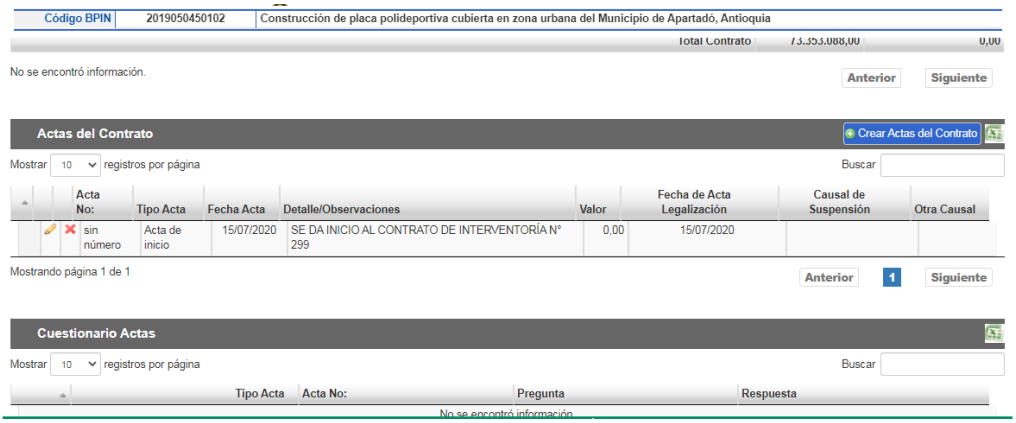

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Total Contrato 73.353.088,00 0,00

No se encontró información. Anterior Siguiente

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

		Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
		sin número	Acta de inicio	15/07/2020	SE DA INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 299	0,00	15/07/2020		

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página Buscar

Tipo Acta	Acta No:	Pregunta	Respuesta

No se encontró información.



Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Amparos del Contrato — Crear Amparos del Contrato

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A	N. Amparo	21-44-101327098
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Tomador	CONSORCIOS INTERVENTORÍAS APARTADÓ 2020
Tipo Amparo	Cumplimiento		

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Oficio	SIN NÚMERO	14/07/2020

Cubrimientos — Crear Cubrimientos




Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Documento	N. Amparo	Fecha
Oficio	SIN NÚMERO	14/07/2020

Cubrimientos — Crear Cubrimientos

		Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia Fecha inicial	Vigencia Fecha Final	Observación
		Calidad	7.335.308,80	33,00	30/10/2020	30/10/2025	NO
		Cumplimiento	7.335.308,80	33,00	30/06/2020	30/04/2021	NO
		Salarios y prestaciones	7.335.308,80	34,00	30/06/2020	30/10/2023	NO

Actualizaciones y Modificaciones Amparo: 21-44-101327098 — Crear Modificación del Amparo del Contrato 0



ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON EL OBJETO : “Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó”



Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Información Representante Legal — Crear Información Representante Legal

	Nombres	Apellidos	Documento	Número ID	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Estado Contacto
1	FELIPE BENICIO	CAÑIZALEZ PALACIOS	Cédula de Ciudadanía	71253245	8280175	3215360179	alcalde@apartado.gov.co	Activo

Información Contactos — Crear Información Contactos

	Nombre	Documento	Número ID	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Estado contacto	Tipo Contacto
1	ORLET TORRES IBARRA	Cédula de Ciudadanía	71984546	8280175	3215360179	bancoproyectos@apartado.gov.co	Activo	Enlace Oficina Planeación

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Fuentes de Financiación

Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Especie	Valor Aporte	%	Saldo Aportes	Saldo Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Asignación para la Paz (Municipios)	2019	0,00	5.098.957.370,00	100,00	5.098.957.370,00	0,00
		Subtotal Fuentes de Financiación SGR :	0,00	5.098.957.370,00	100,00	5.098.957.370,00	0,00

Otras Fuentes de Financiación

Entidad Aportante	Fuente	Incluida SUIFP	Valor Especie	Valor Aporte	%	Saldo Aportes	Saldo Especie
		Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal Otras Fuentes de Financiación No Aprobadas :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Proyecto Aprobado :	0,00	5.098.957.370,00	100,00	5.098.957.370,00	0,00
		Valor Total del Proyecto :	0,00	5.098.957.370,00	100,00	5.098.957.370,00	0,00

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Cumplimiento Requisitos para Contratación — Crear Cumplimiento Requisitos para Contratación

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Fecha	Número del Documento o Radicado	Cumplimiento	OCAD
1	15/05/2020	N° 45 (Mod. AC52)	Total	Sin Definir - OCAD PAZ

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Histórico de Modificaciones Cumplimiento de Requisitos

Fecha	Número Documento	Cumplimiento	Ocad	Fecha Modificación	Tipo Modificación	Usuario
15/05/20	N° 45 (Mod. AC52)	Total	OCAD PAZ	18/05/20	Inserción	Orlet

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Crear Fuente no Suifp

Valores Comprometidos y Saldos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Aporte	Valor Especie	Valor Comprometido Especie	Saldo Especie	Valor Comprometido Dinero	Valor Comprometido Dinero Multiproyecto	Total Comprometido	Saldo Aportes
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Asignación para la Paz (Municipios)	2019	5.098.957.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.957.370,00

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Rubros Presupuestales

Rubros — Crear Rubros

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Rubro	Descripción del Rubro	Creado por	Fecha creación
005-2402-0600-2019-130101-0197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO TIPO MDC-2 VÍA APARTADO CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	SPGR	09/05/2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Información Ejecución : Proyecto con retrasos en la ejecución debido a que se programó su terminación en el mes de july de 2020. Verifique el estado real de la ejecución y de ser necesario reprograme el mes de terminación de su proyecto.

Certificado de Disponibilidad — Crear Certificado de Disponibilidad

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Número	Fecha CDP	Valor Total	Valor RP	Valor Saldo	Maneja Múltiples Proyectos	Creado por	Fecha creación
1	120	06/05/2020	4.809.443.817,00	0,00	4.809.443.817,00	No	SPGR	09/05/2020
2	220	06/05/2020	289.513.553,00	0,00	289.513.553,00	No	SPGR	09/05/2020

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente



Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Incorporación Presupuestal MUNICIPIO DE APARTADO Nit : 890980095 — Incorporación Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Vigencia	Fuente	Rubro - Descripción	Valor Incorporado	Número del Acto Administrativo	Fecha de Acto Administrativo	Aplica Vigencia Futura	Número de Autorización de Vigencia Futura	Creado por	Fecha creación
2019	Asignación para la Paz (Municipios)	005-2402-0600-2019-130101-0197 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO TIPO MDC-2 VÍA APARTADO CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	5.098.957.370,00	25	04/05/2020	No		SPGR	09/05/2020


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Total de Recursos Incorporados : $5,098,957,370.0

Saldos Cierre Vigencias Presupuestales MUNICIPIO DE APARTADO Nit : 890980095

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Vigencia	Vlr Aprobado	Vlr Total Proyecto	Vlr Total Comprometido	Recursos Aprobados No Incorporados	R. Incorporados No Comprometidos	R. Incorporados No Comprometidos No SUIFP	R. Liberados	R. Liberados No SUIFP	Saldo Disponible

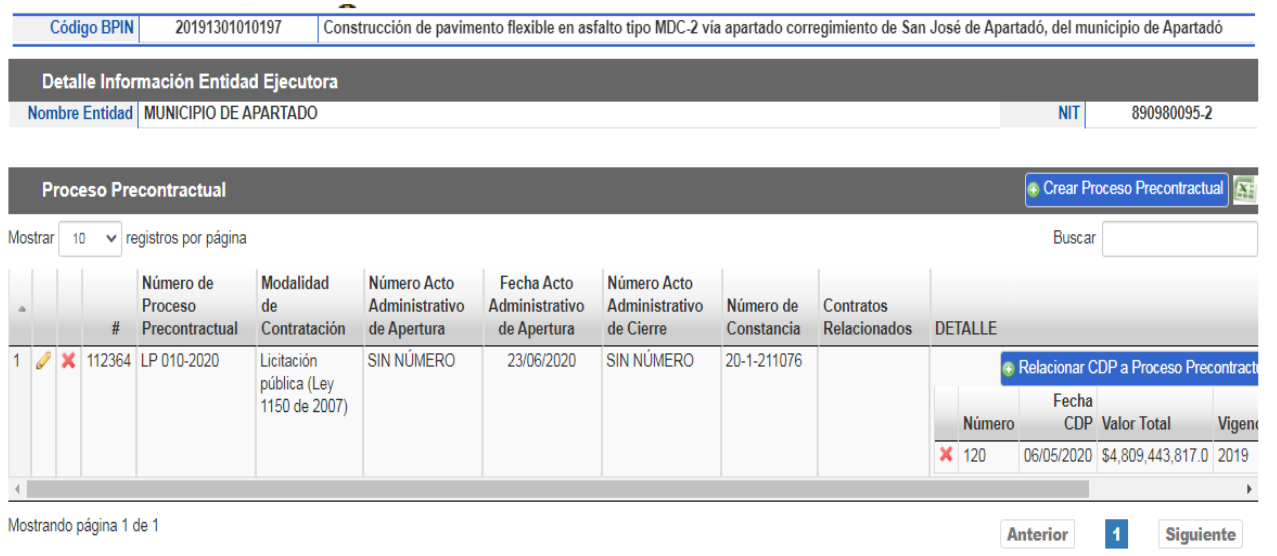

Código BPIN	20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Proceso Precontractual — Crear Proceso Precontractual

Mostrar 10 registros por página — Buscar

#	Número de Proceso Precontractual	Modalidad de Contratación	Número Acto Administrativo de Apertura	Fecha Acto Administrativo de Apertura	Número Acto Administrativo de Cierre	Número de Constancia	Contratos Relacionados	DETALLE
1	112364	LP 010-2020	Licitación pública (Ley 1150 de 2007)	SIN NÚMERO	23/06/2020	SIN NÚMERO	20-1-211076	

Relacionar CDP a Proceso Precontract

Número	Fecha CDP	Valor Total	Vigenc
120	06/05/2020	$4,809,443,817.0	2019

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente


SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías


ACTUALIZACIONES EN LA PLATAFORMA SPGR


- Actualización y validación de usuarios
- Generación Reporte Cronograma de Flujos
- Validación de Cronograma de flujos
- Asignación Presupuesto a Proyectos
- Solicitud de recursos
- Legalización de anticipos
- Radicación cuentas por pagar
- Asignación y radicación de registros presupuestales
- Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Validación de certificados presupuestales

- Asignación cuentas bancarías de contratistas
- Apertura capitulo independiente
- Asignación del ordenador del gasto

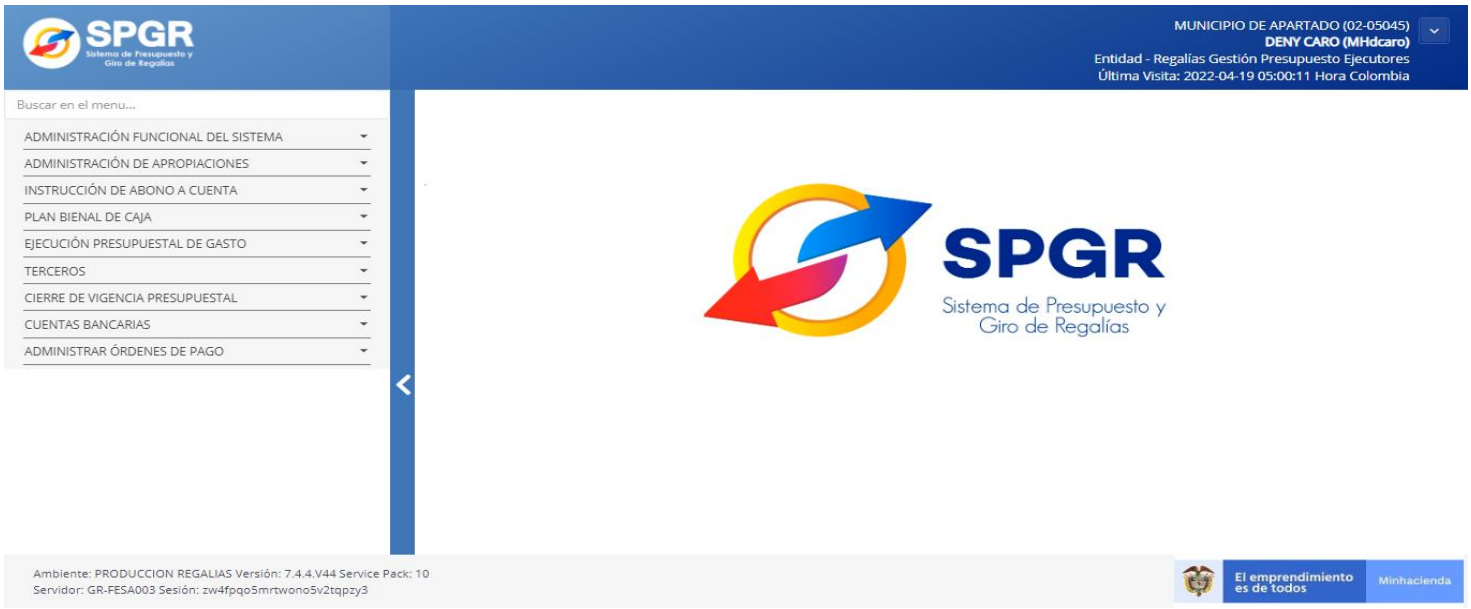


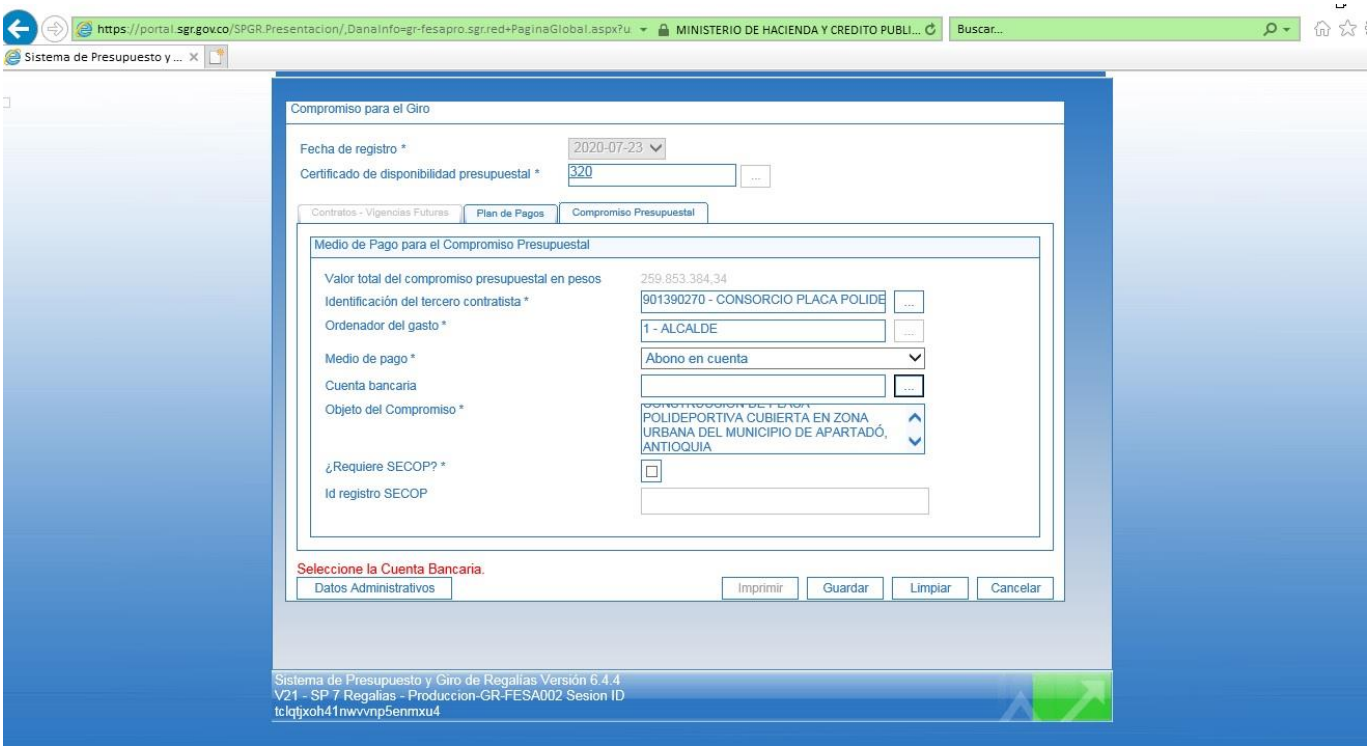

Sistema de Presupuesto y ...
Compromiso para el Giro
Fecha de registro *
2020-07-23
Certificado de disponibilidad presupuestal *
320
Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal
Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal
Valor total del compromiso presupuestal en pesos
259.853.384,34
Identificación del tercero contratista *
901390270 - CONSORCIO PLACA POLIDE
Ordenador del gasto *
1 - ALCALDE
Medio de pago *
Abono en cuenta
Cuenta bancaria
Objeto del Compromiso *
POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA
¿Requiere SECOP? *
Id registro SECOP
Seleccione la Cuenta Bancaria.
Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías Versión 6.4.4
V21 - SP 7 Regalias - Produccion-GR-FESA002 Sesion ID
tclqtjxoh41nwvvnp5enmxu4

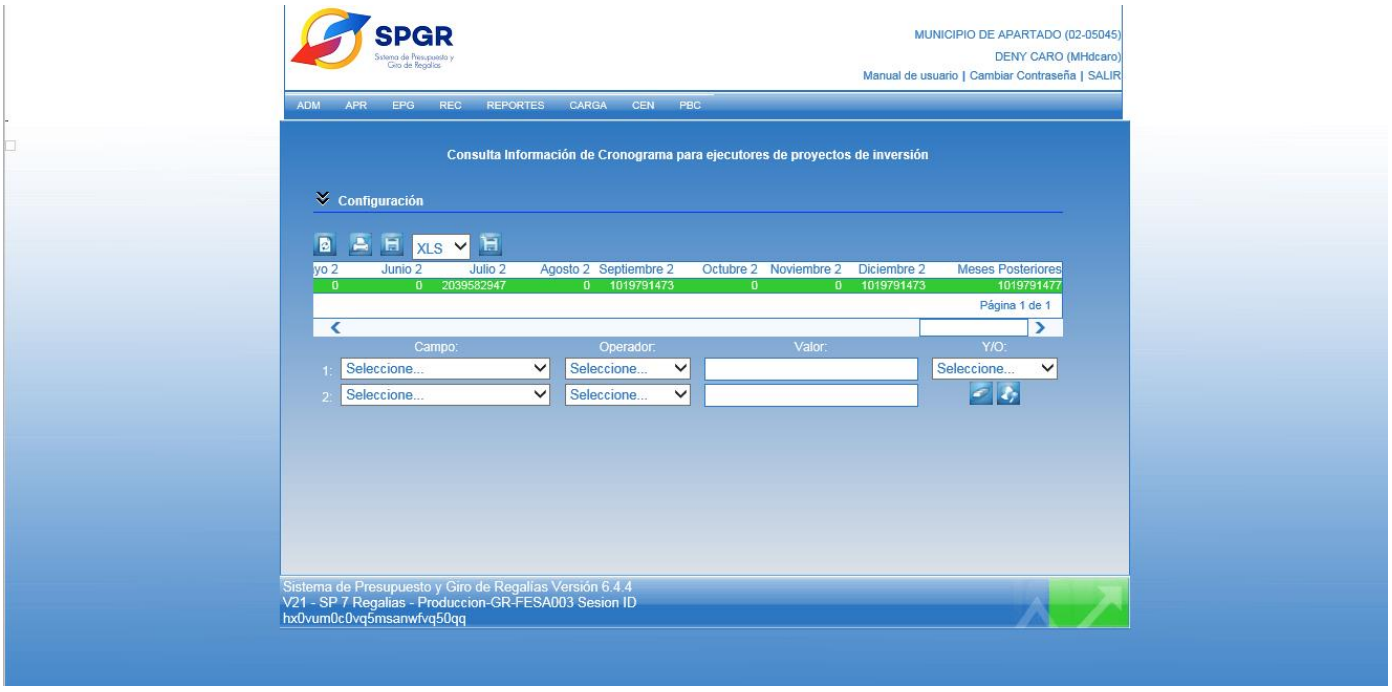

SPGR
MUNICIPIO DE APARTADO (02-05045)
DENY CARO (MHdcaro)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR
ADM
APR
EPG
REC
REPORTES
CARGA
CEN
PBC
Consulta Información de Cronograma para ejecutores de proyectos de inversión
Configuración
XLS
Junio 2
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 2
Meses Posteriores
0
0
2039582947
0
1019791473
0
0
1019791473
1019791477
Página 1 de 1
Campo:
Operador:
Valor:
Y/O:
Seleccione...
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías Versión 6.4.4
V21 - SP 7 Regalias - Produccion-GR-FESA003 Sesion ID
hx0vum0c0vq5msanwfvq50qq




CREACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PROYECTO PRODUCTIVO

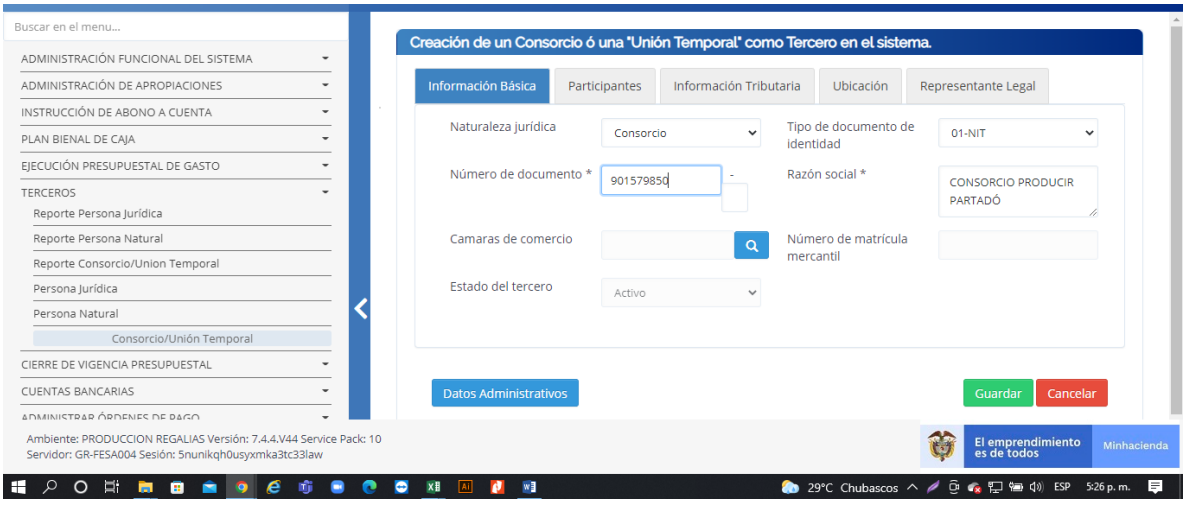

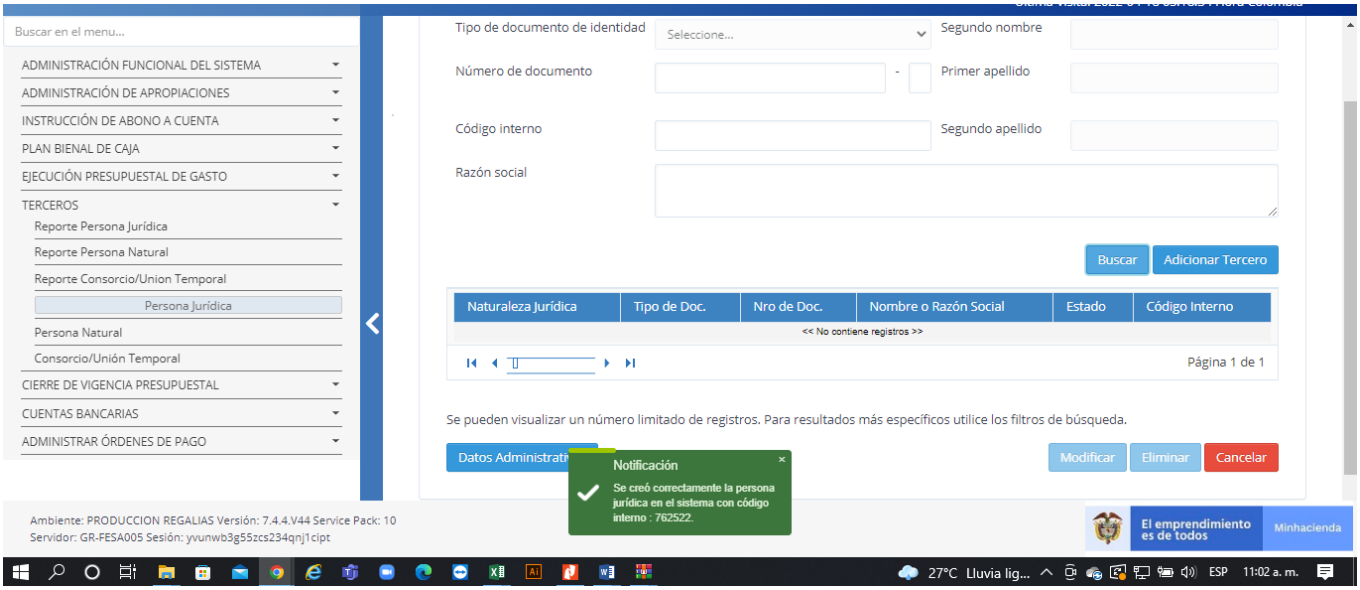

Buscar en el menu...
ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DE APROPIACIONES
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
PLAN BIENAL DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
TERCEROS
Reporte Persona Jurídica
Reporte Persona Natural
Reporte Consorcio/Union Temporal
Persona Jurídica
Persona Natural
Consorcio/Unión Temporal
CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL
CUENTAS BANCARIAS
ADMINISTRAR ÓRDENES DE PAGO
Tipo de documento de identidad
Seleccione...
Segundo nombre
Número de documento
Primer apellido
Código interno
Segundo apellido
Razón social
Buscar
Adicionar Tercero
Naturaleza Jurídica
Tipo de Doc.
Nro de Doc.
Nombre o Razón Social
Estado
Código Interno
<< No contiene registros >>
Página 1 de 1
Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.
Modificar
Eliminar
Cancelar
Notificación
Se creó correctamente la persona jurídica en el sistema con código interno : 762522.
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.4.4.V44 Service Pack: 10
Servidor: GR-FESA005 Sesión: yvunwb3g55zcs234qnj1cipt
El emprendimiento es de todos
Minhacienda
27°C Lluvia lig...
ESP
11:02 a. m.

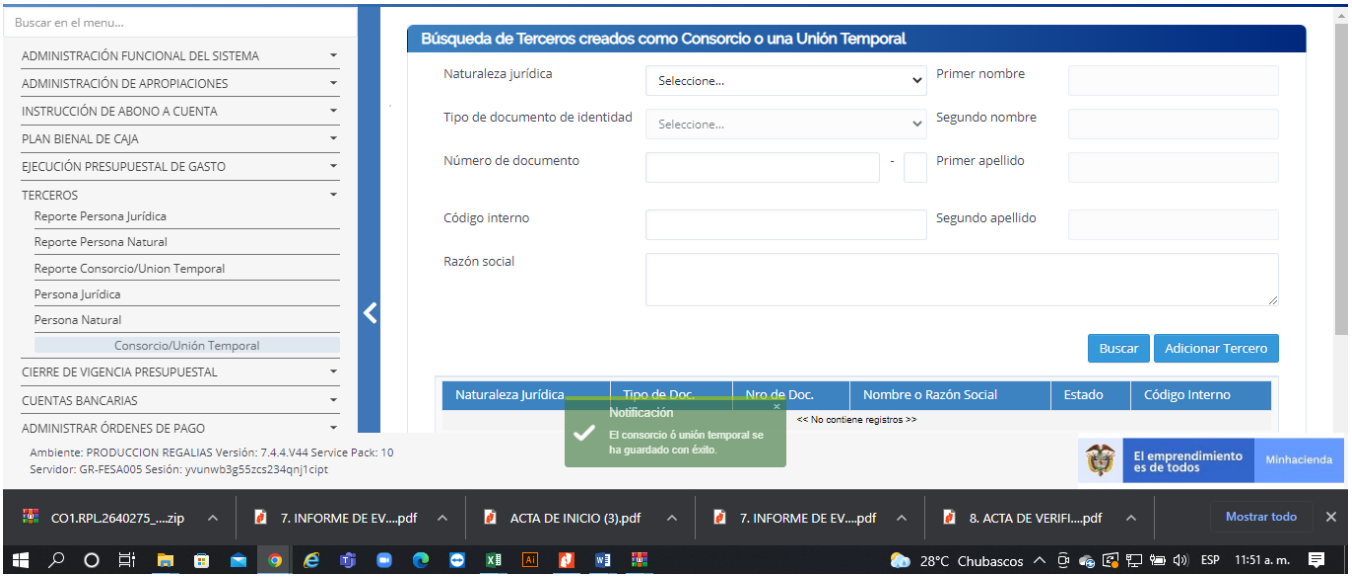

Buscar en el menu...
ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DE APROPIACIONES
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
PLAN BIENAL DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
TERCEROS
Reporte Persona Jurídica
Reporte Persona Natural
Reporte Consorcio/Union Temporal
Persona Jurídica
Persona Natural
Consorcio/Unión Temporal
CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL
CUENTAS BANCARIAS
ADMINISTRAR ÓRDENES DE PAGO
Búsqueda de Terceros creados como Consorcio o una Unión Temporal
Naturaleza jurídica
Seleccione...
Primer nombre
Tipo de documento de identidad
Seleccione...
Segundo nombre
Número de documento
Primer apellido
Código interno
Segundo apellido
Razón social
Buscar
Adicionar Tercero
Naturaleza Jurídica
Tipo de Doc.
Nro de Doc.
Nombre o Razón Social
Estado
Código Interno
<< No contiene registros >>
Notificación
El consorcio ó unión temporal se ha guardado con éxito.
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.4.4.V44 Service Pack: 10
Servidor: GR-FESA005 Sesión: yvunwb3g55zcs234qnj1cipt
El emprendimiento es de todos
Minhacienda
CO1.RPL.2640275_....zip
7. INFORME DE EV....pdf
ACTA DE INICIO (3).pdf
7. INFORME DE EV....pdf
8. ACTA DE VERIFI....pdf
Mostrar todo
28°C Chubascos
ESP
11:51 a. m.

CREACIÓN CUENTA BANCARIA

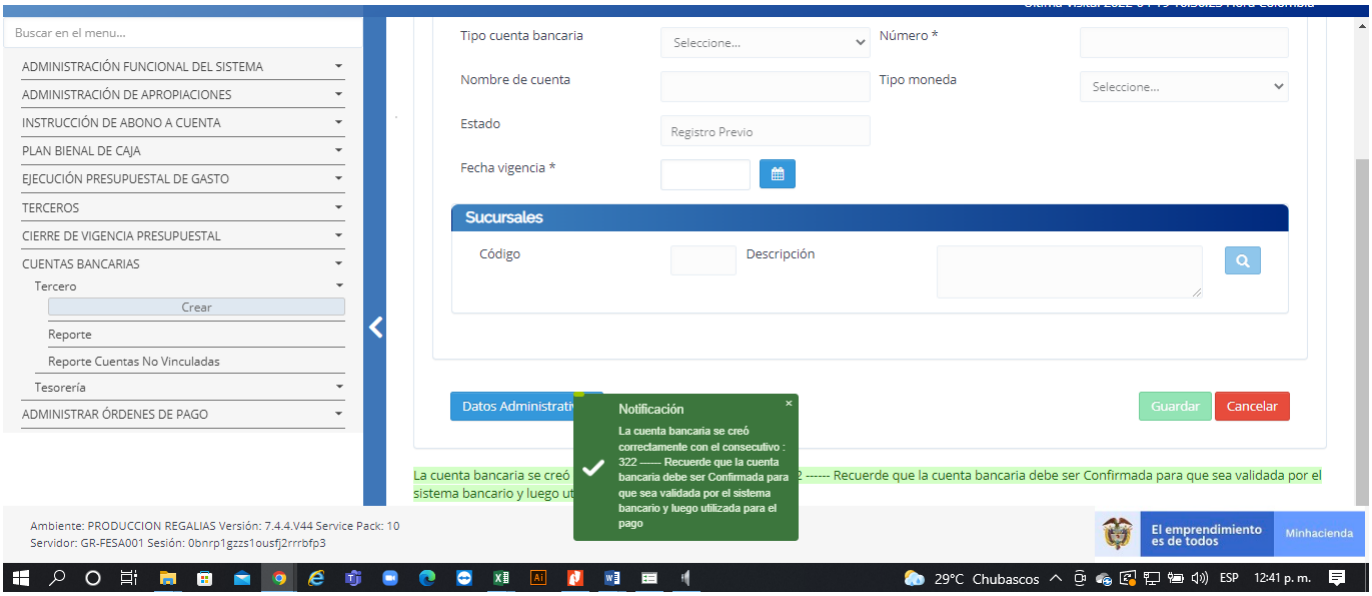


CONFIRMACIÓN Y VALIDACIÓN CUENTA BANCARIA

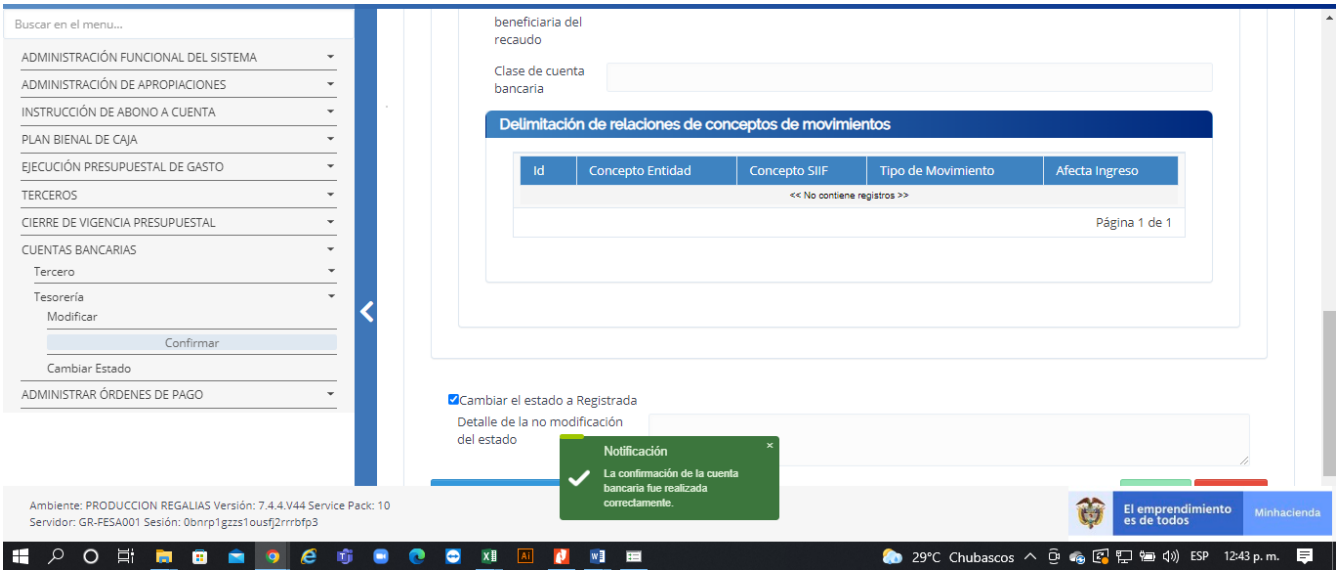


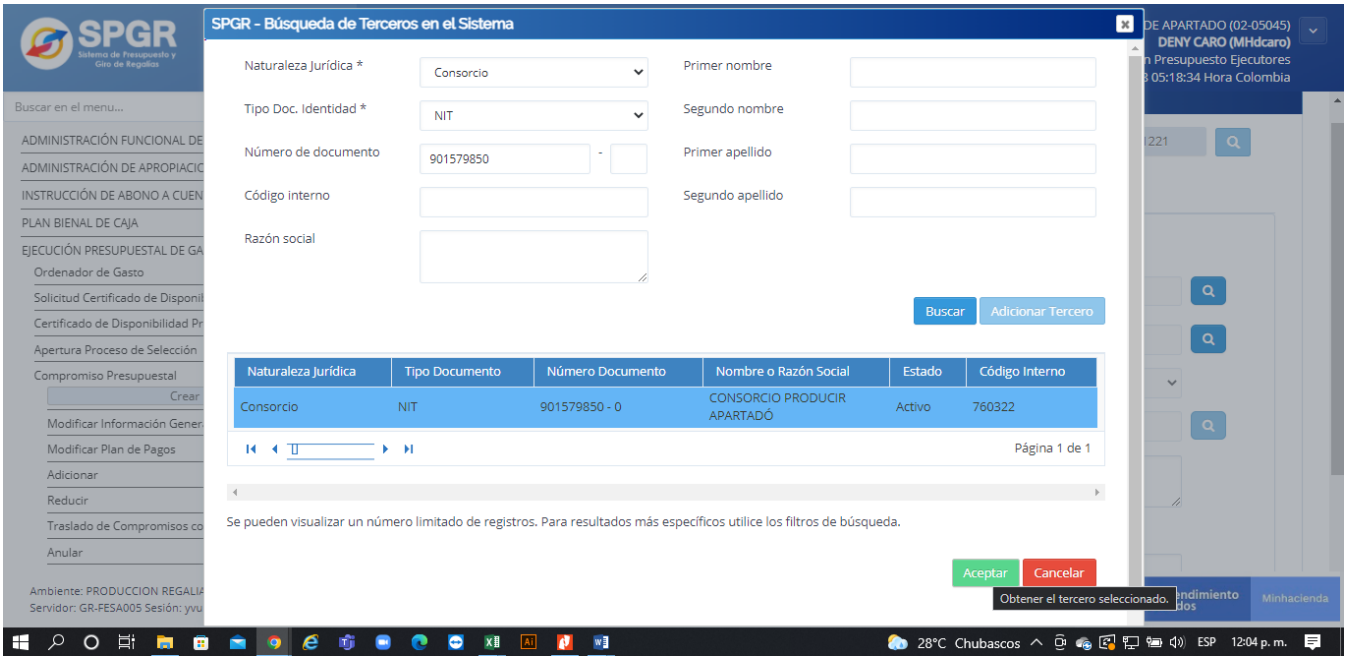


EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

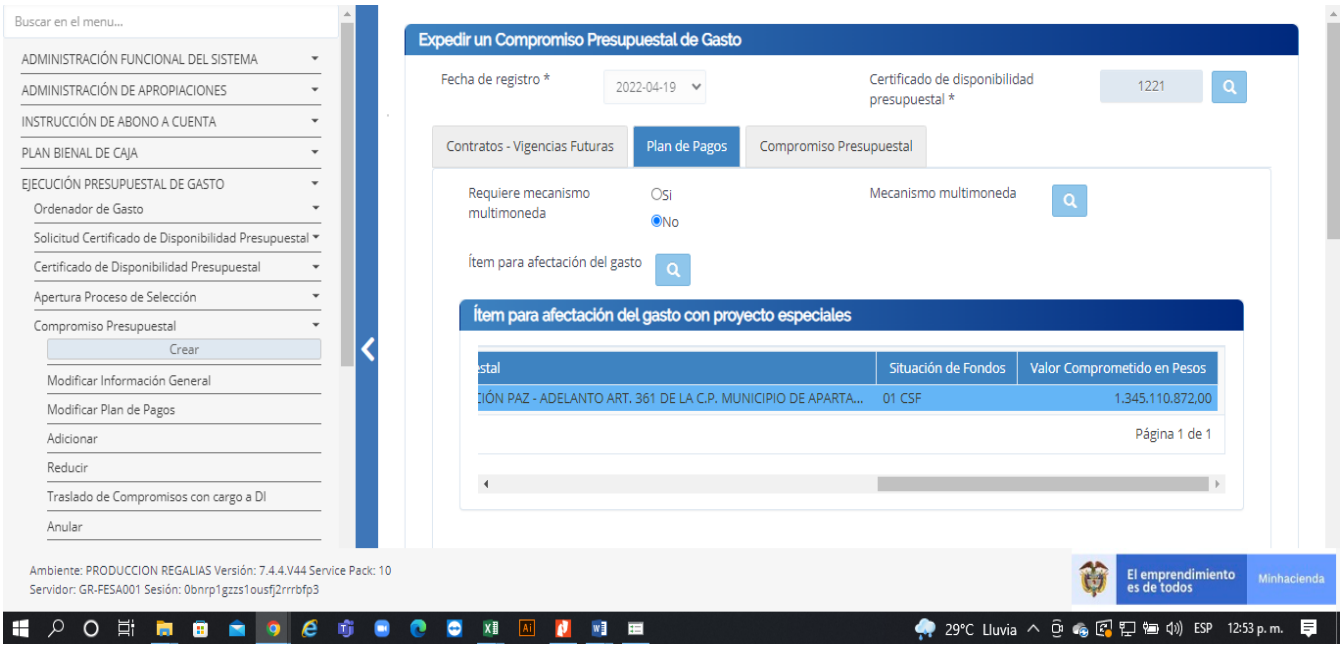


ASIGNACIÓN PLAN DE PAGOS

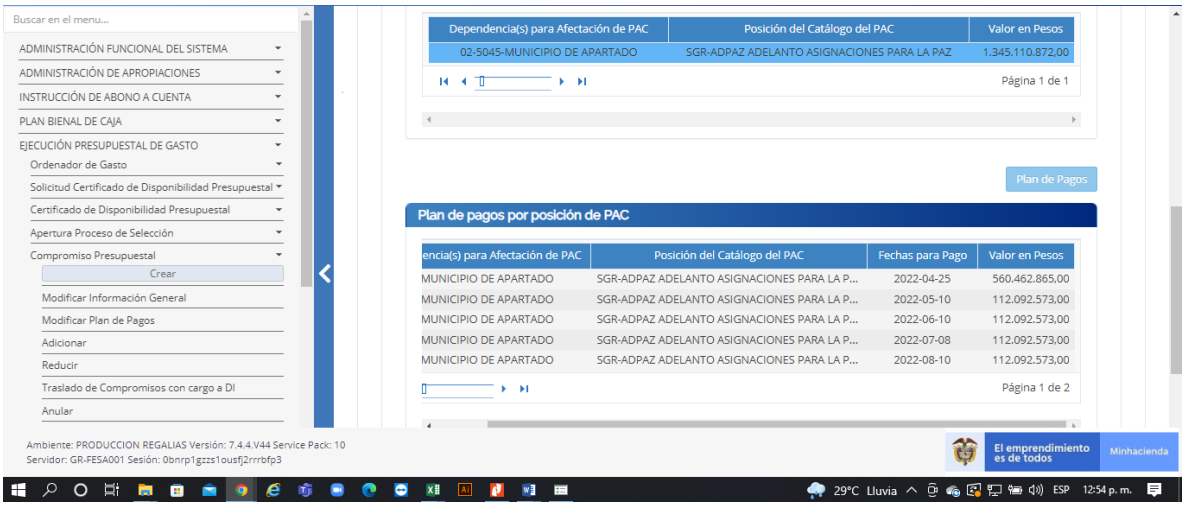


VALIDACIÓN COMPROMISO PRESUPUESTAL

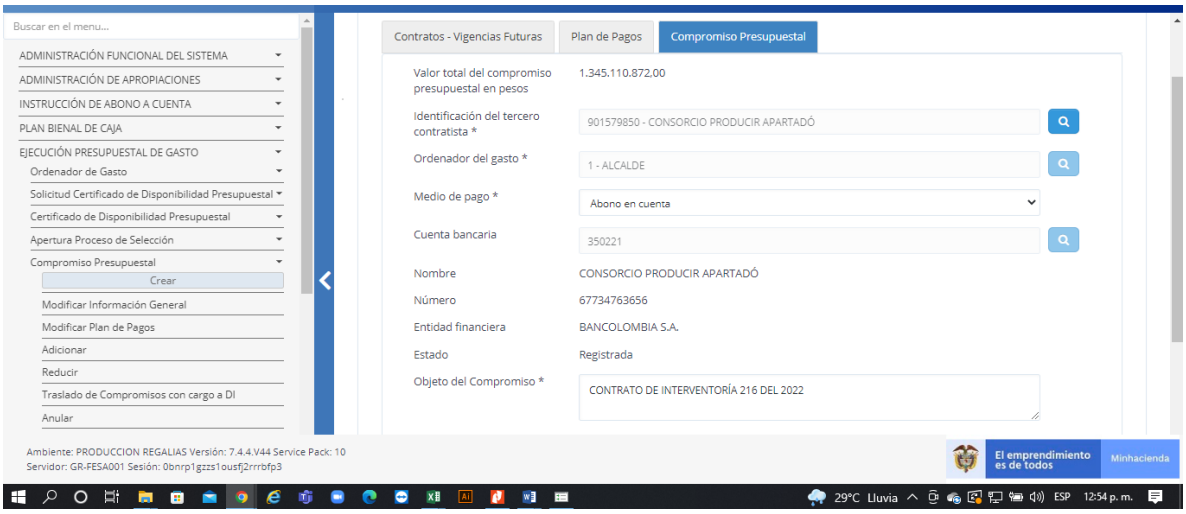



APERTURA DE PROCESO DE SELECCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECRETA EL GASTO

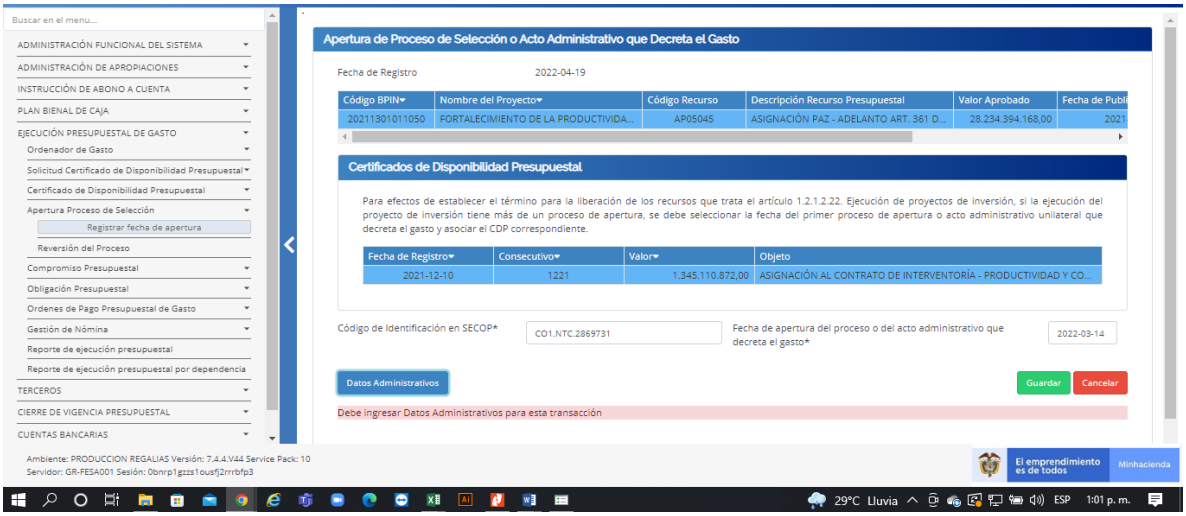


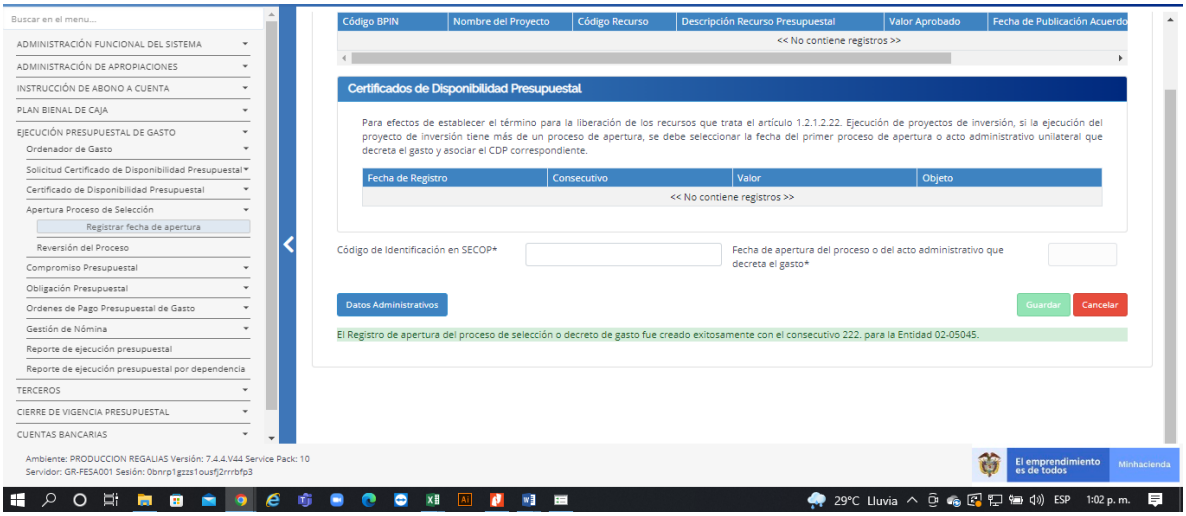



APROBACIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PROYECTO PRODUCTIVO

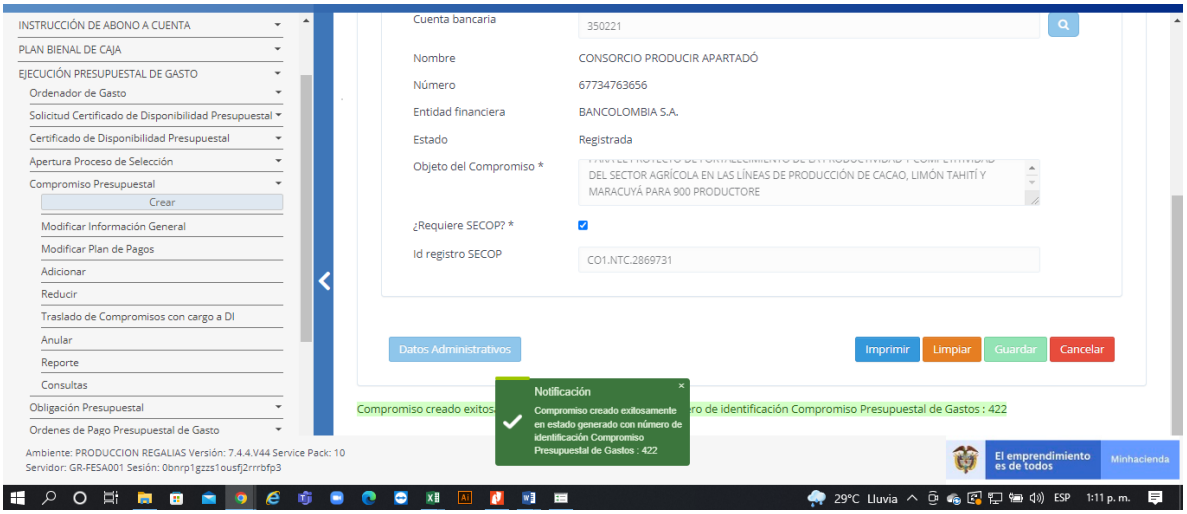


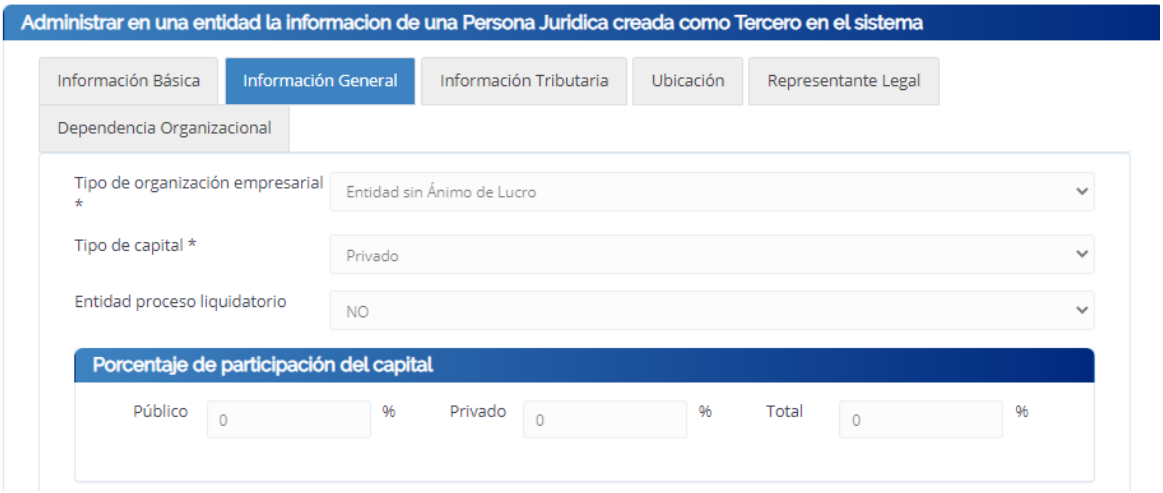

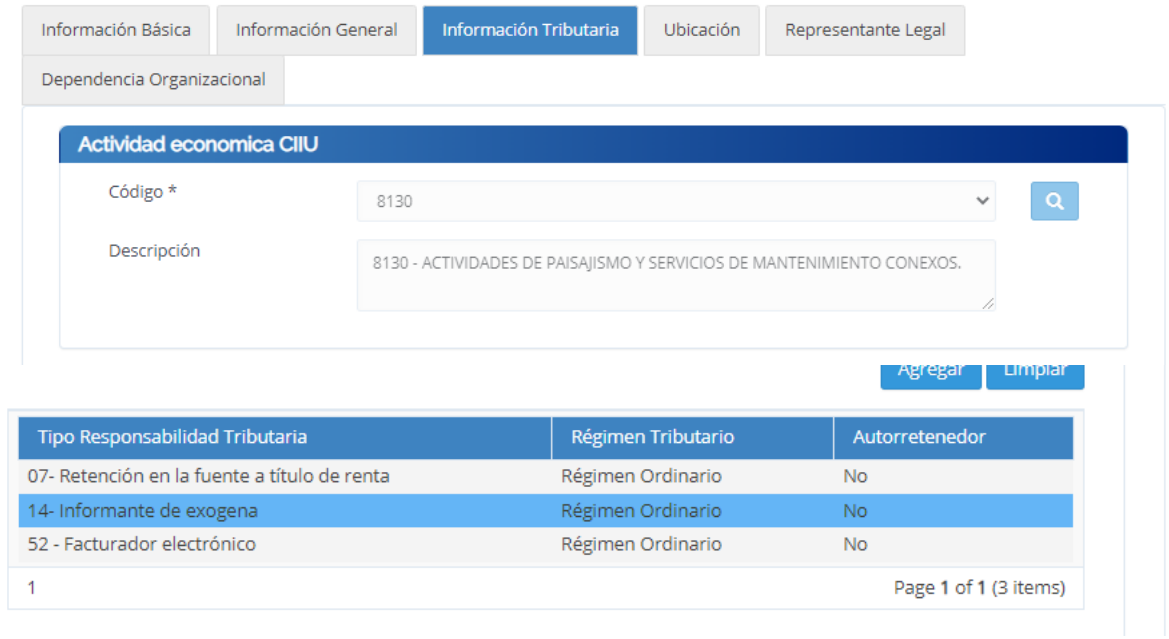
Información Básica
Información General
Información Tributaria
Ubicación
Representante Legal
Dependencia Organizacional
Actividad economica CIIU
Código *
8130
Descripción
8130 - ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS.
Agregar
Limpiar
Tipo Responsabilidad Tributaria
Régimen Tributario
Autorretenedor
07- Retención en la fuente a título de renta
Régimen Ordinario
No
14- Informante de exogena
Régimen Ordinario
No
52 - Facturador electrónico
Régimen Ordinario
No
1
Page 1 of 1 (3 items)

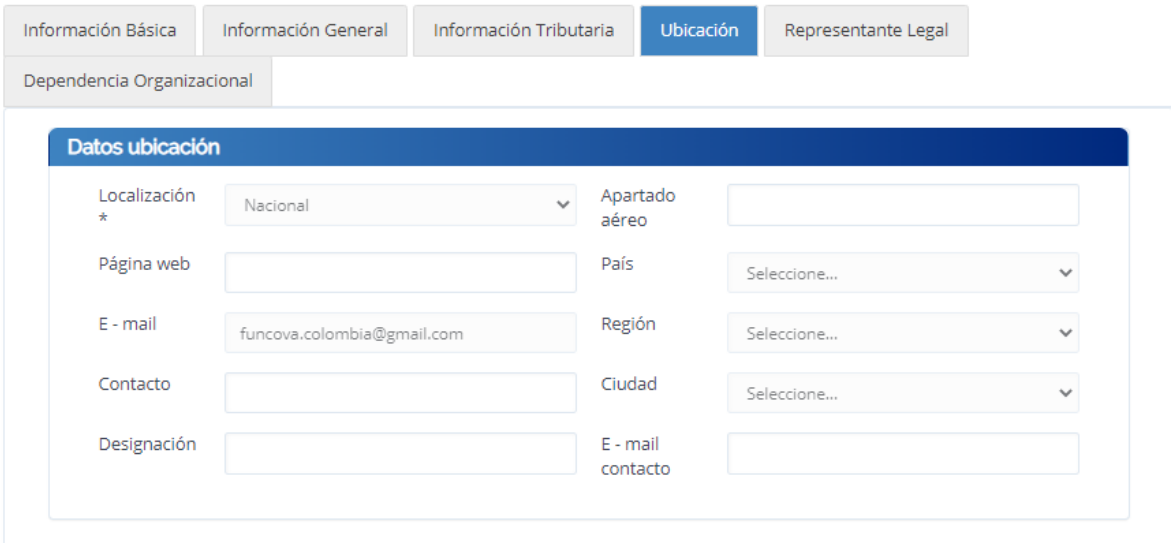
Información Básica
Información General
Información Tributaria
Ubicación
Representante Legal
Dependencia Organizacional
Datos ubicación
Localización *
Nacional
Apartado aéreo
Página web
País
Seleccione...
E - mail
funcova.colombia@gmail.com
Región
Seleccione...
Contacto
Ciudad
Seleccione...
Designación
E - mail contacto


Agregar
Tipo de Dirección
Dirección
País
Región
Ciudad
Teléfono
Fax
DOMICILIO CONTRACTUAL
CR 31 19 61 BRR EL RECREO
COLOMBIA
Sucre
Sincelejo
2827039
1
Page 1 of 1 (1 items)
Modificar
Eliminar

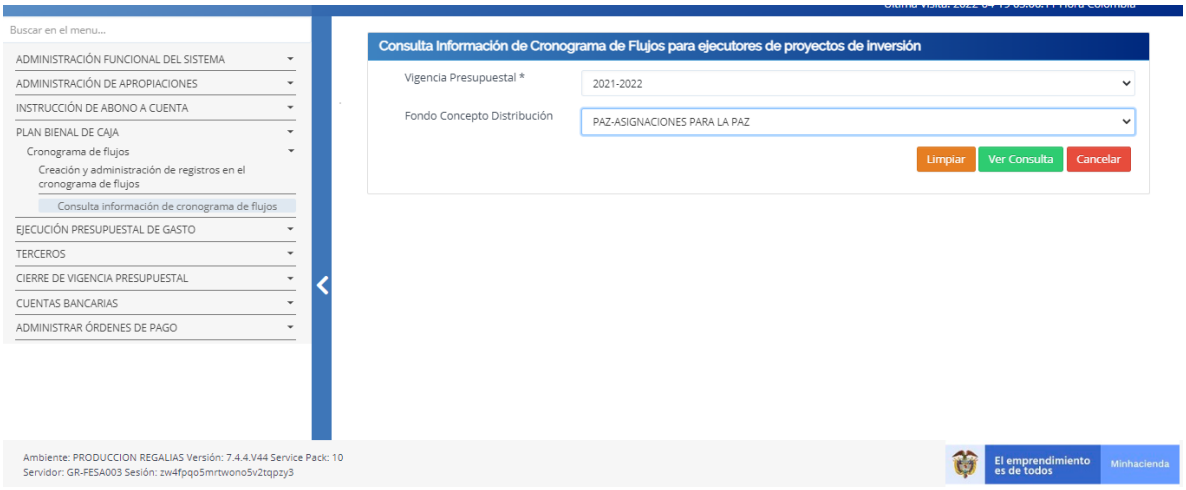
Buscar en el menu...
ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DE APROPIACIONES
INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
PLAN BIENAL DE CAJA
Cronograma de flujos
Creación y administración de registros en el cronograma de flujos
Consulta información de cronograma de flujos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
TERCEROS
CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL
CUENTAS BANCARIAS
ADMINISTRAR ÓRDENES DE PAGO
Consulta Información de Cronograma de Flujos para ejecutores de proyectos de inversión
Vigencia Presupuestal *
2021-2022
Fondo Concepto Distribución
PAZ-ASIGNACIONES PARA LA PAZ
Limpiar
Ver Consulta
Cancelar
Ambiente: PRODUCCION REGALIAS Versión: 7.4.4.V44 Service Pack: 10
Servidor: GR-FESA003 Sesión: zw4fpqo5mrtwono5v2tqpzy3
El emprendimiento es de todos
Minhacienda

REPORTE EN EL APLICATIVO DE GESPROY CUENTAS MAESTRA DE REGALÍAS

