Proyecto Cartagena



Contrato interadministrativo Distrito de Cartagena.

En el mes diciembre se realizo acta de modificación al Contrato con el municipio de Cartagena por 5.5 Meses. El distrito continua con el proceso de gestion de las vigencias futuras, la administración distrital a manifestado la intención de realizar el contrato inter administrativo a 5 Años.

El distrito ha manifestado su deseo de realizar la contratación a través del contrato interadministrativo con EPM. Se continua realizando seguimiento a la gestion del la probación de las vigencias.


Alcance del AMB


Prestar el servicio de mantenimiento del sistema actual de alumbrado publico.


Ejecutar la modernización del 15% del sistema de alumbrado publico. Equivalente a 10.350 UCAP.




GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

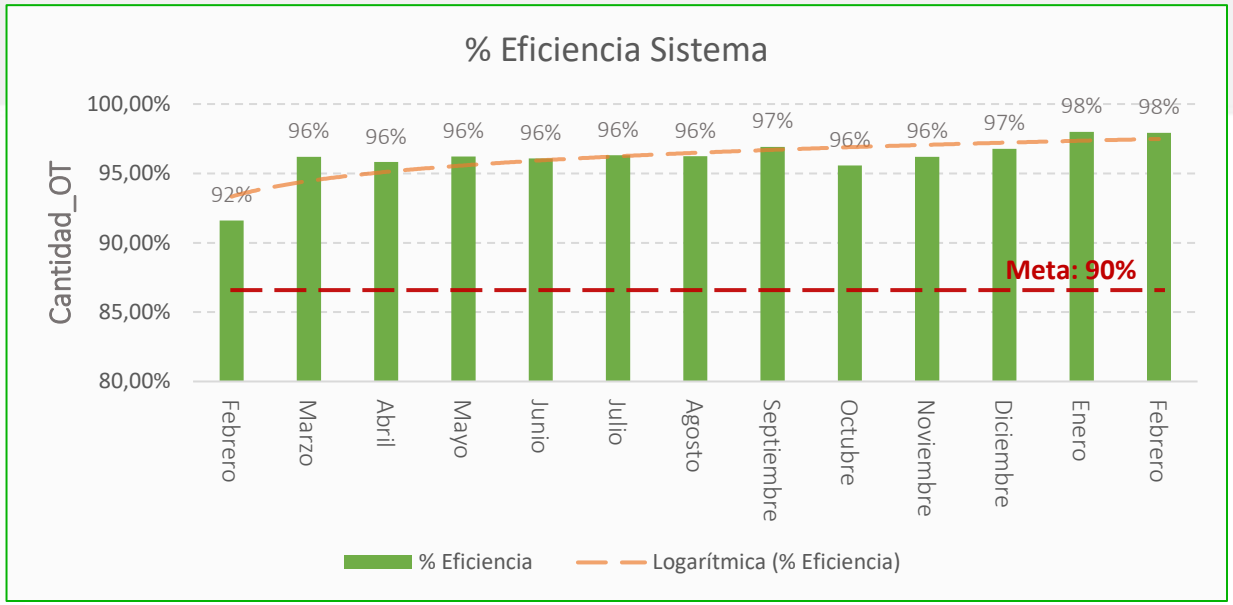

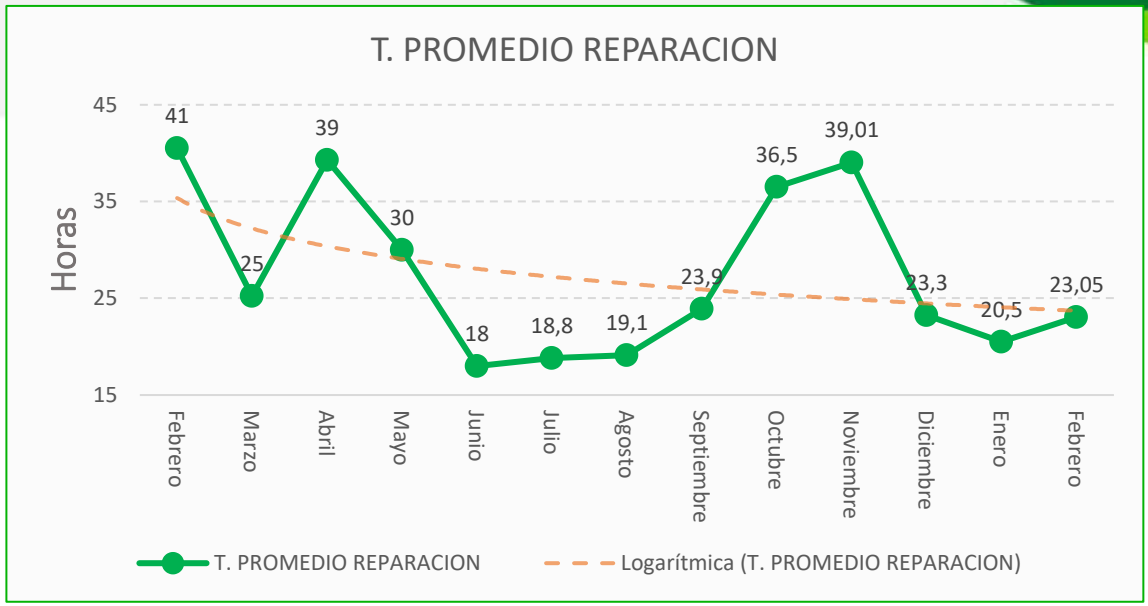

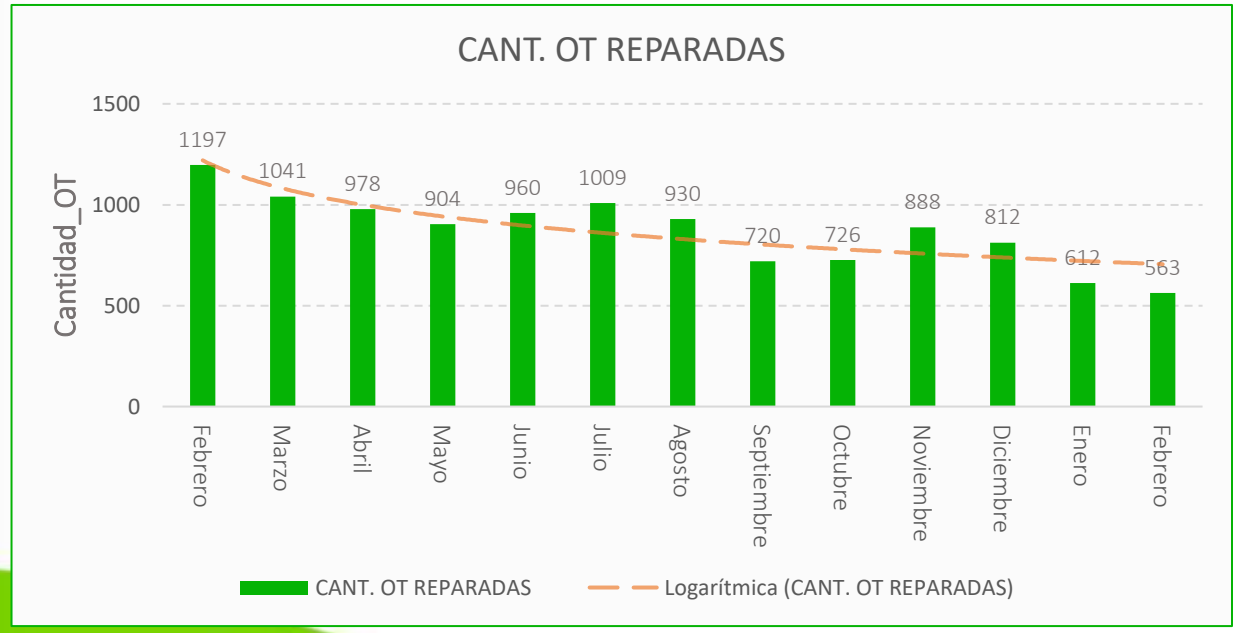


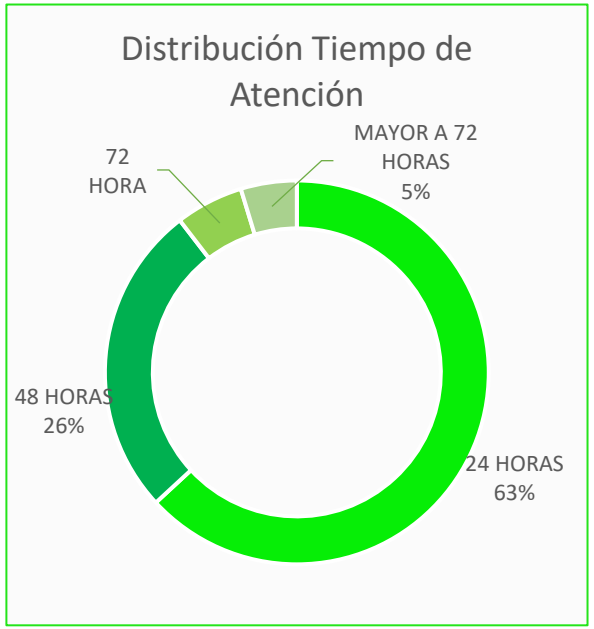

Se ha cumplido con los compromisos contractuales, se retoma el tiempo promedio de reparación se continua con la atención en menos de 24 horas.

Fotos Proyectos



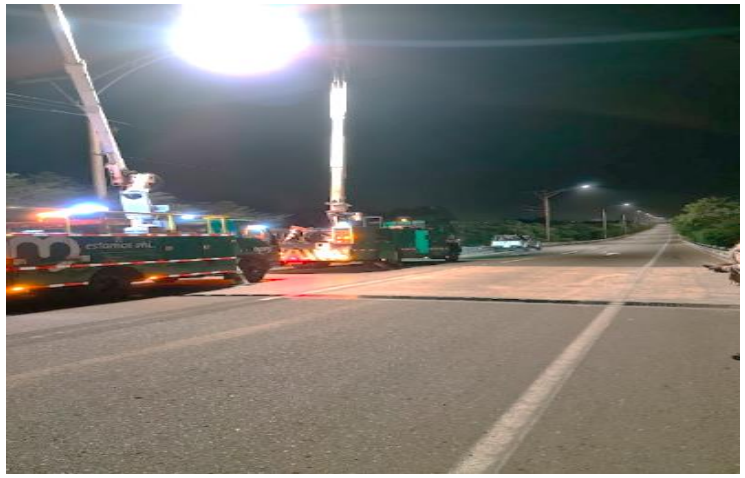











GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN

Curva S del Proyecto Modernización

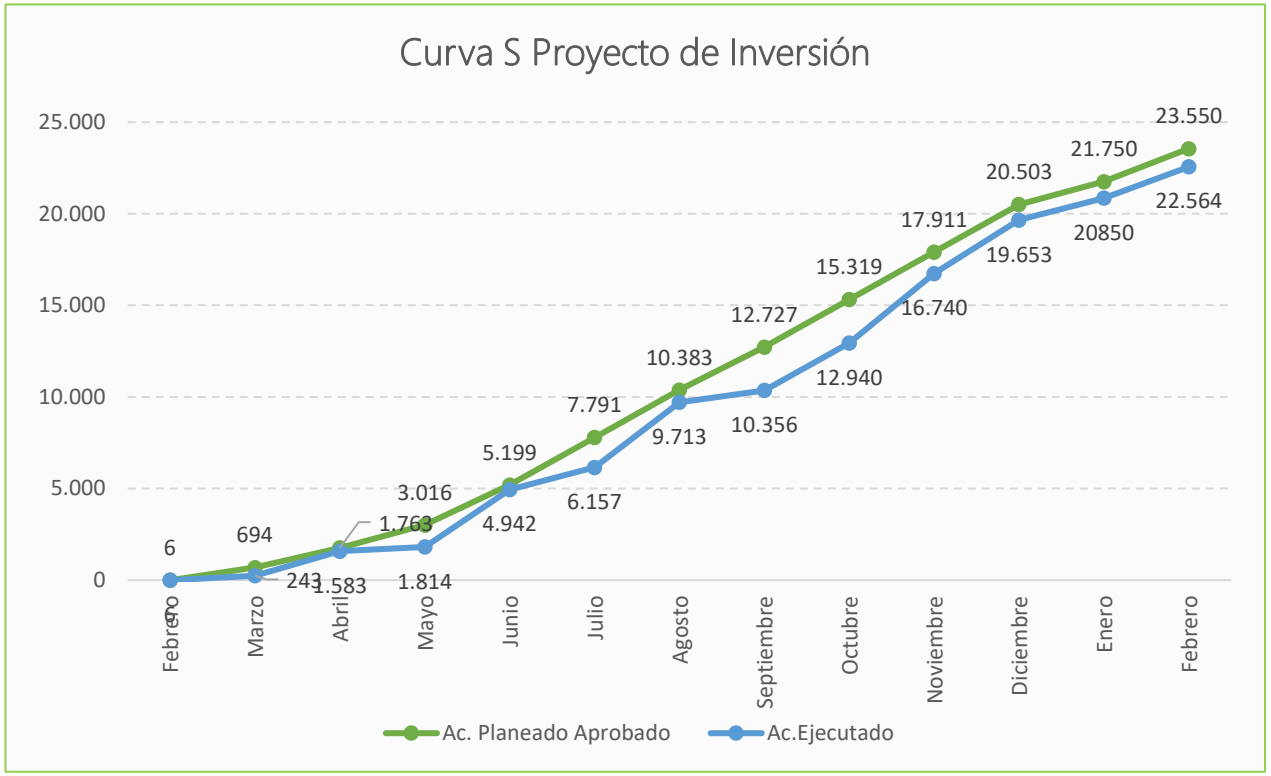

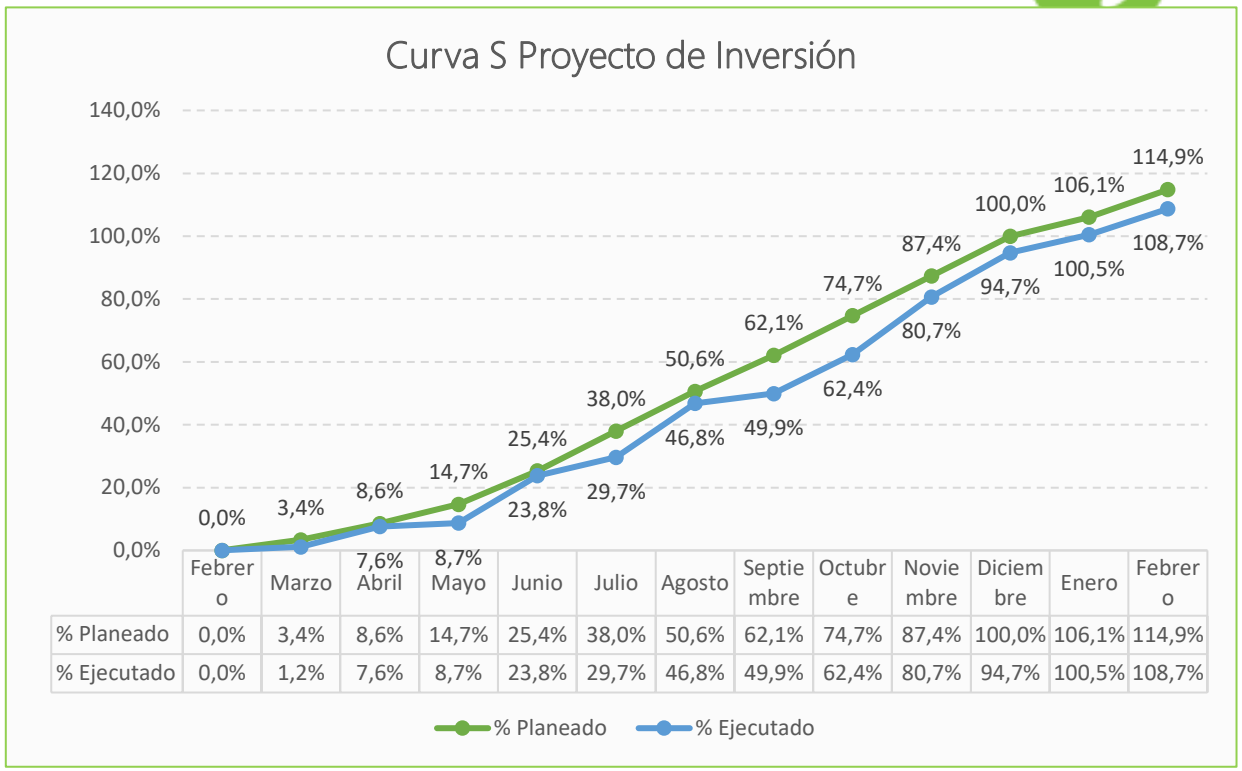


	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
% Planeado	0,0%	3,4%	8,6%	14,7%	25,4%	38,0%	50,6%	62,1%	74,7%	87,4%	100,0%	106,1%	114,9%
% Ejecutado	0,0%	1,2%	7,6%	8,7%	23,8%	29,7%	46,8%	49,9%	62,4%	80,7%	94,7%	100,5%	108,7%

Se ha cumplido con los compromisos contractuales, con respecto al año pasado solo quedaron pendiente los proyectos que requieren aprobación ante terceros, Afinia Proyectos de redes y ante las vías concesionadas, Este año se continua con la gestion de los tramites.

Avances en la prestación del servicio


Imágenes y videos








GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN – Mapa de Cobertura

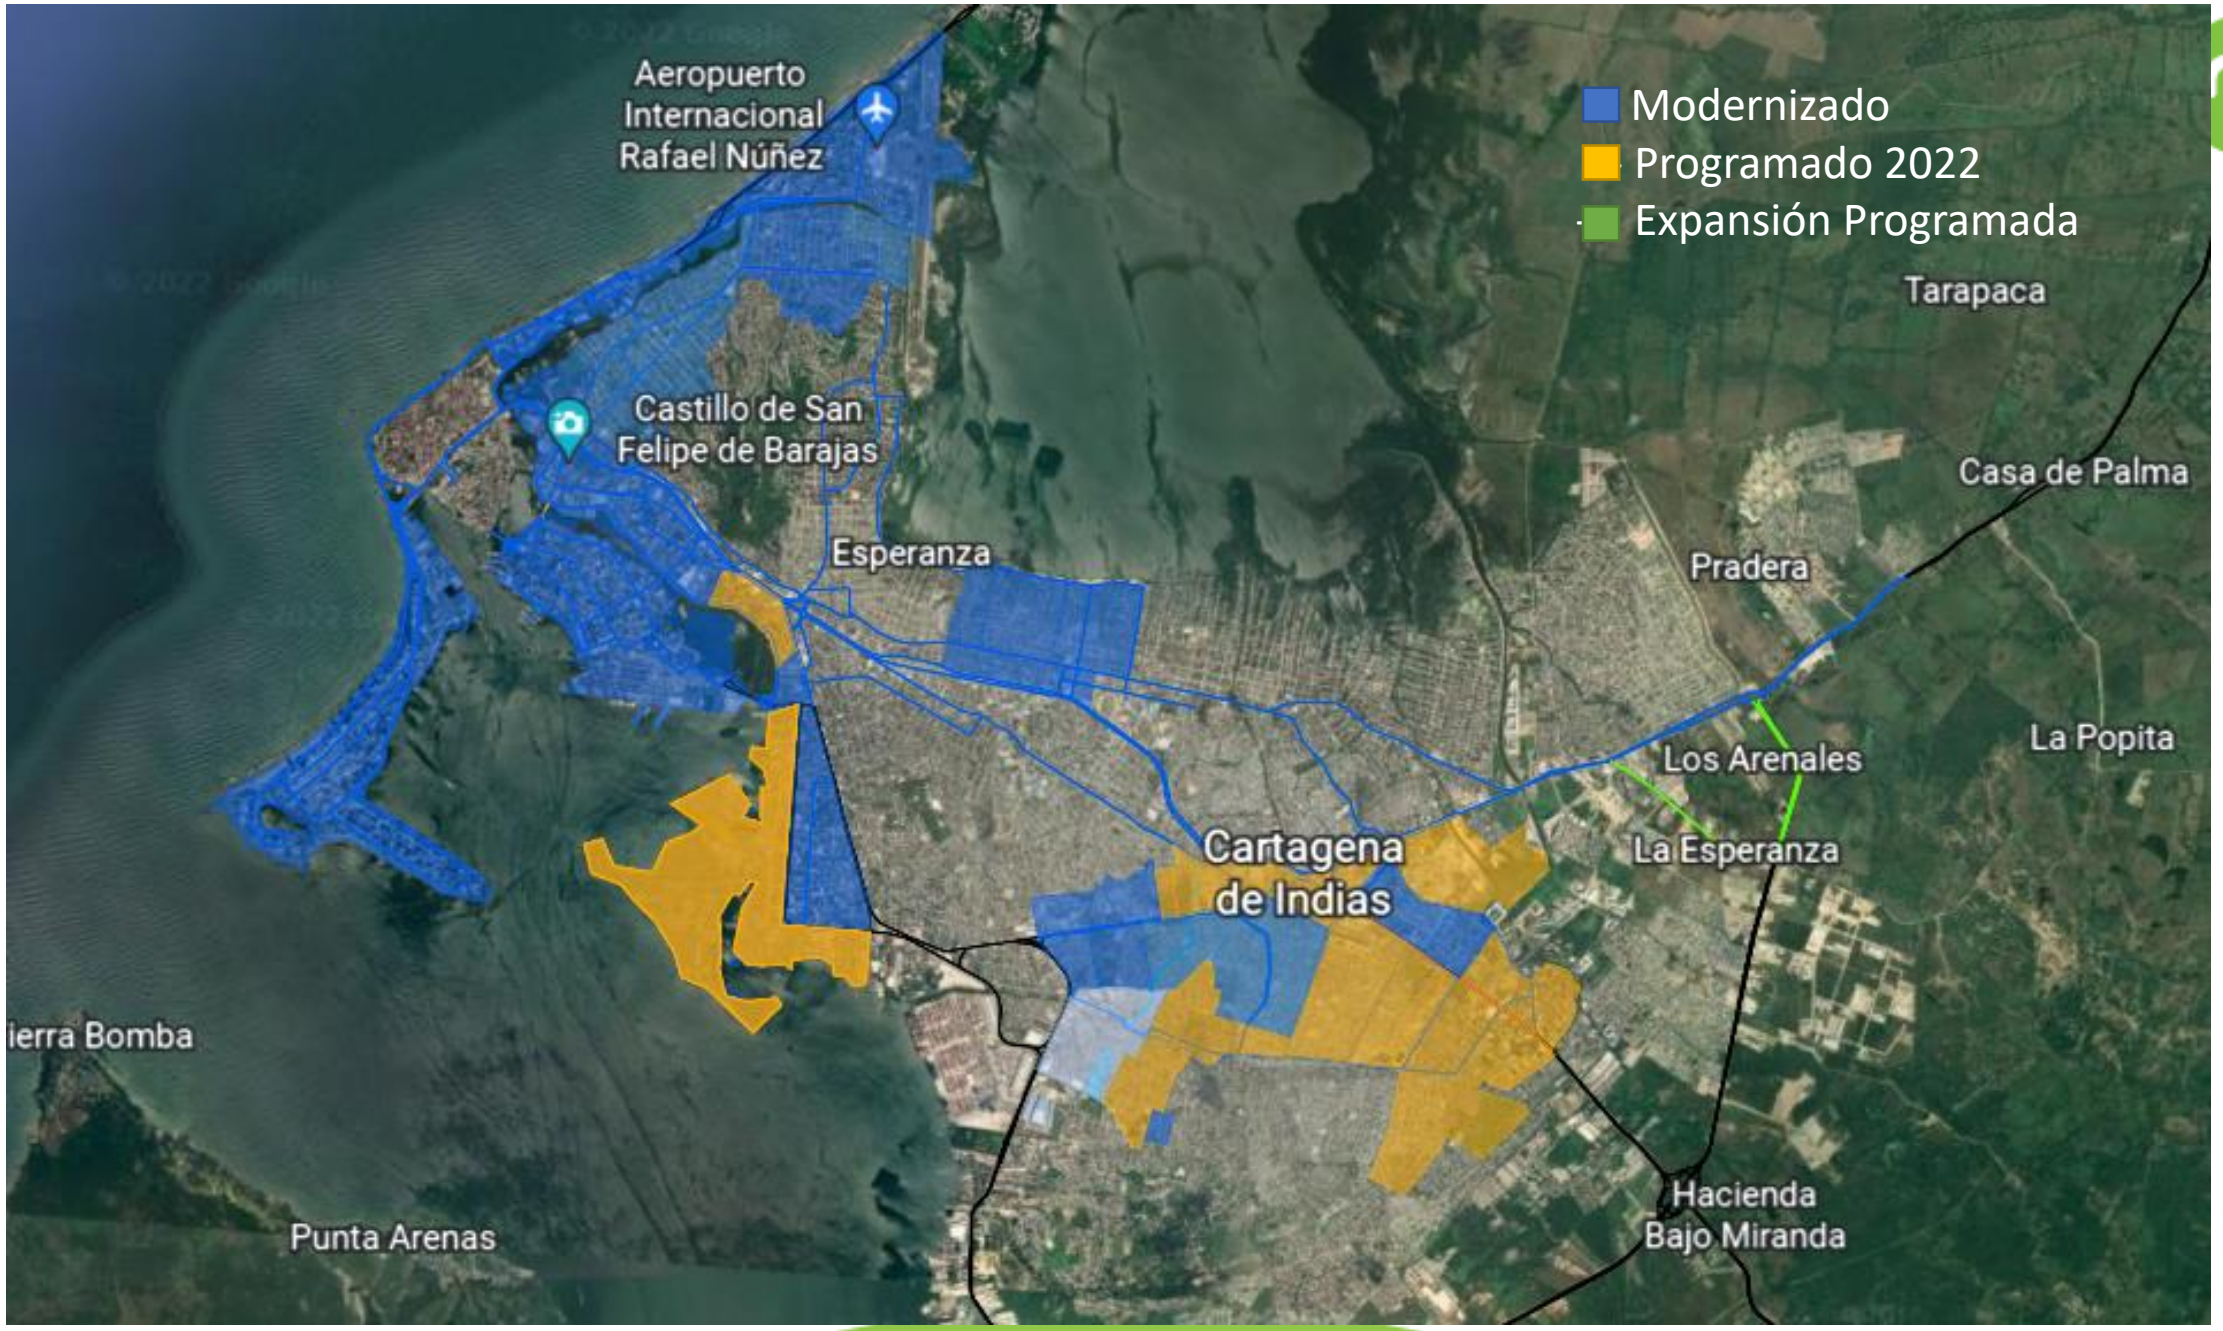

¡Gracias!

Apellidos

correo@epm.com.co

Teléfono:
