REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER
CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Demolición de pavimentos rígidos	m^2	$ 16.877,39	108,20	$ 1.826.095,00
1,2	Traslado de postes	un	$ 410.101,98	4,00	$ 1.640.408,00
1,3	Excavación en material común de explanación y canales	m^3	$ 22.177,45	183,02	$ 4.058.917,00
1,4	Excavaciones en Roca sin prestamos	m^3	$ 72.427,18	37,50	$ 2.716.019,00
	Sub total				**$ 10.241.439,00**
2	**ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN**				
2,1	Excavaciones en Roca sin Prestamos	m^3	$ 72.427,18	30,00	$ 2.172.815,00
2,2	Excavación en material común de explanación y canales	m^3	$ 22.177,45	214,43	$ 4.755.510,00
2,3	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención	kg	$ 6.323,10	2.162,27	$ 13.672.248,00
2,4	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m^3	$ 556.505,87	51,57	$ 28.699.008,00
2,5	Relleno de Estructuras con Recebo	m^3	$ 21.188,50	124,75	$ 2.643.265,00
	Sub total				**$ 51.942.846,00**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3,1	Base granular clase B	m^3	$ 107.886,83	180,59	$ 19.483.282,00
3,2	Pavimento en concreto hidráulico de fraguado rápido (4000 psi)	m^3	$ 539.968,81	213,41	$ 115.234.744,00
3,3	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m^3	$ 556.505,87	-	$ -
3,4	Acero de refuerzo fy 4200 MPA para bordillo	kg	$ 6.323,10	377,28	$ 2.385.579,00
3,5	Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 26.717,55	402,00	$ 10.740.455,00
	Sub total				**$ 147.844.060,00**
4	**VARIOS**				
4,1	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria 6" de diámetro	ml	$ 74.966,02	16,00	$ 1.199.456,00
4,2	Pozo de inspección diámetro interior 1,5 m y 3,5 m de prof.	un	$ 3.449.449,88	1,00	$ 3.449.450,00
4,3	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria 4" de diámetro	ml	$ 46.931,09	4,00	$ 187.724,00
4,4	Transporte de materiales provenientes de demolición y excavación	m^3	$ 15.714,00	531,32	$ 8.349.162,00
	Sub total				**$ 13.185.792,00**
5	**COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS**				
5,1	Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI)	m^3	$ 851.130,87	18,78	$ 15.984.238,00
5,2	Enchape para Baño	m^2	$ 49.375,93	11,00	$ 543.135,00
5,3	Muro de Mampostería N°4	m^2	$ 41.014,37	41,40	$ 1.697.995,00
	Sub total				**$ 18.225.368,00**
6	**ITEM NO PREVISTOS**				
6,1	Dren francés, geotextil no tejido 1600 y graba tubo de 4" perforado, de 0,35 de ancho por 2,75 de alto	m	$ 173.525,00	23,48	$ 4.074.367,00
6,2	Acero Refuerzo Adicional para las dovelas y juntas longitudinales del pavimento fy 420 Mpa.	kg	$ 6.323,10	1.277,29	$ 8.076.432,00
6,3	Realce de los pozos de inspección	un	$ 215.480,40	12,00	$ 2.585.765,00
6,4	Realce de los sumideros	un	$ 460.285,00	2,00	$ 920.570,00
6,5	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m3	$ 556.506	4,06	$ 2.259.414,00
6,6	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención	kg	$ 6.323	367,20	$ 2.321.842,00
	Sub total				**$ 20.238.390,00**
COSTO DIRECTO					**$ 261.677.895,00**
ADMINISTRACIO 6%					$ 15.700.673,70
IMPREVISTOS 1%					$ 2.616.778,95
UTILIDAD 5%					
VALOR TOTAL DEL PUENTE AJUSTADA AL PESO					**$ 279.995.348,00**

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
C. C. No.: 2.175.201	C. C. No. 13.925.781	Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.		Territorial		

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

PRELIMINARES

ITEM	1,1	Demolición de pavimentos rígidos				UNID	m2

CANT	LONG	ANCHO				TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	11,00	6,20				68,20	Al terminar el Muro del Asilo
1,00	8,00	5,00				40,00	Al inicio de la obra Calle 5 con carrera 8
					TOTAL:	108,20	

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: ~~13.925.791~~** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**


INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

PRELIMINARES

ITEM	**1,2**	**Traslado de postes**				**UNID**	**un**
CANT					**TOTAL**	**OBSERVACIONES**	
2,00					**2,00**	**De Alumbrado Publico**	
2,00					**2,00**	**Red de baja tensión**	
				TOTAL:	**4,00**		

DESCRIPCION



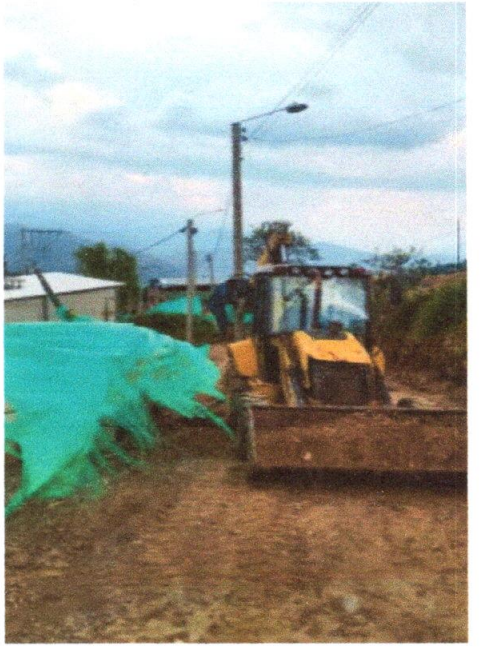

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022	Fecha: 7/03/2022
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	
SUPERVISOR	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS	

PRELIMINARES

ITEM	1,3	Excavación en material común de explanación y canales				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO	ESPESOR			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	145,00	6,00	0,14			121,20	Calle 5 entre 8 hacia la 9
1,00	25,00	4,50	0,36			40,50	Carrera 8
1,00	16,40	6,50	0,20			21,32	Carrera 8
					TOTAL:	183,02	

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ C. C. No.: 2,175,201 "ASOJUNTAS"	Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ C. C. No.: 13.925.791 T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

PRELIMINARES

ITEM	1,4	Excavaciones en Roca sin prestamos				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO	ESPESOR			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	20,00	1,50	1,25			37,50	Calle 5 entre 8 hacia la 9
					TOTAL:	37,50	

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

ITEM	2,1	Excavaciones en Roca sin Prestamos				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO	ESPESOR			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	10,00	2,00	1,50			30,00	Rocas a nivel de la cota de cimentación de la estructura
					TOTAL:	30,00	

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

ITEM	2,2	Excavación en material común de explanación y canales				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO	ALTURA			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	23,50	2,65	3,08			191,50	Estructura de contensión Reforzado
1,00	18,20	0,90	1,40			22,93	Para la cimentación de la estructura de contensión Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI)
					TOTAL:	214,43	

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

ITEM	2,3	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención				UNID	kg
CANT	LONG PRO	kg/ml				TOTAL	OBSERVACIONES
45,00	2,70	1,00				121,50	Refuerzo A superior zarpa
48,00	2,47	1,00				118,56	Refuerzo A superior zarpa
110,00	2,70	1,00				297,00	Refuerzo B superior zarpa
66,00	2,47	1,00				163,02	Refuerzo B superior zarpa
55,00	3,45	1,00				189,75	Refuerzo C exterior elevación
53,00	2,94	1,00				155,82	Refuerzo C exterior elevación
59,00	2,90	1,00				171,10	Refuerzo D exterior elevación
78,00	3,23	1,00				251,94	Refuerzo F exterior elevación
18,00	25,50	0,56				257,04	Refuerzo de 3/8" zarpa
20,00	25,50	0,56				285,60	Refuerzo de 3/8" zarpa
2,00	12,00	0,56				13,44	Refuerzo de 3/8" zarpa dentellon
55,00	2,50	1,00				137,50	Refuerzo de 1/2"" zarpa dentellon
					TOTAL:	2.162,27	

DESCRIPCION



Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	


ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

ITEM	2,4	Concreto Resistencia de 28 Mpa				UNID	m3

CANT	LONG	ANCHO	ALTURA			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	20,60	2,25	0,45			20,86	Zarpa muro
1,00	2,88	2,00	0,45			2,59	Zarpa muro
1,00	20,60	0,38	2,75			21,53	Elevación
1,00	2,88	0,38	2,40			2,63	Elevación
1,00	11,00	0,60	0,60			3,96	Dentellón
					TOTAL:	51,57	

DESCRIPCION



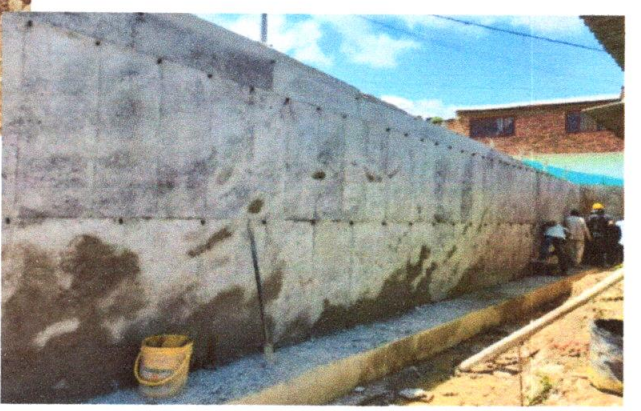

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	


ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

ITEM	2,5	Relleno de Estructuras con Recebo	UNID	m3

CANT	LONG	ANCHO	ALTURA			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	20,60	2,10	2,30			99,50	Relleno estructura de contención
1,00	2,88	1,80	2,00			10,37	
1,00	18,60	1,00	0,80			14,88	Relleno muro en Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI)
					TOTAL:	124,75	

DESCRIPCION



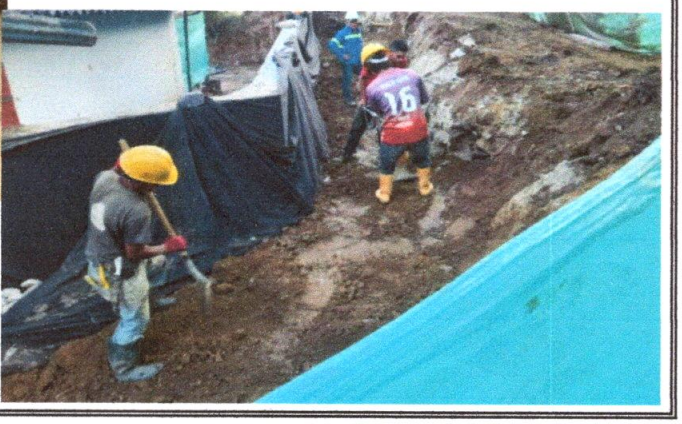

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

ITEM	6,1	Dren francés, geotextil no tejido 1600 y graba tubo de 4" perforado, de 0,35 de ancho por 2,75 de alto	UNID	m

CANT	LONG					TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	20,60					20,60	Cara interna del muro reforzado
1,00	2,88					2,88	
					TOTAL:	23,48	

DESCRIPCION



Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ITEM	3,1	Base granular clase B				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO	ALTURA		TOTAL	OBSERVACIONES	
1,00	140,00	6,00	0,15		126,00	Calle 5 entre 8 hacia la 9	
1,00	46,90	6,00	0,15		42,21	Carrera 8	
1,00	7,00	3,00	0,15		3,15	Interseccion carrera 8 con calle 5	
1,00	3,00	2,50	0,15		1,13	Interseccion calle 5 con 8A	
1,00	9,00	6,00	0,15		8,10	Carrera 8A intersección	
				TOTAL:	180,59		

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ITEM	3,2	Pavimento en concreto hidráulico de fraguado rápido (4000 psi)				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO	ALTURA			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	140,00	5,80	0,18			146,16	Calle 5 entre 8 hacia la 9
1,00	46,90	5,80	0,18			48,96	Carrera 8
1,00	7,00	5,80	0,18			7,31	Interseccion carrera 8 con calle 5
1,00	8,00	5,80	0,18			8,35	Interseccion calle 5 con 8A
1,00	46,90	0,70	0,08			2,63	Anden carrera 8
					TOTAL:	213,41	

DESCRIPCION



Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ITEM	3,3	Concreto Resistencia de 28 Mpa				UNID	m3
CANT	LONG	ANCHO				TOTAL	OBSERVACIONES
					TOTAL:	-	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ITEM	3,4	Acero de refuerzo fy 4200 MPA para bordillo				UNID	kg
CANT	LONG PRO	kg/ml			TOTAL	OBSERVACIONES	
1.140,00	0,45	0,56			287,28	Ancalje en U varilla de 3/8" cada 30 centimetros	
1,00	360,00	0,25			90,00	Varilla de 1/4" longitudinal refuerzo boldillo	
				TOTAL:	377,28		

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ITEM	3,5	Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo				UNID	m
CANT	LONG					TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	201,00					201,00	Izquierda
1,00	201,00					201,00	Derecha
					TOTAL:	402,00	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**


INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	


ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ITEM	6,2	Acero Refuerzo Adicional para las dovelas y juntas longitudinales del pavimento fy 420 Mpa.	UNID	kg

CANT	LONG PRO	kg/ml				TOTAL	OBSERVACIONES
1.100,00	0,35	3,97				1.529,61	Acero de 1" liso para las dovelas de las juntas transversales
220,00	2,80	0,15				94,86	Acero Para conformar las dovelas de 4,5 mm
200,00	1,70	1,00				340,00	Acero juntas longitudinales
213,41	(1,00)	3,22				(687,18)	Menos Acero contabilizado en el concreto del pavimento
					TOTAL:	1.277,29	

DESCRIPCION

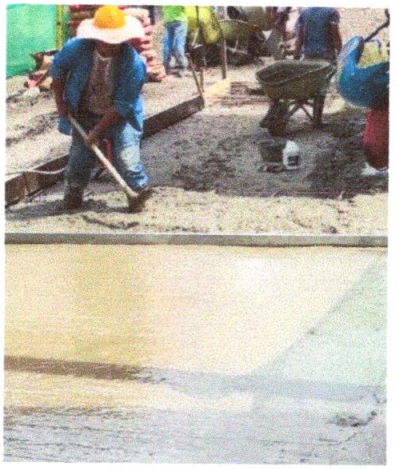

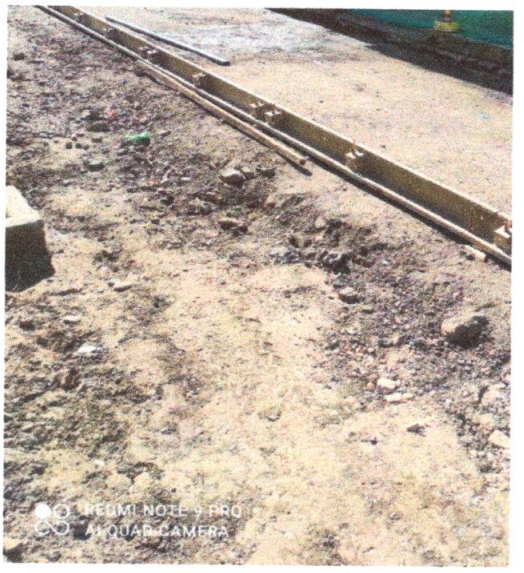

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

VARIOS

ITEM	4,1	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria 6" de diámetro				UNID	ml
CANT	LONG					TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	16,00					16,00	
					TOTAL:	16,00	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

VARIOS

ITEM	4,2	Pozo de inspección diámetro interior 1,5 m y 3,5 m de prof.	UNID	un

CANT						TOTAL	OBSERVACIONES
1,00						1,00	
					TOTAL:	1,00	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

VARIOS

ITEM	4,3	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria 4" de diámetro				UNID	ml

CANT	LONG					TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	4,00					4,00	
					TOTAL:	4,00	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	


VARIOS

ITEM	4,4	Transporte de materiales provenientes de demolición y excavación	UNID	m3

CANT	EXCA.					TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	210,47					210,47	Excavación en material común de explanación y canales
1,00	41,25					41,25	Excavaciones en Roca sin prestamos
1,00	33,00					33,00	Excavaciones en Roca sin Prestamos
1,00	246,59					246,59	Excavación en material común de explanación y canales
					TOTAL:	531,32	

DESCRIPCION



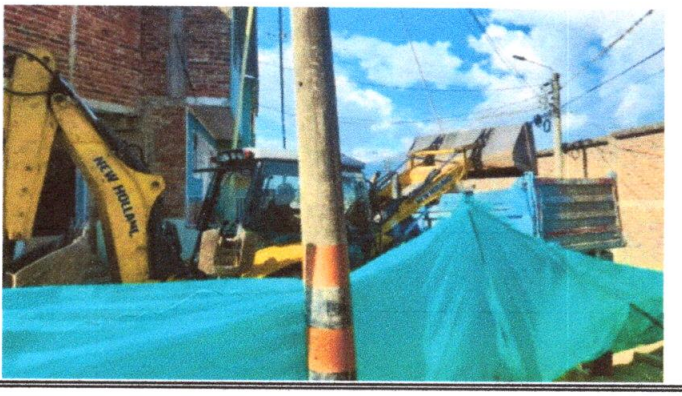

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ**	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**
C. C. No.: 2,175,201	**C. C. No.: 13.925.791**	**Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

VARIOS

ITEM	6,3	Realce de los pozos de inspección	UNID	un

CANT						TOTAL	OBSERVACIONES
6,00						6,00	Calle 5 entre carrera 8 hacia 9 sanitario
6,00						6,00	Calle 5 entre carrera 8 hacia 9 pluvial
					TOTAL:	12,00	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

VARIOS

ITEM	6,4	Realce de los sumideros	UNID	un

CANT						TOTAL	OBSERVACIONES
2,00						2,00	Calle 5 entre carrera 8 hacia 9 pluvial
					TOTAL:	2,00	

DESCRIPCION

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**


INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022**	**Fecha:** 7/03/2022
CONTRATISTA:	**ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ**	
SUPERVISOR	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS**	

COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

ITEM	5,1	Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI)	UNID	m3

CANT	LONG	ANCHO	ALTURA			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	3,80	0,80	1,50			4,56	Al terminar el Muro del Asilo
1,00	3,20	0,60	1,03			1,97	Al inicio de la obra Calle 5 con carrera 8
1,00	5,00	0,75	1,25			4,69	
1,00	3,10	0,80	1,50			3,72	
1,00	3,10	0,80	1,55			3,84	
					TOTAL:	18,78	

DESCRIPCION

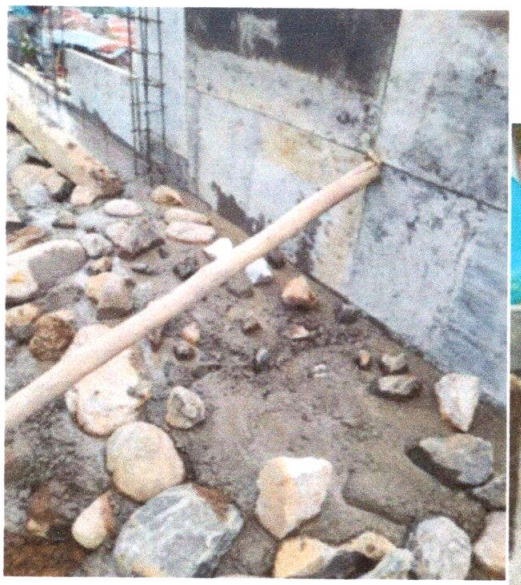



Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01190-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022	Fecha: 7/03/2022
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	
SUPERVISOR	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS	

COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

ITEM	5,3	Muro de Mampostería N°4				UNID	m2

CANT	LONG	ALTURA				TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	1,96	2,30				4,51	
1,00	0,25	2,30				0,58	Baño
1,00	3,50	0,20				0,70	
1,00	3,16	2,45				7,74	TRAMO 1
1,00	2,87	2,20				6,31	TRAMO 2
1,00	3,04	2,22				6,75	TRAMO 3
1,00	2,85	2,20				6,27	TRAMO 4
1,00	2,79	2,23				6,22	TRAMO 5
1,00	1,29	1,80				2,32	TRAMO 6
					TOTAL:	41,40	

DESCRIPCION



Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ **C. C. No.: 2,175,201** **"ASOJUNTAS"**	**Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ** **C. C. No.: 13.925.791** T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	**ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS** **Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial**

RES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS N°. 01		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022	Fecha: 7/03/2022
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	
SUPERVISOR	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS	

COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

ITEM	5,4	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contencion				UNID	kg
CANT	LONG	Refu kg/ml	Varillas			TOTAL	OBSERVACIONES
7,00	3,50	0,56	4,00			54,88	Columnetas Longitudinal de 3/8"
150,00	0,75	0,25	1,00			28,13	Estribos de 1/4" columnetas
1,00	22,69	0,56	6,00			76,24	Viga cimentacionVarilla de 3/8"
144,00	1,00	0,25	1,00			36,00	Estribos de 1/4" viga cimentación
1,00	24,48	0,56	4,00			54,84	Viga corona Varilla de 3/8"
154,00	0,65	0,25	1,00			25,03	Estribos de 1/4" viga corona
1,00	1,60	1,00	21,00			33,60	Placa baño
1,00	1,50	0,56	14,00			11,76	
1,00	2,70	0,56	2,00			3,02	Dintel puerta baño
1,00	3,50	1,00	7,00			24,50	Gradas de entrada
1,00	1,20	1,00	16,00			19,20	
					TOTAL:	367,20	

DESCRIPCION





Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ C. C. No.: 2,175,201 "ASOJUNTAS"	Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ C. C. No.: 13.925.791 T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial

RES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS N°. 01		
Proyecto: PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.		
CONVENIO SOLIDARIO No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022	Fecha: 7/03/2022
CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS" R/L BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	
SUPERVISOR	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS	


COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

ITEM	5,5	Concreto Resistencia de 28 Mpa				UNID	m3

CANT	LONG	ANCHO	ALTURA			TOTAL	OBSERVACIONES
1,00	4,04	0,25	0,25			0,25	Viga cimentacion muro N°. 4
1,00	3,16	0,25	0,25			0,20	
1,00	4,93	0,25	0,25			0,31	
1,00	3,13	0,25	0,25			0,20	
1,00	3,13	0,25	0,25			0,20	
1,00	3,10	0,25	0,25			0,19	
1,00	4,04	0,10	0,25			0,10	Viga corona
1,00	3,16	0,10	0,25			0,08	
1,00	4,93	0,10	0,25			0,12	
1,00	3,13	0,10	0,25			0,08	
1,00	3,13	0,10	0,25			0,08	
1,00	3,10	0,10	0,25			0,08	
1,00	1,59	0,10	0,25			0,04	
1,00	0,70	0,12	2,45			0,21	Columnetas de confinamiento
1,00	0,30	0,12	2,45			0,09	
5,00	0,30	0,12	2,20			0,40	
1,00	0,30	0,12	1,80			0,06	
1,00	3,12	1,60	0,12			0,60	Placa cubierta baño para soporte tanque
1,00	2,70	0,10	0,15			0,04	Dintel puerta baño
1,00	3,50	1,10	0,19			0,73	Gradas entrada
					TOTAL:	4,06	

DESCRIPCION



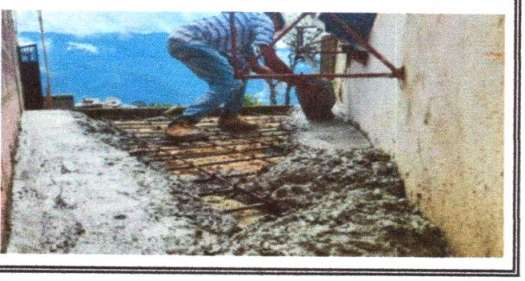

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ C. C. No.: 2,175,201 "ASOJUNTAS"	Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ C. C. No.: 13.925.791 T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial
