INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	01 de noviembre de 2018	**PERIODO No.**	28	DEL	**25/10/2018**	AL	**31/10/2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	2018363			CONTRATO No.:	20171833		
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018		
PLAZO ACTUALIZADO:	243			PLAZO ACTUALIZADO:	243		
PLAZO TRANSCURRIDO:	195	EQUIVALE AL	80,25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	195	EQUIVALE AL	80,25%
VALOR INICIAL :	$		433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$		4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$		-	VALOR ADICIÓN(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$		189.132.921,00	VALOR PAGADO:	$		1.990.157.379,00
VALOR POR PAGAR:	$		244.074.679,00	VALOR POR PAGAR:	$		2.568.283.820,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez			INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado			
1	0	0			
2	0	0			
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**34,81%**	
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**42,22%**	
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**42,22%**	
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**45,93%**	
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**51,11%**	
8	52	121	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**89,63%**	
9	14	135	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	**100,00%**	

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	**1,45%**	V2
8	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	**1,45%**	V2
9	12	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	**18,84%**	V2
10	0	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	**18,84%**	V2
11	3	16	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	**23,19%**	V1
12	3	19	Indicador= $\frac{\#diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	**27,54%**	V1
13	8	27	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	**39,13%**	V1
14	8	35	Indicador= $\frac{\#\ diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	**50,72%**	V1
15	3	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**55,07%**	V1
16	0	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**55,07%**	V1
17	14	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**75,36%**	V1
18	0	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**75,36%**	V1
19	8	60	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**86,96%**	V1
20	2	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**89,86%**	V0
21	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**89,86%**	V0
22	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**89,86%**	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
26	3	3	
27	8	11	
28	0	11	
29			
30			
acum		11	Aprobada

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	0,00%
acumulado	11
porcentaje acumulado	37,93%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	01 de noviembre de 2018	**PERIODO No.**	28	DEL	**25/10/2018**	AL	**31/10/2018**

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
27	1	0
28	2	2
Acum		**23**

Programados Semanal	%
Avance Semanal	4,55%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	52,27%

6. Actividades Administrativas

En la vigésimo octava semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 89,86%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 86,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

•Con respecto a la entrega de diseños en georreferenciación, esta semana el Contratista realizó la entrega de (0) diseños para un acumulado de 11 diseños, correspondientes al 39,43% del total de entregas.

• En el componente de obra se traabjó en instalación de mallas del ID 9_2 Fase II, el ID queda finalizado esta semana.
En el ID 9_9 se trabajó en la instalación de 15,24m lineales de defensa metálica y 4 terminales de impacto X-Lite.

• Se realiza comité de seguimineto de obra # 28.


• El contratista envia informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



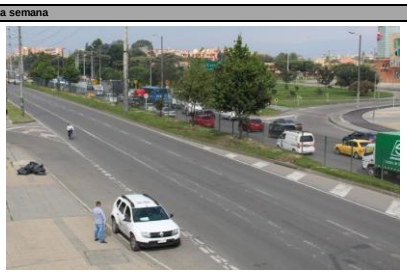

ID 9_2 Av. Ciudad de Cali entre Calles 18 y 20





ID 9_9 (Carrera 91 con Calle 20ª)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**
