


001

uf1 mallorquín	HOJA DE CONTROL DE INFORMES	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	EDU- 566-2021
ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL No 6**
CODIGO: IM-504-06	

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsable de Elaboración	Nombre:	CYNTHIA VILLEGAS			
	Firma:				
	Fecha:	mar-22			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	mar-22			
Vo. Bo. Gerente del Proyecto	Nombre:	FABIAN SUAREZ			
	Firma.				
	Fecha:	mar-22			


CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	EDUBAR S.A	1 COPIA FÍSICA
1	EDUBAR S.A	1 COPIA MAGNETICA
1	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	1 COPIA MAGNETICA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA S.A

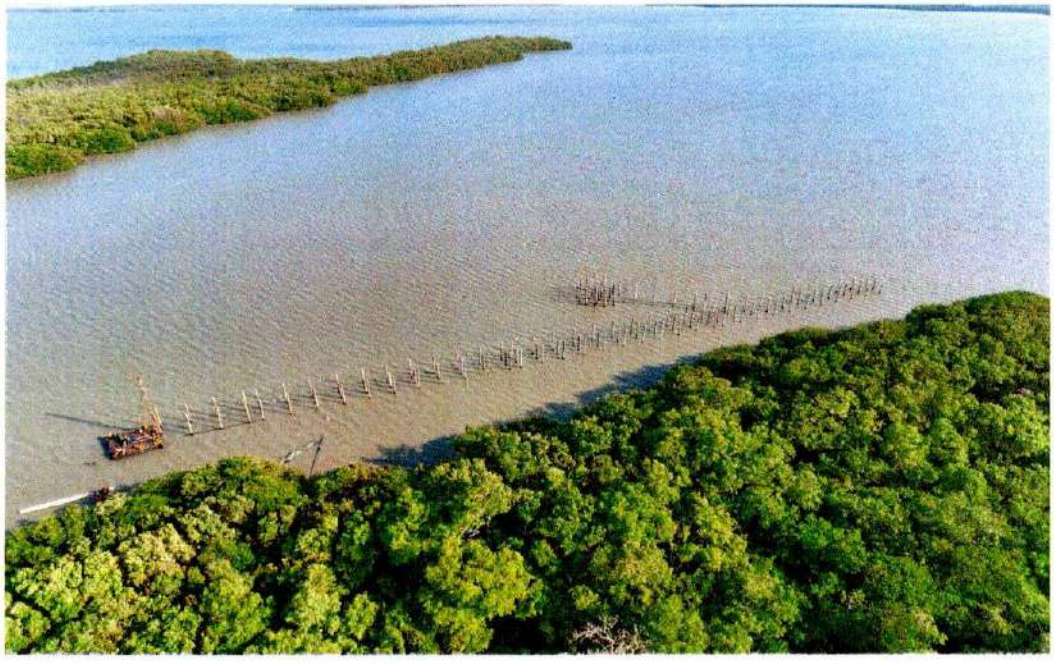

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6

(PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022)

IM-504-06

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INTERVENTOR: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

BARRANQUILLA – FEBRERO 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
CONTRATO DE INTERVENTORIA	EDU- 566 – 2021.
CONTRATO DE OBRA:	EDU – 561 – 2021.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN – NIT 901.501.273 – 2
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6

Control de Distribución del Documento				
Nombre	Área o Entidad	Copia No.	Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC	Fecha
Ing. Diego Rada Altahona	Edubar	1	C	Marzo/2022
Pedro Gutiérrez	Interventoría	1	C	Marzo/2022
CONTROL DE MODIFICACIONES				
Versión	Descripción de Modificaciones			Fecha

Elaboró:	Ing. Cynthia Villegas	
Aprobó:	Ing. Fabian Suarez	
Responsable:	Ing. Pedro Gutiérrez	

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
1.0 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....6
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....6
1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO.....7
1.3. DESCPRICION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....10
1.4. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.....11
2.0 ESTADO DE LOS CONTRATOS.....15
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....15
2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....16
2.3. INFORMACIÓN PÓLIZAS CONTRATISTA.....17
2.4. INFORMACIÓN PÓLIZAS INTERVENTORÍA.....17
2.5 BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS.....18
2.5.1. CONTRATO DE OBRA.....18
2.5.1.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.....18
2.5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....19
2.5.2.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....19
3.0 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.....20
3.1. CONTRATO DE OBRA.....20
3.2 CONTRATO INTERVENTORÍA.....28
4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.....29
5.0 CONTROL DEL PERSONAL.....31
5.1. CONTRATO DE OBRA.....31
5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....31
6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.....32
7.0. ESTADO DEL TIEMPO.....35
8.0 CONTROL DE CALIDAD.....36
9.0 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.....36

LISTA DE ANEXOS

ANEXO No. 1 INFORMES SEMANALES.

ANEXO No. 2 OFICIOS RECIBIDOS

ANEXO No. 3 OFICIOS ENVIADOS.

ANEXO No. 4 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO No. 5 INFORME Y ASPECTOS AMBIENTALES

ANEXO No. 6 COMITÉ DE OBRA

ANEXO No. 7 INDICADORES DE CALIDAD

ANEXO No. 8 GESTION SOCIAL

ANEXO No. 9 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO No. 10 BITACORA

ANEXO No. 11 INFORME Y ASPECTOS SST

006

INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las actividades ejecutadas por el CONSORCIO JCO MALLORQUIN, durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2022, en el cual se desarrollaron las actividades contenidas dentro del Contrato de Obra **No. EDU-561 – 2021,** teniendo por objeto "**INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA".**

A través de este informe se presentan los procesos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de seguridad en el trabajo, a cargo del CONSORCIO UF1 MALLORQUIN., en la ejecución del Contrato **N.º EDU-566-2021**, suscrito con **EDUBAR SAS**, con el fin de realizar el seguimiento del Proyecto e informar el debido cumplimiento por parte del Contratista de cada una de las actividades contratadas para la ejecución a satisfacción de la obra y las eventualidades que se presenten durante el desarrollo del mismo.

007

1.0 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

EDUBAR S.A.S., en el marco de sus obligaciones, considera necesario y oportuno realizar el proceso de contratación de la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

La Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-06-2021 y una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta por parte del CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7.

Que el 23 de julio de 2021, EDUBAR SA., suscribió un contrato Interventoría No. EDU-566-2021 con el CONSORCIO UF1 MALLORQUIN por valor de $3,974.629.750 incluido IVA y con plazo hasta 31 de diciembre de 2021.

De igual forma, la Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-04-2021 y una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta por parte del CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.501.273 – 2.

Que el 21 de julio de 2021, EDUBAR SA., suscribió un contrato Obra No EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUIN por valor de $82.464.264.620 incluido IVA y con plazo hasta 31 de diciembre de 2021.

Que el 20 de diciembre de 2021, EDUBAR SA., suscribió Prorroga No 1 del EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUIN con plazo hasta 30 de junio de 2022.

1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO.

La Ciénaga de Mallorquín cuenta con 650 hectáreas de extensión y se ubica al norte del departamento del Atlántico, en jurisdicción de los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia que forman parte del área metropolitana de Barranquilla. Funciona como una laguna costera después de que en 1935, con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, se modificara el régimen estuarino dada su conexión y dependencia del río Magdalena. Con esta circunstancia comenzaron los problemas para el cuerpo de agua, pues el intercambio necesario de aguas para el equilibrio se rompió causando grandes consecuencias negativas a la vida acuática que alberga, y estimuló la acumulación de contaminantes en niveles no aceptables y procesos de sedimentación importantes.

Actualmente, una de las problemáticas es la contaminación, ya que el sector de las Flores se ha utilizado para disponer residuos sólidos de la ciudad de forma indiscriminada, funcionando como un botadero de basuras a cielo abierto, promoviendo la contaminación progresiva de las aguas, así como la proliferación de enfermedades para la población aledaña. Así mismo, la Ciénaga ha sido contaminada por la entrada de grandes cantidades de desechos provenientes de sectores aledaños, del suroccidente de la ciudad y

de los municipios de la parte alta y media de la cuenca del Arroyo Grande y León.

Otra problemática latente es el cambio de borde de Ciénaga por erosión y sedimentación debido a los asentamientos informales y no controlados de edificaciones sobre la ribera de la misma. Con el aterramiento de toneladas de escombros y material de relleno se ha provocado la destrucción de numerosas hectáreas de manglar, fuente y base de la productividad pesquera y acuática de la Ciénaga y protector natural de la línea de costa, que en el sector tiene una alta dinámica erosiva. Al analizar el área de estudio, se evidencian las modificaciones drásticas que han alterado no sólo las dinámicas naturales, sino esencialmente la manera en que la ciudad y los ciudadanos se relacionan con el agua. A raíz del crecimiento no controlado de los barrios La Playa y Las Flores, además de las grandes obras de ingeniería, siendo la más importante el Tajamar de Bocas de Ceniza, se ha rellenado y construido la costa y sobre la Ciénaga para solucionar problemas de accesibilidad y conectividad, olvidando la condición ecológica de dicho cuerpo de agua. Así, en cuento a la evolución costera de la Ciénaga de Mallorquín se considera que:

- Con la construcción de los tajamares se pasó de un régimen estuarino a uno de laguna costera, ya que se perdió la conexión y dependencia permanente del río Magdalena.
- Desde los años 30 la barra ha sufrido erosión progresiva y un déficit de sedimentos transportados a las playas a causa de la construcción de los tajamares.
- En la actualidad (desde 1980 hasta ahora), la Ciénaga de Mallorquín ha venido sufriendo cambios severos, especialmente relacionados con las variaciones de la urbanización.

• A causa de la fuerte presión antropogénica dominante, la Ciénaga de Mallorquín en su cuerpo de agua, ha perdido entre 1984 y el 2018 unas 370 hectáreas que equivalen a casi un 50%

• Al proceso evolutivo de la Ciénaga de Mallorquín se suman diversas problemáticas ambientales en sus ecosistemas afluentes y a lo largo de toda su cuenca hidrográfica. En esta última se ha generado un desequilibrio en los cauces de los arroyos y por ende en cantidad de agua que debería llegar a la Ciénaga.

Como parte del desarrollo de la ciudad de Barranquilla en 2019 se propone el Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, como una respuesta al cambio climático y a la urgente necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza en una ciudad que no sólo piensa en el presente, sino también planea la calidad de vida de la futura Barranquilla. En 2019, se propone el programa de gobierno para la ciudad de Barranquilla 2020-2023, que establece el objetivo de plantear no sólo el crecimiento y los lineamientos de la ciudad en estos cuatro (4) años, sino también consolidar las bases para el desarrollo urbano de la ciudad en la década próxima basándose en seis (6) líneas de acción, desarrollo de capital humano, mejores espacios públicos, conectividad de la ciudad, cultura y deporte, empleabilidad y gestión pública. En consecuencia, la Ciénaga de Mallorquín se presenta de vital importancia no sólo para la integración del tejido natural a las dinámicas de Barranquilla, sino también para ser un punto de partida para un crecimiento resiliente en los años venideros de la Ciudad. La Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín busca Potencializar la Ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación integral de los ecosistemas, la implementación de implementado acciones de recuperación de calidad el agua, playas, el desarrollo urbano, mangares, parques, senderos e infraestructura que permita el disfrute y uso

sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras de infraestructura, de transporte y espacio público. De igual manera, se buscará la recuperación de servicios eco-sistémicos y la protección de la ronda hídrica de la Ciénaga.

1.3. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Ecoparque Uf1 Distrito Familiar, se desarrolla en el Departamento del Atlántico, en la vía que comunica a Barranquilla con el Corregimiento de La Playa.



Ilustración 1 Localización del Proyecto

La propuesta para el Ecoparque Ciénaga Mallorquín se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje que solucionen problemas de accesibilidad, contaminación, crecimiento urbano no controlado, y que a su vez, generen las bases para una ciudad biodiversa. La propuesta corresponde a 7 características espaciales y de usos que se representan en distritos a lo largo

del borde de Ciénaga, y son; Distrito de protección La Playa, Distrito de Aventura, Distrito de Contemplación, Distrito Familiar, Distrito de Ciencia y Conservación, Distrito de protección Las Flores, y Distrito Tajamar. Como resultado se presenta una red ecoturística activa que busca reestablecer los vínculos entre la ciudadanía y las dinámicas naturales costeras, visibilizar el patrimonio natural, y proveer a la ciudad de nuevos espacios públicos.

1.4. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

El distrito de contemplación se propone como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de fauna y flora local. Está pensado para el disfrute de actividades de contemplación a través de recorridos ecológicos por senderos entre el manglar y el agua de la Ciénaga, que permiten apreciar la flora local, respirar aire fresco y observar el ecosistema en el que confluye río y mar. El avistamiento de aves también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se plantean paradas o estaciones en medio del recorrido que permiten el encuentro con las especies de aves de la región. El recorrido del distrito termina dentro de la Ciénaga con un muelle y un equipamiento deportivo, pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones. El proyecto incluye las siguientes partes:

- Estación III: La estación es la conexión entre la ciudad y el distrito, es donde empieza el recorrido. Funciona como control de acceso peatonal y de bicicletas y se encuentran los equipamientos de servicios básicos como baños y parqueadero de bicicletas. Esto permitirá que no se supere el aforó máximo permitido dentro del ecoparque
- Gradas Playa. Siguiente a la estación, se encuentra una plazoleta con grada que bajan hacia una playa naturalmente formada en la Ciénaga, de manera que esta pueda ser usada para el baño o contemplación de

los visitantes. Se podrán realizar actividades de contemplación, recreación, observación.



Ilustración 2 Gradas Playa

- Contemplación: La tercera parada del recorrido es la gradería de contemplación, desciende al suelo desde el recorrido y está pensada como espacio de receso, meditación y contemplación. Las gradas permiten un acercamiento a los árboles y especies de fauna.



Ilustración 3 Gradas Contemplación

- Avistamiento de aves: Para el avistamiento de aves, el recorrido del sendero se convierte en una hélice que sube y vuelve a descender. Esta rodea los árboles, lo que permite tener una visual más amplia del paisaje, así como mayor contacto con la naturaleza y las especies de aves de la región.



Ilustración 4 Avistamiento de Aves

- Muelle: El recorrido de los senderos termina en un muelle hacia el norte, planteado para la salida y llegada de pequeñas embarcaciones que realicen excursiones o paseos en la Ciénaga.
- Equipamiento deportivo: El distrito contemplación, plantea un equipamiento deportivo, que posibilite el desarrollo de actividades y deportes náuticos dentro de la Ciénaga. Funciona como un equipamiento de servicios y almacenamiento, así como otra forma de acercamiento al agua en el recorrido.



Ilustración 5 Equipamiento Deportivo

2.0 ESTADO DE LOS CONTRATOS.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación se relaciona la información general del contrato de obra y sus modificaciones.

CONTRATO No:	EDU-561 – 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A S.A.S. Nit: 800.091.140 – 4
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN Representante legal : ADALBERTO VIVERO CORONEL
NIT.	901.501.273 – 2
SUPERVISOR:	ING. DIEGO RADA ALTAHONA.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA .
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L. **($ 82.464.264.620,00)**
FECHA DE INICIO:	1 de Septiembre 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta 31 de Diciembre de 2021
PRORROGA No 1	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta 30 de Junio de 2022

Cuadro No.1. Estado General del Contrato de Obra.

2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO No:	EDU – 566 – 2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A. ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL. Representante Legal.
CONTRATISTA:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT	901.502.533-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 3.974.629.750).
FECHA DE INICIO:	1 de Septiembre 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta 31 de Diciembre de 2021
PRORROGA No 1	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta 30 de Junio de 2022

Cuadro No.2 Estado General del Contrato de Interventoría.

2.3. INFORMACIÓN PÓLIZAS CONTRATISTA.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	No. BQ – 100043007 – ANEXO No 5
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	No. BQ – 100011003 – ANEXO No 6
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2021	30/12/2022	$ 16.492.852.924
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31/12/2021	30/06/2025	$ 12.369.639.693
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2022	30/06/2027	$ 24.739.279.386
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/09/2021	30/09/2022	$ 16.492.852.924

Cuadro No.3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.

2.4. INFORMACIÓN PÓLIZAS INTERVENTORÍA

POLIZA	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	No. 85-44-101111717 – ANEXO 5
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	No. 85-40-101049329 – ANEXO 4
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 de diciembre de 2021

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2021	30/12/2022	$ 794.925.950
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2021	30/06/2025	$ 596.194.462,5
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2021	31/12/2026	$ 794.925.950
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/09/2021	30/06/2022	$ 794.925.950

Cuadro No.4 Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría.

2.5 BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS.

2.5.1. CONTRATO DE OBRA.

El valor del Contrato No. EDU-561-2021 es la suma de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L. **($82.464.262.620,00),** los cuales serán pagados mediante la presentación de actas parciales de obra dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura.

2.5.1.1 Actas Generadas al Contrato de Obra.

- Actas Generales.

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el presente periodo.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1 de Septiembre 2021

Cuadro No.5 Resumen de las actas del contrato de obra.

- Acta Parcial de Obra.

A la fecha del cierre del presente informe el Contratista se han suscrito dos (2) actas parciales de obra, así:.

No Acta	Período	Valor del Acta
1	1 diciembre 2021 – 31 enero 2022	$1.628.531.995,79
2	1 - 28 febrero de 2022	$1.365.320.628,52

Cuadro No.6 Resumen de las actas parciales de obra.

2.5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El valor del Contrato de Interventoría No. EDU-566 - 2021 es la suma de *TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.* ***($ 3.974.629.750).***

EDUBAR pagará al CONSORCIO UF1 MALLORQUIN el servicio prestado, en proporción al avance de obra durante el período correspondiente.

2.5.2.1 Actas Generadas al Contrato de Interventoría.

- Actas Generales.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1 de Septiembre 2021

Cuadro No.7 Resumen de las actas del contrato de Interventoría.

- Acta Parcial de Interventoría.

A la fecha del cierre del presente informe esta Interventoría ha presentado un (1) actas parciales de costos, así:

No Acta	Período	Valor del Acta
1	1 diciembre 2021 – 31 enero 2022	$78.300.206

Cuadro No.8 Resumen de las actas de costos de Interventoría.

021

3.0 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

3.1. CONTRATO DE OBRA.

A continuación se describen las actividades realizadas por el Contratista **CONSORCIO JCO MALLORQUIN**, durante el período comprendido del 01 al 28 de febrero del 2022:

Actividades realizadas:

- Localización y replanteo del proyecto
- Revisión de planos y especificaciones del Proyecto
- Asistencia a cuatro (4) comités de obra.

Acta de comité	Fecha
15	4/02/2022
16	8/02/2022
17	11/02/2022
18	24/02/2022

- Seguimiento a los siguientes documentos: Plan de calidad, Cronograma, Flujo de Inversiones, Matriz de Riesgo, Programa de Gerencia, Plan de Trabajo, Plan de Gestión de Riesgo, Protocolo de Bioseguridad, Programa SST, Programa de Gestión Social, PMA
- Trámite de permisos ante diferentes entidades para el desarrollo de la obra
- Movilización de tercer equipo de hincado de pilotes en tierra
- Seguimiento del hincado del pilotaje en el frente de tierra (Estación III, Modulo 15) y en el frente de agua (Modulo 1, 2,3,4,5 y 6)
- Recepción y acopio de madera proveniente de Estados Unidos en campamento de obra ubicado en las instalaciones de Caribe Verde.

- Recepción y acopio de vigas de madera prensadas en campamento de Caribe Verde
- Talleres y Capacitaciones del proyecto con la comunidad de la playa

3. 2 INFORMACIÓN TÉCNICA

Frente Tierra

- **Módulo 14 – Estación III**

Se han hincado 566,47 (66 pilotes) de 707 ml correspondientes a pilotes de 20 y 25 centímetros de diámetro. Se presenta rechazo en 10 pilotes hasta el corte del presente informe.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
20	2	7,7	15,4
25	16	11,65	186,4
25	30	8,65	259,5
25	18	13,65	245,7
TOTAL	66		707

Cuadro No. 9 Listado de pilotes – E3

PILOTES D25 MODULO 14
ESTACION III

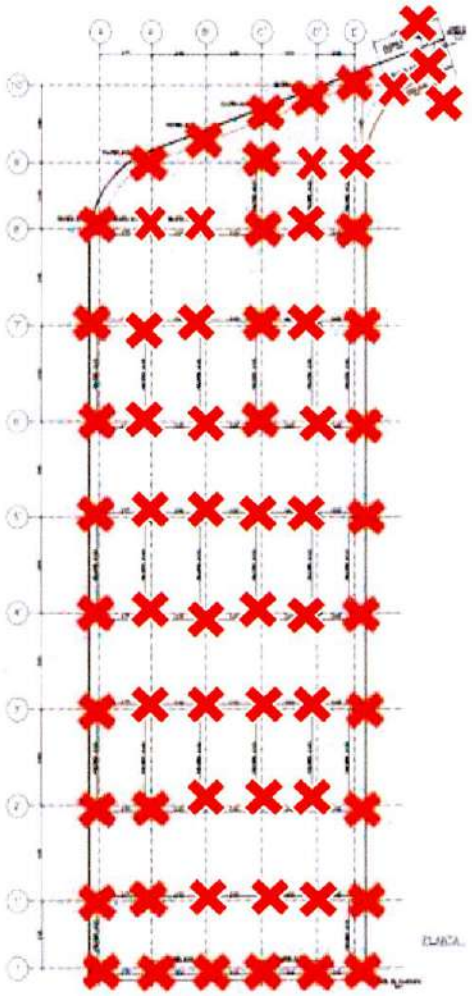


Ilustración 6. Pilotes hincados estación III

- **Módulo 15 – Pasarela 1,5 m**

  Se ha hincado 168,09 (21 pilotes) de 199 ml correspondientes a pilotes de 20 y 25 centímetros de diámetro. Se presenta rechazo en 2 pilotes hasta el corte del presente informe.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
20	6	9,3	55,8
25	7	9,3	65,1
25	3	9,95	29,85
20	4	9,95	38,6
25	1	9,65	9,65
TOTAL	21		199

- **Cuadro No. 10 Listado de pilotes – M15**

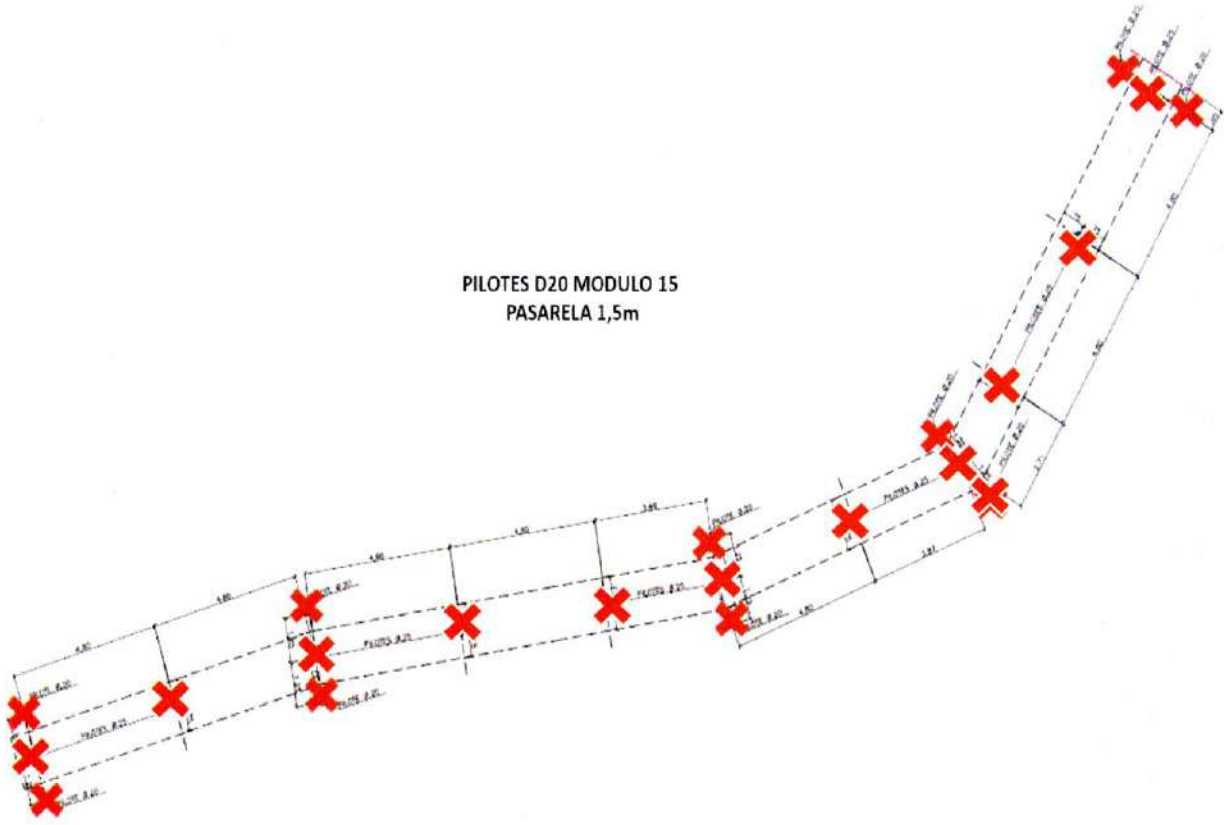


Ilustración 7. Pilotes hincados estación III

Frente Agua

- **Módulo 1**

  Se hincaron 412,7 ml (39 pilotes) completando todo el módulo sin rechazo alguno.

025

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
25	11	11,3	124,3
20	28	10,3	288,84
TOTAL	39		412,7

Cuadro No. 11 Listado de pilotes – M1

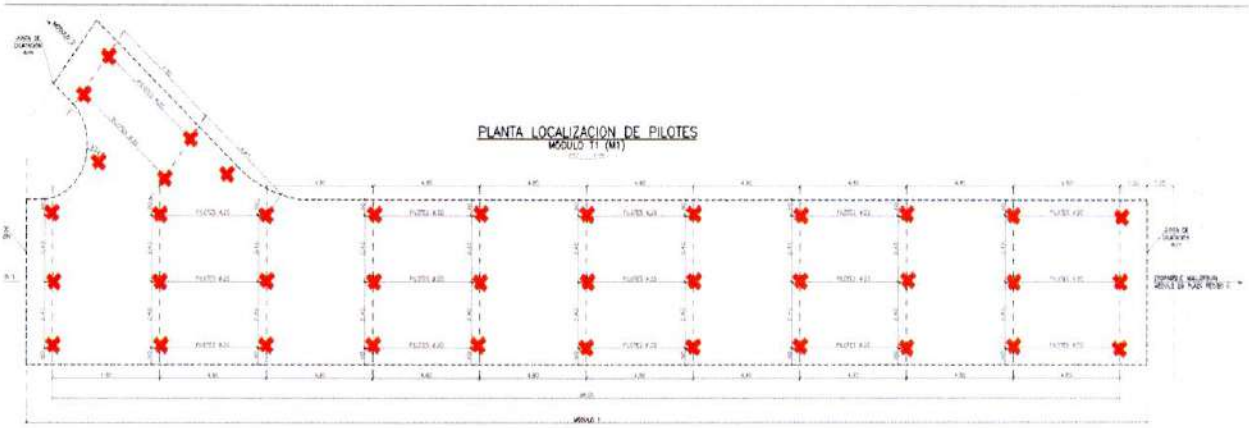


Ilustración 8. Pilotes hincados M1

- **Módulo 2**

Se hincaron 316,2 ml (31 pilotes) completando todo el módulo sin rechazo alguno.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
20	10	10.2	102
25	8	10.2	81,6
25	13	10.2	132,6
TOTAL	31		316,2

Cuadro No. 12 Listado de pilotes – M2

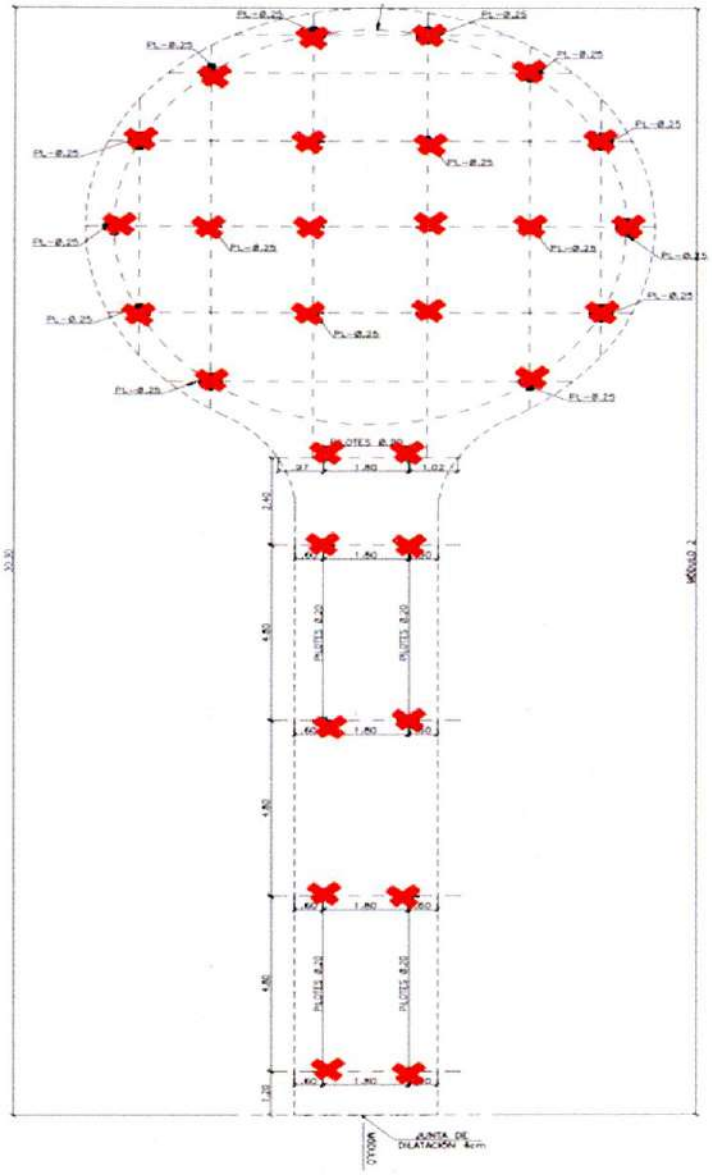


Ilustración 9. Pilotes hincados - M2

- **Módulo 3**

  Se hincaron 361,9 ml (33 pilotes) completando todo el módulo sin rechazo alguno.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
20	22	11,3	248,6
25	11	10,3	113,3
TOTAL	33		361,9

Cuadro No. 13 Listado de pilotes – M3

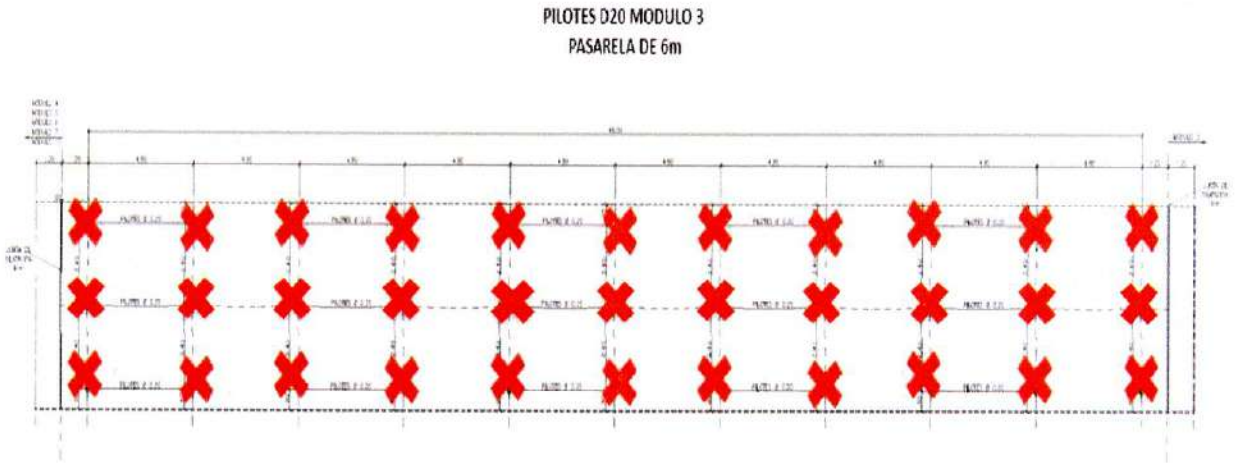


Ilustración 10. Pilotes hincados – M3

- **Módulo 4**

Se hincaron 361,9 ml (33 pilotes) completando todo el módulo sin rechazo alguno.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
20	22	11,3	248,6
25	11	10,3	113,3
TOTAL	33		361,9

Cuadro No. 14 Listado de pilotes – M4

PILOTES D20 MODULO 4
PASARELA DE 6m

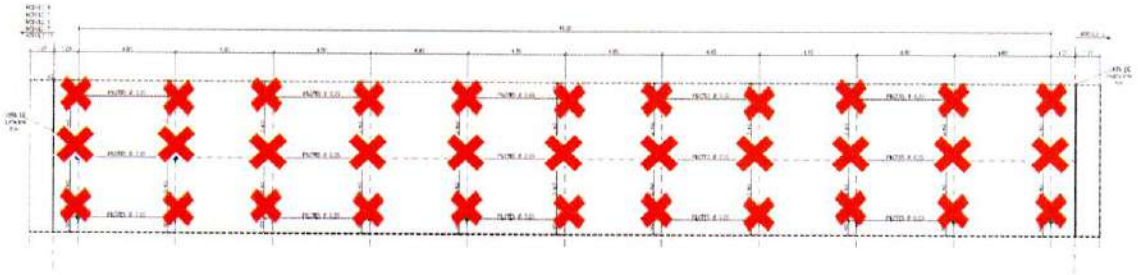


Ilustración 11. Pilotes hincados – M4

- **Módulo 5**

Se hincaron 361,9 ml (33 pilotes) completando todo el módulo sin rechazo alguno.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
20	22	11,3	248,6
25	11	10,3	113,3
TOTAL	33		361,9

Cuadro No. 15 Listado de pilotes – M5

PILOTES D25 MODULO 5
PASARELA DE 6m

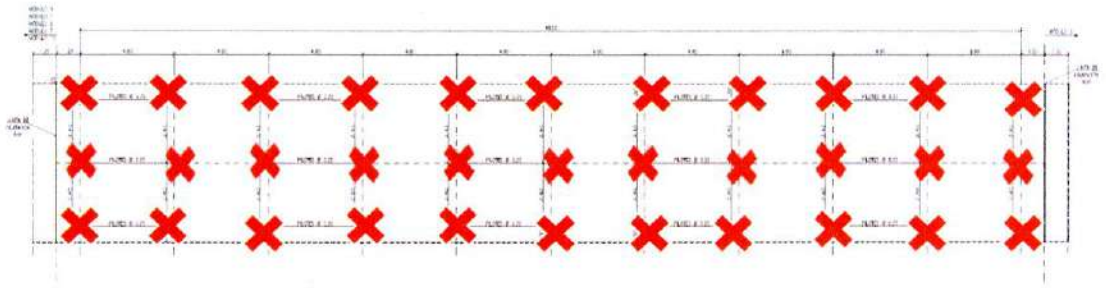


Ilustración 12. Pilotes hincados – M5

En el **Anexo No 4** se adjunta el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo

De acuerdo con el avance del proyecto se espera que durante el próximo periodo se ejecuten los módulos No 6, 7 y 8.

3.3 CONTRATO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo del presente informe, el equipo de la Interventoría ha realizado las actividades que se relacionan a continuación:

Actividades realizadas

- Revisión, control y seguimiento permanentemente de los documentos radicados por el Contratista
- Se realizaron controles por medio de oficios, de manera verbal y actas de comité sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.
- Se realizaron informes semanales discriminando las actividades realizadas.

Informe semanal	Periodo
23	31/01/2022 – 06/02/2022
24	07/02/2022 – 13/02/2022
25	14/02/2022 – 20/02/2022
26	21/02/2022 – 27/02/2022

Ver anexo No.1 Informes Semanales.

- Seguimiento al Contratista a las actividades de campo a fin de que se cumplan con las normas técnicas de calidad y normas ambientales.
- Durante la ejecución de las actividades se proporcionaron oportunamente las sugerencias y respectivas recomendaciones de aspectos técnicos, de seguridad industrial y ambiental.
- Supervisión a las actividades de localización y replanteo
- Supervisión a actividades de hincado de pilotes en agua y tierra
- Elaboración y presentación del informe de Interventoría correspondiente al periodo de febrero de 2022

- Seguimiento al cronograma de obras y programa de inversiones.
- Revisión y aprobación de acta parcial de obra

4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.

A continuación se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el Contratista, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 30 de Junio de 2022.

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
19	1/01/2022	9/01/2022	19,81%	0,00%	-19,81%	0,34%	0,00%	$ -	-0,34%
20	10/01/2022	16/01/2022	23,11%	1,00%	-22,11%	0,67%	0,53%	$ 433.206.937,70	-0,14%
21	17/01/2022	23/01/2022	26,42%	1,00%	-25,42%	1,01%	0,99%	$ 815.199.938,80	-0,02%
22	24/01/2022	30/01/2022	29,72%	1,00%	-28,72%	1,35%	1,34%	$ 1.106.995.753,60	-0,01%
23	31/01/2022	6/02/2022	33,02%	4,00%	-29,02%	1,96%	1,72%	$ 1.419.672.685,70	-0,24%
24	7/02/2022	13/02/2022	36,32%	7,00%	-29,32%	2,58%	2,12%	$ 1.747.137.609,90	-0,46%
25	14/02/2022	20/02/2022	39,62%	8,00%	-31,62%	3,20%	2,55%	$ 2.103.033.302,50	-0,65%
26	21/02/2022	27/02/2022	42,92%	9,00%	-33,92%	3,81%	3,29%	$ 2.714.045.072,80	-0,52%
27	28/02/2022	6/03/2022	46,23%			4,75%			
28	7/03/2022	13/03/2022	49,53%			5,69%			
29	14/03/2022	20/03/2022	52,83%			6,63%			
30	21/03/2022	27/03/2022	56,13%			7,56%			
31	28/03/2022	3/04/2022	59,43%			8,89%			
32	4/04/2022	10/04/2022	62,74%			10,22%			
33	11/04/2022	17/04/2022	66,04%			11,56%			
34	18/04/2022	24/04/2022	69,34%			12,89%			
35	25/04/2022	1/05/2022	72,64%			14,22%			
36	2/05/2022	8/05/2022	75,94%			16,47%			
37	9/05/2022	15/05/2022	79,25%			18,72%			
38	16/05/2022	22/05/2022	82,55%			20,97%			
39	23/05/2022	29/05/2022	85,85%			23,22%			
40	30/05/2022	5/06/2022	89,15%			38,58%			
41	6/06/2022	12/06/2022	92,45%			53,93%			
42	13/06/2022	19/06/2022	95,75%			69,29%			
43	20/06/2022	26/06/2022	99,06%			84,64%			
44	27/06/2022	30/06/2022	100,00%			100,00%			

Página 1

Cuadro No.16 Resumen de avance de obras ejecutadas.

- A la fecha del presente corte y según la programación entregada por el Contratista luego de aprobada la prórroga No 1, el porcentaje de obras ejecutadas a la fecha es de **9%** vs obras programadas de **42,92%** presentándose un atraso del **33,92%**. Retraso que está debidamente

justificado en las demoras en la importación de la madera debido a la crisis de contenedores y la fallas mecánicas que viene presentando el equipo de hincado del equipo de tierra que no ha permitido cumplir con la meta establecida de hincado de pilotes en este frente.

- En este periodo el Contratista se encuentra realizando la revisión de los estudios y diseños del proyecto con respecto a la última información entregada de los tramos curvos y el avistamiento de aves, y el diseño eléctrico de lo cual debe presentar un informe detallado con el levantamiento topográfico, el presupuestos y cantidades actualizados, programación ajustada con sus respectivas especificaciones técnicas.
- Continua la llegada de contenedores de madera proveniente de Estados Unidos, y se está acopiando en el patio de acopio alterno donde se almacena inicialmente y luego se traslada al sitio de las obras en la medida que se va avanzando en la ejecución de la obra.
- Durante el periodo se registra la llegada de las primeras vigas laminadas procedentes del taller especializado en Bogotá.
- Durante todo el periodo del informe Puerta de Oro, el Distrito, Edubar y el Contratista, han venido realizando ingentes esfuerzos para conseguir permisos ante la ANI para la intervención de la vía y poder iniciar la construcción del carril de desaceleración y Parqueadero.
- El Contratista continua con el trazado y replanteo del proyecto para la ubicación de los pilotes de cada módulo, esto con el fin de verificar el alineamiento y poder realizar los ajustes necesarios durante el proceso de hincado.
- A fecha de corte del presente informe se han hincado 69 pilotes en tierra (Estación III y modulo 15) y 165 en agua correspondientes a los módulos 1, 2, 3, 4 y 5.
- Se movilizó una tercera máquina de hincado que se utilizará para iniciar el frente de la pasarela de 3m, sin embargo, se ha solicitado al Contratista un

plan de acción con respecto a la reparación y mantenimiento de los equipos sobre todo el del frente de tierra ya que ha presentado múltiples fallas lo que ha generado un bajo rendimiento en este frente.

5.0 CONTROL DEL PERSONAL.

5.1. CONTRATO DE OBRA.

El Contratista cuenta con el siguiente personal profesional aprobado, los cuales se relacionan a continuación:

NOMBRE	CARGO
ADALBERTO VIVIERO	GERENTE DEL PROYECTO
JAVIER VELEZ	DIRECTOR DE OBRA
JHORVIS DE LUQUE	RESIDENTE DE OBRA
LUIS POLO	RESIDENTE DE OBRA
ANTONIO FRANCO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CARLOS DUSSAN	ESPECIALISTA AMBIENTAL
LAYTON GONZALEZ-RUBIO	ESPECIALISTA HIDRAULICO
COMISION DE TOPOGRAFIA	2
OPERADORES CABRIA	2

Cuadro No.17 Resumen Personal en obra.

NOMBRE	CARGO
AYUDANTES	10
VIGILANTE	3
SOLDADORES	2
MARYURIS LOZANO	INSPECTORA/SISO
OPERADORES TELEHANDLER	2
OPERADORES RETROCARGADOR	1
OFICIOS VARIOS	2

Cuadro No. 18 Resumen Mano de Obra Calificada

5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El equipo de trabajo de la Interventoría en el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 2022 se relaciona a continuación:

No.	PERSONAL	CARGO
1	PEDRO GUTIERREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	FABIAN SUAREZ	GERENTE DE PROYECTO
3	CYNTHIA VILLEGAS	RESIDENTE INTERVENTORÌA
4	LILIANA GALLARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
5	JAIME CURVELO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
6	MARIELA VILORIA	PROFESIONAL SOCIAL
7	CRISTIAN BENAVIDES	RESIDENTE AMBIENTAL
8	HERNANDO GÓMEZ CASAS	ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Cuadro No.19 Resumen Personal Interventoría.

NOMBRE	CARGO
COMISIÓN TOPOGRAFICA	1
INGENIERA AUXILIAR	2
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 20 Resumen mano de obra calificada.

6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

Entrega de planos.

A la fecha todos los planos y diseños definitivos del proyecto han sido remitidos por la Entidad contratante.

Análisis de precios unitarios y presupuesto.

El Contratista remitió el presupuesto y apus iniciales que fueron presentados en su oferta licitatoria, sin embargo, luego de la revisión de los diseños deberá entregar un informe con el balance real del contrato que incluye el presupuesto y apu actualizado para revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la entidad contratante.

Trámites y Permisos

Durante el presente período Puerta de Oro, Edubar, el Distrito y el Contratista han venido realizando ingentes esfuerzos en lo que respecta a los trámites ante la ANI que permitan obtener el permiso de intervención de la vía que comunica a Barranquilla con

el corregimiento de la Playa y que es colindante con el proyecto, donde se construirá el carril de desaceleración, la cicloruta y el parqueadero.

Balance del Contrato

Dentro del primer mes de ejecución del Contratista debía realizar una revisión detallada del proyecto, por lo que esta Interventoría está a la espera que se presente un informe detallado que contenga el presupuesto detallado actualizado y análisis de precios unitarios acompañados de las respectivas especificaciones. A fecha del presente informe el Contratista remitió el presupuesto del componente eléctrico y la Interventoría realizó las respectivas observaciones a través del Especialista Eléctrico. El Contratista se encuentra en proceso de ajuste de acuerdo con las observaciones presentadas por la Interventoría.

Plan de Compras

Es importante mencionar que dicho plan no se encuentra dentro de las obligaciones del Contrato de Obra e Interventoría. Sin embargo, debido a que gran parte de los materiales del proyecto no se producen en Colombia y serán importados desde Estados Unidos y China, la Interventoría está realizando un seguimiento a la compra e importación de la madera, para verificar que cumpla con todas las especificaciones y se garantice un suministro al proyecto que permita cumplir con los plazos programados. .

7.0. EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo el contratista utilizó en obra los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
CABRIA 890 Y 1300 KG – En zona seca	1
CABRIA 2000 KG – En zona húmeda	1
RETROCARGADOR NEW HOLLAND B95B	1
BOMBA	1
LANCHA	1
TELEHANDLER CAT TH103	1
PETIBOND	1
PLANTA ELECTRICA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	1
ESTACIÓN TOTAL	2
NIVEL AUTOMÁTICO	2

Cuadro No. 21Equipo de Obra

Por parte de interventoría se contó con los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
DRON	1
COMPUTADORES	4
ESTACIÓN TOTAL	1
NIVEL	1
VEHICULO	1

Cuadro No. 22 Equipo de Interventoría

8.0. ESTADO DEL TIEMPO.

A continuación se relaciona el estado del tiempo durante el periodo en curso.

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
1/02/2022	0			
2/02/2022	0			
3/02/2022	0			
4/02/2022	0			
5/02/2022	0			
6/02/2022	0			
7/02/2022	0			
8/02/2022	0			
9/02/2022	0			
10/02/2022	0			
11/02/2022	0			
12/02/2022	0			
13/02/2022	0			
14/02/2022	0			
15/02/2022	0			
16/02/2022	0			
17/02/2022	0			
18/02/2022	0			
19/02/2022	0			
20/02/2022	0			
21/02/2022	0			
22/02/2022	0			
23/02/2022	0			
24/02/2022	0			
25/02/2022	0			
26/02/2022	0			
27/02/2022	0			
28/02/2022	0			

Cuadro No. 23 Estado del Tiempo

9.0 CONTROL DE CALIDAD.

La Interventoría realizó seguimiento y control a las actividades de topografía, hincado de pilotes, para garantizar la calidad de las obras.

10 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

A partir de las actividades ejecutadas en el presente periodo se pueden resaltar los siguientes aspectos:

- **Aspectos Técnicos.**

A la fecha Edubar S.A ha realizado la entrega completa de los diseños definitivos eléctricos y de los diseños estructurales de los módulos curvos y el módulo de avistamiento de aves.

Con respecto a los permisos para la intervención de la vía es importante obtener la viabilidad por parte de la ANI lo más pronto posible para permitir al Contratista iniciar los trabajos del carril de desaceleración, cicloruta, ampliación de box coulvert y parqueadero.

El Contratista remitió el presupuesto del componente eléctrico teniendo en cuenta los diseños definitivos remitidos por la entidad contratante, la Interventoría realizó las respectivas observaciones y se encuentra a la espera que el Contratista presente el diseño y presupuesto debidamente ajustado para su aprobación.

En lo que va del plazo contractual la Interventoría dio tramite a la solicitud de prorroga tanto del Contrato de Obra como de Interventoría por 6 meses, por lo que la nueva fecha de finalización de los contratos ha quedado establecida para el 30 de junio de 2022.

De acuerdo con la verificación de topografía realizada por el Contratista, se encontró que las riostras de la pasarela de 1,5 m de ancho están quedando enterradas por debajo del nivel del suelo si se construyen a la cota +1,96 establecida en el diseño, y por lo tanto no estarían cumpliendo con la función de apoyo estructural para la que fueron diseñadas. El diseñador estructural plantea levantar la pasarela de la cota +1,96 a la cota +2,72 por lo que la pasarela quedaría al mismo nivel de la estación III y no se vería afectado el proyecto. Para el caso de la pasarela de 6m y Estación Playa, Puerto de Oro entregó una versión a la cota +2,20 que garantiza no solo el empotramiento de los pilotes y niveles de seguridad de la estructura sino que se respecta el diseño de mantener las pasarelas lo más cerca posible del agua. El Contratista se encuentra evaluando esta alternativa y presentará sus propias propuestas para escoger la mejor alternativa.

- **Programación.**

Se realizó control de la programación de la obra con corte al día 28 de febrero del 2022, teniendo en cuenta la programación entregada por el contratista para la prórroga No 1, con un porcentaje programado de **42,92%** y ejecutado de **9%**, con una diferencia de atraso del **33,92%**. La derivación de los retrasos de estas actividades se presentan por temas pendientes en los trámites para la intervención de la vía, los daños recurrentes en el frente de tierra (Estación III), la entrega de la totalidad de los predios del proyecto y los plazos para la llegada de la madera desde Estados Unidos a Barranquilla.

- **Avance Presupuestal.**

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 febrero del 2022 el Contratista ejecuto obras por valor de $1,365.320.628 incluido AIU equivalente a un 1,66% del valor contractual, con un valor acumulado de $ 2.993.852.624 equivalentes al 3,63%.

- **Gestión Social**

1- Programa de Atención Comunitaria

Este programa permite mantener un contacto directo con las personas de la zona de influencia directa del proyecto.

Actividades

- El contratista mantiene un Profesional Social para la atención comunitaria.
- Se adecuo un correo electrónico para recepción de quejas, reclamos y/o sugerencias. - resocialmallorquin@gmail.com-
- El horario de atención comunitaria es de Lunes a Viernes desde las 8.30 a.m. Hasta las 5.00 p.m.
- Se tiene un horario establecido para atención de inquietudes, en los sectores del barrio las Flores y barrio la Playa. -Organizados de la siguiente manera: Flores, los días Miércoles de 2.00 a 5:00 p.m. y en el sector la Playa los días Viernes de 2:00 a 5; 00 p.m.
- Para el periodo no se generaron PQRS referentes al proyecto.

2- Programa de Información y Comunicación

Permite mantener informada a la comunidad con todo lo referente al proyecto.

Actividades

- El contratista realizo reunión el día 16 de febrero del 2022, la cual fue dirigida a lideres naturales del sector de las Flores. Ver anexo N. 8
- Conformación del comité de sostenibilidad en las Flores, de igual forma, le fue socializado todo lo referente al cronograma para el desarrollo de talleres en este mismo sector.

3- Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos

Este programa permite registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructuras, previo al inicio de las actividades constructivas.

Actividades

- Para el periodo no se desarrollaron actividades referentes a este programa.

4- Programa de Cultura Vial y Participación Comunitaria

Se refiere a la construcción de una convivencia armoniosa, responsable y de respeto entre todos los que hacemos uso de vías de tránsito, sean estas aceras, rutas, caminos, ciclo vías etc.

Actividades

- Para el 23 de febrero fue conformado el comité de sostenibilidad comunitaria- Las Flores, El grupo quedo conformado de la siguiente forma: Edilsa Hebrad- presidenta, Omar Ángulo- Vicepresidente, Angélica Jiménez – Secretaria Juan Carlos Toledo- Tesorero y el señor Dimas Caraballo – Vocal y receptor de la comunidad. Ver anexo No. 8

5- Programa de Generación de Empleo

Este programa permite la vinculación laboral y generación de ingresos a las personas del área de influencia del proyecto.

PERSONAL CONTRATADO MANO DE OBRA	
Personal Mano de Obra Calificada	10
Personal Mano de Obra No Calificada	23
Total, Personal	32

PERSONAL POR SEXO	
Hombres	30
Mujeres	2

- **Gestión Ambiental**

El seguimiento a los documentos y gestión ambiental del periodo se adjunta en el **Anexo No 5**

- **Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.**

  El seguimiento a los documentos y gestión ambiental del periodo se adjunta en el **Anexo No 11**

- **Bitácora de Obra.**

El Contratista inició actividades de hincado de pilotes el día 3 de enero de 2022. Ver Anexo No 10.

ANEXO No. 1

INFORMES SEMANALES


EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 23	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$	**82.464.262.620,00**
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$	**82.464.262.620,00**
Prórrogas	N/A	**Valor Facturado:**	$ -	**0,00%**
Suspensiones	N/A	**Valor por Pagar:**	$ 82.464.262.620,00	**100,0%**
Reinicios	N/A			
Plazo Actualizado:	31/12/2021	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Plazo en Semanas:	17 semanas	ANTICIPO	NA	
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.1	$ -	
Contrato Nº:	EDU-566-2021			
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Fecha de Inicio:	1/09/2021			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021			
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A			
Prórrogas	6 meses			
Plazo Actualizado:	30/06/2022			

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
14	29/11/2021	5/12/2021	3,30%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	$ -	-2,07%
15	6/12/2021	12/12/2021	6,60%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	$ -	-2,07%
16	13/12/2021	19/12/2021	9,91%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	$ -	-2,07%
17	20/12/2021	26/12/2021	13,21%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	$ -	-2,07%
18	27/12/2021	31/12/2021	16,51%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	$ -	-2,07%
19	1/01/2022	9/01/2022	19,81%	0,00%	0,00%	10,04%	0,00%	$ -	-10,04%
20	10/01/2022	16/01/2022	23,11%	1,00%	1,00%	10,04%	0,53%	$ 433.206.937,70	-9,51%
21	17/01/2022	23/01/2022	26,42%	1,00%	1,00%	10,04%	0,46%	$ 381.993.001,20	-9,58%
22	24/01/2022	30/01/2022	29,72%	1,00%	1,00%	10,04%	0,35%	$ 291.795.814,70	-9,69%
23	31/01/2022	6/02/2022	33,02%	4,00%	4,00%	4,80%	0,38%	$ 312.676.932,10	-4,42%
24	7/02/2022	13/02/2022	36,32%			4,80%			
25	14/02/2022	20/02/2022	39,62%			4,80%			
26	21/02/2022	27/02/2022	42,92%			4,80%			
27	28/02/2022	6/03/2022	46,23%			1,80%			
28	7/03/2022	13/03/2022	49,53%			1,80%			
29	14/03/2022	20/03/2022	52,83%			1,80%			
30	21/03/2022	27/03/2022	56,13%			1,80%			
31	28/03/2022	3/04/2022	59,43%			0,58%			
32	4/04/2022	10/04/2022	62,74%			0,58%			
33	11/04/2022	17/04/2022	66,04%			0,58%			
34	18/04/2022	24/04/2022	69,34%			0,58%			
35	25/04/2022	1/05/2022	72,64%			0,58%			
36	2/05/2022	8/05/2022	75,94%			4,94%			
37	9/05/2022	15/05/2022	79,25%			4,94%			
38	16/05/2022	22/05/2022	82,55%			4,94%			
39	23/05/2022	29/05/2022	85,85%			4,94%			
40	30/05/2022	5/06/2022	89,15%			0,08%			
41	6/06/2022	12/06/2022	92,45%			0,08%			
42	13/06/2022	19/06/2022	95,75%			0,08%			
43	20/06/2022	26/06/2022	99,06%			0,08%			
44	27/06/2022	30/06/2022	100,00%			0,08%			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 23	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Interventoría:	5 Personas	2 Cabrias	
		1 Bobcat	
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 12 Ayudantes. 1 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidraulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	2 Barcazas 1 Grua 1 Retrocargador 1 Bomba Telehandler	1

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites para gestionar los permisos ante la ANI
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e intalaciones provisionales	MES	0,25	2,25
CM-01	Comisión topografica mensual	MES	0,25	2,00
CM-02	Desmonte y descapote mecanico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2	975,84	975,84
3819	Suministro e intalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suminitro e instalación pilote diametro 20	ML	143,78	513,50
CM-05	Suministro e intalación pilote diametro 25	ML	101,43	657,55
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 23	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	31/01/2022: Pilotes en agua. Modulo 1 y 2



FOTO 2	1/02/2022: Toma aerea Estación 3



FOTO 3	1/02/2022: Toma aerea de pilotes en agua



FOTO 4	2/02/2022: Pilotes en agua



FOTO 5	2/02/2022: Pilotes en tierra - Estación 3



FOTO 6	4/02/2022: Visita al frente de hinca de pilotes en agua por parte de Edubar

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 23	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





FOTO 7	4/02/2022: Equipo dispuesto en obra por el Contratista	FOTO 8	3/02/2022: Equipo de bombeo dispuesto en obra por el Contratista

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del eje del proyecto para el hincado de los pilotes del modulo 3 en agua y de la Estación III en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (zona estación III): 0
Rehincado Pilotes en Tierra (zona estación III): 0
Pilotes Agua (pasarelas): 23

Se realizó comité de obra en campo el dia viernes 4 de febrero de 2022. En este comité se revisaron las observaciones al componente electrico, el estado de los persmisos (ANI), el tema predial del lote del parqueadero, se coordinó reunión de especialistas en geotecnica yestructurales y la socialización del proyecto en la comunidad de la Playa por parte de la Alcaldía con el acompañamiento de Edubar, Contratista e Interventoría

El Contratista debe presentar un informe con lo relacionado en la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 5 y 6 el cual esta programado para la entrega a final del mes de enero de 2022. La Interventoria está a la espera de la entrega de este documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	7-feb-22


EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 24	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA				
Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$		**82.464.262.620,00**
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$		**82.464.262.620,00**
Prórrogas	N/A	**Valor Facturado:**	$	-	**0,00%**
Suspensiones	N/A	**Valor por Pagar:**	$	82.464.262.620,00	**100,0%**
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	31/12/2021	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**			
Plazo en Semanas:	17 semanas	ANTICIPO		NA	
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.1	$	-	
Contrato Nº:	EDU-566-2021				
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Fecha de Inicio:	1/09/2021				
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021				
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Prórrogas	6 meses				
Plazo Actualizado:	30/06/2022				

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
19	1/01/2022	9/01/2022	19,81%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	$ -	-0,34%
20	10/01/2022	16/01/2022	23,11%	1,00%	1,00%	0,34%	0,53%	$ 433.206.937,70	0,19%
21	17/01/2022	23/01/2022	26,42%	1,00%	1,00%	0,34%	0,46%	$ 381.993.001,20	0,12%
22	24/01/2022	30/01/2022	29,72%	1,00%	1,00%	0,34%	0,35%	$ 291.795.814,70	0,01%
23	31/01/2022	6/02/2022	33,02%	4,00%	4,00%	0,62%	0,38%	$ 312.676.932,10	-0,24%
24	7/02/2022	13/02/2022	36,32%	7,00%	7,00%	0,62%	0,40%	$ 327.464.924,20	-0,22%
25	14/02/2022	20/02/2022	39,62%			0,62%			
26	21/02/2022	27/02/2022	42,92%			0,62%			
27	28/02/2022	6/03/2022	46,23%			0,94%			
28	7/03/2022	13/03/2022	49,53%			0,94%			
29	14/03/2022	20/03/2022	52,83%			0,94%			
30	21/03/2022	27/03/2022	56,13%			0,94%			
31	28/03/2022	3/04/2022	59,43%			1,33%			
32	4/04/2022	10/04/2022	62,74%			1,33%			
33	11/04/2022	17/04/2022	66,04%			1,33%			
34	18/04/2022	24/04/2022	69,34%			1,33%			
35	25/04/2022	1/05/2022	72,64%			1,33%			
36	2/05/2022	8/05/2022	75,94%			2,25%			
37	9/05/2022	15/05/2022	79,25%			2,25%			
38	16/05/2022	22/05/2022	82,55%			2,25%			
39	23/05/2022	29/05/2022	85,85%			2,25%			
40	30/05/2022	5/06/2022	89,15%			15,36%			
41	6/06/2022	12/06/2022	92,45%			15,36%			
42	13/06/2022	19/06/2022	95,75%			15,36%			
43	20/06/2022	26/06/2022	99,06%			15,36%			
44	27/06/2022	30/06/2022	100,00%			15,36%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 24	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Interventoría:	5 Personas	2 Cabrias	
		1 Bobcat	
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 12 Ayudantes. 1 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidraulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	2 Barcazas 1 Grua 1 Retrocargador 1 Bomba Telehandler	 1

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites para gestionar los permisos ante la ANI
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e intalaciones provisionales	MES	0,25	2,50
CM-01	Comisión topografica mensual	MES	0,25	2,25
CM-02	Desmonte y descapote mecanico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e intalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suminitro e instalación pilote diametro 20	ML	112,97	626,47
CM-05	Suministro e intalación pilote diametro 25	ML	162,54	819,89
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 24	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	08/02/2022: Pilotes en agua



FOTO 2	09/02/2022: Pilotes en tierra



FOTO 3	11/02/2022 Hincado Pilotes modulo 3



FOTO 4	11/02/2022 Vista general modulos 1,2 y 3



FOTO 5	11/02/2022 Comité de Obra



FOTO 6	11/02/2022 Hincado de pilotes Estación III

FONDAR	**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 24**	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





FOTO 7	12/02/2022 Hincado de pilotes Estación III	**FOTO 8**	12/02/2022 Finaliza Hincado de pilotes Modulo 3 e inicia modulo 4

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los pilotes del modulo 3 y 4 en agua y de la Estación III en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (zona estación III): 11
Rehincado Pilotes en Tierra (zona estación III): 7
Pilotes Agua (pasarelas 6m): 16

En esta semana se terminó con el hincado de pilotes en el modulo 3

Se realizó comité de obra en campo el día viernes 11 de febrero de 2022 con la presencia de los especialistas en geotecnia y estructural por parte de Puerta de Oro. En este comité se revisaron los temas pendientes como son el nivel definitivo de las pasarelas, criterio de rechazo de los pilotes y tolerancia de la verticalidad de los pilotes. De acuerdo con lo expuesto por el especialista estructural se realizaran los ajustes necesarios para establecer la cota final a +2,70 teniendo en cuenta que el anclaje de las riostras no debe atravesar la geomalla de protección de los pilotes. Para el caso de los rechazos de los pilotes se estableció que el criterio son de 5 golpes para bajar una pulgada en el momento que se observe que la pesa del equipo empieza a presentar rebote.

El Contratista debe presentar un informe con lo relacionado en la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 5 y 6 el cual esta programado para la entrega a final del mes de enero de 2022. La Interventoría está a la espera de la entrega de este documento

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	**NOMBRE:** Ing. Fabian Suarez	**NOMBRE:** Ing. Pedro Gutiérrez B.	**Elaborado:**
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	**CARGO:** Gerente de Proyectos	**CARGO:** Director de Interventoría	14-feb-22


EDUMAR	**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 25**		CÓDIGO:
			Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA				
Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$		**82.464.262.620,00**
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$		**82.464.262.620,00**
Prórrogas	N/A	**Valor Facturado:**	$	1.628.531.996,00	1,97%
Suspensiones	N/A	**Valor por Pagar:**	$	82.464.262.620,00	100,0%
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	31/12/2021	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**			
Plazo en Semanas:	17 semanas	ANTICIPO		NA	
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.1	$	1.628.531.996,00	1,97%
Contrato Nº:	EDU-566-2021				
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Fecha de Inicio:	1/09/2021				
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021				
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Prórrogas	6 meses				
Plazo Actualizado:	30/06/2022				

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE
19	1/01/2022	9/01/2022	19,81%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	$ -	-0,34%
20	10/01/2022	16/01/2022	23,11%	1,00%	1,00%	0,34%	0,53%	$ 433.206.937,70	0,19%
21	17/01/2022	23/01/2022	26,42%	1,00%	1,00%	0,34%	0,46%	$ 381.993.001,20	0,12%
22	24/01/2022	30/01/2022	29,72%	1,00%	1,00%	0,34%	0,35%	$ 291.795.814,70	0,01%
23	31/01/2022	6/02/2022	33,02%	4,00%	4,00%	0,62%	0,38%	$ 312.676.932,10	-0,24%
24	7/02/2022	13/02/2022	36,32%	7,00%	7,00%	0,62%	0,40%	$ 327.464.924,20	-0,22%
25	14/02/2022	20/02/2022	39,62%	8,00%	8,00%	0,62%	0,43%	$ 355.895.692,60	-0,19%
26	21/02/2022	27/02/2022	42,92%			0,62%			
27	28/02/2022	6/03/2022	46,23%			0,94%			
28	7/03/2022	13/03/2022	49,53%			0,94%			
29	14/03/2022	20/03/2022	52,83%			0,94%			
30	21/03/2022	27/03/2022	56,13%			0,94%			
31	28/03/2022	3/04/2022	59,43%			1,33%			
32	4/04/2022	10/04/2022	62,74%			1,33%			
33	11/04/2022	17/04/2022	66,04%			1,33%			
34	18/04/2022	24/04/2022	69,34%			1,33%			
35	25/04/2022	1/05/2022	72,64%			1,33%			
36	2/05/2022	8/05/2022	75,94%			2,25%			
37	9/05/2022	15/05/2022	79,25%			2,25%			
38	16/05/2022	22/05/2022	82,55%			2,25%			
39	23/05/2022	29/05/2022	85,85%			2,25%			
40	30/05/2022	5/06/2022	89,15%			15,36%			
41	6/06/2022	12/06/2022	92,45%			15,36%			
42	13/06/2022	19/06/2022	95,75%			15,36%			
43	20/06/2022	26/06/2022	99,06%			15,36%			
44	27/06/2022	30/06/2022	100,00%			15,36%			

EDUBAR	**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 25**	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas	2 Cabrias 1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grua 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 12 Ayudantes. 1 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidraulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites para gestionar los permisos ante la ANI
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e intalaciones provisionales	MES	0,25	2,75
CM-01	Comisión topografica mensual	MES	0,25	2,50
CM-02	Desmonte y descapote mecanico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e intalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suminitro e instalación pilote diametro 20	ML	154,05	780,52
CM-05	Suministro e intalación pilote diametro 25	ML	150,17	970,06
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 25	CÓDIGO: Página 1 de 3
Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

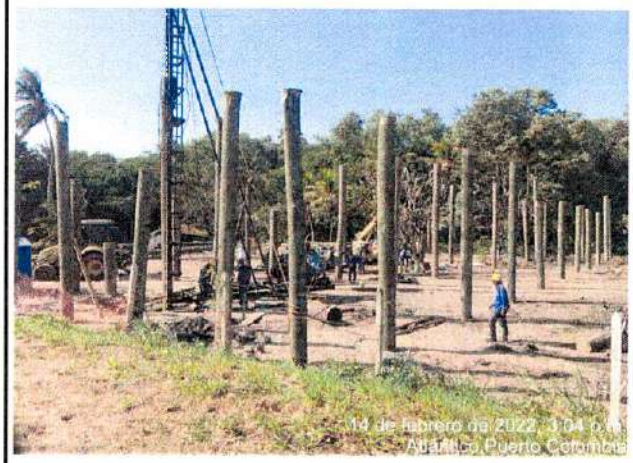


FOTO 1	14/02/2022: Pilotes Estación 3



FOTO 2	14/02/2022: Pilotes en agua Modulo 4



FOTO 3	16/02/2022: Pilotes en agua Vista general Modulo 1-2-3-4



FOTO 4	16/02/2022: Charla con trabajadores en frente de tierra





	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 25	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

FOTO 5	17/02/2022: Rectificación topografia en frente de Agua	**FOTO 6**	18/02/2022: Hincado de pilote modulo 4

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los pilotes del modulo 4 en agua y de la Estación III en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (zona estación III): 7. Acumulado: 48 pilotes
Rehincado Pilotes en Tierra (zona estación III): 2
Pilotes Agua (pasarelas 6m): 23. Acumulado 126 pilotes

En esta semana se continua con el hincado de pilotes del modulo 4 y se programa iniciar la próxima semana con el modulo No 5.

El contratista radica el Acta No 1 de avance de obra a la interventoria, correspondiente al periodo del 1-31 de enero de 2022 por un valor de $1.628.531.996 equivalente al 1,97% del contrato.
Se realiza observación al contratista en cuento al manejo de residuos en el campamento. No se ha implementado en su totalidad el PMA.
Se programó comite para el próximo 22 de febrero/22 para evaluar propuesta presentada por el diseñador en cuanto al arriostramiento de los módulos en agua.

El Contratista debe presentar un informe con lo relacionado en la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 5 y 6 el cual esta programado para la entrega a final del mes de enero de 2022. La Interventoría está a la espera de la entrega de este documento

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	**NOMBRE:** Ing. Fabian Suarez	**NOMBRE:** Ing. Pedro Gutiérrez B.	**Elaborado:**
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	**CARGO:** Gerente de Proyectos	**CARGO:** Director de Interventoría	21-feb-22


	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 26	CÓDIGO:
		Página 1 de 3


Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$	**82.464.262.620,00**
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$	**82.464.262.620,00**
Prórrogas	6 meses	**Valor Facturado:**	$ 1.628.531.996,00	**1,97%**
Suspensiones	N/A	**Valor por Pagar:**	$ 82.464.262.620,00	**100,0%**
Reinicios	N/A			
Plazo Actualizado:	30/06/2022	**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
Plazo en Semanas:	43 semanas	ANTICIPO	NA	
		ACTA No.1	$ 1.628.531.996,00	**1,97%**
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Contrato Nº:	EDU-566-2021			
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Fecha de Inicio:	1/09/2021			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021			
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A			
Prórrogas	6 meses			
Plazo Actualizado:	30/06/2022			

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
19	1/01/2022	9/01/2022	19,81%	0,00%	-19,81%	0,34%	0,00%	$ -	-0,34%
20	10/01/2022	16/01/2022	23,11%	1,00%	-22,11%	0,67%	0,53%	$ 433.206.937,70	-0,14%
21	17/01/2022	23/01/2022	26,42%	1,00%	-25,42%	1,01%	0,99%	$ 815.199.938,90	-0,02%
22	24/01/2022	30/01/2022	29,72%	1,00%	-28,72%	1,35%	1,34%	$ 1.106.995.753,60	-0,01%
23	31/01/2022	6/02/2022	33,02%	4,00%	-29,02%	1,96%	1,72%	$ 1.419.672.685,70	-0,24%
24	7/02/2022	13/02/2022	36,32%	7,00%	-29,32%	2,58%	2,12%	$ 1.747.137.609,90	-0,46%
25	14/02/2022	20/02/2022	39,62%	8,00%	-31,62%	3,20%	2,55%	$ 2.103.033.302,50	-0,65%
26	21/02/2022	27/02/2022	42,92%	11,00%	-31,92%	3,81%	3,29%	$ 2.714.045.072,80	-0,52%
27	28/02/2022	6/03/2022	46,23%			4,75%			
28	7/03/2022	13/03/2022	49,53%			5,69%			
29	14/03/2022	20/03/2022	52,83%			6,62%			
30	21/03/2022	27/03/2022	56,13%			7,56%			
31	28/03/2022	3/04/2022	59,43%			8,89%			
32	4/04/2022	10/04/2022	62,74%			10,22%			
33	11/04/2022	17/04/2022	66,04%			11,56%			
34	18/04/2022	24/04/2022	69,34%			12,89%			
35	25/04/2022	1/05/2022	72,64%			14,22%			
36	2/05/2022	8/05/2022	75,94%			16,47%			
37	9/05/2022	15/05/2022	79,25%			18,72%			
38	16/05/2022	22/05/2022	82,55%			20,97%			
39	23/05/2022	29/05/2022	85,85%			23,22%			
40	30/05/2022	5/06/2022	89,15%			38,58%			
41	6/06/2022	12/06/2022	92,45%			53,93%			
42	13/06/2022	19/06/2022	95,75%			69,29%			
43	20/06/2022	26/06/2022	99,06%			84,64%			
44	27/06/2022	30/06/2022	100,00%			100,00%			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 26	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas	2 Cabrias 1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 12 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites para gestionar los permisos ante la ANI
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	3,00
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,5	4,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suminitro e instalación pilote diámetro 20	ML	154,50	1.043,60
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML	150,41	1.220,12
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 26	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	21/02/2022: Pilotes Estación 3



FOTO 2	23/02/2022: Verificación de niveles en la estación III



FOTO 3	24/02/2022: Avance de la hinca de pilotes en agua - Vista general Modulo 1-2-3-4 y 5 (en ejecución)



FOTO 4	24/02/2022: Avance de la hinca de pilotes en estación III



FOTO 5	25/02/2022: Panorámica del avance en frente de Agua



FOTO 6	25/02/2022: Panorámica Estación III y Lote Parqueadero

OBSERVACIONES

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 26	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los pilotes del modulo 4 en agua y de la Estación III en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras. En el frente de Tierra se finaliza con el hincado de los pilotes de la Estación III y se inicia con el hincado de pilotes del Modulo 15 de pasarela peatonal 1,5 m.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (zona estación III): 21. Acumulado: 69 pilotes
Rehincado Pilotes en Tierra (zona estación III): 2
Pilotes Agua (pasarelas 6m): 33. Acumulado 159 pilotes

En esta semana se finaliza con el hincado de pilotes del modulo 4 y se inicia con el hincado de pilotes del modulo No 5.

El Contratista radica el Acta No 1 de avance de obra a la interventoría, correspondiente al periodo del 1-31 de enero de 2022 por un valor de $1.628.531.996 equivalente al 1,97% del contrato.

Se realiza observación al Contratista en cuanto al manejo de residuos en el campamento. No se ha implementado en su totalidad el PMA.
Se realizó comité para el 25 de febrero/22 para evaluar propuesta presentada por el diseñador en cuanto al arriostramiento de los módulos en agua.

El Contratista debe presentar un informe con lo relacionado en la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 5 y 6 el cual esta programado para la entrega a final del mes de enero de 2022. La Interventoría está a la espera de la entrega de este documento.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Cynthia Villegas A	P. Suarez H		
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	**NOMBRE:** Ing. Fabian Suarez	**NOMBRE:** Ing. Pedro Gutiérrez B.	**Elaborado:**
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	**CARGO:** Gerente de Proyectos	**CARGO:** Director de Interventoría	28-feb-22

ANEXO No. 2

OFICIOS RECIBIDOS

uf1 mallorquin	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [x] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/02/2022	IP-OOO79	RESPUESTA OBSERVACIONES DISEÑOS ELECTRICOS	EDUBAR	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
1/02/2022	IP-OOO80	PUNTOS DE CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	EDUBAR	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
14/02/2022	JCO-026-2022	SOLICITUD PERMISO ANI	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
16/02/2022	JCO-027-2022	RESPUESTA SOLICITUD LIMPIEZA DE TRAZAS DE ACEITE	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
16/02/2022	JCO-029-2022	PRESUPUESTO SOCIOAMBIENTAL	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
17/02/2022	JCO-030-2022	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
19/02/2022	JCO-032-2022	SOLUCION PILOTE E´9	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
22/02/2022	JCO-033-2022	RESPUESTA OBSERVACIONES DE EQUIPOS	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
24/02/2022	JCO-034-2022	PRESUPUESTO SOCIOAMBIENTAL	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

Firma: F. Suarez H

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA

GERENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR

050

IP-00079
Barranquilla, febrero 1 de 2022

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: IP-00079 RESPUESTA A OBSERVACIONES ELECTRICAS — Fecha: 01/02/2022
No Radicado: R-0000105-2022 — Anexos: Folios - 1
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabian Jovanny Suárez Herrera, Pedro Ant

Señor
PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
REPRESENTANTE LEGAL

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Asunto: Respuesta oficio CINP-504-042-0055 Respuesta a observaciones eléctricas.

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir las observaciones relacionadas en el oficio del asunto, las cuales fueron resueltas por medio de los especialistas en el comte técnico realizado el 20 de enero del presente año.

A continuación, relaciono el enlace por medio del cual se tiene acceso a los estudios y diseños en una versión actualizada con los ajustes sugeridos por los especialistas en dicho comité.

En caso de requerir alguna aclaración se le agradece informar vía correo electrónico o en respuesta a este oficio.

Enlace:
https://edubarsa.sharepoint.com/:f:/g/areatecnica/EoFLcee_ueJImEtAuJgS5G8Bfbx1FgUzCQ_q58dRfQK0AA?e=Ky9rsa

Atentamente,

ALVARO FERNANDEZ DIAZ GRANADOS
Subgerente de Proyectos
EDUBAR S.A.

Proyectó: Ing. Diego Rada Artahona

IP-00080
Barranquilla, febrero 1 de 2022

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
Asunto: IP-00080 SOLICITUD DE VISITA CONJUNTA PARA ENTREGA DE PUNTOS
Fecha: 01/02/2022
No Radicado: R-0000104-2022
Anexos: Folios - 7
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabian Jovanny Suarez Herrera, Pedro Ant

Señor
PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
REPRESENTANTE LEGAL

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Asunto: Respuesta oficio CINP-504-048-0192 – Solicitud de visita conjunta para entrega de puntos de conexión de servicios públicos.

Reciba un cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista a la interventoría, me permito suministrar la información correspondiente a las factibilidades suministradas por la empresa prestadora de servicio público (Triple A).

Respecto al punto de conexión eléctrica, el contratista y su especialista manifestaron haber localizado el punto de acuerdo con la factibilidad y a los diseños suministrados por la entidad, por lo tanto, no se considera necesario realizar una visita para la entrega del punto.

Quedo atento para la validación de estos puntos a través de una visita conjunta con los especialistas responsables de esta área previo a la verificación con topografía y validación por parte de interventoría, previo a la realización de la dicha visita.

En caso de requerir alguna aclaración se le agradece informar vía correo electrónico o en respuesta a este oficio.

Atentamente,

ÁLVARO FERNÁNDEZ DIAZ GRANADOS
Subgerente de Proyectos
EDUBAR S.A.

Proyectó: Ing. Diego Rada Altahona
Anexo: Seis (6) folios.

055

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 14 de febrero de 2022

JCO-026-2022

ING INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-026-2022 SOLICITUS PERMISOS DE ANI Fecha: 14/02/2022

No Radicado: R-0000171-2022 Anexos: Folios - 1

Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabian Jovanny Suárez Herrera, Pedro Ant Gutiérrez Uribe

Señores

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Atn. Fabian Suarez Herrera
Calle 77B Nª 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
Barranquilla, Atlántico

ASUNTO: Solicitud de permiso de la ANI

REF: CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Tal como lo manifestamos en nuestros oficios OF-006, OF-007 Y OF-008 dirigidos a EDUBAR S.A. Reiteramos nuestra solicitud que se nos informe sobre el estado de los trámites de permisos ante la ANI y la entrega del lote destinado para la zona de obra de construcción del parqueadero.

Es de anotar que nuestro cronograma tenía como fecha prevista para el inicio de las obras del parqueadero y trabajos de la ampliación de la calzada existente,el dia 03 de enero de 2022, y a la fecha no contamos con el permiso para iniciar dichas obra.

En espera de sus comentarios.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Gerente de Proyectos

056

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, febrero 16 de 2022
JCO-027-2022

ING INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-027-2022 ALCALCE DE COMUNICACIÓN
No Radicado: R-0000183-2022
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabian Jovanny Suárez Herrera, Pedro Ant Gutiérrez Visbal
Fecha: 16/02/2022
Anexos: Folios - 3

Señores
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Atn. Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Visbal
Representante Legal
Ing. Pedro Gutiérrez Bustillos
Director de Interventoría
Calle 77B No. 57 – 103 Green Tower oficina 907
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
Ciudad.

Ref: Contrato de Obra No. EDU-561-2021 – Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

Asunto: Alcance comunicado CINP-504-056-0499

Cordial saludo,

Acuso comunicado del asunto, por medio del cual nos requieren la limpieza de trazas de sustancias químicas sobre el cuerpo de agua de la Ciénaga Mallorquín, producto del derrame de las actividades de pilotaje, para lo cual le presentamos las medidas implementadas como plan de contingencia al momento de los hechos:

1. Recolección manual de las sustancias químicas en el cuerpo de agua.
2. Recolección mediante material absorbente "Aserrín", en áreas de la barcaza.
3. Trasporte de residuos hasta la sociedad RECITRAC S.A.S, proveedor de disposición final de residuos peligrosos. La certificación de disposición final por parte de la firma en mención se allegará en el informe ambiental número dos (2) correspondiente al periodo del mes de febrero del año en curso.
4. Capacitación al personal referente al manejo de sustancias químicas y residuos especiales.
5. Ubicación de Kit Antiderrame en la barcaza.

No obstante, hemos solicitado ante la alta gerencia del consorcio, la compra de los siguientes materiales con el objeto de garantizar el no aporte y recolección de sustancias químicas al ecosistema:

- Barrera absorbente Oleofilica 100% de 3 pulgadas de ancho X 10 metros lineales.

Carrera 64D No. 86-134
PBX: (5) 3574300
Fax: 3730110
Barranquilla

- Tela Oleofilica para derrames de aceite, Un rollo de 76Cm X 46 metros.





Recolección manual con material absorbente







Estado lámina de agua después de la limpieza

Carrera 64D No. 86-134
PBX: (5) 3574300
Fax: 3730110
Barranquilla

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2





Capacitación al personal

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO FRP - 02 VERSIÓN 3 FECHA 18/07/18

TEMA: MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS / RCD / MATERIALES CONTRA
DOCENTE: JAIME CASAS DUSAN / PSI. ISAMARA MONTERO FECHA: 28/10/2022
LUGAR: CASA DE OBRA MOCA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	NELSON PATIÑO TORRES	AYUDANTE		✓	
2	Alexander Linares	Ayudante		✓	
3	Silvio Diaz	Oficial obra		✓	
4	Oswaldo P.	auxiliar		✓	
5	Ribelis Hurtado	Operador		✓	
6	Rafael Orozco	Ayudante		✓	
7	Manuel Bossa	Topografo		✓	
8	Residente Ambiental	Contratista		✓	
9	Patricia Gomez	Auxiliar		✓	
10	CARLOS MERCADO	MANUEL CARCAMO		✓	
11	Jesus Polo M.	Topografo		✓	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES: SE PRESENTO LA PSICOLOGA ISAMARA MONTERO PARA LOGRAR CUMPLIR LAS TEMATICAS DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EN EL PROYECTO.
SE ENTREGO EL KIT DE DERRAME PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

Registro de capacitaciones

Carrera 64D No. 86-134
PBX: (5) 3574300
Fax: 3730110
Barranquilla

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

	
Barrera absorbente Oleofilica 100% de 3 pulgadas de ancho X 10 metros lineales.	Tela Oleofilica para derrames de aceite, Un rollo de 76Cm X 46 metros

Atentamente.

ING. ADALBERTO DE JESÚS VIVERO CORONEL
Representante Legal

Copia: Archivo
Anexo: Lo enunciado

Carrera 64D No. 86-134
PBX: (5) 3574300
Fax: 3730110
Barranquilla

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

058

Barranquilla, febrero 16 de 2022
JCO-029-2022

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-029-2022 PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL | Fecha: 16/02/2022
No Radicado: R-0000166-2022 | Anexos: Folios - 2
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Ant Gutiérrez Visbal

Señores
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Atn. Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Visbal
Representante Legal
Ing. Pedro Gutiérrez Bustillos
Director de Interventoría
Calle 77B No. 57 – 103 Green Tower oficina 907
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
Ciudad.

Ref: Contrato de Obra No. EDU-561-2021 – Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

Asunto: Presupuesto Socio Ambiental

Cordial saludo,

Adjuntamos, Presupuesto Socio Ambiental para su respectiva revisión y aprobación, con el objeto de implementar las medidas de mitigación, control y seguimiento, contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el contrato de la referencia.

Atentamente.

ING. ADALBERTO DE JESÚS VIVERO CORONEL
Representante Legal

Copia: Archivo
Anexo: Lo enunciado

Carrera 64D No. 86-134
PBX: (5) 3574300
Fax: 3730110
Barranquilla

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 17 de febrero de 2022

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-030-2022 ACTA DE OBRA NO. 01 Fecha: 17/02/2022

No Radicado: R-0000186-2022 Anexos: Folios - 2

Destinatario: Pedro Antonio Gutiérrez Vidal

JCO-030-2022

Señores

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Atn. Fabian Suarez Herrera
Calle 77B Nº 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
Barranquilla, Atlántico

REF: CONTRATO DE OBRA Nº EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Por medio de la presente se hace remisión del Acta parcial de obra N° 1 del contrato en referencia con el siguiente contenido:

- Acta parcial de obra N° 1
- Pre acta N° 1
- Memoria de cantidades
- Soporte de memoria
- Certificación de aportes
- Documentos contractuales y otros
- Informe de obra diciembre de 2021
- Informe de obra enero de 2022
- Informe ambiental enero 2022
- Informe topográfico
- Informe social

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo enero 2022
- Certificado de calibración de equipos de topografía
- Certificado de calidad de materiales
- Seguridad Social

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN



ADALBERTO VIVERO CORONEL
Gerente de Proyectos

060

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 19 de febrero de 2022

JCO-032-2022

ING INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-032-2022 REVISION DE PLANOS Fecha: 21/02/2022

No Radicado: R-0000207-2022 Anexos: Folios - 1

Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabian Jovanny Suarez Herrera, Pedro Ant Gutierrez Vidal

Señores

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Atn. Fabian Suarez Herrera

Calle 77B Nª 57-103 Of 907 Ed. Green Towers

Barranquilla, Atlántico

REF: CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Por medio de la presente se adjunta solución enviada por el diseñador correspondiente al pilote E'9' en la Estación III.

Se adjunta planta de localización de vigas y viguetas del módulo 14 (MT10 – Estación III), donde se ajusta la viga sobre el eje E', entre ejes 7' y 10'.

Adicionalmente, se incluye el detalle 1-107A, correspondiente al detalle de unión entre vigas laminadas de diferente sección.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

ADALBERTO VIVERO CORONEL

Gerente de Proyectos

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

061

Barranquilla, 22 de febrero de 2022
JCO-033-2022

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-033-2022 RESPUESTA A COMUNICADO 0673 — Fecha: 22/02/2022
No Radicado: R-0002219-2022 — Anexos: Folios - 1
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Ant Gutiérrez Vishal

Señores
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Atn. Fabian Suarez Herrera
Calle 77B Nº 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
Barranquilla, Atlántico

REF: CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

En atención a su oficio CINP-504-063-0673 debemos anotar lo siguiente:

Si bien es cierto como ustedes lo manifiestan, que el equipo ha presentado diversas varadas, es de anotar que el contratista ha tomado las acciones correctivas del equipo con cambios importantes en la estructura del mismo. En el cuadro suministrado por ustedes se puede observar que desde el momento del cambio de la nueva torre se han disminuido sustancialmente las paradas del equipo por daños; es importante recalcar, que en tierra nos hemos encontrado con unos suelos más densos que han disminuido el rendimiento esperado del equipo, por consiguiente como contingencia implementaremos la jornada laboral de tal forma que logremos en un término de tres (3) semanas nivelar la ejecución programada.

En cuanto al plan de mantenimiento manifestamos que ha sido permanente y continúo durante el ajuste de los equipos a las condiciones de trabajo, con cambios significativos en los mismos como es el caso del cambio de torre, y equipo completo ejecutado en Estación III.

Es de esperar que con estas medidas mejoraremos nuestro rendimiento y por ende nos acercaremos a la ejecución programada.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Gerente de Proyectos

-0147 062

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, febrero 24 de 2022
JCO-034-2022

ING INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Asunto: JCO-034-2022 PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL Fecha: 24/02/2022
No Radicado: R.0000237-2022 Anexos: Folios: 1
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Ant Gutiérrez Visbal

Señores
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Atn. Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Visbal
Representante Legal
Ing. Pedro Gutiérrez Bustillos
Director de Interventoría
Calle 77B No. 57 – 103 Green Tower oficina 907
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
Ciudad.

Ref: Contrato de Obra No. EDU-561-2021 – Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

Asunto: Presupuesto Socio Ambiental

Cordial saludo,

Adjuntamos, Presupuesto Socio Ambiental acogiendo sus observaciones para su respectiva revisión y aprobación, con el objeto de implementar las medidas de mitigación, control y seguimiento, contempladas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el contrato de la referencia.

Atentamente.

ING. ADALBERTO DE JESÚS VIVERO CORONEL
Representante Legal

Copia: Archivo
Anexo: Lo enunciado

Carrera 64D No. 86-134
PBX: (5) 3574300
Fax: 3730110
Barranquilla

ANEXO No. 3

OFICIOS ENVIADOS

uf1 mallorquin	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [ ] ENVIADA [X]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/02/2022	CINP-504-054-0388	RESPUESTA EDUBAR PUNTOS DE CONEXIÓN SERVICIOS PUBLICOS	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
8/02/2022	CINP-504-055-0490	INFORME SEMANAL No. 23	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	EDUBAR
9/02/2022	CINP-504-056-0499	DERRAME DE COMBUSTIBLE	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
14/02/2022	CINP-504-057-0559	INFORME SEMANAL No. 24	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	EDUBAR
14/02/2022	CINP-504-058-0562	REMISION OFICIO CONTRATISTA SOLICITUD PERMIS ANI	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	EDUBAR
15/02/2022	CINP-504-059-0566	INFORME MENSUAL No 5	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	EDUBAR
16/02/2022	CINP-504-060-0579	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE PMA	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
18/02/2022	CINP-504-061-0649	APROBACION ACTA DE OBRA No 1	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
21/02/2022	CINP-504-062-0661	INFORME SEMANAL No. 25	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	EDUBAR
22/02/2022	CINP-504-063-0673	PLAN DE CONTINGENCIA FALLAS EQUPOS DE HINCADO	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
25/02/2022	CINP-504-064-0730	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA No 1	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN	EDUBAR

Firma:

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
GERENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR

190

uf1 mallorquín
CONSORCIO

065

Barranquilla, 1 de febrero de 2022
CINP – 504 – 054 – 0388

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Adjuntamos oficio IP-0080 de fecha 1 de Febrero de 2022, donde la Entidad Contratante adjunta prefactibilidad de la empresa Triple A para realizar la localización de los puntos de conexión de agua potable y saneamiento del Proyecto.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: CVA - DRA
Aprobó: FSH

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Folio 060

Barranquilla, 8 de febrero de 2022

CINP – 504 – 055 – 0490

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 23 correspondiente al periodo 30 de enero al 6 de febrero de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

-DUP 067

Barranquilla, 9 de febrero de 2022
CINP–504–056–0499

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Como es de su conocimiento, el día de ayer (8/02/2022) se presentó un derrame accidental de combustible en el frente de obra en agua. Consecuencia de eso quedaron trazas de este en el cuerpo de agua. Anexamos registro fotográfico.

Por lo anterior, solicitamos realicen la limpieza de este y definir un plan de contingencia para controlar derrames de hidrocarburos para un futuro.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: LGP
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

065

Barranquilla, 14 de febrero de 2022

CINP – 504 – 057 – 0559

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 24 correspondiente al periodo 7 al 13 de febrero de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín

069

Barranquilla, 14 de febrero de 2022

CINP – 504 – 058 – 0562

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Por medio del presente damos traslado a la entidad del comunicado JCO-026-2022 de fecha 14 de febrero de 2022 del Contratista Consorcio JCO Mallorquín, cuyo asunto es "*Solicitud de permiso de la ANI*", con el fin que indique el estado de los trámites allí señalados.

Que tal como lo señaló la Interventoría en su oficio CINP-504-046-0190 del 17 de enero de 2022, al hacerle seguimiento a las actividades descritas en el cronograma, evidenciamos que las actividades correspondientes al capítulo de movimiento de tierra ya debieron haber iniciado, pero debido a que aún se adelantan los trámites correspondientes a los *permisos ante la ANI y la entrega del lote designado para la zona de parqueadero*, ya estas actividades muestran retraso en su inicio, por lo que se hace necesario se agilicen dichos tramites.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Javier Vélez Camargo – Director de Obra - CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX - FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA – COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA – COLOMBIA

uf1 mallorquín

070

Barranquilla, 15 de febrero de 2022

CINP – 504 – 059 – 0566

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe mensual en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe mensual No. 5 correspondiente al periodo 1 al 31 de enero de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No. 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX - FAX: (57-5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel. (571) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

071

Barranquilla, 16 de febrero de 2022
CINP–504–060–0579

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

En nuestra calidad de Interventores del Contrato de Obra en referencia, manifestamos nuestra preocupación, ya que con más de un mes de iniciadas las actividades físicas del proyecto, no han implementado completamente el Plan de Manejo Ambiental que le fue aprobado el 5 de octubre de 2021 mediante oficio CINP–504–018–3823, esto a pesar de la solicitud realizada el pasado 14 de enero del presente mediante el oficio CINP-504–045–0146.

Adicionalmente, viendo que la semana pasada tuvieron un derrame accidental de combustible en la Ciénaga, continúan operando sin los elementos necesarios, como barreras que permitan contener una emergencia en caso de derrame; se sigue sin contar con el Kit Antiderrame en la barcaza, el cual se le solicitó al Profesional Ambiental la semana pasada.

En el campamento no se han instalado los puntos ecológicos en los frentes de obra para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. En recorrido realizado se solicitó realizar una jornada de limpieza, ya que tanto la zona de campamento como el frente de agua requieren actividades de aseo.

Por todo lo anterior, solicitamos nuevamente el Plan de Contingencia en caso de derrames accidentales de combustible, documento que se solicitó mediante el oficio CINP–504–056–0499 (9/02/2022), tener todos los elementos necesarios en

uf1 mallorquín
CONSORCIO

072

Barranquilla, 18 de febrero de 2022
CINP–504–061–0649

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Acusamos recibido de su comunicado JCO-030-2022 con radicado No R-0000195-2022 de fecha 17 de febrero de 2022 en el cual se remiten el Acta de obra No. 1 y sus soportes.

En respuesta a los documentos enviados, se hace devolución debidamente firmada el acta y se notifica que la Interventoría una vez revisado los adjuntos emite la No objeción de los mismos.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIÁN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: DRA-CVA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX FAX: 57 (5) 3686111 - 3686110 - 3680026
E-mail: info@improyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@improyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

073

Barranquilla, 21 de febrero de 2022

CINP – 504 – 062 – 0661

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 25 correspondiente al periodo 14 al 20 de febrero de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 – 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

074

Barranquilla, 22 de febrero de 2022
CINP–504–063–0673

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

En nuestra calidad de Interventores del Contrato de Obra en referencia, manifestamos nuestra preocupación, ya que con más de 45 días de haberse iniciado las obras de hincado de los pilotes, se han venido presentando múltiples fallas en el equipo de hincado sobre todo en el de la Estación III que a pesar que fue cambiado aún sigue presentando fallas lo que ha generado un bajo rendimiento en este frente. En el cuadro adjunto, se presenta un resumen a la fecha de las fallas del equipo de hincado en tierra.

Como se puede observar en dicho cuadro, el total de horas no disponibles del equipo solo en el frente de tierra por daños y/o reparaciones es de 186,7 equivalentes aproximadamente a 18 días de trabajo lo que claramente se ve reflejado en el rendimiento de la obra.

De acuerdo con el programa de inversiones la inversión programada para item de hincado de pilotes es el siguiente:

Ítem programado	Valor
Valor programado pilotaje Enero	$ 1.060.477.172,82
Valor programado pilotaje Febrero	$ 1.831.460.800,00
Total Programado	$ 2.891.937.972,82

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 25 de febrero de 2022

CINP – 504 – 064 – 0730

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo cuatro (4) originales del Acta de Interventoría y sus anexos del Contrato de la Referencia.

1. Acta de recibo parcial No 1
2. Acta de recibo parcial a satisfacción
3. Factura electrónica No 1
4. Copia de Resolución de la DIAN
5. RUT
6. Certificación Bancaria
7. Copia del Contrato y Prorroga No 1
8. Pago de planilla de seguridad social
9. Certificación de aportes
10. Copia CC Representante legal
11. Certificado junta central de contadores, tarjeta profesional y CC contador.
12. Acta de obra/acta de recibo parcial
13. Copia de estampilla pagadas

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorciouf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

Folio 076

ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

uf1 mallorquin	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 1 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	MODULO 1 y 2
COMENTARIOS:	HINCA DE PILOTES MODULO 3		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 8 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Frente Aguua
COMENTARIOS:	Hincdo de pilotes modulo 3		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 11 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Campamento
COMENTARIOS:	Comité de Obra		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	lunes, 14 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Estación III
COMENTARIOS:	Hincado de Pilotes en Tierra		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 16 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 4
COMENTARIOS:	Hincado de Pilotes en agua		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 16 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	BARRIO LA PLAYA	SECTOR:	Estacion III
COMENTARIOS:	Hincado de Pilotes		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)


Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 7

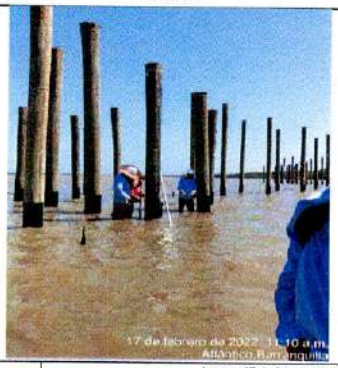


FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 17 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 4
COMENTARIOS:	Control Topografico interventoria		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	sábado, 19 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 5
COMENTARIOS:	Hincado de Pilotes en agua		

FOTO No. 9

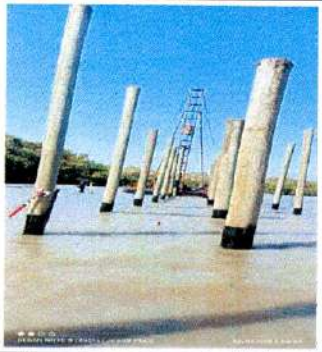

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 22 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 5
COMENTARIOS:	Hincado de pilotes en agua		

FOTO No. 10



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 23 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Estacion III
COMENTARIOS:	Hincado de ultimos pilotes estacion III		

FOTO No. 11



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	domingo, 27 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	ESTACIÓN 3
COMENTARIOS:	Hincado de Pilotes Frente Tierra		

FOTO No. 12



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	lunes, 28 de febrero de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Frente de Agua
COMENTARIOS:	Hincado Modulo 6		

ANEXO 5

GESTION AMBIENTAL

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)


FECHA O PERIODO:	FEBRERO DE 2022
PROYECTO:	SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	AMBIENTAL
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	LILIANA GALLARDO P.
ASUNTO:	INFORME No. 6

DESARROLLO DEL TEMA

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión Ambiental realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 28 de febrero de 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO Mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exija. De igual manera estos anexos soportan la Gestión Ambiental realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental.

LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

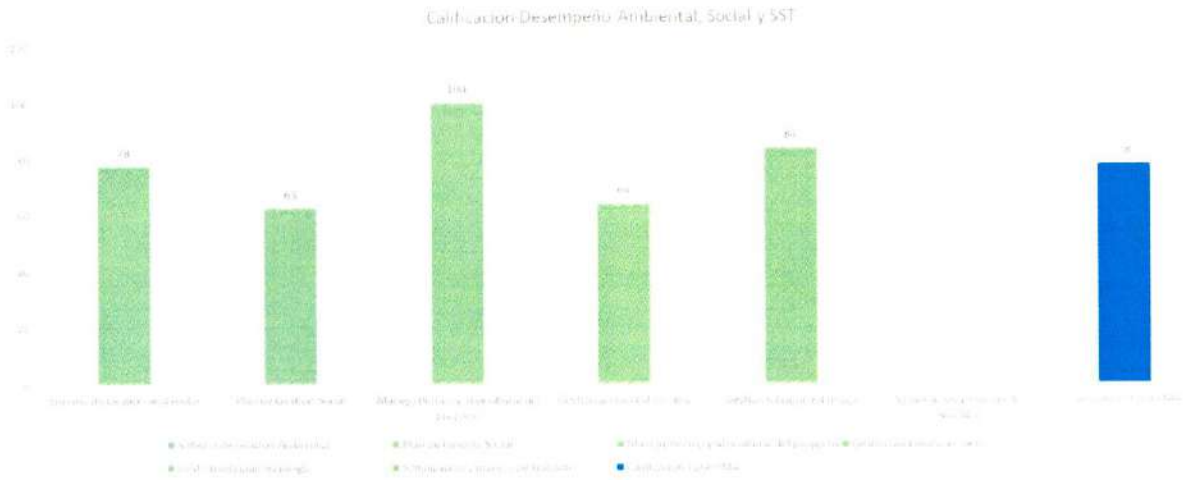

Durante el periodo tratado el Contratista de Obra tuvo un promedio de calificación de la implementación del PMA del 78%. El promedio de las áreas temáticas estuvo por encima del 60%. Cabe mencionar que el área temática de Señalización y manejo de tránsito no aplica para este periodo, ya que no se han iniciado las actividades en la vía debido a que la ANI no ha otorgado el permiso para la intervención de esta.

Ver Formato Lista de Verificación del Desempeño Ambiental

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental elaborado para la totalidad del proyecto. El Consorcio JCO Mallorquín, elaboró un Plan de Manejo Ambiental ajustando las fichas de dicho documento a las características del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar. Este fue revisado por la Interventoría y remitidas algunas observaciones.

Los programas estipulados por el Contratista para el manejo ambiental de la obra se presentan a continuación:

FMA-1: Programa para el Manejo de Emisiones Atmosféricas, Material Particulado y Ruido

FMA-2: Programa para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios, Peligrosos y Especiales
FMA-3. Programa para el Manejo de Materiales de Construcción
FMA-4: Programa para el Manejo de Vertimientos y Gestión del Recurso Hídrico
FMA-5: Programa para el Control de Sedimentos y Manejo del Suelo
FMA-6: Programa de Señalización
FMB-1: Programa para el Manejo de la Cobertura Vegetal
FMB-2: Programa para la Protección de la Flora
FMB-3: Programa para la Protección de la Fauna Acuática
FMB-4: Programa para la Protección de la Fauna Terrestre
FMB-5: Programa para la Protección y Conservación de Hábitats

EQUIPO AMBIENTAL DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Dussan	Especialista Ambiental	Consorcio JCO Mallorquín
Liliana Gallardo	Especialista Ambiental	Consorcio UF1 Mallorquín

PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES

Proveedores de Materiales

Tipo de Material	Proveedor	Acto Administrativo	Vigencia	Título Minero
Agregados pétreos	Valores y Contratos S.A.	Resolución No. 860 de 2015 Resolución No. 284 de 2019	Vida útil del proyecto	Contrato de Concesión No. 10429C1
Agregados Pétreos	SERVICS S.A.S.	Resolución No. 157 de 2016	Vida útil del proyecto	NI7-10301
Agregados Pétreos	Luis Ramos De La Hoz	Resolución No. 077 de 2016	Vida útil del proyecto	Contrato de Concesión No. L685 KH5-14071

Gestores Externos Prestadores de Servicios (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, RESPEL, RCD y otros)

Empresa	Actividad	Acto administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad Otorgante
RECITRAC S.A.S	Manejo, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento, recuperación de residuos peligrosos o desechos peligrosos	Resolución 0625 de 2009 Resolución 0880 de 2010 Resolución 1263 de 2018	Vida útil del proyecto	DAMAB
SAKATECK	Suministro de baños portátiles con recolección y transporte de residuos industriales y RAEE en los vehículos	Resolución No. 2996 de 2020	Enero de 2022	Barranquilla Verde

Actos Administrativos Gestionados por el Contratista (Autorización de tala, concesión de aguas, permiso de vertimientos, ocupación de cauce, RCD y otros)

Tipo de Permiso	Acto Administrativo	Entidad Otorgante	Medida Compensatoria	%Avance Medida Compensatoria
Ocupación de Cauce	Resolución 641 (19/11/2021)	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	NA	NA
Permiso de Aprovechamiento Forestal	En trámite	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	-	-

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL DE OBRA

FMA-1: Programa para el Manejo de Emisiones Atmosféricas, Material Particulado y Ruido

Durante el periodo tratado no realizaron acopio de materiales de construcción que puedan generar material particulado. Solo cuentan con el acopio de los pilotes de madera, los cuales no se encuentran acopiados en zonas verdes.

FMA-2: Programa para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios, Peligrosos y Especiales

A la fecha de corte de este informe cuentan con un punto ecológico temporal sin el código de colores. Se le solicitó al Contratista tomar las acciones correctivas.

FMA-3. Programa para el Manejo de Materiales de Construcción

Cuentan con proveedores legalmente autorizados para la compra de los materiales de construcción. A la fecha solo tienen acopiados los maderos de los pilotes.

Las áreas de almacenamiento cuentan con un acceso seguro y señalizado y por fuera de zonas verdes.

FMA-4: Programa para el Manejo de Vertimientos y Gestión del Recurso Hídrico

A la fecha para las actividades de obra no es necesario la utilización de agua, por lo que no se genera agua residual de este tipo.

El Contratista cuenta, para el manejo de las aguas residuales domésticas, con cuatro (4) baños portátiles. El proveedor de estos es la empresa SAKATECH, la cual está debidamente autorizada para esta actividad.

Durante el mes se presentó un derrame accidental en el cuerpo de agua, el cual fue recogido y almacenado en tanques. Este residuo fue entregado a la empresa Recitrac S.A.S. para su tratamiento y disposición.

Ver anexo No. 1

FMA-5: Programa para el Control de Sedimentos y Manejo del Suelo

Actualmente la actividad que se está realizando es la de hincado de pilotes, y esta actividad no genera turbiedad en el cuerpo de agua.

FMA-6: Programa de Señalización

El Contratista de Obra instaló la valla informativa del proyecto, la cual está ubicada dentro del lote del proyecto. Los frentes de obra cuentan con señalización informativa.

FMB-1: Programa para el Manejo de la Cobertura Vegetal

A la fecha no se ha realizado descapote en el frente de obra.

El Consorcio realizó un inventario forestal y solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico el Permiso de Aprovechamiento Forestal. La Corporación, mediante el Auto 737 de diciembre 18 de 2022, por medio del cual admite la solicitud e inicia el trámite de autorización. A la fecha de corte de este informe, el Contratista de Obra manifiesta que no ha tenido respuesta por parte de la Corporación.

FMB-2: Programa para la Protección de la Flora

En el periodo no se ha realizado actividades de obra en áreas donde existe el ecosistema de manglar.

FMB-3: Programa para la Protección de la Fauna Acuática

El Consorcio realiza charlas al personal que labora en el frente de obra en temas sobre el manejo y conservación del recurso hídrico e hidrobiológico.

Durante el periodo tratado realizaron las siguientes charlas **(ver anexo No. 2)**:

- ✓ Manejo de sustancias químicas
- ✓ Programa de arqueología, orden, aseo y limpieza
- ✓ Plan de manejo ambiental PMA – Protección al ecosistema

FMB-4: Programa para la Protección de la Fauna Terrestre

Han realizado actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna afectada directamente por las actividades realizadas en el frente de obra. Esta actividad fue realizada por un Biólogo.

Para el manejo con los trabajadores en el frente, les ofrecen charlas y mantienen la prohibición de maltrato, tráfico y/o comercialización de especies animales.

FMB-5: Programa para la Protección y Conservación de Hábitats

El Consorcio realiza charlas al personal que labora en el frente de obra en temas para la protección y conservación de hábitats.

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Revisión de la documentación presentada por el Contratista de Obra.
- Elaboración de informes.
- Realizar seguimiento y control de las actividades en el frente de obra.
- Solicitar al Contratista las acciones correctivas pertinentes en la implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

REUNIONES SOCIO-AMBIENTALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo tratado en este informe no se realizaron reuniones socio-ambientales.

- ✓ Se realizó reunión con el Contratista de Obra para la revisión del Presupuesto Ambiental del Proyecto
- ✓ Se realizó reunión con la Supervisión Ambiental de EDUBAR para ajustar el formato Lista de Verificación del Desempeño Ambiental para el Proyecto

FIRMA: _____

NOMBRE: LILIANA GALLARDO P.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Frente de obra en tierra



Frente de obra agua



Manejo de aguas residuales campamento de obra

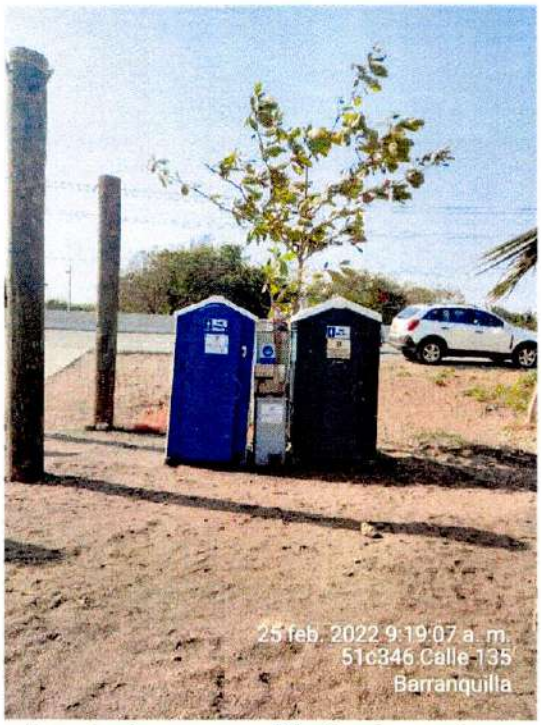

Manejo de aguas residuales frente tierra

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

FORMATO LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código	
EDUMAR	SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS	Versión	V1
		Fecha	29/12/2020

Contrato EDU-561-2021


Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Proyecto SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Contrato interventoría EDU-566-2021 **Interventoría** CONSORCIO UF 1 MALLORQUIN **Periodo** 1 2 2022 **al** 28 2 2022

Presupuesto total de obra $ 82.464.264.620 **Presupuesto total del PMA** $ 662.124.857 **Participación PMA en obra** 0,802923375

	Área temática	Und	Valor de referencia	AÑO 2022											
				FEB	MAR	ABIR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SG-01	Sistema de Gestión Ambiental	%	25	78											
PGS-02	Plan de Gestión Social	%	15	63											
MBS-03	Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	%	10	100											
GAO-04	Gestión ambiental en obra	%	25	64											
GIR-05	Gestión integral del riesgo	%	20	84											
PMT-06	Señalización y manejo de tránsito	%	5												
	Calificación Total PMA	%	100	78	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Monto pagado por ejecución del PMA														
	Valor aportes pagados en seguridad social														

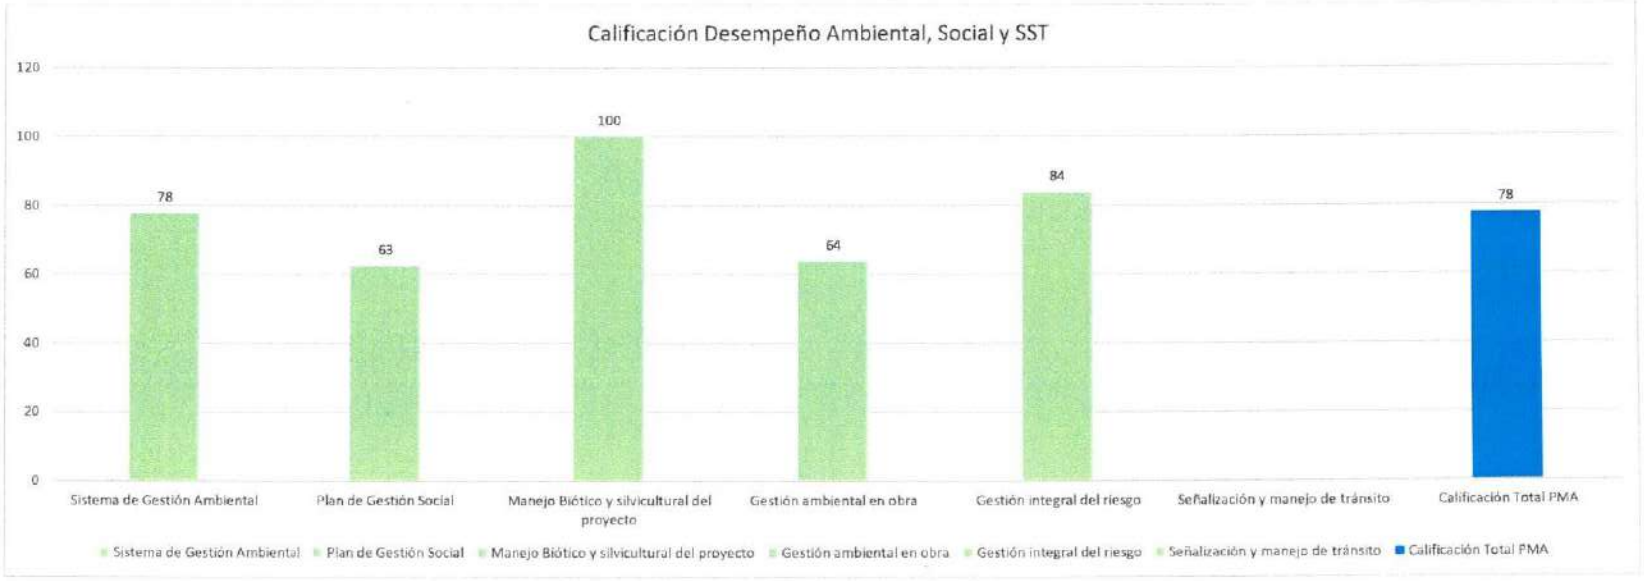

EDMAR	**LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL**	CODIGO		
		VERSION		

NOMBRE DEL PROYECTO:	SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021, INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA	CONSORCIO JCD MALLORQUIN
INTERVENTORIA	CONSORCIO UF 1 MALLORQUIN
NUMERO DEL CONTRATO OBRA	EDU-561-2021 — NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDU-566-2021
PERIODO DE EVALUACIÓN	FEBRERO DE 2022

MS 01 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GA 01-1	El contratista entregó el plan de manejo ambiental (PMA) ajustado y aprobado por parte de la autoridad ambiental dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos del PMA que son responsabilidad del contratista y en la fecha acordada	Entregó los formatos en la fecha indicada	Se entregan los formatos con mas de una semana de retraso	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-3	El contratista entregó el plan de contingencia para el control de derrame de hidrocarburos en cuerpos de agua (Cienaga de Mallorquin)	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	0	0	0	0	0	
GA 01-4	Se publicaron los comunicados de prensa con la del plan de manejo de transito y desvios y avisos pertinentes sobre el proyecto, cumpliendo con las especificaciones del PMA.	Brigada de aseo trabaja tiempo completo	N.A.	No se cumple	-	-	-	-		No han presentado el PMT, ya que se encuentran en solicitud de permiso de la ANI
GA 01-5	El contratista entregó el plan de manejo trafico (PMT) aprobado por parte de la autoridad competente dentro de los terminos definidos en el contrato y se encuentra vigente durante el periodo de ejecución.	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	-	-	-	-		
GA 01-6	El contratista entregó dentro del PMA las fichas de la gestión Social dentro de los términos definidos en el contrato y remitió de manera mensual la programación de actividades.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.	100	100	100	100	100	
GA 01-7	El contratista entregó el plan de gestión de riesgo aprobado por la oficina de gestión del riesgo y entregó soportes de la implementación de forma mensual	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.	50	50	50	50	50	
GA 01-8	El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de comité socio-ambiental en las fechas establecidas en las respectivas actas.	Cumple	Cumple parcialmente	No se cumple	50	50	50	50	50	
GA 01-9	El contratista deberá presentar un informe mensual a la interventoría, donde se relacione la gestión realizada durante el periodo, con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales	Se entrego el informe socioambiental en las fechas establecidas	Se cumple parcialmente	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-10	El contratista entregó el cronograma de actividades de la gestion social, ambiental y de SST, ajustado al cronograma de obra. Se entregó el % de cumplimiento de las actividades del cronograma aprobado.	Se cumple el requerimiento	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-11	El contratista cuenta con los permisos y licencias vigentes requiridas en la ejecucion del proyecto.	cuenta con el 100% de permisos vigentes	no cuenta con uno de los permisos requeridos	No cuenta con permisos	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (A)	75	

PGS-02 FICHAS DE GESTION SOCIAL

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GS 02-1	Realizó todas las reuniones de socialización del proyecto (Inicio y cierre de obra) programadas	Cumple con el requerimiento	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-2	Realizó todas las reuniones generales informativas de Avance de Obra de acuerdo a la frecuencia acordada con la interventoría.	Realizó todas las reuniones ordinarias	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GS 02-3	Entregó evidencia mensualizada (as reuniones con la comunidad (actas y registros de asistencia).	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-4	El contratista entregará a la interventoría para aprobación la programación de actividades de la gestión social, de forma mensual, cualquier cambio a esta se deben ser notificada con antelación.	cumplio con el requerimientos	cumplio parcial con el requerimientos	no cumplio con el requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-5	Se entregaron los volantes establecidos en el PMA, cumpliendo con las especificaciones exigidas, en la cantidad y plazos establecidos por la interventoría, y de acuerdo al cronograma /programación de actividades/ y frentes de obra	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% - 80% de los volantes.	Entregó menos del 80 % de los volantes.	0	0	0	0	0	
GS 02-6	Se instaló la valla informativa del proyecto	Se instalaron todas las vallas.	Se dejo de instalar una valla	Se dejó de instalar dos o más vallas.	100	100	100	100	100	
GS 02-7	El contratista realizó las reuniones intermedias de acuerdo a lo estipulado en el PMA	Si las realizó.	dejó de realizar una reunión	No las realizó	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GS 02-8	El contratista colocó carteleras en el área influencia directa de la obra. Estas permanecieron en la obra o fueron reemplazadas en caso de deterioro .	Colocó todas las carteleras	Dejo de colocar o reemplazar una cartelera	Dejo de colocar o reemplazar dos o más carteleras	0	0	0	0	0	
GS 02-9	Realizó el inventario inicial de predios para conocer el número de actas de vecindad a realizar.	Realizó la actividad	Realizó parcialmente el inventario	No realizó la actividad	-	-	-	-		No aplica
GS 02-10	Levantó las Actas de Vecindad en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PMA.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 80% -80% de las actas de vecindad	levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	-	-	-	-		No aplica
GS 02-11	Verificó y atendió todas las quejas interpuestas por la comunidad por sneños en inmuebles de acuerdo a lo estipulado en el PMA.	Verificó y atendió todas las quejas.	Verificó y atendió entre el 99% - 80% de las quejas	Atendió menos del 80% de las quejas.	-	-	-	-		No aplica
GS 02-12	Levantó actas de cierre de acuerdo al inventario inicial realizado en el área de influencia del proyecto.	Levantó la totalidad de actas de cierre.	N.A.	No levantó de actas de cierre	-	-	-	-		En caso de requerirse, se realiza una vez se terminen las actividades técnicas del proyecto.
GS 02-13	Recibió, atendió y solucionó las PQRS manifestadas por la comunidad, de acuerdo al trámite requerido, entregó soportes de la gestión de PQRS.	Solucionó el 100% de las quejas y reclamos.	Solucionó entre el 99 al 80 % de las quejas	Solucionó menos del 80% de las quejas.	-	-	-	-		no se presentaron solicitudes
GS 02-14	El contratista lleva un registro de la gestión de PQRS mes a mes y se presenta en el informe mensual.	Solucionó el 100% de las quejas y reclamos.	Solucionó entre el 99 al 80 % de las quejas	Solucionó menos del 80% de las quejas.	50	50	50	50	50	Presento el formato de recepción de PQRS
GS 02-15	Conformó el Comité Comunitario de Obra y realizo reuniones mensuales.	Instaló el Comité Comunitario de Obra.	Se instaló el comité con retraso considerable	No instaló el Comité Comunitario de Obra.	100	100	100	100	100	
GS 02-16	Elaboró y distribuyó piezas informativas o plegable pedagógico de contenido de sostenibilidad y cultura Ciudadana.	Si bom plegable pedagógico.	N.A.	No cumple con los requerimientos	-	-	-	-		Se encuentra en etapa de reconocimiento del sector y de los lideres
GS 02-17	Realizó los talleres pedagógicos para el cuidado y Sostenibilidad dirigidos a la comunidad y/o organizaciones sociales existentes en el área de influencia del proyecto	Realizó la totalidad de los talleres.	N.A.	No cumple con los requerimientos	-	-	-	-		
GS 02-18	El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la interventoría y será ejecutado durante todo el transcurso las actividades constructivas. En caso de requerir ajustes al plan se notificará a la interventoría con las respectivas justificaciones técnicas del caso.	Cumple con el requerimiento.	N.A.	no se cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GS 02-19	Contrató el 10 % o más de la mano de obra no calificada pertenece a población vulnerable según lo definido contractualmente.	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 49% y el 20% del personal con domicilio en el AMB	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	50	0	0	0	0	
GS 02-20	Se contrató 5 mujeres inscritas en el censo de oportunidades del distrito perteneciente a la nomina de mano de obra no calificada (M.O.N.C)	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 9% y el 1% del personal con domicilio en el AID.	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	0	0	0	0	0	
GS 02-21	Se realizó la promoción de vinculación de mano de obra local, a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, se presentaron las actas correspondientes.	Cumple con el requerimiento.	N.A.	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (B)	63	

MBS 03- MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
MBS 03-1	El Contratista antes del inicio de las actividades de obra actualizó el inventario forestal levantado previamente para el proyecto.	Se cumplen los requerimientos.	Se entregó el inventario luego de iniciadas las labores de tala	No entrego completo el inventario forestal dentro de los términos de calidad y cronograma previsto.	100	100	100	100	100	
MBS-03-2	Tratamientos silviculturales cuentan con aprobación de autoridad ambiental	Se cumplen los requerimientos.	El permiso de la autoridad ambiental fue dado después de iniciar labores de tala	No cumple	-	-	-	-		El Contratista solicitó el Permiso de Aprovechamiento y se encuentra en espera de respuesta por parte de la CRA
MBS-03-3	Se cumplió con los requerimientos exigidos en el Permiso de Aprovechamiento Forestal	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS 03-4	Se protegio los individuos arboreos existentes en el area de construcción	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS-03-5	Residuos vegetales son retirados dentro de tiempo estipulado por la Autoridad Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Se observa sitio con incumplimiento	Se observa más de un sitio con incumplimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS-03-6	Como medida de compensación del daño o pérdida de árboles, el Constructor deberá sembrar árboles, considerando especies aprobadas por la autoridad ambiental y ubicación según diseño. Se cumplirán los árboles de compensación en los términos establecidos en el permiso de aprovechamiento forestal.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS 03-7	Se realizó capacitación de personal de obra sobre protección de fauna domestica y silvestre presente en el sitio.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (C)	100	

GAO 04 GESTION AMBIENTAL DE OBRA

GAO 04-1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-1.1	Se realizó la capacitación y sensibilización del personal operativo del contratista para el manejo y control de derrames de hidrocarburos en la Ciénaga de Mallorquín. Sensibilización semanal. Entregar evidencia	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.2	Se realizaron limpiezas periódicas de los baños portátiles ubicados en obra	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.3	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás material sea a cuerpo de agua y/o su disposición directa sobre el suelo.	Se cumple	NA	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.4	El contratista entregó certificados de disposición de limpieza de baños portatiles	Se cumple	NA	No se cumple	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (D)		100	

GAO 04-2 MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION- RCD :

GAO 04-2.1	Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El contratista realizó limpieza de las vías	Las vías de entrada y salida de la obra se cuentran limpias y despejadas	por lo menos una vía no cumple con el requerimiento	No cumple con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.2	Los escombros deben ser protegidos (con elementos tales como plásticos, lonas impermeables o mallas) o humedecidos para controlar la dispersión por el viento, pueden permanecer en la zona de acopio temporal hasta 24 horas después que de su generación y luego transportados a los sitios autorizados para su disposición final. El Contratista debe llevar el registro de los volúmenes generados indicando el factor de esponjamiento, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente el igual que cumplir con el almacenamiento temporal en punto de generacion	Los escombros son retirados dentro del plazo. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.	se lleva registro de generacion pero no son retirados en el tiempo definido.	Los escombros no fueron retirados y no se llevan registros de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.	-	-	-	-		Durante el periodo tratado no generaron escombros
GAO 04-2.3	El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras.	No se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	N.A.	Se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.4	Las volquetas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón y deben ser cubiertas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón. se controla el cargado de las volquetas al salir de la obra.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.5	No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.6	La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes. El contratista entrega de manera mensual la certificación otorgada por el sitio de disposición final o escombrera autorizada en la cual consta el volumen dispuesto durante el periodo.	Se cumple con los requerimientos.	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.7	El contratista deberá disponer de puntos ecológicos, lonjeos debidamente marcados y señalizados, para almacenar residuos de construcción, tal como se indica en el PMA.	Cumple con lo estipulado en el PMA	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con lo estipulado en el PMA	0	0	0	0	0	
GAO 04-2.8	El contratista deberá entregar a la interventoría previo al retiro y disposición final de los escombros el registro de generador de RCD y la inscripción del proyecto. la documentación pertinente que demuestre la legalidad del sitio o escombrera para su aprobación.	Se cumple con los requerimientos.	N.A.	No cumple con lo estipulado en el PMA	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.9	El contratista lleva registro mensual de la generación y aprovechamiento de RCD.	Se cumple con los requerimientos.	N.A.	No se cumplen los requerimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (DS)		75	

GAO 04 -3 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04 -3.1	Los materiales finos almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aires y su contaminación, los materiales gruesos fueron se humectados según se requiera. Los materiales empleados en la obra no deben generar obstrucción del flujo vehicular y peatonal. En caso de presentarse esto, deben tomarse las correctivos de forma inmediata.	Todos los frentes de trabajo cumplen	No se cumple entre uno y tres frentes de trabajo	Por lo menos tres frentes de trabajo no cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.2	En caso de que el Contratista requiera realizar mezcla de concretos y cementos en zonas verdes en los frentes de obra, estas serán inspeccionadas por la interventoría y se deben realizar sobre una plataforma metálica o de madera, y en todo caso asegurar que el lugar permanezca en dichas condiciones	Cumple el requerimiento en todos los casos.	No se cumple entre uno y dos frentes de trabajo	Se observó más de dos sitio que no cumple el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.3	No se deben presentar derrames de mezclas de concreto en los frentes de obra. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas en caso de presentarse.	No se evidencias derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día siguiente a la interventoría.	Se evidencian derrames en los frentes de obra entre uno y tres casos	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres casos y no se han entregado los reportes de estos al día siguiente a la interventoría.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.4	Se prohíbe el lavado de la olla de los vehículos mezcladores en el frente de obra, en vías asfaltas, zonas verdes o duras. Se habilitó un sitio impermeabilizado para la limpieza del canal abatible del vehículo mezclador y se realiza en sitio autorizado.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	N.A.	No cumple con los requerimientos y procedimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.5	Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas. Esta documentación debe ser entregada a la interventoría para su respectiva aprobación previo al suministro.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.6	Los acopios de materiales no se encuentran obstruyendo pasos peatonales o espacio público.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GAO 04 -3.7	El acopios de materiales en obra se encuentran ordenados por clase y tipo de material	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (DO)		100	

GAO 04 -4 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04 -4.1	El campamento o campamentos no se podrán instalar en espacios públicos que no hagan parte del frente de obra.	Los campamentos no están en el espacio público	Uno o dos campamentos se encuentran en espacio público	Más de dos campamentos están en el espacio público	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.2	El campamento deberá contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Estas estar dotadas de una sección de primeros auxilios con camilla, botiquín portátil con todos los elementos necesarios y extintor.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con una o dos condiciones	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.3	Se deberá colocar recipientes en un punto del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.	Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados.	0	0	0	0	0	
GAO 04 -4.4	El campamento debe estar señalizado adecuadamente, debe tener visible la ruta de evacuación, debe estar dotados de baños, punto de hidratación, zona de descanso, primeros auxilios, protección contra incendios, y allí deben reposar el plano de ruta de evacuación y teléfonos de emergencia	Cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	50	50	50	50	50	
							CALIFICACION TOTAL (DS)		63	

GAO 04-5 Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-5.1	El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos debe ser realizado con la frecuencia que requiera el tipo y edad del equipo. El contratista debe entregar mensualmente los registros de este mantenimiento en el informe SST.	Cumple con los requerimientos.	Se evidenció uno o dos maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	Se evidenció tres o más maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	0	0	0	0	0	
GAO 04-5.2	El contratista entregó para verificación copia del certificado de revisión tecnomecánica, tarjeta de propiedad, SOAT, Manifiesto de importación, permiso de movilización y licencia de operador o conductor, certificado de idoneidad de los operadores en el informe mensual.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con el requerimiento	0	0	0	0	0	
GAO 04-5.3	Todos los vehículos y maquinarias , que laboran en la obra se encuentra en buenas condiciones de luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas. Y se entregó registro preoperacional diario en el informe SST	Cumple con los requerimientos.	Faltó por revisar uno o dos vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	Faltó por revisar tres o más vehículos	0	0	0	0	0	
GAO 04-5.4	La maquinaria que se parquean en los frentes de obra debe ser encerrada para evitar accidentes con tres líneas de cinta plástica. Las sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Uno o dos ítem no cumplieron con los requerimientos	Dos (2) o más ítem no cumplieron con los requerimientos	-	-	-	-		
GAO 04-5.5	Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento Preventivo de vehículos y maquinaria en las vías. La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en los frentes de trabajo, en los mantenimientos realizados se llevó a cabo instalando protección en el área a intervenir con material de polietileno y con previa autorización de la interventoría.	Cumple con los requerimientos.	Se reparó y/o llevó uno o dos vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	Se reparó y/o llevó dos o más vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	50	100	100	100	88	
							CALIFICACION TOTAL (DE)		22	

GAO 04 -6 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-6.1	No se podrán realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a las redes existentes de drenaje pluvial.	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen vertimientos de agua residual a sitios no autorizados.	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.2	Se realizó el mantenimiento de las cabinas de servicio sanitario instaladas en los diferentes frentes de construcción o campamentos usados por el personal de la obra, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana.	Cumple los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.3	El manejo y disposición de aceites usados deberá realizarse con las empresas autorizadas. Se entregó la certificación de entrega y gestor autorizado.	Cumple los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.4	El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con pipas), se realizó mediante la utilización de un vehículo adecuado para tal fin.	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.5	Si se requirió mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo de niveles de aceites y líquidos), el constructor utilizó material de polietileno que cubre la totalidad del área donde se realizó este actividad, de forma tal que se evitó contaminación del suelo por derrames accidentales.	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GAO 04-6.6	Se prohibe realizar vertimientos de aceites y demás materiales al cuerpo de agua y/o su disposición directa sobre el suelo.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se evidenció vertimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.7	Los productos químicos se encuentran con el etiquetado que facilita información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deben observarse para los trabajadores.	Todos los productos químicos están debidamente etiquetados	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen tres o mas productos químicos que no fue etiquetado adecuadamente	0	0	0	0	0	
GAO 04-6.8	El contratista cuentan con la matriz de compatibilidad de sustancias químicas y se mantuvo disponible las fichas técnicas de seguridad de la sustancias químicas utilizadas y almacenadas en el campamento y las social en los entrenamientos de inducción del personal.	Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos.	0	0	0	0	0	
GAO 04-6.9	La obra cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de sustancias químicas, aceites y combustibles, dotado con señalización y un dique de contención, igualmente se cuenta con los elementos para el control de derrames.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
							CALIFICACION TOTAL (06)		50	

GAO 04-7 Manejo de Estructuras y Aseo

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-7.1	Se cuenta con una brigada de limpieza, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. En el evento en que la interventoría detecte que la Brigada o alguno de sus miembros o equipo está desarrollando otras labores, éstas se deberán suspender para dedicarse a las de aseo y limpieza.	Existe y opera la Brigada de limpieza acorde con el Componente A	Se cumple parcialmente este requerimiento	No opera la brigada de limpieza	0	0	0	0	0	
GAO 04-7.2	Se observa que se realiza limpieza general diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.	Se cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitio de disposición se encuentra cerca de la zona de tráfico y/o no está protegido	0	0	0	0	0	
GAO 04-7.3	Se recogieron los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realizan las obras. Estos materiales se colocaron en canecas y se dispusieron (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material susceptible de reciclarse se clasificó y se depositó en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización.	Se cumplen todos los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumplen todos los requerimientos	50	0	50	0	25	
GAO 04-7.4	No se presentó acumulación de basura ni otros desechos sólidos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, alameda, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y probados para tal fin.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	50	0	50	0	25	
GAO 04-7.5	Los residuos especiales que se generaron del uso de soldaduras (pegantes PVC), incompatibilizantes, sellantes epóxicos y antiácidos, fueron recolectados en bolsas separadas y entregados a los gestores autorizados. Se entregó certificación de la disposición final.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (06)		13	

GAO 04-8 Manejo de Aguas Superficiales

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-8.1	El contratista no realizó vertimientos líquidos o sólidos a las aguas de escorrentía y/o cuerpo de agua en el sector del proyecto durante una lluvia.	Se cumple con los requisitos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos.	0	100	100	100	75	
							CALIFICACION TOTAL (07)		75	

GAO 04-9 Manejo de Excavaciones y Rellenos

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-9.1	Al momento de hacer las excavaciones se encontró piezas arqueológicas, y dio la orden de suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informó al ICANH (Instituto colombiano de antropología y de Historia Natural), para que evalue la situación y determine el momento de continuar con la obra.	No se encontraron hallazgos. Se suspendieron las labores encontrar un posible hallazgo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Las labores no se suspendieron de manera inmediata.	-	-	-	-		
GAO 04-9.2	El contratista previamente antes de iniciar las excavaciones identificó la existencia de redes y ubicó los ejes de las tuberías y redes enterradas sobre el terreno.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	100	100	100	100	100	
GAO 04-9.3	Las excavaciones fueron señalizadas de forma apropiada para evitar accidentes. En caso de deterioro de las señales, estas fueron reemplazadas.	Se señalizaron de manera adecuada todas las excavaciones	por lo menos una o dos excavaciones estuvieron sin señalizar	Estuvieron al menos tres excavaciones sin señalizar	-	-	-	-		
GAO 04-9.4	Se garantizó la seguridad y estabilidad del talud, en todas las excavaciones que requirieron de entibado por su profundidad. El personal que contó con líneas de vida y elementos de seguridad definidos en la normas aplicables.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		
GAO 04-9.5	Los materiales de excavación fueron retirados del borde de la excavación, se mantuvo una distancia mínima de 1m para el acopio de los materiales a reutilizar en el relleno de zanjas. Durante este tiempo, se mantuvieron debidamente señalizados.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		
							CALIFICACION TOTAL (08)		100	

GAO 04-10 Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-10.1	Las zonas donde se desarrollan intervenciones de obra, fueron aisladas con el cerramiento perimetral aprobado, este cuenta con una altura mínima de dos metros de altura.	Cumple con la media	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida	100	100	100	100	100	
GAO 04-10.2	Para minimizar las emisiones de material particulado las zonas descubiertas de acabados fueron humedecidas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas descubiertas de acabados.	Se realizan los humedecimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se realizan los humedecimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.3	La velocidad de los volquetas y de la maquinaria no superó los 30 km/h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas.	Cumple con la velocidad propuesta.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con la medida	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.4	No se realizaron quemas a cielo abierto.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos.	100	100	100	100	100	
GAO 04-10.5	Se mantuvo restringido el uso continuo de cornetas, claxón o bocinas de todos los vehículos que laboran en la obra.	Los vehículos y equipo cumplen con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con los requerimientos	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.6	Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra fueron protegidos de la acción del viento. En este sentido se utilizó un sistema de humectación o cerramiento con el tipo de material.	Se protegen los sitios temporales de acopio de los materiales	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (09)		100	

GAO 04-11 – Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-11.2	Previo al inicio de las actividades de construcción, se debió dictar charlas al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar.	Cumple con los requisitos sobre charlas y procedimiento a seguir sobre el manejo de elementos de tipo arqueológico.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos	0	0	0	0	0	
GAO 04-11.3	Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos se puede seguir con la operación normal de la actividad.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GAO 04-11.4	En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor actuará de conformidad con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley 397 de 1997 el cual dice "...quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso". Se suspendió de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GAO 04-11.5	Se consultó con el ICANH sobre la entrega de los materiales arqueológicos y ecaecificó en el informe el lugar donde estos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICAN Hasecordó a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la zona de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (D10)		0	
							CALIFICACION TOTAL (D+D10)		84	

GIR 00 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR 05-1 – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GIR 05-1.1	El contratista definió los EPP en la matriz de peligro por puestos de trabajo, y fueron suministrados a todo el personal de obra. Fue controlado el porte y uso de los mismos por parte del personal encargado.	Todos los trabajadores tienen los EPI correspondientes al puesto de trabajo	una a tres personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	más de 3 personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.2	Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación de personas, asociados a la ejecución de las tareas. Este análisis deberá ser presentado en el informe mensual socio-ambiental.	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.3	El contratista entregó programa de capacitación y remitió los soportes de ejecución de estas actividades en el informe socio ambiental	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.4	El contratista entregó la evaluación de los estándares mínimos según la Resolución 312 de 2019.	Se cumple con el requerimiento.		No cumple Requerimiento	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.5	Todo el personal que labora en la obra, está afiliado a una EPS, AFP y ARL. El Contratista implementó un formato de registro de cada empleado que indique: nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, a barrio que pertenece, EPS a la cual está afiliado (fecha de afiliación) y la fecha de afiliación a la ARL. Los registros de esta actividad fueron entregados en el informe mensual socioambiental.	Se cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.6	El Contratista debe entregó a la interventoría para revisión y aprobación el cronograma y la programación para efectuar el plan de trabajo anual. Mensualmente entregó el reporte de las actividades realizadas por el Contratista para dar cumplimiento a esta obligación.	El plan se entregó y se está cumpliendo con la programación.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.7	Se entregó y se tiene actualizada la matriz IPER, debe ser entregada a la interventoría para revisión y aprobación y debe atender las observaciones en un plazo no mayor a una (1) semana. Los riesgos deben ser revisados y reevaluados mensualmente y de dicha revisión se debe establecer un plan de acciones correctivas.	Se está cumpliendo con la programación. En el evento que algún registro de inspección no sea entregado en el informe de gestión socioambiental, este deberá ser entregado a la interventoría a más tardar el día siguiente del informe socioambiental.	se cumple parcialmente este requerimiento, los registros se entregaron después de la entrega del informe en un termino no mayor a tres días	se cumple con el requerimiento después de tres días de la entrega del informe.	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.8	Se dispone dentro del campamento de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP del personal contratista.	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.9	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Se cumplió con el plazo establecido para informar a interventoría. Se entregó el formato de reporte e investigación de accidentes y lesiones.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.10	Todas las personas (del Contratista) antes de entrar a laborar en los frentes de obra fueron debidamente entrenadas. Implementó un programa de inducción de entrenamiento en SST. Se entregó el registro del entrenamiento dado a los trabajadores del contratista que laboran en la obra y debidamente firmado por el trabajador, con su respectiva evaluación del entrenamiento.	Se cumple con el requerimiento. En el evento que algún	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.11	El Contratista realizó exámenes médicos de ingreso de los trabajadores . El examen médico de ingreso fue consistente con el puesto de trabajo al cual será asignado el trabajador. Estos resultados fueron entregados a la interventoría en el informe mensual socio ambiental.	A todos los trabajadores se les ha realizado el examen médico de ingreso de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.12	Se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales y de reubicación de los trabajadores de cuerdo al profesiograma.	A todos los trabajadores de los Contratista se les ha realizado el examen médico periódico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	NA	Se evidenció que a uno o más trabajadores de los contratistas presentes en la obra no se les realizó el examen médico periódico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GIR 05-1.13	El Contratista debe presentar el Plan de Estímulos dirigido a todos los trabajadores en relación con el uso de los EPP. Los registros de esta actividad fueron entregados y actualizados en el informe mensual de gestión socioambiental	Se mantiene el plan de estímulos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR 05-1.14	Los baños serán ubicados en la zona de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores presentes en cada frente, a fin de cumplir con el requisito de 1 baño por cada 20 personas	Cumple con el requerimiento.	falta uno o dos baños	Faltan más de dos (2) baños	100	100	100	100	100	
GIR 05-1.15	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos de las zonas y accidentes no fueron entregados a la interventoría.	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.16	Se mantuvo actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.17	El contratista realizó las labores de alto riesgo y diligenció el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (SST), en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor. Los permisos fueron entregados en el informe socioambiental	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	10M	
GIR 05-1.18	Las zonas de almacenamiento de sustancias se mantuvieron adecuadamente señalizadas para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas de seguridad necesarias (no fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos de protección personal, etc.). Estas sustancias se deben almacenar en sitios especiales en el almacén, donde no estén cerca o en contacto con otros elementos que puedan resultar contaminados, como agua potable.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.19	El contratista conformó el comité pertario de seguridad y salud en el trabajo [COPASST], se entregaron los soportes realizados por este en el informe socio ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	0	0	0	0	0	
GIR 05-1.20	El contratista conformó el comité de convivencia laboral [COCOLA], se entregaron los soportes realizados por este en el informe socio ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	0	0	0	0	0	
								CALIFICACION TOTAL (01)	42	

GIR 05-2 – PLAN DE CONTINGENCIA

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GIR 05-2.1	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entregó el Plan de Contingencia debidamente ajustado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	10K	
GIR 05-2.2	El Contratista determinó las amenazas potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia se activó los mecanismos de prevención y acción del plan.	El Contratista implementó las medidas de prevención y control	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR 05-2.3	El Contratista identificó y mantuvo publicado el listado de las instituciones que estan presentes en el área de influencia de la obra, que pueda ofrecer sus servicios de apoyo, para ser vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias	El Contratista entrega el registro de las instituciones que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR 05-2.4	El Contratista divulgó e incentivó la participación del personal del proyecto, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR 05-2.5	Se mantuvieron disponibles, completos , en buenstados, señalizados y accesibles los equipos de control de emergencias en la obra.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	10M	
GIR 05-2.6	Se conformó el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. El contratista entregó soporte manual de requerimiento.	El Contratista acta de conformación y capacitación y los procedimientos operativos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR 05-2.7	Se realizaron simulacros periódicos de emergencia conforme a la programación (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimensual). Involucrando a todo el personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del área de influencia.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
								CALIFICACION TOTAL (02)	42	
								CALIFICACION TOTAL (01 + 02)	84	

PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO										
PMT 06-1 IMPLEMENTACION DE PMT										
Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
PMT 06-1.	Se cuenta con los permisos vigentes requeridos para el cierre parcial o total de vías y/o de cargue o descargue de materiales.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-2.	La señalización fue ubicada en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes de conformidad con lo establecido por el PMT. Las vallas son de material resistente y fueron reemplazadas cuantas veces se requiera en caso de deterioro.	Las señales y vallas cumplen	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-3.	Las labores de excavación en el frente de obra fueron aisladas totalmente (con cinta o malla) y se fijaron avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra contó con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, bicadores, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre los colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. Los avisos fueron reemplazados cuantas veces se requirió, en caso de pérdida, robo o deterioro	Se cumple con los requisitos de señalización	Se cumple parcialmente este requerimiento	Tres frentes de excavación no cumple con los requisitos de señalización	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-4.	La ubicación diaria de materiales en espacio público, no interfieren con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra fueron demarcados y acordonados de tal forma con cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.	Todos los sitios cumplen los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Si por lo menos dos sitios no cumplen con los requisitos	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-5.	Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. El uso de escombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos, solo se permite si es complemento de una señalización ajustada al Manual de Intervención del INVIAS, se encuentre cubierto. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 65 cm de alto y 50 cm de ancho	Todos los cierres totales cumplen con las medidas	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitios no cumplen con los requisitos	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-6.	Se colocaron todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado	Se utilizan elementos de iluminación adecuados para señal nocturna	Se cumple parcialmente este requerimiento	Por lo menos tres sitios sin señal luminosa o con uso de antorchas	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-7.	El contratista previo a la construcción de cualquier sector del proyecto informó a la ciudadanía y a los vecinos de la obra por lo menos con cinco días de antelación mediante volantes informativos los desvíos o cierres de vías, las cuales fueron aprobadas por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.	Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se informa	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-8.	En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, dichos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. En caso de que sea imposible garantizar el acceso al parqueo, el contratista debe comunicarle al responsable del predio.	Se cumple con los requerimientos	uno o dos pasos temporales a garaje o vivienda no se habilitaron	Más de dos paso temporal a garaje o vivienda no se habilitaron	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-9.	El tránsito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante auxiliares de tráfico, los cuales deben estar dotados de chalecos reflectivos y casco usando señales de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos. La visibilidad del auxiliar de tráfico y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones.	El tránsito alternado es manejado acorde con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-10.	El contratista debera entregar el reporte de la implementacion del PMT de forma mensual, junto con informe de inversion de los recursos de las provisiones del PMT.	Se cumple con los requerimientos	N.A.	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para este periodo
								CALIFICACION TOTAL (F)		
								DESEMPEÑO AMBIENTAL MENSUAL : [A+B+C+D+O1+O2+O8+O4+O5+O6+O7+O9+D9+O10+O11+O12+F]		78

ANEXO No. 1

Certificado SAKATECH

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

Codigo: F3PCO3
Version: 01

SAKATECH

Barranquilla, 28 FEBRERO 2022

CERTIFICACIÓN

SAKATECH S.A.S. identificado con NIT 901.216.902-5, certifica que realiza TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL de aguas residuales provenientes de mantenimiento de baños portátiles a la empresa **CONSORCIO JCO MARLLORQUÍN** identificado con NIT 901.501.273-2 ubicado en la Ciénaga de Mallorquín.

SAKATECH S.A.S. cuenta con autorización otorgada por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (C.R.A.) bajo las RESOLUCIONES NO. 4189 del 19 de junio 2020. Se certifica que se recogió **0,96 Metros cúbicos (m3) correspondiente a cuatro (4) baños portátiles del periodo de 1 FEBRERO – 28 FEBRERO 2022**. La disposición final se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la empresa AGUACARIBE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. identificado con NIT 901.231.847-0 ubicada en GALAPA.

Contamos con personal capacitado y equipos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

SAKATECH NIT. 901.216.902-5

Ing. Santiago Pérez Moscote.
Gerente

RECITRAC...

RECITRAC S.A.S
NIT No. 900.273802-6

Licencia Ambiental No. 0625 del 14 de julio de 2009 -Licencia Ambiental No. 0880 del 11 de junio de 2010 modificado por Resolución No. 1263 del 07 de septiembre de 2018
Procesador y/o dispositor final de aceites usados.

Barranquilla, 26 de febrero de 2022

RECICLAJE Y TRATAMIENTOS DE ACEITES USADOS RECITRAC S.AS. Identificada con Nit No. 900.273.802-6 y licencia ambiental No. 0625 del 14 de junio de 2009 otorgada por el DAMB. modificada por la Licencia Ambiental No. 0880 del 11 de junio de 2010 y modificada por la Licencia Ambiental No. 1263 del 7 de septiembre de 2018 otorgada por EPA BARRANQUILLA VERDE como procesador y/o dispositores final de Aceites usados.

CERTIFICA QUE:

Movilizo y realizo disposiciones finales de los **ACEITES USADOS** abajo detallados, del **CONSORCIO JCO MALLORQUÍN** identificado con Nit. No. 901.501.273-2 ubicada en la carrera 59 # 64 -125 Barranquilla – Atlántico, correspondiente al Contrato de Obra No. EDU-561-2021 – Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla, en el periodo del mes de febrero de 2022.

TIPO DE RESIDUOS RECIBIDOS	CANTIDAD GAL
ACEITES USADOS - AGUA	4

Los aceites y residuos fueron debidamente tratados a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación. Una vez almacenado el producto terminado fue dispuesto a través de distribuidores autorizados por **RECITRAC S.A.S.** a dispositores finales para su uso en el aprovechamiento como combustible alternativo industrial para su combustión en hornos y/o calderas, dando cumplimiento a la resolución No. 1446 del 05 de octubre de 2005 del ministerio de medio ambiente.

Atentamente,

LUIS ACOSTA
Gerente

RECITRAC S.A.S
RECICLAJES INDUSTRIALES
NIT 900.273.802-6

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO No. 2

Listado Asistencia a Charlas

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	**REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO**	CODIGO: FRP - 02 VERSION: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS / RCD / MATERIALES CONSTRUC
DOCENTE: ING. CARLOS DUSSAN / PSI ISABELA MONTERO FECHA: FEB/10/2022
LUGAR: FRENTE DE OBRA NUEVA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	WILSON PEREZ YEPES	AYUDANTE	WILL	✓	
2	ALEXANDER HANOS	AYUDANTE		✓	
3	SILVIO DIAZ	OFICIAL INCA		✓	
4	OSWALDO E.	AUXILIAR		✓	
5	ALBEIRO HERRERA	OPERADOR		✓	
6	RUBEN QUIROZ	AUX. VIAS		✓	
7	MANUEL BRICEÑO	TOPOGRAFO		✓	
8	DESIDERIO CARMONA	CADENEROS		✓	
9	BRAYAN GARCIA	AUXILIAR		✓	
10	LAURA MANRIQUEZ	AUXILIAR CADENERO	LAURA MANRIQUEZ	✓	
11	JESUS PABLO M.	TOPOGRAFO	JESUS PABLO	✓	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES: SE PRESENTO LA PSICOLOGA ISABELA MONTERO QUIEN COORDINARA LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EN EL PROYECTO.
SE INSTALO EL KIT DE DERRAME PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

FIRMA DOCENTE

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CODIGO: FRP - 02
		VERSION: 3
		FECHA: 18/07/18

TEMA: Programa de Arqueología – Orden, aseo y limpieza

DOCENTE: Arqueol. Álvaro Mates – Ing. Carlos Dussán FECHA: Febrero 01 de 2022

LUGAR: Frentes de obra PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Isabella Monterroza V.	Pas Social			
2	Yonnis	Ruiz			
3	Giovanny Alexander Soto	Soldador			
4	Yelina Ramirez Ahumada	Ingeniera			
5		Bioseguridad			
6	Oswaldo Echeverria	Arqueólogo			
7					
8	Jose miguel salas	Soldador			
9					
10	Alvaro Moreno	Operador			
11		CAT			
12	RUBEN DARIO RIVERA	AUXILIAR			
13					
14					
15	Delmar Sanjuan	Auxiliar de pilotaje			
16	Carlos Pertuz	Operador			
17		conductor			
18	Carlos Portilla	Topógrafo			
19					
20	Jose Contreras	Inspector			
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES: Ninguna

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: Plan de Manejo Ambiental PMA – Protección al ecosistema

DOCENTE: Ing. Carlos Dussan FECHA: Febrero 18 de 2022

LUGAR: Frentes de obra PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Luis Quiñonez H	Brigadista	Luis Quiñonez H		
2	Isabella Monterroza V	Psi Social	Isabella		
3	Alexander Llanos	Ranpa			
4	Yenniy	Ruiz	Yenniy		
5	Jose miguel salas	Soldador	Jose salas		
6	Geovanny Obadet Pabon	Soldador			
7	Jose Blanco	Ayudante civil			
8	Melissa Ramirez Ahumado	Ingeniera	Melissa Ruiz		
9	RUBEN DARIO GUERRERO	AUXILIAR	RUBEN DARIO		
10	Oscar Estevez	Auxiliar			
11	Alvaro Llanos	Operador			
12	Eduardo Guamanga	Cat			
13	Jose Pinto	Conductor			
14	Camilo Pinilla	Oficial de Obra			
15	WILFRIDO PEREZ DIAZ	OPERADOR			
16	FRANCISCO Chamano	Auxiliar de Pilote			
17	Carlos Ruelly C.	Torrero Auxiliar	Carlos Ruelly		
18	Jose Contreras M	Topografo			
19	Weimar San Juan	Auxiliar de pilote	Weimar San Juan		
20	Carlos Prieto	Operador	Carlos Prieto		
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES: Ninguna

ANEXO 6

COMITES DE OBRA

uf1 mallorquin	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 15 Pág 1 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuparación integral de la ciénagade mallorquin en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: 4 FEBRERO DE 2022 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
Javier Velez C	Constructor	
Thorvis De Lugue A.	JCO mallorquin	
Melissa Ramirez Ahumada	JCO Mallorquin	
Fabián Suárez Herrera	Interventoría	
Carmen Ibarra Ayos	PDO	
DIEGO RADA ALTAHONA	EDUBAR	
Pedro Miranda Gutierrez	EDUBAR	
Ivan lopez ROMERO	EDU Bar	
Ing. Fernando Galbao Anoyo	Obras Publicas	

II. OBJETO DE COMITÉ

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

1) DISEÑOS ELECTRICOS: INTERVENTORIA ENTREGA AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ESPECIALISTA ELECTRICO. SE SOLICITA AL CONTRATISTA

REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL DISEÑO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, INCISO S. LUEGO DEBE REMITIRLO A LA INTERVENTORIA PARA SU REVISION Y APROBACION, Y FINALMENTE SERA REMITIDO A EDOBAR PARA SU APROBACION. EL CONTRATISTA INFORMARA EL DIA DE MAÑANA CUANDO SERAN REMITIDOS LOS AJUSTES.

2- NUEVO EQUIPO DE HINCADO. EL CONTRATISTA INFORMA QUE EN DOS SEMANAS LLEGARA UN NUEVO EQUIPO DE HINCADO PARA ABRIR UN TERCER FRENTE PROBABLEMENTE PARA LA PASARELA DE 34. EL EQUIPO QUE SE TRAJO PARA LA ESTACION III INICIARA LABORES EL DIA DE MAÑANA.

3- ACTA OBRA: EL SUPERVISOR INFORMA QUE ENVIARA EL LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE COMO SOPORTE PARA LA PRESENTACION DEL ACTA DE OBRA

4- PLANOS ACTUALIZADOS: EL CONTRATISTA SOLICITA A EDOBAR PRESENTAR LOS PLANOS ESTRUCTURALES ACTUALIZADOS Y GEOREFERENCIADOS DEBIDO A QUE SE HAN ENCONTRADO DIFERENCIAS ENTRE EL PLANO DE IMPLANTACION Y LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LOS MODULOS

5- RECHAZO PILOTES: DEBIDO A EL RECHAZO QUE VIENEN PRESENTANDO ALGUNOS PILOTES DE LA ESTACION III SE SOLICITO UNA REUNION CON EL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE PUERTA DE ORO PARA EVALUAR ESTE TEMA. SE PROGRAMA REUNION VIRTUAL CON LOS ESPECIALISTAS, CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA EL MARTES 8 DE FEBRERO/22 A LAS 10:00 AM

6- SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LA ALCALDIA: DEBIDO A LOS INCONVENIENTES QUE SE HA TENIDO CON LA COMUNIDAD DURANTE LAS SOCIALIZACIONES, LA ALCALDIA CONVOCARA UNA NUEVA SOCIALIZACION

ufl mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 15 Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

DEL PROYECTO GENERAL PARA EXPLICAR EL ALCANCE DEL PROYECTO Y RESOLVER INQUIETUDES

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA
1- AJUSTES DISEÑO ELECTRICO	CONTRATISTA	PENDIENTE

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 8 (DIA) 02 (MES) 2022 (AÑO)

uf mallorquin	**ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 16 (VIRTUAL)** Pág 1 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénagade mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: 8 FEBRERO 2022 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
DAVID BLANCO	PUERTA DE ORO.	
ANTONIO FRACO	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	PDO
JAIME CORVELO	ESP ESTRUCTURAL INTERVENTORIA.	
FABIAN SUAREZ	INTERVENTORIA.	
CARMEN IBARRA	PUERTA DE ORO.	
DIEGO RADA	EDUBAR	
JAVIER VELEZ	CONTRATISTA	
CYNTHIA VILLEGAS.	INTERVENTORA	

II. OBJETO DE COMITÉ

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

1) COTA DEFINITIVA CORTE DE PILOTES: EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA MANIFIESTAN QUE LA COTA DEL SEDIMENTO ENCONTRADO EN CAMPO DIFIERE

EN CASI 80cm A LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS, POR LO TANTO PARA CUMPLIR CON LA LONGITUD DE DISEÑO DE LOS PILOTES NO SE ESTARIA LLEGANDO A LA COTA 1,96 SINO A LA COTA 2,72, Y QUE SI SE CONSTRUYE A LA 1,96 LAS RIOSTRAS QUEDARIAN ENTERRADAS EN EL SEDIMENTO LO QUE IMPLICARIA UN PROCESO CONSTRUCTIVO DIFERENTE. PUERTA DEDO SOLICITA AL DISEÑADOR LOS DISEÑOS DE LAS PLATAFORMAS PARA QUE SE MANTENGA LA SENSACION DEL DISEÑO DE LA PASARELA DE CAMINAR LO MAS CERCA POSIBLE SOBRE EL AGUA EL ING. FRANCO COMENTA QUE HARA UNA REVISION AL DISEÑO PARA CERRAR EL ANGULO DE LAS RIOSTRAS (120°) Y REDUCIR 30cm ADICIONALES DEL PLANTEAMIENTO INICIAL PARA EVALUAR UNA NUEVA COTA DE LA PASARELA EZ 2,26. IGUALMENTE LA INTERVENTORIA SOLICITA AL ING. FRANCO ESTABLECER UNA TOLERANCIA EN LA VERTICALIDAD DE LOS PILOTES QUE PERMITA ESTABLECER SU ACEPTACION O NO EN LA OBRA.

2) RECHAZO EN PILOTES ESTACION III: EL ESP. EN GEOTECNIA INFORMA QUE EN EL SONDEO REALIZADO EN LA ESTACION III SE PRESENTA UN ESTRATO DURO POR LO QUE NO SERIA INCONVENIENTE EN LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA. AL ENTRAR EL PILOTE A TRABAJAR POR PUNTA Y POR FRICCION. SE ESTABLECE QUE EL CRITERIO DE RECHAZO SON EN 5 GOLPES x PULGADA.

3) VISITA: SE COORDINA VISITA EN CAMPO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS PARA EL 11 DE FEBRERO/22 PARA VERIFICAR EN CAMPO LOS TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ

	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 16 VIRTUAL Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 11 (DIA) 02 (MES) 2022 (AÑO)

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 17 Pág 1 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuparación integral de la ciénagade mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: 11 Febrero 2022 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
Luis José Flores Linares.	Puerta de Oro	
Carmen Ibarra Añas	Puerta de Oro	
Antonio J. Franco E	Estruct. Sostenibles sas	
Luis Fernando Garbao Arroyo	Sec. de obras publicas	
JUAN CASTRO INSIGNARES	CASTRO Y ASOCIADOS INGENIEROS	
Ivan Lopez Romero	EDUBAR	
JMelissa Ramirez Ahumada.	Consorcio JCO Mallorquin	
Javier. Velez.	" " "	
Jhonys De luque.	" " "	
DIEGO RADA ALTAHONA	EDUBAR S.A.	
Cynthia Villegas Andrade	Interventoria / Residente	
Daniela Rodriguez Abdala	Interventoria / Ing Ambl.	

II. OBJETO DE COMITÉ

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

1) ALTURA DEFINITIVA DE PLATAFORMAS: DE ACUERDO CON EL COMITE DE OBRA REALIZADO EL PASADO 8 DE FEBRERO/22 EL ING ANTONIO FRANCO

INFORMA QUE REVISO LOS DISEÑOS PARA COLOCAR LA ALTURA DE LAS PLATAFORMAS A LAS COTA +2,26 Y COLOCAR RIOSTRAS A 1,20 METROS DE ALTURA. EL ING. FRANCO INFORMA QUE LA SOLUCION ES VIABLE PARA LAS PASARELAS PERO QUE PARA LAS ESTRUCTURAS AUN SE ESTA EVALUANDO PORQUE ESTAN AL LIMITE DE LOS VALORES DEL DISEÑO, PERO QUE HABRIA QUE SUBIR A LA COTA 2,46 DEBIDO A QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA LA ALTURA DE LAS RIOSTRAS TRANSVERSALES QUE VAN DEBAJO DE LAS LONGITUDINALES. SIN EMBARGO AL REALIZAR LA VISITA A LA OBRA EL ING. FRANCO INFORMA QUE SE DEBE HACER UN AJUSTE EN DICHA COTA HASTA LA 2,70 DEBIDO A QUE LAS PERFORACIONES DE LOS ANCLAJES DE LAS RIOSTRAS NO PUEDEN ROMPER LA MEMBRANA DE PROTECCION DEL PILOTE. EL ING. FRANCO REALIZARA LOS ULTIMOS AJUSTES PARA DEFINIR LA COTA DEFINITIVA DEL CORTE DEL PILOTE.

2) VERTICALIDAD DEL PILOTE. EL ING. ANTONIO FRANCO SE ENCUENTRA REALIZANDO LA REVISION PARA LA TOLERANCIA EN LA VERTICALIDAD DEL PILOTE. LOS CALCULOS ESTAN APROXIMADAMENTE EN 3%

3) RECHAZO DE PILOTES. EL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INFORMA QUE NO REPRESENTA UN RIESGO PARA LA ESTRUCTURA PORQUE EL RECHAZO INDICA QUE SE ENCONTRO UN ESTRATO DURO Y EL PILOTE ENTRA A TRABAJAR POR PUNTA Y POR FRICCION Y EN EL DISEÑO SE TRABAJA POR FRICCION. PARA EL CRITERIO DE RECHAZO SE INFORMA QUE UNA VEZ LA PESA EMPIECE A PRESENTAR REBOTE SE EMPIEZA A UTILIZAR EL CRITERIO DE RECHAZO DE 5 GOLPES POR PULGADA.

4) EL CONTRATISTA SOLICITA QUE UNA VEZ SE AJUSTEN LOS DISEÑOS A LA ALTURA DE

ctf mallarquin	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 17 Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

CORTE, SE HAGA UN RECONOCIMIENTO DEL PILOTE POR EL RECHAZO Y LA DISTANCIA DEL CORTE DEBIDO A QUE SE COMPRARON DE ACUERDO CON EL DISEÑO, SE EVALUARA ESTA SOLICITUD.

5) DISEÑO ELECTRICO: CONTRATISTA ENTREGO PRIMERA PARTE DE LOS AJUSTES AL INTERVENTOR Y HOY SE ENVIA EL RESTANTE

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA _____
DIA MES AÑO

uf1 mallorquin	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 18 Pág 1 de 3	099 CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénagade mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: 25 FEBRERO | 2022 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
David Blanco	Puerta de Oro	
Alvaro Fernandez	Edubar	
Diego Rada Altahona	Edubar	Diego Rada Altahona
Carmen Ibarra Arias	Puerta de Oro	
Aris Jose J/ Linares	Puerta de Oro	
Ivan Lopez Romero	Edubar	
Jhorvis De Jesus	Consorcio JCO Mallorquin	
Melissa Ramirez Ahumada.	Consorcio JCO Mallorquin	
Luis Fernando Caicedo Arroyo	Sec. de Obras Públicas	
Fabian Suarez Herrera.	Interventoria	
Cynthia Villegas Andrade.	Interventoria	Cynthia V.

II. OBJETO DE COMITE

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

1) PLANTEAMIENTO NUEVA ALTERNATIVA: PUERTA DE ORO EXPLICA LA NUEVA ALTERNATIVA DEL DISEÑO DE LA PASARELA DE 6M QUE PERMITIRIA

ufl mallorquin	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 18 Pág 2 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

SEGUIR CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO DE MANTENER LAS PLATAFORMAS LO MAS BAJO POSIBLE Y ADAPTADO A LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN SITIO. PUERTA DE ORO EXPLICA QUE LOS NIVELES DEL PLANO DE MAREAS MAXIMAS Y MINIMAS DE +0,30 Y -0,30 SON LOS NIVELES PROMEDIO DE VARIACION DE LA MAREA EN LA CIENAGA, POR LO QUE LA GEOMEMBRANA SE RECORTA A 75 CM Y SE REALIZO AJUSTE EN LAS RIOSTRAS PARA LLEGAR A UNA COTA MAXIMA DE +2,20. EL CONTRATISTA REVISARA LA NUEVA PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO Y ECONOMICO Y TAMBIEN PRESENTARA OTRAS POSIBLES ALTERNATIVAS TENIENDO EN CUENTA LA COTA MAXIMA ESTABLECIDA POR EDUBAR.

2) BATIMETRIA: EDUBAR SOLICITA REALIZAR BATIMETRIA A TODA LA ZONA DE MUELLE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA VERIFICAR LOS NIVELES REALES DE AGUA Y SEDIMENTO. LA INTERVENTORIA INFORMA QUE SE REALIZARA LA PROXIMA SEMANA.

3) PILOTE J'D': LA INTERVENTORIA INFORMA QUE ESTE PILOTE QUEDO DESALINEADO EN 20cm. Y SE DEBE EXTRAER PARA COLOCARLO EN LA ALINEACION CORRECTA.

4) PILOTE G'E': SE SOLICITA AL CONTRATISTA SUSTENTAR EL CALCULO ESTRUCTURAL QUE JUSTIFIQUE EL CAMBIO DEL DISEÑO ORIGINAL PARA REVISION

5) PARQUEADERO: EDUBAR INFORMA QUE YA SE TIENE TITULO DEL PREDIO Y SE VA A INICIAR EL PROCESO DE DESALOJO. SE ESPERA ENTREGAR EL LOTE EL PROXIMO 4 DE MARZO.

6) AJUSTES DISEÑOS ELECTRICOS: EL CONTRATISTA INFORMA QUE EL PROXIMO LUNES ENTREGARA LOS AJUSTES PARA REVISION DE INTERVENTORIA

7) DESGLOCE: LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA EL DESGLOCE

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 18 Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

DE LOS ITEM GLOBALES DEL PROYECTO PARA REVISION Y APROBACION

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 03 (DIA) 03 (MES) 2022 (AÑO)

ANEXO 7

INDICADORES DE CALIDAD

CONSOLIDADO INDICADORES DE PROCESOS/PROYECTOS

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INDICADOR	META	FRECUENCIA	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	PROMEDIO
Actividades Ejecutadas / Act. Programa	90,00%	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**100,00%**
Presentacion oportuna de informes	90,00%	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**100,00%**
No. Producto no conforme	Max 3	Mensual	0	0	0	0	0	0	**0**
Indice de Quejas	0	Mensual	0	0	0	0	0	0	**0**
Evaluación del Desempeño	>34	Durante el Proyecto							-
Encuesta de Satisfacción	> 12	Durante el Proyecto							-
Eficacia de Acciones Correctivas y de Mejora	80%	Mensual							-

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	MEDICION INDICADOR :	1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	ACTIVIDAD	APLICA SI/NO	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACION
1	Control sobre los documentos contractuales (polizas, contratos, otro si, etc)	SI	X		
2	Revisión y aprobación de las actas de obra	SI	X		
3	Seguimiento al Programa de Inversiones	SI	X		
4	Revisión y aprobación de análisis de precios no previstos	NA			
5	Control del personal asignado por el ejecutor	SI	X		
6	Control estado diario del tiempo	SI	X		
7	Control a equipos y dispositivos de medición	SI	X		
8	Registro fotografico de los avances y eventos diarios de la obra	SI	X		
9	Seguimiento y control al avance de obra (Ejecutado Vs. Programado)	SI	X		
10	Exigencias al contratante de la documentación (Diseños, Planos, etc) que se generen durante el desarrollo del proyecto	SI	X		
11	Seguimiento y control sobre los pagos de aportes parafiscales y seguridad social del contratista	SI	X		
12	Control sobre los metodos constructivos empleados en cada una de las actividades	SI	X		
13	Verificación de medidas y cuantificación de cantidades de obra	SI	X		
14	Control Topografico del proyecto (verificación de trazados y nivelación)	SI	X		
15	Verificación de la calidad de los materiales	SI	X		
16	Reuniones de Comité de Obra	SI	X		
17	Seguimiento a la Matriz de Planificación del Servicio	SI	X		
18	Elaboración Informe Mensual de Interventoria	SI	X		
19	Reuniones de Calidad				
20	Encuesta de Retroalimentación del cliente				
21	Auditorias interna de Calidad				
22	Auditorias Externa				
23	Evaluación de desempeño de personal interventoria				
	TOTAL				

PERIODO		
1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022	17	ACTIVIDADES
No. Actividades que aplican en el periodo	17	
No. Actividades que cumplieron en el periodo	17	
No. Actividades que no cumplieron en el periodo	0	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	
META	90%
	100,00%

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	ACT. EJECUTADAS / ACT. PROGRAMADAS
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022



Resultado del indicador en el periodo:	100,00%
Comparación del resultado con la meta:	90%
Se dio cumplimiento al indicador	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se mantiene	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
No aplica	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
No aplica	

MEDICION INDICADOR: 1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022

PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES INTERVENTORIA Y/O ESTUDIO

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	INFORME	CUMPLIO	FECHA ENTREGADA	FECHA ESPERADA	OBSERVACION
1	Informe Semanal No. 23	SI	7/02/2022	7/02/2022	
2	Informe Semanal No. 24	SI	14/02/2022	14/02/2022	
3	Informe Semanal No. 25	SI	21/02/2022	21/02/2022	
4	Informe Semanal No. 26	SI	28/02/2022	28/02/2022	
5	Informe Mensual No. 6	SI	15/03/2022	15/03/2022	

PERIODO 1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022	
No. Informes presentados en el periodo	5
No. Informes entregados a tiempo	5
No. Informes atrasados	0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	
META	90%
	100,00%

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	PRESENTACION OPORTUNA DE INFORMES
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022



Resultado del indicador en el periodo:	100%
Comparación del resultado con la meta:	90%

Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.

Comparación del resultado con el histórico:

Se presentó cumplimiento en este corte

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022

100%



Resultado del indicador en el periodo:	0
Comparación del resultado con la meta:	0%

Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.

Comparación del resultado con el histórico:

Se presentó cumplimiento en este corte

Clasificar los motivos del no cumplimiento:

NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE QUEJAS
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Febrero – 28 de Febrero de 2022




Resultado del indicador en el período:	0
Comparación del resultado con la meta:	0
Se da cumplimiento sin novedad	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se cumple con el indicador	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
NA	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
NA	

ANEXO 8

GESTION SOCIAL

ACTAS DE REUNION

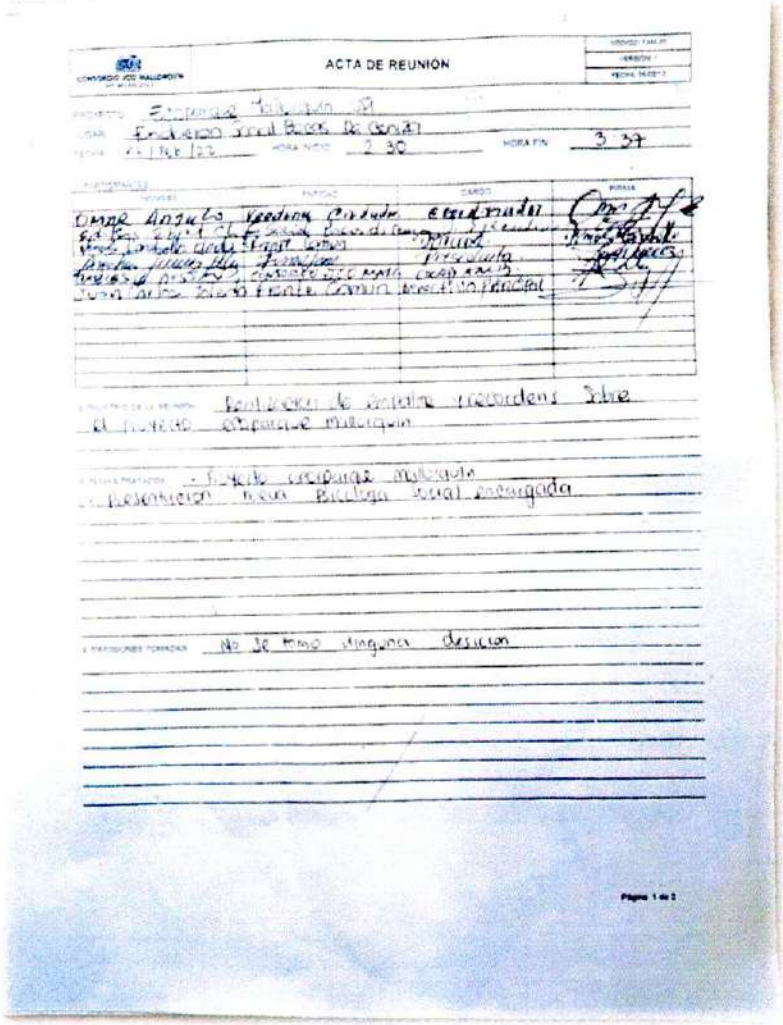

ACTA DE REUNIÓN

Empalme Telefónica
Entorno Social Bocas de Ceniza
FECHA 21/06/22 HORA INICIO 2:30 HORA FIN 3:37

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Omar Angulo	Residente Ciudad	Estructurador
[illegible]	Social	[illegible]
[illegible]	Presidenta	[illegible]
[illegible]	Coordinador	[illegible]
Juan Carlos Salcedo	Frente Comun	Inspección Principal

TEMA DE LA REUNIÓN: Socialización de aspectos relevantes sobre el proyecto empalme Mallorquín

DESARROLLO:
- Inicio de socialización Mallorquín
- Presentación área Psicóloga social encargada

COMPROMISOS TOMADOS: No se toma ninguna decisión

Página 1 de 2

CONSORCIO JCO MALLORQUIN	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: FMA-01 VERSIÓN: 1 FECHA: 16/02/22

7. PROYECTOS PRESENTADOS: La comunidad no Presento ninguna inquietud


8. COMPROMISOS PACTADOS: No se Pacto ningun compromiso

9. OBSERVACIONES: No hay Observaciones

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO DE LOS MISMOS. DADA EN Puerto Colombia A LOS 16 DIAS DEL MES DE Febrero DE 2022.

Página 2 de 2

- El día 23 de febrero de 2022 se realizó reunión para la conformación del comité comunitario sector las flores y se realizo presentacion del proyecto "aprendamos del manglar" el cual contienene dos talleres el primero titulado "importancia del manglar y el segundo "conservacion del manglar"

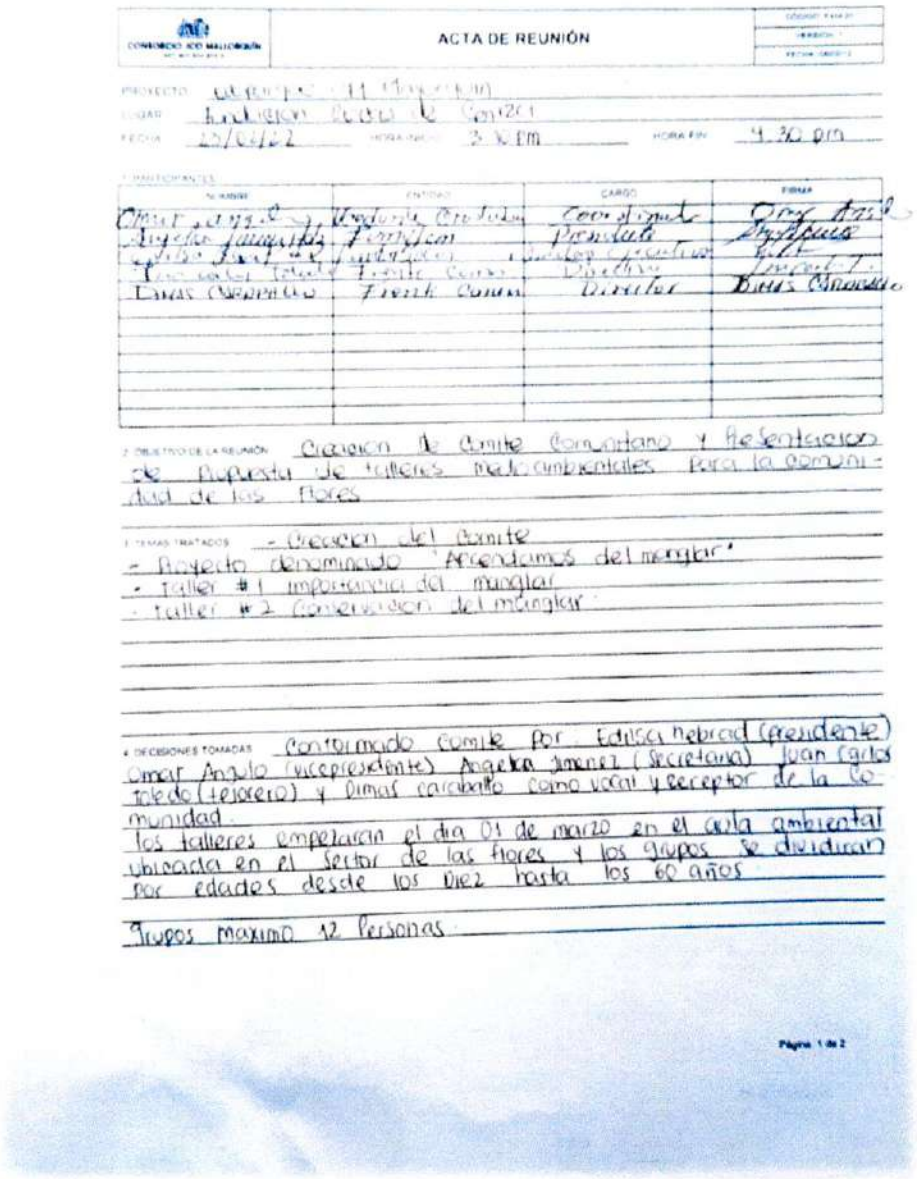

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: Aprendamos del Manglar
LUGAR: Fundacion Verde de Control
FECHA: 23/02/22 HORA INICIO: 3:00 PM HORA FIN: 4:30 pm

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Omar Angulo	Vigilante Particular	Coordinador	
Angelica Jimenez	Particular	Presidente	
Juan Carlos Toledo	Particular	Director Ejecutivo	
Edwis Hernandez	Frente Comun	Director	

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Creacion de Comite Comunitario y Presentacion de Propuesta de talleres Medio ambientales para la Comunidad de las Flores

3. TEMAS TRATADOS:
- Creacion del Comite
- Proyecto denominado "Aprendamos del manglar"
- Taller #1 importancia del manglar
- Taller #2 Conservacion del manglar

4. DECISIONES TOMADAS: Conformado Comite por: Edwis Hernandez (presidente) Omar Angulo (vicepresidente) Angelica Jimenez (Secretaria) Juan Carlos Toledo (tesorero) y Dimas caicedo como vocal y receptor de la Comunidad.
los talleres empezarian el dia 01 de marzo en el aula ambiental ubicada en el sector de las flores y los grupos se dividiran por edades desde los diez hasta los 60 años
Grupos maximo 12 Personas

Página 1 de 2

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: FAM-01 VERSIÓN: 1 FECHA: 04/07/22

5. INQUIETUDES PRESENTADAS: La Comunidad no manifesto inquietudes

6. COMPROMISOS PACTADOS: No se Pactaron Compromisos

7. OBSERVACIONES: No hay observaciones

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE INTERVIENEN EN ELLA, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO DE LOS MISMOS. DADA EN Barranquilla A LOS 29 DIAS DEL MES DE Octubre DE 2022

Página 1 de 1

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES

HOJA 1 DE 1
FECHA 23 02 23

CONTRATO N°

NOMBRE DEL PROYECTO UF1 Equipos Mallorquin

LUGAR DE LA REUNION Fundación Parque de Sendas

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
1	Omar Angulo	Cra 82 # 100-57	3002477209	
2	Juan Carlos Toledo Barrantes	Cra 86 # 100-59	3025721937	
3	Yenis Cantillo Ojeda	CA 84 # 108-94	3040280351	
4	Estefania Arrieta Hernandez	Cra 84 # 108.30	302 4369262	
5	Yaritza Perez Ospino	Cra 85 # 102-83	3152994382	
6	Isabella Montenegro Vasquez	Cra 90 # 124-248	3116426437	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

FIRMA DE CONTRATISTA	INTERVENTORIA	TRAMITE

REGISTRO FOTOGRAFICO

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	16 DE FEBRERO		
UBICACIÓN:	Ciénaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Las Flores
COMENTARIOS:	Presentacion de la nueva profesional social para el proyecto y resocialización del proyectoa lideres del sector		

FOTO No. 2




FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	FEBRERO 23 DE 2022		
UBICACIÓN:	Ciénaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Las Flores
COMENTARIOS:	Conformación formal del comité de participación ciudadana		

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	16 DE FEBRERO		
UBICACIÓN:	Ciénaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Las Flores
COMENTARIOS:	Presentacion de la nueva profesional social para el proyecto y resocialización del proyectoa lideres del sector		

FOTO No. 4

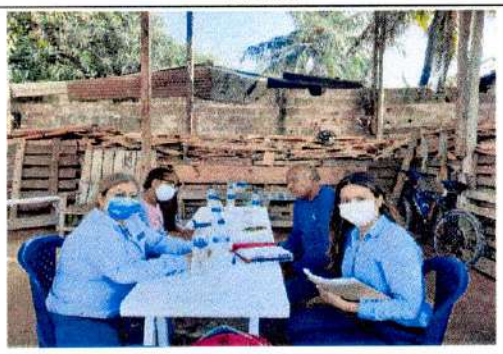

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	23 DE FEBRERO		
UBICACIÓN:	Ciénaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Las Flores
COMENTARIOS:	Conformación formal del comité de participación ciudadana		

ANEXO 9

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 10

BITACORA

ANEXO 11

INFORME Y ASPECTOS SST

uf1 mallorquín	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

FECHA O PERIODO:	FEBRERO DE 2022
PROYECTO:	SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	SST
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE
ASUNTO:	INFORME No. 6

DESARROLLO DEL TEMA

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 28 de febrero del 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exija. De igual manera estos anexos soportan la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. INDUCCIÓN RE-INDUCCIÓN.

Para el periodo reportado el Contratista manifiesto la realización de las inducciones, se presentó registros de asistencia, pero no se evidenció la evaluación de la inducción.

Las inducciones deben ser encaminadas a conocer los temas relevantes del sistema de gesto de seguridad y salud desarrollado para el proyecto, dentro de los cuales se debe hace referencia a: Políticas SST, Políticas de alcohol y

Drogas, Objetivos y Metas, Responsabilidades en el sistema, Reglamento Interno, COPASST, Emergencias, Brigada, etc. Dentro de los temas de la inducción se debe incluir lo referente al protocolo de bioseguridad y las medidas para la prevención de COVID-19 y sus variantes.

2. EXÁMENES OCUPACIONALES

Para el desarrollo del programa de medicina preventiva y del trabajo el contratista de obra realiza al personal que ingresa a laborar los respectivos exámenes ocupacionales de ingreso dando así cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
El objetivo de este programa es conocer el estado de salud físico y mental de los potenciales y actuales empleados, permitiendo al empleador contar con una adecuada organización del recurso humano y un ambiente laboral sano, para poder desempeñar las actividades que le sean asignadas, los exámenes ocupaciones se deben realizar de acuerdo a un profesiograma el cual es un documento técnico - administrativo que organiza la interrelación, interactuación e interdependencia de un puesto de trabajo desde los puntos de vista: de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los trabajadores.

Dentro de los beneficios que tiene la implementación de un profesiograma es en cuanto a la contratación de personas que ocuparan puestos vacantes:

- Permite la inducción y contratación adecuada.
- Clasifica los puestos y los ubica de acuerdo a una estructura técnico – administrativa.
- Permite la actualización de manera periódica de la GTH.
- Permite que las personas contratadas y no contratadas no se vean perjudicadas.
- Sirve como herramienta para obtener los índices de SST, de manera especial los índices proactivos.
- Cumple con la normativa legal.

Durante el periodo se realizaron exámenes ocupacionales, los cuales se describen en la siguiente tabla:

IDENTIFICACION	NOMBRES COMPETOS	CARGO
7595499	CARLOS MANUEL PERTUZ CABARCAS	OPERADOR DE MAQUINARIA
1098648986	DIANA MARCELA DAZA BECERRA	SISO
1129572070	EDER ENRIQUE AGAMEZ SALAS	OPERADOR
72268894	ELKIN IVAN DE LA CRUZ MARQUEZ	OPERADOR
1005680047	ISABELLA STEFANIA MONTERROZA VASQUEZ	TRABAJADORA SOCIAL

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se presentaron los siguientes equipos durante el periodo

EQUIPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OPERADOR
CABRIA 1300 KG – En zona seca	Artefacto utilizado para levantar pesos para hincado de pilotes	WILFRIDO JOSE PEREZ DIAZ
CABRIA 2000 KG – En zona húmeda	Artefacto utilizado para levantar pesos para hincado de pilotes	ALBERTO ALFONSO LLERENA OSPINO
RETROCARGADOR NEW HOLLAND B95B	Excavación y movimiento de tierra	ELKIN
TELEHANDLER CAT TH103	Levantamiento de carga	CARLOS MANUEL PERTUZ CABARCAS

4. VEHÍCULOS

El contratista cuenta con un vehículo para la logística y apoyo del proyecto.

5. ACTIVIDADES DE INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS

Capacitaciones y Charlas

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores en las actividades de dragado, teniendo como resultado, trabajadores sensibilizados, dispuestos a

aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y enfermedades de tipo laboral inherentes a su actividad. Se presentaron evidencias en la realización de actividades de sensibilización y prevención referente a temas de SST.

FECHA	TEMA
01-02-2022	Actividad de alto riesgo
04-02-2022	Política de no alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo
05-02-2022	Brigadas
09-02-2022	Peligros y riesgo
11-02-2022	Peligros en actividades de izaje
01-02-2022	Políticas – Inducción SST
12-02-2022	Política de acoso laboral
19-02-2022	Política de gestión SST
14-02-2022	Inducción SST

6. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

A la fecha se evidencio personal laborando en actividades los cuales han contado con el suministro de los EPP y dotación requerida para realizar de forma normal y segura sus actividades en el proyecto, el Contratista ha mostrado la entrega de los mismos se evidenciaron en los respectivos registros presentado en el informe mensual.

7. INSPECCIONES

Durante la ejecución de las actividades del proyecto se realizó inspección a los equipos que se tienen en los frentes de trabajo. Se evidencio extintores, camilla, botiquín, se ha solicitado al Contratista realizar inspecciones pre-operacionales de todos los equipos que se tengan en los frentes de trabajo para validar su estado operativo y sus próximos mantenimientos.

8. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO

De igual manera la Interventoría realizó la supervisión del personal y sus actividades en el periodo el Contratista ha completado las afiliaciones del nuevo personal y planillas de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

9. IDENTIFACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

El Contratista cuenta con un procedimiento y la matriz para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos los cuales se presentan por las actividades desarrollas en el proyecto, por consiguiente, es necesario aplicar los controles necesarios para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

10. ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante el periodo ejecutado se presentó un accidente laboral, El trabajador Carlos Puello Carmona identificado con número de cédula 73.205.797 de Cartagena con 38 años de edad, le ocurrió un accidente el día 09 de febrero de 2022, el trabajador se encontraba transportando un pedazo de tubo de 1 metro en compañía de otro trabajador, al momento del desplazamiento en el sitio se encontraba una varilla enterrada con la punta afuera tapada con pasto ocasionando una perforación en el pie izquierdo cabe resaltar que el trabajado tenía puestas sus botas de seguridad.

Se reporte el accidente y se llevó inmediatamente al trabajador al Hospital para su respectiva atención médica, le generaron tres (3) días de incapacidad.

El Contratista no ha entregado la investigación, la lección aprendida las versiones del implicado y testigos, el plan de acción para darle cierre al evento ocurrido y para evitar su recurrencia.

11. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Durante la ejecución de las actividades se pueden presentar situaciones de emergencias a las cuales se les debe prestar el apoyo con el suministro de elementos para su atención oportuna, el Contratista describe sus planes operativos normalizados en los siguientes:

- ✓ Procedimiento en caso de emergencia
- ✓ Procedimiento en caso de huracanes y tornados
- ✓ Procedimiento en caso de vendavales
- ✓ Procedimiento en caso de atentado terrorista
- ✓ Procedimiento en caso de colapso estructural
- ✓ Procedimiento en caso mordedura de incendio
- ✓ Procedimiento en caso de evacuación
- ✓ Procedimiento en caso de lesiones y primeros auxilios
- ✓ Procedimiento en caso de accidente de tránsito y vehículos
- ✓ Procedimiento en caso de sismo

Durante las actividades desarrolladas en el periodo se le dio aprobación al Plan de Gestión del Riesgo por medio del comunicado CINP – 504 – 051 – 0362, del 31 de enero de 2022, de parte de la Interventoría.

12. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

De acuerdo al virus que se ha presentado a nivel mundial el Contratista estable unas medidas para la prevención y propagación del COVID-19 las cuales son:

- Entrega de Tapabocas al personal
- Campañas de limpieza en los equipos
- Socialización de protocolos de actuación frente al COVID 19
- Adecuación de los puntos de lavados de manos
- Manejo de los residuos

Durante el tiempo de ejecución de actividades se ha evidenciado la adecuación de los puntos de lavado de manos, se ha evidenciado la instalación de infografías referentes a la prevención de COVID-19.

Se ha evidenciado la medición de la temperatura al personal vinculado al proyecto

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)



Ubicación de lava manos portátiles en zona de campamento donde se llevan las actividades de la ciénaga, para darle cumplimiento al protocolo de bioseguridad



Ubicación de extintor de emergencias para la atención de un fuego incipiente, instalado en el campamento.

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)



Se evidenció kit para atención de emergencias ambientales



Instalación de camilla para atención de primeros auxilios
