

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	OBSERVACIONES	Cant. Ejec.	% Ejec. (Inversión)	% P. (Inversión)	Ejec. Inversion	CPTP
1	1	IDU - 1847- 2021 - CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO 4 - CLB - 20220113	665,5 días	vie 14/01/22	mar 13/02/24	$ 51.448.129.375		0	0,33%	0,32%	$ 164.485.270	$ 164.812.687
2	1.1	ACTA DE INICIO	0 días	vie 14/01/22	vie 14/01/22	$ 0		1	0%	0%	$ 0	$ 0
3	1.2	FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	128,5 días	vie 14/01/22	lun 13/06/22	$ 391.192.915		0	42,05%	42,13%	$ 164.485.270	$ 164.812.687
4	1.2.1	INFORME TECNICO	128,5 días	vie 14/01/22	lun 13/06/22	$ 286.271.915		0	29,88%	29,96%	$ 85.531.340	$ 85.749.686
5	1.2.1.1	HOJAS DE VIDA FASE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES	14 días	vie 14/01/22	lun 31/01/22	$ 2.187.000		0	99,28%	100%	$ 2.171.350	$ 2.187.000
6	1.2.1.1.	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO MINIMO	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22	$ 622.000	Comunicación CSC 004-2022	1	100%	100%	$ 622.000	$ 622.000
7	1.2.1.1.	HOJAS DE VIDA RECURSO HUMANO TOTAL ETAPA GESTIONES PRELIMINARES	14 días	vie 14/01/22	lun 31/01/22	$ 1.565.000	CS 005-2022; CSC 008-2022; CSC 013-2022; CSC 015-2022;CSC 020-2022;CSC 031-2022; CSC [illegible]	0,99	99%	100%	$ 1.549.350	$ 1.565.000
8	1.2.1.2	DISGLOSE DEL AIU OFERTADO	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 010-2022	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
9	1.2.1.3	ANTICIPO	13 días	vie 14/01/22	lun 21/02/22	$ 3.130.000		0	100%	100%	$ 3.130.001	$ 3.130.000
10	1.2.1.3.	PLAN DETALLADO DE INVERSION DEL ANTICIPO	3 días	vie 14/01/22	mar 18/01/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 005-2022	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
11	1.2.1.3.	SUSCRIBIRÁ CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO	30 días	mar 18/01/22	lun 21/02/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 072-2022, CSC 085-202, INTERVENTORIA REMITE CON EL COMUNICADO [illegible]	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
12	1.2.1.4	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU	43 días	vie 14/01/22	jue 3/03/22	$ 3.130.000		0	99,84%	100%	$ 3.125.000	$ 3.130.000
13	1.2.1.4.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRECIOS UNITARIOS VERSION 0	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$ 2.830.000	Comunicación CSC 005-2022	1	100%	100%	$ 2.830.000	$ 2.830.000
14	1.2.1.4.	REVISION DEL PRECIOS UNITARIOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	jue 17/02/22	mié 23/02/22	$ 100.000	Comunicación ZINDUSTRIAL_04-062-22 Comunicación ZINDUSTRIAL_04-103-22	1	100%	100%	$ 100.000	$ 100.000
15	1.2.1.4.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	mié 23/02/22	sáb 26/02/22	$ 100.000	Comunicación CSC 050-2022; Comunicación CSC 065-2022	1	100%	100%	$ 100.000	$ 100.000
16	1.2.1.4.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS VERSION FINAL	5 días	sáb 26/02/22	jue 3/03/22	$ 100.000	Comunicación ZINDUSTRIAL_04-184-22, APROBACION PENDIENTE POR PARTE DEL IDU	0,95	95%	100%	$ 95.000	$ 100.000
17	1.2.1.5	HOJAS DE VIDA PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCION	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$ 1.565.000	CS 005-2022; CSC 008-2022; CSC 013-2022 ; CSC 015-2022;CSC	0,97	97%	100%	$ 1.518.050	$ 1.565.000
18	1.2.1.6	ADQUIRIR INFORMACION DEL CONTRATO	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22	$ 3.130.000		1	100%	100%	$ 3.130.000	$ 3.130.000
19	1.2.1.7	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO.	15 días	vie 14/01/22	mar 1/02/22	$ 939.000	Comunicación CSC 014-2022	1	100%	100%	$ 939.000	$ 939.000
20	1.2.1.8	REVISION DOCUMENTOS CONTRATOS CONSULTORIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS	124,75 días	mar 18/01/22	sáb 11/06/22	$ 68.850.000		0	50%	50%	$ 34.425.000	$ 34.425.000
21	1.2.1.8.	CARTA GENERADA POR EL IDU DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	0 días	mar 18/01/22	mar 18/01/22	$ 0	IDTP 20222250022213 STISV 20223300087971 ENTREGA CARTA 21 DE ENERO	1	0%	0%	$ 0	$ 0
22	1.2.1.8.	REVISAR Y ESTUDIAR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE ACUERDO A LA CLAUSULA 6 A PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, E IDENTIFICACION DE POSIBLES ERRORES EN LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS	58 días	mar 5/04/22	sáb 11/06/22	$ 68.850.000	SE LE A DADO RESPUESTA A LAS ENTREGAS PARCIALES DE LA ENTIDAD, CON LOS COMUNICADOS: CSC 018-2022, CSC 029-2022, CSC 066-2022, CSC 147-2022 LA ENTIDAD ENTREGA NUEVA INFORMACION PARCIAL EL DIA 18 DE MARZO, PENDIENTE APROBACION POR PARTE DE LAS EPS.	0,5	50%	50%	$ 34.425.000	$ 34.425.000
23	1.2.1.9	VISITA A OBRA	5 días	vie 14/01/22	jue 20/01/22	$ 3.130.000		1	100%	100%	$ 3.130.000	$ 3.130.000
24	1.2.1.10	TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	5 días	jue 20/01/22	mié 26/01/22	$ 3.130.000		0	100%	100%	$ 3.130.000	$ 3.130.000
25	1.2.1.10	SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL IDU DEL LISTADO DE DELEGADOS DE LAS ESP RESPUESTA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	0 días	jue 20/01/22	jue 20/01/22	$ 0		1	0%	0%	$ 0	$ 0
26	1.2.1.10	INFORMAR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	5 días	jue 20/01/22	mié 26/01/22	$ 3.130.000		1	100%	100%	$ 3.130.000	$ 3.130.000
27	1.2.1.11	ELABORACION Y APROBACION PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS	34 días	vie 4/02/22	lun 14/03/22	$ 6.259.000		0	99,36%	100%	$ 6.219.000	$ 6.259.000
28	1.2.1.11.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS VERSION 0	22 días	vie 4/02/22	mar 1/03/22	$ 5.959.000	Comunicación CSC 026-2022// 10 DE FEBRERO	1	100%	100%	$ 5.959.000	$ 5.959.000
29	1.2.1.11.	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	mar 1/03/22	lun 7/03/22	$ 100.000	Comunicación USTRIAL_04-069-22;Comunic ZINDUSTRIAL_04-129-22	1	100%	100%	$ 100.000	$ 100.000
30	1.2.1.11.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	lun 7/03/22	mié 9/03/22	$ 100.000	Comunicación CSC (071-2022;Comunicación CSC 121-2022 (28/03/22); Comunicación CSC 126-2022 (30/03/22)	0,8	80%	100%	$ 80.000	$ 100.000
31	1.2.1.11.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	5 días	mié 9/03/22	lun 14/03/22	$ 100.000		0,8	80%	100%	$ 80.000	$ 100.000
32	1.2.1.12	ELABORACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE OBRA	31 días	sáb 7/05/22	lun 13/06/22	$ 23.977.000		0	6,16%	6,13%	$ 1.478.160	$ 1.469.761
33	1.2.1.12.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE PRESUPUESTO DE OBRA VERSION 0	22 días	sáb 7/05/22	jue 2/06/22	$ 18.477.000	PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,08	8%	7,95%	$ 1.478.160	$ 1.469.761
34	1.2.1.12.	REVISION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	4 días	jue 2/06/22	mar 7/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
35	1.2.1.12.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	mar 7/06/22	jue 9/06/22	$ 2.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
36	1.2.1.12.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO FINAL	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
37	1.2.1.13	ELABORACION Y APROBACION PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA	20 días	jue 19/05/22	lun 13/06/22	$ 9.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0

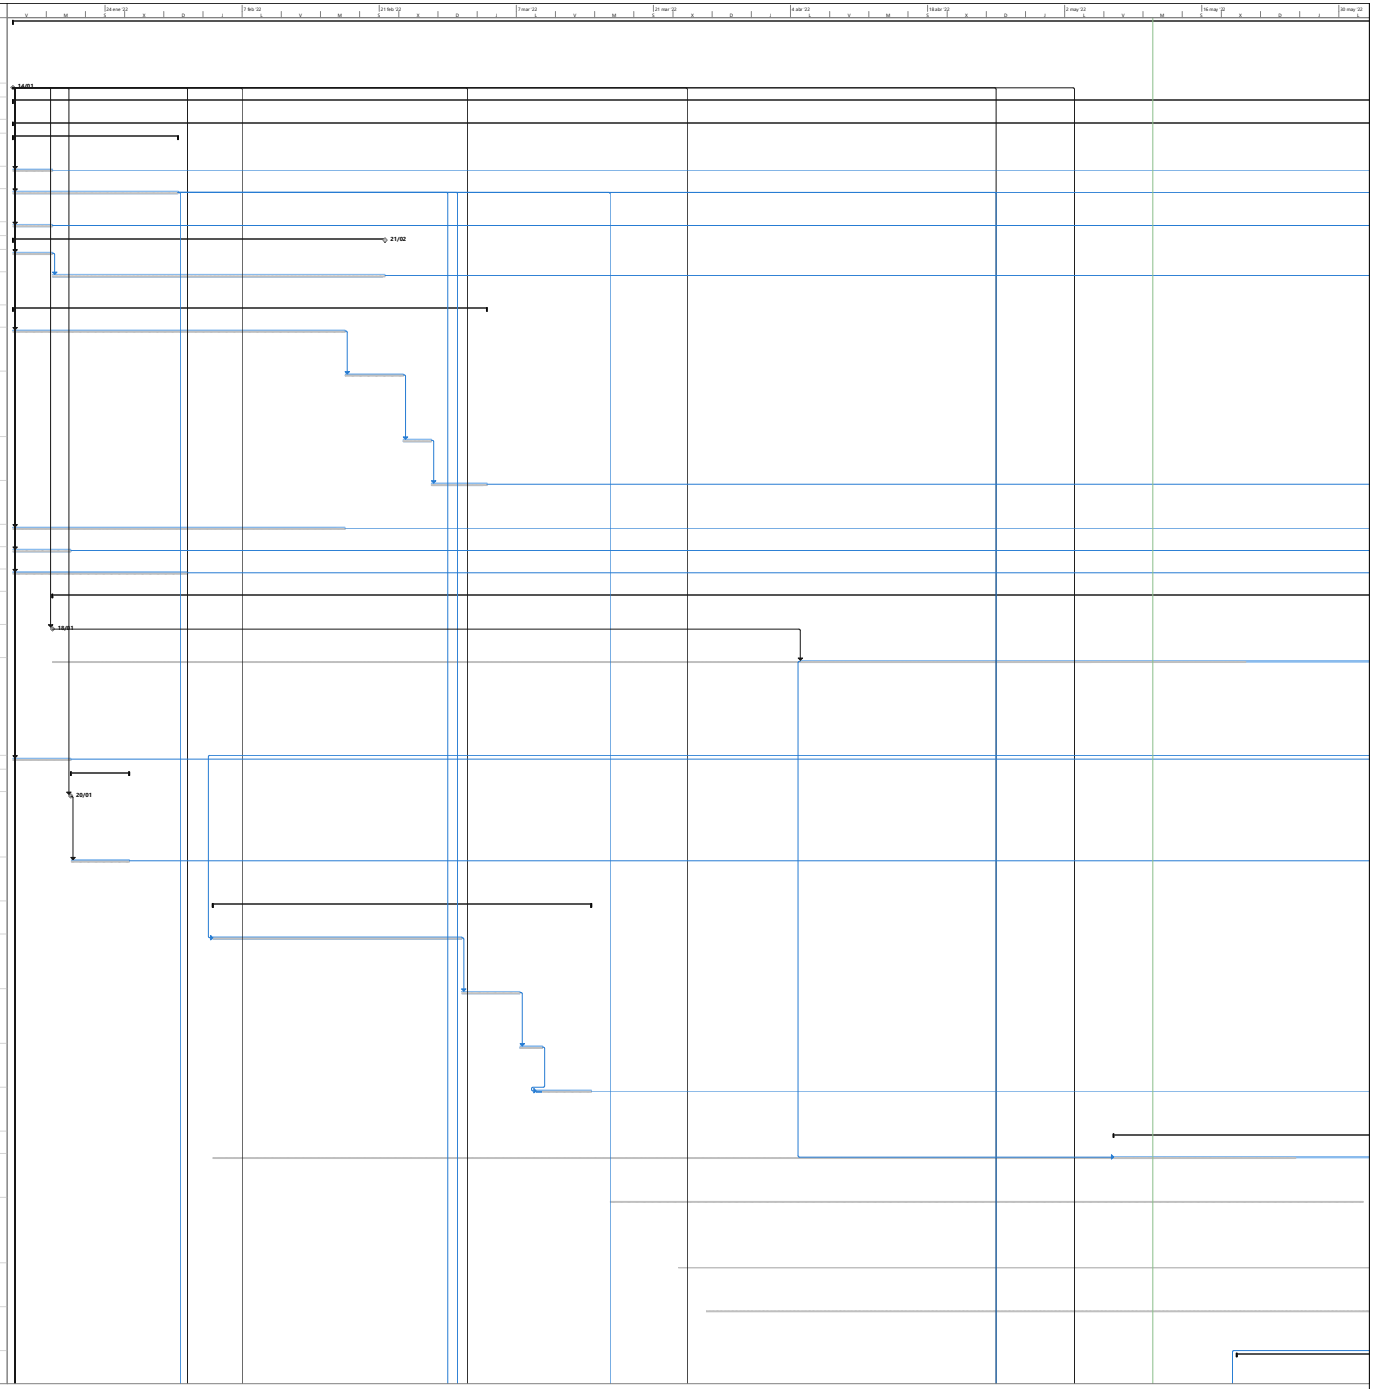


Proyecto: IDU-1847-2021-CON
Fecha: mié 11/05/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual · Tarea LBI · Hitos LBI

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	OBSERVACIONES	Cant. Ejec	% Ejec. (Inversión)	% P. (Inversión)	Ejec. Inversion	CPTP
38	1.2.1.1.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA VERSION 0	10 días	jue 19/05/22	mié 1/06/22	$ 4.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
39	1.2.1.1.	REVISION DEL PDT POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	4 días	mié 1/06/22	lun 6/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
40	1.2.1.1.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	lun 6/06/22	mié 8/06/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
41	1.2.1.1.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PDT FINAL	4 días	mié 8/06/22	lun 13/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
42	1.2.1.1.	**ELABORACION Y APROBACION PAC**	**10 días**	**mié 1/06/22**	**lun 13/06/22**	**$ 7.000.000**	ESTA LINEA HACE REFERENCIA AL PAC DE OBRA QUE DEBE	0	0%	0%	$ 0	$ 0
43	1.2.1.1.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PAC VERSION 0	3 días	mié 1/06/22	sáb 4/06/22	$ 2.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
44	1.2.1.1.	REVISION DEL PAC POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	3 días	sáb 4/06/22	mié 8/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
45	1.2.1.1.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
46	1.2.1.1.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PAC FINAL	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	$ 1.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
47	1.2.1.1.	**ELABORACION Y APROBACION INFORME FINAL ETAPA**	**36 días**	**mar 3/05/22**	**lun 13/06/22**	**$ 148.779.915**		**0**	**14,5%**	**14,59%**	**$ 21.570.780**	**$ 21.709.722**
48	1.2.1.1.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL)	27 días	mar 3/05/22	jue 2/06/22	$ 93.786.000	PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Comunicación CSC 029-2022;Comunicación CSC	0,23	23%	23,15%	$ 21.570.780	$ 21.709.722
49	1.2.1.1.	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	4 días	jue 2/06/22	mar 7/06/22	$ 16.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
50	1.2.1.1.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	2 días	mar 7/06/22	jue 9/06/22	$ 21.993.915		0	0%	0%	$ 0	$ 0
51	1.2.1.1.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22	$ 16.500.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
52	1.2.1.16	FIN COMPONENTE TECNICO	0 días	lun 13/06/22	lun 13/06/22	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0
53	1.2.2	**COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAMITE - PMT**	**124 días**	**vie 14/01/22**	**mié 8/06/22**	**$ 19.404.000**		**0**	**78,98%**	**78,98%**	**$ 15.319.000**	**$ 15.324.313**
54	1.2.2.1.	ASIGNACION DEL DELEGADO POR PARTE DE LA SDM	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22	$ 100.000	RESPUESTA IDU SDM, SUJETO A PRESENTACION DEL PRIMER PMT	0,95	95%	100%	$ 95.000	$ 100.000
55	1.2.2.2	**PRESENTACION Y APROBACION DEL PMT**	**91 días**	**mié 26/01/22**	**mié 11/05/22**	**$ 15.204.000**		**0**	**99,93%**	**99,94%**	**$ 15.194.000**	**$ 15.194.625**
56	1.2.2.2.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA PMT GENERAL (VERSION INICIAL)	40 días	mié 26/01/22	vie 11/03/22	$ 12.262.000	Comunicación CSC 048-2022; Comunicación ZINDUSTRIAL_04-102-22; Comunicación CSC 067-2022	1	100%	100%	$ 12.262.000	$ 12.262.000
57	1.2.2.2.	REVISION DEL PMT ESPECIFICO TRAMOS INICIALES, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	27 días	vie 11/03/22	mar 12/04/22	$ 100.000	ZINDUSTRIAL_04-102-22; CSC 067-2022 ; CSC 090-2022; CSC 103-2022 (23/03/22) Y CSC 115-2022 (25/03/22). ZINDUSTRIAL_04-182-22 (28/03/22)_ CSC 127-2022 (30/03/22) PMT ESPECIFICOS, CSC 151-2022 (11/04/22) PMT TIPICO (NOTIFICAT	1	100%	100%	$ 100.000	$ 100.000
58	1.2.2.2.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	5 días	mar 12/04/22	mié 20/04/22	$ 2.742.000		1	100%	100%	$ 2.742.000	$ 2.742.000
59	1.2.2.2.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	24 días	mar 12/04/22	mié 11/05/22	$ 100.000		0,9	90%	90,62%	$ 90.000	$ 90.625
60	1.2.2.3	RADICACION, REVISION Y APROBACION POR POR PARTE DE LA SDM DE LOS PMTS APROBADO POR INTERVENTORIA	16 días	mié 4/05/22	sáb 21/05/22	$ 100.000		0,3	30%	29,69%	$ 30.000	$ 29.688
61	1.2.2.4	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO (VERSION CORREGIDA)	7 días	sáb 21/05/22	mar 31/05/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
62	1.2.2.5	APROBACION DE PMT ESPECIFICO TRAMOS PRIORIZADOS, PARA INICIO DE FASE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA SDM	7 días	mar 31/05/22	mié 8/06/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
63	1.2.2.6	FIN COMPONENTE PMT	0 días	mié 8/06/22	mié 8/06/22	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0
64	1.2.3	**COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD**	**127,63 días**	**vie 14/01/22**	**sáb 11/06/22**	**$ 52.700.000**		**0**	**84,14%**	**84,21%**	**$ 44.342.030**	**$ 44.377.030**
65	1.2.3.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22	$ 626.000	Comunicación CSC 016-2022; Comunicación CSC 062-2022 REVISION POR PARTE INTERVENTORIA	0,95	95%	100%	$ 594.700	$ 626.000
66	1.2.3.2	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	123 días	vie 14/01/22	mar 7/06/22	$ 2.347.000	PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE RECIBE EL DIA 22 DE MARZO ACTUALIZACION DE LOS PRODUCTOS AMBIENTALES, VIA CORREO ELECTRONICO, PENDIENTE COMUNICADO	0,8	80%	80,28%	$ 1.877.600	$ 1.884.279
67	1.2.3.3	AJUSTAR Y OBTENER LA APROBACION DEL INTERVENTOR E IMPLEMENTAR LOS CAPITULOS O ANEXOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES, GUIAS PLANES Y PROCEDIMIENTOS DEL IDU	12 días	mar 1/02/22	lun 14/02/22	$ 3.130.000	Comunicación CSC 020-2022; Comunicación ZINDUSTRIAL_-067-22	1	100%	100%	$ 3.130.000	$ 3.130.000
68	1.2.3.4	VERIFICARÁ EL INVENTARIO INICIAL DEL ARBOLADO Y AVIFAUNA DE ACUERDO CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA SDA, TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS POSIBLES TRATAMIENTOS	75 días	lun 28/02/22	mié 25/05/22	$ 1.565.000	LA ENTIDAD NO HA ENTREGADO INFORMACION PARA ADELANTAR LAS CORRESPONDIENTES GESTIONES, SE RECIBE EL DIA 22 DE MARZO UNA ACTUALIZACION DE LOS PRODUCTOS AMBIENTALES VIA CORREO ELECTRONICO, SE ENVIA Comunicación CSC 103-2022; Solicitud de	0,8	80%	80,33%	$ 1.252.000	$ 1.257.217
69	1.2.3.5	INVENTARIO Y BALANCES DE ZONAS VERDES	54 días	mié 16/03/22	jue 19/05/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 123-2022 (26/03/22), Comunicación ZINDUSTRIAL_-067-22_	0,85	85%	82,87%	$ 1.330.250	$ 1.296.921
70	1.2.3.6	REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	94 días	lun 31/01/22	jue 19/05/22	$ 939.000	EL DIA 16/02/2022 EL IDU MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, APRUEBA EL	0,9	90%	90,16%	$ 845.100	$ 846.588

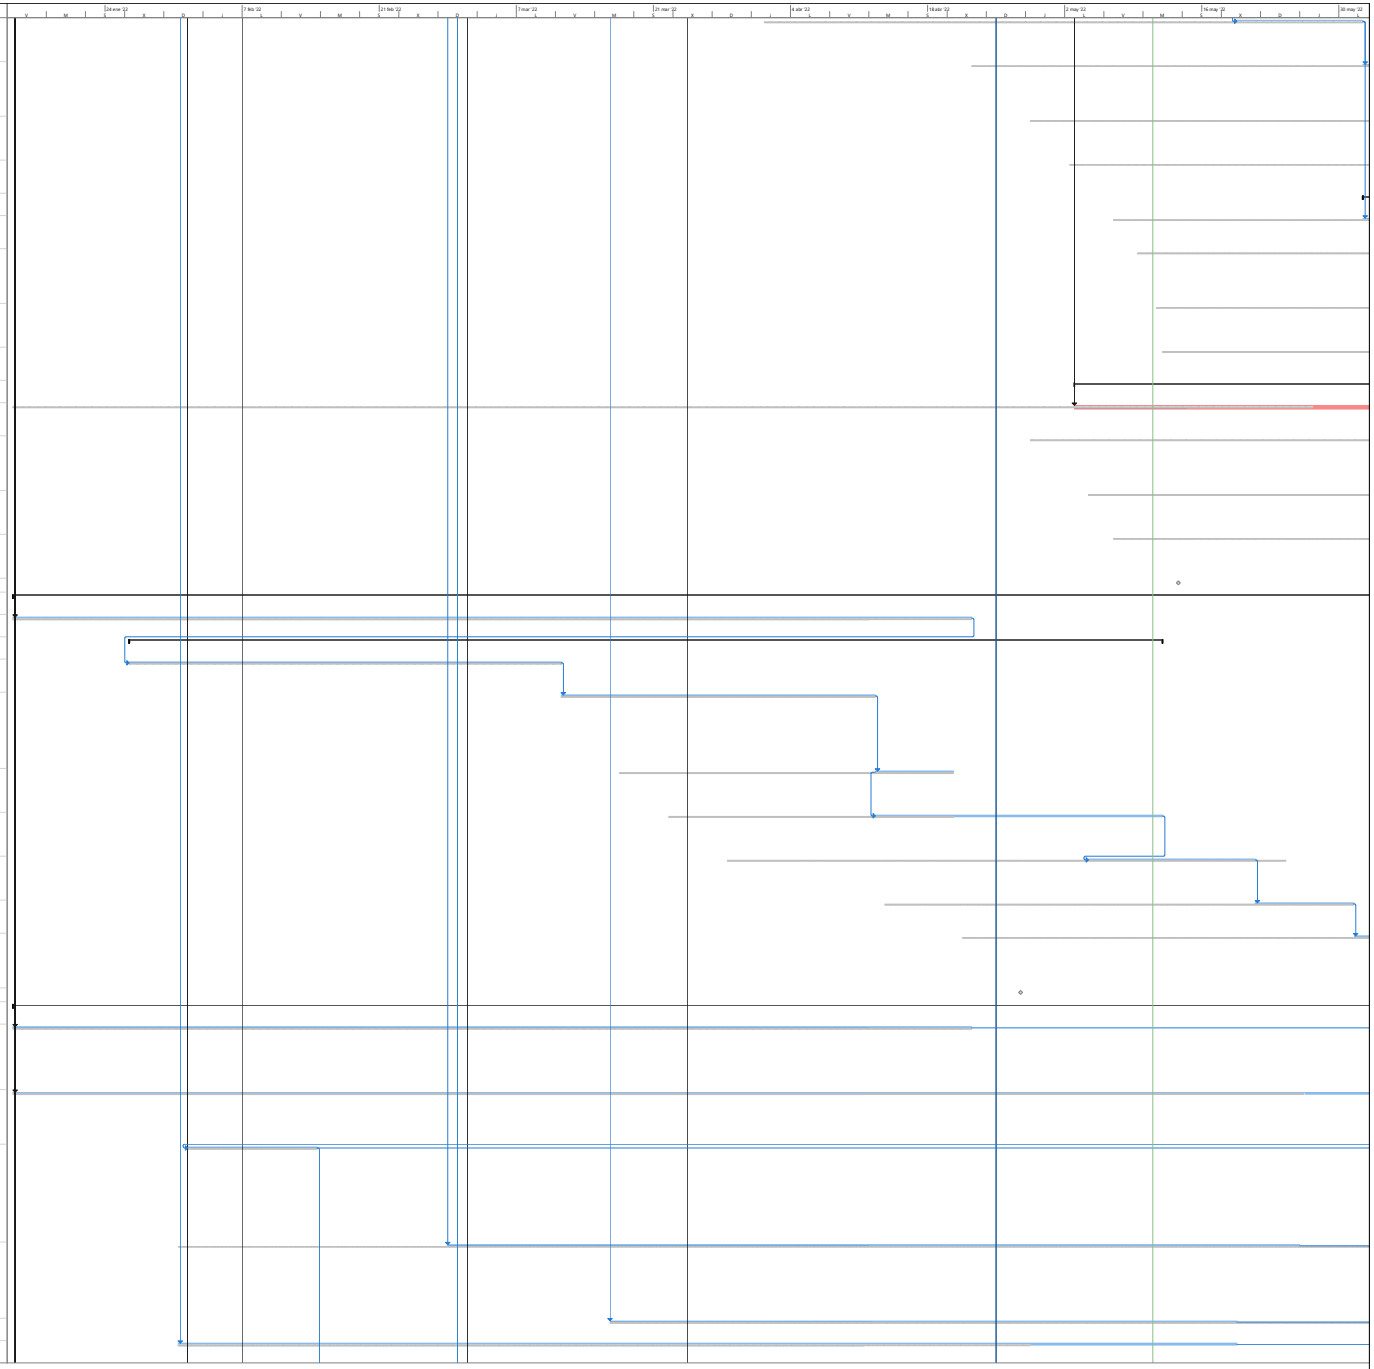


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	OBSERVACIONES	Cant. Ejec	% Ejec. (Inversión)	% P. (Inversión)	Ejec. Inversión	CPTP
71	1.2.3.7	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	88 días	mar 1/03/22	sáb 11/06/22	$ 939.000	Comunicación 2INDUSTRIAL_-235-22	0,67	67%	67,19%	$ 629.130	$ 630.891
72	1.2.3.8	VERIFICARÁ QUE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDAN CON LO REQUERIDO POR EL MISMO, EN CASO DE SER NECESARIO, TRAMITARÁ LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O TRÁMITES	39 días	lun 25/04/22	mié 8/06/22	$ 939.000	LA ENTIDAD NO HA ENTREGADO INFORMACION PARA ADELANTAR LAS CORRESPONDIENTES GESTIONES, SE RECIBE EL DIA 22 DE MARZO UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AMBIENTALES VIA CORREO ELECTRONICO; Comunicación CSC 136-2022 (01/04/22) PERMISO ALCALDIA LOCAL TRABAJOS	0,35	35%	34,94%	$ 328.650	$ 328.048
73	**1.2.3.9**	**ELABORARÁ EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MAO (MANEJO AMBIENTAL EN OBRA).**	**100 días**	**lun 14/02/22**	**vie 10/06/22**	**$ 38.650.000**		**0**	**88,89%**	**88,94%**	**$ 34.354.600**	**$ 34.377.076**
74	1.2.3.9.	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA MAO GENERAL (VERSION INICIAL)	30 días	lun 14/02/22	sáb 19/03/22	$ 33.073.000	Comunicación CSC 088-2022, REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA	1	100%	100%	$ 33.073.000	$ 33.073.000
75	1.2.3.9.	REVISION DEL MAO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	sáb 19/03/22	sáb 26/03/22	$ 100.000	Comunicación 2INDUSTRIAL_-235-22 (18/04/2022)	1	100%	100%	$ 100.000	$ 100.000
76	1.2.3.9.	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	23 días	mar 19/04/22	vie 13/05/22	$ 1.477.000		0,8	80%	81,52%	$ 1.181.600	$ 1.204.076
77	1.2.3.9.	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	10 días	mar 10/05/22	vie 20/05/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
78	1.2.3.9.	REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL IDU	18 días	vie 20/05/22	vie 10/06/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
79	1.2.3.10	ACTIVIDADES TRATAMIENTOS SALVICULTURALES FRENTES INICIALES	12 días	vie 27/05/22	vie 10/06/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
80	1.2.3.11	FIN COMPONENTE AMBIENTAL-SST-BIOSEGURIDAD	0 días	sáb 11/06/22	sáb 11/06/22	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0
81	**1.2.4**	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**125,13 días**	**vie 14/01/22**	**jue 9/06/22**	**$ 26.557.000**		**0**	**56,12%**	**56,30%**	**$ 14.910.901**	**$ 14.964.975**
82	1.2.4.1	ELABORAR Y PRESENTAR LOS DOCUMENTOS METODOLOGICOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL COMPONENTE SOCIAL	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$ 1.565.000	Comunicación 2INDUSTRIAL_04-047-22	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
83	1.2.4.2	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	84 días	vie 14/01/22	vie 22/04/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 076-2022;Comunicación 2INDUSTRIAL_04-136-22, EN REVISION POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
84	1.2.4.3	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DISARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL PROYECTO	89 días	vie 14/01/22	jue 28/04/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 077-2022, Comunicación 2INDUSTRIAL_04-140-22; Comunicación CSC 083-2022, EN REVISION POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
85	1.2.4.4	REALIZAR LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL Y PLAN DE MANEJO DE LOS MISMOS	61 días	mié 2/03/22	jue 12/05/22	$ 1.565.000	PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD, PENDIENTE INFORMACION	0,95	95%	95,08%	$ 1.486.750	$ 1.488.033
86	1.2.4.5	INVENTARIO DE PREDIOS, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS	89 días	vie 14/01/22	jue 28/04/22	$ 1.565.000	Comunicación CSC 083-2022, Comunicación CSC 078-2022; Comunicación 2INDUSTRIAL_04-142-22; Comunicación CSC 094-2022., EN REVISION POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	100%	100%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
87	1.2.4.6	ELABORARÁ LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS FRENTES INICIALES	41 días	mar 19/04/22	sáb 4/06/22	$ 1.565.000	SE INICIA ACTIVIDAD EL DIA 04/04/22, ACTAS DE LA UAE 111, 83 UNIDADES APROXIMADAMENTE, ESTA MINUTADA SE HACE EN BASE	0,45	45%	45,73%	$ 704.250	$ 715.701
88	1.2.4.7	INSTALARÁ EL CAMPAMENTO Y PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PUNTO IDU.	30 días	vie 14/01/22	jue 17/02/22	$ 939.000		1	100%	100%	$ 939.000	$ 939.000
89	1.2.4.8	REALIZARÁ LAS SOCIALIZACIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS SEGÚN EL APÉNDICE H.	93 días	mar 1/02/22	jue 19/05/22	$ 626.000	CSC 061-2022 Y CSC 005-2022 ALCALDIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EL VIERNES 18 SE REALIZO VISITA CON EL LIDER DE LOS	0,9	90%	90,05%	$ 563.400	$ 563.737
90	1.2.4.9	DIRECTORIO DE ACTORES	21 días	jue 24/03/22	mar 19/04/22	$ 313.000	6n 2INDUSTRIAL_04-139-22,	1	100%	100%	$ 313.000	$ 313.000
91	**1.2.4.11**	**ELABORACION Y APROBACION INFORME DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**	**40 días**	**lun 25/04/22**	**jue 9/06/22**	**$ 15.289.000**		**0**	**30,38%**	**30,60%**	**$ 4.644.500**	**$ 4.687.505**
92	1.2.4.11	ELABORACION Y ENTREGA A LA INTERVENTORIA INFORME GENERAL (VERSION INICIAL)	27 días	lun 25/04/22	mar 24/05/22	$ 9.289.000	EL CONTRATISTA AVANZA CON ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO AL AVANCE DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS	0,5	50%	50,48%	$ 4.644.500	$ 4.687.505
93	1.2.4.11	REVISION DEL INFORME POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y GENERACION DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	5 días	mar 24/05/22	mar 31/05/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
94	1.2.4.11	ATENCION A OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO A LA INTERVENTORIA (VERSION CORREGIDA)	3 días	mar 31/05/22	vie 3/06/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
95	1.2.4.11	REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DEL PRODUCTO FINAL	5 días	vie 3/06/22	jue 9/06/22	$ 2.000.000		0	0%	0%	$ 0	$ 0
96	1.2.4.11	FIN COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0 días	jue 9/06/22	jue 9/06/22	$ 0	ESTA LINEA HACE REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE DEBEMOS TENER EJECUTADAS ANTES DE EMPEZAR LA FASE DE	0	0%	0%	$ 0	$ 0
97	**1.2.5**	**ACTIVIDADES ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO**	**108 días**	**lun 7/02/22**	**sáb 11/06/22**	**$ 6.360.000**		**0**	**70%**	**69,89%**	**$ 4.382.000**	**$ 4.374.886**
98	1.2.5.1	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL ICANH	88 días	lun 7/02/22	jue 19/05/22	$ 3.130.000	PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA POR PARTE DE LA ENTIDAD DE PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO APROBADO POR EL ICANH	0,9	90%	89,77%	$ 2.817.000	$ 2.809.886
99	1.2.5.2	ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO	58 días	mar 5/04/22	sáb 11/06/22	$ 3.130.000	Comunicación CSC 054-2022 DADIS Comunicación CSC 050-2022 IDPCComunicación CSC 056-2022 Min. Cultura; MINISTERIO DE CULTURA OK, Comunicación CSC	0,5	50%	50%	$ 1.565.000	$ 1.565.000
100	1.2.5.3	FIN ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	0 días	sáb 11/06/22	sáb 11/06/22	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0
101	1.2.6	FIN DE ETAPA OBRAS INICIALES Y PRELIMINARES	0 días	lun 13/06/22	lun 13/06/22	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0
102	1.3	ACTA DE INICIO FASE DE EJECUCION	0 días	mar 14/06/22	mar 14/06/22	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0
103	1.4	FASE DE CONTRUCCION	536 días	mar 14/06/22	mar 13/02/24	$ 51.056.936.460		0	0%	0%	$ 0	$ 0
104	1.5	FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 13/02/24	mar 13/02/24	$ 0		0	0%	0%	$ 0	$ 0

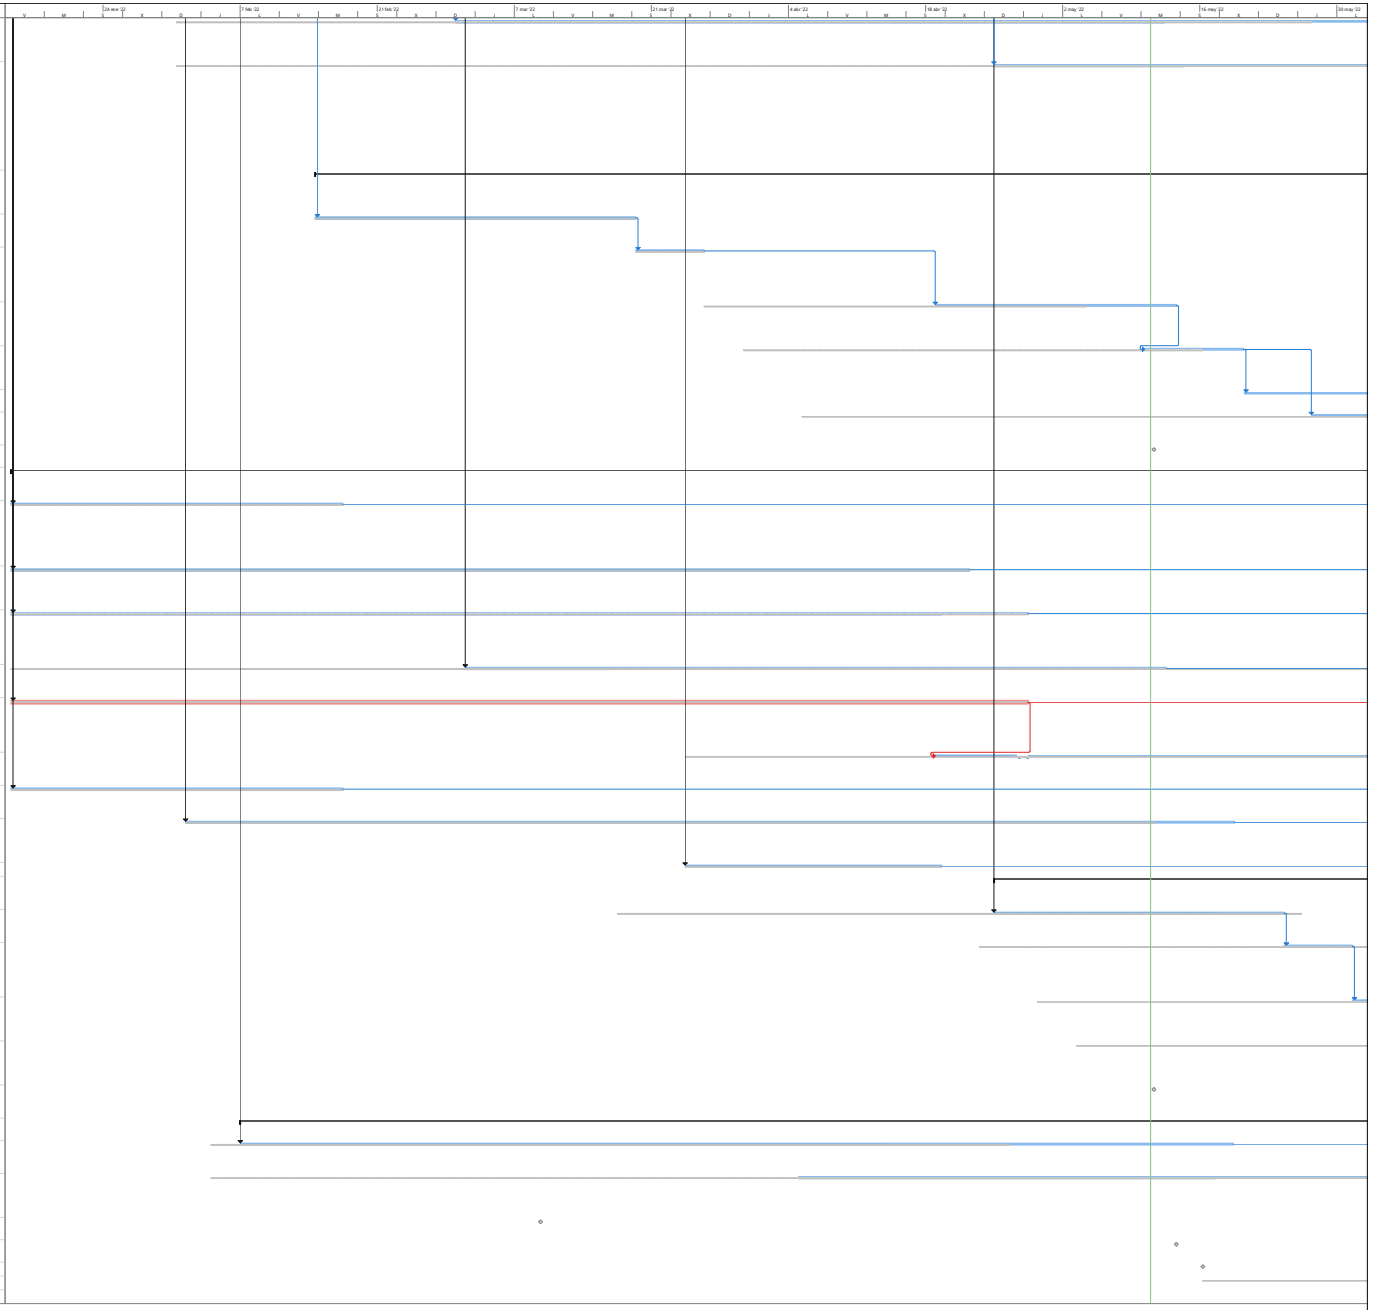


Proyecto: IDU-1847-2021-CON
Fecha: mié 11/05/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual · Tarea LBI · Hitos LBI



Proyecto: IDU-1847-2021-CON
Fecha: mié 11/05/22

Página 4

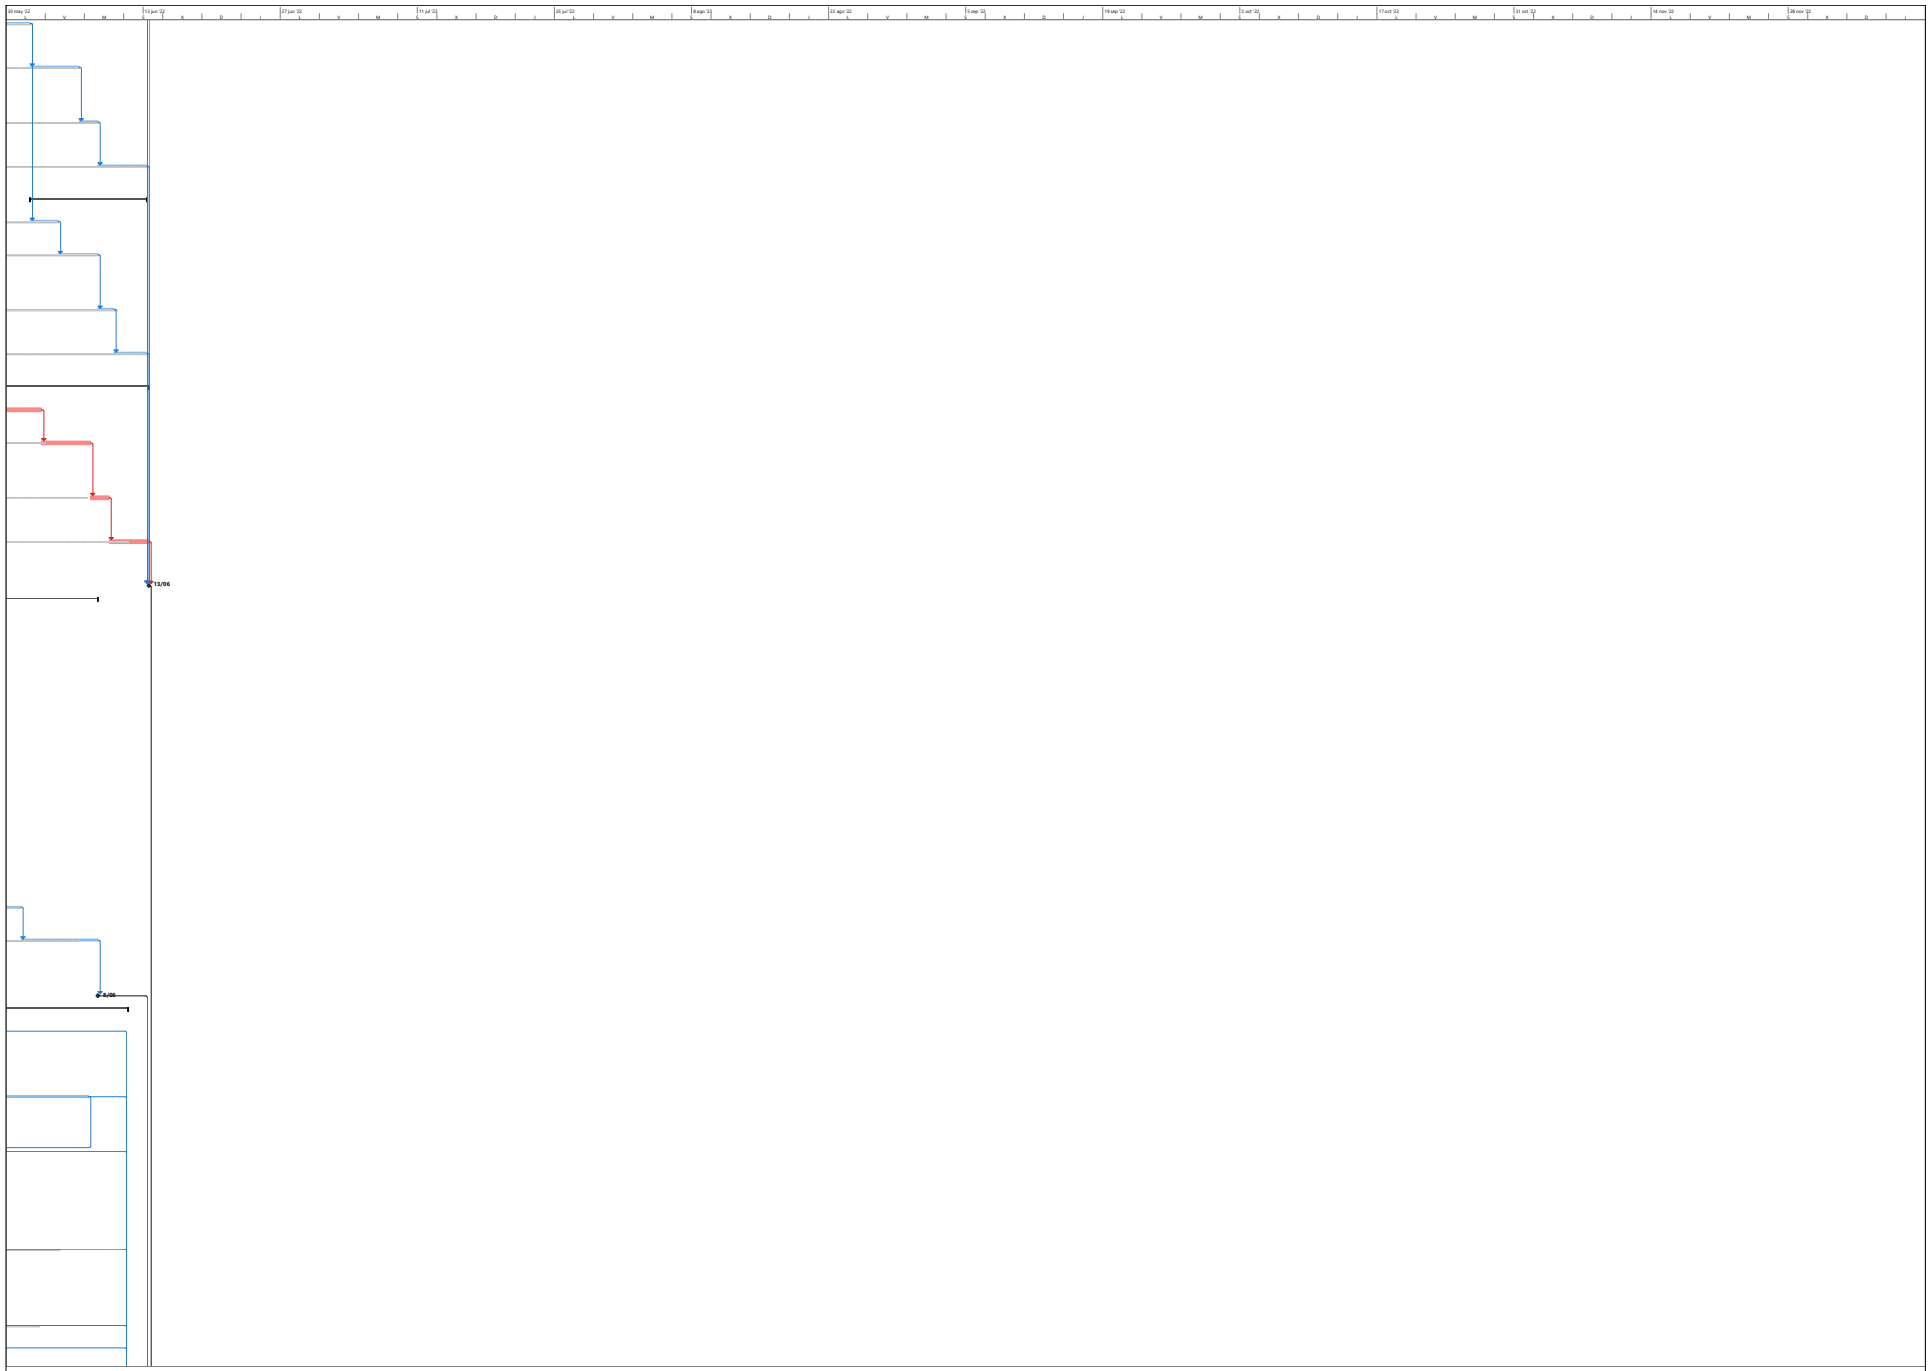

Proyecto: IDU-1847-2021-CON
Fecha: mié 11/05/22

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual · Hitos LBT
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso · Tarea LBT



Proyecto: IDU-1847-2021-CON
Fecha: mié 11/05/22

Tarea · Hito · Resu men del proyecto · Hito inactivo · Tareas manual · Informe de resu men manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual · Hitos LBI
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso · Tarea LBI
